San Sebastián de Buenavista, 09 de enero de 2025 **OFICIO N.º 027**

Señores
CONSORCIO INTERVENTORES AC
Arq. Carolina Sanabria.
Representante Legal

Ref.: **2687 DE 2024** OBJETO: **MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA SAN SEBASTIÁN - LOS GALVIS CÓDIGO 78141, EN EL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.**

Asunto: Solicitud de aprobación de modificación de mayores y menores cantidades e ítems no previstos.

Cordial saludo,

La presente es para solicitar el trámite de modificación de mayores y menores cantidades e inclusión de nuevos ítems no previstos al contrato de obra, esta necesidad nace de los resultados dados por los estudios y diseños realizados y entregados a la interventoría, además de otras condiciones inherentes a una obra vial, como es la señalización horizontal y vertical en la vía y la actividad de demolición de las placas de pavimento que conforman las rampas de acceso de las vías existentes en los tramos que se van a intervenir, esto para tener un correcto empalme de la nueva vía con la ya existente. A continuación, se detallan los ítems no previstos solicitados.

1. **Demolición de Pavimentos Rígidos y Flexibles:** Se realizaron trabajos de demolición del pavimento de las rampas en los tramos de San Sebastián y Los Galvis, esto con la finalidad de hacer un correcto empalme con el pavimento que se esta ejecutando.








2. **Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - BORDILLO (0,20m * 0,15m):** Se hace necesario hacer un nuevo ítem de bordillo debido a que el que se encuentra en el presupuesto inicial tiene un diseño diferente al realizado en obra, el nuevo ítem de bordillo va acorde al diseño utilizado en obra.



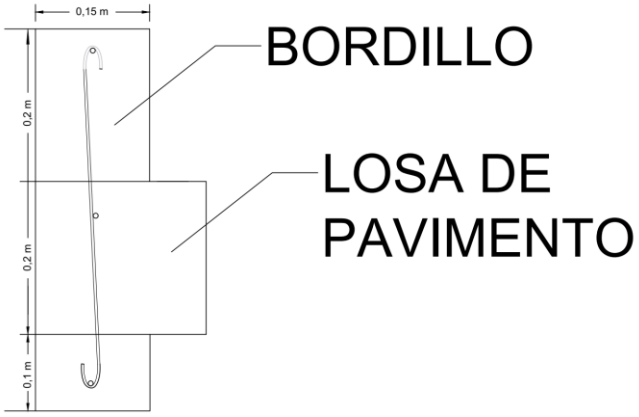

Para la solicitud se anexan las siguientes actas y soportes:

1. MEPI-MN1-IN-10-FR-1 ANALISIS PRECIOS UNITARIOS
2. MEPI-MN1-IN-10-FR-2 COMP PRECIOS UNIT ITEMS NO PREVISTOS
3. MEPI-MN1-IN-10-FR-4 ACTA DE FIJACION DE ITEMS NO PREVISTOS
4. MEPI-MN1-IN-7-FR-1 ACTA MODIFICACION CANT OBRA

Atentamente,

JAIRO ALBERTO QUINTERO DÁVILA
DIRECTOR DE OBRA
QUINDAVI SAS
