INFORME DE INTERVENTORIA N°. 02 AL CONTRATO DE CONSULTORIA N° PS-001-2025. - "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA".

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°. CI 0126-2024.

OBJETO: REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA BPIN: 20243218000001.

PERIODO: DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2025.

CONTRATISTA:
ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ.

PRESENTADO A:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA - CORPOGUAJIRA

RIOHACHA, LA GUAJIRA
ABRIL DE 2025.

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION 4
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5
1.1.1 NOMBRE DEL PROYETO 5
1.2 OBJETIVOS 5
1.2.1 OBJETIVO GENERAL 5
1.2.2 Objetivos Específicos 5
1.3. SITUACION EXISTENTE 6
1.4 JUSTIFICACIÓN 6
1.5. LOCALIZACION DEL PROYECTO 8
2. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 9
2.1 Información General del contrato 9
3. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 10
4. METODOLOGIA DE EJECUCION DE LA INTERVENTORIA 13
5. COMPONENTES BASICOS DEL PROYECTO SEGÚN LOS BJETIVOS 14
5.1 OBJETIVO 1. MEJORAR ACCIONES DE CULTURA AMBIENTAL EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 14
5.2 OBJETIVO 2: FORTALECER LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. 14
6. ASPECTOS TECNICOS DEL CONSULTOR 14
6.1. Descripción de actividades ejecutadas 14
6.1.1 Realizar socialización del Proyecto 15
6.1.1.1 Municipio de San Juan del Cesar 15
6.1.1.2 Municipio de La Jagua del Pilar 15
6.1.1.3 Municipio de Urumita 16
6.1.1.4 Municipio de Maicao 17
6.1.1.5 Municipio de Albania 17
6.1.1.6 Municipio de Manaure 18
6.1.1.7 Municipio de Uribía 19
6.1.1.8 Distrito de Riohacha 20
6.1.1.9 Municipio de Dibulla 21
6.1.2 Implementar un Plan de Medios y Divulgación del Proyecto 26

6.1.3 Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales.....26

6.1.3.1. Municipio de San Juan del Cesar.....26

6.2 Avances de Actividades del contrato de consultoría N° 001 DE 2025.....29

6.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....30

7. ASPECTO TECNICO DE LA INTERVENTORIA.....31

7.1. Actividades de carácter técnico.....31

8. ASPECTOS FINANCIERO DE LA INTERVENTORIA.....31

8.1 Avance financiero de las actividades.....31

9. SOLICITUDES DE LA INTERVENTORIA AL CONSULTOR DEL CONTRATO 001 DE 2025. 33

10. ANEXOS.....34

1. INTRODUCCION

La sociedad actual enfrenta el problema de la contaminación ambiental, provocada por el poco valor que le dan al cuidado del ambiente y de la naturaleza en general, además de las actividades que se desarrollan, conllevando a diversos y numerosos problemas ambientales, que van de la escala local a la global (pérdida de biodiversidad, calentamiento global, perdida del patrimonio cultural de los pueblos, residuos urbanos, deforestación, desertificación, contaminación del agua, escasez de agua segura, contaminación por agroquímicos, entre tantos otros).

A través del tiempo, el hombre ha alterado el equilibrio de la naturaleza provocando una transformación de su entorno: sobrepoblación, agotamiento de recursos naturales, extinción de diversas especies y hábitat silvestre, acumulación de residuos sólidos, contaminación atmosférica, entre otras; deteriorando cada vez más las condiciones ambientales básicas para la vida y la salud de las generaciones presentes y futuras de nuestro territorio.

La educación constituye un factor determinante para las buenas prácticas dentro de la sociedad, en la interacción entre las personas y el medio ambiente, sin embargo, es un tema que se deja a un lado, dándole importancia a las problemáticas de tipo económico y político, sin tener en cuenta que día a día el deterioro ambiental cada vez es mayor.

En la actualidad el departamento de La Guajira presenta Insuficientes Estrategias de Educación Ambiental en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, ocasionada por las débiles acciones de cultura ambiental en las escuelas públicas y los débiles procesos de participación comunitaria en la Gestión Ambiental del departamento.

La Corporación Autónoma Regional de La Guajira – CORPOGUAJIRA como máxima autoridad del medio ambiente en el departamento de La Guajira para cumplir con la misión de administrar, el medio ambiente y los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción y propender por el desarrollo sostenible del país, adelanto el proyecto IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA, el cual se ejecutara en 181 instituciones educativas del departamento de La Guajira en donde se realizaran 30 socializaciones del Proyecto, dos en cada municipio. De igual manera, durante el proyecto se Implementarán un plan de medios y divulgación del proyecto, se desarrollarán 30 talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales, se realizarán 181 capacitaciones sobre manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente, instalación de 362 puntos ecológicos (capacidad de 55lt) para el adecuado manejo de los residuos sólidos. Así mismo, se realizarán 15 ilustraciones de la conservación de los recursos naturales en sitios específicos de las instituciones públicas del departamento de La Guajira y el fortalecimiento de las bibliotecas de Educación Ambiental en el Departamento de La Guajira a través de la entrega de 1475 libros o recursos didácticos necesarios para que todos los niños y niñas, sin excepción, puedan observar, describir, analizar y manipular, un material que constituya una experiencia valiosa para aprender.

El presente informe de interventoría se desarrolla de acuerdo con las exigencias de CORPOGUAJIRA, de conformidad a lo establecido en las cláusulas del contrato de interventoría N° CI 0126 de 2024 “Presentar los

informes de ejecución del objeto y obligaciones del contrato y los que sean requeridos por el supervisor en forma oportuna", y describe las labores que se llevaron a cabo en el transcurso del periodo comprendido entre el 1 y el 31 de Marzo de 2025.

La interventoría realiza seguimiento permanente, vigilando el desarrollo de las actividades con el fin de verificar que las contratadas se ejecuten en las condiciones de calidad, cantidad, plazo, y valor acordado en la minuta del contrato.

El grupo de trabajo de la Interventoría para el periodo que comprende el presente informe estuvo conformado por un director, un Profesional de campo (Ingeniero ambiental) y una trabajadora social.

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1.1 NOMBRE DEL PROYETO

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo General

Incrementar las Estrategias de Educación Ambiental en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira.

1.2.2 Objetivos Específicos

- **Objetivo específico 1:**

Mejorar acciones de cultura ambiental en las escuelas públicas del Departamento de La Guajira.

- **Objetivo específico 2:**

Fortalecer los procesos de participación comunitaria en la Gestión Ambiental del departamento de La Guajira

1.3 SITUACION EXISTENTE

En la actualidad el departamento de La Guajira presenta Insuficientes Estrategias de Educación Ambiental en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, ocasionada por las débiles acciones de cultura ambiental en las escuelas públicas y los débiles procesos de participación comunitaria en la Gestión Ambiental del departamento. La primera es causada por las escasas acciones de promoción de educación ambiental desde las instituciones educativas y el desconocimiento de la importancia sobre la conservación de los recursos naturales.

La segunda es causada por la débil articulación institucional en la gestión ambiental, pocas gestiones de conservación de los recursos naturales e insuficiente información de educación ambiental para la toma de decisiones, esta situación genera un crecimiento de la problemática ambiental como lo es el crecimiento de la contaminación Ambiental y los problemas en salud de la población. De igual manera, se genera incumplimiento de las políticas ambientales, lo que genera un aumento del uso inadecuado de los recursos naturales y un deterioro de la Imagen institucional.

Magnitud actual del problema: Insuficientes Estrategias de Educación Ambiental en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira.

1.4 JUSTIFICACIÓN

Para el Desarrollo de un ambiente sostenible es imprescindible establecer estrategias que permitan tomar conciencia de los problemas ambientales que afectan a la comunidad y por ende al bienestar común. Las numerosas formas de vivir, los cambios de hábitos, el desconocimiento de la población frente a temas ambientales, ha determinado la necesidad de generar espacios y momentos oportunos para incorporar el conocimiento del cuidado del ambiente de una manera práctica, sencilla y accesible. El cambio climático y sus respectivos efectos, los problemas de residuos urbanos, el inadecuado uso y manejo de los recursos hídricos, etc., son algunos de los ejemplos más relevantes de cómo se viene modificando el ambiente como resultado de una débil conciencia ambiental. Si bien es cierto, la educación ambiental en Colombia está regi da por Ley 99 de 2003, pocos son los avances que se han logrado, especialmente porque no se alcanza un cambio en los modelos de vida y recientemente el 1549 de 2012, es evidente que los nuevos profesionales continúan tomando decisiones empresariales que generan impactos negativos al medio ambiente.

La Corporación Autónoma Regional de La Guajira, CORPOGUAJIRA, para cumplir con la misión de administrar, el medio ambiente y los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción y propender por el desarrollo sostenible del país, debe adelantar un proceso dinámico de planificación ambiental que permita a la entidad y al departamento de La Guajira orientar mediante la coordinación y concertación el manejo, administración y aprovechamiento de sus rec ursos naturales renovables buscando alternativas de desarrollo sostenible acorde las características de la jurisdicción.

Este proyecto forma parte de la práctica pedagógica sobre las necesidades ambientales, que se detectaron en el departamento de La Guajira, acerca del cuidado del medio ambiente, la conservación y preservación de

sus recursos naturales, en perspectiva de fomentar desde la enseñanza temprana una cultura 44 ambiental, que incida de manera definitiva en todo el proceso vivencial para la comunidad de este departamento.

Por todo lo anteriormente expuesto CORPOGUAJIRA que tiene competencia en materia de administración, conservación y control de los recursos naturales en el área de su jurisdicción según lo dispuesto en el, Decreto 2811 de 1974, Decreto de 1541 de 1978, Ley 99 de 1993, Ley 373 de 1997, Decreto 155 de 2004, Decreto 1076 de 2015, en el cumplimiento normal de la actividad que desarrolla, tramito por intermedio del Grupo de Educación Ambiental, el proyecto aprobado para ser financiado con recursos del Sistema General de Regalías, denominado: "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA", el cual fue debidamente viabilizado y aprobado para su ejecución.

Para velar por la adecuada inversión de los recursos y ejecución del proyecto, la corporación regional de la guajira (corpoguajira), decidió contratar una interventoría cuyo objeto es: INTERVENTORIA AL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA.

La interventoría se compromete a ser un seguimiento mensual de las actividades, e igualmente reportarlos avances de ejecución en periodos mensuales.

El presente informe de interventoría se desarrolla de acuerdo con las exigencias de CORPOGUAJIRA, de conformidad a lo establecido en las cláusulas del contrato de interventoría N° **CI 0126-2024** "Presentar los informes de ejecución del objeto y obligaciones del contrato y los que sean requeridos por el supervisor en forma oportuna", y describe las labores que se llevaron a cabo en el transcurso del periodo comprendido entre el 1 y 31 de marzo del 2025.

La interventoría realiza seguimiento permanente, vigilando el desarrollo de las actividades con el fin de verificar que las contratadas se ejecuten en las condiciones de calidad, cantidad, plazo, y valor acordado en la minuta del contrato.

1.5 LOCALIZACION DEL PROYECTO

Las sedes de realización del proyecto serán las 181 instituciones educativas de carácter público que se encuentran distribuidos en los 15 municipios del departamento de La Guajira:

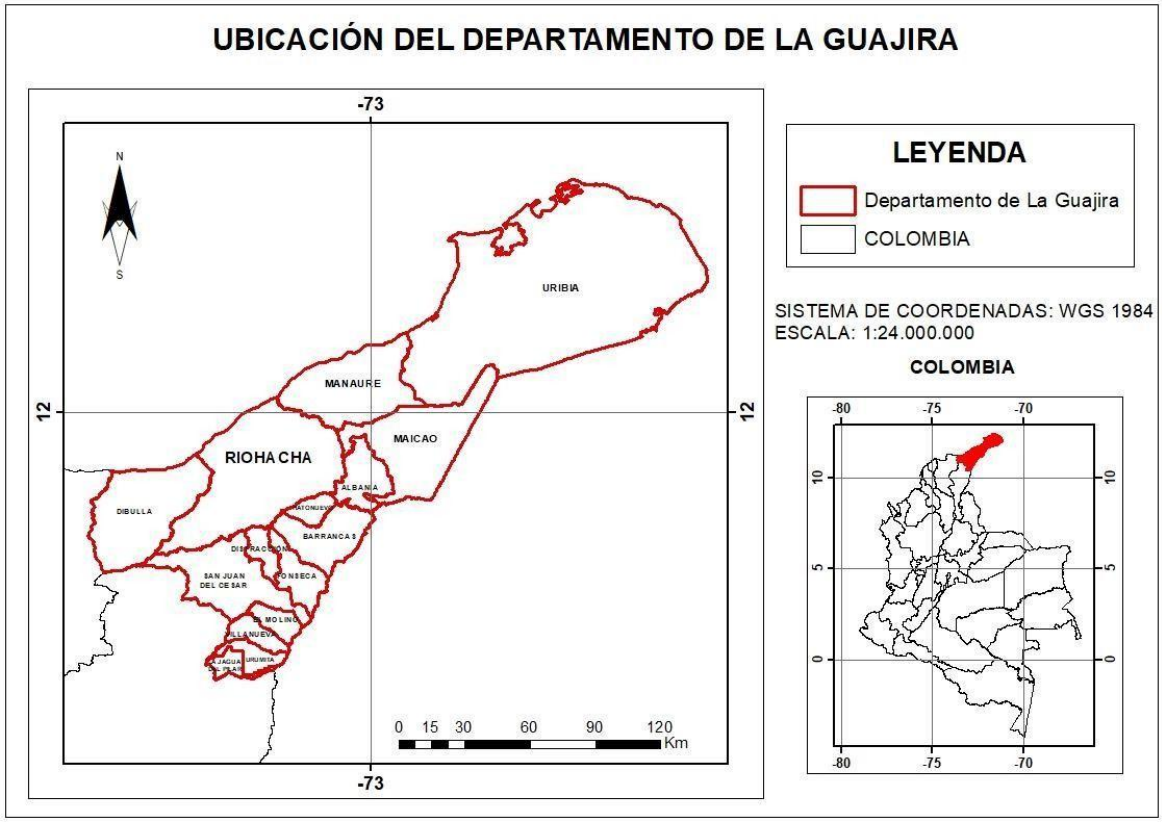


Figura 1. Ubicación especifica del Proyecto.
Fuente: proyecto

2. CONTRATO DE PRETACION DE SERVICIOS.

La Corporación Autónoma Regional de La Guajira, CORPOGUAJIRA, para cumplir con la misión de administrar el medio ambiente y los recursos naturales renovables dentro del área de su jurisdicción y propender por el desarrollo sostenible, fomentando desde la enseñanza temprana una cultura ambiental suscribió con la firma "SOLTAM S.A.S", el Contrato de prestación de servicios No. 001 de 2025, cuyo objeto es el "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA BPIN: 20243218000001".

2.1 Información General del contrato

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO		
PERIODO DEL PRESENTE INFORME:	DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025.	
NÚMERO CONTRATO: 001 DE 2025	CONTRATISTA: SOLTAM S.A.S	
VALOR INICIAL: $ 1.711.921.999.00	PLAZO: CINCO (5) MESES	
OBJETO DEL CONTRATO: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA BPIN: 20243218000001.		
FECHA DE INICIO:	17 DE FEBRERO DE 2025.	
FECHA DE TERMINACION:	16 DE JULIO DE 2025.	
INTERVENTORIA:	ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ	
SUPERVISOR DESIGNADO:	HECTOR ALEXANDER SUAZA PIMIENTA	
PÓLIZA – GARANTÍA ÚNICA No.: 47-44-101029951	ULTIMA ACTUALIZACION : 28/01/2025	COMPAÑIA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
PLAZO INICIAL: 05 Meses	PLAZO ADICIONAL: NINGUNO	

Tabla 1: Resumen del contrato N° 001 de 2025.
Revisión de Vigencia de las Garantías.

Tabla 2: Descripción de las vigencias de las garantías.

AMPAROS	VIGENCIAS		VR ASEG.	EXPEDICION	COMPAÑÍA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/01/2025	28/12/2025	$ 171.192.200,00	28/01/2025	SEGUROS DEL ESTADO
CALIDAD DEL SERVICIO	28/01/2025	28/12/2025	$ 171.192.200,00	28/01/2025	SEGUROS DEL
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	28/01/2025	28/12/2025	$ 171.192.200,00	28/01/2025	SEGUROS DEL ESTADO
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL DE ANTICIPO:	28/01/2025	28/12/2025	$ 855.961.000,00	28/01/2025	SEGUROS DEL ESTADO
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	28/01/2025	28/06/2028	$ 85.596.100,00	28/01/2025	SEGUROS DEL ESTADO

La correspondiente póliza fue aprobada en la plataforma SECOP II el día 09 de enero de 2025.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CI 0126-2024.

Tabla 3. Descripción del contrato de interventoría No. CI 0126-2024

CONTRATO	No. CI 0126-2024.
OBJETO	REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA BPIN: 20243218000001.
CONTRATANTE	CORPOGUAJIIRA
CONTRATISTA	ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($116.700.000,00) M/L
PLAZO DE EJECUCIÓN	CINCO (5) MESES
FECHA ACTA DE INICIO	17 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN.	16 DE JULIO DE 2025.
SUPERVISION	HECTOR ALEXANDER SUAZA PIMIENTA

Tabla 4: Presupuesto de obras.

PRESUPUESTO OFICIAL

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA

1.0 Mejorar acciones de cultura ambiental en las escuelas públicas del Departamento de La Guajira.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
1.1	Realizar socialización del Proyecto	Numero	30	$ 1.065.091,05	$ 31.952.731,43
1,2	Implementar un plan de medios y divulgación del proyecto	Numero	1	$ 22.890.000,00	$ 22.890.000,00
1,3	Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales.	Número	30	$ 13.155.719,33	$ 394.671.579,89
				Subtotal 1	**$ 449.514.311,32**

2.0 Fortalecer los procesos de participación comunitaria en la Gestión Ambiental del departamento de La Guajira.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR. PARCIAL
2.1	Realizar talleres de sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente.	Numero	181	$ 944.020,52	$ 170.867.714,80
2.2	Instalar puntos ecológicos (capacidad de 55lt) para el adecuado manejo de los residuos sólidos	Numero	362	$ 1.572.498,04	$ 569.244.289,58
2.3	Ilustrar la conservación de los recursos naturales en sitios específicos de las instituciones públicas del departamento de La Guajira	Numero	15	$ 5.213.156,63	$ 78.197.349,38
2.4	Fortalecer las bibliotecas de Educación Ambiental en el Departamento de La Guajira	Numero	1	$ 170.828.260,75	$ 170.828.260,76
				Subtotal 3	**$ 989.137.614,51**

Subtotal del Proyecto	**$ 1.438.651.925,83**
Iva 19%	**$ 273.343.866**
Interventoría	**$ 116.714.456,25**
Valor total del proyecto	**$ 1.828.710.247,98**

4. METODOLOGIA DE EJECUCIÓN DE LA INTERVENTORIA

Tabla 6. Anexo al cronograma de actividades.

ANEXO AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES			
ITEM	**ACTIVIDAD**	**METODOLOGIA**	**RECURSOS**
1	Realizar socialización del Proyecto.	Realizar acompañamiento técnico en las actividades contempladas en este ítem al consultor con el profesional especializado del equipo técnico de la interventoría para que se lleven a cabo el número de socializaciones y las especificaciones técnicas, en el sector educativo.	Un trabajador social , un ingeniero ambiental y un vehículo.
2	Implementar un plan de medios y divulgación del proyecto.	Se realizara seguimiento para que se Realicen las cuñas radiales, la entrega de oficios a la población del área del proyecto, las Publicaciones en periódicos locales y departamental la cual debe cumplir con las especificaciones técnicas y características exigidas por CORPOGUAJIRA.	Un (1) profesional Trabajadora Social, un ingeniero ambiental y un vehículo.
3	Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales	Se Realizara acompañamiento técnico en las actividades de Capación a 3000 personas entre estudiantes y docentes en la conservación de los recursos naturales Contempladas en este ítem al consultor con el profesional especializado del equipo técnico de la interventoría.	Un (1) profesional Trabajadora Social, un ingeniero ambiental y un vehículo.
4	Realizar talleres de sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente.	Realizar acompañamiento técnico en las actividades contempladas en este ítem al consultor con el profesional especializado del equipo técnico de la interventoría, para que se realicen los talleres de sensibilización en las las instituciones Educativas.	Un (1) profesional Ingeniero Ambiental, un (Vehículo)
5	Instalar puntos ecológicos (capacidad de 55lt) para el adecuado manejo de los residuos sólidos.	Se realizara seguimiento a la actividad para que se cumpla con las especificaciones, Zonificación de los puntos para la implementación de los puntos ecológicos -Instalación de puntos ecológicos (Código de Colores) contempladas en este ítem al consultor con el profesional especializado del equipo técnico de la interventoría.	Un (1) profesional Ingeniero Ambiental, un (Vehículo)
6	Ilustrar la conservación de los recursos naturales en sitios específicos de las instituciones públicas del departamento de La Guajira.	Se realizara seguimiento a la actividad para que se cumpla con las especificaciones contempladas, Zonificación de los sitios donde se ubicará el mural a realizar con pinturas ecológicas en este ítem al consultor con el profesional especializado del equipo técnico de la interventoría.	Un (1) profesional Ingeniero Ambiental, un (Vehículo)
7	Fortalecer las bibliotecas de Educación Ambiental en el Departamento de La Guajira..	Se realizara seguimiento a la actividad para que se cumpla con las especificaciones contempladas, Acta de Entrega de los Libros a la persona responsables de recibirlo con el profesional especializado del equipo técnico de la interventoría.	Un (1) profesional Ingeniero Ambiental, un (Vehículo)

5. COMPONENTES BÁSICOS DEL PROYECTO SEGÚN LOS OBJETIVOS

El proyecto **"IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA",** Tiene como objetivo General Incrementar las Estrategias de Educación Ambiental en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira .. A continuación se describen las actividades para alcanzar los objetivos.

5.1 OBJETIVO 1. MEJORAR ACCIONES DE CULTURA AMBIENTAL EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

1.1 Realizar socialización del Proyecto.
1.2 Implementar un plan de medios y divulgación del proyecto.
1.3 Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales.

5.2 OBJETIVO 2: FORTALECER LOS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA GESTIÓN AMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

2.1 Realizar talleres de sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente.

2.2 Instalar puntos ecológicos (capacidad de 55lt) para el adecuado manejo de los residuos sólidos.
2.3 Ilustrar la conservación de los recursos naturales en sitios específicos de las instituciones públicas del departamento de La Guajira.

2.4 Fortalecer las bibliotecas de Educación Ambiental en el Departamento de La Guajira.

6. ASPECTOS TÉCNICOS DEL CONSULTOR

6.1 Descripción de actividades ejecutadas

Durante el mes de marzo se realizaron las siguientes actividades, Según el cronograma del documento técnico del contrato, se ejecutaron trabajos en las actividades 1.1 Realizar socialización del Proyecto, 1.2 Implementar un plan de medios y divulgación del proyecto y 1.3 Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales.

6.1.1 Realizar Socialización del Proyecto.

El contratista continuo la actividad de las socializaciones el día 06 de marzo, realizando un total de nueve (9), socializaciones, adicionalmente se realizó el reforzamiento de las mismas en (4) municipios; todo esto hasta el día 31 de marzo. En los siguientes Municipios:

6.1.1. 1 MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR

En este municipio se realizó la socialización, la cual se llevó a cabo el día 6 de marzo en las instalaciones de la sala de juntas de la Alcaldía municipal a las 8:00 am. Esta actividad contó con la asistencia de docentes y directivos de las instituciones Educativas públicas del municipio, además contó con la asistencia de funcionarios de la administración municipal, también asistieron funcionarios del Instituto de Formación Técnica Profesional INFOTEP.

En el marco de esta actividad surgió la iniciativa por parte de los asistentes de generar una convocatoria entre las diferentes instituciones educativos para generar el boceto del mural que los represente como municipio.



Foto 1: Socialización del proyecto en el municipio de San Juan del Cesar

6.1.1.2. MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR

En este municipio se realizó esta actividad el día 6 de marzo, a las 11:00 am. Esta actividad contó con la asistencia de funcionarios de la administración municipal, también asistieron estudiantes y directivos de la Institución Educativa Anaurio Manjarrez.

En la misma la empresa contratista solicito el espacio para el mural representativo de este municipio, a lo cual el secretario de planeación municipal Freddy Duran, quedo en darle respuesta prontamente. Uno de los lugares propuestos fue al interior de la institución educativa Anaurio Manjarrez.



Foto 2: Socialización del proyecto en el municipio de La Jagua del Pilar

6.1.2.3. MUNICIPIO DE URUMITA

La socialización en este municipio se realizó en las instalaciones del Centro Comunal, a esta socialización contó con la asistencia de 26 personas, entre las cuales estuvieron docentes y directivos de las instituciones educativas públicas del municipio, de igual manera asistieron personas del Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental – CIDEA, (cuerpo de bomberos, presidentes de JAC, entre otros). Esta actividad se llevó a cabo el día 6 de marzo, desde las 2:00 PM.

Los asistentes se mostraron animados y abiertos a recibir las actividades que se realizaran en el municipio en el marco del presente proyecto.



Foto 3: Socialización del proyecto en el municipio de Urumita

6.1.2.4. MUNICIPIO DE MAICAO

En este municipio fronterizo la socialización se realizó el día 7 de marzo desde las 2:00 PM, en las instalaciones de la Casa de la Cultura municipal RAMIRO CHOLES ANDRADES. Entre los asistentes estuvieron representantes de la administración municipal, docentes y directivos de las instituciones educativas públicas del municipio, presidentes de JAC, entre otros.

Los asistentes se mostraron expectantes por las diferentes actividades que se realizaran en su municipio, de igual forma dieron su apoyo a la empresa contratista.



Foto 4: Socialización del proyecto en el municipio de Maicao

6.1.2.5. MUNICIPIO DE ALBANIA.

En este municipio se realizó esta actividad el día 12 de marzo en las instalaciones de la oficina de planeación municipal, a las 9:00 am. Esta actividad contó con la asistencia de funcionarios de la administración municipal, también asistieron docentes y directivos de las instituciones educativa de carácter público del municipio, también asistieron personal del Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental – CIDEA. En total la actividad contó con la asistencia de 28 personas.

Los asistentes se mostraron animados y abiertos a recibir las actividades que se realizaran en el municipio en el marco del presente proyecto.



Foto 5: Socialización del proyecto en el municipio de Albania

6.1.2.6. MUNICIPIO DE MANAURE

En este municipio se realizó esta actividad el día 13 de marzo en las instalaciones de la Casa de la Cultura municipal JUANA BARROS BARROS, a las 9:00 am. Esta actividad contó con la asistencia de estudiantes y directivos de las Instituciones educativas de carácter público del municipio. Para destacar en esta socialización la ausencia de personal de la administración municipal. En total la actividad contó con la asistencia de 52 personas.

Los asistentes se mostraron expectantes por las diferentes actividades que se realizaran en su municipio, de igual forma dieron su apoyo a la empresa contratista.



Foto 6: Socialización del proyecto en el municipio de Manaure.

6.1.2.7. MUNICIPIO DE URIBIA

En este municipio la socialización se realizó el día 13 de marzo desde las 2:00 PM, en las instalaciones de la Casa de la Cultura municipal TOMAS PANA, a esta actividad asistieron un total de 26 personas. Entre los asistentes estuvieron representantes de la administración municipal, docentes y directivos de las instituciones educativas públicas del municipio, presidentes de JAC, entre otros.

Los asistentes se mostraron expectantes por las diferentes actividades que se realizaran en su municipio, de igual forma dieron su apoyo a la empresa contratista. De igual manera mostraron preocupación debido a lo complejo y extenso que es su territorio.



Foto 7: Socialización del proyecto en el municipio de Uribia.

6.1.2.8. DISTRITO DE RIOHACHA

El día 14 de marzo se realizó en las instalaciones del auditorio CARLOS "CAYITO" FERNANDES RUEDA, de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira –CORPOGUAJIRA, la socialización de las actividades del proyecto. A la misma asistieron 28 personas, entre las cuales estuvieron docentes y directivos de las instituciones educativas rurales y urbanas de carácter público del Distrito. La administración distrital no hizo presencia en la socialización.

Para destacar la asistencia de la gran mayoría de las instituciones educativas de carácter público del distrito.



Foto 8: Socialización del proyecto en el distrito de Riohacha

6.1.2.9. MUNICIPIO DE DIBULLA.

En este municipio se realizó la socialización en las instalaciones del de la sala de juntas de la alcaldía, a esta socialización contó con la asistencia de 27 personas, entre las cuales estuvieron docentes y directivos de las instituciones educativas públicas del municipio, de igual manera asistieron personas del Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental – CIDEA. Esta actividad se llevó a cabo el día 14 de marzo, desde las 2:00 PM.

Los asistentes se mostraron animados y abiertos a recibir las actividades que se realizaran en el municipio en el marco del presente proyecto. De igual forma los asistentes expusieron algunas problemáticas ambientales.



Foto 9: Socialización del proyecto en el municipio de Dibulla

REFORZAMIENTO DE SOCIALIZACIONES

Debido a la baja asistencia presentada en la socialización inicial en los municipios de El Molino, Villanueva, Fonseca y Distracción, se realizó nuevamente la socialización en los mismos.

- **MUNICIPIO DEL MOLINO**

En esta oportunidad la socialización se realizó en el centro Regional de Victimas, el día 19/03, a la reunión asistieron personal del Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental – CIDEA. Lográndose en esta oportunidad una asistencia de 27 personas. Desde las 9:00 am.

En esta oportunidad se logró la asistencia de los rectores de las dos (2) instituciones educativas públicas del municipio, los cuales brindaron el apoyo a las actividades contempladas en el proyecto.



Foto 10: Socialización del proyecto en el municipio de El Molino

- **MUNICIPIO DE VILLANUEVA**

En esta oportunidad el sitio escogido fue el recinto del Concejo municipal, a él asistieron 28 personas, entre las cuales se encontraban los presidentes de las JAC tanto urbanas como rurales de este municipio, esta actividad se realizó el día 19/03, desde las 3:00 pm.

Una vez culminada la socialización, los asistentes le expusieron a la empresa y en especial al supervisor del proyecto una amplia problemática ambiental que está sucediendo en el municipio y que ellos consideran urgente atender.



Foto 11: Socialización del proyecto en el municipio de Villanueva

- **MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN**

En este municipio se realizó nuevamente la socialización del proyecto, debido a la escaza asistencia presentada en la primera socialización. En esta oportunidad se le socializo el proyecto al Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental – CIDEA municipal. De este comité hace parte la administración municipal, cuerpos asistieron de socorro, fuerza pública, la empresa Veolia, entre otros sectores. Esta actividad se realizó en las instalaciones de la sala de Juntas de la Alcaldía municipal el día 20/03, desde las 9:00 am.

En esta ocasión la fuerza publica (Ejercito) mostro el interés de hacer parte activa en las diferentes actividades del proyecto. De igual manera se vincula la empresa Veolia.



Foto 12: Socialización del proyecto en el municipio de Distracción

- **MUNICIPIO DE FONSECA**

En este municipio se repitió la socialización inicial del proyecto dado que la primera vez se presento una escaza asistencia. En esta oportunidad se realizó el día 20/03, en las instalaciones de la sala de juntas de la alcaldía municipal. Para esta oportunidad se socializo el proyecto al Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental – CIDEA municipal, de este hacen parte la administración municipal, la fuerza pública (Policía Nacional y Ejercito Nacional), cuerpos de socorro (Bomberos y Defensa Civil), empresa Interaseo, Universidad de La Guajira, entre otros.

En el marco de la actividad se solicito por parte de los asistentes a la administración municipal la implementación del comparendo ambiental, dada la problemática presentada por la inadecuada disposición de los residuos sólidos, especialmente en las diferentes vías de acceso de este municipio y a las fuentes de agua.



Foto 13: Socialización del proyecto en el municipio de Fonseca

6.1.2 Implementar un Plan de Medios y Divulgación del Proyecto.

Para cumplir con el objetivo de informar, extender y promocionar la información general del proyecto y aumentar el alcance del mismo, el contratista elaboro unos flyers publicitario y Envió oficios (ver anexos), invitando a las diferentes socializaciones y talleres.

El contratista articulo con la oficina de comunicaciones de Corpoguajira la publicación de los flyers de las diferentes actividades en la página web de la corporación autónoma regional de La Guajira.

Adicionalmente el contratista elaboro 2 pendones con la información del proyecto y los empezó a usar en la ejecución de los talleres de gestión y cultura ambiental.

A continuación se muestran las imágenes de los flyers elaborados:


#MANAURE
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
es compromiso de todos
Te invitamos a la socialización Sobre
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA.
JUEVES 13 MARZO
ALCALDÍA MUNICIPAL
10:00 AM
Corpoguajira


#DIBULLA
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
es compromiso de todos
Te Invitamos a la socialización Sobre
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA.
VIERNES 14 MARZO
ALCALDÍA MUNICIPAL
2:00 PM
Corpoguajira


#RIOHACHA
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
es compromiso de todos
Te invitamos a la socialización Sobre
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA.
Corpoguajira
10:00 AM
AUDITORIO CORPOGUAJIRA
VIERNES 14 MARZO


#URIBIA
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
es compromiso de todos
Te invitamos a la socialización Sobre
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA.
JUEVES 13 MARZO
ALCALDÍA MUNICIPAL
2:00 PM
Corpoguajira


#URUMITA
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
compromiso de todos
Te invitamos a la
Socialización Sobre
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA.
MARTES 25 FEBRERO
3:00


#SAN JUAN DEL CESAR
TE INVITAMOS AL
Taller de Gestion y
Cultura Ambiental
VIERNES 28 MARZO
8:00


#MAICAO
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
es compromiso de todos
Te invitamos a la
socialización Sobre
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA.
VIERNES 7 MARZO
2:00


LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
es compromiso de todos
Te invitamos a la
cocialización Sobre
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA.
JUEVES 6 MARZO
11:00

6.1.3 REALIZAR TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ACERCA DE PROCESOS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y SEPARACIÓN EN LA FUENTE.

Otra de las actividades a realizar por el contratista son los talleres de Gestión y Cultura Ambiental, los cuales tienen una duración de 3 horas en los que se manejan 4 temas que son:

1. PEDAGOGÍA DEL AMBIENTE.
2. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.
3. CAMBIO CLIMATICO.
4. USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA Y ENERGIA.

En el desarrollo de los talleres se entregan unos Kit de sensibilización ambiental a cada participante, estos contienen:

- Bolsa biodegradable.
- Lapicero ecológico
- Agenda
- Gorras con el nombre del programa de sensibilización.
- Cartilla con la información respectiva a las temáticas.

A la fecha del presente informe solo se ha realizado un (1) taller y fue en el municipio de San Juan del Cesar.

6.1.3.1. MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL CESAR

En este municipio se realizó el taller de Gestión y Cultura Ambiental, el día 28 de marzo, a esta actividad asistieron 126 personas, entre las cuales estuvieron líderes comunales, docentes, delegaciones de los corregimientos aledaños al área urbana, estudiantes de Instituciones Educativa. Este taller se realizó en las instalaciones de la biblioteca de la institución educativa El Carmelo.

Este taller se realizó según lo establecido por la empresa contratista, presentando una participación activa de los asistentes, en el marco del mismo se identificaron problemáticas ambientales que se presentan tanto en la zona rural como en la urbana.

Dentro de las conclusiones obtenidas se obtuvieron:

- Es necesario intensificar la educación ambiental a las comunidades, pero adicionalmente acompañarlas con acciones que la promuevan.
- La implementación del comparendo ambiental como medida para controlar la contaminación causada por la inadecuada disposición de los residuos sólidos.
- La protección por parte de todos de la parte alta del Rio Cesar, como fuente principal de agua en el municipio.



Foto 14: Realización del Taller de gestión y cultura ambiental en el municipio de San Juan del Cesar



Foto 15: Participación de la comunidad en el taller, municipio de San Juan del Cesar.



Foto 16: Entrega de kit de sensibilización ambiental, municipio de San Juan del Cesar



Foto 17: Asistentes al taller con su kit de sensibilización ambiental, municipio de San Juan del Cesar.

6.2 Avances de Actividades del contrato de consultoría N° 001 DE 2025.

Tabla 7. Anexo al cronograma de actividades

ITEM	ACTIVIDADES	UNID	CANT	VR UNIT (sin IVA)	VR TOTAL (sin IVA)	CANTIDAD EJECUTADA	% DE AVANCE		VALOR EJECUTADO
1.1	Realizar socialización del Proyecto.	Numero	30	$ 1.065.091,05	$ 31.952.731,43	15	50%		$ 15.976.366
1.2	Implementar un plan de medios y divulgación del proyecto.	(#) Cuñas radiales	30	$8.829.000	$ 8.829.000,00				$ 6.730.750
		(#) periódicos locales y Redes Sociales	30	$12.262.500	$ 12.262.500,00	15	50%	29%	
		(#) Pendón	6	$1.798.500	$ 1.798.500,00	2	33%		
1.3	Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales	Numero	30	$ 13.155.719,33	$ 394.671.579,89	1	3%		$ 13.155.719
2.1	Realizar talleres de sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente.	Numero	181	$ 944.020,52	$ 170.867.714,80	0	0%		
2.2	Instalar puntos ecológicos (capacidad de 55lt) para el adecuado manejo de los residuos sólidos.	Numero	362	$ 1.572.498,04	$ 569.244.289,58	0	0%		
2.3	Ilustrar la conservación de los recursos naturales en sitios específicos de las instituciones públicas del departamento de La Guajira.	Numero	15	$ 5.213.156,63	$ 78.197.349,38	0	0%		
2.4	Fortalecer las bibliotecas de Educación Ambiental en el Departamento de La Guajira.	Numero	1475	$ 170.828.260,75	$ 170.828.260,76	0	0%		
TOTAL	7						**2,5%**		**$ 35.862.835**


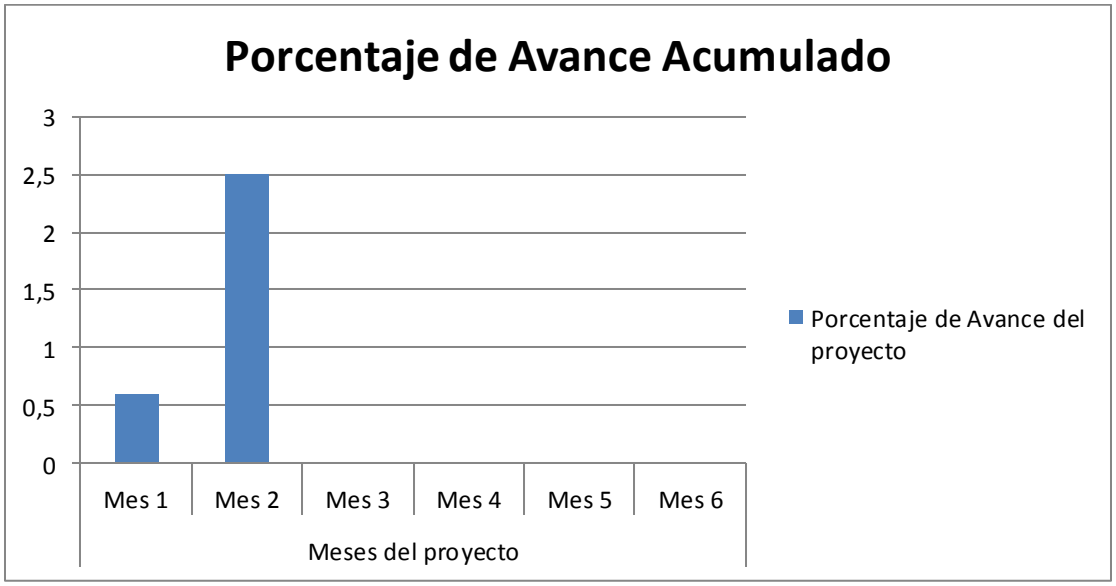


Figura 2. Avance del segundo mes de ejecución de actividades del contrato 001 de 2025.

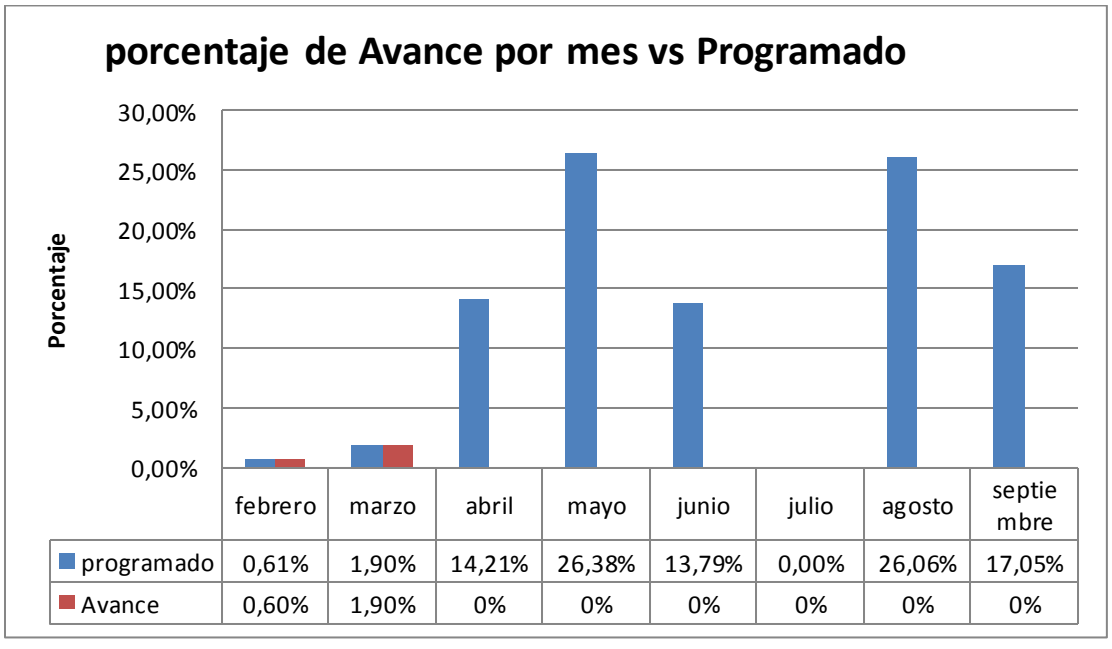

	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre
programado	0,61%	1,90%	14,21%	26,38%	13,79%	0,00%	26,06%	17,05%
Avance	0,60%	1,90%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Figura 3. Avance por mes vs programado del contrato 001 de 2025.

6.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como se evidencia en el avance físico, el proyecto tubo un avance del 2,5 % en los primeros dos (2) meses de ejecución. Por lo anterior se considera que el contratista lleva un avance aceptable en las actividades 1.1 Realizar socialización del Proyecto y 1.2 Implementar un plan de medios y divulgación del proyecto, en esta última actividad se le recomendó al contratista avanzar y mejorar el plan de medios, para que la actividad 1.3 Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales tengan mayor cobertura. En cuanto a esta última actividad (1.3), se le recomendó al contratista avanzar diligentemente por que deben realizarse quince (15) talleres en esta etapa del contrato, además se debe iniciar la actividad 2.1 Realizar talleres de sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente, que son la ruta crítica del contrato debido a que se deben realizar en 181 instituciones (95 urbanas y 86 rurales), hay que considerar que las instituciones rurales se encuentran dispersas, distantes y algunas se encuentran ubicadas en la Alta Guajira

7. ASPECTO TECNICO DE LA INTERVENTORIA

7.1 Actividades de carácter técnico

Durante el período que abarca el presente informe (1 al 31 de Marzo de 2025) se desarrollaron las siguientes tareas de carácter técnico:

- **Revisión de la metodología desarrollada por el consultor.**

La interventoría realizo la revisión y el cumplimiento por parte del Contratista de las actividades propias del contrato de prestación de servicios objeto de interventoría, y verifico que se cumplan todas las especificaciones Técnicas para Realizar la socialización del proyecto, la Implementación del plan de medios y divulgación del proyecto y para Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales. Se realizó seguimiento para que se Realizaran las cuñas radiales, la entrega de oficios a la población del área del proyecto, las Publicaciones en periódicos locales y departamental la cual debe cumplir con las especificaciones técnicas y características exigidas por CORPOGUAJIRA. Que se convocará a la población del sector educativo, referentes ambientales. Además que contara con el talento humano necesario, el sitio adecuado y el mínimo requerido para realizar las actividades.

8. ASPECTOS FINANCIEROS DE LA INTERVENTORIA

8.1 Avance financiero de las actividades

Con respecto a la ejecución financiera por parte del equipo técnico, administrativo y contable de esta interventoría, informamos que para el periodo comprendido entre 1 al 31 de marzo de 2025 se realizó una inversión parcial de $**23.342.891,25,** para un acumulado de ejecución presupuestal de $**32.513.312,8125.**

Tabla 8. Avance General de Ejecución Financiera

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO									
CONTRATO No.	001 DE 2025								
OBJETO	REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA BPIN: 20243218000001.								
CONTRATISTA	ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ								
SUPERVISOR	HECTOR ALEXANDER SUAZA PIMIENTA								
VALOR CONTRATO	$116.700.000,00 M/L								
VALOR ANTICIPO	**0**								
ITEM	**DESCRIPCION**		**MES 1**	**MES 2**	**MES 3**	**MES 4**	**MES 5**	**MES 6**	**TOTALES**
	PERSONAL PROFESIONAL	**SALARIO BASE/ DEDICACION**	**F.M. 1,95**	**F.M. 1,95**	**F.M. 1,95**	**F.M. 1,95**	**F.M. 1,95**	**F.M. 1**	
1,1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	$ 2.700.000	5.130.000	5.130.000					10.260.000
1,2	INGENIERO AMBIENTAL	$ 4.500.000	8.550.000	8.550.000					17.100.000
1,3	AUXILIAR ADMINISTARITIVO	$ 800.000	1.520.000	1.520.000					3.040.000
	VALOR		**15.200.000**	**15.200.000**					**30.400.000**
	Papeleria Para infórmenes		**550.000**	**550.000**					**1.100.000**
	Transporte y/o vehículo y mantenimiento incluye conductor		**3.865.875**	**3.865.875**					**7.731.750**
	Subtotal		**19.615.875**	**19.615.875**					**39.231.750**
	IVA (19%)		**3.727.016**	**3.727.016**					**7.454.032**
			23.342.891,25	**23.342.891,25**					**46.685.782,5**
			9.170.421,5625	**23.342.891,25**					**32.513.312,8125**

9. SOLICITUDES DE LA INTERVENTORÍA AL CONSULTOR DELCONTRATO 001 DE 2025.

Durante este periodo del 1 al 31 del mes de marzo de 2025, se hicieron varias recomendaciones en la parte técnica para la ejecución de las actividades procurando optimizar los recursos logísticos y financieros.

- Se reiteró al consultor hacer la entrega a la interventoría el cronograma mensual de actividades en los primeros cinco días del mes sin que esta tenga que solicitárselo y enviárselo a la supervisión de tal manera que esta programe las actividades correspondientes.

- Ejecutar las actividades lo más ajustadas al documento técnico y al cronograma de actividades.

- Se solicitó al contratista la seguridad social de los empleados y las pólizas de garantía.

Aprobado.

ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ.

Interventor

10. ANEXOS

- **Anexo 1.** Oficio al consultor solicitando cronograma de actividades para el periodo.
- **Anexo 6.** Solicitud de cumplimiento de cronograma del proyecto en Ejecución del Contrato de prestación de servicio N° **PS-001-2025.**
