MODIFICATORIO No. 6 AL CONTRATO DE OBRA No. 105-2023 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO CORDOBA Y DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS.

CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO CÓRDOBA.**
CONTRATISTA	**DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS**
VALOR INICIAL	**DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($ 2.249.293.254).**
VALOR CORREGIDO	**DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($2.249.290.254) M/CTE**
PLAZO INICIAL	**TRES (3) MESES**
PLAZO ACLARADO (SEGUN MODIFICATORIO #1)	**UN (1) MES**
PLAZO ADICIONAL 1 (MODIFICATORIO #3)	**VEINTIDOS (22) DIAS**
PLAZO ADICIONAL 2 (MODIFICATORIO #4)	**UN (1) MES Y DIEZ (10) DIAS**
PLAZO ADICIONAL 3 (MODIFICATORIO #5)	**DIECISÉIS (18) DÍAS**
PLAZO ADICIONAL 4 (MODIFICATORIO #6)	**DOS (2) MESES**
PLAZO TOTAL	**OCHO (8) MESES Y DOS (2) DIAS**
OBJETO	**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE CINTURA Y PUERTO SANTO ETAPA II, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.**

Entre los suscritos a saber: **OVIDIO MIGUEL HOYOS PATERNINA** mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No.70.549.037 expedida en Pueblo Nuevo, Córdoba, obrando en calidad de Alcalde de EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, mediante Acta de Posesión No. 001 de fecha 30 de diciembre de 2023, con facultades para celebrar contrato, que para efectos del presente contrato se denominará **EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO**, por una parte, y **DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS C.C. No. 72.236.745 De Barranquilla,** quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA** hemos convenido celebrar el presente Modificatorio No. 6 al contrato de obra No. 105-2023, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

CLAUSULA PRIMERA: Que entre **EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO** y **DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS C.C. No. 72.236.745 De Barranquilla**, suscribieron el contrato de obra No. 105-2023, cuyo objeto es **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE CINTURA Y PUERTO SANTO ETAPA II, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.** con un plazo de ejecución ampliado a TRES (3) MESES, tiempo corregido según modificatorio #1 quedando en una duración de CUATRO (4) MESES y valor ajustado de **DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS**

CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($2.249.290.254) M/CTE, el cual tuvo una adición N°1 en tiempo de veintidós (22) DIAS, una adición #2 en tiempo de UN (1) mes y DIEZ (10) días, una adición #3 en tiempo de Dieciocho (18) Días.

CLAUSULA SEGUNDA: Que el contratista solicito mediante oficio DEAC - 041 de 16 de febrero de 2024, la adición en tiempo de DOS (2) MESES más quedando un plazo total de OCHO (8) meses y DOS (2) días, donde se argumenta lo siguiente:

(...) Dando alcance al comunicado DEAC-034 del 22 de enero de 2024 mediante el cual se solicitó la prorroga No. 3 al contrato de obra manifestando que durante la ejecución del proyecto se han presentado diferentes afectaciones que han derivado en el atraso presentado hasta la fecha, entre los cuales se encuentran las siguientes:

• Mayor tiempo en la etapa de revisión y ajuste de los Estudios y Diseños entregados por el Municipio de Pueblo Nuevo.
• Inconvenientes por Orden Público (Ya superados) que impidieron iniciar las obras oportunamente.
• Dificultades para el suministro de materiales, como consecuencia de la lejana localización de los frentes de obra, y de las condiciones de la vía de acceso.
• En el frente de Puerto Santo, dadas las condiciones de las vías a intervenir, el contratista ha realizado varias recorridos de la mano de la interventoría con el fin de evaluar y determinar los tramos de vías a intervenir teniendo en cuenta que los anchos de las vías para este frente obra son bastante angostos y varían entre los 3 y 5m, imposibilitándose el ingreso de maquinaria mínima para la adecuación de las vías, dificultándose la ejecución de las actividades de excavación y conformación de capas granulares del pavimento.
• En puerto santo el contratista se ve obligado a cambiar el plan de acción que tenía contemplado para la fundida del concreto para el pavimento rígido, ya que inicialmente se tenía estipulado fundir con concreto premezclado para un mejor rendimiento y mayor avance en el desarrollo de la obra tal como se hizo en el frente de obra de cintura, pero dada la angostura de las vías el concreto deberá ser elaborado en obra con mezcladoras y diferentes cuadrillas para lograr un rendimiento óptimo que permita dar cumplimiento a esta actividad.
• En el frente de Puerto Santo, se deben realizar primero, relocalizaciones de tuberías del acueducto, para poder avanzar con el pavimento.
• Las Festividades de fin de año 2023 y comienzos de 2024, han afectado significativamente el avance de la obra dados los cierres de las canteras y empresas proveedoras de material en general.

Nos permitimos reiterar, que para el cumplimiento del 100% del objeto del contrato, el contratista necesita la ampliación del plazo de ejecución por un término dos (2) meses, por tanto, solicitamos ampliar el plazo del contrato de obra desde el día 27 de febrero de 2024 hasta el día 26 de abril de 2024 y de igual manera informamos que como contratistas se está trabajando en las contingencias a que haya lugar para tratar de minimizar el impacto en la ejecución de obra, pero ante los eventos atípicos presentados es evidente que se generara un retraso en los avances programados.

Por consiguiente y en verificación de los imprevistos que generan contratiempos durante la ejecución del proyecto; son circunstancias que fundan el presente requerimiento y dentro de los parámetros jurídicos y contractuales, requerimos atender la presente, en análisis de las circunstancias que atraviesa el contrato y la demanda de un tiempo superior al restante.

Ahora bien, es importante resaltar que, de acuerdo con los ajustes realizados y los comités técnicos realizados de la mano de la interventoría, se evidencio que la meta física del proyecto aumento en un 19%, lo que indica

una optimización del recurso y un mayor tiempo para llevar a buen término el objeto del contrato. De esta manera informamos que nos encontramos adelantando cada una de las actividades relacionadas en el presupuesto contratado, específicamente en el frente de obra de puerto santo, donde se encuentra realizando actividades de instalación de tuberías de acueducto, mejoramiento de subrasante con piedra rajón, instalación de geotextil, colocación, extendido y compactación de material de mejoramiento (terraplén) y de subbase, instalación de bordillos, fundida de vigas de confinamiento y anden como se evidencia a continuación: (…)

(SUBRAYADO FUERA DE TEXTO)

CLAUSULA TERCERA: Que el INTERVENTOR del proyecto mediante oficio CVR-1210-2024 de cuatro (4) de abril de 2024 Emite el siguiente concepto sobre la solicitud de prórroga #4 para el contrato 105 de 2023:

Evaluada la solicitud de prórroga No.04, presentada por DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS, Contratista de Obra del contrato de la referencia; hecha mediante comunicado OFICIO DEAC-041, con el fin de lograr ampliación de plazo por DOS (02) MESES; La Interventoría recomienda al Municipio de Pueblo Nuevo, aprobar la prórroga solicitada por DOS MESES, a partir del 06 de abril de 2024 hasta el 05 de junio de 2024. Nuestro aval se da, con el objetivo de terminar a satisfacción el 100% de las obras contempladas dentro del alcance y presupuesto actualizado del contrato y, de cumplir con el fin social del proyecto, con base en las siguientes consideraciones:

Que, mediante comunicado OFICIO DEAC-041, el Contratista de obra solicitó prórroga No.04, al contrato de obra No.105-2023, por DOS (02) MESES, prórroga que avalamos por este plazo y hasta el 05 de junio de 2024, considerando que, el contrato de obra fue suspendido del 26 de febrero de 2024 al 04 de abril de 2024, y que la actual fecha de terminación del contrato es el 05 de abril de 2024. Así las cosas, la prórroga 04, es avalada por la Interventoría, mediante el presente comunicado, justificada en las necesidades del proyecto, con el fin de cumplir con el alcance y demás condiciones contractuales, en procura del beneficio socio-económico de las Comunidades de los Corregimientos de Cintura y Puerto Santo.

Que, el contrato de Interventoría Invias No. 2273 de 2021, fue reiniciado a partir del 04 de abril de 2024, y se encuentra vigente con fecha de terminación del 10 de junio de 2024 y, por tanto, de otorgarse la prórroga No.04 al contrato de obra, cuenta con los recursos y plazo para realizar el seguimiento y control al contrato de obra derivado No.105-2023.

Que, el Convenio Interadministrativo No.992 de 2021 "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DEPARTAMENTO DE CORDOBA-COLOMBIA RURAL". suscrito entre el Municipio de Pueblo Nuevo y el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, se encuentra vigente, con fecha de terminación del 31 de diciembre de 2024.

Que, el Contratista, debe tomar las medidas necesarias para garantizar la terminación de las obras dentro del nuevo plazo de ejecución.

Que, el Contratista, debe presentar a más tardar el 11 de abril de 2024, la reprogramación de obra e inversiones, y el flujo de caja, ajustados para el periodo del 06 de abril de 2024 al 5 de junio de 2024, documentos que deberán ser aprobados por las partes.

Que, con base en lo expuesto en este comunicado, es viable la prórroga solicitada por el Contratista de Obra, DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS, teniendo en cuenta que, dicha solicitud se encuentra soportada en el estatuto de contratación estatal, que el contrato se encuentra vigente y que se requiere para ejecutar en su totalidad el alcance contractual; cumpliéndose así con la misión de la Entidad Contratante, la satisfacción del interés general y los fines del estado.

(SUBRAYADO FUERA DE TEXTO)

CLAUSULA CUARTA: Que el supervisor del contrato avala la prórroga solicitada de la siguiente manera:

1. RECOMENDACIÓN TÈCNICA

En este documento se presenta el Concepto Técnico sobre la necesidad de realizar prorroga No.4 al Contrato de obra N°105-2023, suscrito entre el Municipio de **PUEBLO NUEVO CÒRDOBA Y DAVERLIS ELÍAS ARRIETA CÁRDENAS** con cedula de ciudadanía 72.236.745 de Barranquilla, en calidad de Contratista.

1. RECOMENDACIÓNES ESPECIFICAS

Que debido a la solicitud mediante oficio DEAC-041 del contratista de fecha 16 de febrero de 2024 y oficio de interventoría CVR 1210-2024 de fecha 04 de abril de 2024, los cuales solicitan una Prórroga al contrato de la referencia por los siguientes motivos:

- Mayor tiempo en la etapa de revisión y ajuste de los Estudios y Diseños entregados por el Municipio de Pueblo Nuevo.
- Inconvenientes por Orden Público (Ya superados) que impidieron iniciar las obras oportunamente.
- Dificultades para el suministro de materiales, como consecuencia de la lejana localización de los frentes de obra, y de las condiciones de la vía de acceso.
- En el frente de Puerto Santo, dadas las condiciones de las vías a intervenir, el contratista ha realizado varias recorridos de la mano de la interventoría con el fin de evaluar y determinar los tramos de vías a intervenir teniendo en cuenta que los anchos de las vías para este frente obra son bastante angostos y varían entre los 3 y 5m, imposibilitándose el ingreso de maquinaria mínima para la adecuación de las vías, dificultándose la ejecución de las actividades de excavación y conformación de capas granulares del pavimento.
- En puerto santo el contratista se ve obligado a cambiar el plan de acción que tenía contemplado para la fundida del concreto para el pavimento rígido, ya que inicialmente se tenía estipulado fundir con concreto premezclado para un mejor rendimiento y mayor avance en el desarrollo de la obra tal como se hizo en el frente de obra de cintura, pero dada la angostura de las vías el concreto deberá ser elaborado en obra con mezcladoras y diferentes cuadrillas para lograr un rendimiento óptimo que permita dar cumplimiento a esta actividad.

- En el frente de Puerto Santo, se deben realizar primero, relocalizaciones de tuberías del acueducto, para poder avanzar con el pavimento.
- Las Festividades de fin de año 2023 y comienzos de 2024, han afectado significativamente el avance de la obra dados los cierres de las canteras y empresas proveedoras de material en general.

Además, nos acogemos en la aprobación dada por la interventoría mediante el radicado CVR-1210-2024, la cual expresa que:

"Evaluada la solicitud de prórroga No.04, presentada por DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS, Contratista de Obra del contrato de la referencia; hecha mediante comunicado OFICIO DEAC-041, con el fin de lograr ampliación de plazo por DOS (02) MESES; La Interventoría recomienda al Municipio de Pueblo Nuevo, aprobar la prórroga solicitada por DOS MESES, a partir del 06 de abril de 2024 hasta el 05 de junio de 2024. Nuestro aval se da, con el objetivo de terminar a satisfacción el 100% de las obras contempladas dentro del alcance y presupuesto actualizado del contrato y, de cumplir con el fin social del proyecto, con base en las siguientes consideraciones:

Que, mediante comunicado OFICIO DEAC-041, el Contratista de obra solicitó prórroga No.04, al contrato de obra No.105-2023, por DOS (02) MESES, prórroga que avalamos por este plazo y hasta el 05 de junio de 2024, considerando que, el contrato de obra fue suspendido del 26 de febrero de 2024 al 04 de abril de 2024, y que la actual fecha de terminación del contrato es el 05 de abril de 2024. Así las cosas, la prórroga 04, es avalada por la Interventoría, mediante el presente comunicado, justificada en las necesidades del proyecto, con el fin de cumplir con el alcance y demás condiciones contractuales, en procura del beneficio socio-económico de las Comunidades de los Corregimientos de Cintura y Puerto Santo.

Que, el contrato de Interventoría Invias No. 2273 de 2021, fue reiniciado a partir del 04 de abril de 2024, y se encuentra vigente con fecha de terminación del 10 de junio de 2024 y, por tanto, de otorgarse la prórroga No.04 al contrato de obra, cuenta con los recursos y plazo para realizar el seguimiento y control al contrato de obra derivado No.105-2023.

Que, el Convenio Interadministrativo No.992 de 2021 "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DEPARTAMENTO DE CORDOBA-COLOMBIA RURAL". suscrito entre el Municipio de Pueblo Nuevo y el Instituto Nacional de Vías -INVIAS, se encuentra vigente, con fecha de terminación del 31 de diciembre de 2024.

Que, el Contratista, debe tomar las medidas necesarias para garantizar la terminación de las obras dentro del nuevo plazo de ejecución.

Que, el Contratista, debe presentar a más tardar el 11 de abril de 2024, la reprogramación de obra e inversiones, y el flujo de caja, ajustados para el periodo del 06 de abril de 2024 al 5 de junio de 2024, documentos que deberán ser aprobados por las partes.

Que, con base en lo expuesto en este comunicado, es viable la prórroga solicitada por el Contratista de Obra, DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS, teniendo en cuenta que, dicha solicitud se encuentra soportada en el estatuto de contratación estatal, que el contrato se encuentra vigente y que se requiere para ejecutar en su totalidad el alcance contractual; cumpliéndose así con la misión de la Entidad Contratante, la satisfacción del interés general y los fines del estado."

La presente supervisión del contrato en mención, en atención a la solicitud realizada y revisando todos los argumentos técnicos abonados, y considerando los limitantes del contrato de interventoría, AVALA la Prórroga No. 4 a partir del 06 de abril de 2024 hasta el 05 de junio de 2024 (2 meses) al Contrato de Obra No. 105 DE 2023 que tiene por objeto "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE CINTURA Y PUERTO SANTO ETAPA II, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, tiempo que se estima suficiente para culminar las obligaciones pendientes del contratista de obra y lograr los fines perseguidos por la contratación.

(SUBRAYADO FUERA DE TEXTO)

Que, por lo anteriormente expuesto, las partes **CONVIENEN:**

CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la cláusula cuarta del contrato 105-2023, la cual a partir de la fecha quedara así: **CLAUSULA CUARTA. PLAZO DEL CONTRATO**. El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de ocho (8) meses y dos (2) días, contados a partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones. **CLAUSULA SEGUNDA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN**: El presente modificatorio se considera perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes. **CLÁUSULA TERCERA**: **VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES PRIMIGENIAS**: Todas las cláusulas y parágrafos del Contrato primigenio, que no sean afectadas por este acuerdo de voluntades, continúan vigentes. **CLÁUSULA CUARTA**: El contratista deberá ampliar las garantías en la misma aseguradora que la expidió.

Para constancia se firma en Pueblo Nuevo, a los CUATRO (4) días del mes de abril de 2024.

OVIDIO MIGUEL HOYOS PATERNINA
Alcalde Municipal

DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS
C.C.No. 72.236.745 De Barranquilla.
Contratista

Proyectó: RA ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S. - Contratista Externo

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: +0Acqd0CKGz7oPvfLA2k4g==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSRR000000027-D00I

No. PÓLIZA	CMT-100001775	**No. ANEXO**	8	**No. CERTIFICADO**	489021894	**No. RIESGO**	
TIPO DE DOCUMENTO				**FECHA DE EXPEDICIÓN**	10/04/2024	**SUC. EXPEDIDORA**	CEN MONTERIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	14/07/2023	24:00 Horas Del	08/06/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	ARRIETA CARDENAS, DABERLIS	**No. DOC. IDENTIDAD**	72.236.745
DIRECCIÓN	CR 45 27 BRR VILLA CARIBE	**TELÉFONO**	3213023037
ASEGURADO	ARRIETA CARDENAS, DABERLIS	**No. DOC. IDENTIDAD**	72.236.745
DIRECCIÓN	CR 45 27 BRR VILLA CARIBE	**TELÉFONO**	3213023037
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE DE ACUERDO AL MODIFICATORIO N° 6 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2024, SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA POR DOS (2) MESES MAS. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODFICADOS PERMANECEN IGUAL.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.105-2023 , CUYO OBJETO ES

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE CINTURA Y PUERTO SANTO ETAPA II, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIA COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA DABERLIS ARRIETA CARDENAS, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIA BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	174.000.000,00	348.000.000,00	348.000.000,00	174.476,71
PATRONAL	104.400.000,00	104.400.000,00	104.400.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	104.400.000,00	104.400.000,00	104.400.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	104.400.000,00	104.400.000,00	104.400.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 348.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
MIGUEL ANTONIO VASQUEZ FLOREZ	AGENTES	100,00

PRIMA BRUTA	$	174.476,71
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	174.476,71
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	33.150,57
TOTAL A PAGAR	$	207.627,28

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 10/04/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	CMT-100001775	No. ANEXO	8	No. CERTIFICADO	489021894	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	10/04/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN MONTERIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	14/07/2023	24:00 Horas Del	08/06/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

TENDRÁ A MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIA COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	489021894

Fecha de Facturación	10/04/2024
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
Póliza No.	CMT-100001775
Periodo Facturado	14/07/2023 — 08/06/2024

Fecha Límite de Pago	10/05/2024
Prima (incluye gastos de expedición)	174.476,71
IVA	33.150,57
VALOR TOTAL A PAGAR $	207.627,28

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	ARRIETA CARDENAS, DABERLIS
CR 45 27 BRR VILLA CARIBE	72236745
Intermediario	MIGUEL ANTONIO VASQUEZ FLOREZ

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

ESPACIO PARA EL TIMBRE

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **10/05/2024** se aplicara la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la poliza y en la caratula de esta (artículo 1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7**, al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra pagina web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continue el proceso de pago.

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	489021894

Fecha de Facturación	10/04/2024
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
Póliza No.	CMT-100001775
Periodo Facturado	14/07/2023 — 08/06/2024

Fecha Límite de Pago	10/05/2024
Prima (incluye gastos de expedición)	174.476,71
IVA	33.150,57
VALOR TOTAL A PAGAR $	207.627,28

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	ARRIETA CARDENAS, DABERLIS
CR 45 27 BRR VILLA CARIBE	72236745
Intermediario	MIGUEL ANTONIO VASQUEZ FLOREZ

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)000004890218 94(3900)000000207627(96)20240510

Bancos Corresponsales OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)229904890218 94(3900)000000207627(96)20240510

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago · Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored
Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre

RESOLUCIÓN N ° 096 R.A.G.
(abril 09 de 2024)

POR LA CUAL SE APRUEBA UNA GARANTÍA

LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO CORDOBA, en uso de sus facultades legales y en especial las consignadas en la Ley 80/93 y,

CONSIDERANDO:

Que, la señora **DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS** identificada con la cedula de ciudadanía número 72.236.745 de Barranquilla, suscribió contrato No 105-2023 con el Municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba, por un valor de **DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($2.249.290.254) MCTE.** Que tiene como objeto **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE CINTURA Y PUERTO SANTO ETAPA II MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".**

Que, se actualizaron vigencias de la póliza de acuerdo al modificatorio No 6 de fecha 04 de abril de 2024, por dos (2) meses más, las demás términos y condiciones no modificados permanecen igual.

Que, la señora **DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS** identificada con la cedula de ciudadanía número 72.236.745 de Barranquilla, aportó Póliza y/o garantía de **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL** N° CMT-100001775 de fecha 10/04/2024 de la compañía Aseguradora Seguros Mundial Nit 860037013-6 por los siguientes amparos:

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia Desde d-m-a	Vigencia Hasta d-m-a
Básico – Predios, Labores y operaciones.	$348.000.000,00	14-07-2023	08-06-2024
Patronal	$104.400.000,00	14-07-2023	08-06-2024

Contratista y subcontratista	$104.400.000,00	14-07-2023	08-06-2024
Vehículos propios y no propios	$104.400.000,00	14-07-2023	08-06-2024

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Aprobar La Póliza y/o garantía de **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL** N ° CMT-100001775 de fecha 10/04/2024 de la compañía Aseguradora Seguros Mundial Nit 860037013-6, expedida a favor de El Municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba NIT 800.096.766-7 e Instituto Nacional de Vias – INVIAS, tomada por la señora **DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS** identificada con la cedula de ciudadanía número 72.236.745 de Barranquilla, y en cumplimiento a lo establecido en el decreto reglamentario 679 de 1994, decreto 1082 de 2015, y por estar ajustada a lo estipulado en el contrato.

ARTICULO SEGUNDO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición.

Dado en Pueblo Nuevo, Córdoba, a los diez (10) días del mes de abril de Dos Mil Veinticuatro (2.024).

DELCY MILENA ALVAREZ ALVAREZ
Secretaria de Gobierno Municipal

Proyecto: Jaime Martinez – Asesor Juridico Externo – área de contratación.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: Ams+mf8GPvaWc4wyVxk4aw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CMT-100007849	No. ANEXO	8	No. CERTIFICADO	489021893	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	10/04/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN MONTERIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	14/07/2023	24:00 Horas Del	08/06/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	ARRIETA CARDENAS, DABERLIS	**No. DOC. IDENTIDAD**	72.236.745
DIRECCIÓN	CR 45 27 BRR VILLA CARIBE	**TELÉFONO**	3213023037
ASEGURADO	MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.096.766-7
DIRECCIÓN	CRA 9 11 85	**TELÉFONO**	3135323291
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.096.766-7
DIRECCIÓN	CRA 9 11 85	**TELÉFONO**	3135323291

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE DE ACUERDO AL MODIFICATORIO N° 6 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2024, SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA POR DOS (2) MESES MAS. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODFICADOS PERMANECEN IGUAL.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE DE ACUERDO AL ACTA DE SUSPENSION N 1 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2024 Y ACTA DE REINICIO N 1 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2024. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS PERMANECEN IGUAL.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE DE ACUERDO AL MODIFICATORIO N° 5 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2024, SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS PERMANECEN IGUAL.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE DE ACUERDO AL MODIFICAORIO N° 4 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, SE

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 10/08/2023	24:00 Horas Del 08/10/2024	224.929.025,40	93.977,20
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 10/08/2023	24:00 Horas Del 08/06/2027	112.464.512,70	46.988,60
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 10/12/2023	24:00 Horas Del 10/12/2028	224.929.025,40	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 562.322.563,50	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
MIGUEL ANTONIO VASQUEZ FLOREZ	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	140.965,80
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	140.965,80
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	26.783,50
TOTAL A PAGAR	$	167.749,30

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 10/04/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

Daberlis Arrieta C
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CMT-100007849	No. ANEXO	8	No. CERTIFICADO	489021893	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	10/04/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN MONTERIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	14/07/2023	24:00 Horas Del	08/06/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

PRORROGA LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS PERMANECEN IGUAL.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE DE ACUERDO AL MODIFICATORIO N° 3 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2023, SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS PERMANECEN IGUAL
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.105-2023 , CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE CINTURA Y PUERTO SANTO ETAPA II, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD SERA DE CINCO (5) AÑOS CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LA OBRA.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CMT-100007849** y endoso, **8** cuyo afianzado es: **ARRIETA CARDENAS, DABERLIS** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS / MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS** , expedida por la Compañía en **10/04/2024**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN MONTERIA a los **10** días del mes **ABRIL** del año **2024**.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	489021893

Fecha de Facturación	10/04/2024
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	
Póliza No.	CMT–100007849
Periodo Facturado	14/07/2023 — 08/06/2029

Fecha Límite de Pago	10/05/2024
Prima (incluye gastos de expedición)	140.965,80
IVA	26.783,50
VALOR TOTAL A PAGAR $	167.749,30

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	ARRIETA CARDENAS, DABERLIS
CR 45 27 BRR VILLA CARIBE	72236745
Intermediario	MIGUEL ANTONIO VASQUEZ FLOREZ

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

ESPACIO PARA EL TIMBRE

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **10/05/2024** se aplicara la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la poliza y en la caratula de esta (artículo 1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7**, al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el arriculo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continue el proceso de pago.

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	489021893

Fecha de Facturación	10/04/2024
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	
Póliza No.	CMT–100007849
Periodo Facturado	14/07/2023 — 08/06/2029

Fecha Límite de Pago	10/05/2024
Prima (incluye gastos de expedición)	140.965,80
IVA	26.783,50
VALOR TOTAL A PAGAR $	167.749,30

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	ARRIETA CARDENAS, DABERLIS
CR 45 27 BRR VILLA CARIBE	72236745
Intermediario	MIGUEL ANTONIO VASQUEZ FLOREZ

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)000004890218 93(3900)000000167749(96)20240510

Bancos Corresponsales OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990489021893(3900)000000167749(96)20240510

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago · Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored
Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre

RESOLUCIÓN N ° 097 R.A.G.
(abril 10 de 2024)

POR LA CUAL SE APRUEBA UNA GARANTÍA

LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO CORDOBA, en uso de sus facultades legales y en especial las consignadas en la Ley 80/93 y,

CONSIDERANDO:

Que, la señora **DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS** identificada con la cedula de ciudadanía número 72.236.745 de Barranquilla, suscribió contrato de obra No 105-2023, con el Municipio de Pueblo Nuevo - Córdoba, por un valor de **DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($2.249.290.254) MCTE.** Que tiene como objeto **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE CINTURA Y PUERTO SANTO ETAPA II MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".**

Que, se actualizaron vigencias de la póliza de acuerdo al modificatorio No 6 de fecha 04 de abril de 2024, por dos (2) meses más, las demás términos y condiciones no modificados permanecen igual.

Que, la señora **DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS** identificada con la cedula de ciudadanía número 72.236.745 de Barranquilla, aportó Póliza y/o **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO** N ° CMT-100007849 de fecha 10/04/2024 de la compañía Aseguradora Seguros Mundial Nit 860037013-6 por los siguientes amparos:

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia Desde d-m-a	Vigencia Hasta d-m-a
Cumplimiento del contrato	$ 224.929.025,40	10-08-2023	08-10-2024
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$112.464.512,70	10-08-2023	08-06-2027
Estabilidad de la obra	$ 224.929.025,40	10-12-2023	10-12-2028

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Aprobar La Póliza y/o **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO** N ° CMT-100007849 de fecha 10/04/2024 de la compañía Aseguradora Seguros Mundial Nit 860037013-6, expedida a favor de El Municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba NIT 800.096.766-7 y la Instituto Nacional de Vias – INVIAS, tomada por la señora **DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS** identificada con la cedula de ciudadanía número 72.236.745 de Barranquilla, y en cumplimiento a lo establecido en el decreto reglamentario 679 de 1994, decreto 1082 de 2015, y por estar ajustada a lo estipulado en el contrato.

ARTICULO SEGUNDO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición.

Dado en Pueblo Nuevo, Córdoba, a los diez (10) días del mes de abril de Dos Mil Veinticuatro (2.024).

DELCY MILENA ALVAREZ ALVAREZ
Secretaria de Gobierno Municipal

Proyecto: Jaime Martinez – Asesor Jurídico Externo – área de contratación.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: +0Acqd0CKGz7oPvfLA2k4g==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUSRR000000027-D00I

No. PÓLIZA	CMT-100001775	**No. ANEXO**	8	**No. CERTIFICADO**	489021894	**No. RIESGO**	
TIPO DE DOCUMENTO				**FECHA DE EXPEDICIÓN**	10/04/2024	**SUC. EXPEDIDORA**	CEN MONTERIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	14/07/2023	24:00 Horas Del	08/06/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	ARRIETA CARDENAS, DABERLIS	**No. DOC. IDENTIDAD**	72.236.745
DIRECCIÓN	CR 45 27 BRR VILLA CARIBE	**TELÉFONO**	3213023037
ASEGURADO	ARRIETA CARDENAS, DABERLIS	**No. DOC. IDENTIDAD**	72.236.745
DIRECCIÓN	CR 45 27 BRR VILLA CARIBE	**TELÉFONO**	3213023037
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN	.	**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE DE ACUERDO AL MODIFICATORIO N° 6 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2024, SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA POR DOS (2) MESES MAS. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODFICADOS PERMANECEN IGUAL.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.105-2023 , CUYO OBJETO ES

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE CINTURA Y PUERTO SANTO ETAPA II, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIA COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA DABERLIS ARRIETA CARDENAS, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIA BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	174.000.000,00	348.000.000,00	348.000.000,00	174.476,71
PATRONAL	104.400.000,00	104.400.000,00	104.400.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	104.400.000,00	104.400.000,00	104.400.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	104.400.000,00	104.400.000,00	104.400.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 348.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
MIGUEL ANTONIO VASQUEZ FLOREZ	AGENTES	100,00

PRIMA BRUTA	$	174.476,71
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	174.476,71
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	33.150,57
TOTAL A PAGAR	$	207.627,28

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 10/04/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	CMT-100001775	No. ANEXO	8	No. CERTIFICADO	489021894	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	10/04/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN MONTERIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	14/07/2023	24:00 Horas Del	08/06/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

TENDRÁ A MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIA COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	489021894

Fecha de Facturación	10/04/2024
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
Póliza No.	CMT-100001775
Periodo Facturado	14/07/2023 — 08/06/2024

Fecha Límite de Pago	10/05/2024
Prima (incluye gastos de expedición)	174.476,71
IVA	33.150,57
VALOR TOTAL A PAGAR $	207.627,28

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	ARRIETA CARDENAS, DABERLIS
CR 45 27 BRR VILLA CARIBE	72236745
Intermediario	MIGUEL ANTONIO VASQUEZ FLOREZ

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

ESPACIO PARA EL TIMBRE

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **10/05/2024** se aplicara la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la poliza y en la caratula de esta (artículo 1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7**, al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra pagina web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continue el proceso de pago.

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	489021894

Fecha de Facturación	10/04/2024
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
Póliza No.	CMT-100001775
Periodo Facturado	14/07/2023 — 08/06/2024

Fecha Límite de Pago	10/05/2024
Prima (incluye gastos de expedición)	174.476,71
IVA	33.150,57
VALOR TOTAL A PAGAR $	207.627,28

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	ARRIETA CARDENAS, DABERLIS
CR 45 27 BRR VILLA CARIBE	72236745
Intermediario	MIGUEL ANTONIO VASQUEZ FLOREZ

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)000004890218 94(3900)000000207627(96)20240510

Bancos Corresponsales OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)229904890218 94(3900)000000207627(96)20240510

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago · Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored
Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre

RESOLUCIÓN N ° 096 R.A.G.
(abril 09 de 2024)

POR LA CUAL SE APRUEBA UNA GARANTÍA

LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO CORDOBA, en uso de sus facultades legales y en especial las consignadas en la Ley 80/93 y,

CONSIDERANDO:

Que, la señora **DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS** identificada con la cedula de ciudadanía número 72.236.745 de Barranquilla, suscribió contrato No 105-2023 con el Municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba, por un valor de **DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($2.249.290.254) MCTE.** Que tiene como objeto **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE CINTURA Y PUERTO SANTO ETAPA II MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".**

Que, se actualizaron vigencias de la póliza de acuerdo al modificatorio No 6 de fecha 04 de abril de 2024, por dos (2) meses más, las demás términos y condiciones no modificados permanecen igual.

Que, la señora **DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS** identificada con la cedula de ciudadanía número 72.236.745 de Barranquilla, aportó Póliza y/o garantía de **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL** N° CMT-100001775 de fecha 10/04/2024 de la compañía Aseguradora Seguros Mundial Nit 860037013-6 por los siguientes amparos:

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia Desde d-m-a	Vigencia Hasta d-m-a
Básico – Predios, Labores y operaciones.	$348.000.000,00	14-07-2023	08-06-2024
Patronal	$104.400.000,00	14-07-2023	08-06-2024

Contratista y subcontratista	$104.400.000,00	14-07-2023	08-06-2024
Vehículos propios y no propios	$104.400.000,00	14-07-2023	08-06-2024

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Aprobar La Póliza y/o garantía de **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL** N ° CMT-100001775 de fecha 10/04/2024 de la compañía Aseguradora Seguros Mundial Nit 860037013-6, expedida a favor de El Municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba NIT 800.096.766-7 e Instituto Nacional de Vias – INVIAS, tomada por la señora **DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS** identificada con la cedula de ciudadanía número 72.236.745 de Barranquilla, y en cumplimiento a lo establecido en el decreto reglamentario 679 de 1994, decreto 1082 de 2015, y por estar ajustada a lo estipulado en el contrato.

ARTICULO SEGUNDO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición.

Dado en Pueblo Nuevo, Córdoba, a los diez (10) días del mes de abril de Dos Mil Veinticuatro (2.024).

DELCY MILENA ALVAREZ ALVAREZ
Secretaria de Gobierno Municipal

Proyecto: Jaime Martinez – Asesor Juridico Externo – área de contratación.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: Ams+mf8GPvaWc4wyVxk4aw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CMT-100007849	No. ANEXO	8	No. CERTIFICADO	489021893	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	10/04/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN MONTERIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	14/07/2023	24:00 Horas Del	08/06/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	ARRIETA CARDENAS, DABERLIS	**No. DOC. IDENTIDAD**	72.236.745
DIRECCIÓN	CR 45 27 BRR VILLA CARIBE	**TELÉFONO**	3213023037
ASEGURADO	MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.096.766-7
DIRECCIÓN	CRA 9 11 85	**TELÉFONO**	3135323291
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.096.766-7
DIRECCIÓN	CRA 9 11 85	**TELÉFONO**	3135323291

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE DE ACUERDO AL MODIFICATORIO N° 6 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2024, SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA POR DOS (2) MESES MAS. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODFICADOS PERMANECEN IGUAL.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE DE ACUERDO AL ACTA DE SUSPENSION N 1 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2024 Y ACTA DE REINICIO N 1 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2024. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS PERMANECEN IGUAL.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE DE ACUERDO AL MODIFICATORIO N° 5 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2024, SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS PERMANECEN IGUAL.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE DE ACUERDO AL MODIFICAORIO N° 4 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, SE

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 10/08/2023	24:00 Horas Del 08/10/2024	224.929.025,40	93.977,20
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 10/08/2023	24:00 Horas Del 08/06/2027	112.464.512,70	46.988,60
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 10/12/2023	24:00 Horas Del 10/12/2028	224.929.025,40	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 562.322.563,50	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
MIGUEL ANTONIO VASQUEZ FLOREZ	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	140.965,80
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	140.965,80
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	26.783,50
TOTAL A PAGAR	$	167.749,30

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 10/04/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

Daberlis Arrieta C
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CMT-100007849	No. ANEXO	8	No. CERTIFICADO	489021893	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	10/04/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN MONTERIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	14/07/2023	24:00 Horas Del	08/06/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

PRORROGA LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS PERMANECEN IGUAL.

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE DE ACUERDO AL MODIFICATORIO N° 3 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2023, SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS PERMANECEN IGUAL
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.105-2023 , CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE CINTURA Y PUERTO SANTO ETAPA II, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD SERA DE CINCO (5) AÑOS CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LA OBRA.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CMT-100007849** y endoso, **8** cuyo afianzado es: **ARRIETA CARDENAS, DABERLIS** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS / MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS** , expedida por la Compañía en **10/04/2024**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN MONTERIA a los **10** días del mes **ABRIL** del año **2024**.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	489021893

Fecha de Facturación	10/04/2024
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	
Póliza No.	CMT–100007849
Periodo Facturado	14/07/2023 — 08/06/2029

Fecha Límite de Pago	10/05/2024
Prima (incluye gastos de expedición)	140.965,80
IVA	26.783,50
VALOR TOTAL A PAGAR $	167.749,30

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	ARRIETA CARDENAS, DABERLIS
CR 45 27 BRR VILLA CARIBE	72236745
Intermediario	MIGUEL ANTONIO VASQUEZ FLOREZ

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

ESPACIO PARA EL TIMBRE

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **10/05/2024** se aplicara la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la poliza y en la caratula de esta (artículo 1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7**, al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el arriculo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continue el proceso de pago.

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	489021893

Fecha de Facturación	10/04/2024
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	
Póliza No.	CMT–100007849
Periodo Facturado	14/07/2023 — 08/06/2029

Fecha Límite de Pago	10/05/2024
Prima (incluye gastos de expedición)	140.965,80
IVA	26.783,50
VALOR TOTAL A PAGAR $	167.749,30

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	ARRIETA CARDENAS, DABERLIS
CR 45 27 BRR VILLA CARIBE	72236745
Intermediario	MIGUEL ANTONIO VASQUEZ FLOREZ

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)000004890218 93(3900)000000167749(96)20240510

Bancos Corresponsales OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990489021893(3900)000000167749(96)20240510

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago · Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored
Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre

RESOLUCIÓN N ° 097 R.A.G.
(abril 10 de 2024)

POR LA CUAL SE APRUEBA UNA GARANTÍA

LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO CORDOBA, en uso de sus facultades legales y en especial las consignadas en la Ley 80/93 y,

CONSIDERANDO:

Que, la señora **DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS** identificada con la cedula de ciudadanía número 72.236.745 de Barranquilla, suscribió contrato de obra No 105-2023, con el Municipio de Pueblo Nuevo - Córdoba, por un valor de **DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($2.249.290.254) MCTE.** Que tiene como objeto **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE CINTURA Y PUERTO SANTO ETAPA II MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".**

Que, se actualizaron vigencias de la póliza de acuerdo al modificatorio No 6 de fecha 04 de abril de 2024, por dos (2) meses más, las demás términos y condiciones no modificados permanecen igual.

Que, la señora **DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS** identificada con la cedula de ciudadanía número 72.236.745 de Barranquilla, aportó Póliza y/o **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO** N ° CMT-100007849 de fecha 10/04/2024 de la compañía Aseguradora Seguros Mundial Nit 860037013-6 por los siguientes amparos:

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia Desde d-m-a	Vigencia Hasta d-m-a
Cumplimiento del contrato	$ 224.929.025,40	10-08-2023	08-10-2024
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$112.464.512,70	10-08-2023	08-06-2027
Estabilidad de la obra	$ 224.929.025,40	10-12-2023	10-12-2028

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Aprobar La Póliza y/o **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO** N ° CMT-100007849 de fecha 10/04/2024 de la compañía Aseguradora Seguros Mundial Nit 860037013-6, expedida a favor de El Municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba NIT 800.096.766-7 y la Instituto Nacional de Vias – INVIAS, tomada por la señora **DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS** identificada con la cedula de ciudadanía número 72.236.745 de Barranquilla, y en cumplimiento a lo establecido en el decreto reglamentario 679 de 1994, decreto 1082 de 2015, y por estar ajustada a lo estipulado en el contrato.

ARTICULO SEGUNDO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición.

Dado en Pueblo Nuevo, Córdoba, a los diez (10) días del mes de abril de Dos Mil Veinticuatro (2.024).

DELCY MILENA ALVAREZ ALVAREZ
Secretaria de Gobierno Municipal

Proyecto: Jaime Martinez – Asesor Jurídico Externo – área de contratación.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: jptUMz3vnGkDSeIclAqOTA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2B55600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-000I

No. PÓLIZA	CMT-100007849	No. ANEXO	9	No. CERTIFICADO	489023736	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	25/06/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN MONTERIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	14/07/2023	24:00 Horas Del	09/06/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	ARRIETA CARDENAS, DABERLIS	**No. DOC. IDENTIDAD**	72.236.745
DIRECCIÓN	CR 45 27 BRR VILLA CARIBE	**TELÉFONO**	3213023037
ASEGURADO	MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.096.766-7
DIRECCIÓN	CRA 9 11 85	**TELÉFONO**	3135323291
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.096.766-7
DIRECCIÓN	CRA 9 11 85	**TELÉFONO**	3135323291

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO FINAL DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2024, SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

DESDE: 05/06/2024 HASTA: 05/06/2029.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.105-2023 , CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE CINTURA Y PUERTO SANTO ETAPA II, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD SERA DE CINCO (5) AÑOS CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 10/08/2023	24:00 Horas Del 08/10/2024	224.929.025,40	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 10/08/2023	24:00 Horas Del 08/06/2027	112.464.512,70	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 05/06/2024	24:00 Horas Del 05/06/2029	224.929.025,40	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 562.322.563,50	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
MIGUEL ANTONIO VASQUEZ FLOREZ	AGENTES	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 25/06/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

Daberlis Arrieta C.
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CMT-100007849	No. ANEXO	9	No. CERTIFICADO	489023736	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	25/06/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN MONTERIA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	14/07/2023	24:00 Horas Del	09/06/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

DE LA OBRA.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF Asociación Panamericana de Fianzas Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CMT-100007849** y endoso, **9** cuyo afianzado es: **ARRIETA CARDENAS, DABERLIS** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS / MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO E INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS** , expedida por la Compañia en **25/06/2024**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN MONTERIA a los **25** días del mes **JUNIO** del año **2024**.

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

RESOLUCIÓN N ° 185 R.A.G.
(junio 25 de 2024)

POR LA CUAL SE APRUEBA UNA GARANTÍA

LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO CORDOBA, en uso de sus facultades legales y en especial las consignadas en la Ley 80/93 y,

CONSIDERANDO:

Que, **DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS** identificada con C.C. No 72.236.745 de Barranquilla, suscribió contrato No-105-2024 con el Municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba, por un valor de **DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($2.249.290.254) MCTE. Que tiene como objeto "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE CINTURA Y PUERTO SANTO ETAPA II MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".**

Que, mediante el presente anexo # 9 de la póliza número ***CMT-100007849*** *de la compañía* ***Aseguradora Seguros Mundial Nit 860037013-6***, se actualiza la vigencia del amparo de estabilidad de la obra del contrato # 105-2023, de acuerdo al acta final de fecha 05 de junio de 2024.

Que, **DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS** identificada con C.C. No 72.236.745 de Barranquilla**,** aportó anexo 9 de la Póliza y/o ***garantía de cumplimiento No CMT-100007849*** *de la compañía* ***Aseguradora Seguros Mundial*** de fecha 25 de junio de 2024, por los siguientes amparos y vigencias, en aras de garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato No 105-2023.

Amparo	Valor Asegurado	Vigencia Desde d-m-a	Vigencia Hasta d-m-a
Cumplimiento del contrato	$ 224.929.025,40	10-08-2023	08-10-2024
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$112.464.512,70	10-08-2023	08-06-2027
Estabilidad de la obra	$ 224.929.025,40	05-06-2024	05-06-2029

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Aprobar La Póliza y/o ***garantía de cumplimiento No CMT-100007849*** *de la compañía* ***Aseguradora Seguros Mundial*** de fecha 25 de junio de 2024, *anexo 9,* expedida a favor de El **Municipio de Pueblo Nuevo, Córdoba** NIT 800.096.766-7, E Instituto Nacional de Vias – INVIAS, tomada por la señora **DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS** identificada con la cedula de ciudadanía número 72.236.745 de Barranquilla, y en cumplimiento a lo establecido en el decreto reglamentario 679 de 1994, decreto 1082 de 2015 y por estar ajustada a lo estipulado en el contrato.

ARTICULO SEGUNDO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición.

Dado en Pueblo Nuevo, Córdoba, a los veinticinco (25) días del mes de junio de Dos Mil Veinticuatro (2.024).

DELCY MILENA ALVAREZ ALVAREZ
Secretaria de Gobierno Municipal

Proyecto: Jaime Martinez – Asesor Jurídico externo Área de contratación.

M□□□M□1□□□1□□□R□1□□

□O□□R□□O□□□□□–□□□□1□

M□□□□□□□O□D□MO□□□R□□□

C□□e□□□□□□□□□□□C□□□□er□□□ Te□e□□□□□□□□□□□

	□□□□□□□O□□□□□D□□□□□ □RO□□□O M□□O□□□□□□□□□□□□D□□ROY□□□O□D□□□□R□□□□□R□□□□R□D□□□R□□□□OR□□ M□□□□□D□□□□□R□□□□OR□O□R□□□□□□□□ □□□□M□□□□O□□□□□□□□D□□□□□D□D□O□□R□□O D□O□R□	C□DI□O	M□□I M□□□I□□□□□R□□□
		□□R□I□□	□
		□□□I□□□	

□□C□□ □□□□□□□□□□

□D□□ □Me□□ □□□o□

□□D□D□□□□□□□OR□□ □□□DIR□CCIO□□I□□□R□□IO□□□□□ D R□□□□□□□□RR□OR□□□□CORDO□□

□O□□R□□O D□□O□R□□□o□ □□□D□□□□□
I□dic□r□□□□ero□□□□o□

O□□□□O D□□□□O□□R□□O□D□O□R□□

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – COLOMBIA RURAL. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 920 DE 2021

□O□□R□□□□□□□ CO□□ORCIO□CORDO□□□□□□

□□□□□□D□□□□□O□ □□□□□□□□□□ □□□□□O□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□D□□□□□□□M□□□□O□ □□□□□□□□□□
I□dic□r□d□□□e□□□□o□ I□c□□e□r□rro□□□□□□□□e□□o□e□□ □□□

□O□□R□□□O D□□□□□□R□□□□□OR□□□□o□ □□□□□□□□□□□□
I□dic□r□□□□ero□□□□o□

□□□R□□□□□OR□ CO□□□ORCIO□I□□□R□R□□□

1□□□□□□D□□□□□□D□□D

□R□□□□T□DO□ SI ---X--- NO ------- □□RO□□DO□ SI ---X--- NO ------- □□R□I□□□□o□ □ □□C□□□D□□□R□I□□□ □□□□□□□□□

O□□□R□□□□O□□□□

□□□□□□de c□lid□d □re□e□t□do □or □□rte de□Co□tr□ti□t□□de□cri□e e□co□□□□to de □ccio□e□ □□e e□t□ de□e □ro□t□r □□r□ o□r□r □□□□ □e or□e□ □ c□lid□d de □□□ □cti□id□de□ □ de□□rro□□r d□r□□te □□e èc□ci□□ de□□ro□ecto□to□ □□do co□□o □ode□o □□□e □□ or□ □ti□□ i□ter□□cio□□□□O□□□□□□
□de□ □□□e□Co□tr□ti□t□□□e□□□b□re□□ecti□o□□or□ □to□□□□ □e□ e□t□r□e de□tro de□□□□o de è ec□ci□□□b c□□□er□ite□e□r□□□□ □□or co□tro□□or□□rte de□□□□ter□e□tor□□□□te□□□di□i□t□□□e□e□t□□□id□de□□□e□□ed□□□□r□ir□e□□de□□rro□b de□□□□□cti□id□de□de o□r□□□

□□□□□D□□OR□□□□D□□□□□D□D

□RO□R□M□□□DITORI□□R□□□□T□DO□ SI ------ NO ------X------ □o□D□□□□DITOR□□□□RO□R□M□D□□□□ □ □□C□□□□TIM□□□□DITOR□□□ □o□re□□□□d□□
□R□□□□TO□I□□ORM□□D□□□□DITOR□□□ SI ------ NO ------X------ □o□D□□□□DITOR□□□R□□□□D□□□□ □ □□C□□□R□□IM□□□□DITOR□□□ □o□re□□□□

O□□□R□□□□O□□□□

□□□□□□e e□Co□tr□ti□t□□□re□e□t□ □□□ro□r□□ □de □□ditor□□□i□ter□□□□ □edi□□te doc□□ e□to de□o□i□□do □l□□RO□□□□e□te □o□□e□e□te □ri□d□□□tr□ccio□e□ de tie□□o co□□o co□dicio□e□ □ □□□or□ de □or□□□□ci□□ de □□ cro□o□r□□□ de □□ditor□□□□□or □o c□□□□□ l□ter□e□tor□□ co□oc□r□□ di□□o□ici□□□de□Co□tr□ti□t□□□□er□o□□□Id□□eo□co□e□□□de□re□□□r □□□□□ro□r□□ □ci□□de□□ditor□□□□□e□□□□□□corde□co□□e□de□□rro□b de□□□□□cti□id□de□de o□r□□□□□e□te□eriodo e□□□□do e□co□tr□ti□□□□□□□o□□□□□□□□□do□□□□correcio□e□□□erti□e□te□□

□□□□□□□□D□□□□□□□□□□□□M□D□□□□□Y□□□□□YO□□□□My□□

□R□□□□T□DO□ SI ------ NO ---X--- □□RO□□DO□ SI ------ NO ---X--- □□C□□D□□□□RO□□CI□□□ □□□□r□□□□□a□□□□

□o□TOT□□□D□□□□□□□O□□□RO□R□M□DO□□□□□□□M□□□□□□□□□□0□□□□ □o□TOT□□D□□□□□□O□□□□C□T□DO□□□□□□M□□□ □

C□M□□IDO□□□□□□□□D□□IM□□□□□□M□□□ SI ------ NO --X---

O□□□R□□□□O□□□□

□□l□ter□e□tor□□□□to co□□ e□Director □Re□ide□te de o□r□□□e□ □□□e □ o e□□e□to e□e□□□□de C□lid□d □re□e□t□do□□cord□ro□ □□te□□de d□r i□icio □ □□□ □cti□id□de□ de o□r□□re□□□r □□ reco□oci□ie□to de □□□ □cti□id□de□ cr□tic□□de□ro□ecto□□□□ □ri□□e□ □ co□tro□r□□□ □edid□□de co□tro□□□criterio□de□□ce□t□ci□□□rec□e□ci□de□co□tro□□re□o□□□□e□□□b□re□i□tro□□□e□e□de□□e□er□di□e□ci□doè□r□ □to□l□ □□OR□□□M□tri□de□co□tro□de□c□lid□d□i□□□ecci□□□□e□□□o□□

□□□□□□de□l□□□ecci□□□□□edici□□□□e□□□□o□de□e□c□□ □ir□e□□□□todo□co□□□□e□i□e□ci□□co□tr□ct□□e□□□□□□or□ □□□de e□□□o□□□□□e□□eci□ic□cio□e□de□co□□tr□cci□□de□l□□tit□to□□cio□□□de□□□□□
□□c□tid□d□de e□□□o□□□e□de□e□re□□□r□è□è□□e□de□i□e□co□□□□e e□□□è□i□e□ci□□de□□IM□□□□e□□□o□r□□□e□è èc□te□
□□c□tid□d□de e□□□o□re□i□□do□□de□e□re□□o□der□□□□□è□i□e□ci□□de□□IM□□□□de□□o□r□e èc□t□d□□

□□R□□OR□□□□D□□□O□□O□□ORM□D□D□□

□o□d□□o□o□orm□dad□□r□□or□ada□□□□□□m□□□ 1 □o□d□□o□o□orm□dad□□□□□d□□□□□d□□□rr□□□□□m□□□ 1

□o□a□□m□ado d□□o□o□orm□dad□□□d□□□□ada□□ara□□□o□ra□o□ 0 □o□a□□m□ado d□□o□o□orm□dad□□□□rrada□□ara□□□o□ra□o□ 0

□o□a□□m□ado d□□o□o□orm□dad□□□□d□□□□d□□□rr□□ara□□□o□ra□o□ 0

O□□□R□□□□O□□□□

□□co□tr□ti□t□□□ici□co□□□□citi□id□de□□e□□□ e□de□□□io□□□e□ r□□o□e□□e□te□eriodo□e□□□do□□o□□e□è□de□ci□□re□orte□□de□□o□co□□or□id□d□

□□□ □□□□□□Y R□□□□MO□

□o□D□□□□a□y r□□amo□□r□□□da□□□□□m□□□ 0 □o□D□□□□a□y r□□amo□□a□□d da□□□□□m□□□ 1

□o□D□□□□a□y r□□amo□□□□m□□□□d□□□□d□a□□□□□ 0 □o□□□m□ado d□D□□□□a□y r□□amo□□r□□□da□□or□□□o□ra□o□ 0

□o□□□m□ado D□□□□a□y r□□amo□□□□d□□□□d□a□□□□□or□□□o□ra□o□ 0 □o□□□m□ado d□D□□□□a□y r□□amo□a□□d da□□□□□o□ra□o□ 0

O□□□R□□□□O□□□□

□□è□te□eriodo è□□□do□□e è□de□ci□□e□e□□□R□□□□to de□□□e□□□rec□□o□□□□eticio□□or□□□ie□ □ro de□□co□ □id□d de□corre□i□ie□to de□□r□□ie□□co□tr□ti□t□□e□c□□□e è dio re□□e□t□□□o□□di□□

□□□□□e□□□rec□□o□tie□e□co□o ori□e□□□d□□ e□t□□□o□□□□rio□de□ro□ecto□□□co□ □id□d de□□o□□

	□□□□□□□O□□□□O□□□D□□□□□ □RO□□□OM□□O□□□□□JECUC□□N DE□ROY□□□O□D□□□□R□□□□R□□□□R□DE□□R□□□□OR□□ M□□□□□D□□□□□R□□□□OR□□O□R□□□□□□□□ □□□□M□□□□O□□□□□□□D□□□□□D□D□O□□R□□ODEO□R□	C□DI□O	M□□I□M□□□□□□□□R□□□
		□□R□I□□	□
		□□□I□□□	

□□C□□ □□□□□□□□□□
□D□□ Me□□ □□o□

□. □D□□□□□D□□□ESTI □N□□□(□□□r□c□d□o□eti□o□de□c□ld□d□de□□□□de□C□ld□d□□e□de□e□t□□ecer□□□□ e□o□□□□□dice□de□e□ti□□□□e□□er□it□e□□□□r□□□è□t□do□de□c□□ □i□ ie□to□

□□□□o□□d□ador d□□□□□□□□:	□a□or d□□G□m□□	□om□□ar□o□□o□r□□□d□□ador d□□□□□□□□□□□□□□□arar□□rm□□a y□□o□□d□ra□□o□□□□□□□a d□□□□□□□□□d□□□□□ □
□orce□t□□e□de□□□□ce□de□o□r□	94. 3%	□□e□□r□de□□□□co□dicio□e□□d□er□□□□e□Co□tr□t□t□□□□o□r□do□e□er□□□□□□ce□de□o□r□□□□□□e□□ce□t□□e□□e□c□e□tr□□or□de□□□o□de□o□ro□r□□ □do□□□e□□er□do□□e□ec□t□r□□□t□□□□ec□□□de□□□re□e□te□
□orce□t□□e□de□c□□ □i□□ie□to□de□ co□tro□e□□de□c□□id□d	1□.0%	□□e□□r□de□□□□er□re□i□□do□o□□□erti□e□te□□e□□□□o□□or□□rte□de□Co□tr□t□t□□□□o□□□ □teri□e□□□□i□ □e□e□t□r□□e□e□c□e□tr□□or□de□□□o□de□o□ro□r□□ □do□□□e□□er□do□□e□ec□t□r□□□t□□□□ecid□□□□or□□□□or□ □ti□□□ co□o□□ □□□□□□□r□□□er□ti□□d□□□e□o□r□□□□
□orce□t□□e□de□□□□e□e□t□ci□□□de□ □ccio□e□□de□□e□or□.	80 □	□□□□ec□□□de□□re□e□te□or□ □to□□e□□□□□re□e□t□do□□ccio□e□□de□□e□or□□□or□□rte□de□Co□tr□t□t□□□□or□o□c□□□e□te□i□dic□dor□□e□e□□□□□□□□□□□ □□□□□
C□□ □i□ie□to□co□□□□□□cti□id□de□□ de□c□□□cit□ci□□□□□□er□o□□□	1□.0%	□□□□ec□□□de□□re□e□te□or□ □to□□e□□□□□ri□d□do□□□□c□□□cit□cio□e□□□□□□□□ □erti□e□te□□o□re□e□rid□d□□□□□□d□e□e□tr□□□o□or□□rte□de□Co□tr□t□t□
C□□ □i□ie□to□de□o□□ro□r□□ □□□ □□□T	90 □	□□□□ec□□□de□□re□e□te□or□ □to□□e□□re□e□t□□□□□□□□□□i□cio□e□co□ □et□□de□□er□o□□□de□o□r□□□□d□i□t□t□o□de□o□di□ere□te□□re□te□de□e□ec□cio□□
□orce□t□□e□de□□□□□ce□de□o□r□□ □ro□r□□ □do□□□r□e□□□e□□	98. 8%	□□e□□r□de□□□□co□dicio□e□□d□er□□□□e□Co□tr□t□t□□□□□ro□r□□ □do□□□□□□□ce□de□o□r□e□c□□□o□□e□o□i□e□e□te□eriodo□e□□r□□e□ec□t□r□□□□ti□□ccio□□□□□□□□e□□ce□t□□e□□□e□c□e□tr□□or□de□□□o□de□o□

□□r□□c□d□□□dic□dor□de□□e□ti□□□e□de□e□de□□r□□□tt□□o□re□re□e□t□□i□□de□□i□□o□

O□□□R□□□□O□□□□:
□□□□ec□□de□□re□e□te□or□ □to□□o□□dic□dore□□de□c□□id□d□de□ □e□tr□□re□□□t□do□□□eriore□□□o□e□□er□do□□e□to□□or□□e□□o□e□□□□o□r□do□□□□it□r□□□et□□□□de□Re□i□□□de□□□t□dio□□□o□Di□e□o□□□□or□o□t□□to□□o□e□□□□□□ici□do□□□□re□□ecti□□□□□cti□id□de□□

7. □ALI □RACI □N□**D**□□EQU□P**O**S, □NSPECC □ÓN □**M**□**D**□□□□□□**Y**□ENSA **YO.** □□e□de□e□re□□cio□□r□todo□è□e□□i□o□□□e□re□□ier□□de□c□□r□ci□□□□□

□o.	□□□o□d□□□□□□□o	Mar□a	□□r□□	□□□□a d□□ □a□□ra□□□□	□o□y□□□□a□ □□r□□□ado d□□ □a□□ra□□□□	□□□□a d□□ □□□□□m□□□o□□ □a□□ra□□□□	□om□□ar o□
1	I□□TR□M□□TO□□I□□□	□OO□□I□	□52034	**2022 – 08 – 05**	**M**□□2□94□□ **2022 – 08 – 05**	23□02□23	
2	□□T□ClO□□TOT□□	□O□ID□	K**1**562□□	**2022 – 06 – 23**	□□393/ **2022 – 06 – 23**	23□**1**2□22	
3	I□□TR□M□□TO□□I□□□	□□OM□□	**7**□40□□2E□**11**	**2022 – 06 – 05**	C64□□□ **2022 – 06 – 05**	5**1**□2□□2	
4							
5							
6							

O□□□R□□□□O□□□□:
□□è□te□□eriodo□è□□□□do□□□e□□re□e□t□ro□□certi□ic□do□□de□c□□□r□ci□□de□o□□è□□i□o□□de□To□o□r□□□□□or□□□rte□de□Co□tr□t□t□□

□**O**□□□:
□ie□ □re□□□e□□□□□□□de□□□□re□□□e□t□□□de□è□te□br□ □to□□e□□"□O"□e□□□ter□e□tor□de□□Idic□r□è□è□□□cio□de□o□□er□□cio□e□□□□□□ccio□e□□to□ □d□□□□□r□d□r□c□□ □i□ ie□to□□□□□o□i□□ci□□□

□ir□ □	□ir□ □	□ir□ □	□ir□ □
□o□ □re□C□□□R□□□□RDO□□□□N□□□D□□□□□ □□□	□o□ □re□C□□□R□□D□□RE□□□R□□□D□□□□ □□□	□□□□:□□RIC□RDO□R□□□□□□□Di□□□	□□□□□RIC□RDO□R□□□□□□□□□
Re□re□e□t□□te□□□o□□□ode□□□de□Co□tr□t□t□	Re□re□e□t□□te□□□o□□□ode□□uo de□Co□tr□t□t□	Director de□□□ter□e□tor□□	Director de□□□ter□e□tor□□
M□tr□c□□□□ro□e□lo□□□□o□□□□□□□□□□□□□□□COR	M□tr□c□□□□ro□e□lo□□□□o□□□□□□□□□□□□□□□COR	M□tr□c□□□□ro□e□lo□□□□o□□□□□□□□□□□□□□□TD	M□tr□c□□□□ro□e□lo□□□□o□□□□□□□□□□□□□□□TD

Ori□□□□□or□e□□e□□□□de□□ter□e□tor□□□rc□□o de□e□i□□de□□□i□□□
Co□□□□□□□id□d□ec□tor□□□ter□e□tor□□Direcci□□Territori□□

M□□□M□1□□□1□□□R□1□□

□O□□R□□O□1□□□–□□□□□□

M□□□□□□□O□D□□□□□□□O□□□□□O□

	□□□□□□□□O□□□□O□□□□D□□□□□□ □RO□□□□O M□□O□□□□□□□□□□□□D□□□ROY□□□□O□□D□□□□R□□□□□R□□□□R□□D□□□R□□□□OR□□ M□□□□□□D□□□□□□□R□□□□□OR□□□O□R□□□□□□□□ □□□□M□□□□O□□□□□□□□D□□□□□□D□□D□□O□□R□□O D□□O□R□	C□DI□O	M□□IM□□I□□□□□R□□□
		□□R□I□□	□
		□□□I□□□	

□□C□□

□□□□□□□□□□

□D□□ □Me□□ □□□o□

□□□D□□D□□□□□□□OR□□ □□□□DIR□CCIO□□□I□□□R□□□IO□□□□□ D□R□□□□□□□□□RR□□OR□□□□ CORDO□□

□O□□□R□□O D□□O□R□□□o□ □□□□D□□□□□□

□□□□□□□□□□

O□□□□O D□□□□O□□R□□O□D□□O□R□□

CO□□TR□CCIO□□D□□□□□IM□□TO□RI□IDO□□□□□□□□O□□□□R□□□□D□□□C□□TRO□□O□□□DO□D□□□CORR□□IMI□□TO□D□□CI□T□R□□□□□□RTO□□□□TO□□T□□□□II□M□□ICI□IO□D□□□□□□□O□□□□O□D□□□RT□M□□TO□D□□CORDO□□□

□O□□□R□□□□□□□ CO□□ORCIO□□I□□□□□□□□□□□□

	□□□□□□□□O□□□□O□□□□D□□□□□□ □RO□□□OM□□O□□□□□□□□□□□□D□□ROY□□□O□D□□□□R□□□□R□□□□R□D□□R□□□□OR□□ M□□□□□□D□□□□□□R□□□□OR□□O□R□□□□□□□□ □□□□M□□□□O□□□□□□□□D□□□□□D□D□□O□□R□□O D□O□R□	C□DI□O	M□□IM□□I□□□□□R□□□
		□□R□I□□	□
		□□□I□□□	

□□C□□ □□□□□□□□□□

D□□ Me□□ □□p□

□□□□D□□□□D□□□ □□□□□□ □□□□ □□□r□c□d□□o□ét□o□de□c□id□d□de□□□□□de□C□id□d□e□de□e□t□□□ecer□□□□ e□o□□□□□□dice□de□□e□ti□□□□□e□□er□it□□e□□□□r□□□□e□t□do□de□c□□ □i□ ie□to□

□□□□o□□d□ador d□□□ □□□□□□□	□a or d□□□□m□□	□om□□ar o□□□o□r□□□d□ador d□□□□□□□□□□□arar□□rm□a y□o□□d□ra□o□□□□□□a d□□□□□□□□□d□□□□□
□orce□t□□e□de□c□□ □□□□ce□de□o□r□□	1□□□	□□ie□□r□de□□□□co□dicio□e□□□d□er□□□□□□t□□□reci□t□cio□e□□□e□Co□tr□t□t□□□□o□r□do□te□er□□□□□□□□ce□de□o□r□□□□□□□e□ce□t□□□e□□e□c□e□tr□□or□de□□□o□de□o□□ro□r□□ □do□□□ e□□er□do□□e□ec□t□r□□□t□□□□ec□□de□□re□e□te□or□ □to□□
□orce□t□□e□de□c□□ □i□ ie□to□de□ co□tro□e□de□c□id□d	□□□	□□ie□□r□de□□□□er□re□□□do□o□□erti□e□te□e□□□o□□or□□rte□de□Co□tr□t□t□□□□o□□ □teri□e□□□□ □e□e□t□r□□□□□o□□o□c□□ □e□□co□□□□e□□eci□c□cio□e□□□e□□e□ci□□e□t□□□ecid□□□ □or□□□or□ □ti□□co□o □
□orce□t□□e□de□□ □e□ e□t□ci□□de□ □ccio□e□de□□ e□or□□	□□□	□□□□ec□□e□Co□tr□t□t□□o□□□re□e□t□do□□□cci□□de□□ e□r□□□□tr□o□re□e□t□do□e□o□r□□□□□c□□□do□e□t□□e□o□ici□d□□or□□□□ter□e□tor□□
C□□ □i□ ie□to□co□□□□□cti□d□de□ de□c□□□cit□ci□□□□□er□o□□□	1□□□	□□□□ec□□de□□re□e□te□or□ □to□□e□□□□ri□d□do□□□c□□□cit□cio□e□□□□□□□ □erti□e□te□□o□re□e□rid□d□□□□d□e□e□tr□□□o□or□□rte□de□Co□tr□t□t□
C□□ □i□ ie□to□de□o□□ro□r□□ □do	1□□□	□□□□ec□□de□□re□e□te□or□ □to□□e□re□e□t□□□□□□□□□□i□cio□e□co□ □et□□□de□□er□o□□□de□o□r□□□□d□i□i□tr□ti□o□de□o□di□re□te□□re□te□de□e□ec□cio□□□
I□ □□□□dice□de□□e□ti□□□□□		

□□r□c□d□□dic□dor□de□□e□ti□□□e□de□e□de□□ir□□□tt□o□re□re□e□t□ti□o□de□□□ i□□ o□

O□□□R□□□□O□□□□

e□ e□te □eriodo e□□□□do □e re□□□□ o□ □erti□e□te□ e□□□□o□ □or □□rte de□Co□tr□t□t□ □ o□ □ teri□e□ □ i□ □e□ e□t□r□ c□□ □ie□do co□ □□ e□□eci□c□cio□e□ □e□□e□ci□□ e□t□□ecid□□ □or □□ □or□ □ti□□ co□o□ □i□□□ □□r□ □er □ti□□□d□□ e□ o□r□□□or otro □do□□e□e□de□ci□□□□de□□to□e□o□r□co□□lder□□e□o□□re□□ecto□□□o□ro□r□□ □do□e□□e□te□eriodo□o□e□□ece□□rio□□e□□i□o□□to□o□r□ico□□

7□□□□□□R□□□□ □D□□□□□□O□□□□□□□□□□□□M□D□□□□Y□□□□YO□□□e□de□e□re□cio□□r□todo□e□e□□i□o□□□e□re□□ier□□de□c□i□r□ci□□□□

□o□	□□□o□d□□□□□□o	Mar□a	□□r□□	□□□□a□d□□ □a□□ra□□□□	□o□y□□□□a□ □□r□□□ado□d□□ □a□□ra□□□□	□□□□a□d□□ □□□□□m□□□o□□ □a□□ra□□□□	□om□□□ar□□

O□□□R□□□□O□□□□□

□o□e□□□□re□e□t□do□certi□ic□do□de□c□i□r□ci□□□or□□rte□de□co□tr□t□t□□

□**O**□□□

□ie□ □re□□e□□□□□□de□□□re□□e□t□□de□e□te□or□ □to□□e□"□O"□e□t□ter□e□tor□de□e□dic□r□e□e□□□cio□de□o□□er□□cio□e□□□□□ccio□e□□to□ □d□□□□r□d□r□□ □i□ ie□to□□□□o□i□□ci□□□

□ir□ □□

□o□ □re□D□□R□i□□□□□RRI□□ □C□RD□□□□

Re□re□e□t□□te□e□□□o□□oder□do□de□Co□tr□t□t□□

M□tr□c□□□ro□e□lo□□□□o□□□□□□□□□□□□□□□T□

□ir□□

□re□RIC□RDO R□□□□□□DI□□□

Director de□□□□ter□e□tor□□

M□tr□c□□□□ro□e□lo□□□□o□□□□□□□□□□□□□□□TD

Ori□□□□t□or□e□e□□□□de□t□ter□e□tor□□□rc□□o□de□e□t□□□de□t□□□□

Co□□□□□□id□d□□ec□tor□□t□ter□e□tor□□Direcci□□□Territori□□

□RO□R□M□□D□□O□R□□

□O□□R□□O□□□□□–□□□□1□

M□□□□□□O□D□□MO□□□□R□□□□

ALCALDÍA MONTERIA

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORRDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 920 DE 2021

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin	Costo
1		**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE VÍAS DE TERCER ORDEN EN EL CORREGIMIENTO MARTINEZ, BARRIO CHUCHURUBI Y LA VIA QUE COMUNICA EL CASCO URBANO DE CERETE CON LA VEREDA EL QUEMADO, EN EL CORREGIMIENTO DEL RETIRO DE LOS INDIOS, EN EL MUNICIPIO D**	**140,63 días**	**mar 8/03/22**	**sáb 30/07/22**	**$16.860.924.080,...**
2		**ACTA DE INICIO**	**0 días**	**mar 8/03/22**	**mar 8/03/22**	**$0,00**
3		**SECCION 1 - VIA CORREGIMIENTO JARAQUIEL**	**135 días**	**sáb 12/03/22**	**sáb 30/07/22**	**$3.753.751.454,00**
4		**EXPLANACIONES**	**60 días**	**sáb 23/04/22**	**sáb 25/06/22**	**$106.929.044,00**
8		**BOX CULVERT 1X1 (L =6.2m)**	**11 días**	**jue 7/04/22**	**mar 19/04/22**	**$16.212.688,00**
15		**OBRAS DE PROTECCION A BOX CULVERT**	**5 días**	**mar 19/04/22**	**sáb 23/04/22**	**$10.517.886,00**
19		**PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO**	**59 días**	**mié 25/05/22**	**lun 25/07/22**	**$3.436.818.246,00**
20		Subbase Granular Clase C.	20 días	mié 15/06/22	mié 6/07/22	$374.456.640,00
21		Geotextil Tipo T-2400 o similar Tejido	20 días	mié 15/06/22	mié 6/07/22	$118.807.850,00
22		Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	20 días	mié 15/06/22	mié 6/07/22	$105.284.192,00
23		Mejoramiento de la subbrasante con adición de materiales (piedra rajón)	25 días	mié 25/05/22	lun 20/06/22	$504.469.190,00
24		Pavimento de concreto hidraulico módulo de rotura 38 MPa	15 días	jue 30/06/22	vie 15/07/22	$1.559.710.027,00
25		Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS	5 días	sáb 16/07/22	jue 21/07/22	$354.102.626,00

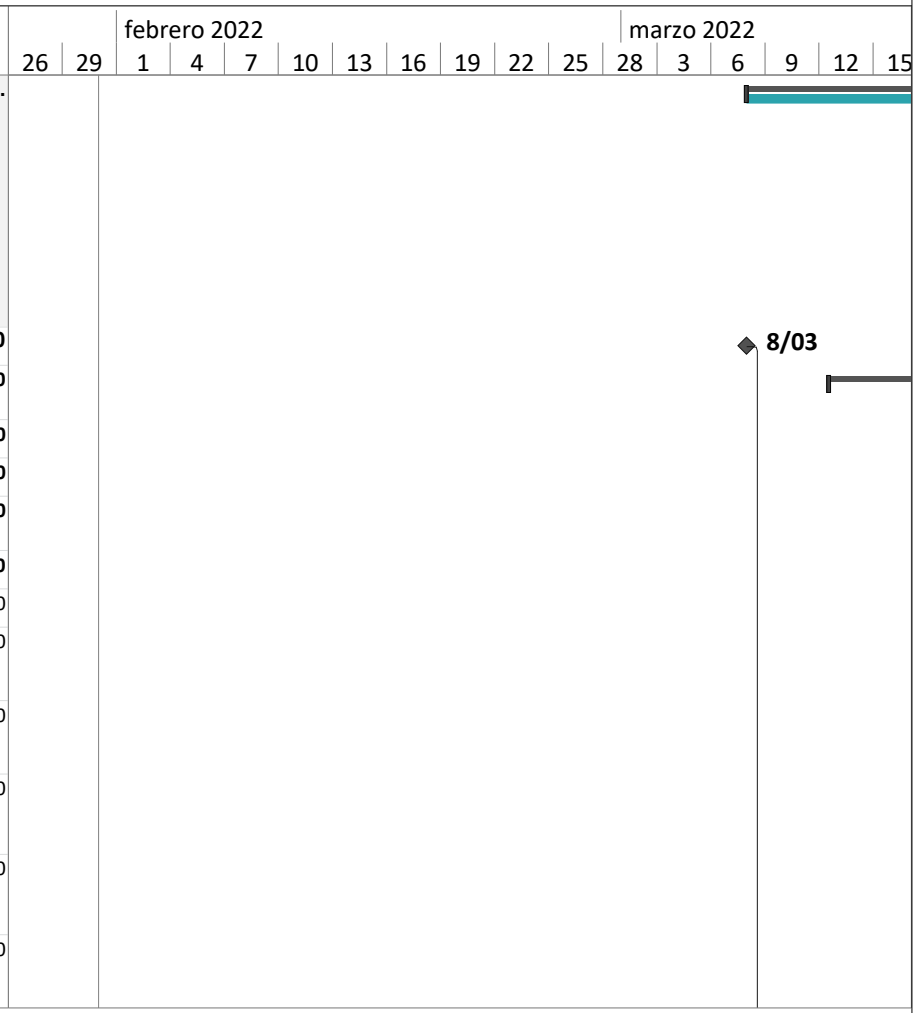

Elaboró:

ALCALDÍA MONTERIA

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORRDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 920 DE 2021

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin	Costo
26		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	10 días	mié 15/06/22	sáb 25/06/22	$263.187.200,00
27		Bordillo de Piezas Prefabricadas de Concreto; incluye la preparacion de la	9 días	sáb 16/07/22	lun 25/07/22	$156.800.521,00
28		**TRANSPORTE**	**12 días**	**mié 25/05/22**	**mar 7/06/22**	**$156.839.296,00**
29		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien	12 días	mié 25/05/22	mar 7/06/22	$156.839.296,00
30		**SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL**	**14 días**	**sáb 16/07/22**	**sáb 30/07/22**	**$21.464.294,00**
31		Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm	5 días	mar 26/07/22	sáb 30/07/22	$9.466.146,00
32		Línea de Demarcación con Pintura en Frío.	5 días	sáb 16/07/22	jue 21/07/22	$11.998.148,00
33		**CARACTERIZACIÓN VIAL**	**4 días**	**sáb 16/07/22**	**mié 20/07/22**	**$4.970.000,00**
34		Caracaterización del corredor	5 días	sáb 16/07/22	jue 21/07/22	$4.970.000,00
35		**SECCION 2- VIA CORREGIMIENTO KILOMETRO 12**	**110 días?**	**jue 7/04/22**	**sáb 30/07/22**	**$3.445.018.819,00**
36		**EXPLANACIONES**	**45 días**	**sáb 23/04/22**	**mié 8/06/22**	**$452.089.375,00**
40		**BOX CULVERT 1X1 (L =5m)**	**10 días**	**jue 7/04/22**	**lun 18/04/22**	**$12.290.304,00**
46		**OBRAS DE PROTECCION A BOX CULVERT**	**5 días**	**lun 18/04/22**	**vie 22/04/22**	**$19.176.728,00**
50		**PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO**	**72 días**	**vie 13/05/22**	**mié 27/07/22**	**$2.400.922.406,00**
51		Subbase Granular Clase B.	20 días	vie 3/06/22	vie 24/06/22	$305.344.566,00
52		Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	25 días	vie 13/05/22	mié 8/06/22	$102.769.498,00
53		Pavimento de concreto hidraulico módulo de rotura	20 días	sáb 18/06/22	sáb 9/07/22	$1.502.199.497,00



Elaboró:

ALCALDÍA MONTERIA

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORRDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 920 DE 2021

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin	Costo
54		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	15 días	vie 3/06/22	sáb 18/06/22	$186.728.109,00
55		Bordillo de Piezas Prefabricadas de Concreto; incluye la preparacion de la	17 días	sáb 9/07/22	mié 27/07/22	$303.880.736,00
56		**TRANSPORTE**	**15 días**	**vie 13/05/22**	**lun 30/05/22**	**$533.926.240,00**
57		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000	15 días	vie 13/05/22	lun 30/05/22	$533.926.240,00
58		**SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL**	**20 días**	**sáb 9/07/22**	**sáb 30/07/22**	**$21.125.766,00**
59		Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm	2 días	jue 28/07/22	sáb 30/07/22	$9.466.146,00
60		Línea de Demarcación con Pintura en Frío.	5 días	sáb 9/07/22	vie 15/07/22	$11.659.620,00
61		**CARACTERIZACIÓN VIAL**	**5 días**	**mar 26/07/22**	**sáb 30/07/22**	**$5.488.000,00**
62		Caracaterización del corredor	3 días	mar 26/07/22	jue 28/07/22	$5.488.000,00
63		**SECCION 3 - CONSTRUCCION DEL PUENTE BASAL**	**107 días**	**jue 7/04/22**	**mié 27/07/22**	**$1.815.021.544,00**
64		**EXPLANACIONES**	**15 días**	**jue 7/04/22**	**vie 22/04/22**	**$39.402.480,00**
65		Terraplenes	15 días	jue 7/04/22	vie 22/04/22	$39.402.480,00
66		**PUENTE EN CONCRETO REFORZADO L= 35m**	**107 días**	**jue 7/04/22**	**mié 27/07/22**	**$1.644.931.540,00**
67		Excavaciones varias en material común bajo agua.	12 días	lun 11/04/22	vie 22/04/22	$27.148.770,00
68		Demolición de estructuras	3 días	jue 7/04/22	lun 11/04/22	$16.663.975,00
69		Concreto clase C (280 kg/cm2 ó 4000 PSI) VIGAS Y TABLERO	15 días	mar 12/07/22	mié 27/07/22	$155.013.872,00

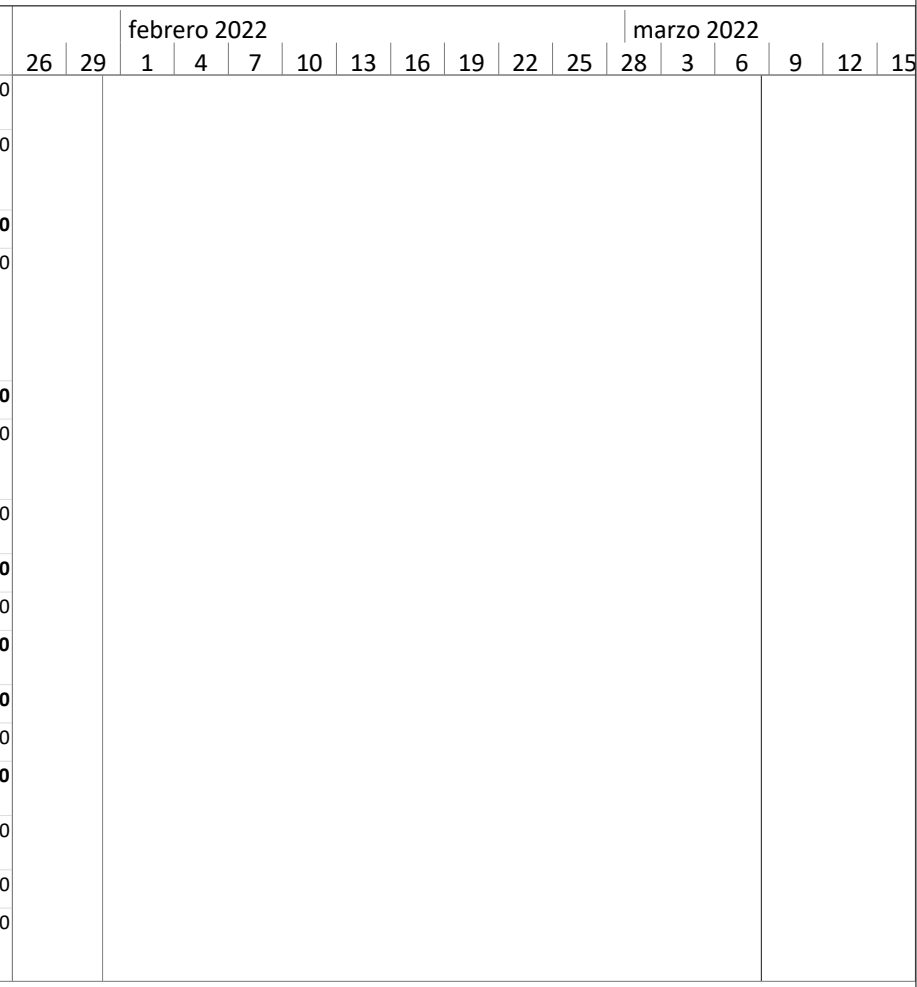

Elaboró:

ALCALDÍA MONTERIA

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORRDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 920 DE 2021

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin	Costo
70		Concreto clase C (280 kg/cm2 ó 4000 PSI) ESTRIBOS Y ALETAS	15 días	lun 27/06/22	mar 12/07/22	$63.637.259,00
71		Concreto clase C (280 kg/cm2 ó 4000 PSI) DADO	15 días	vie 10/06/22	lun 27/06/22	$87.266.640,00
72		Revestimiento en piedra pegada para protección	10 días	mar 12/07/22	vie 22/07/22	$459.042.374,00
73		Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	7 días	sáb 23/04/22	sáb 30/04/22	$3.250.266,00
74		Pilote concreto vaciado in-situ, diametro 1,2 m (incluye acero de refuerzo)	15 días	jue 26/05/22	vie 10/06/22	$400.805.040,00
75		Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa	25 días	sáb 30/04/22	jue 26/05/22	$268.932.384,00
76		Apoyo elastometrico	10 días	vie 10/06/22	mar 21/06/22	$4.634.768,00
77		Junta de dilatación elastómera reforzada (incluye suministro e instalación)	5 días	mar 21/06/22	lun 27/06/22	$11.052.954,00
78		GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	12 días	sáb 23/04/22	jue 5/05/22	$20.911.452,00
79		Drenes 4"	5 días	lun 27/06/22	vie 1/07/22	$905.540,00
80		Baranda metalica para trafico vehicular	4 días	mar 21/06/22	sáb 25/06/22	$52.942.960,00
81		PRUEBA DE CARGA INSTRUMENTADA CON	1 día	mar 21/06/22	mié 22/06/22	$72.723.286,00
82		**TRANSPORTE**	**20 días**	**sáb 23/04/22**	**vie 13/05/22**	**$128.583.936,00**
83		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000	20 días	sáb 23/04/22	vie 13/05/22	$128.583.936,00
84		**SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL**	**7 días**	**mié 22/06/22**	**mié 29/06/22**	**$2.103.588,00**



Elaboró:

ALCALDÍA MONTERIA

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORRDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 920 DE 2021

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin	Costo
85		Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm	7 días	mié 22/06/22	mié 29/06/22	$2.103.588,00
86		**SECCION 4- OBRAS DE CONSTRUCCION LAS CRUCES - SAN**	**115 días**	**jue 7/04/22**	**jue 4/08/22**	**$7.599.838.813,00**
87		**EXPLANACIONES**	**45 días**	**vie 29/04/22**	**mié 15/06/22**	**$606.203.664,00**
90		**ALCANTARILLAS SENCILLA TUBERIA CONCRETO REFORZADO**	**14 días**	**jue 7/04/22**	**vie 22/04/22**	**$82.046.366,00**
99		**ALCANTARILLAS DOBLE TUBERIA CONCRETO REFORZADO (Φ36")**	**21 días**	**jue 7/04/22**	**vie 29/04/22**	**$257.377.842,00**
108		**ALCANTARILLAS TRIPLE TUBERIA CONCRETO REFORZADO (Φ36")**	**23 días**	**jue 7/04/22**	**lun 2/05/22**	**$129.809.140,00**
117		**BOX CULVERT 1X1**	**13 días**	**jue 7/04/22**	**jue 21/04/22**	**$74.165.007,00**
125		**BOX CULVERT 1.5X1.5**	**13 días**	**jue 7/04/22**	**jue 21/04/22**	**$52.530.969,00**
133		**BOX CULVERT 1.5X1.5**	**13 días**	**jue 7/04/22**	**jue 21/04/22**	**$111.127.359,00**
141		**BOX CULVERT 2X2**	**13 días**	**jue 7/04/22**	**jue 21/04/22**	**$139.573.804,00**
149		**BOX CULVERT 4X4**	**13 días**	**jue 7/04/22**	**jue 21/04/22**	**$323.093.943,00**
157		**OBRAS DE PROTECCION A BOX CULVERT**	**11 días**	**jue 21/04/22**	**lun 2/05/22**	**$355.389.839,00**
162		**PAVIMENTO ASFALTICO**	**69 días**	**mié 25/05/22**	**jue 4/08/22**	**$4.269.534.646,00**
163		Base Granular Clase C	25 días	jue 9/06/22	mié 6/07/22	$512.212.176,00
164		Subbase Granular Clase C.	20 días	mié 25/05/22	mié 15/06/22	$557.531.142,00
165		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	20 días	jue 30/06/22	jue 21/07/22	$77.104.440,00
166		Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	15 días	jue 9/06/22	sáb 25/06/22	$1.895.633.535,00
167		Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS	10 días	sáb 25/06/22	mié 6/07/22	$859.247.887,00
168		Rellenos con Material Filtrante	20 días	jue 9/06/22	jue 30/06/22	$97.008.304,00
169		Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	14 días	jue 21/07/22	jue 4/08/22	$270.797.162,00

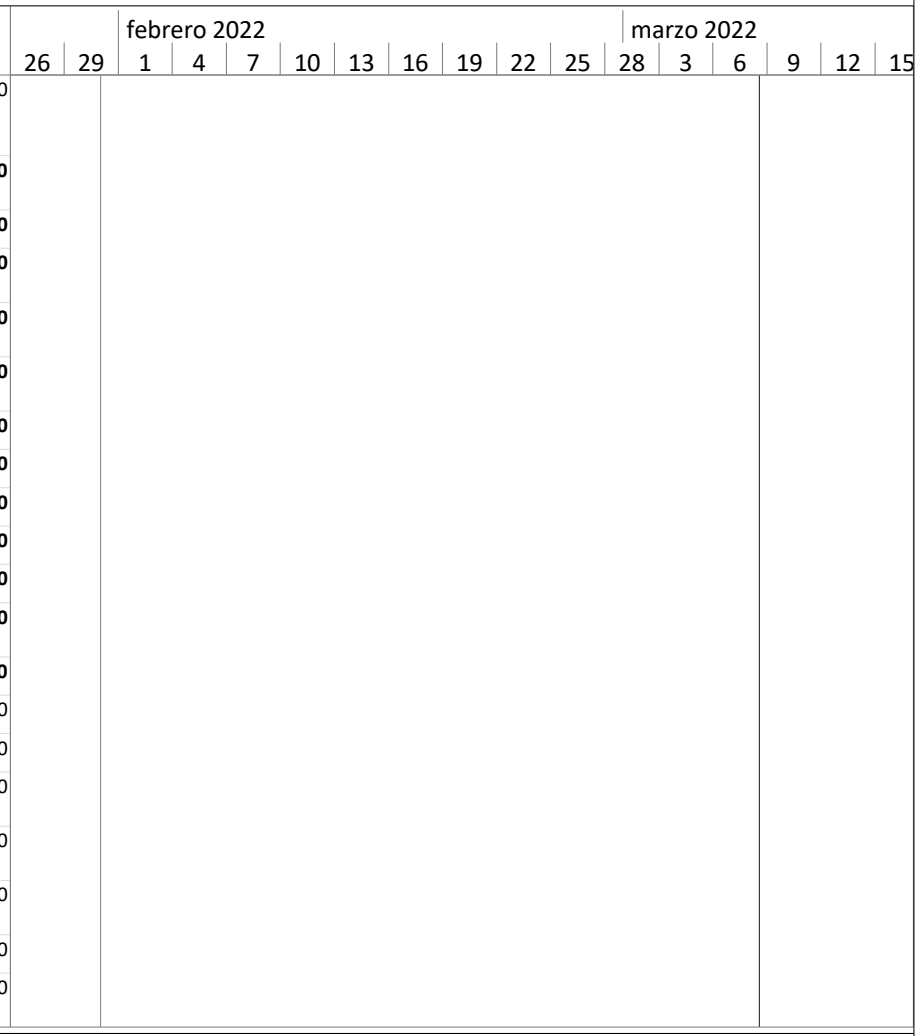

Elaboró:

ALCALDÍA MONTERIA

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORRDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 920 DE 2021

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duració	Comienzo	Fin	Costo
170		**TRANSPORTE**	**15 días**	**mié 25/05/22**	**jue 9/06/22**	**$1.160.079.264,00**
171		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien	15 días	mié 25/05/22	jue 9/06/22	$1.160.079.264,00
172		**SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL**	**9 días**	**jue 21/07/22**	**sáb 30/07/22**	**$35.756.970,00**
173		Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm	2 días	jue 28/07/22	sáb 30/07/22	$5.258.970,00
174		Línea de Demarcación con Pintura en Frío.	7 días	jue 21/07/22	jue 28/07/22	$30.498.000,00
175		**CARACTERIZACIÓN VIAL**	**7 días**	**jue 21/07/22**	**jue 28/07/22**	**$3.150.000,00**
176		Caracaterización del corredor	7 días	jue 21/07/22	jue 28/07/22	$3.150.000,00
177		OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	20 días	mié 6/07/22	mar 26/07/22	$171.474.266,00
178		REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)	30 días	mar 8/03/22	jue 7/04/22	$63.713.600,00
179		IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	20 días	jue 7/04/22	jue 28/04/22	$12.105.584,00
180		ACTA FINAL	0 días	sáb 30/07/22	sáb 30/07/22	$0,00

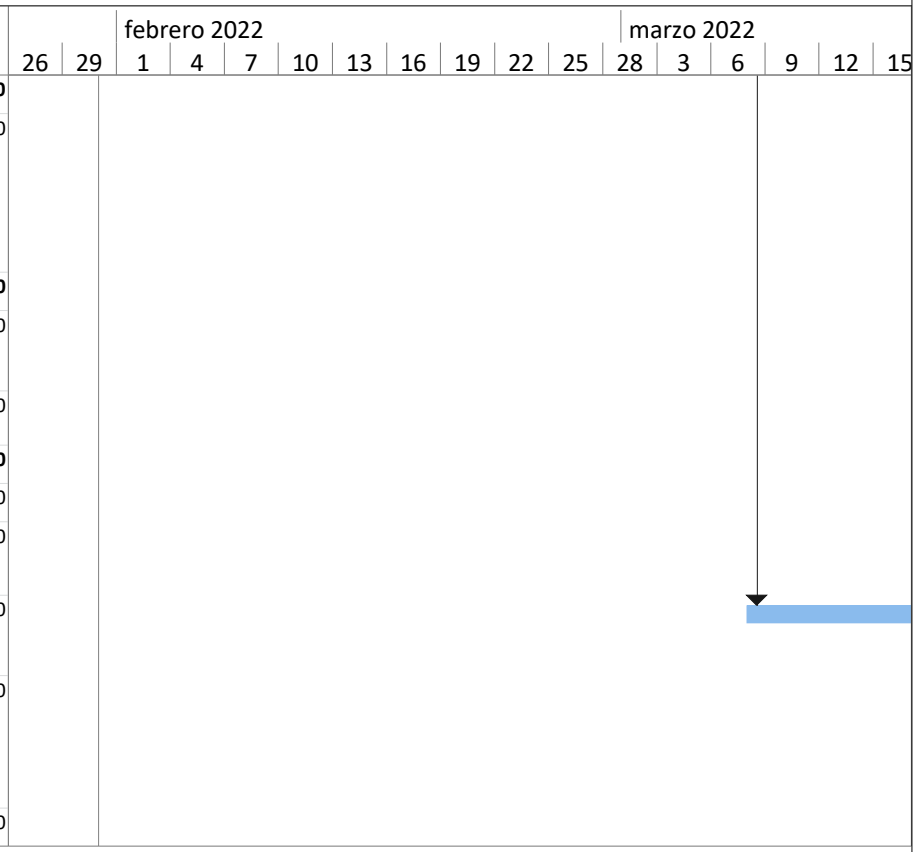

Elaboró:

ALCALDÍA MONTERIA

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORRDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 920 DE 2021

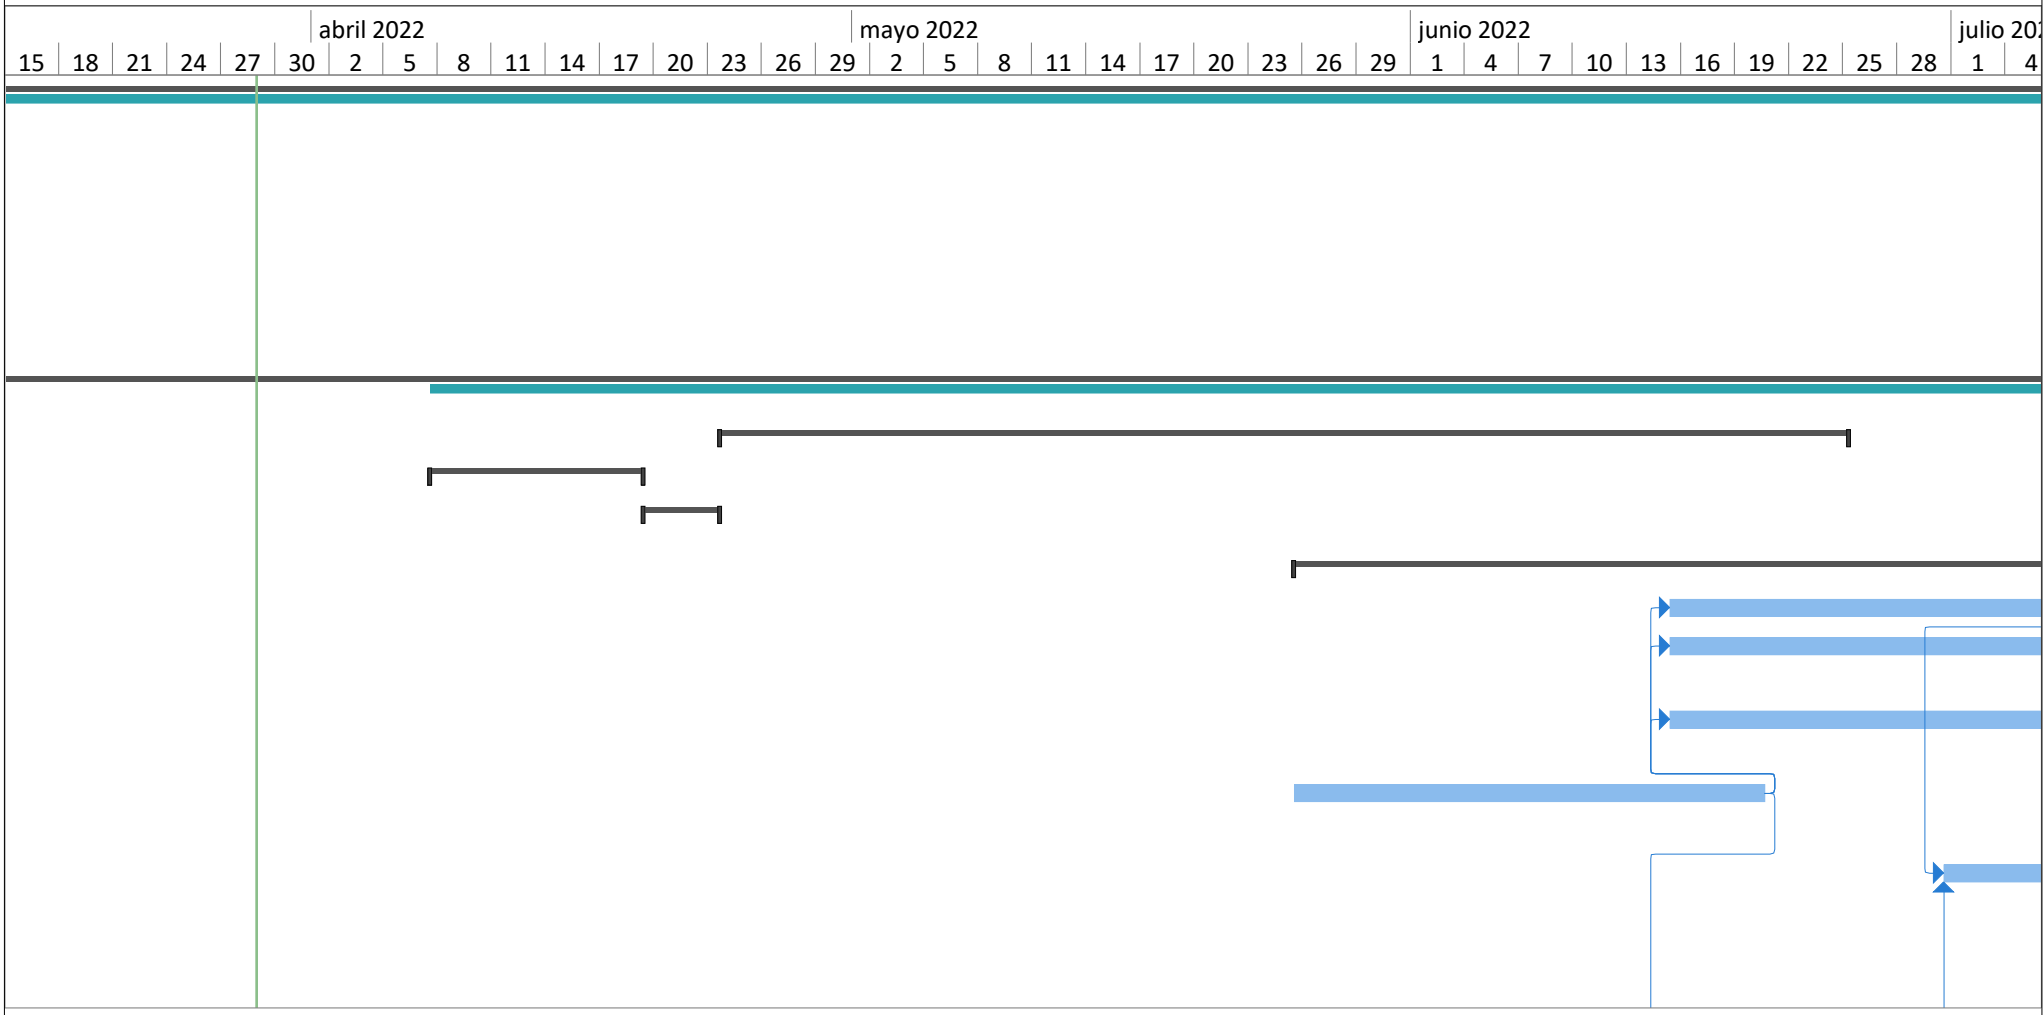

Elaboró:

ALCALDÍA MONTERIA

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORRDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 920 DE 2021

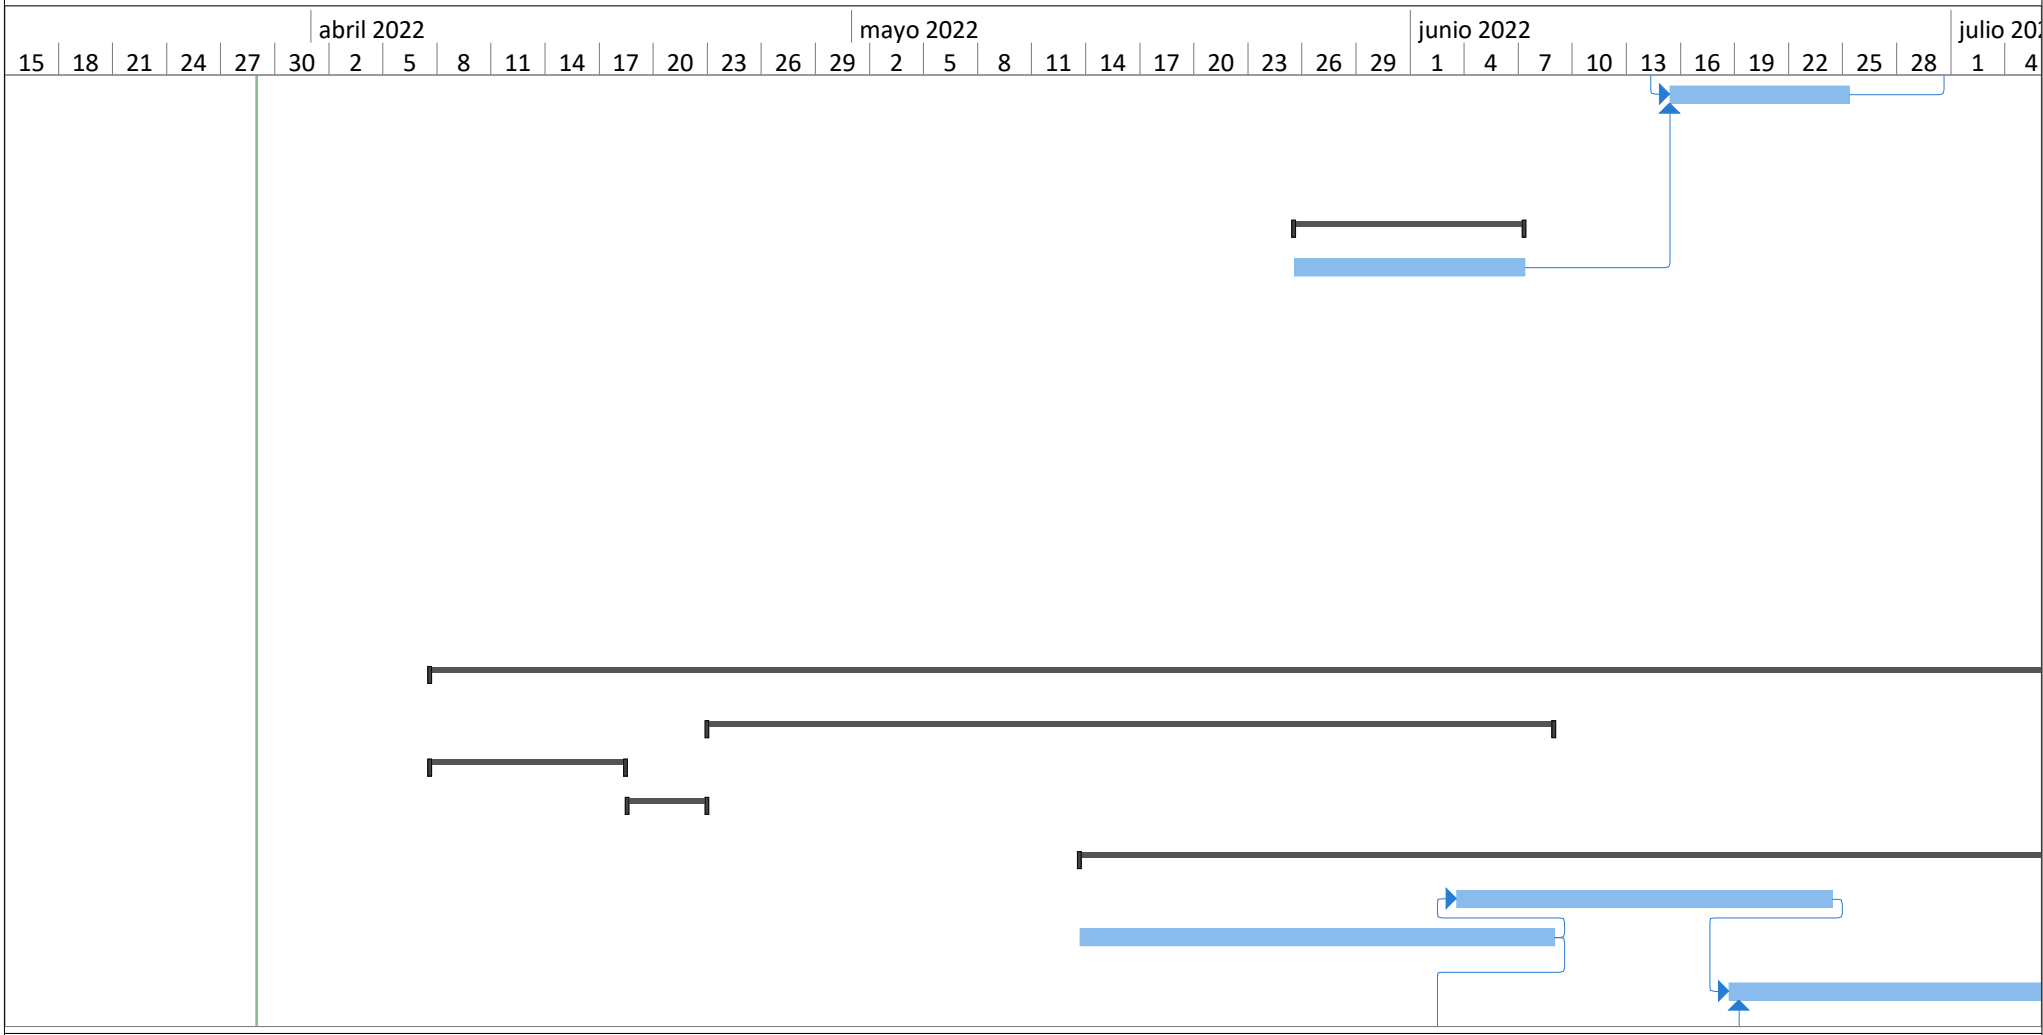

Elaboró:

ALCALDÍA MONTERIA

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORRDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 920 DE 2021

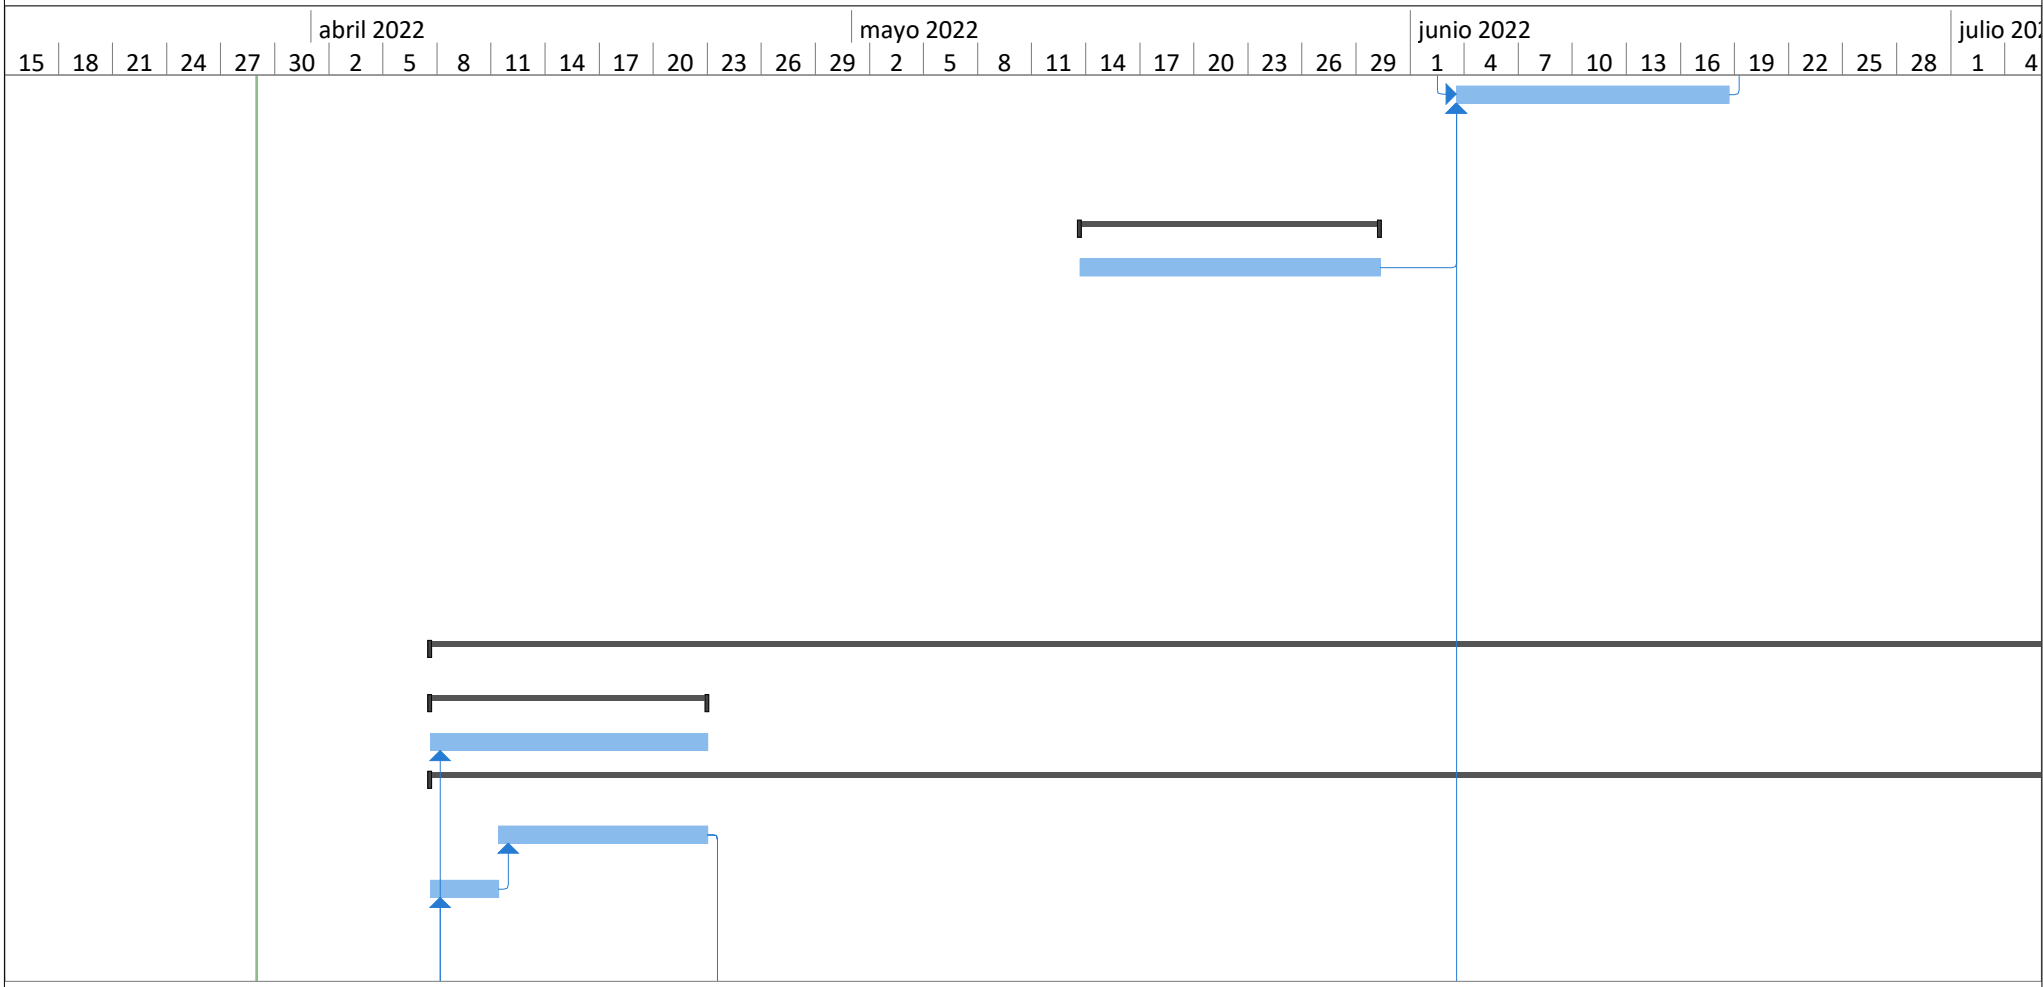

Elaboró:

ALCALDÍA MONTERIA

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORRDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 920 DE 2021

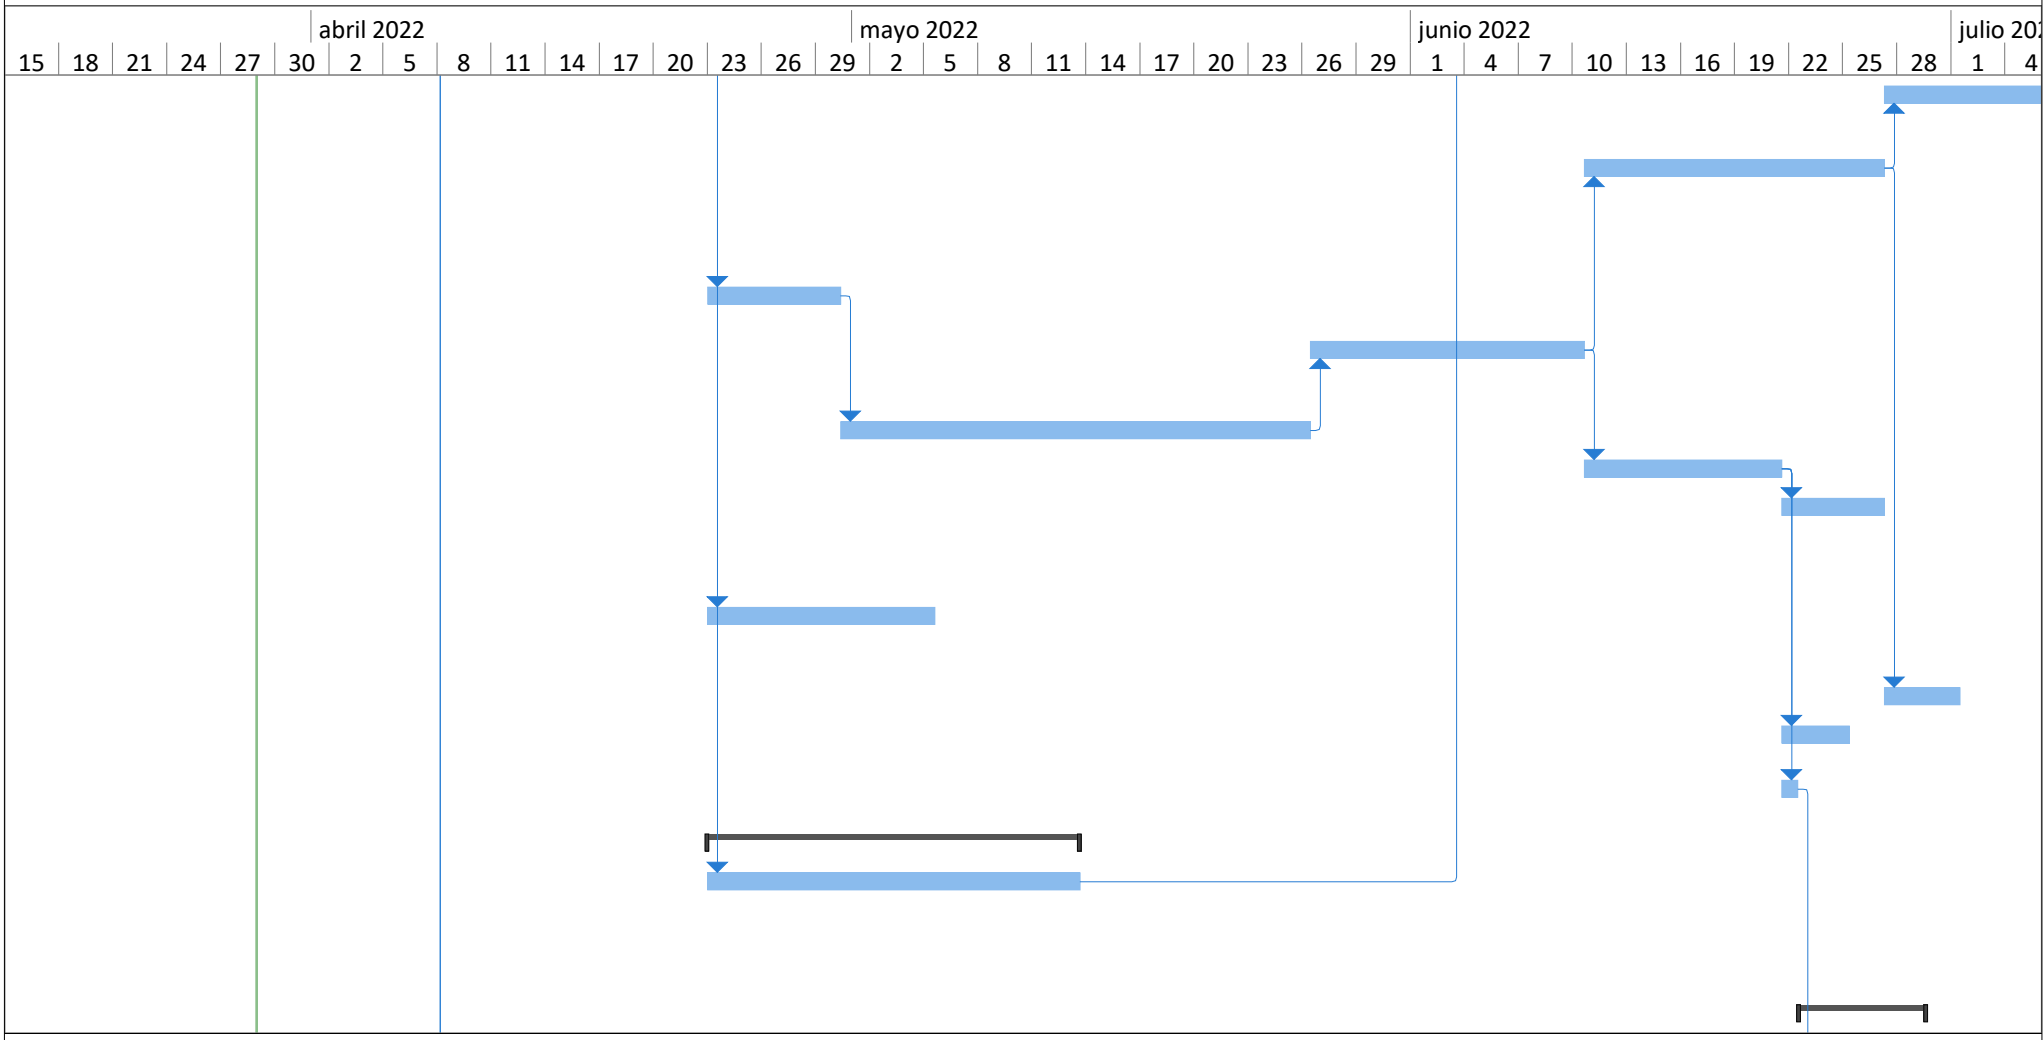

Elaboró:

ALCALDÍA MONTERIA

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORRDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 920 DE 2021

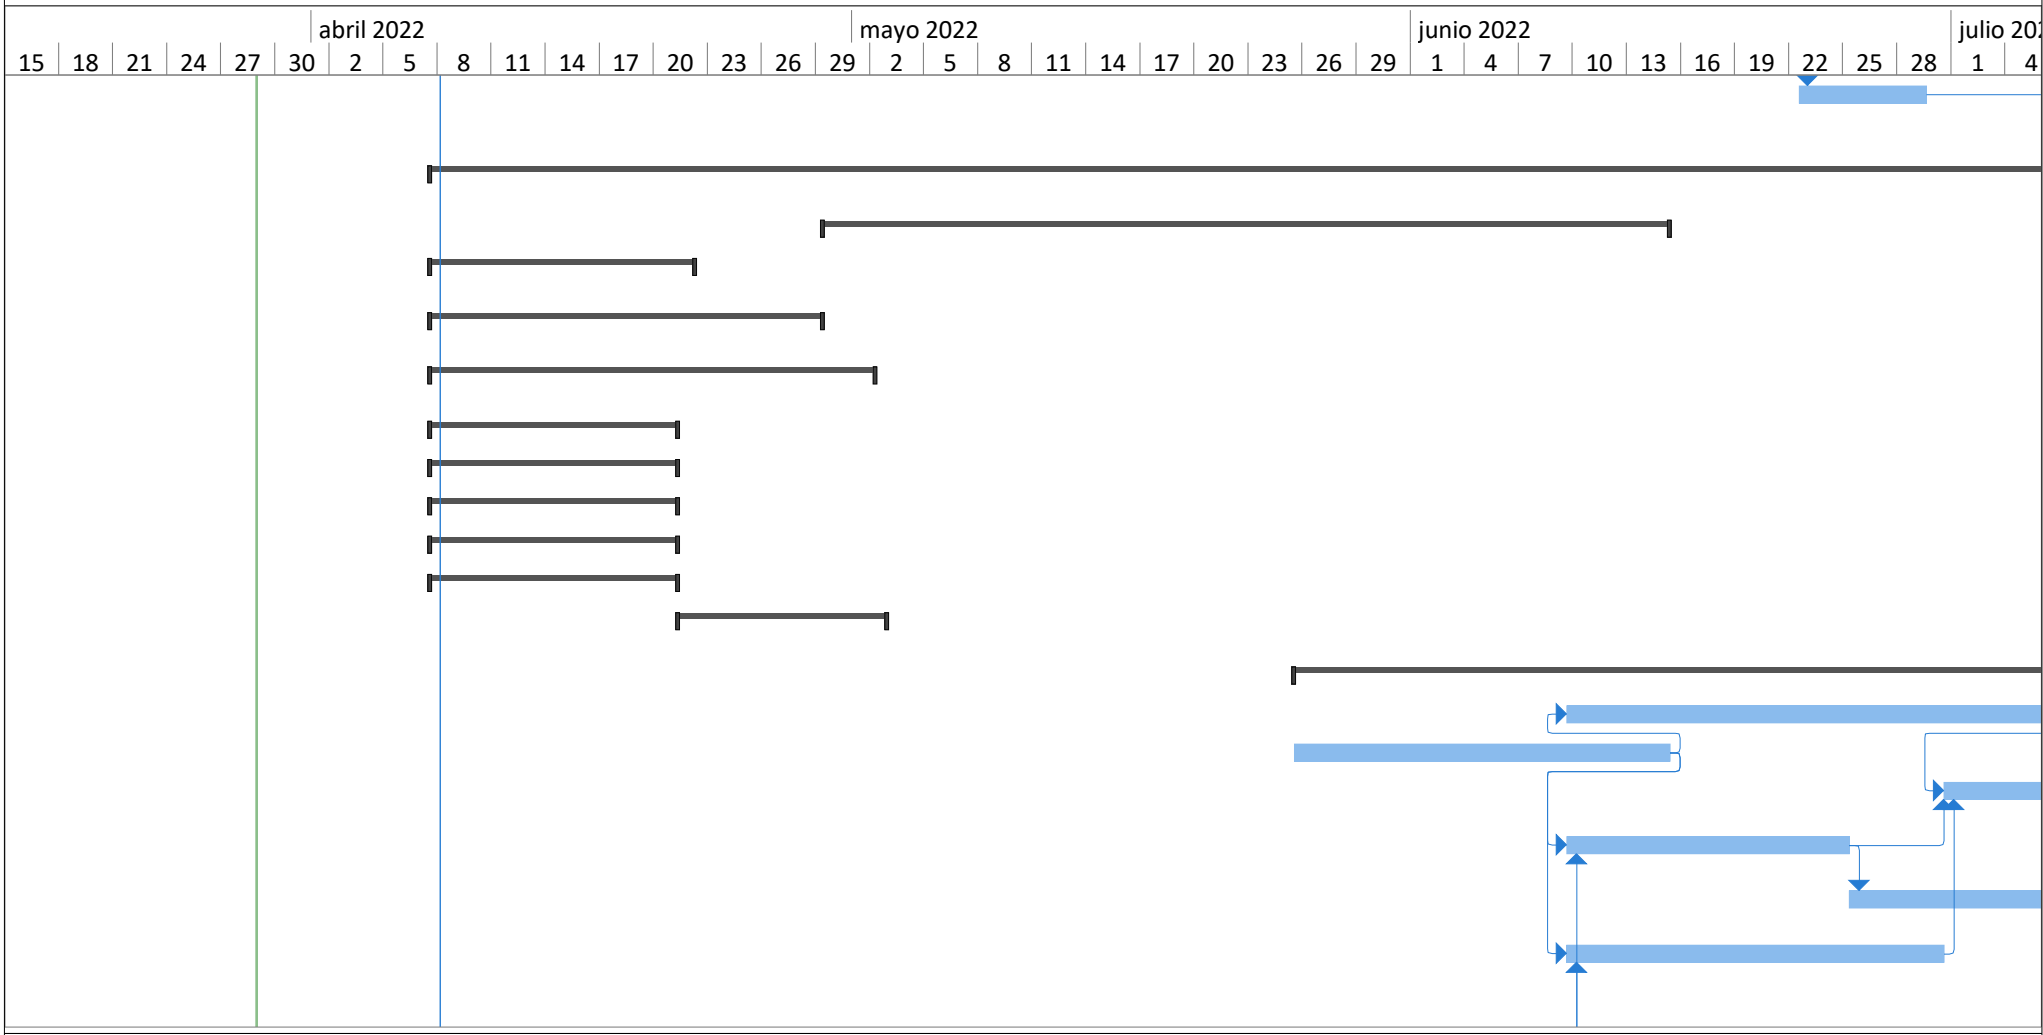

Elaboró:

ALCALDÍA MONTERIA

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORRDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 920 DE 2021

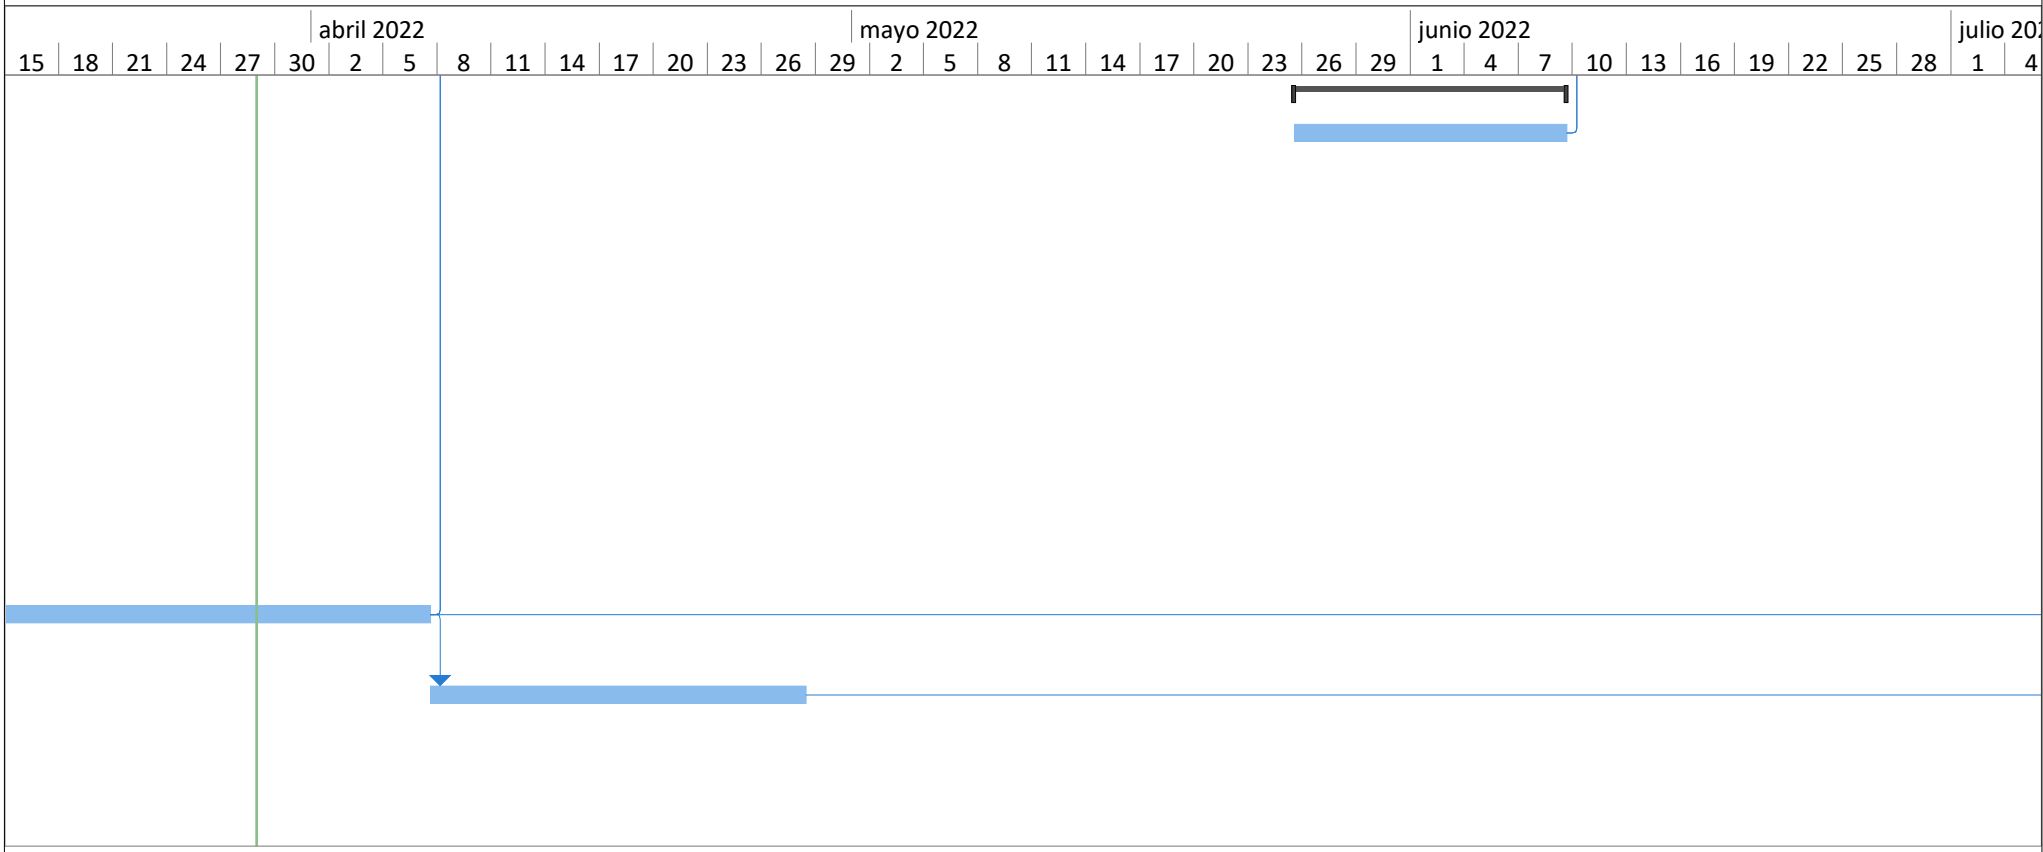

Elaboró:

ALCALDÍA MONTERIA

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORRDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 920 DE 2021

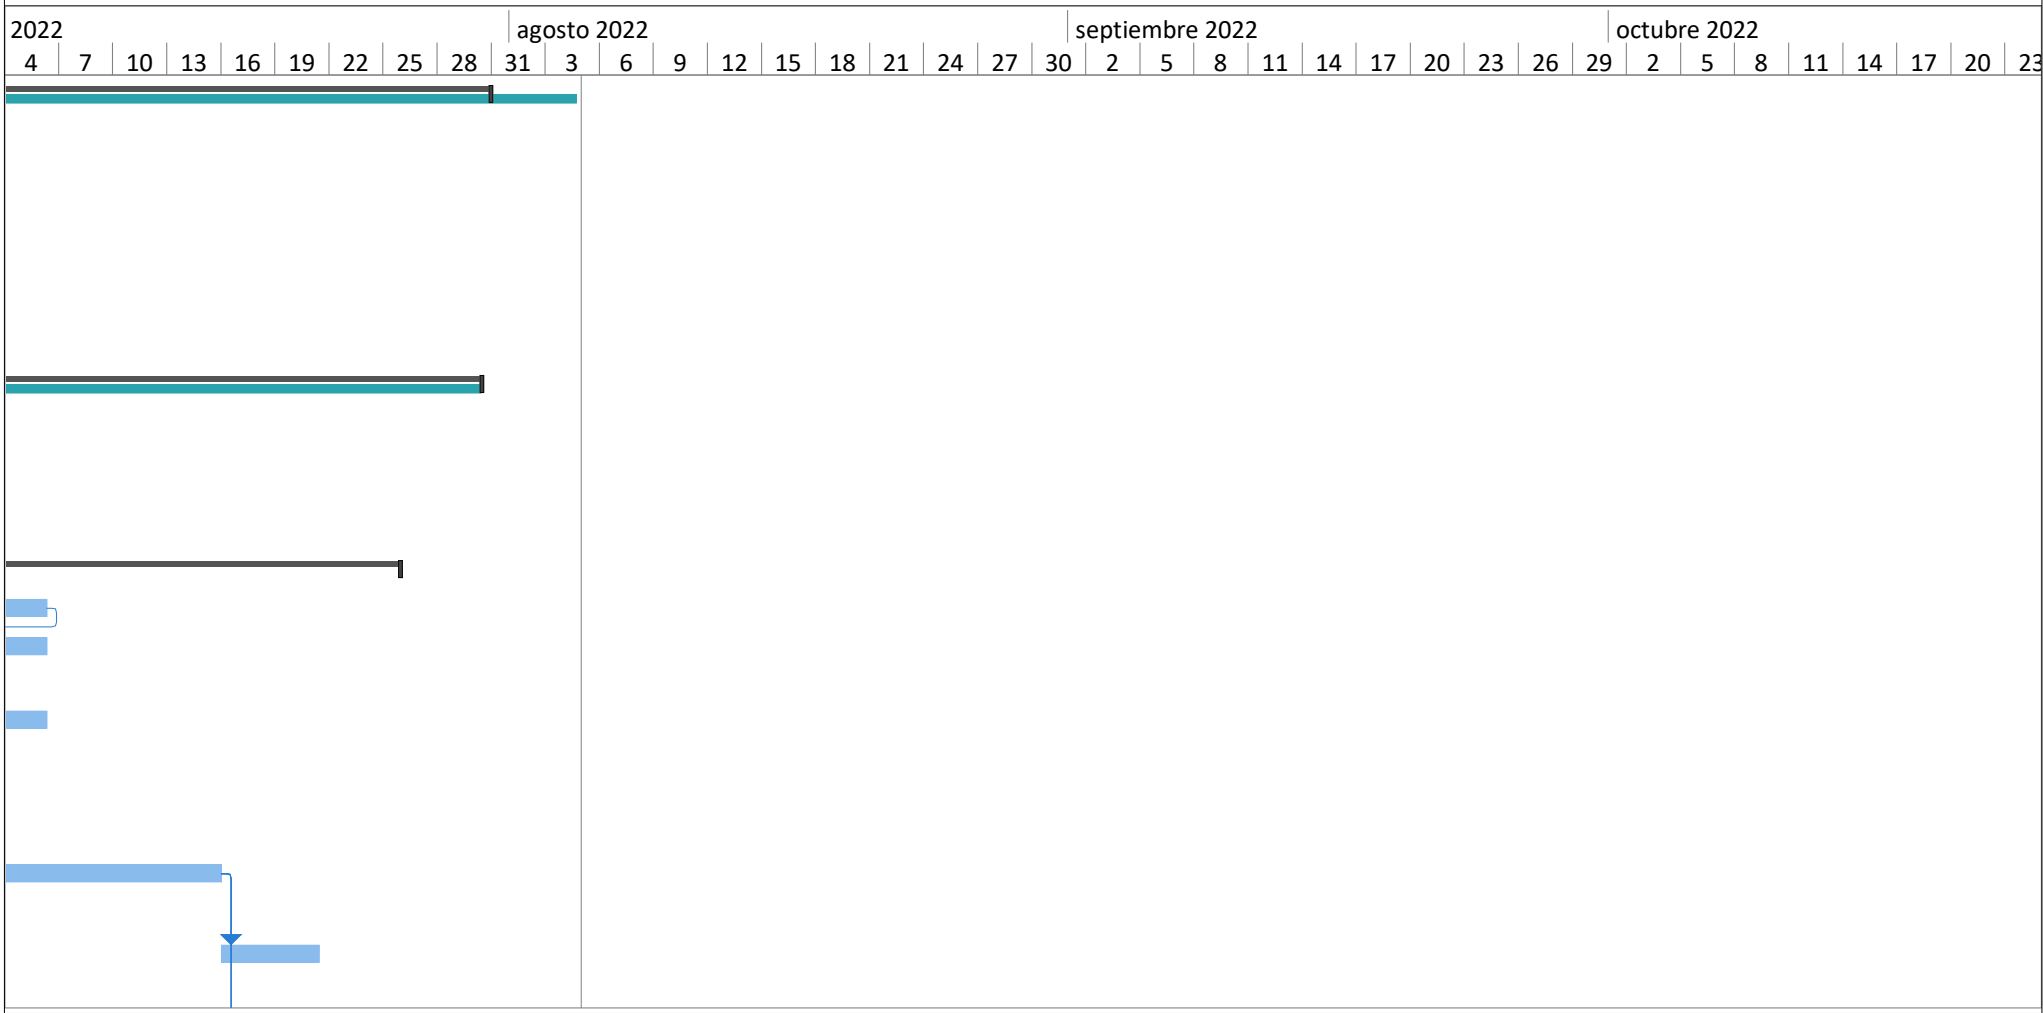

Elaboró:

ALCALDÍA MONTERIA

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORRDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 920 DE 2021

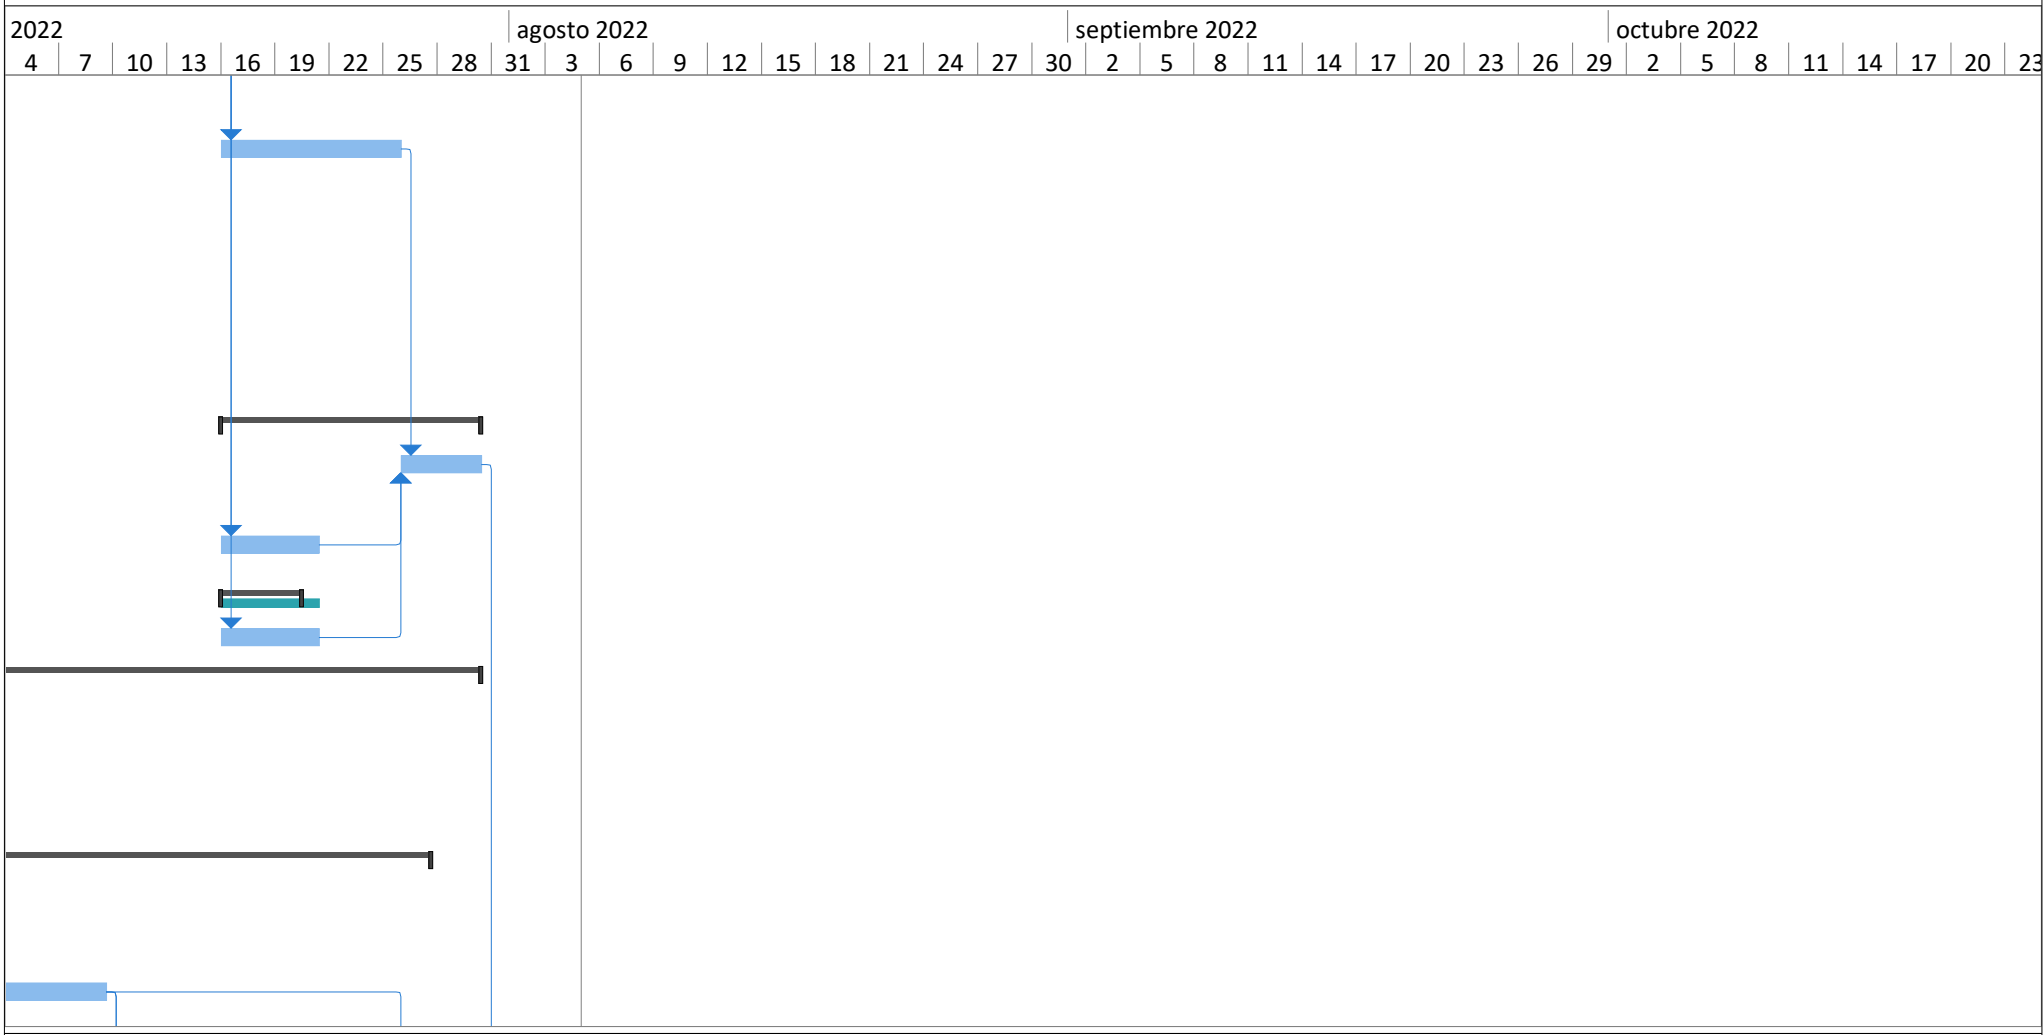

Elaboró:

ALCALDÍA MONTERIA

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORRDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 920 DE 2021

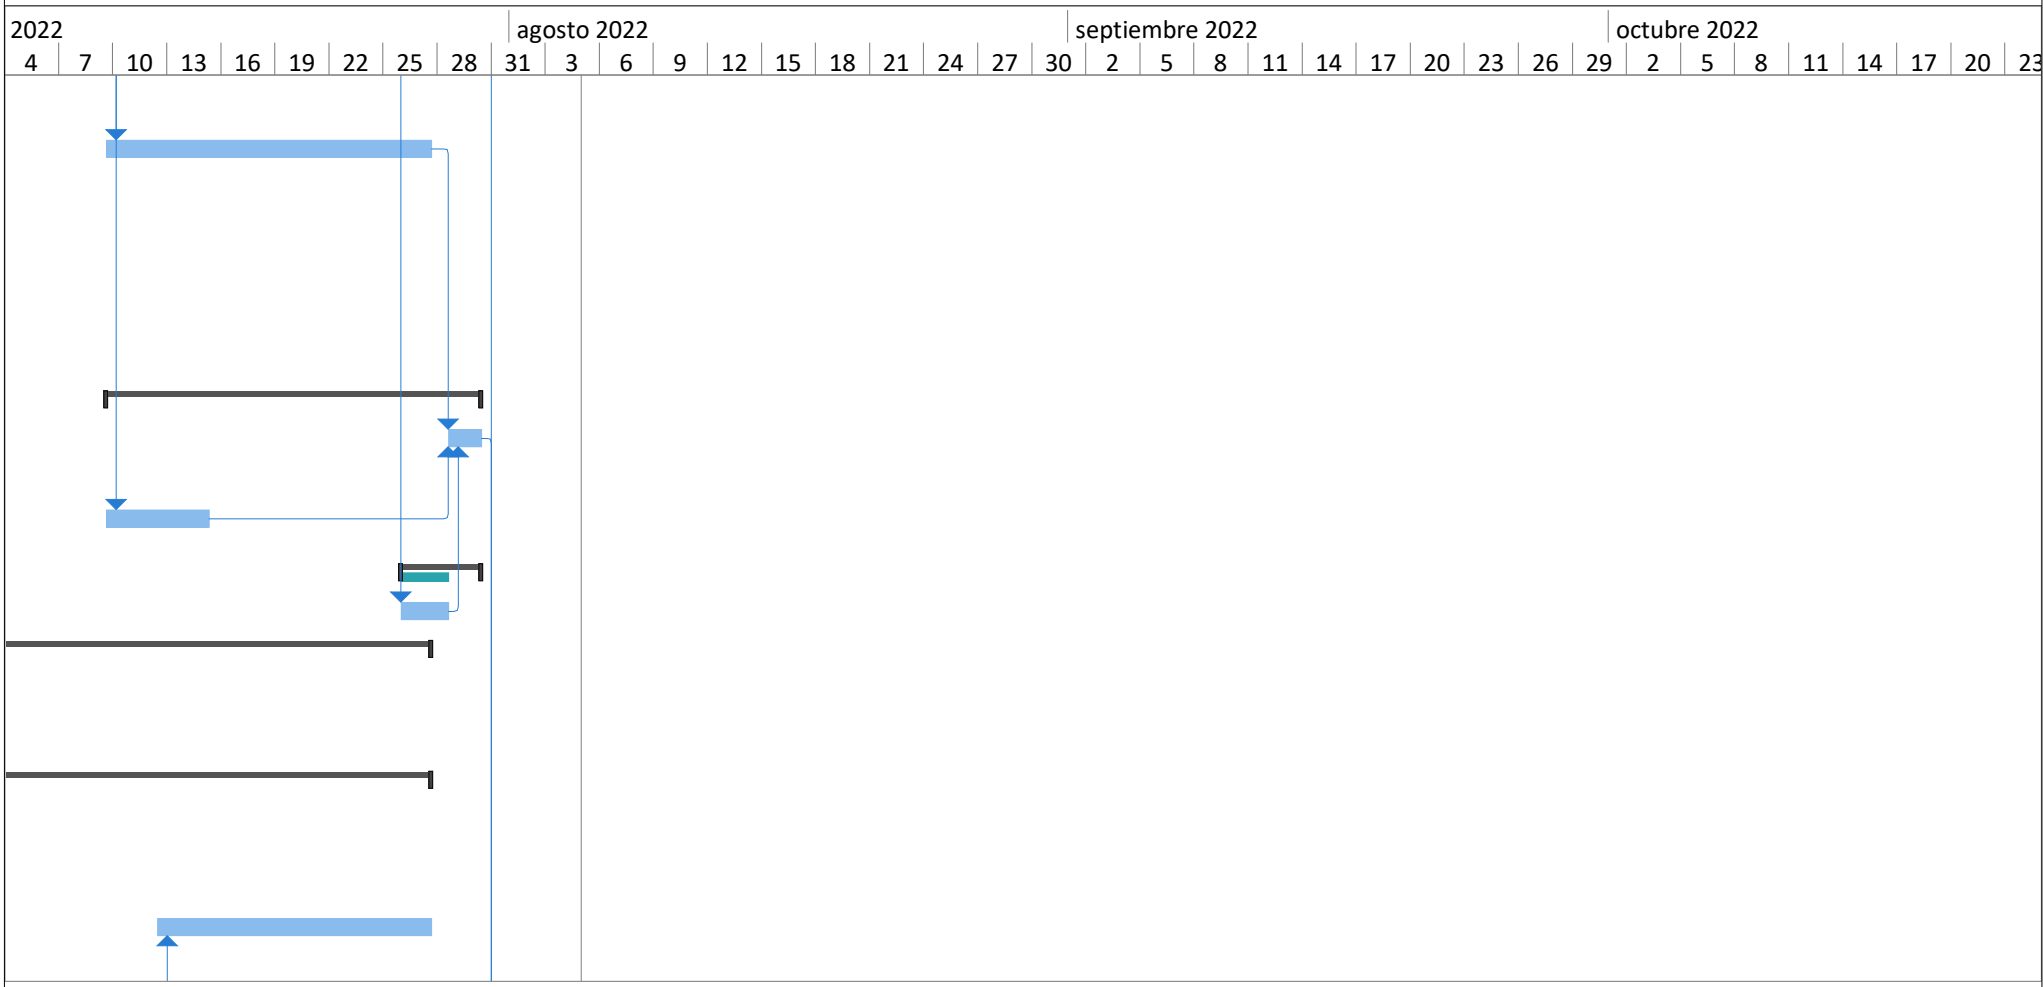

Elaboró:

ALCALDÍA MONTERIA

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORRDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 920 DE 2021

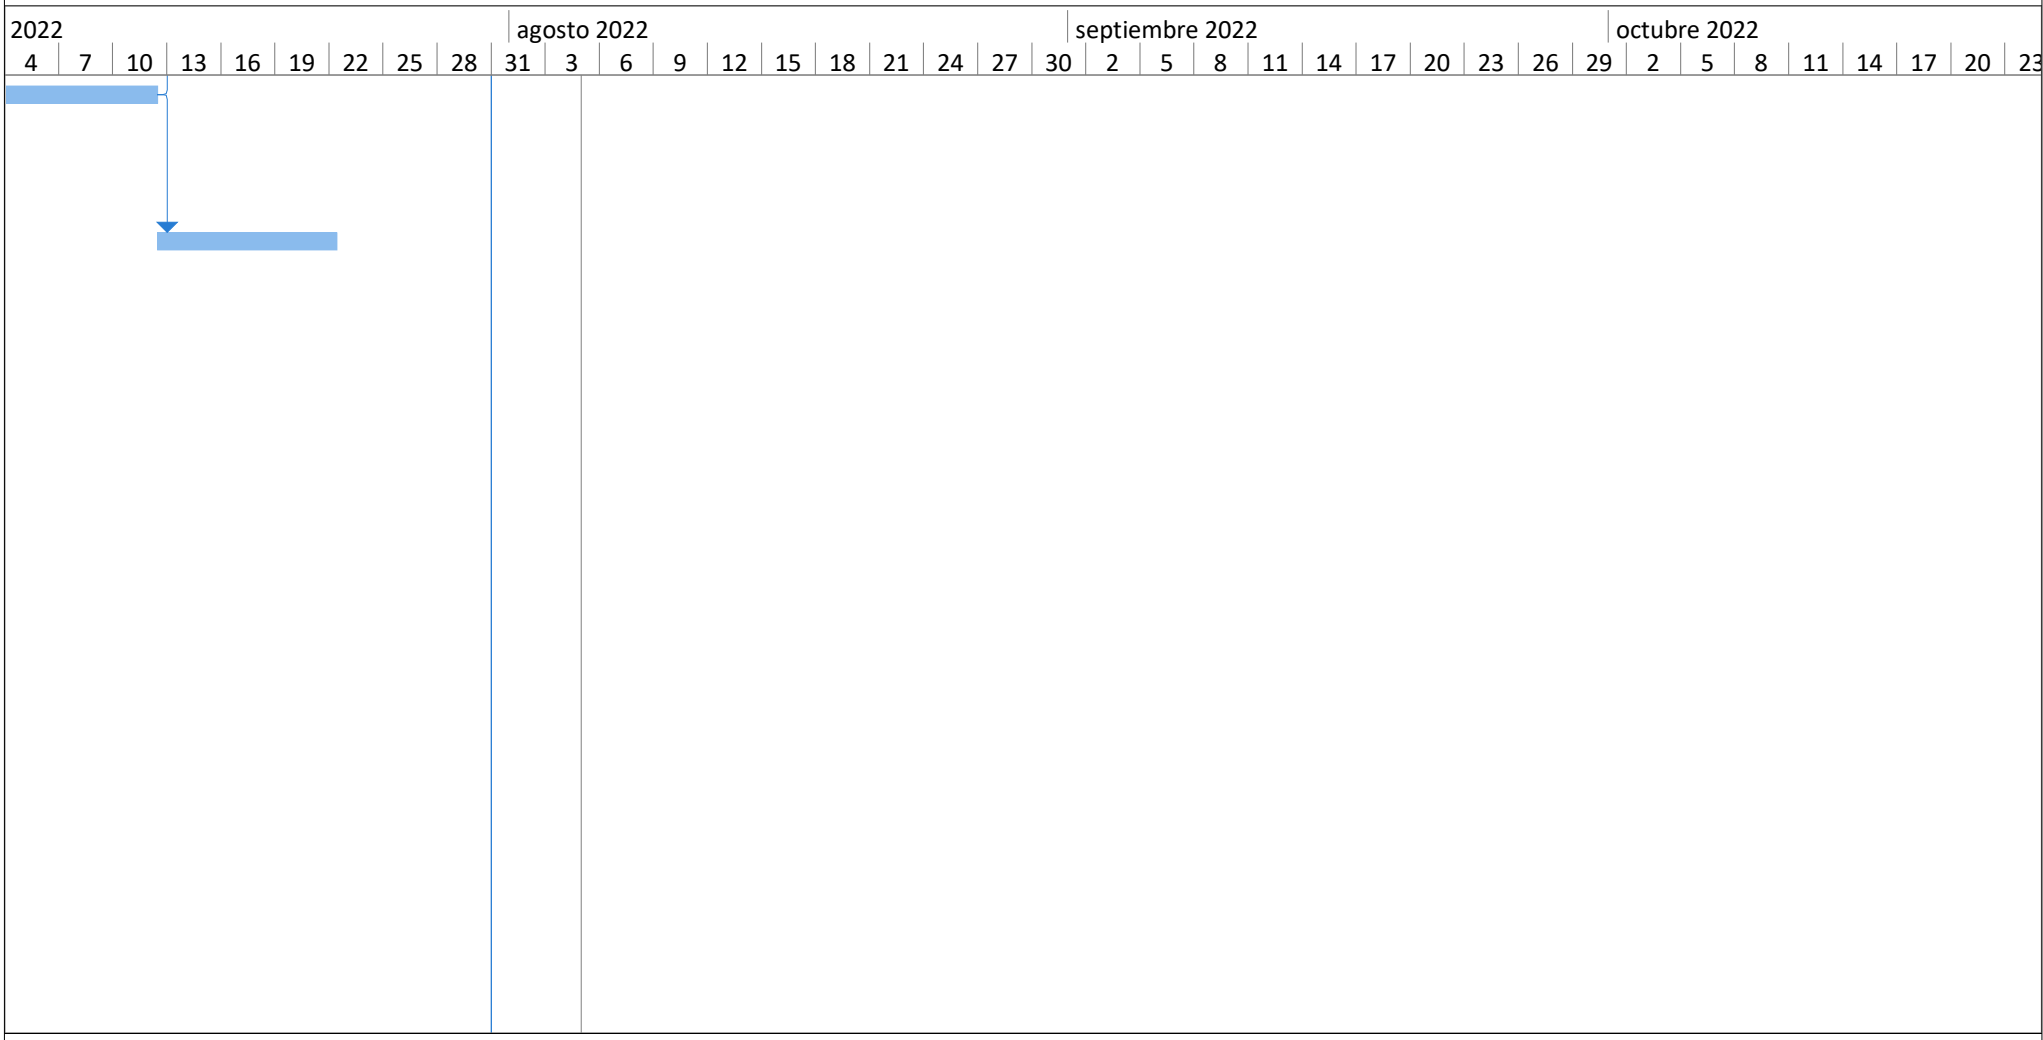

Elaboró:

ALCALDÍA MONTERIA

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORRDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 920 DE 2021

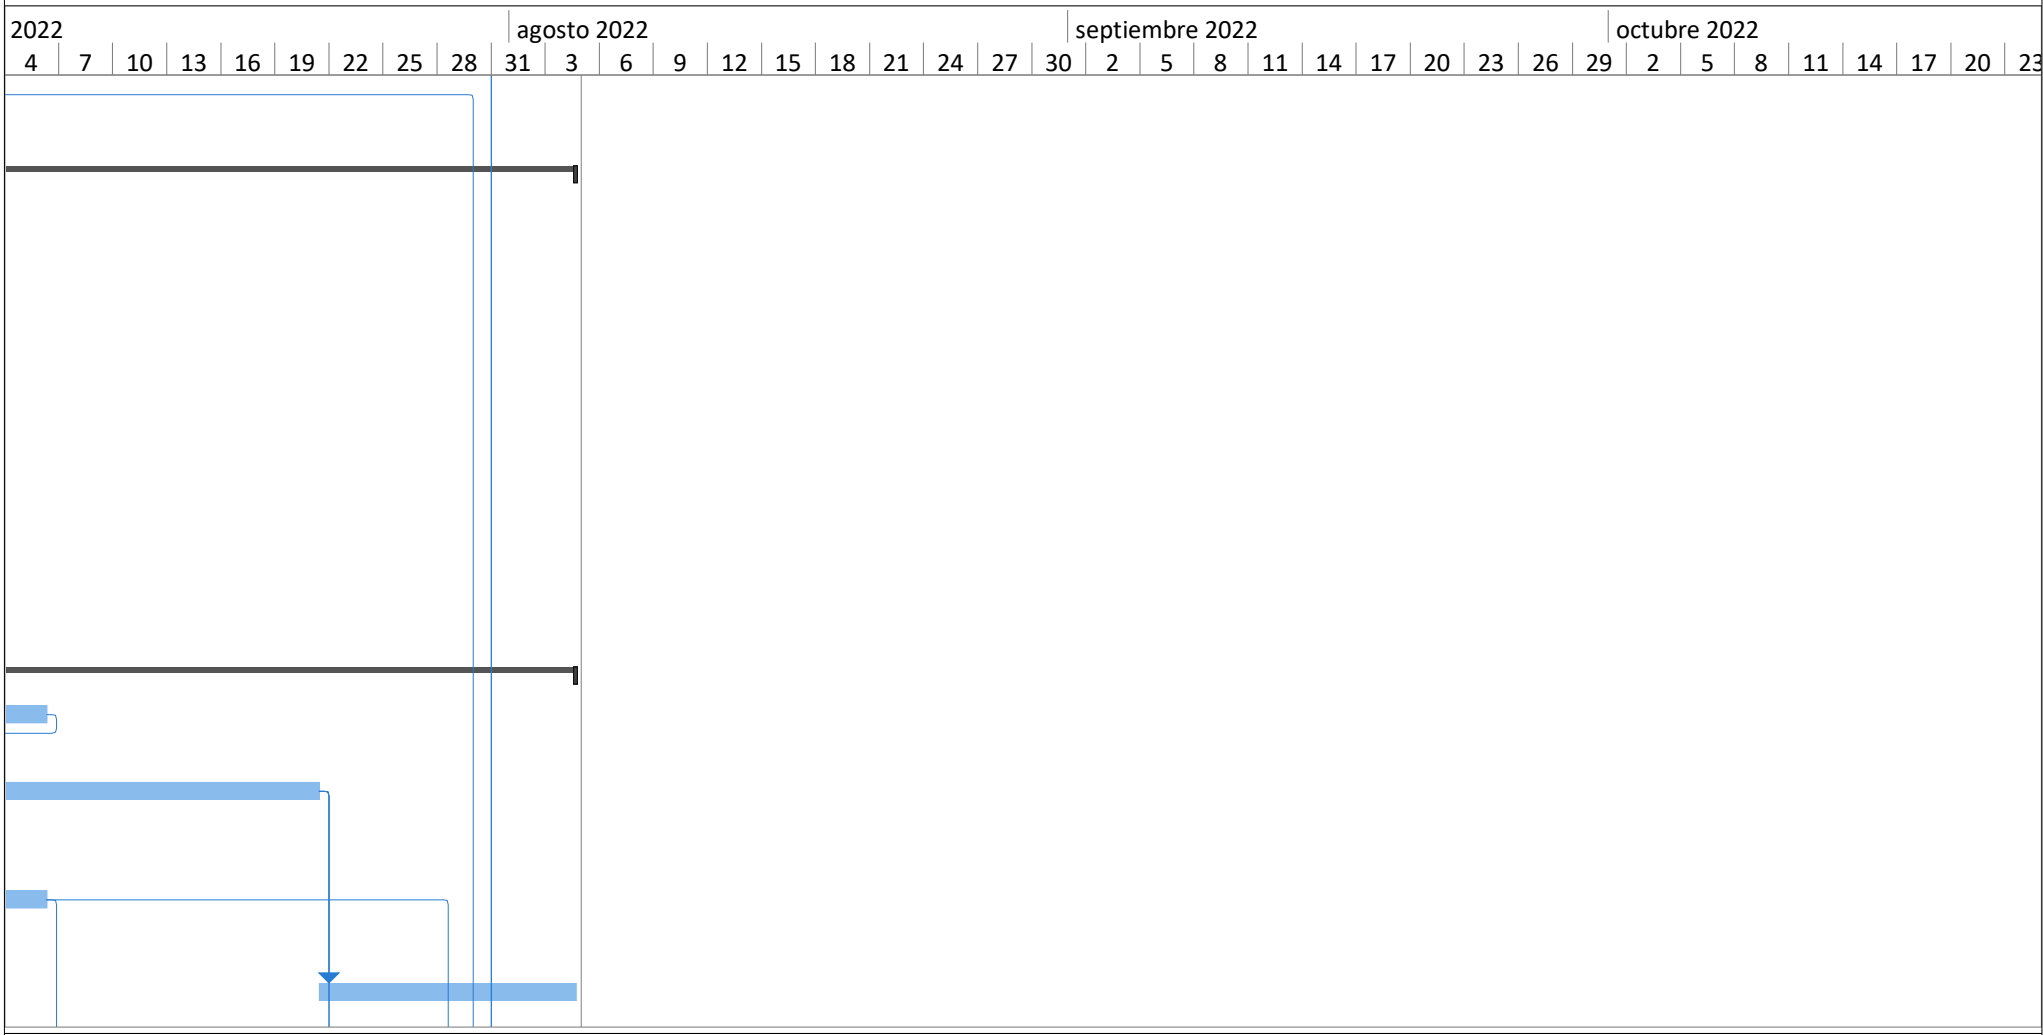

Elaboró:

ALCALDÍA MONTERIA

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORRDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - COLOMBIA RURAL. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 920 DE 2021

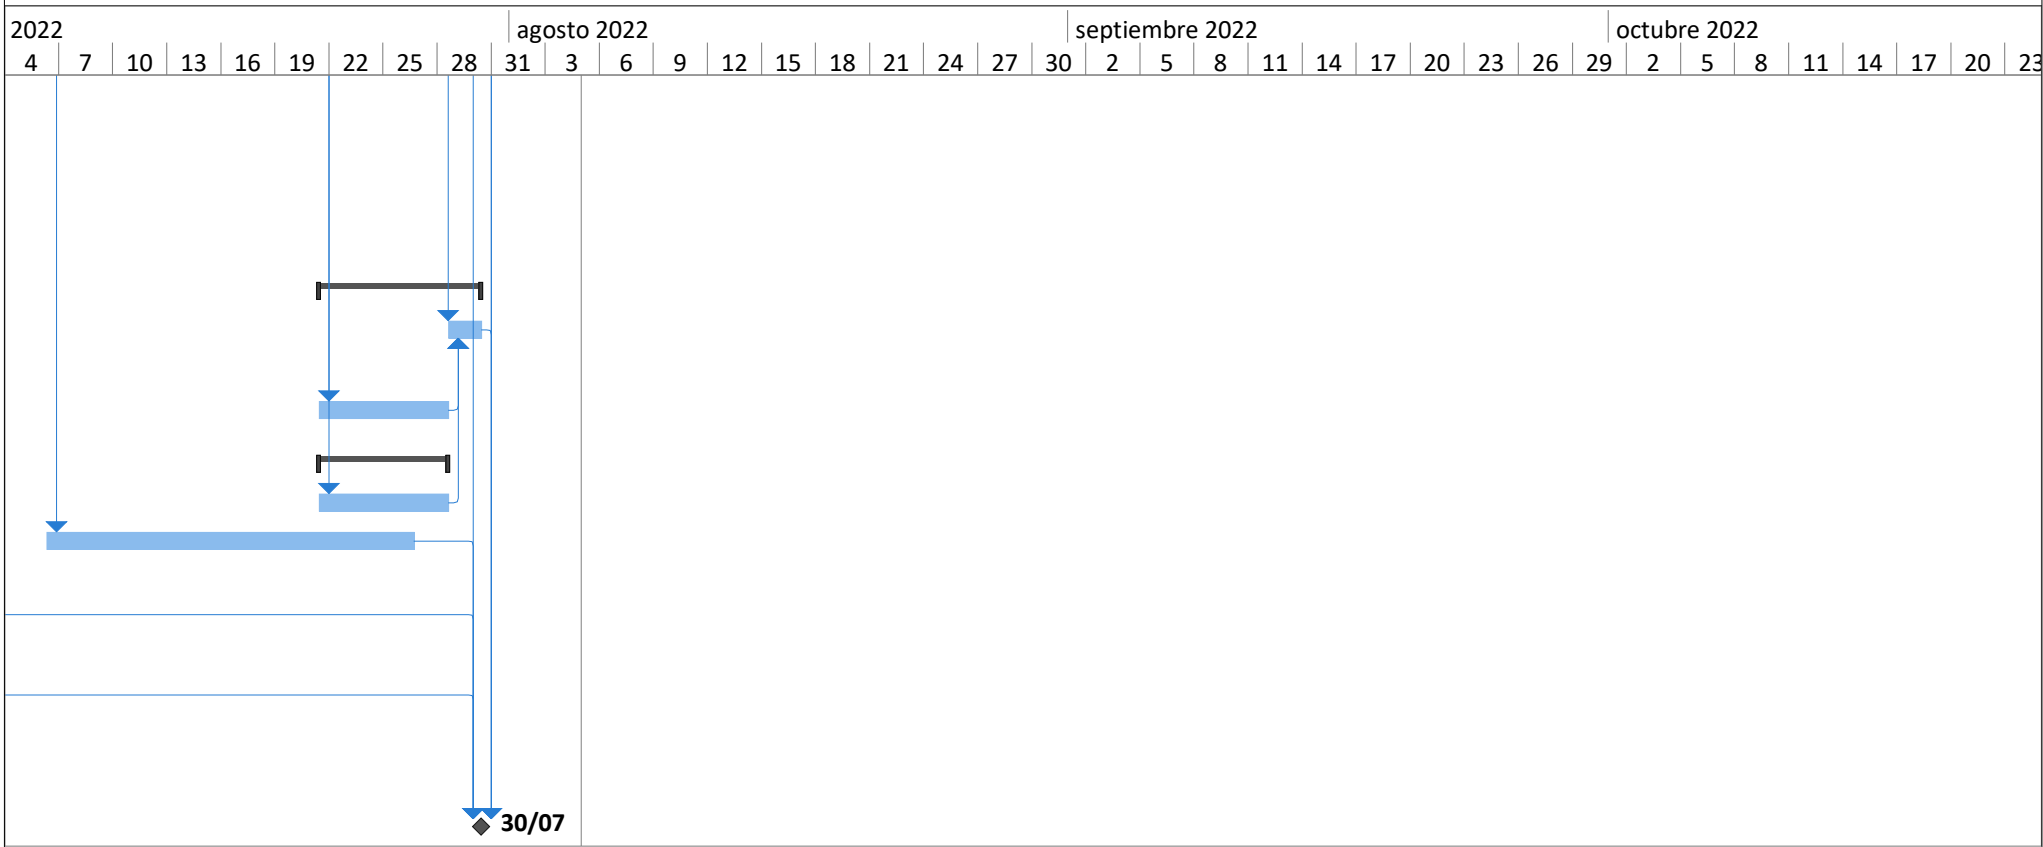

Elaboró:

□RO□R□M□□D□□O□R□□

□O□□R□□O1□□□–□□□□□□

M□□□□□□O□D□□□□□□□O□□□□□O□

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**PROGRAMA PAVIMENTO PUEBLO NUEVO**	**87 días?**	**jue 10/08/23**	**vie 8/12/23**
2		INICIO	0 días	jue 10/08/23	jue 10/08/23
3		AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	20 días	lun 14/08/23	vie 8/09/23
4		**I. EXPLANACIONES**	**20 días**	**lun 11/09/23**	**vie 6/10/23**
5		Excavación en material comun de la explanacion y canales	20 días	lun 11/09/23	vie 6/10/23
6		Terraplenes	8 días	lun 18/09/23	mié 27/09/23
7		Pedraplen (Material para mejoramiento de subrasante)	3 días	lun 18/09/23	mié 20/09/23
8		**II. PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO MR 40 MPA**	**50 días**	**jue 28/09/23**	**mié 6/12/23**
9		Subbase Granular clase C	10 días	jue 28/09/23	mié 11/10/23
10		Pavimento en concreto hidraulico modulo de rotura 40 Mpa	20 días	jue 12/10/23	mié 8/11/23
11		Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) CUNETAS	6 días	jue 16/11/23	jue 23/11/23
12		Acero de refuerzo FY = 4.200 kg/cm2 (60.000 PSI).	15 días	jue 12/10/23	mié 1/11/23

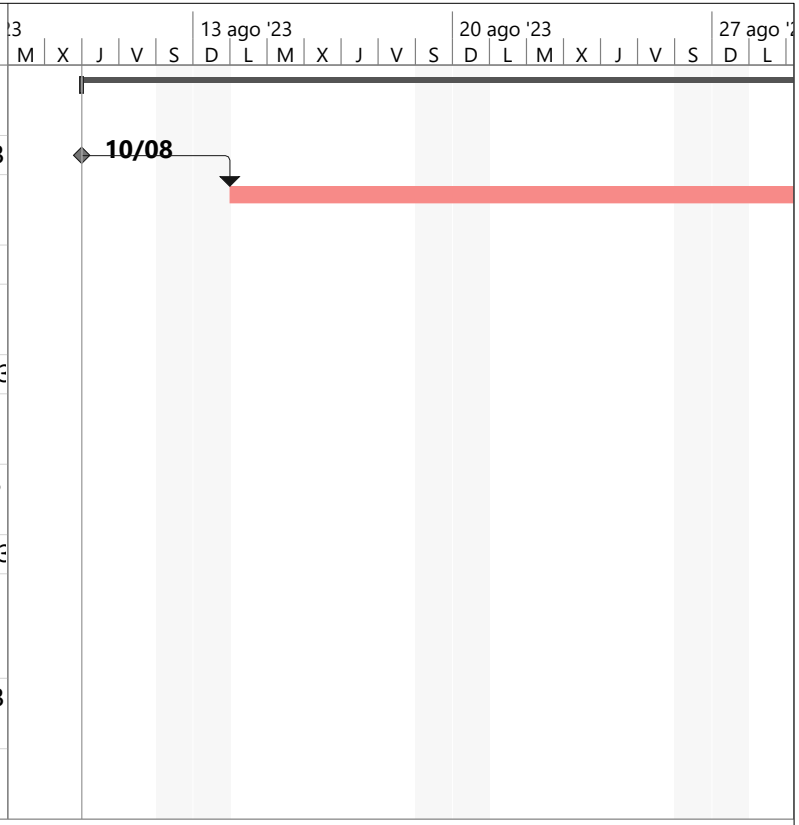

Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: mar 17/10/23

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
13		Bordillo de piezas prefabricadas de concreto 50X20X80, incluye la preparacion de la superficie de apoyo	15 días	jue 2/11/23	mié 22/11/23
14		Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - ANDENES Y VIGAS DE CONFINAMIENTO	12 días	mar 21/11/23	mié 6/12/23
15		Relleno para estructuras con recebo	5 días	jue 9/11/23	mié 15/11/23
16		**III. TRANSPORTES**	**20 días**	**lun 11/09/23**	**vie 6/10/23**
17		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanacion, canales y prestamos para distacias mayores de mil metros (1.000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	20 días	lun 11/09/23	vie 6/10/23
18		**IV. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD**	**1 día**	**jue 7/12/23**	**jue 7/12/23**
19		Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm	1 día	jue 7/12/23	jue 7/12/23
20		Linea de demarcación con pintura en frio	1 día	jue 7/12/23	jue 7/12/23
21		**V. CARACTERIZACION VIAL**	**1 día?**	**vie 8/12/23**	**vie 8/12/23**



Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: mar 17/10/23

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
22		Caracterización del corredor	1 día?	vie 8/12/23	vie 8/12/23
23		**VI. REPOSIION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO**	**65 días**	**lun 11/09/23**	**vie 8/12/23**
24		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO A MANO	5 días	lun 11/09/23	vie 15/09/23
25		RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO	3 días	mié 27/09/23	vie 29/09/23
26		RELLENO CON ARENA	2 días	lun 18/09/23	mar 19/09/23
27		S/I TUBERIA PRESION DE 3" RDE 21	3 días	mié 20/09/23	vie 22/09/23
28		S/I CODO PVC-P 90° D=3"	1 día	lun 25/09/23	lun 25/09/23
29		S/I VALVULA DE COMPUERTA D=3"	1 día	lun 25/09/23	lun 25/09/23
30		S/I TEE PVC-P D=3"	1 día	lun 25/09/23	lun 25/09/23
31		S/I TUBERIA PRESION DE 2" RDE 21	2 días	lun 25/09/23	mar 26/09/23
32		S/I CODO PVC-P GRAN RADIO 90° D=2" U.M.	1 día	mié 27/09/23	mié 27/09/23
33		S/I VALVULA DE COMPUERTA D=2"	1 día	mié 27/09/23	mié 27/09/23
34		S/I TUBERÍA PF+UAD DOMICILIARIA 1/2". INCLUYE	5 días	mié 27/09/23	mar 3/10/23
35		FIN	0 días	vie 8/12/23	vie 8/12/23

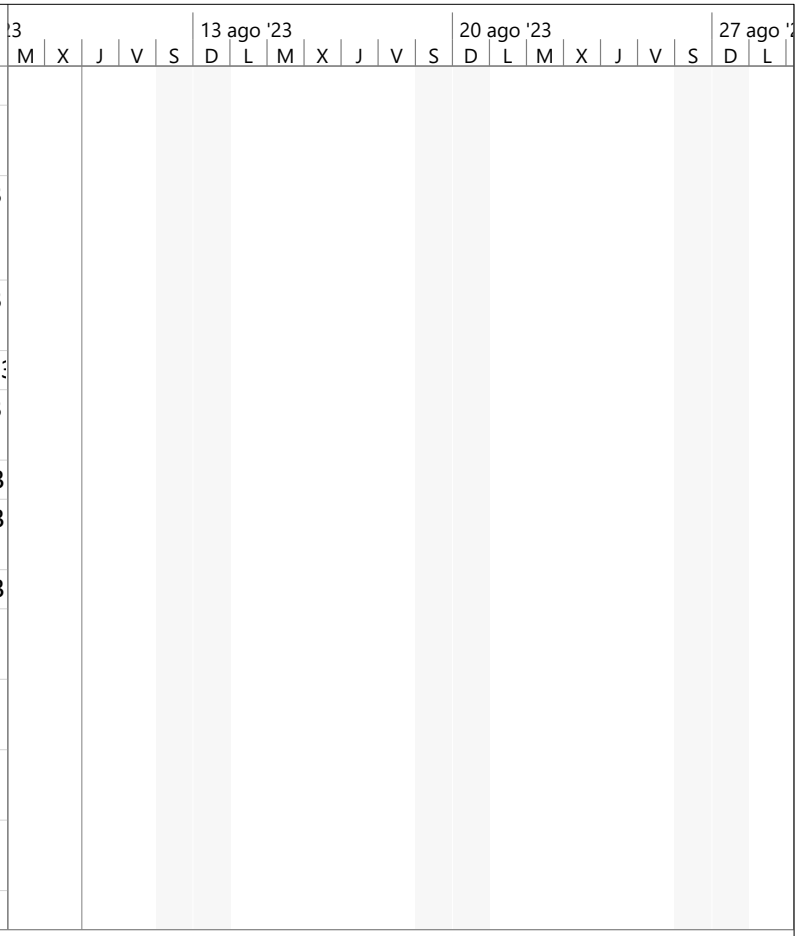

Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: mar 17/10/23

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

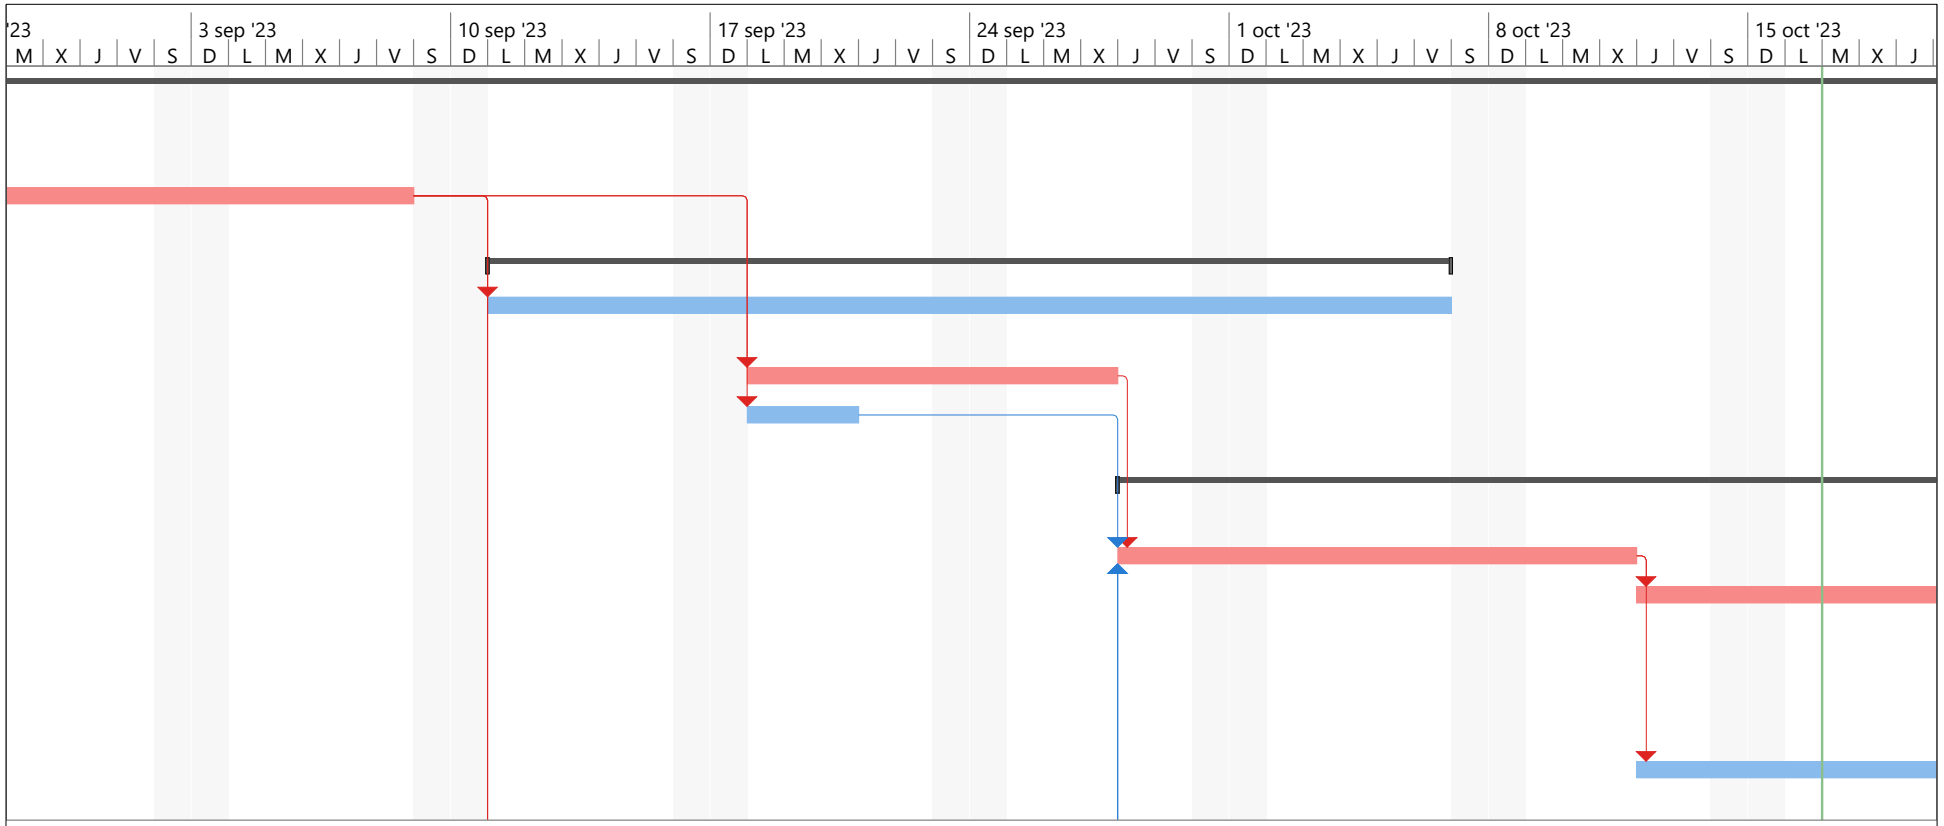

Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: mar 17/10/23

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

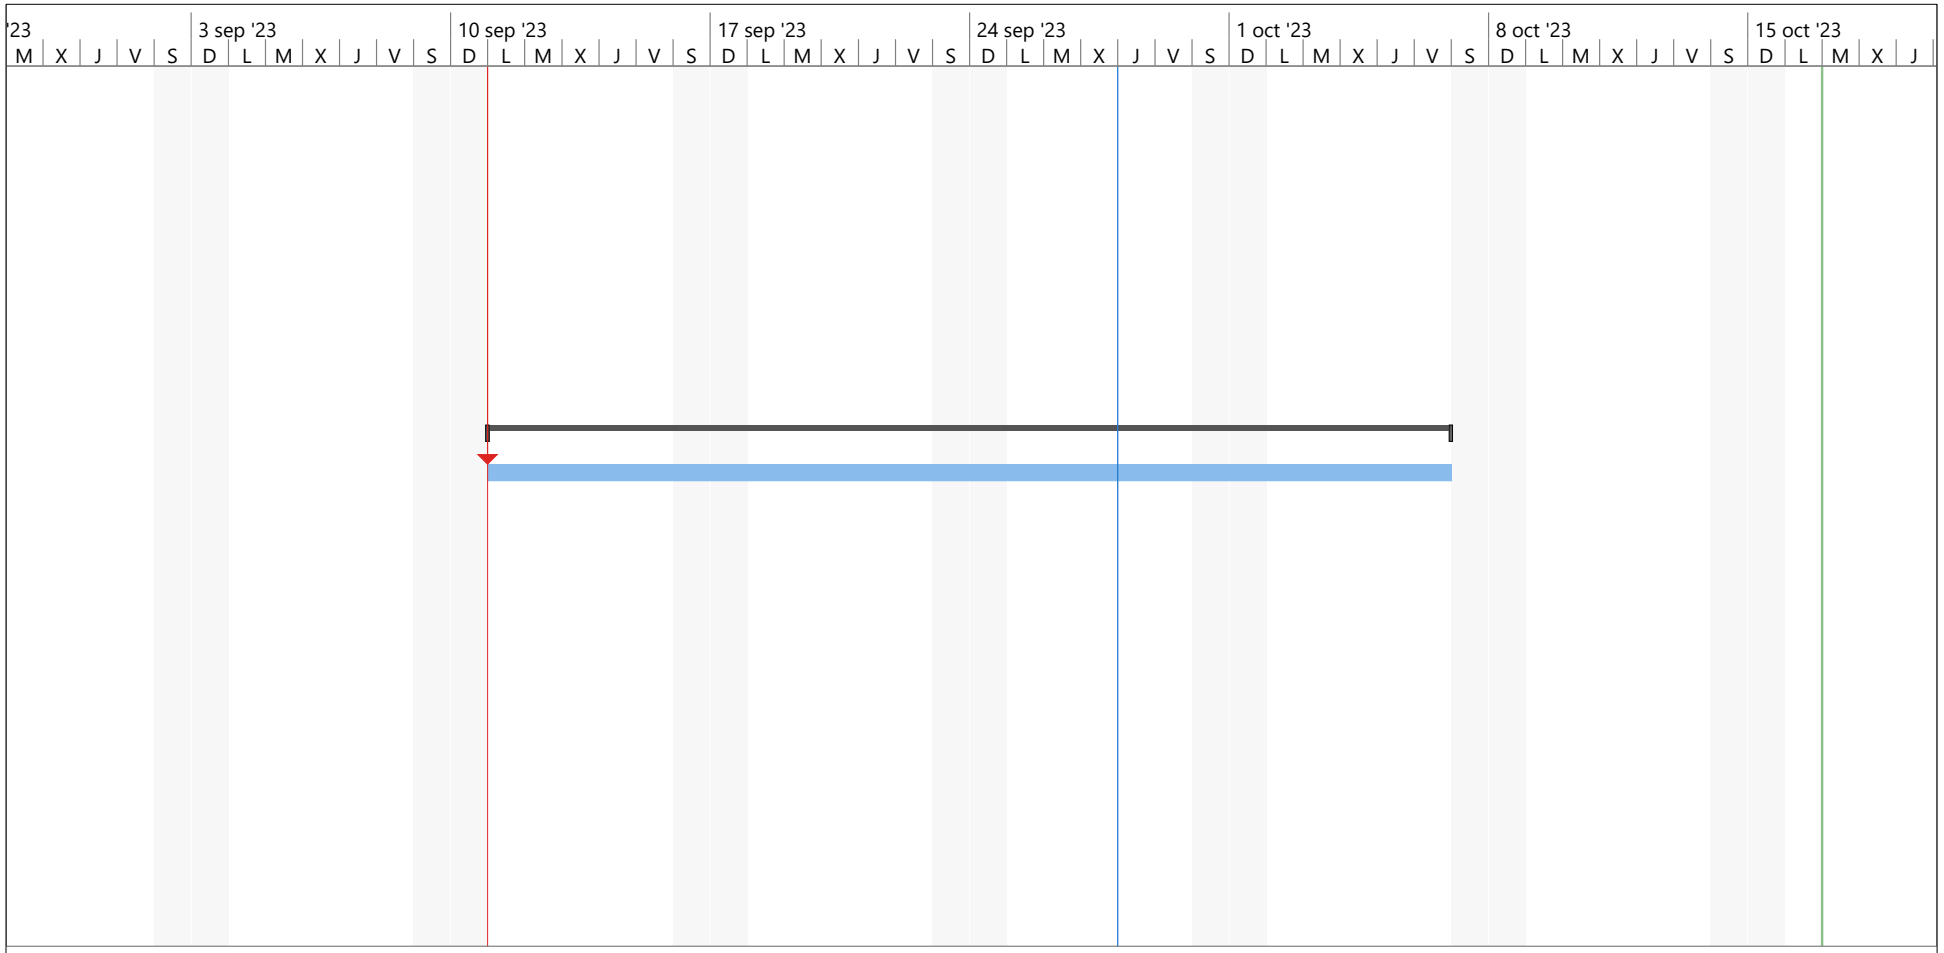

Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: mar 17/10/23

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

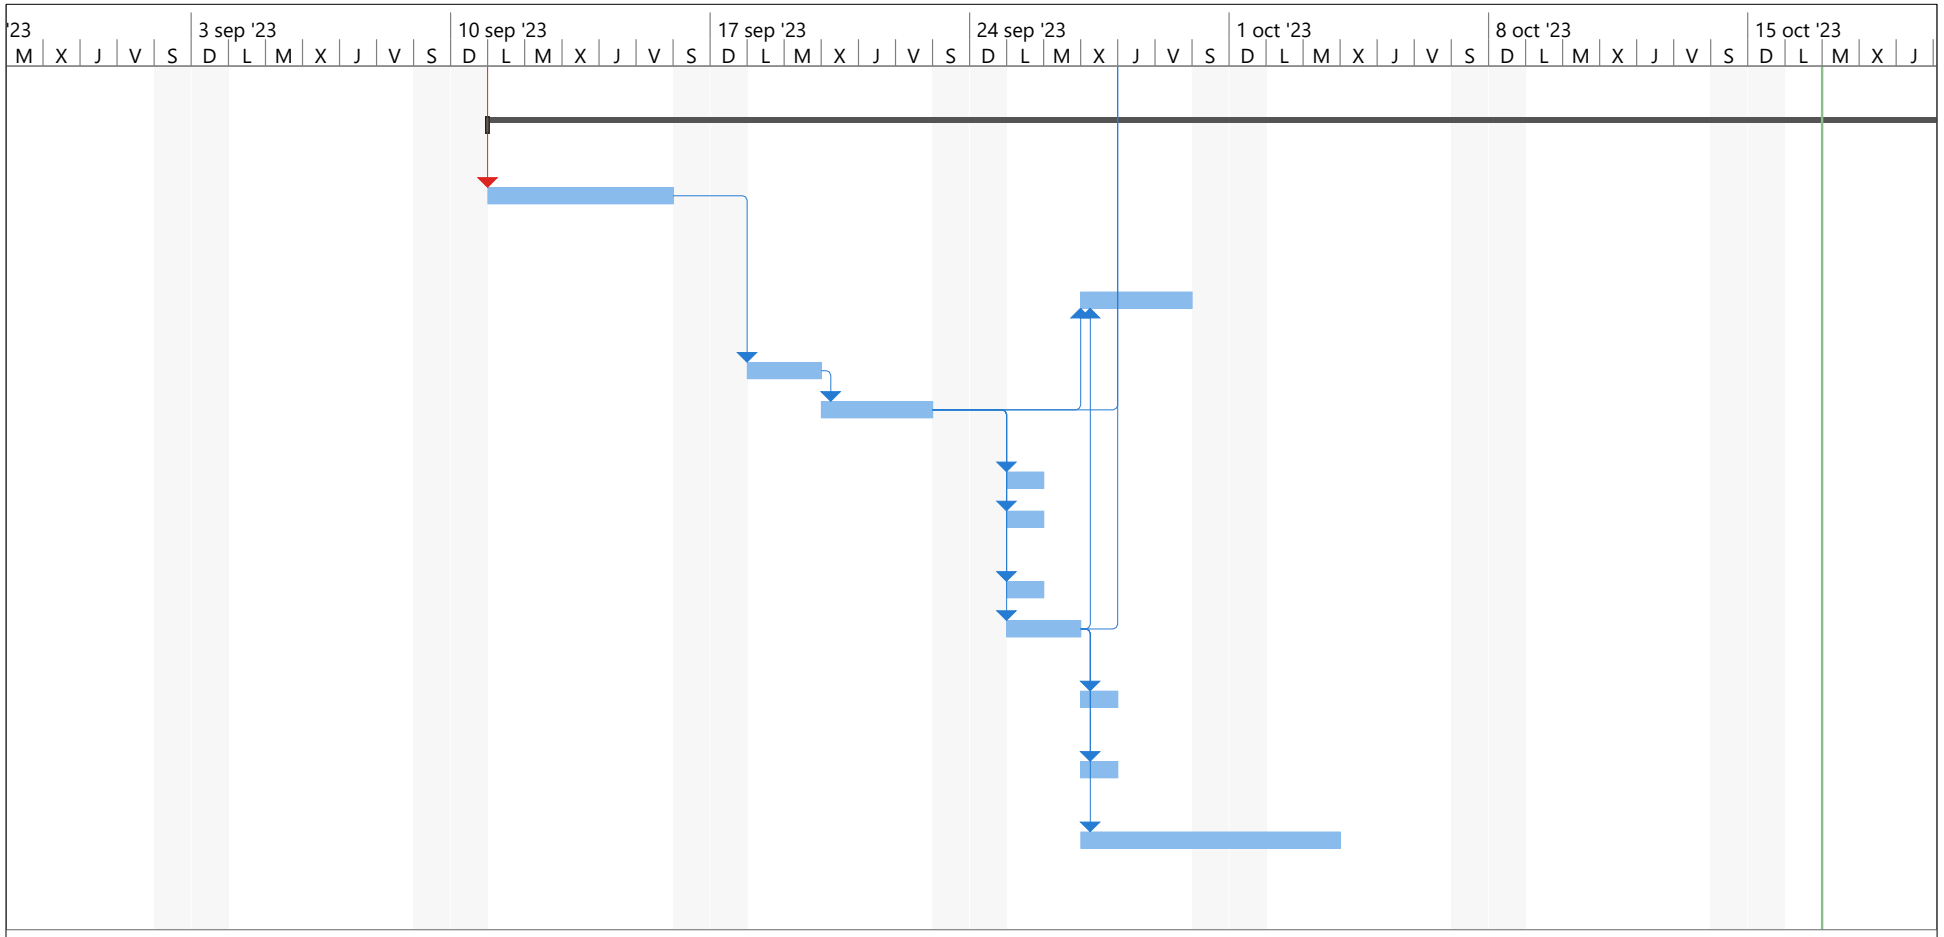

Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: mar 17/10/23

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

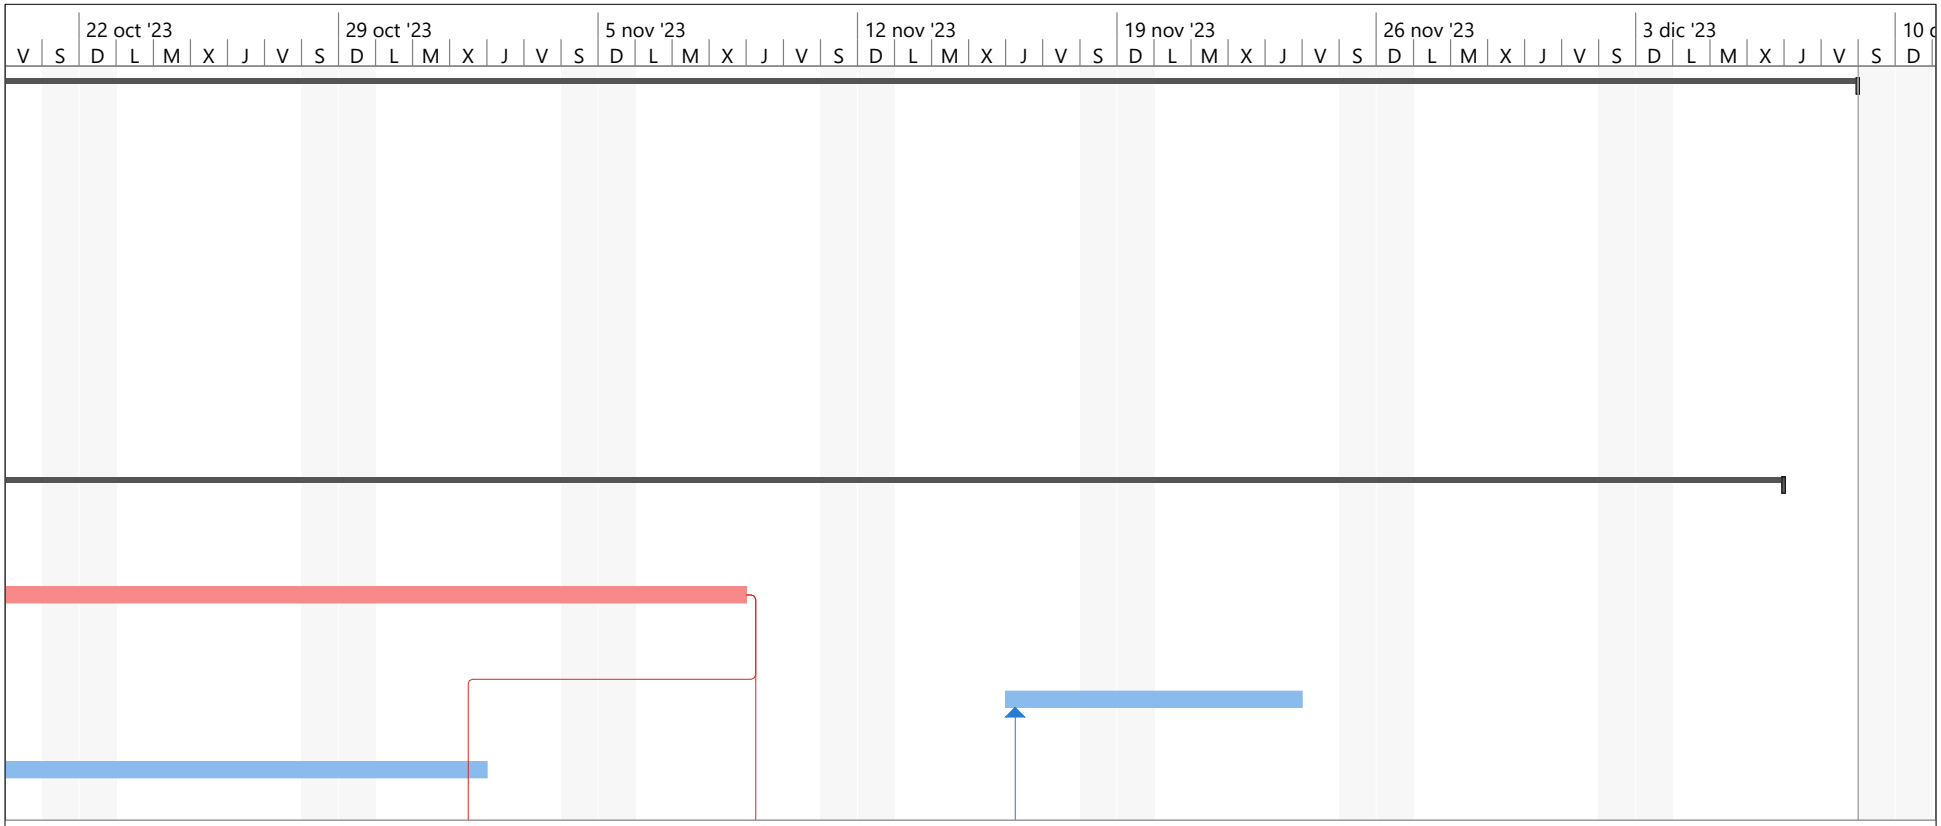

Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: mar 17/10/23

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

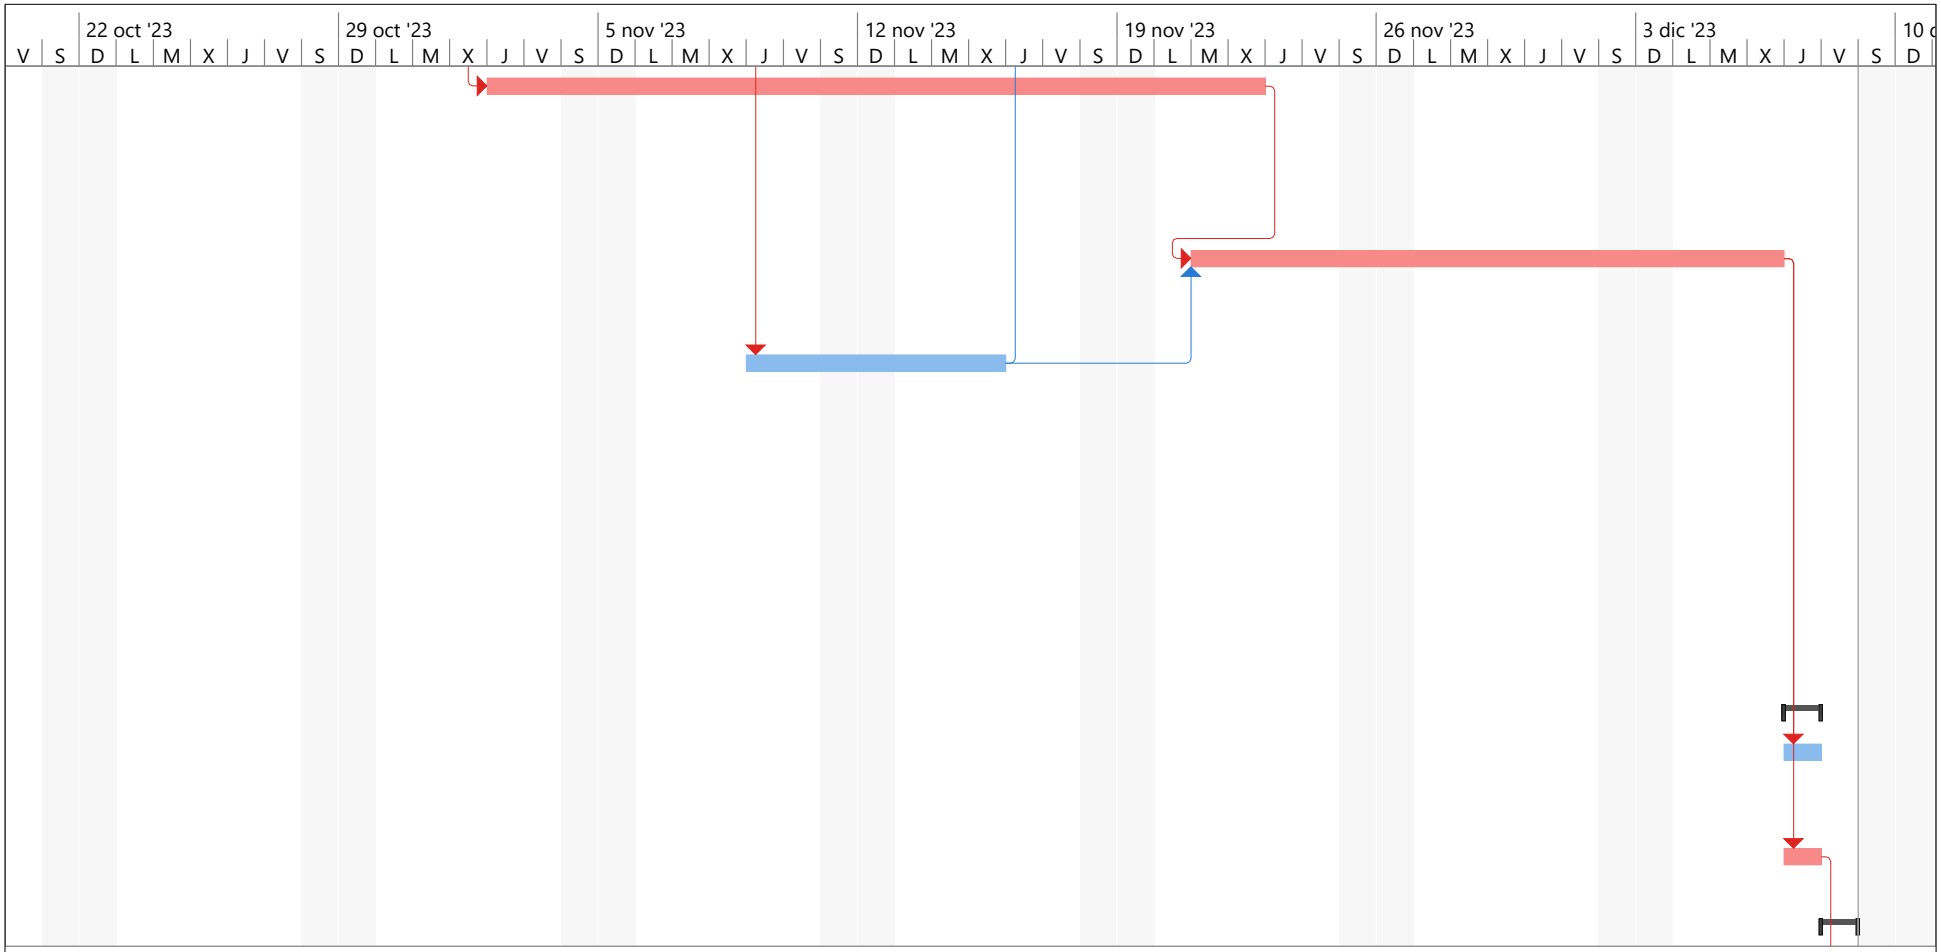

Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: mar 17/10/23

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

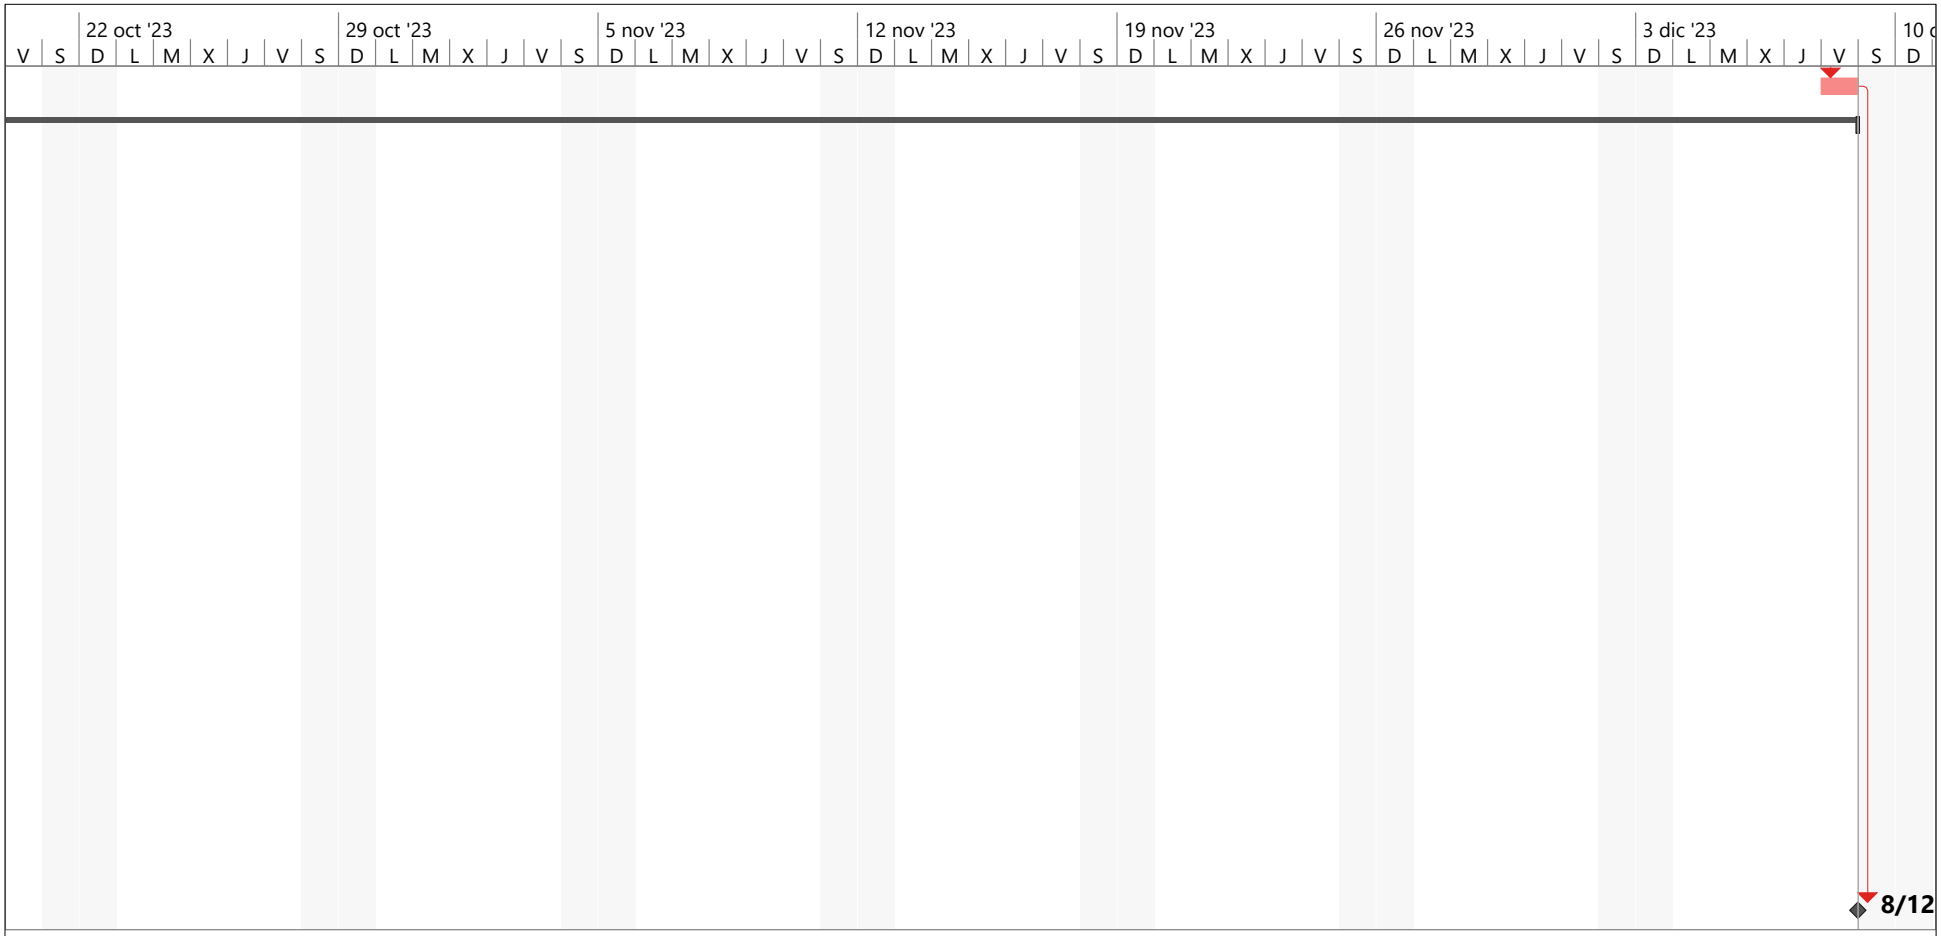

Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: mar 17/10/23

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual





M□□□□-M□□-□□□□-□□□-□□R-1□

□O□□R□□O□□□□□-□□□□1□

M□□□□□□□O□D□□MO□□□R□□□

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN Nº7 AL PROGRAMA DE INVERSIONES

UNIDAD EJECUTORA: | DIRECCIÓN TERRITORIAL: | PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No

CONTRATO No:

OBJETO:

CONTRATISTA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: | INTERVENTOR:

| GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP) | VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos | (%) OBRA PROGRAMADA (I) | (%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA | % Programado Estado pagado | | |

M□□□□–M□□–□□□□–□□□–□□R–□□□□

□O□□R□□O□□□□□–□□□□□1□

M□□□□□□O□D□□MO□□□□R□□□□

C□□e□□□□□□□□□□□□C□□□□er□□□ Te□e□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□Ce□□□r□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL REPROGRAMADO DE INVERSIONES N°7

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No.

CONTRATO No:

OBJETO:

CONTRATISTA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: INTERVENTOR:

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA (I)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado a Este mes / Valor Ejecutado a Este mes
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA			

M□□□□-M□□-□□□□-□□□-□□R-□1□

□O□□R□□O1□□□-□□□□□□

M□□□□□□O□D□□□□□□□O□□□□□O□

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES N°3

UNIDAD EJECUTORA: [illegible] **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDO[illegible]

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. [illegible]

CONTRATO No: [illegible]

OBJETO:

CO[illegible]TR[illegible]CCI[illegible]D[illegible]IM[illegible]TO R[illegible]IDO [illegible]C[illegible]TRO [illegible]DO D[illegible]CORR[illegible]IMI[illegible]TO D[illegible]CI[illegible]T[illegible]R[illegible]RTO[illegible]TO[illegible]T[illegible]ll[illegible]M[illegible]ICI[illegible]IO D[illegible]O[illegible]D[illegible]RT[illegible]M[illegible]TO D[illegible]C[illegible]RDO[illegible]

CONTRATISTA: D[illegible]R J[illegible]RRI[illegible]T[illegible]C[illegible]RD[illegible]

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: [illegible] **INTERVENTOR:** CO[illegible]ORCIO[illegible]R[illegible]

[illegible]O[illegible]ICI[illegible] [illegible]M[illegible]
[illegible]C[illegible]D[illegible]ICIO D[illegible]CO[illegible]TR[illegible]TO[illegible] [illegible]C[illegible]D[illegible]CIMI[illegible]TO[illegible]CT[illegible] [illegible]C[illegible]D[illegible]
[illegible]OR[illegible]ICI[illegible]c[illegible]ido I[illegible](A) $ 2'249'290'254.00
[illegible]OR[illegible]C[illegible]M[illegible]DO[illegible]c[illegible]ido I[illegible](C=A+B) $ 2'249'290'254.00
[illegible]OR[illegible]DICIO[illegible]c[illegible]ido I[illegible](B)

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	[illegible]	[illegible]	oct[illegible]	[illegible]	dic[illegible]	e[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ 80'900	$ 9'105	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ 61'475	$ 9'105	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ 48'767	$ 843'780	$ 709'606	$ 122'281	[illegible]	$ 761'135	$ 435'998	$ 367'672	$ 158'706	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ 206'352	$ 68'784	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ 104'457	$ 68'784	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ 9'789	[illegible]	[illegible]	$ 9'789	[illegible]	$ 9'789	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ 700	[illegible]	[illegible]	$ 700	[illegible]	$ 700	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ 68'232	$ 1'707	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ 66'232	$ 1'707	$ 7'565	$ 7'565	[illegible]	[illegible]

M□□□□-M□□-□□□□-□□□-□□R-□□□

□O□□R□□O1□□□-□□□□□□

M□□□□□□O□D□□□□□□□O□□□□□O□

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

UNIDAD EJECUTORA: □□□DIR□CCIO□□I□□R□□IO□□□□□ **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDO□□ **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** □□□ **DE** □□□□

SEGUIMIENTO No. □

CONTRATO No: □□□D□□□□□□

OBJETO:

CO□□TR□CCI□□□D□□□□□IM□□TO R□IDO□□ □□□O□□□R□□□□D□□C□□TRO□□O□□□DO D□□CORR□□IMI□□TO D□CI□T□R□□□□□RTO□□□TO□T□□□IM□□ICI□IO D□□□□□□O□□□□O□D□□□RT□M□□TO D□C□RDO□□

CONTRATISTA: D□□R□I□□□I□□□RRI□T□□C□RD□□□□

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: □□□□D□□□□□ **INTERVENTOR:** CO□□ORCIO□□I□□R□R□□

C□DI□O	M□□IM□□I□□□R□□
□R□I□□	□
□□□I□□	
□□C□□	
	□D□□Me□□□□o□

□□□□O I□ICI□□□ □□M□□□□□ □□□□e□e□□e□□□□oo□r□to□□I□ci□□□ **$ 2.249.290.254,00**

□□C□□□D□□I□ICIO D□□CO□□TR□TO□ □□C□□□D□□I□□CIMI□□TO□CT□□□□ □□C□□□D□□R□□□□D□CI□□□

□□C□□□D□□□□□□□□I□ □□ □□□OR□I□ICI□□□I□c□ldo I□□□□[A]□ **$ 2.249.290.254,00**

□□□OR□DICIO□□□□I□c□ldo I□□□□[B]□ **$**

□□□OR□□C□M□□□DO□I□c□ldo I□□□□**(C=A+B)**□□ **$ 2.249.290.254,00**

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos
□R□□IMI□□R□□	□□□□□□□	□□□□□	□□□□□
	□□□□□□□	□□□□□	□□□□□□□
□□□IM□□TO□CO□CR□TO RI□IDO□□□□C□□□ □□□□□	□□□□□□□□□□	□□□□□□	□□□□□□
	□□□□□□□□□□	□□□□□□	□□□□□□□□□
TR□□□□ORT□	□□□□□□□□	□□□□□□	□□□□□□
	□□□□□□□□	□□□□□□	□□□□□□□□
□□□□□I□□CIO□□□□□□ □RID□D□I□□	□□□□□□	□□□□□	□□□□□
	□□□□□□	□□□□□	□□□□□□
C□R□CT□RI□□CIO□□I□□	□□□□	□□□□□	□□□□
	□□□□	□□□□□	□□
R□□O□ICIO□D□□T□□□RI□□D□□C□□D□CTO	□□□□□□□	□□□□□	□□□□□
	□□□□□□□	□□□□□	□□□□□□
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 2.174.022,03	100,00%	
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 2.174.022,03	100,00%	

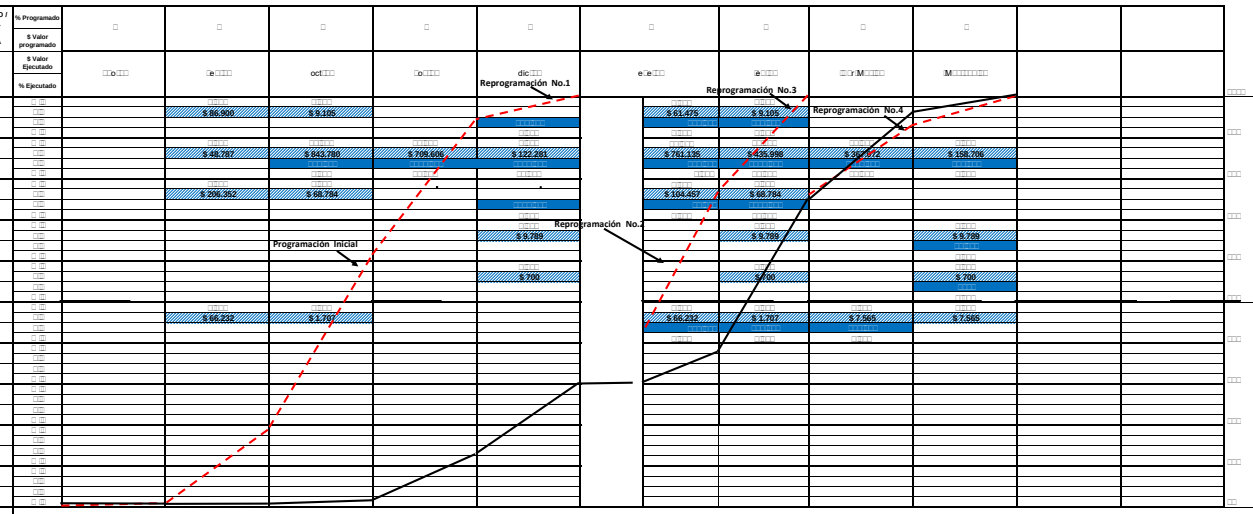

						RETRASO						
I□□□R□I□□O□R□□RO□R□M□D□□C□M□□□D□	□	0,00%	18,78%	42,47%	32,64%	6,11%	12,00%	33,69%	24,20%	17,23%	8,13%		
	□□□OR□Mie□de□e□o□□	$0	$408.271	$923.376	$709.606	$132.770	$260.883	$ 993.300	$526.083	$374.637	$176.760		
I□□□R□I□□O□R□□RO□R□M□D□□C□M□□□D□	□	0,00%	18,78%	61,25%	93,89%	100,00%	42,11%	75,80%	100,00%	91,87%	100,00%		
	□□□OR□Mie□de□e□o□□	$0	$408.271	$1.331.647	$2.041.252	$2.174.022	$643.460	$ 1.636.760	$2.162.843	$1.997.262	$2.174.022		
I□□□R□I□□O□R□□□□□C□T□D□□M□□□	□	0,00%	0,00%	1,25%	11,26%	17,60%		6,36%	38,17%	22,84%	2,52%		
	□□□OR□Mie□de□e□o□□	$0	$0	$27.284	$244.778	$382.577		$138.206	$829.779	$496.611	$54.786		
I□□□R□I□□O□R□□□□□C□T□D□□C□M□□□D□	□	0,00%	0,00%	1,25%	12,51%	30,11%		36,47%	74,64%	97,48%	100,00%		
	□□□OR□Mie□de□e□o□□	$0	$0	$27.284	$272.062	$654.639		$792.846	$1.622.625	$2.119.236	$2.174.022		

□□□□ □ro□l□lo□e□ □otro□co□ce□to□ □□e □e re□l□re□ e□ e□□re□e□le c□dro de□e□ corre□□o□der co□ o□re□cio□□do□e□ □□
□ro□□e□l□eco□□□ic□□□ro□□d□o□odi□c□o□□□o□l□r□ct□□□□
I□c□□e□l□□□de□e□□□□□□re□□□r□tol□□de□o□l□r□o□□

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
□ □□T□DIO□ □ DI□□□O□□ R□□□I□IO□ □□□□T□□ □□O□T□□□□□CIO□ □□O MODI□IC□CIO□ □□O COM□□□M□□T□CIO□D□□□T□DIO□□DI□□□O□	□□□□□□□□□□



□□□ORM□□M□□□□□□D□□□□□R□□□□OR□□□□o□□□□□
□□rodo□1a□□□□d□□□□□□o□d□□□□□□□
□
□
□O□□R□□O□D□□□□□□R□□□□OR□□□□o□□□7□□D□□□□□□1□
□



□ □
□

□□□□□□ORM□□□□□□□O□□R□□O□D□□□□□□R□□□□OR□□□□

□□1□□□□□orma□□□□□□□□□□ra□d□□□□□o□□ra□o□d□□□□□□r□□□□or□a□□

□□co□tr□to□de□i□ter□e□tor□□□□re□e□t□□□o□□□i□□ie□te□□□□r□□etro□□□

D□□□□RRO□□□O□□□□□□□□D□□□□□O□□□R□□□O□D□□□□□□R□□□□□OR□□□□	
□o□de□□□roce□o□de□□e□ecci□□□□	CM□□DO□□RT□□□□□□□□□□□□□□
□o□ID□de□□□□CO□□□	CO□□□CC□TR□□□□□□□□□□□□□
□o□de□□co□tr□to□□	□□□□□□de□□□□□□□□
□ec□□□de□□□□□cri□ci□□□□	□□□de□dicie□□re□de□□□□□□□
O□□eto□□	I□T□R□□□TOR□□□T□C□IC□□□□DMI□I□TR□TI□□□□I□□□CI□R□□□□□M□I□□T□□□□□R□□□□□M□□T□□IMI□□TO□□□M□□OR□MI□□TO□D□□□□□□T□RCI□RI□□□D□□□□RO□R□M□□"CO□OM□I□□R□R□□"□□□□□O□□M□□ICI□IO□□D□□□D□□□RT□M□□TO□D□□□C□RDO□□□□□□R□□O□□□
Co□tr□ti□t□□□	CO□□ORCIO□□I□□R□R□□□□
□IT□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
I□te□r□□te□□□□IT□□□□orce□t□□e□□de□□□rtici□□ci□□□□	□□□□□□M□DO□□I□□R□□O□C□C□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

D r d a a dad r a ada or r or

i ter e tor i o e i ie to o co tr to de o r de c erdo o e t ecido e e
de i ter e tor de l l do de e e t ece i ie te cti id de
d i i tr ti T c ic i ie t e oci e e eriodo de de io de

dad dm ra a

- Re i i or rte de o e eci i t de i ter e tor de o i or e t c ico de re i i o e t dio di e o re e t do d r te e re e te eriodo de o ro ecto de o co tr to de de de o ici io de e o e o de de de ici io de et Ric de de de ici io de Mo ter
- Re i i r ro ci de doc e t ci e i id r i id cio e de o co tr to de de de ici io de e o e o de de de ici io de et Ric de de de ici io de et Ric de de de ici io de C ete de de de ici io de et Ric
- i ter e tor e tre l i Territori C rdo i or e e e co tr to de de de ici io de e o e o de de de ici io de et Ric de de de ici io de Mo ter de de ici io de C ete
- tre de i or e doc e t ci e er d e de rro o de ro ecto ecret ri de i r e tr ct r e ci de o ici io
- Reci i ie to re i i de doc e t ci erti e te r de id i id ci de o co tr to de o r i do e t l ter e tor

dad a

- eri ic ci co tro de o teri e ti i do e o r de o ro ecto de Ci t r erto to – e o e o e te + Mo ter C roi i – et Ric
- eri ic ci de rocedi ie to co tr cti o de c erdo co o di e o ro do
- Medici de c tid de e ec t d re orte de ce de e ec ci

- To de e tr de e o de or torio de ctiid de e ect d
- i ter e tor e re i tro di rio de o r it cor do de ed co i do e det e ctiid de re i d or e co tr ti t re i tro di rio de ci or otr it cio e e re cio e co e ro ecto
- Co tro de er o de e i o e or r
- eri ic ci de c i ie to de o e de e o de tr ico e o r

dad m a y

r e re orte de ctiid de co cer ie te e ti ie t de i ter e tor e tie e i ie te tr iid d de rro d d r te e e de o de c re e e e i ie to o co tr ti t de o r r o ro ecto ctio ct e te o c e o

Co tr to de Mo ter o Co orcio C rdo e ro ecto de e o e o t Il Ci t r erto to co tr to o ∙ D eri i rriet

e ti re i d d r te e e e i ie te

∙ Co co ic do C R de de o de e ed re e t o icio l i O r te der o er cio e de ro ecto de e o e o t Il e ic do tr iid d e e te i de de e o te ie do e c e t i e ci de ro ecto i e ie t de l i

∙ Co co ic do C R de de o de e oicit o i or e e e e de e de ri co tr to o de ro ecto de Mo ter

∙ Co co ic do C R de de o de e oicit co tr to o de ro ecto de C ro i t Il e i or e de e de e rero de e i or e i r roceder re i r e ce ie t Ter i ci de Co tr to de O r

• Co co ic do C R de de o de e oicit o i or e de e i ie to ie t de o e e de e rero ri de r e ro ecto de e o e o t ll Co tr to o

• Co co ic do C R de de o de e oicit ie t de l i e co ce to o re e ce ie t r e Co tr to o de ro ecto de e o e o t l

• Co co ic do C R e oicit e co ce to de ce ie t ter i ci de co tr to o r e ro ecto de e dro t ll

• Te ie do e c e t e do o d e co tr ti t Co orcio O i o re it e i or e e ie t de e de e rero e i or e i e e dio or c ce co ic do C R co co ic do C R de de o de oicit do e e te o i or e t te ec

• Te ie do e c e t e e co tr ti t de ro ecto de e o e o t ll do o d o re it i ter e tor o i or e e die te ec e e dio or c ce co ic do C R co co ic do C R r e reiter r oicit r o e die te or e tre r

• Co co ic do C R de de o de e re i co tr ti t co orcio C rdo o er cio e i or e e ie t de e de ri

• Te ie do e c e t e e ro i ec de cierre de ro ecto de Mo ter e e oicito or edio de or c ce co ic do C R e i t do de e o i e r roceder co e tre de cierre ie t de co tr to or edio de co ic do C R de de o de

• Co co ic do C R e edio re e t o icio O co e i de c r r o icit d de co ce to de ce ie t r e co tr to de o r o de ro ecto de e o t l

 do e e ec de cierre ie t de ro ecto de Mo ter co tr to o e cerc i e o icit co ce to de i or e tri e tr ie t o r oder co et r tr id d co co ic do C R de de o de

or rte de co tr ti t e re e t i ie te e ti

• Co o icio O IC CC de de o de reci e o i or e e e ie t e de co tr to o r e ro ecto de Mo ter

• Co o icio O IC CC de de o de e co tr ti t o icit eri ic ci de ct r ie t e de o ro ecto de Cr ce co e i de er ie e rec r o di o i e de rtid ie t ede er co oc do e o r

• de co e ci ie t e r dic do C e de e rero de ec e tid d ie t C o e ite co ce to o o re e de co e ci ie t

• Co o icio O IC CC de de o de e co tr ti t co orcio c r do rocedi co e tre de cio e o er cio e de i or e e ie t de e de ri

• d de o de e tid d ie t C R C re o de o icio r dic do or e co tr ti t e e c e o icit co ce to de co e ci ie t o e e tid d re o de e oc r e ec e doc e to e e c e tr e et de re i i

• Co oicio O lC CC e co tr ti t de o ter e tre i ter e tor e i or e e ie t de e de o

• Co oicio O lCIO D C de de o de e co tr ti t de e o e o t ll re ite i ter e tor e i or e de e de e rero de

or rte de direcci de o te i id d e tie e i ie te tr id d

• de o de o de e reci e oicio l i O do de d re et r dic do R de de r o de R dic do e or rte de co ic do C R edi te e c i ter e tor re ite ie t de l i e l or e de ce ie t ter i ci de co tr to o de ro ecto de C ro i t l o e co e io o critо e tre e M ici io de et Ric e l tit to cio de e te oicio e r ti ic e e dio direcci ce ie t de ro ecto e oicio l i O de de ri de e ri de e re iti e or do Direcci Territori C rdo o re ro ci de i or e i ie t

• de o de e reci e oicio l i O do de e d re et r dic do R de de r o de R dic do e or rte de co ic do C R do de e re ort i ie t de l i e l or e de ce ie t ter i ci de co tr to de o r o r e ro ecto de e dro t ll o co e io i ter d i i tr ti o e tre e l i e M ici io de et Ric Co e io o re ort do i ter e tor co ce to ro torio r e i or e i ie t

• de o de e reci e oicio l i O do de e d re et r dic do R de de ri de R dic do e or rte de co ic do C R do de e e oicit l i co ce to o re e de ro ecto de e dro t ll o e ie t re o de e te ie do e c e t

e e co tr to i i do e t direcci e tie e de e itir co ce to re o i i i ter e tor or e ti ie t de rro d

• de o de e reci e o icio l i O do de re o de r dic do R de de ri de r e co tr to o do de e tie de o er cio e o icio O e t o ro d e dic o o icio

• de o de e reci e o icio l i O do de e d re e t r dic do R de de ri de te ci co ic do C R de de ri de do de e re ite o er cio e de o icio O e t o ro d or ie t de l i O er cio e de l or e Tri e tr ie t o de ro ecto de Mo ter co tr to o o e co e io o te i o o icio oicit e i ter e tor i or e ie t e ro ci ie to de e tid d ie t C R C o re co o e roce o de de Co e ci e re ect o ro ecto de Cr ce e te

• de o de e reci e o icio l i O do de e d re e t r dic do R r e co tr to o de ro ecto de Mo ter o re e i or e tri e tr ie t o o do de d or reci id e ct de e i ct de rei icio de co tr to de i ter e tor rro o de co tr to de o r

• de o de e reci e o icio l i O do de e d re e t r dic do R de de o de r e ro ecto de C roi t l co co tr to o i e r o o co ici or rte de ie t e t i ter e tor edi te co ic do C R de de o de re o de c r do e o De co tr to c e e o icito e co ce to

• de o de e reci e o icio l i O do de e e d re e t r dic do R de de e rero de r e co tr to o de ro ecto de e o e o Ci t r erto to re ecto

cio e o er cio e de i or e tri e tr ie t o o D do co ce to ro torio e te i or e

• de o de e reci e o icio l i O do de er ti ic e co ce to de ro ci de ce o ie t r e ro ecto de e dro t ll Co tr to o

• de o de e reci e o icio l i O do de e e ite o er cio e i or e tri e tr ie t o de ro ecto de e o e o t ll co tr to o

ORM D O Y RO O

1 l or e director de l ter e tor

□ □
□

SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA

INFORME EJECUTIVO DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA No 28

□□r□odo□□□1□a□□□□□d□□□□□□o□d□□□□□□

CONTRATO DE INTERVENTORÍA INVIAS N°2273 de 2021

□
□
O□□□□O□□
□□□□R□□□□OR□□□□□□□□□□□□DM□□□□R□□□□□□□□□□□R□Y□□M□□□□□□□□R□□□□
M□□□□□□M□□□□□O□Y□M□□OR□M□□□□□O□D□□□□□□□□□R□□□R□□□D□□□□RO□R□M□□
“COLOMBIA RURAL” EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA –□
□R□□O□□□

□
□
□
□

□O□□OR□□O□□□□□R□R□□□

□
□
□
□
□
□
□
□
□

□



ORM O D D R OR D
R OR o
r odo 1 a d o

O R O D R OR o 7 D 1



D

direcci de re io e del l cri i co e io i ter d i i tr ti o co ici io de De rt to de C rdo c o o eto e R R O R M OR MI TO M T IMI TO R I IT CI D CORR DOR R R PRODUCTIVOS DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” e e rco de cio de De rro o “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” co e ec ci de ro r de or ic “COLOMBIA RURAL” ro r de o ier o cio r e e or ie to te i ie to de r r e de co e er r co e i e e c o co o i o ece it

o co e io crito te e o o de co e ici io de e o de co e M ici io de C ete o de co e M ici io de Mo ter o de co e M ici io de et Ric o de co e M ici io de e o e o or rte o ici io de t ro o roce o co tr ct e o od id d de icit ci ic de o r r d dic r o co tr to deri do de o co e io

or rte de l tit to cio de tr de co c r o de rito o **M DO R 1 7 1** ce e r e co tr to o de co ir **O OR O R R IT** re re e t do e e te or e i e ie ro do i r o r e ec t r R OR **DM R Y M R M M O Y M OR M O D R R D RO R M “COLOMBIA RURAL” EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA – R O**

c re i r l ter e tor i ie do o r etro t c ico e t ecido e e de i ter e tor er i o doc e to co tr ct e

orde r e i icio de i ter e tor e d d or e l edi te o icio R de ec de e rero de e o i ici e t e de io de e re i ri er r rro t e de dicie re de o terior e te e rro o or e d e t

e de e tie re de Co rro ero tre e e te di e o de l ter e tor t e de Dicie re de e e te edi te rro ero c tro e i e o de l ter e tor t e d de e rero de o terior e te co ec de de e rero de e dio ri er e i de co tr to co ec de de ri de e dio e rei icio ero o i co tr to co o tr ite i ie te e dio e i ero do de co tr to o terior e te e dio rei icio ero do de co tr to o terior i i ci co ec de de io de

D R R D O R

M o d ya Co tr cci de etro tr o e c e e de correi ie to de De ici

M o d a a R a Co tr cci de etro tr o e c e e o C ert e de correi ie to e dro

M o d a a R a Co tr cci de etro tr o e i e to e i e o C ert e de correi ie to C roi

M o d o o Co tr cci de etro tr o e i e to r ido d do e o de edi te e die te e de correi ie to de Ci t r etro de i e to r ido o C ert e de correi ie to de erto to

M o d Mo r a Co tr cci de etro tr o e i e to r ido o C ert e de correi ie to i o etro Doce Co tr cci de etro tr o e i e to r ido C ert e de correi ie to r ie Co tr cci de e te de etro de o it d e e r d
Co tr cci de etro tr o e i e to e i e c t ri o C ert e e tr o i Cr ce – e i e

M o d a a Co tr cci de tr o de e i e to r ido de etro i e e e e correi ie to de o e o r r de ici io de C ete de co te co tr cci de oc c e r e te i o tr o c e tie e o it d de etro e decir e o it d tot de i ter e ci r e te tr o i c e do i terce cio e cie de etro

	**ORM O D D R OR D** **R OR o** **r odo 1 a d o** **O R O D R OR o 7 D 1**	

ORM R D O O R O

- **O R O 1 D 1 M O D Y**

D RRO O D O R	
o de roce o de e ecci	M
o ID de CO	o ic r CO 1
o de co tr to	de
ec de cri ci	de dicie re de
O eto	M OR MI TO M T IMI TO R I IT CI D CORR DOR R R ROD CTI O M ICI IO D RT M TO D CORDO CO OM I R R
Co tr ti t	IO T M OR I D ICI
IT	
I te r te IT orce t e de rtici ci	MI D O C C D CI R D RRO O OCIO CO OMICO D O M ICI IO D CO OM I IT DC I I RO IT
ori ici	
o	e e
ec de i icio	de e rero de
rorro ec de ri de	e e
e i ec de ri de	d
Rei icio	de io de
e i ec de io de	d
Rei icio	de o to de
rorro ec de io de	e e
rorro ec de e tie re de	e e
ec de ter i ci ct de co tr to	de dicie re de
Direcci ero de te o o	C e o Mo ter – C rdo Ce r

[1] Detalle del proceso: LP-MA-015-2021 (contratos.gov.co) Link SECOP I

□ □
□

- □ □O□□R□□O□□□□□D□□□□□□1□M□□□□□□□O□D□□MO□□□R□□□□□

□

D□□□□RRO□□□O□□□□□□□□D□□□□□O□□R□□□O□D□□□O□R□□	
□o□de□□□roce□o□de□□e□ecci□□□□	□□□□□□M□□□□□□□□□□□□□□
□o□ID□de□□□□CO□□	CO□□□□TC□□□□□□□□□□□□
□o□de□co□tr□to□	□□□□de□□□□□□□
□ec□□□de□□□□□cri□ci□□□□	□□□de□e□ero□de□□□□□□□
O□□eto□	M□□OR□MI□□TO□M□□T□□IMI□□TO□□□R□□□□I□IT□CI□□□ D□□CORR□DOR□□□R□R□□□□□□RODCTI□O□□□□□□□□□ M□□ICI□IO□ D□□ MO□T□R□□□□ D□□□RT□M□□TO□ D□□ C□RDO□□□ –□ CO□OM□I□□ R□R□□□□ CO□□□□IO□ I□T□R□DMI□I□TR□TI□O□□o□□□□□□D□□□□□□□
Co□tr□ti□t□□	CO□□ORCIO□CORDO□□□□□□□□
□IT□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□
I□te□r□□te□□□□IT□□□□orce□t□e□□de□□□rtici□□ci□□□□	M□□□I□T□R□□□TOR□□□□□□CO□□□□TOR□□□□□□□□□□□□IT□ □□□□□□□□□□□□□□□□□

- O R O 11 D 1 M O D R

D RRO O O D O R	
o de roce o de e ecci	M R
o ID de CO	o ic r CO l
o de co tr to	de
ec de cri ci	de oct re de
O eto	CO TR CCI D C CORR IMI TO D M DRO M ICI IO D T RIC C RDO M RCO D CO IO D CRITO TR M ICI IO D T RIC I TIT TO CIO D
Co tr ti t	CO ORCIO I
IT	
I te r te IT orce t e de rtici ci	CO TR CCIO T T IT ID TO IO O I DO M C C C
ori ici	
dici de ec de de r o de	
ori i	
o	e e
ec de i icio	de e rero de
rorro de ec de de io de	e e
rorro de ec de de io de	e e
rorro de ec de o to de	e e
rorro de ec de o ie re de	e e
rorro de ec de dicie re de	e e
rorro de ec de r o de	e e
ec de ter i ci ct de co tr to	de ri de
Direcci ero de te o o	Cr o Ce

[2] Detalle del proceso: LP-MPR-010-2021 (contratos.gov.co) Link SECOP I

□ □
□

- □ □O□□R□□O□11□□D□□□□□□□M□□□□□□O□D□□□□□□□□□R□□□□□

D□□□RRO□□O□□□□□□D□□□□O□□R□□O□D□□O□R□□	
□o□de□□□roce□o□de□□e□ecci□□□	□□□M□R□□□□□□□□□□
□o□ID□de□□□CO□□	□o□□□ic□□□□r□□□□CO□□I□
□o□de□co□tr□to□	□□□□de□□□□□□□
□ec□□□de□□□□cri□ci□□□	□□□de□□□io□de□□□□□□
O□□eto□	CO□□TR□CCI□□□ D□□ □□□IM□□TO□ □□□ CO□CR□TO□R□□IDO□□□□□□CORR□□IMI□□TO□ D□□□□□M□□DRO□□M□□ICI□IO□D□□□□□□□T□□ RIC□□□ C□RDO□□□□ □□□ □□□ M□RCO□ D□□□ CO□□□□IO□□□□□D□□□□□□□□□□□CRITO□□□TR□□ □□□M□□ICI□IO□D□□ □□□□□T□□RIC□□ □□ □□□ I□□TIT□TO□□□CIO□□□D□□□□□□□
Co□tr□ti□t□□	CO□□TR□CTOR□□□OT□□TI□□□□□□□□
□IT□	□□□□□□□□□□□□□□□
I□te□r□□te□□□IT□□□orce□t□□e□□de□□□rtici□□ci□□□	CO□□TR□CTOR□□□OT□□TI□□□□□□□□□□□□□□□ □□ □IT□□□□□□□□□□□□□□□
□□□ori□ici□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□ori□i□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□o□	□□□e□e□□
□ec□□□de□i□icio□	□□□de□□□io□de□□□□□□
□ec□□□de□ter□i□□ci□□□□ct□□□de□□co□tr□to□	□□□de□dicie□□re□de□□□□□□
Direcci□□□□□□□□ero□de□te□□o□o□□	M□□□□□□□C□□ote□□□□□ector□□to□□□r□□□o□□□□□ Co□□o□□t□□–□□□□et□Ric□□□Ce□□□□□□□□□□□□□□□

□
□
□
□

[3] Detalle del proceso: LP-MPR-007-2023 (contratos.gov.co) Link SECOP I

C□□e□□□□□□□□□□□□□C□□□□er□□□Te□e□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ □

□

- □ □O□□R□□O□1□□D□□□□□1□M□□□□□□O□D□□□□□□□□□R□□□□□

□

D□□□RRO□□O□□□□□□D□□□□O□□R□□O□D□□O□R□□	
□o□de□□roce□o□de□□e□ecci□□□	□□□M□R□□□□□□□□□□□□
□o□ID□de□□□CO□□	□o□□□ic□□□□r□□□CO□□I□
□o□de□co□tr□to□	□□□□de□□□□□□
□ec□□□de□□□□cri□ci□□□	□□de□dicie□□re□de□□□□□□
O□□eto□	M□□OR□MI□□TO□D□□□□□□□□□□□CO□D□C□□ D□□□□□□□T□□RIC□□□□□CORR□□IMI□□TO□D□□ C□RO□I□□□M□□ICI□IO□D□□□□□□□T□□RIC□□ C□RDO□□□□□□□□□M□RCO□D□□□CO□□□□IO□ □□□□ D□□ □□□□□□ □□□CRITO□ □□TR□□ □□□ M□□ICI□IO□ D□□ □□□□□T□□ RIC□□ □□ □□□ I□□TIT□TO□□CIO□□□D□□□□□□
Co□tr□ti□t□□	M□RIO□□OM□I□IO□□I□I□T□RR□□□□□□R□
□IT□	□□□□□□□□□□□□□□□
□□or□i□ici□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□o□	□□t□e□□□□de□□□io□de□□□□□
□ec□□□de□i□icio□	□□de□e□rero□de□□□□□
□rorro□□□□□de□ec□□□□□de□□□io□de□□□□□	□□□e□e□□□
□rorro□□□□□de□ec□□□□□de□e□tie□□re□de□□□□□	□□□e□e□□□
□rorro□□□□□de□ec□□□□□de□dicie□□re□de□□□□□	□□□e□e□□
□rorro□□□□□de□ec□□□□□de□□□□r□o□de□□□□□□	□□□e□e□□
□rorro□□□□□de□ec□□□□□de□□□□o□de□□□□□□	□□□e□e□□
□rorro□□□□□de□ec□□□□□de□□□io□de□□□□□	□□□e□e□□
□ec□□□de□ter□i□□ci□□□ct□□□de□co□tr□to□	□□de□e□tie□□re□de□□□□□
Direcci□□□□□□□ero□de□te□□□o□o□□	Ce□□□□□□□□□□□□□□

[4] Detalle del proceso: LP-MPR-013-2021 (contratos.gov.co) Link SECOP I

C□□e□□□□□□□□□□□□□C□□□□er□□□Te□e□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ □

□

- □ □O□□R□□O□□□7□D□□□□□□□M□□□□□□O□D□□□□□□□□R□□□□□

□

D□□□RRO□□O□□□□□□D□□□□O□□R□□O□D□□O□R□□	
□o□de□□roce□o□de□e□ecci□□□	□□□M□R□□□□□□□□□□□
□o□ID□de□□□CO□□	□o□□□ic□□□r□□□CO□□1□
□o□de□co□tr□to□	□□□de□□□□□□
□ec□□de□□□□cri□ci□□□	□□de□□□io□de□□□□□□
O□□eto□	M□□OR□MI□□TO□□□□CO□CR□TO□RI□IDO□D□□□□□□□□I□□ □□□□CO□D□C□□□□CORR□□IMI□□TO□D□□ C□RO□I□□□□ M□□ICI□IO□ D□□ □□□□□T□□ RIC□□ C□RDO□□□□□□□□□□M□RCO□D□□□CO□□□□IO□□□□□D□□ □□□□□□□ □□□CRITO□ □□TR□□ □□□□ M□□ICI□IO□ D□□ □□□□□T□□RIC□□□□□□□□I□□TIT□TO□□□CIO□□□□D□□ □□□□□□
Co□tr□ti□t□□	CO□□ORCIO□O□□□□I□□□
□IT□	□□□□□□□□□□□□□□
I□te□r□□te□□□IT□□□orce□t□e□□de□□□rtici□□ci□□□	□□□□O□□□□I□□CO□□TR□CCIO□□□□□□□□□□□□□

□ □
□

- □ □O□□R□□O□1□□D□□□□□1□M□□□□□□O□D□□□□□□□O□□□□□O□□□

D□□□RRO□□O□□□□□□□D□□□□O□□R□□O□D□□O□R□□	
□o□de□□□roce□o□de□□e□ecci□□□	□o□□□□□□□□D□□□□□□□□
□o□ID□de□□□□CO□□	□o□□□ic□□□□r□□□□CO□□□
□o□de□co□tr□to□	□□□□de□□□□□□□
□ec□□□de□□□□cri□ci□□□	□□de□e□ero□de□□□□□□
O□□eto□	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA □R□□□□□D□□□C□□TRO□□O□□□DO□D□□□CORR□□IMI□□TO□ D□□CI□T□R□□□□□□RTO□□□□TO□M□□ICI□IO□D□□□□□□□O□ NUEVO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"□ □
Co□tr□ti□t□□	CO□□ORCIO□I□□□□□□□□□□□
□IT□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□
I□te□r□□te□□□□IT□□□□orce□t□e□□de□□□rtici□□ci□□□	□□□□O□□□□IOR□□□R□□R□□□OT□□O C□C□□□o□□□□□□□□□□□□□□□□de□□□□□et□Ric□□□□□□□ □□ □I□CI□□ □□I□RI□□□□□□□□□□□□ □IT□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□
□□or□i□ici□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□o□	□□t□e□□□□de□□□io□de□□□□□□
□ec□□de□i□icio□	□□de□e□rero□de□□□□□□
□r□rro□□□□□de□ec□□□□□de□□□io□de□□□□□□	□□□e□e□□□
□rorro□□□□□de□ec□□□□□de□oct□□re□de□□□□□□	□□□e□e□□
□rorro□□□□□de□ec□□□□□de□dicie□□re□de□□□□□□	□□□e□e□□
□rorro□□□□□de□ec□□□□□de□□□ri□de□□□□□□	□□□e□e□□
□rorro□□□□o□□□de□□□□de□□□io□de□□□□□□	□□□e□e□□
□rorro□□□□o□□□de□□□□de□□□o□to□de□□□□□□	□□□e□□
□rorro□□□□o□□□de□□□□de□□e□tie□□re□de□□□□□□	□□□e□□
□ec□□□de□ter□i□□ci□□□□ct□□□□de□co□tr□to□	□□□de□oct□□re□de□□□□□□
Direcci□□□□□□□□ero□de□te□□o□o□□	Ce□□□□□□□□□□□□□□□

[6] Detalle del proceso: No. LP-129-2021. (contratos.gov.co) Link SECOP I

C□□e□□□□□□□□□□□□□□C□□□□er□□□Te□e□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ □

□

- □ □O□□R□□O□1□□D□□□□□□□M□□□□□□O□D□□□□□□□O□□□□□O□□□

□

D□□□RRO□□O□□□□□□D□□□□O□□R□□O□D□□O□R□□	
□o□de□□□roce□o□de□□e□ecci□□□	□o□□□□□□□□□D□□□□□□□□
□o□ID□de□□□□CO□□	□o□□□ic□□□□r□□□□CO□□I□
□o□de□co□tr□to□	□□□□de□□□□□□□
□ec□□□de□□□□cri□ci□□□	□□□de□□□io□de□□□□□□
O□□eto□	“CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN □□□□O□□□□R□□□□□D□□□C□□TRO□□O□□□DO□ D□□□ CORR□□IMI□□TO□ D□□ CI□T□R□□ □□ □□□RTO□□□□TO□□T□□□□IIM□□ICI□IO□D□□ □□□□□O□ □□□□O□□ D□□□RT□M□□TO□ D□□ CÓRDOBA”□ □
Co□tr□ti□t□□	D□□□R□I□□□I□□□RRI□T□□C□RD□□□□□□
□□□ero□de□Ced□□□	□□□□□□□□□□□□
I□te□r□□te□□□IT□□□orce□t□□e□□de□□□rtici□□ci□□□	□□□□
□□□or□i□ici□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□o□	□□□e□e□□
□ec□□□de□i□icio□	□□□de□□□o□to□de□□□□□□
□rorro□□□□□de□ec□□□de□□□de□dicie□□re□de□□□□□□	□□□t□□□□de□□e□rero□de□□□□□□
□rorro□□□□□de□ec□□□de□□□de□□e□rero□de□□□□□□	□□□t□□□□de□□e□rero□de□□□□□□
□rorro□□□□□de□ec□□□de□□□de□□e□rero□de□□□□□□	□□□t□□□□de□□□io□de□□□□□□
□ec□□□de□ter□i□□ci□□□□ct□□□de□co□tr□to□	□□□de□□□io□de□□□□□□
Direcci□□□□□□□□ero□de□te□□o□o□□	Cr□□□□□□o□□□□□□□□□rrio□i□□□C□ri□e□–□Mo□ter□□□ Ce□□□□□□□□□□□□□□

□

□

[7] Detalle del proceso: No. 105-2023 (contratos.gov.co) Link SECOP I

C□□e□□□□□□□□□□□□□C□□□□er□□□Te□e□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- **O R O 1 D M O D**

D RRO O O D O R O D O R	
o de roce o de e ecci	MC
o ID de CO	o ic r CO I
o de co tr to	de
ec de cri ci	de e tie re de
O eto	M T IMI TO M OR MI TO D I R R M ICI IO D C T– CORDO D RO R M CO OM I R R M RCO D CO IO D C CRITO TR M ICI IO D C T I IT TO CIO D I – I I
Co tr ti t	M RIO OM I IO I I T RR R
IT	
ori ici	
o	t e de dicie re de
ec de i icio	de oct re de
r rro de ec de dicie re de	e e
r rro de ec de ri de	e e
ec de ter i ci ct de co tr to	de io de
Direcci ero de te o o	Ce

[8] Detalle del proceso: MC-LP-010-2022 (contratos.gov.co) Link SECOP I

R M D D D D D D

Co tr to – **O R O DO Y D DO**

Co tr to – MO T RI **O R O DO Y RO O D**
R M O Y D

Co tr to – T RIC **O R O DO Y RO O D**
R M O Y D

Co tr to – T RIC **O R O DO Y RO O D**
R M O Y D

Co tr to – T RIC **O R O DO Y RO O D**
R M O Y D

Co tr to – T RIC **O R O DO Y RO O D**
R M O Y D

Co tr to – O O **O R O DO Y RO O D**
R M O Y D

Co tr to – O O **O R O DO Y RO O D**
R M O Y D

Co tr to – C T **O R O DO Y RO O D**
R M O Y D

□ □
□

R□□□M□□□□□□□DO□□□□□□O□Y□□□□□□□RO□D□□□□O□□□O□□R□□O□□D□□O□R□□□□

□□ec□□□de□□corte□de□□□re□□e□te□i□□or□□e□□e□tie□□e□□□o□□□□i□□ie□te□□□□□□□ce□□□□□ico□□□□□i□□□□ciero□□de□
o□□co□tr□to□□de□o□r□□e□□□□□e□□□□i□□or□□e□□e□ □□□□□□□

□

□o□de□□co□tr□to□	l□□er□i□□□□ro□r□□□d□□ □c□□ □□□d□□	l□□er□i□□□e□ec□t□d□□ □c□□ □□□d□□	□ □ □□□□□ce□ro□r□□ □do□ □c□□ □□□do□	□ □□□□□□ce□e□ec□t□do□ □c□□ □□□do□
□□□□□ de□ □□□□□□ □ Mo□ter□□□	□ □□□□□□□□□□□

Co tr to de de ici io de e

co tr to e e c e tr e ter i do e ec t do e ec de i i ci e e de dicie re de et ic e ec t d e etro de c e er do et ic i ici c er de etro

Co tr to de de ici io de Mo ter

e re e te eriodo e re i ro cti id de ic de ro ecto

R MO R

e re e te eriodo o e re i ro cti id de de o r e e re e te co tr to e e t e e c e tr i i do e roce o de i id ci

R MO R

e re e te eriodo o e re i ro cti id de de o r e e re e te co tr to e e t e e c e tr i i do e roce o de i id ci

R MO OM RO 1

e re e te eriodo o e re i ro cti id de de o r e e re e te co tr to e e t e e c e tr i i do e roce o de i id ci

e re e te eriodo o e re i ro cti id de de o r e e re e te co tr to e e t e e c e tr i i do e roce o de i id ci

Co tr to de de ici io de et Ric

co tr to e e c e tr e ter i do e ec t do e ec de i i ci e e de ri de D r te et de e ec ci de co tr to e re i dici e te er itie do e c ce de et ic co tr ct

Co tr to de de ici io de et Ric

co tr to e e c e tr e ec t do e cie or cie to ec de ter i ci e e de dicie re de de c erdo co e o i ici de co tr to e c corre o de e e de tir de ec de i icio de de io de

Co tr to de de ici io de et Ric

e ec ci de or r ic de erodo re re e t ce e ec t do c do de ce ro r do de ce re e t do tr o de de c erdo re ro r ci de i er io e ro do or o t to e cri e ct de e tre reci o de i iti o de o r

Co tr to de de ici io de et Ric

co tr to e e c e tr e ter i do e ec t do e ec de i i ci e e de de e tie re de D r te et de e ec ci de co tr to e re i dici e te er itie do e c ce de et ic co tr ct

Co tr to de de ici io de e o e o

co tr to e e c e tr co ce e ec t do de ec de i i ci e e de oct re de de c erdo co r rro o d d or e ici io de e o e o

Co tr to de de ici io de e o e o

e re e te eriodo o e re i ro cti id de de o r e e re e te co tr to e e t e e c e tr i i do e roce o de i id ci orce t e de ce de e ec ci de ro ecto e de ce ro r do de c erdo co re ro r ci o de ro r de i er io e re e t do or e co tr ti t ro do or i ter e tor

Co tr to de de ici io de C ete

co tr to e e c e tr ter i do e ec t do e ec de i i ci e e de
io de et ic e ec t d e etro de i e to r ido MR er do
et ic i ici c er de etro



ORM O D R OR o
R OR o
rodo 1 a d o

O R O D R OR o 7 D 1



ORM O R O D R OR

co tr to de i ter e tor re e t o i ie te r etro

D RRO O D O R O D R OR	
o de roce o de e ecci	CM DO RT
o ID de CO	CO CC TR
o de co tr to	de
ec de cri ci	de dicie re de
O eto	I T R TOR T C IC DMI I TR TI I CI R M I T R M T IMI TO M OR MI TO D T RCI RI D RO R M "CO OM I R R" O M ICI IO D D RT M TO D C RDO R O
Co tr ti t	CO ORCIO I R R
IT	
I te r te IT orce t e de rtici ci	M DO I R O C C O IT
or i ici	
dici o	
dici o	
dici o	
or tot	
o	t de io de
ec de i icio	de e rero de
r rro de ec de de io de	t de dicie re de
r rro de ec de de e tie re de	t de e tie re de
r rro de ec de de dicie re de	t de dicie re de
r rro de ec de de e rero de	t de e rero de
e i de ec de de e rero de	t de ri de
Rei icio de ec de de ri de	t de io de
e i de ec de de ri de	t de io de
Rei icio de ec de de io de	t de io de
ec de ter i ci ct de co tr to	de io de
Direcci ero de te o o	C e o orid c Te

O O

ec de i icio r e co tr to de i ter e tor e dio rtir de de e rero de ie tr e r o co tr to de o r e ir ro ct de i icio e i ie te ec e de e rero de i icio de co tr to de ici io de e o e o de e rero de i icio de co tr to de ici io de e et Ric de r o de i icio de co tr to de ici io de Mo ter de oct re de i icio e co tr to de ici io de C ete

o ra o 1 d 1 d m o d ya e e c e tr ec t do e o co tr ct e ci e de dicie re de et ic e ec t d e de etro de c e er do e et ic i ici de co tr to c er de etro e re e t ro ore c tid de e e te de ir do e e co te re e o co te ri de ir do de e d r de ordi o de c et o r o de c e re e o ter e

co tr ti t re i e tre de o r e co to co i ter e tor d i i tr ci ici co id de corre i ie to de D ici e d de dicie re de o r e reci i ti cci c ie do co o di e o e eci ic cio e t c ic de ro ecto e re i ct de reci o i de o r co c e co tr ti t de e ct i r i de co tr to

o ra o d 1 d m o d Mo r a e ec ci de o r ic de er odo re re e t ce e ec t do c do de ce ro r do de de c erdo re ro r ci de i er io e ro do

co tr ti t re i e tre de o r e co to co i ter e tor d i i tr ci ici co id de de o di ti to corre i ie to e d de io de o r e reci i ti cci c ie do co o di e o e eci ic cio e t c ic de ro ecto

e re i ct de reci o i de o r co c e co tr ti t de e ct i r i de co tr to

orce t e de ce de e ec ci r e te eriodo e e o ra o 11 d 1 d **m o d a a R a** e e c e tr e ec t do e co tr ct e ci e de ri de D r te et de e ec ci de co tr to e re i dici e te er itie do e c ce de et ic co tr ct

e re i o i it re i reci i ie to de tr o e i ter e ci or rte de l ter e tor d i i tr ci ici De o terior ri iero o er cio e rre o o c e e co tr ti t e co ro eti re i r e re ed d de o o i e r e c o e corre o die te reci o ti cci de o r

orce t e de ce de e ec ci r e te eriodo e e o ra o 11 d d **m o d a a R a** e e c e tr e ec t do e tot id d co orce t e de e ec ci de cie or cie to de or de co tr to reci id ti cci or i ter e tor e ici io de et Ric c ie do co e eci ic cio e t c ic de ro ecto

ce de o ra o 7 d d **m o d a a R a** co r do co e ro r de i er io e i e te e e c e tr e e i ie te e t do

Valor Total ejecutado acumulado al mes 8	$ 2.172.552.096,00
Valor Obra Básica en el mes 8	$ 362.432.949,00
Valor Básico Estudios y Diseños	$7.000.000,00
Valor total Iva	$ 1.330.000,00
Porcentaje ejecutado acumulado obra básico	100%
Porcentaje programado obra básico	100%

e ec ci de o r ic de er odo re re e t ce e ec t do c do de ce ro r do de ce ro r do de c erdo re ro r ci de i er io e ro do

e re i o i it re i reci i ie to de tr o e i ter e ci or rte de l ter e tor d i i tr ci ici De o terior r iero o er cio e rre o o c e e co tr ti t e co ro eti re i r e re ed d de o o i e r e c o e corre o die te reci o ti cci de o r

o ra o 1 d 1 d m o d o o tie e ce e ec t do de cie or cie to ec de ter i ci e e de oct re de de c erdo co r rro o d d or e ici io de e o e o or e

ro ecto e e ec t e tot id d te ie do recorte e et ic i ici e e tr o de ci t r de etro o c e de i i c i de re o ici de t er de c ed cto e e e co tr de o de i e to e c ido id ti de i c ero cti id de dicio e co o co tr cci de rete de etro de to r rotecci de t d e e e i t ci de red ctore de e ocid d o c e o e t co te do e e re e to

c id d de o teri e ti i do e or ido corro or d co ti e te de c erdo co or e o ic e c d de cti id de de ro ecto re i do e o re ecti o e o o de or torio o c e c e co re eridoe e ecific cio e

	ORM O D D R OR D **R OR o** **rodo 1 a d o** **O R O D R OR o 7 D 1**	CONSORCIO VIAL RURAL

o ra o 1 – o o e e c e tr e ec t do e e o co tr ct

e ci e de io de D r te et de e ec ci de co tr to e re i dici
e te er itie do e c ce de et ic co tr ct

e re i o i it re i reci i ie to de tr o e i ter e ci or rte de l ter e tor
d i i tr ci ici De o terior r iero o er cio e rre o o c e e
co tr ti t e co ro eti re i r e re ed d de o o i e r e c o e
corre o die te reci o ti cci de o r

o ra o 1 d d M o d a a e e c e tr ter i do e ec t do e

ec de i i ci e e de io de et ic e ec t d e
etro de i e tor ido MR er do et ic i ici c er de etro
de e ec t ro o r de co tr cci de oc c e ordi o de e e i t ci
de e i ci ertic de rc ci ori o t o r o de tr o i ter e ido e tre
ci de ie do co o di e o e eci ic cio e t c ic de ro ecto

i ter e tor reco ie d e ec t r ro o er e e o de
reco e d cio e e rece e e de te i ie to de r r ti r
e e t id d de o tr o

R ardo R ad a
Director l ter e tor

l or e de ro r de C –

Te ie do e c ro e o co tr ti t de o r tie e re ci direct co o
ici io e or co i ie te e co tr to o e t o i do re i r
co ro e e e i o e e e o ce de o r co ti ci e re e t
e e i ie te c dro o recio co tr ct e co dicio e co o ti i
ct de co ro re i d or c d o de o co tr ti t

CONTRATO	VR TOTAL	VR BASICO	% DE AVANCE	VALOR EJECUTADO
097-2023 P. RICA - CAROLINA	2.180.882.096	2.167.595.908,00	42,70%	931.236.654,99
119-2023 P.RICA - ALMENDRO	570.436.364,57	563.071.322,94	40,50%	231.026.727,65
105-2023 -PUEBLO NUEVO	2.249.293.254	2.174.022.033,00	15,05%	338.518.634,73
010-2022 - CANALETE	1.754.072.775,7	1.729.204.155,7	100,00%	1.754.072.775,70
020-2021 - MONTERIA	18.896.043.112	18.648.749.664	83,48%	15.774.416.789,90
129-2021 P. RICA - CAROLINA	5.129.100.000	5.110.145.204	100,00%	5.129.100.000,00
112-2021 P.RICA - ALMENDRO	2.102.000.000	2.075.949.492	100,00%	2.102.000.000,00
129-2021 -PUEBLO NUEVO	5.849.341.239	5.812.087.738	100,00%	5.849.341.239,00
015-2021 - AYAPEL	908.101.145	889.146.349	100,00%	908.101.145,00
TOTALES OBRA	**39.639.269.986,27**	**39.169.971.866,54**	**83,30%**	**33.017.813.966,97**
TOTALES INTERVENTORIA	**3.306.999.387,00**		**95,86%**	**3.170.161.737**
I/O	**8,34%**			**9,60%**

ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5	ACTA 6	TOTAL PAGADO	%	
								CAROLINA 2
210.538.881						210.538.881	**36,91%**	ALMENDRO 2
								PUEBLO NUEVO 2
1.104.907.774	473.736.341					1.578.644.115	**90,00%**	CANALETE
2.099.404.784	2.564.257.160	6.008.165.861	2.196.135.245	1.260.939.142	1.275.345.219	15.404.247.411	**81,52%**	MONTERIA
1.279.404.164,32	2.236.077.984,44	870.516.309,50	743.101.541,74			5.129.100.000,00	**100,00%**	CAROLINA
877.793.726,43	502.529.632,80	223.417.290,38	498.259.350,39			2.102.000.000,00	**100,00%**	ALMENDRO
1.384.783.102,50	531.404.473,00	319.683.699,50	1.378.022.672,00	1.385.111.545,00	265.401.623,10	5.264.407.115,10	**90,00%**	PUEBLO NUEVO
200.845.072,00	113.940.804,00	100.677.217,00	53.818.886,00	208.321.896,00	230.497.270,00	908.101.145	**100,00%**	AYAPEL

l or e tri de rie o

corte de re e te i or e o e re e t i ti o de rie o e ect r e ec ci
de o co tr to de o r e i ter e tor c ie to co o e ti do de tro de
M de l ter e tor e i c e tri de rie o o ort id de
corre o die te co tr to de l ter e tor

l or ci otro ro r ic ti o e ie o de co dicio e Co tr to de
O r e l ter e tor

• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el i te de i or ci eo r ico l de tid d

De tro de o ci co d ie i ie te Re i T c ic l ici e co tr ti t de e re i r edi te o icio co t de ode o de d to te direcci co ete te de Direcci T c ic de tr ct r ci co e i de e o o e e de rro r d r te e ec ci de co tr to e co ti e co i te te co e i te de l or ci eo r ico l ti i do or e l tit to r o c de e co t r e e i ie te i tt er e i i o co ei o e e i di e direcci co ete te de Direcci T c ic de tr ct r ci

corte de re e te i or e e tie e or rte de o co tr ti t de o co tr to de o r i ie te e tio e

- e e tie e Co tr ti t e tre o c r cteri ci i te e Mi Tr orte
- Mo ter Co tr ti t o re i do e t e ti
- et Ric – Co tr ti t e tre o c r cteri ci i te Mi Tr orte
- et Ric – Co tr ti t e tre o c r cteri ci i te e Mi Tr orte
- e o e o – e co tr ti t e t e roce o de re i r e ti
- e o e o – e co tr ti t o re i do e t e ti
- et Ric – e co tr ti t o re i do e t e ti
- et Ric – e co tr ti t e t e roce o de re i r e ti
- C ete – Co tr ti t e tre o c r cteri ci i te Mi Tr orte

R OR M O R O D R OR

1 i o e c o Co tr to de l ter e tor M l M l R
er o Co tro orte e e rid d oci Co tr to de l ter e tor M l M l R
l or e i ciero re t Co tr to de l ter e tor M l M l R
e i ie to r t Co tr to de l ter e tor M l M l R
e i ie to de C id d Co tr to de l ter e tor M l M l R
Otro doc e to e i ie to e

- Seguimiento a la inversión del Anticipo MEPI M l R M l M l R
- Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado MEPI M l R
- Seguimiento al Plan de Cargas MEPI M l R

i o e c o Co tr to de l ter e tor M l M l R

		C□DI□O	M□□IM□□I□□□□R□□
		□□R□I□□	□
		□□□I□□□	□D□□

□□C□□□ | □□□□□□□□□□

□D□□□Me□□□□o□

□□D□D□□□□□□OR□□ | □□□DIR□CCIO□□D□□□I□□R□□IO□□□□□ | D R□□□□□□□□□RR□□OR□□□□CORDO□□

□O□□RO□□D□□R□O D□□□□□□□□O□□Y□□□□□□□□O□□D□□□□□O□□R□□□O D□□□□□□R□□□□□OR□□□

□□R□ODO□□M□□□□□□ORM□□M□□□□□□□ | □□ □IO D□□□□□□ | □ROY□□□O□ | M□□T□□IMI□□TO□□M□□OR□MI□□TO D□□□I□□□T□RCI□RI□□□D□□□RO□R□M□□CO□OM□□R□□R□□ □□□O□□M□□ICI□IO□□D□□□D□□□RT□M□□TO D□□CORDO□□□□□R□□O□□

□O□□R□□O□□□□R□□□□OR□□□□o□ | □□□□D□□□□□ | □□□□R□□□□OR□□□□ | CO□□ORCIO□□□□R□R□□

□O□□R□□O D□□O□R□□□o□ | □□□D□□□□□□CO□□□□□□D□□□□□ | □O□□R□□□□□□ | □□IO□T□M□OR□□□□I□□□□D□□ICI□□□□□□□□ | □□D□□□□□□□□□

er o Co tro orte e e rid d oci Co tr to de l ter e tor M l M l R

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2273 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 AL 6 DE JUNIO DE 2024 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 2

CONTRATO DE OBRA No.: LP MA 015-2015 (1359-2021) **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL VIA LAS DELICIAS - MUNICIPIO AYAPEL
129-2021 (992-2021) CONSORCIO VIAL H&P, R.I HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO- MUNICIPIO PUEBLO NUEVO
129-2021 (925-2021) MARIO POMPILLO SINISTERRA - MUNICIPIO PLANETA RICA
112-2021 (1143-2021) CONSORCIO VIAL - MUNICIPIO PLANETA RICA
LP-SPM- 020-2021 (920-2021) CONSORCIO CORDOBA - MUNICIPIO MONTERIA

NOMBRE ARL: ARL SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACOR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	RICARDO RUGE PADILLA	91.287.961	Director	$ 6,700,000	X	X	X	X	X	X																								20%		$ 2,680,000	$ 186,600	V	SANITAS	30298670	$ 107,200	PORVENIR	30298670	$ 455,600	$ 107,200	N.A	N.A	
2	JORGE LUIS JALAL CARVAJAL	15.648.189	Ingeniero Residente	$ 4,200,000	X	X	X	X	X	X																								20%		$ 1,400,000	$ 97,500	V	SALUD TOTAL	30298670	$ 56,000	PORVENIR	30298670	$ 224,000	$ 56,000	N.A	N.A	
3	JAIRO LUIS ARCINIEGAS TORRES	1.233.338.812	Ingiero Auxiliar	$ 2,400,000	X	X	X	X	X	X																								20%		$ 960,000	$ 66,900	V	SANITAS	30298670	$ 38,400	PORVENIR	30298670	$ 153,600	$ 38,400	N.A	N.A	
4	DANNA VANESSA ROLDAN QUIÑONEZ	1.066.733.809	Secretaria	$ 1,050,000	X	X	X	X	X	X																								20%		$ 433,334	$ 2,300	I	EPS COOSALUD	30298670	$ 17,400	PORVENIR	30298670	$ 69,400	$ 17,400	N.A	N.A	
5	SANIA ESTHER ARROYO MARTINEZ	1.064.311.758	Inspector SST	$ 1,700,000	X	X	X	X	X	X																								20%		$ 566,667	$ 39,500	V	MUTUAL SER	30298670	$ 22,700	PORVENIR	30298670	$ 90,700	$ 22,700	N.A	N.A	
6	CRISTHIAN ALBERTO CAICEDO	1010035275	Inspector	$ 1,800,000	X	X	X	X	X	X																								20%		$ 600,000	$ 41,800	V	SALUD TOTAL	30298670	$ 24,000	PROTECCION	30298670	$ 96,000	$ 24,000	N.A	N.A	
7	MARIA ISABEL SANCHEZ PICO	63.323.292	Especialista Ambiental	$ 4,800,000																														20%		$ 960,000	$ 249,600	V	SALUD TOTAL	30336793	$ 143,500	SINAFP	30336793	$ -	$ 143,500	N.A	N.A	
8	INGRIS JHOANA RENTERIA ARAGON	26,039,688	Profesional Social	$ 3,600,000	X	X	X	X	X	X																								20%		$ 1,200,000	$ 83,600	V	NUEVA EPS S.A	30298670	$ 48,000	PORVENIR	30298670	$ 192,000	$ 48,000	N.A	N.A	
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 26,250,000																																												

El Interventor adjunta la certificación de fecha 06/06/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JUAN AMADO LIZARAZO
Representante Legal CONSORCIO VIAL RURAL
Matrícula Profesional No.:68202-25792 STD

Firma
Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Supervisor del Contrato
Matrícula Profesional No.:13202-47439 BOL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2273 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO VIAL RURAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 25 AL 28 DE JUNIO DE 2024 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 2

CONTRATO DE OBRA No.: LP MA 015-2015 (1359-2021) 129-2021 (992-2021) 129-2021 (925-2021) 112-2021 (1143-2021) LP-SPM- 020-2021 (920-2021) **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL VIA LAS DELICIAS - MUNICIPIO AYAPEL; CONSORCIO VIAL H&P, R.I HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO- MUNICIPIO PUEBLO NUEVO; MARIO POMPILLO SINISTERRA - MUNICIPIO PLANETA RICA; CONSORCIO VIAL - MUNICIPIO PLANETA RICA; CONSORCIO CORDOBA - MUNICIPIO MONTERIA

NOMBRE ARL: ARL SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACOR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	RICARDO RUGE PADILLA	91.287.961	Director	$ 6,700,000																								X	X	X	X			20%		$ 2,680,000	$ 186,600	V	SANITAS	30298670	$ 107,200	PORVENIR	30298670	$ 455,600	$ 107,200	N.A	N.A	
2	JORGE LUIS JALAL CARVAJAL	15.648.189	Ingeniero Residente	$ 4,200,000																								X	X	X	X			20%		$ 1,400,000	$ 97,500	V	SALUD TOTAL	30298670	$ 56,000	PORVENIR	30298670	$ 224,000	$ 56,000	N.A	N.A	
3	JAIRO LUIS ARCINIEGAS TORRES	1.233.338.812	Ingiero Auxiliar	$ 2,400,000																								X	X	X	X			20%		$ 960,000	$ 66,900	V	SANITAS	30298670	$ 38,400	PORVENIR	30298670	$ 153,600	$ 38,400	N.A	N.A	
4	DANNA VANESSA ROLDAN QUIÑONEZ	1.066.733.809	Secretaria	$ 1,050,000																								X	X	X	X			20%		$ 433,334	$ 2,300	I	EPS COOSALUD	30298670	$ 17,400	PORVENIR	30298670	$ 69,400	$ 17,400	N.A	N.A	
5	SANIA ESTHER ARROYO MARTINEZ	1.064.311.758	Inspector SST	$ 1,700,000																								X	X	X	X			20%		$ 566,667	$ 39,500	V	MUTUAL SER	30298670	$ 22,700	PORVENIR	30298670	$ 90,700	$ 22,700	N.A	N.A	
6	CRISTHIAN ALBERTO CAICEDO	1010035275	Inspector	$ 1,800,000																								X	X	X	X			20%		$ 600,000	$ 41,800	V	SALUD TOTAL	30298670	$ 24,000	PROTECCION	30298670	$ 96,000	$ 24,000	N.A	N.A	
7	INGRIS JHOANA RENTERIA ARAGON	26,039,688	Profesional Social	$ 3,600,000																								X	X	X	X			20%		$ 1,200,000	$ 83,600	V	NUEVA EPS S.A	30298670	$ 48,000	PORVENIR	30298670	$ 192,000	$ 48,000	N.A	N.A	
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			$ 21,450,000																																												

El Interventor adjunta la certificación de fecha 28/06/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JUAN AMADO LIZARAZO
Representante Legal CONSORCIO VIAL RURAL
Matrícula Profesional No.:68202-25792 STD

Firma
Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Supervisor del Contrato
Matrícula Profesional No.:13202-47439 BOL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

I or e i ciero re e t Co tr to de l ter e tor M l
M l l R



□□□□□□O□□□□O□□□D□□□□□
□RO□□□□OM□□O□□□□□□□□□□□□□□□D□□ROY□□□□O□D□□□□R□□□□□R□□□□□R□D□□R□□□□□OR□□
M□□□□□□D□□□□□R□□□□□OR□□O□R□□□□□□□□□
□□ORM□□□□□□□□□□□□□ROY□R□□□□□□□□□□□□□□□□O□□R□□OD□□□□□R□□□□□OR□□

C□DI□O	M□□IM□□□□□□□R□□
□□R□I□□	□
□□□I□□	□ / D□ / □

□□C□□□ □□□□□□□□□□
□D□□□Me□□□□o□

□□□D□D□□□□□□□OR□□□ □□□□DR□CCIO□D□□□I□□R□□IO□□□□□ DIR□□□□□□□□RR□OR□□□□ CORDO□□□□

□O□□R□□OD□□O□R□□□o□ □□□□de□□□□□ □□□□R□□□□□OR□□CO□□ORCIO□□□□R□R□□□□

M□□□□□□ORM□□M□□□□□□□□ □□□□O□D□□□□□□ □ROY□□□O□I□T□R□□□□TOR□□T□C□IC□□□DM□I□TR□T□□□□I□□□□CI□R□□□□M□I□□□□□R□□□□M□□□T□□IM□□TO□□M□□OR□MI□□TO□D□□□□□□T□RCI□RI□□□□
D□□□RO□R□M□□CO□OM□I□R□R□□□T□□□□□D□M□□□ICI□IO□D□□D□□□□RT□M□□TO□D□□□□C□RDO□□□□□R□□O□□□
□

□O□□R□□OD□□O□R□□□o□ □□□M□□□□□□□□□□□□□□□□

e i ie to r t Co tr to de l ter e tor M l M l
R

	[illegible]	C□DI□O	M□□I□M□□I□ [illegible] R[illegible]
	□RO□□□O M[illegible]	□□R□I□□	□
	M□□□□□D[illegible]	□□□I□□	

□□C□□ | [illegible]

D[illegible] Me[illegible] o□

□□I**D**□**D**[illegible] **OR**[illegible] □□□DIR□CCIO□[illegible]I□□R□□IO□□□□□ **D**iR□□□[illegible] □[illegible]**RR**[illegible]**OR**[illegible]□□CORDO□□

□**O**□□**R**□□**O**I**D**[illegible] □□**R**□□□**OR**[illegible] **o**[illegible] □□□□D[illegible] [illegible] □□□**R**□□□**OR**□CO□□ORCIO[illegible]I□□R□R□□

O□□□□**O**I**D**□□□□**O**□□**R**□□**O**[illegible]

I□T□R□□□TOR[illegible]T□C□IC□[illegible]DMI□I□TR□TI□□[illegible]I□□□CI□R□[illegible]M□I□□T□[illegible]R□[illegible]M□□T□□IMI□□TO[illegible]M□□OR□MI□□TO□D[illegible]□□T□RCI□RI□□□ D□□[illegible]RO□R□M□CO□OM□I□R□R□[illegible]□□O□M□□ICI□IO□D□□□D□□□RT□M□□TO□D□□C□RDO□□[illegible]R□□O[illegible]

□□□□□**D**[illegible] **O**□ □D□[illegible]□□R□RO□D[illegible]

□□□□**O**[illegible] □□□T□[illegible]D[illegible] □IO[illegible]

□□□□□**D**[illegible] **M**[illegible] **O**[illegible] [illegible] □□D[illegible] □IO[illegible]
I□c[illegible]e□r□rro□[illegible]e□io□e□□

□□□**OR**[illegible] [illegible] □[illegible]

□□□**OR**[illegible] **M**□□**DO**□ □[illegible]
I□c[illegible]e□dicio□e□□

□□□□**R**□[illegible]**OR**I**D**□□□□**O**□□**R**□□**O**I**D**[illegible] □□**R**□□□**OR**[illegible] □□□□□□O□□IM□R[illegible]IC□RD□[illegible] □□□□□O

□□**R**□□□□[illegible] □□□□□□□□**D**[illegible] **M**□□**M**[illegible] **O**[illegible] □□□□**D**[illegible] □□□□□□□**O**□□**R**□□**O**□**R**[illegible] □□□□

□m□aro	□ [illegible]m□aro	□a□or[illegible] □□□□rado□ [illegible]	[illegible]					
			D□□d□			□a□a		
C□□ □i□ ie□to	□□	□□□□□□□□□□□□□□□□	□□	□□	□□□□□	□□	□□	□□□□□
□□e□□□ □□e□o□□correct□i□□er□í□□□de□□□□tici□o	□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□	□□	□□	□□□□□	□□	□□	□□□□□
□□□o□de□□□□rio□□□re□t□cio□e□□□oci□e□□ e□□□e□□e□i□de□ □í□□cio□e□	□□	□□□□□□□□□□□□□□□□	□□	□□	□□□□□	□□	□□	□□□□□
C□îd□d□de□□er□icio	□□	□□□□□□□□□□□□□□□□	□□	□□	□□□□□	□□	□□	□□□□□

□□**R**□□□□[illegible] □□□□□□□□**D**[illegible] **M**□□**M**[illegible] **O**[illegible] **o**□ □□□□□□□□□□□□□□□□

□□**r**[illegible]**ado**□**d**□**mod**[illegible]**a**□□□□□**o**□**a**□□□□**o**□□**o**[illegible] □
[illegible]e□□□□r□e□[illegible]ti□o□certi□ic□do□de□[illegible] odi□ic□ci□□□o□□□e□o□□□ro□□do□□or□e□□□tit□to□corre□□o□die□te□[illegible]□□co□dicio□e□□i□ici□e□□de□□co□tr□to□

Ra□□□□□**o**□**a**□□□**om**□**a**□**a**[illegible] □□□□□**radora**□ □□□□RO□□D□□□□□T□DO□□□□

□□□□**a**□**d**□**a**□**ro**□**a**□□□□□**d**□□**a**□□**ara**□□**a**□□□□**a**□□□**a**□**a**□**orma**□**d**[illegible] □□□□□O[illegible] □□□□□□□□□□□□

□□**R**□□□□[illegible] □□□□□□□□**D**[illegible] **M**□□**M**[illegible] **O**[illegible] □□□□□**Y**□□**DO**[illegible] **D**[illegible] **O**□□□□**MOD**[illegible] □□□□**O**□□□□□[illegible]**R**□**RRO**□□□□**Y**□□□□□□□□**O**□□□

□□co□ti□□□ci□□i□dic□r□o□□□□ □□ro□□□□i□e□ci□□de□o□□certi□ic□do□de□[illegible] odi□ic□ci□□□o□□□e□o□□□ro□□do□□□or□e□l□□tit□to□e□□□□□orde□□co□□ec□ti□o□

□m□aro	□ [illegible]m□aro	□a□or[illegible] □□□□rado□ [illegible]	[illegible]					
			D□□d□			□a□a		
C□□ □i□ ie□to	□□	□□□□□□□□□□□□□□□□	□□	□□	□□□□□	□□	□□	□□□□□
□□e□□□ □□e□o□□correct□i□□er□í□□□de□□□□tici□o	□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□	□□	□□	□□□□□	□□	□□	□□□□□
□□□o□de□□□□rio□□□re□t□cio□e□□□oci□e□□ e□□□e□□e□i□de□ □í□□cio□e□	□□	□□□□□□□□□□□□□□□□	□□	□□	□□□□□	□□	[illegible]	□□□□□
C□îd□d□de□□er□icio	□□	□□□□□□□□□□□□□□□□	□□	□□	□□□□□	□□	□□	□□□□□

□□**R**□□□□[illegible] □□□□□□□□**D**[illegible] **M**□□**M**[illegible] **O**[illegible] **o**□ □□□□□□□□□□□□□□□□

□□**r**[illegible]**ado**□**d**□**mod**[illegible]**a**□□□□□**o**□**a**□□□□**o**□□**o**[illegible] □□
[illegible]e□□□□r□certi□ic□do□de□[illegible] odi□ic□ci□□□o□□□e□o□□□ro□□do□□or□e□l□□tit□to□

Ra□□□□□**o**□**a**□□□**om**□**a**□**a**[illegible] □□□□□**radora**□ □□□□RO□□D□□□□□T□DO□□□□

□□□□**a**□**d**□**a**□**ro**□**a**□□□□□**d**□□**a**□□**ara**□□**a**□□□□**a**□□□**a**□**a**□**orma**□**d**[illegible] □□□□□O[illegible] □□□□□□□□□□□□

	RO O M O D ROY O D R R R D R OR M D R OR O R M D R O R O D R OR	C DI O	M I M R
		R I	
		I	

C	
	D Me o

O R O

or to de e di i e ci r e de er co ec ti r cd o de o certi ic do o e o de odi ic ci de r t ro d or e l tit to

l ter e tor de e i c ir e te or to de er co ec ti i or ci r cd o de o certi ic do o e o de odi ic ci de r t ro d or e l tit to l ert r c í e e ier

ir
o re RIC RDO R DI
Director de l ter e tor
M tr c ro e io o TD

ir
o re O IM R IC RD O
er i or Co tr to de l ter e tor
M tr c ro e io o O

Ori i l or e e de l ter e tor rc i o de e ti de l I
Co i l ter e tor Direcci Territori

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	**BUCARAMANGA**	**96**	**96-44-101169521**	10

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	**04**	**2024**	**30**	**12**	**2021**	**00:00**	**31**	**07**	**2027**	**23:59**	**ANEXO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CONSORCIO VIAL RURAL	**NIT: 901.551.905-2**	CALLE 32 NRO. 26-63	FLORIDABLANCA, SANTANDER	6076782235

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**NIT: 800.215.807-2**	CARRERA 59 NO.26-60	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NUMERO 2273 DE 2021 REFERENTE A: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA - GRUPO 2. PARA EL LOTE 1
EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIOS TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA.
LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/12/2021	27/07/2024	$372,699,938.70	$350,699,938.70
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	30/12/2021	27/07/2024	$1,863,499,693.50	$1,753,499,693.50
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	30/12/2021	27/01/2027	$745,399,877.40	$701,399,877.40
CALIDAD DEL SERVICIO	31/07/2022	31/07/2027	$1,118,099,816.10	$1,052,099,816.10

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN LAS SIGUIENTES ACTAS, SE PRORROGA LA VIGENCIA Y SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO DE LA GARANTIA:
-ACTA DE SUSPENSION N. 1 DEL 26/02/2024
-ADICION N. 4 Y PRORROGA N. 5 DEL 05/04/2024

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****764,997.00	$ **********0.00	$ *****145,349.00	$ **********910,346.00	$ ****4,099,699,325.70	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PARMENIDES MANUEL PACHECO PADRON	983936	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-44-101169521

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cerrar | Tramitar | Responder | Imprimir | Verificar Anexos

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MEMORANDO
No SPSC 7016

Fecha
04/02/2022
DD/MM/AAAA

No. Radicación Interna	1662097

Los campos marcados con ■ son requeridos

Información de Asignación

■ **Para**	SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
De	EDWIN JAVIER GALVIS ACEVEDO
De Dependencia	SUBDIRECCIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES
Copia a	
Asignacion de la Copia:	
Asignado a:	ALVARO DE JESUS GALVIS ARAGON

Información del Documento

■ **Referencia**	Respuesta del Memorando Individual No. SVR 6274 02/02/2022

Anexos

■ **Anexo**	**Acta de Garantía contrato No. 2273 de 2021.pdf** **Informe Secop II póliza.pdf**

■Contenido

Cordial saludo Ing Corredor,

En atención al memorando de la referencia, me permito informar que a través de la Plataforma del SECOP II, el día 03 de febrero de 2022 se aprobó la Póliza Única de Cumplimiento No. 96-44-101169521 Anexo No. 1 del 01 de febrero de 2021, QUE AMPARAN EL CONTRATO No. 2273 de 2021.

Atentamente,

95 ² ʟb Ⱳ ! ±ʟ9w D ! [±ʟ{ ! /9±95h

SUBDIRECCIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES

Anexo: Informe SECOP II, Acta de Garantía.

Elaboró: Lina López – Abogada

La movilidad es de todos | Mintransporte

Historia de Correcciones

Fecha	Creador
04/02/2022 10:34:59 am	**YAVIRA ESPERANZA FLORIAN CASTAÑEDA**
04/02/2022 10:34:45 am	**YAVIRA ESPERANZA FLORIAN CASTAÑEDA**

Documento Origen

Documento Origen No. SVR 6274

	MINISTERIO DE TRANSPORTE - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Cč DIGO	
	Subdirección de PROCESOS DE SELECCIÓN CONTRACTUALES		
	Unidad Ejecutora: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	VERSIč N	

CONTRATO No. 2273 de 2021

CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAL RURAL CON NIT. 901.551.905-2
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORðA T£CNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VðAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL Cč RDOBA - GRUPO 2.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	30 de diciembre de 2021
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Hasta el 31 de julio de 2022
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO:	NA
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:	$ 2.850.279.387,00

VALOR ADICIONAL: NA **No.REGISTRO PRESUPUESTAL:** 1081621 del 30 de diciembre de 2021

DOCUMENTO QUE AMPARA LA PÓLIZA:	Contrato Principal

VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS

1. Póliza Única de Cumplimiento No: 96-44-101169521	**Anexo o modificatorio N°: 1 del 01 de febrero de 2022**	**Aseguradora: Seguros del Estado S.A.**

CUMPLIMIENTO-MULTAS-CLAUSULA PENAL.	**Desde:**	30 de diciembre de 2021	**Hasta:**	**Nota de Vigencia:** Hasta la liquidaci· n del Contrato.	**Valor:**	$ 285.027.938,70
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.	**Desde:**	30 de diciembre de 2021	**Hasta:**	**Nota de Vigencia:** Hasta la liquidaci· n del Contrato.	**Valor:**	$ 1.197.596.381,00
PAGO DE SALARIOS-PRESTACIONES SOCIALES-INDEMNIZACIONES LABORALES.	**Desde:**	30 de diciembre de 2021	**Hasta:**	31/07/2025	**Valor:**	$ 570.055.877,40
CALIDAD DEL SERVICIO.	Nota de Vigencia: 5 a¶os contados a partir de la fecha de suscripci· n del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra.				**Valor:**	$ 855.083.816,10

OBSERVACIONES: NA

Vo. Bo.: Lina L· pez. Abogado SPSC
Reviso: Yavira Florian Casta¶eda Abogada SPSC
Aprob· : Edwin Galvis Acevedo Subdirector SPSC

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	**BUCARAMANGA**	**96**	**96-44-101169521**	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
31	**01**	**2022**	**30**	**12**	**2021**	**00:00**	**31**	**07**	**2027**	**23:59**	**EMISION ORIGINAL**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO VIAL RURAL		**NIT: 901.551.905-2**
DIRECCIÓN: CALLE 32 NRO. 26-63	CIUDAD: FLORIDABLANCA, SANTANDER	TELÉFONO: 6076782235

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		**NIT: 800.215.807-2**
DIRECCIÓN: CARRERA 59 NO.26-60	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO 7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NUMERO 2273 DE 2021 REFERENTE A: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA - GRUPO 2. PARA EL LOTE 1
EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIOS TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA.
LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/12/2021	31/01/2025	$285,027,938.70
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	30/12/2021	31/01/2025	$1,197,596,381.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	30/12/2021	31/07/2025	$570,055,877.40
CALIDAD DEL SERVICIO	31/07/2022	31/07/2027	$855,083,816.10

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ESAO S.A.S	804005882-9	50.00
AMADO LIZARAZO JUAN	91206554-5	50.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **21,808,144.00	$ ******25,000.00	$ ***4,148,297.00	$ ********25,981,442.00	$ ****2,907,764,013.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PARMENIDES MANUEL PACHECO PADRON	983936	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE NO 3 -08 - TELEFONO: 78 8 - UCARAMANGA

96-44-101169521

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	**BUCARAMANGA**	**96**	**96-44-101169521**	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	02	2022	30	12	2021	00:00	31	07	2027	23:59	**ANEXO DE DISMINUCION DE LA VIGENCIA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO VIAL RURAL	**NIT: 901.551.905-2**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 32 NRO. 26-63	FLORIDABLANCA, SANTANDER	6076782235

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**NIT: 800.215.807-2**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 59 NO.26-60	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NUMERO 2273 DE 2021 REFERENTE A: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA - GRUPO 2. PARA EL LOTE 1
EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIOS TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA.
LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/12/2021	31/01/2023	$285,027,938.70	$285,027,938.70
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	30/12/2021	31/01/2023	$1,197,596,381.00	$1,197,596,381.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	30/12/2021	31/07/2025	$570,055,877.40	
CALIDAD DEL SERVICIO	31/07/2022	31/07/2027	$855,083,816.10	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y DEL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ * 5,938,620.00	$ **********0.00	$ * 1,128,337.00	$ ******* 7,066,958.00	$ ****2,907,764,013.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PARMENIDES MANUEL PACHECO PADRON	983936	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE NO 3 -08 - TELEFONO: 78 8 - UCARAMANGA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

96-44-101169521

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101169521	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	02	2022	30	12	2021	00:00	31	07	2027	23:59	ANEXO DE DISMINUCION DE LA VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO VIAL RURAL		**NIT: 901.551.905-2**
DIRECCIÓN: CALLE 32 NRO. 26-63	**CIUDAD:** FLORIDABLANCA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	6076782235

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		**NIT: 800.215.807-2**
DIRECCIÓN: CARRERA 59 NO.26-60	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7056000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ESAO S.A.S	804005882-9	50.00
AMADO LIZARAZO JUAN	91206554-5	50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE NO 3 -08 - TELEFONO: 78 8 - UCARAMANGA

96-44-101169521

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

MARTHATARAZONA 2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	**BUCARAMANGA**	**96**	**96-44-101169521**	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	02	2022	30	12	2021	00:00	04	09	2027	23:59	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO VIAL RURAL	**NIT: 901.551.905-2**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 32 NRO. 26-63	FLORIDABLANCA, SANTANDER	6076782235

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**NIT: 800.215.807-2**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 59 NO.26-60	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NUMERO 2273 DE 2021 REFERENTE A: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA - GRUPO 2. PARA EL LOTE 1
EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIOS TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA.
LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/12/2021	06/03/2023	$285,027,938.70	$285,027,938.70
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	30/12/2021	06/03/2023	$1,197,596,381.00	$1,197,596,381.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	30/12/2021	04/09/2025	$570,055,877.40	
CALIDAD DEL SERVICIO	31/07/2022	31/07/2027	$855,083,816.10	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS DE ACUERDO A LA:
ORDEN DE INICIO DE FECHA 03/02/2022.

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****2,907,764,013.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PARMENIDES MANUEL PACHECO PADRON	983936	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE NO 3 -08 - TELEFONO: 78 8 - UCARAMANGA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

96-44-101169521

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101169521	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	02	2022	30	12	2021	00:00	04	09	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO VIAL RURAL	**NIT: 901.551.905-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CALLE 32 NRO. 26-63	FLORIDABLANCA, SANTANDER	6076782235

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**NIT: 800.215.807-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CARRERA 59 NO.26-60	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ESAO S.A.S	804005882-9	50.00
AMADO LIZARAZO JUAN	91206554-5	50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE NO 3 -08 - TELEFONO: 78 8 - UCARAMANGA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

96-44-101169521

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SHIRLEYRICO

CONTRATO NÚMERO 2273 DE 2021
PRÓRROGA NÚMERO UNO (01) DE 2022

OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 2.
PLAZO SOLICITADO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
INTERVENTOR:	**CONSORCIO VIAL RURAL** CON NIT **901.551.905-2** (INTEGRADO POR JUAN AMADO LIZARAZO CON C.C 91.206.554 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 50 % Y ESAO SAS CON NIT. 804.005.882-9 CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 50%).

Entre los suscritos **CRISTIAN TORO RÍOS,** identificado con cédula de ciudadanía número 1.040.036.927, quien obra en su calidad de **SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS**, nombrado mediante Resolución No. 3555 del 16 de noviembre de 2021 y posesionado mediante Acta No. 201 del 16 de noviembre de 2021, obrando en nombre y representación del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS**, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre de 2021, debidamente facultado al respecto por la Resolución de Delegación de Funciones No. 3202 del 21 de octubre de 2021, modificada por las Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre de 2021, 3343 del 02 de noviembre de 2021, 3429 del 05 de noviembre de 2021 y 3684 del 24 de noviembre de 2021, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se denominará **EL INSTITUTO** por una parte, y por la otra, **JUAN AMADO LIZARAZO**, identificado con C.C. No. 91.206.554 de Bucaramanga, obrando en nombre y representación de **CONSORCIO VIAL RURAL con NIT 901.551.905-2,** manifestando bajo la gravedad del juramento que ni él, ni los integrantes de la sociedad que represento, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad, impedimento o incompatibilidad para contratar, y quien, para efectos del presente documento se denominará **EL INTERVENTOR**, en razón a que anteriormente celebramos contrato principal número 2273 de 2021, hemos convenido realizar la prórroga número uno (1) el contrato previas las siguientes consideraciones

CONSIDERACIONES

1) Que, mediante oficio CVR-363-2022 del 07 de julio de 2022, EL INTERVENTOR solicita la prórroga del contrato No. 2273 de 2021.

2) Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1 Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga del 07 de julio de 2022, suscrito por el Interventor, el Director Territorial, el Jefe de la Unidad Ejecutora, el Supervisor del Contrato de Interventoría, el Gestor Técnico de Proyecto y el Abogado de la Unidad Ejecutora.

3) Que la solicitud fue estudiada en su integridad por el Comité de Contratación, quien la aprobó según Acta No. 41 del 21 de julio de 2022.

4) Que con Memorando SVR 55980 del 26 de julio de 2022, la Subdirección de Vías Regionales, solicita a la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos dar trámite a la minuta de prórroga del contrato.

5) Que la garantía de cumplimiento que ampara la orden de inicio, fue aprobada por EL INSTITUTO a través de la plataforma transaccional SECOP II, el día 14 de marzo de 2021.

Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá por las disposiciones del Contrato No. 2273 de 2021 y las siguientes

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el plazo del Contrato No. 2273 de 2021, desde el 31 de julio de 2022, hasta el 31 de diciembre de 2022.

PARÁGRAFO PRIMERO: La presente ampliación del plazo del contrato se concede por solicitud del INTERVENTOR y no implica adición en valor ni sobrecostos para EL INSTITUTO, por lo que EL INTERVENTOR efectuará la reprogramación con los recursos existentes del contrato y no presentará reclamación alguna por mayor permanencia en el sitio de actividades de interventoría que tenga como causa la prórroga otorgada

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente prórroga se concede sin perjuicio de las acciones que EL INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL INTERVENTOR.

CLÁUSULA SEGUNDA: ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS DE PERSONAL Y NUEVO PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL Y OTROS RECURSOS. **-** Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL INTERVENTOR se obliga a presentar para aprobación del INSTITUTO, el acta de modificación de costos de personal y el nuevo programa de distribución de personal y otros recursos correspondientes.

CLÁUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.

CLÁUSULA CUARTA: GARANTÍA ÚNICA. - Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del presente documento, El INTERVENTOR se obliga a prorrogar la garantía única que tiene constituida, de conformidad con el plazo que se fija en el mismo.

CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente documento se perfecciona con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II, Para su ejecución se requiere de la aprobación del certificado de modificación de la Garantía Única de que trata la cláusula correspondiente del presente documento.

Elaboró: Julian Gutierrez Rios – Abg. SVR
Vo. Bo. Minuta: Cristian Eduardo Beltrán Cerón– Abogado SVR
Vo Bo. Edgar Fabian López Carrillo – Abogado GGP4 SMCN

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	**BUCARAMANGA**	**96**	**96-44-101169521**	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	**08**	**2022**	**30**	**12**	**2021**	**00:00**	**31**	**12**	**2027**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO VIAL RURAL	**NIT: 901.551.905-2**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 32 NRO. 26-63	FLORIDABLANCA, SANTANDER	6076782235

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**NIT: 800.215.807-2**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 59 NO.26-60	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NUMERO 2273 DE 2021 REFERENTE A: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA - GRUPO 2. PARA EL LOTE 1
EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIOS TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA.
LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/12/2021	01/07/2023	$285,027,938.70	$285,027,938.70
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	30/12/2021	01/07/2023	$1,197,596,381.00	$1,197,596,381.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	30/12/2021	31/12/2025	$570,055,877.40	$570,055,877.40
CALIDAD DEL SERVICIO	31/07/2022	31/07/2027	$855,083,816.10	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AMPLIA LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS
DE ACUERDO AL:
PRORROGA NUMERO UNO (01) DE 2022
EL CUAL ESTABLECE AMPLIAR LA VIGENCIA DESDE 31/07/2022 HASTA 31/12/2022

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,319,088.00	$ *******8,000.00	$ *****252,146.00	$ *********1,579,235.00	$ ****2,907,764,013.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PARMENIDES MANUEL PACHECO PADRON	983936	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE NO 3 -08 - TELEFONO: 78 8 - UCARAMANGA

96-44-101169521

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	**BUCARAMANGA**	**96**	**96-44-101169521**	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	**08**	**2022**	**30**	**12**	**2021**	**00:00**	**31**	**12**	**2027**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO VIAL RURAL	**NIT: 901.551.905-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CALLE 32 NRO. 26-63	FLORIDABLANCA, SANTANDER	6076782235

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**NIT: 800.215.807-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CARRERA 59 NO.26-60	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA · MasterCard · Diners Club International · American Express

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SURTIMAX · Movil Red · Bancolombia Corresponsal Bancario · éxito · Gran Ganga · Su Red · Ca · Copidrogas

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros de Vida del Estado Cuenta Corriente 008465452

Grupo Bancolombia — Seguros de Vida del Estado Cuenta Convenio 47190

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,319,088.00	$ *******8,000.00	$ *****252,146.00	$ *********1,579,235.00	$ ****2,907,764,013.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PARMENIDES MANUEL PACHECO PADRON	983936	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE NO 3 -08 - TELEFONO: 78 8 - UCARAMANGA

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11014110887719(3900)000001579235(96)20221230

REFERENCIA PAGO:

1101411088771-9

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101169521	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	08	2022	30	12	2021	00:00	31	12	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO VIAL RURAL		**NIT: 901.551.905-2**
DIRECCIÓN: CALLE 32 NRO. 26-63	**CIUDAD:** FLORIDABLANCA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	6076782235

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		**NIT: 800.215.807-2**
DIRECCIÓN: CARRERA 59 NO.26-60	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7056000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ESAO S.A.S	804005882-9	50.00
AMADO LIZARAZO JUAN	91206554-5	50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE NO 3 -08 - TELEFONO: 78 8 - UCARAMANGA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

96-44-101169521

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

MARTHATARAZONA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	**BUCARAMANGA**	**96**	**96-44-101169521**	**4**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	**10**	**2022**	**30**	**12**	**2021**	**00:00**	**31**	**07**	**2027**	**23:59**	**ANEXO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CONSORCIO VIAL RURAL	**NIT: 901.551.905-2**	CALLE 32 NRO. 26-63	FLORIDABLANCA, SANTANDER	6076782235

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**NIT: 800.215.807-2**	CARRERA 59 NO.26-60	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NUMERO 2273 DE 2021 REFERENTE A: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA - GRUPO 2. PARA EL LOTE 1
EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIOS TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA.
LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/12/2021	01/07/2023	$295,699,938.70	$285,027,938.70
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	30/12/2021	01/07/2023	$1,197,596,381.00	$1,197,596,381.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	30/12/2021	31/12/2025	$591,399,877.40	$570,055,877.40
CALIDAD DEL SERVICIO	31/07/2022	31/07/2027	$887,099,816.10	$855,083,816.10

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AUMENTA EL VALOR DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA ADICION UNO (1) DE 2022 el cual indica aumentar el contrato en $ 106.720.000

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****462,141.00	$ *******8,000.00	$ ******89,326.00	$ **********559,468.00	$ ****2,971,796,013.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PARMENIDES MANUEL PACHECO PADRON	983936	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE NO 3 -08 - TELEFONO: 78 8 - UCARAMANGA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

96-44-101169521

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	**BUCARAMANGA**	**96**	**96-44-101169521**	**4**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	**10**	**2022**	**30**	**12**	**2021**	**00:00**	**31**	**07**	**2027**	**23:59**	**ANEXO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO VIAL RURAL	**NIT: 901.551.905-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CALLE 32 NRO. 26-63	FLORIDABLANCA, SANTANDER	6076782235

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**NIT: 800.215.807-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CARRERA 59 NO.26-60	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse · VISA · MasterCard · Diners Club International · American Express

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SURTIMAX · Móvil Red · Bancolombia Corresponsal Bancario · éxito · Gana Gana · copidrogas

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****462,141.00	$ *******8,000.00	$ ******89,326.00	$ **********559,468.00	$ ****2,971,796,013.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PARMENIDES MANUEL PACHECO PADRON	983936	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE NO 3 -08 - TELEFONO: 78 8 - UCARAMANGA

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11014111010992(3900)000000559468(96)20231007

REFERENCIA PAGO:

1101411101099-2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101169521	4

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
07	10	2022	30	12	2021	00:00	31	07	2027	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO VIAL RURAL	**NIT: 901.551.905-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CALLE 32 NRO. 26-63	FLORIDABLANCA, SANTANDER	6076782235

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**NIT: 800.215.807-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CARRERA 59 NO.26-60	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ESAO S.A.S	804005882-9	50.00
AMADO LIZARAZO JUAN	91206554-5	50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE NO 3 -08 - TELEFONO: 78 8 - UCARAMANGA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

96-44-101169521

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SHIRLEYRICO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	**BUCARAMANGA**	**96**	**96-44-101169521**	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	**12**	**2022**	**30**	**12**	**2021**	**00:00**	**30**	**09**	**2028**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO VIAL RURAL	**NIT: 901.551.905-2**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 32 NRO. 26-63	FLORIDABLANCA, SANTANDER	6076782235

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**NIT: 800.215.807-2**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 59 NO.26-60	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NUMERO 2273 DE 2021 REFERENTE A: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA - GRUPO 2. PARA EL LOTE 1
EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIOS TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA.
LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/12/2021	30/03/2024	$295,699,938.70	$295,699,938.70
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	30/12/2021	30/03/2024	$1,197,596,381.00	$1,197,596,381.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	30/12/2021	30/09/2026	$591,399,877.40	$591,399,877.40
CALIDAD DEL SERVICIO	31/07/2022	31/07/2027	$887,099,816.10	$887,099,816.10

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AMPLIA LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS DE ACUERDO A LA PRORROGA NRO. TRES
EL CUAL ESTABLECE AMPLIAR LA VIGENCIA DESDE EL 31/12/2022 HASTA 30/09/2023.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***3,118,477.00	$ *******8,000.00	$ *****594,030.00	$ *********3,720,507.00	$ ****2,971,796,013.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PARMENIDES MANUEL PACHECO PADRON	983936	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE NO 3 -08 - TELEFONO: 78 8 - UCARAMANGA

96-44-101169521

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	**BUCARAMANGA**	**96**	**96-44-101169521**	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	**12**	**2022**	**30**	**12**	**2021**	**00:00**	**30**	**09**	**2028**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO VIAL RURAL	**NIT: 901.551.905-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CALLE 32 NRO. 26-63	FLORIDABLANCA, SANTANDER	6076782235

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**NIT: 800.215.807-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CARRERA 59 NO.26-60	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard Diners Club International AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SURTIMAX Movii Red Bancolombia Corresponsal Bancario éxito Gana Gana copidrogas

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***3,118,477.00	$ *******8,000.00	$ *****594,030.00	$ *********3,720,507.00	$ ****2,971,796,013.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PARMENIDES MANUEL PACHECO PADRON	983936	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE NO 3 -08 - TELEFONO: 78 8 - UCARAMANGA

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11014111153871(3900)000003720507(96)20221230

REFERENCIA PAGO:

1101411115387-1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101169521	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	12	2022	30	12	2021	00:00	30	09	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO VIAL RURAL		**NIT: 901.551.905-2**
DIRECCIÓN: CALLE 32 NRO. 26-63	**CIUDAD:** FLORIDABLANCA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	6076782235

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		**NIT: 800.215.807-2**
DIRECCIÓN: CARRERA 59 NO.26-60	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7056000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ESAO S.A.S	804005882-9	50.00
AMADO LIZARAZO JUAN	91206554-5	50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE NO 3 -08 - TELEFONO: 78 8 - UCARAMANGA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

96-44-101169521

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

CONTRATO NÚMERO 2273 DE 2021
PRÓRROGA NÚMERO DOS (02) DE 2022

OBJETO:	INTERVENTORÔA T£CNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÔAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL Cč RDOBA - GRUPO 2.
PLAZO SOLICITADO:	HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO VIAL RURAL CON NIT 901.551.905-2 (INTEGRADO POR JUAN AMADO LIZARAZO CON C.C 91.206.554 CON UNA PARTICIPACIč N DEL 50 % Y ESAO SAS CON NIT. 804.005.882-9 CON UNA PARTICIPACIč N DEL 50%).

Entre los suscritos, **CRISTIAN TORO RIOS**, identificado con c®dula de ciudadan²a n¼mero 1.040.036.927, en calidad de **SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS**, nombrado mediante Resoluci· n No. 3555 del 16 de noviembre de 2021 y posesionado mediante Acta No. 201 del 16 de noviembre de 2021, obrando en nombre y representaci· n del **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS,** Establecimiento p¼blico del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto 1292 del 14 de octubre de 2021, debidamente facultado al respecto por la Resoluci· n de Delegaci· n de Funciones No. 3202 del 21 de octubre del 2021, modificada por las Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre de 2021, 3343 del 02 de noviembre de 2021, 3429 del 05 de noviembre de 2021 y 3684 del 24 de noviembre de 2021, expedidas por el INVIAS, quien para los efectos de este documento se denominar§, **EL INSTITUTO** por una parte, y por la otra, **JUAN AMADO LIZARAZO,** identificado con C.C. No. 91.206.554 de Bucaramanga, obrando en nombre y representaci· n del **CONSORCIO VIAL RURAL**, en su calidad de representante legal, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni ®l, ni los integrantes del consorcio que representa, se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar, y quien, para efectos del presente documento, se llamar§ **EL INTERVENTOR,** en raz· n a que anteriormente celebramos el Contrato No. 2273 del 30 de diciembre del 2021, Prorroga No. 1 del 29 de julio del 2022, y Adici· n No. 1 del 04 de octubre del 2022, hemos convenido prorrogar el contrato previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1). Que mediante oficio CVR-598-2022 del 28 de noviembre de 2022, EL INTERVENTOR solicita la pr· rroga del contrato N¼mero 2273 de 2021.

2). Que la justificaci· n que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MEPIï MN1-IN-13-FR-1 Solicitud de Adici· n y/o Modificaci· n y/o Pr· rroga del 28 de noviembre de 2022, suscrito por el Representante legal de la interventor²a, el Supervisor del Contrato de

Interventor²a, el Director Territorial, el Gestor T®cnico del Proyecto, el Abogado de la Unidad Ejecutora, y la Jefe de la Unidad Ejecutora (E).

3). Que mediante Memorando SVR 94785 24 de noviembre del 2022, la Subdirecci· n de V²as Regionales, solicito a la Oficina Asesora de Planeaci· n el tr§mite de las Vigencia Futuras del Contrato 2273 del 2021.

4). Que con Memorando OAP 95443 25 de noviembre del 2022, la oficina Asesora de Planeaci· n informa que no es posible dar tr§mite a la solicitud.

5). Que la solicitud de pr· rroga fue estudiada en su integridad por el Comit® de Contrataci· n, quien la aprob· seg¼n Acta No. 73 del 19 de diciembre de 2022.

6). Que con Memorando SVR 105779 del 26 de diciembre de 2022, la Subdirecci· n de V²as Regionales, solicita a la Subdirecci· n de Gesti· n Contractual y Procesos Administrativos dar tr§mite a la minuta de pr· rroga del contrato.

Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regir§ por las disposiciones del Contrato N¼mero 2773 de 2021 y las siguientes:

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el plazo del Contrato N¼mero 2273 de 2021, desde el 31 de diciembre de 2022, hasta el 30 de septiembre del 2023

PARÁGRAFO PRIMERO: La presente ampliaci· n del plazo del contrato se concede por solicitud del INTERVENTOR y no implica adici· n en valor ni sobrecostos para EL INSTITUTO, por lo que EL INTERVENTOR efectuar§ la reprogramaci· n con los recursos existentes del contrato, y no presentar§ reclamaci· n alguna por mayor permanencia en el sitio de actividades de interventor²a que tenga como causa la pr· rroga otorgada.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente pr· rroga se concede sin perjuicio de las acciones que EL INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL INTERVENTOR.

CLÁUSULA SEGUNDA: ACTA DE MODIFICACION DE COSTOS DE PERSONAL Y NUEVO PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL Y OTROS RECURSOS. - Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL INTERVENTOR se obliga a presentar para aprobaci· n del INSTITUTO, el acta de modificaci· n de costos de personal y el nuevo programa de distribuci· n de personal y otros recursos correspondientes.

CLÁUSULA TERCERA: GARANTÍA ÚNICA. - Dentro de los tres (3) d²as h§biles siguientes a la suscripci· n del presente documento, El INTERVENTOR se obliga a prorrogar la garant²a ¼nica que tiene constituida, de conformidad con el plazo que se fija en el mismo.

CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Contin¼an vigentes todas las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.

<u>CLÁUSULA QUINTA</u>: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente contrato se perfecciona con la firma electr· nica de las partes a trav®s de la plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecuci· n se requiere de la aprobaci· n del certificado de pr· rroga de la Garant²a Ðnica de que trata la cl§usula correspondiente del presente documento.

Proyect· Minuta: Lina Gonz§lez Contratista SGCP
Vo Bo Minuta: Mar²a Paula S§nchez Abogada SGCP

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	**BUCARAMANGA**	**96**	**96-44-101169521**	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	**12**	**2022**	**30**	**12**	**2021**	**00:00**	**30**	**09**	**2028**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO VIAL RURAL	**NIT: 901.551.905-2**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 32 NRO. 26-63	FLORIDABLANCA, SANTANDER	6076782235

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**NIT: 800.215.807-2**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 59 NO.26-60	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NUMERO 2273 DE 2021 REFERENTE A: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA - GRUPO 2. PARA EL LOTE 1
EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIOS TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA.
LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/12/2021	30/03/2024	$295,699,938.70	$295,699,938.70
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	30/12/2021	30/03/2024	$1,197,596,381.00	$1,197,596,381.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	30/12/2021	30/09/2026	$591,399,877.40	$591,399,877.40
CALIDAD DEL SERVICIO	31/07/2022	31/07/2027	$887,099,816.10	$887,099,816.10

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AMPLIA LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS DE ACUERDO A LA PRORROGA NRO. TRES
EL CUAL ESTABLECE AMPLIAR LA VIGENCIA DESDE EL 31/12/2022 HASTA 30/09/2023.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***3,118,477.00	$ *******8,000.00	$ *****594,030.00	$ *********3,720,507.00	$ ****2,971,796,013.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PARMENIDES MANUEL PACHECO PADRON	983936	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE NO 3 -08 - TELEFONO: 78 8 - UCARAMANGA

96-44-101169521

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	**BUCARAMANGA**	**96**	**96-44-101169521**	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	**12**	**2022**	**30**	**12**	**2021**	**00:00**	**30**	**09**	**2028**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO VIAL RURAL	**NIT: 901.551.905-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CALLE 32 NRO. 26-63	FLORIDABLANCA, SANTANDER	6076782235

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**NIT: 800.215.807-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CARRERA 59 NO.26-60	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard Diners Club International AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SURTIMAX Movii Red Bancolombia Corresponsal Bancario éxito Gana Gana copidrogas

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***3,118,477.00	$ *******8,000.00	$ *****594,030.00	$ *********3,720,507.00	$ ****2,971,796,013.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PARMENIDES MANUEL PACHECO PADRON	983936	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE NO 3 -08 - TELEFONO: 78 8 - UCARAMANGA

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11014111153871(3900)000003720507(96)20221230

REFERENCIA PAGO:

1101411115387-1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101169521	5

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	12	2022	30	12	2021	00:00	30	09	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO VIAL RURAL		**NIT: 901.551.905-2**
DIRECCIÓN: CALLE 32 NRO. 26-63	**CIUDAD:** FLORIDABLANCA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	6076782235

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		**NIT: 800.215.807-2**
DIRECCIÓN: CARRERA 59 NO.26-60	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7056000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ESAO S.A.S	804005882-9	50.00
AMADO LIZARAZO JUAN	91206554-5	50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE NO 3 -08 - TELEFONO: 78 8 - UCARAMANGA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

96-44-101169521

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	**BUCARAMANGA**	**96**	**96-44-101169521**	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	**09**	**2023**	**30**	**12**	**2021**	**00:00**	**31**	**07**	**2027**	**23:59**	**ANEXO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO VIAL RURAL		**NIT: 901.551.905-2**
DIRECCIÓN: CALLE 32 NRO. 26-63	CIUDAD: FLORIDABLANCA, SANTANDER	TELÉFONO: 6076782235

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		**NIT: 800.215.807-2**
DIRECCIÓN: CARRERA 59 NO.26-60	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO 7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NUMERO 2273 DE 2021 REFERENTE A: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA - GRUPO 2. PARA EL LOTE 1
EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIOS TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA.
LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/12/2021	30/03/2024	$330,699,938.70	$295,699,938.70
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	30/12/2021	30/03/2024	$1,197,596,381.00	$1,197,596,381.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	30/12/2021	30/09/2026	$661,399,877.40	$591,399,877.40
CALIDAD DEL SERVICIO	31/07/2022	31/07/2027	$992,099,816.10	$887,099,816.10

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SEGUN ADICION NUMERO DOS (02) Y PRORROGA NUMERO TRES(03) DE 2023 SE AJUSTA VIGENCIA Y VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA ARRIBA

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,281,479.00	$ **********0.00	$ *****243,481.00	$ *********1,524,960.00	$ ****3,181,796,013.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PARMENIDES MANUEL PACHECO PADRON	983936	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-44-101169521

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	**BUCARAMANGA**	**96**	**96-44-101169521**	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	**09**	**2023**	**30**	**12**	**2021**	**00:00**	**31**	**07**	**2027**	**23:59**	**ANEXO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO VIAL RURAL	**NIT: 901.551.905-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CALLE 32 NRO. 26-63	FLORIDABLANCA, SANTANDER	6076782235

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**NIT: 800.215.807-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CARRERA 59 NO.26-60	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,281,479.00	$ **********0.00	$ *****243,481.00	$ *********1,524,960.00	$ ****3,181,796,013.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PARMENIDES MANUEL PACHECO PADRON	983936	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11014111546247(3900)000001524960(96)20240911

REFERENCIA PAGO:

1101411154624-7

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101169521	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	09	2023	30	12	2021	00:00	31	07	2027	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO VIAL RURAL		**NIT: 901.551.905-2**
DIRECCIÓN: CALLE 32 NRO. 26-63	**CIUDAD:** FLORIDABLANCA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	6076782235

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		**NIT: 800.215.807-2**
DIRECCIÓN: CARRERA 59 NO.26-60	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7056000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ESAO S.A.S	804005882-9	50.00
AMADO LIZARAZO JUAN	91206554-5	50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

96-44-101169521

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101169521	7

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	09	2023	30	12	2021	00:00	30	12	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO VIAL RURAL	NIT: 901.551.905-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 32 NRO. 26-63	FLORIDABLANCA, SANTANDER	6076782235

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	NIT: 800.215.807-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 59 NO.26-60	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NUMERO 2273 DE 2021 REFERENTE A: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA - GRUPO 2. PARA EL LOTE 1
EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIOS TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA.
LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/12/2021	30/06/2024	$330,699,938.70	$330,699,938.70
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	30/12/2021	30/06/2024	$1,197,596,381.00	$1,197,596,381.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	30/12/2021	30/12/2026	$661,399,877.40	$661,399,877.40
CALIDAD DEL SERVICIO	31/07/2022	31/07/2027	$992,099,816.10	$992,099,816.10

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SEGUN ADICION NUMERO DOS (02) Y PRORROGA NUMERO TRES(03) DE 2023 SE AJUSTA VIGENCIA Y VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA ARRIBA

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,100,220.00	$ *******8,000.00	$ *****210,561.00	$ *********1,318,782.00	$ ****3,181,796,013.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PARMENIDES MANUEL PACHECO PADRON	983936	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-44-101169521

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	**BUCARAMANGA**	**96**	**96-44-101169521**	**7**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	**09**	**2023**	**30**	**12**	**2021**	**00:00**	**30**	**12**	**2026**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO VIAL RURAL	**NIT: 901.551.905-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CALLE 32 NRO. 26-63	FLORIDABLANCA, SANTANDER	6076782235

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**NIT: 800.215.807-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CARRERA 59 NO.26-60	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard Diners Club International AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SURTIMAX Movil Red Bancolombia Corresponsal Bancario éxito copidrogas

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,100,220.00	$ *******8,000.00	$ *****210,561.00	$ *********1,318,782.00	$ ****3,181,796,013.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PARMENIDES MANUEL PACHECO PADRON	983936	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11014111546254(3900)000001318782(96)20221230

REFERENCIA PAGO:

1101411154625-4

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101169521	7

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	09	2023	30	12	2021	00:00	30	12	2026	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO VIAL RURAL		**NIT: 901.551.905-2**
DIRECCIÓN: CALLE 32 NRO. 26-63	**CIUDAD:** FLORIDABLANCA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	6076782235

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		**NIT: 800.215.807-2**
DIRECCIÓN: CARRERA 59 NO.26-60	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7056000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ESAO S.A.S	804005882-9	50.00
AMADO LIZARAZO JUAN	91206554-5	50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

96-44-101169521

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcrochaa	CARLOS ARTURO ROCHA ALFONSO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Fecha y Hora Sistema:	2023-03-17-12:00 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	66123	**Fecha Registro:**	2023-03-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	350.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	350.000.000,00	**Saldo x Comprometer:**	350.000.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	69923	**Fecha Registro:**	2023-03-17	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
25-21 GRUPO GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	Nación	11	CSF						
					Total:	336.000.000,00	0,00	336.000.000,00	336.000.000,00	0,00

25-21 GRUPO GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS	C-2402-0600-12-0-2402112-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL	Nación	11	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
					Total:	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00

Objeto:	SOL.GSCP.CE.OAP.170323.SVR - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 2.

Firma Responsable

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	**BUCARAMANGA**	**96**	**96-44-101169521**	8

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	**12**	**2023**	**30**	**12**	**2021**	**00:00**	**31**	**07**	**2027**	**23:59**	**ANEXO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CONSORCIO VIAL RURAL	**NIT: 901.551.905-2**	CALLE 32 NRO. 26-63	FLORIDABLANCA, SANTANDER	6076782235

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**NIT: 800.215.807-2**	CARRERA 59 NO.26-60	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NUMERO 2273 DE 2021 REFERENTE A: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA - GRUPO 2. PARA EL LOTE 1
EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIOS TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA.
LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/12/2021	30/06/2024	$350,699,938.70	$330,699,938.70
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	30/12/2021	30/06/2024	$1,753,499,693.50	$1,197,596,381.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	30/12/2021	30/12/2026	$701,399,877.40	$661,399,877.40
CALIDAD DEL SERVICIO	31/07/2022	31/07/2027	$1,052,099,816.10	$992,099,816.10

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AUMENTA EL VALOR DEL CONTRATO DE ACUERDO A ADICION NUMERO CUATRO (04 DE 2023) FECHADO EL 29 NOVIEMBRE 2023

AUMENTAR EL CONTRATO EN $200.000.000= PARA UN VALOR TOTAL DE CONTRATO $3.506.999.387=
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,344,349.00	$ *******8,000.00	$ *****256,946.00	$ *********1,609,295.00	$ ****3,857,699,325.70	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PARMENIDES MANUEL PACHECO PADRON	983936	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-44-101169521

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	**BUCARAMANGA**	**96**	**96-44-101169521**	8

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	**12**	**2023**	**30**	**12**	**2021**	**00:00**	**31**	**07**	**2027**	**23:59**	**ANEXO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO VIAL RURAL	**NIT: 901.551.905-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CALLE 32 NRO. 26-63	FLORIDABLANCA, SANTANDER	6076782235

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**NIT: 800.215.807-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CARRERA 59 NO.26-60	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla Super INTER SURTIMAX Movil Red Bancolombia Corresponsal Bancario éxito Gana Gana copidrogas

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,344,349.00	$ *******8,000.00	$ *****256,946.00	$ *********1,609,295.00	$ ****3,857,699,325.70	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
PARMENIDES MANUEL PACHECO PADRON	983936	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11014111678408(3900)000001609295(96)20241203

REFERENCIA PAGO:

1101411167840-8

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101169521	8

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	12	2023	30	12	2021	00:00	31	07	2027	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO VIAL RURAL		**NIT: 901.551.905-2**
DIRECCIÓN: CALLE 32 NRO. 26-63	**CIUDAD:** FLORIDABLANCA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	6076782235

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		**NIT: 800.215.807-2**
DIRECCIÓN: CARRERA 59 NO.26-60	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7056000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ESAO S.A.S	804005882-9	50.00
AMADO LIZARAZO JUAN	91206554-5	50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

96-44-101169521

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SILVIAOLARTE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	**BUCARAMANGA**	**96**	**96-44-101169521**	9

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	01	2024	30	12	2021	00:00	27	08	2027	23:59	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO VIAL RURAL	**NIT: 901.551.905-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CALLE 32 NRO. 26-63	FLORIDABLANCA, SANTANDER	6076782235

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**NIT: 800.215.807-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CARRERA 59 NO.26-60	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NUMERO 2273 DE 2021 REFERENTE A: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA - GRUPO 2. PARA EL LOTE 1
EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIOS TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA.
LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/12/2021	27/07/2024	$350,699,938.70	$350,699,938.70
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	30/12/2021	27/07/2024	$1,753,499,693.50	$1,753,499,693.50
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	30/12/2021	27/01/2027	$701,399,877.40	$701,399,877.40
CALIDAD DEL SERVICIO	31/07/2022	31/07/2027	$1,052,099,816.10	$1,052,099,816.10

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SEGUN PRORROGA NUMERO CUATRO (No 4) DE 2023 FECHADO 29 DICIEMBRE DE 2023, SE AMPLIA LAS VIGENCIAS DEL CONTRATO EL CUAL ESTABLECE AMPLIAR VIGENCIAS HASTA EL 27 DE FEBRERO DE 2024.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADAS CONTINUAN VIGENTES

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIOS TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****418,918.00	$ *******8,000.00	$ ******81,114.00	$ **********508,032.00	$ ****3,857,699,325.70	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PARMENIDES MANUEL PACHECO PADRON	983936	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-44-101169521

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	**BUCARAMANGA**	**96**	**96-44-101169521**	9

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	**01**	**2024**	**30**	**12**	**2021**	**00:00**	**27**	**08**	**2027**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CONSORCIO VIAL RURAL	**NIT: 901.551.905-2**	CALLE 32 NRO. 26-63	FLORIDABLANCA, SANTANDER	6076782235

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**NIT: 800.215.807-2**	CARRERA 59 NO.26-60	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****418,918.00	$ *******8,000.00	$ ******81,114.00	$ **********508,032.00	$ ****3,857,699,325.70	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PARMENIDES MANUEL PACHECO PADRON	983936	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11014111759771(3900)000000508032(96)20221230

REFERENCIA PAGO:

1101411175977-1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101169521	9

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
22	01	2024	30	12	2021	00:00	27	08	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO VIAL RURAL		**NIT: 901.551.905-2**
DIRECCIÓN: CALLE 32 NRO. 26-63	**CIUDAD:** FLORIDABLANCA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	6076782235

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		**NIT: 800.215.807-2**
DIRECCIÓN: CARRERA 59 NO.26-60	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7056000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ESAO S.A.S	804005882-9	50.00
AMADO LIZARAZO JUAN	91206554-5	50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-44-101169521

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	**BUCARAMANGA**	**96**	**96-44-101169521**	10

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	**04**	**2024**	**30**	**12**	**2021**	**00:00**	**31**	**07**	**2027**	**23:59**	**ANEXO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO VIAL RURAL	**NIT: 901.551.905-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CALLE 32 NRO. 26-63	FLORIDABLANCA, SANTANDER	6076782235

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**NIT: 800.215.807-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CARRERA 59 NO.26-60	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****764,997.00	$ **********0.00	$ *****145,349.00	$ **********910,346.00	$ ****4,099,699,325.70	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
PARMENIDES MANUEL PACHECO PADRON	983936	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11014111877627(3900)000000910346(96)20250407

REFERENCIA PAGO:

1101411187762-7

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101169521	10

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	04	2024	30	12	2021	00:00	31	07	2027	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO VIAL RURAL		**NIT: 901.551.905-2**
DIRECCIÓN: CALLE 32 NRO. 26-63	**CIUDAD:** FLORIDABLANCA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	6076782235

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		**NIT: 800.215.807-2**
DIRECCIÓN: CARRERA 59 NO.26-60	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7056000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ESAO S.A.S	804005882-9	50.00
AMADO LIZARAZO JUAN	91206554-5	50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-44-101169521

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	**BUCARAMANGA**	**96**	**96-44-101169521**	11

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	**04**	**2024**	**30**	**12**	**2021**	**00:00**	**10**	**06**	**2027**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO VIAL RURAL	**NIT: 901.551.905-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CALLE 32 NRO. 26-63	FLORIDABLANCA, SANTANDER	6076782235

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**NIT: 800.215.807-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CARRERA 59 NO.26-60	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NUMERO 2273 DE 2021 REFERENTE A: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA - GRUPO 2. PARA EL LOTE 1
EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIOS TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA.
LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/12/2021	10/12/2024	$372,699,938.70	$372,699,938.70
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	30/12/2021	10/12/2024	$1,863,499,693.50	$1,863,499,693.50
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	30/12/2021	10/06/2027	$745,399,877.40	$745,399,877.40
CALIDAD DEL SERVICIO	31/07/2022	31/07/2027	$1,118,099,816.10	$1,118,099,816.10

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN LAS SIGUIENTES ACTAS, SE PRORROGA LA VIGENCIA Y SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO DE LA GARANTIA:
-ACTA DE SUSPENSION N. 1 DEL 26/02/2024
-ADICION N. 4 Y PRORROGA N. 5 DEL 05/04/2024

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***2,213,731.00	$ *******8,000.00	$ *****422,129.00	$ *********2,643,860.00	$ ****4,099,699,325.70	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PARMENIDES MANUEL PACHECO PADRON	983936	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-44-101169521

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	**BUCARAMANGA**	**96**	**96-44-101169521**	11

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	**04**	**2024**	**30**	**12**	**2021**	**00:00**	**10**	**06**	**2027**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO VIAL RURAL	**NIT: 901.551.905-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CALLE 32 NRO. 26-63	FLORIDABLANCA, SANTANDER	6076782235

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**NIT: 800.215.807-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CARRERA 59 NO.26-60	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***2,213,731.00	$ *******8,000.00	$ *****422,129.00	$ *********2,643,860.00	$ ****4,099,699,325.70	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PARMENIDES MANUEL PACHECO PADRON	983936	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11014111877634(3900)000002643860(96)20221230

REFERENCIA PAGO:

1101411187763-4

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101169521	11

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	04	2024	30	12	2021	00:00	10	06	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO VIAL RURAL		**NIT: 901.551.905-2**
DIRECCIÓN: CALLE 32 NRO. 26-63	**CIUDAD:** FLORIDABLANCA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	6076782235

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		**NIT: 800.215.807-2**
DIRECCIÓN: CARRERA 59 NO.26-60	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7056000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ESAO S.A.S	804005882-9	50.00
AMADO LIZARAZO JUAN	91206554-5	50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-44-101169521

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-11-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2
(Indicar el número en forma consecutiva 1, 2,3,…, etc.)

AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. N.A
(Indicar el número de la ampliación de la correspondiente acta de suspensión en forma consecutiva 1, 2, 3,…, etc.)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción de la presente Acta de suspensión o ampliación de la suspensión, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:
- Condiciones que justifiquen plenamente la necesidad de suspender o ampliar la suspensión del plazo contractual.
- Periodo solicitado de la suspensión o ampliación de la suspensión.

2. El Interventor suspende las labores a partir de la fecha indicada en la plataforma del SECOP, comprometiéndose a reanudar la ejecución del contrato en la fecha acordada, bajo la responsabilidad exclusiva del mismo.

3. El Supervisor del contrato de interventoría debe hacer el análisis de las causas que conllevan a la suspensión del contrato de interventoría, lo cual refrenda con su firma.

4. Sin la suscripción en la plataforma del SECOP del Acta de Suspensión o Ampliación de la Suspensión por parte del funcionario competente según la resolución de delegación de funciones vigente, no se considera suspendido el plazo contractual.

5. En el evento de que el representante legal del Interventor otorgue poder para suscribir las Actas de Suspensión, este documento debe ser publicado igualmente en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II o la versión que se encuentre vigente.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2273-2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL
(Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA -GRUPO 2

CONTRATO DE OBRA No. LP-SPM-020-2021 - MONTERIA - CONVENIO 920-2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CÓRDOBA 020

CONDICIONES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 3/02/2022
Indicar (Día/Mes/Año)

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1	N.A	26/02/2024	26/02/2024	3/04/2024	4-abr-24

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 3.726.999.387,00

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL : 10/06/2024
(Teniendo en cuenta las suspensiones anteriores sin incluir la presente suspensión) Indicar Día/Mes/Año

CAUSAS QUE DAN ORÍGEN A LA SUSPENSIÓN:
(Describir de manera clara y completa las causales que dan origen a la suspensión justificadas por el Interventor y aprobadas por el Supervisor del contrato de Interventoría, teniendo en cuenta que las mismas no sean imputables a las partes contratantes).

Se solicita suspender el contrato de Interventoría 2273 de 2021 teniendo en cuenta que, el Municipio y el Contratista suscribieron acta de suspensión No. 2 del contrato de obra teniendo en cuenta que, mediante oficio No. OFIC-CC020-340 de fecha 5 de junio de 2024, el contratista de obra, esto es, CONSORCIO CORDOBA 020 por medio de su representante CÉSAR HERNANDEZ LÓPEZ, solicitó la suspensión temporal del contrato de obra No. LP-SPM-020-2021, en razón a las circunstancias expuestas en el oficio en mención, especialmente, dificultades en las vías de acceso hacia la obra: "...inconvenientes e incluso accidentes que se nos están presentando por el mal estado de la vía de acceso, agravado por las fuertes lluvias que han ocurrido" ; dificultades en suministro de material: " ...Hemos visto afectada la actividad de relleno de terraplén a causa de falta de disponibilidad de material por parte de la cantera LA LOMA CENTRACOR, debido a que a causa de las lluvias restringen el acceso de volquetas a la zona de cargue" y, necesidad de aprobación del plan de compensación por parte de la autoridad ambiental: "...a la fecha no hemos recibido la aprobación de PLAN DE COMPESANCION AMBIENTAL por parte de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS, por lo cual no se ha podido realizar la respectiva actividad y cumplir con lo convenido contractualmente. El trámite está a la espera del concepto jurídico interno de la CVS". Aunado a lo anterior, mediante oficio OFIC-CC020-341 adiado 6 de junio de 2024, el contratista de obra solicitó prórroga por el término de UN (1) MES, al contrato de obra en cita; por todo lo anterior y Teniendo en cuenta que el contrato de obra derivado del convenio 920 de 2024 se encuentra suspendido, se solicita suspender el contrato de interventoría por dieciocho (18) dias, periodo en el cual, se espera que el Municipio de Montería, realice las actuaciones administrativas necesarias ante el INVÍAS, para proceder a la reactivación del mismo, de acuerdo a lo expuesto en el acta de suspensión del Contrato derivado.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-11-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Teniendo en cuenta que el Municipio de Montería y el Consorcio Cordoba 020 suspendieron el contrato de obra No. LP-SPM-020-2021 basados en las causales descritas por el Municipio de Montería en el Documento Acta de Suspensión 2 de fecha 6 de junio de 2024 a la fecha la Interventoría no tiene ningún contrato en ejecución la supervisión ve viable la suspensión del contrato de interventoría por dieciocho (días), periodo en el cual se espera que el Municipio de Montería realice las actuaciones administrativas necesarias ante el INVÍAS para proceder a la reactivación del contrato mencionado.

NOTAS:

1. Los motivos que dan origen a la presente suspensión y que imposibilitan de manera temporal, el normal desarrollo del contrato, no son imputables a las partes contratantes.
2. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el INTERVENTOR se obliga a presentar al Instituto para su aprobación el certificado de modificación de la garantía única constituída, en la cual se tenga en cuenta la presente suspensión y/o ampliación de la suspensión. El incumplimiento de esta obligación acarrea el inicio de las acciones administrativas y judiciales a que haya lugar.
3. El contrato debe reanudarse en la fecha indicada en la presente acta sin que sea necesaria la elaboración y suscripción de un acta de reanudación.
4. En el evento en que las causales de suspensión cesen con anterioridad a la fecha de reanudación indicada en la presente Acta, se debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-11-FR-4 Acta de Reanudación del Contrato de Interventoría.
5. No se entiende suspendido y reanudado el contrato sin la firma en la plataforma del SECOP del funcionario del INVIAS facultado para suscribir el acta de acuerdo con la delegación de funciones vigente.

6. Dado que, el Consorcio Córdoba 020, entregó al Municipio de Montería y a la Interventoría , solicitud de suspensión 02 y de prorroga 07 para el contrato LP SPM 020 2021, respectivamente mediante comunicados OFIC-CC020 -340 y OFIC-CC020-341; la Interventoría deja constancia, que al respecto, díó respuesta al Municipio de Montería, el 06 de junio de 2024, mediante comunicados CVR-1284-2024 (concepto solicitud de suspensión) y CVR-1288-2024 (concepto solicitud de prórroga).

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSIÓN INICIAL: 7 (Dia) de 6 (Mes) de 2024 (Año)

La fecha de suspensión debe corresponder con la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

FECHA DE REANUDACIÓN 25 (Dia) de 6 (Mes) de 2024 (Año)

La fecha de reanudación debe corresponder con la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el presente formato.

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO: 28 (Dia) de 6 (Mes) de 2024 (Año)

(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta la presente suspensión, según indicación dada en el instructivo correspondiente IV-8.)

CON LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA EL INTERVENTOR DE MANERA LIBRE Y ESPONTÁNEA RENUNCIA EXPRESAMENTE A RECLAMAR JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE MAYORES COSTOS GENERADOS POR LUCRO CESANTE Y/O DAÑO EMERGENTE; DESEQUILIBRIO ECONÓMICO POR: STAND BY DE EQUIPOS, POR DISPONIBILIDAD DE PERSONAL, POR MAYOR CANTIDAD DE DESPLAZAMIENTOS Y/O TRANSPORTE DE EQUIPOS O PERSONAL Y POR MAYOR PERMANENCIA Y DISPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PROPIA DE LA EMPRESA, TODA VEZ QUE EL INTERVENTOR ES ENTERAMENTE LIBRE PARA DISPONER DE LOS RECURSOS MENCIONADOS.

Para constancia de lo anterior, firman los que en ella intervinieron:

Nombre: JUAN AMADO LIZARAZO
Representante legal o su Apoderado
Interventor: CONSORCIO VIAL RURAL
Matrícula Profesional No.: 68202-25792 STD

Nombre: MARY LORENA SAYAGO BOTELLO
Subdirectora de Vías Regionales

Firma
Firmado digitalmente por AICARDY GALEANO ELLEN OBEIMAR

Nombre: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Supervisor del contrato de interventoría
Matrícula Profesional No.: 1320247439 BLV

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Interventor y Dirección Territorial.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	**BUCARAMANGA**	**96**	**96-44-101169521**	12

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	**06**	**2024**	**30**	**12**	**2021**	**00:00**	**31**	**07**	**2027**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO VIAL RURAL	**NIT: 901.551.905-2**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CALLE 32 NRO. 26-63	FLORIDABLANCA, SANTANDER	6076782235

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**NIT: 800.215.807-2**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 25 G NRO. 73 B - 90	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NUMERO 2273 DE 2021 REFERENTE A: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA - GRUPO 2. PARA EL LOTE 1
EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIOS TIENE UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA.
LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/12/2021	28/12/2024	$372,699,938.70	$372,699,938.70
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	30/12/2021	28/12/2024	$1,863,499,693.50	$1,863,499,693.50
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	30/12/2021	28/06/2027	$745,399,877.40	$745,399,877.40
CALIDAD DEL SERVICIO	31/07/2022	31/07/2027	$1,118,099,816.10	$1,118,099,816.10

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AMPLIA LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS DE ACUERDO A LAS ACTAS PRESENTADAS ASI:

ACTA DE SUSPENSION N2 07/06/2024
ACTA DE REINICIO N 2 28/06/2024

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****294,075.00	$ *******8,000.00	$ ******57,394.00	$ **********359,469.00	$ ****4,099,699,325.70	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PARMENIDES MANUEL PACHECO PADRON	983936	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

96-44-101169521

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	**BUCARAMANGA**	**96**	**96-44-101169521**	12

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	**06**	**2024**	**30**	**12**	**2021**	**00:00**	**31**	**07**	**2027**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO VIAL RURAL	**NIT: 901.551.905-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CALLE 32 NRO. 26-63	FLORIDABLANCA, SANTANDER	6076782235

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**NIT: 800.215.807-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CR 25 G NRO. 73 B - 90	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****294,075.00	$ *******8,000.00	$ ******57,394.00	$ **********359,469.00	$ ****4,099,699,325.70	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PARMENIDES MANUEL PACHECO PADRON	983936	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11014111992287(3900)000000359469(96)20221230

REFERENCIA PAGO:

1101411199228-7

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101169521	12

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	06	2024	30	12	2021	00:00	31	07	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO VIAL RURAL		NIT: 901.551.905-2
DIRECCIÓN: CALLE 32 NRO. 26-63	**CIUDAD:** FLORIDABLANCA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	6076782235

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		NIT: 800.215.807-2
DIRECCIÓN: CR 25 G NRO. 73 B - 90	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7056000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ESAO S.A.S	804005882-9	50.00
AMADO LIZARAZO JUAN	91206554-5	50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-44-101169521

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

e i ie to de C id d Co tr to de l ter e tor M l M
l R

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN1-IN-15-FR-15
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2273 DE 2021 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 2.

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL RURAL

FECHA DE INICIO: 3-feb-22 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 6 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 28-jun-24 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No: 015-2021 (Indicar número y año)
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIA LAS DELICIAS

CONTRATO DE OBRA No: 020-2021 (Indicar número y año)
CONTRATISTA: CONSORCIO CORDOBA 020

CONTRATO DE OBRA No: 112-2021 (Indicar número y año)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL

CONTRATO DE OBRA No: 129-2021 (Indicar número y año)
CONTRATISTA: MARIO POMPILIO SINISTERRA JALLER

CONTRATO DE OBRA No: 129-2021 (Indicar número y año)
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL H&P 2021

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI X NO ____ VERSIÓN No. 1 FECHA DE VERSIÓN: **17 de marzo de 2022**

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ____ NO ____ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ____ NO ____ APROBADO: SI ____ NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ____ NO ____

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autrocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: ____ **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** ____

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: ____ **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** ____

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: ____

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: ____ **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** ____

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: ____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** ____

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: ____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** ____

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG □□r□□c□d□o□eti□o□de□c□id□d□de□□□□de□C□id□d□e□de□e□t□□ecer□□□□e□o□□□□□dice□de□□e□ti□□□□e□er□it□e□□□□r□□□e□t□do□de□c□□ □i□ ie□to□

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
I□ □□□□dice□de□□e□ti□□□□□		
I□ □□□□dice□de□□e□ti□□□□□		
I□ □□□□dice□de□□e□ti□□□□□		
I□ □□□□dice□de□□e□ti□□□□□		
I□ □□□□dice□de□□e□ti□□□□□		
I□ □□□□dice□de□□e□ti□□□□□		

□□r□c□d□□dic□dor□de□□e□ti□□□□e□de□e□de□i□ir□□□tit□□o□re□□re□e□t□ti□o□de□□□i□□o□

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO □□e□de□e□re□□cio□□r□todo□e□□e□□o□□□e□re□□ier□□de□c□i□r□ci□□□□

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTA:
□ie□ □re□□e□□□□□□de□□□□re□□□e□t□□□de□e□te□□or□ □to□□e□"□O"□e□I□ter□e□tor□de□e□i□dic□r□e□e□e□□□cio□de□o□□er□□cio□e□□□□ccio□e□□to□ □d□□□□□r□□d□r□c□□ □i□ ie□to□□□□o□i□□ci□□□

□ir□ □ _____
□o□□re□RIC□RDO□R□□ □□□□DI□□□
Director□de□□□I□ter□e□tor□□
M□tri□□□□□ro□e□lo□□□□o□□□□□□□□□□□□□□TD

□ir□ □ _____
□o□□re□RIC□RDO□R□□ □□□□DI□□□
Director□de□□□I□ter□e□tor□□
M□tri□□□□□ro□e□lo□□□□o□□□□□□□□□□□□□□TD

□ir□ □ _____
□o□ □re□□□□□□O□□IM□R□IC□RD□□□ □□□□□O
□□□er□□or□de□Co□tr□to□de□I□ter□e□tor□□
M□tri□□□□□ro□e□lo□□□□o□□□□□□□□□□□□□□O□

Ori□□□□□□or□ e□□ e□□□□de□I□ter□e□tor□□□rc□□o□de□□e□ti□□de□I□□□I□□□
Co□i□□□□□□id□□ec□tor□□I□ter□e□tor□□Direcci□□Territori□□

Otro doc e to e i ie to e

• e i ie to i er i de tici o M l M l R M l M l R

		C□DI□O	M□□I□M□□I□ □□□□R□□		
		□□R□I□□	□		
		□□□I□□	□	D□□	□

□□C□□	1□□□□□□□□□□
	□D□□□□Me□□□□□□o□

□□□D□D□□□□□□□OR□□□ □□□DIR□CCI□□□D□□□□□□□R□□IO□□□□□ D□R□□□□□□□□□RR□□OR□□□□ C□RDO□□ □□□□de□□□□□□□ □□□□

D□□O□□□□□□R□□□□

□□□□D□□□□□R□□□□D□□□□□□□□□□O□o□ □
I□dic□r□e□□□or□ □□co□□ec□ti□□□e□□□□ ero□de□□□□er□□□□ie□do□e□□□□□□I□□ici□□e□□□□ ero□□□

□O□□R□□O□D□□□□□R□□□□OR□□□□o□ □□□□□de□□□□□
□dic□r□□□□ ero□□□□□ □□□□R□□□□OR□ CO□□ORCIO□□I□□R□R□□

O□□□□O□D□□□□O□□R□□O□□

I□T□R□□□TOR□□T□C□IC□□□DMI□I□TR□TI□□□□I□□□CI□R□□□□M□I□□T□□□□R□□□□M□□T□□IMI□□TO□□M□□OR□MI□□TO□D□□□□□□T□RCI□RI□□D□□□RO□R□M□"CO□OM□I□R□R□□"□□□□O□M□□ICI□IO□D□□D□□□RT□M□□TO□D□□C□RDO□□□□□R□□O□□□

□□□□R□□□OR□D□□□□O□□R□□O□D□□□□□R□□□□OR□□□ I□□□□□□□□□O□□IM□R□IC□RD□□□□□□□O

□□□□□□□□□□□□□□

□□dic□r□□□□□□□tific□ci□□□c□□□do□□e□tr□te□de□□odific□ci□□□de□□□□□□de□□er□□□□de□□□□tici□o□

D□□□□□□□D□□□□□□□D□□□□□R□□□□D□□□□□□□□O

□□□M□□o□	D□□□R□□□□□□D□□□□□M	□R□M□□□1	□R□M□□□□	□R□M□□□□	□R□M□□□□	□R□M□□□□	□R□M□□□□	□R□M□□□7	□R□M□□□□	□R□M□□□□	□R□M□□□1□	□R□M□□□11	□□□OR□ □RO□R□M□□ □□RO□□□DO□□□	□
□	□□MI□□□□□□O□OR□RIO□	□□□ □□□	□□□ □□□	□□□ □□□	□□□ □□□	□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□	□□□□
□	□RR□□D□MI□□TO□□□□O□□□□ □I□□R□□	□□□ □□□	□□□ □□□	□□□ □□□	□□□ □□□	□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□	□□□□
□	□□□□□O□□D□□□□□OR□TORIO		□□□ □□□	□□□ □□□	□□□ □□□	□□□ □□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□	□□□ □□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□	□□□□
□O□□□		□□□ □□□	□□□ □□□	□□□ □□□	□□□ □□□	□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□	□□□□7□□□□□□□□	1□□□

□O□□□□

□□□□□□□□□de□□□er□□□□□ici□□□de□□□□□tici□o□□e□□□or□□te□□e□do□e□c□e□t□□e□□□□□or□tot□□□otor□□do□□or□□te□co□□e□to□□o□□□orce□t□□e□□□e□to□ □□□□o□re□e□□□□□□ de□□□□□or□otor□□do□co□ o□□□tici□o□□□□□□□□de□□□er□□□□de□□e□□er□ct□□□□□do□de□c□erdo□co□e□□□□□or□ir□do□□□□□ter□e□tor□

□□□□□□□□tici□o□□e□de□e□□ti□□□r□c□□□□□□□ e□te□□□r□e□□ro□ecto□e□e□□□o□de□□ edici□□□e□□□□o□de□□□□or□torio□□□de□to□o□r□□□□□re□□e□to□□□□r□e□to□□dot□ci□□de□o□ici□□□□□rre□d□□ ie□to□□□□□□□ o□□□□□□□ i□i□tro□□e□□□□o□de□□□□or□torio□□□o□or□rio□□□□□□□ i□□□□□o a□□□a□□ara□om□ra□□□a□□□□□r d□□□□□□□□□o□□

□□□□o □e □er□ite □□□t□ e□□□i□ce □or cie□to □□□□ □de□□□□or de□□□tici□o □□r□ co□ □r□ de e□□i□o□□□ e□e□e□to e□ □□e e□i□ter□e□tor □oicite □ □□□ti□□□e □□ □ □□or □orce□t□□e□e□□□□er□i□or de□co□tr□to de i□ter□e□tor□□ de□e □□□□i□r □□ □oicit□d □ □re□e□t□r □□ co□ce□to□□□ □□ro□□ci□□ de□i□iti□□ de□□o□i□□e □ □□or□orce□t□□e□de□□tici□o□□e□re□i□□□□or□□edio□de□re□o□ci□□□□oti□d□□□□□□crit□□□or□e□Director□□e□er□□□□r□e□co□tr□to□de□i□ter□e□tor□□□e□□ec□ico□

□□□□□i□ter□e□tor□de□e□□ro□r□□ □r□□e□□□□□ e□□□□i□□er□i□□□de□□□□tici□o□te□ie□do□e□c□e□t□e□□□□□o□cord□do□co□□e□□□□er□i□or□de□Co□tr□to□de□i□ter□e□tor□□□□□r□□□□i□□er□i□□□

□ir□ □□
□o□ □re□□□□□□□□M□DO□□□□□R□□O
Re□re□e□t□□te□e□□□o□□□□□oder□do
I□ter□e□tor"CO□□ORCIO□□I□□R□R□□"
M□tr□c□□□□ro□e□io□□□□o□□□□□□□□□□□□□□□TD

Ori□i□□□□rc□i□o□de□□e□ti□□de□I□□□I□□□
Co□i□□□□□id□d□□ec□tor□□I□ter□e□tor□□Direcci□□Territori□□

□ir□ □□
□o□ □re□□□□□□□□O□□□M□R□□□□RDY□□□□□□□O
□□□er□i□or□de□co□tr□to□de□I□ter□e□tor□□
M□tr□c□□□□ro□e□io□□□□o□□□□□□□□□□□□□□□O□

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 30/06/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☑ (Indique si corresponde) **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐ (Indique si corresponde)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2273 DE 2021 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No.: 799-000020-55 **BANCO** BANCOLOMBIA SUCURSAL: FLORIDABLANCA

ANTICIPO OTORGADO: 28,20 **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$ 675.393.660,00 (M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 2.

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
	TRASLADO	15-jun-22	CONSORCIO VIAL RURAL	$ 114.985.200	1, 2 Y 3	NÓMINA Y HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS Y/O ALQUILERES, Y ENSAYOS DE LABORATORIO
	TRASLADO	22-jun-22	CONSORCIO VIAL RURAL	$ 50.281.000	1, 2 Y 3	NÓMINA Y HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS Y/O ALQUILERES, Y ENSAYOS DE LABORATORIO
	TRASLADO	22-jul-22	CONSORCIO VIAL RURAL	$ 54.543.600	1, 2 Y 3	NÓMINA Y HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS Y/O ALQUILERES, Y ENSAYOS DE LABORATORIO
	TRASLADO	30-ago-22	CONSORCIO VIAL RURAL	$ 60.859.900	1, 2 Y 3	NÓMINA Y HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS Y/O ALQUILERES, Y ENSAYOS DE LABORATORIO
	TRASLADO	26-sep-22	CONSORCIO VIAL RURAL	$ 74.210.700	1, 2 Y 3	NÓMINA Y HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS Y/O ALQUILERES, Y ENSAYOS DE LABORATORIO
	TRASLADO	25-oct-22	CONSORCIO VIAL RURAL	$ 78.156.500	1, 2 Y 3	NÓMINA Y HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS Y/O ALQUILERES, Y ENSAYOS DE LABORATORIO
	TRASLADO	28-nov-22	CONSORCIO VIAL RURAL	$ 80.041.600	1, 2 Y 3	NÓMINA Y HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS Y/O ALQUILERES, Y ENSAYOS DE LABORATORIO
	TRASLADO	15-dic-22	CONSORCIO VIAL RURAL	$ 77.218.600	1, 2 Y 3	NÓMINA Y HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS Y/O ALQUILERES, Y ENSAYOS DE LABORATORIO
	TRASLADO	29-ene-23	CONSORCIO VIAL RURAL	$ 73.595.300	1, 2 Y 3	NÓMINA Y HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS Y/O ALQUILERES, Y ENSAYOS DE LABORATORIO
	TRASLADO	18-abr-23	CONSORCIO VIAL RURAL		1, 2 Y 3	NÓMINA Y HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS Y/O ALQUILERES, Y ENSAYOS DE LABORATORIO

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de interventoría Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	NÓMINA Y HONORARIOS	$ 491.608.600,00	$ 491.608.600,00		$ 491.608.600,00	$ -
2	ARRENDAMIENTOS Y/O ALQUILERES	$ 169.405.000,00	$ 169.405.000,00		$ 169.405.000,00	$ -
3	ENSAYOS DE LABORATORIO	$ 14.380.000,00	$ 14.380.000,00		$ 14.380.000,00	$ -
	TOTALES	$ 675.393.600,00	$ 675.393.600,00		$ 675.393.600,00	$ -

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (ABRIL): $ _____
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ _____
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-2 .
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 31/05/2023
(Día / Mes / Año)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
SBR-29092022-901551905	$ 604.541,12		JUNIO-AGOSTO	29/09/2022	$ 604.541,12
SBR-10052023-901551905	$ 320.568,12		SEPTIEMBRE-MARZO		$ 925.109,24

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-3)

NOTA:

Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Interventor de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor.**

Firma:
Nombre: **JUAN AMADO LIZARAZO**
Representante Legal o Delegado
Interventor (CONSORCIO VIAL RURAL)
Matrícula Profesional No.: 68202-25792 STD

Firma:
Nombre: **ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO**
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202-47439 BOL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO
VIAL RURAL

Floridablanca, abril 17 de 2023 CVR-ANT-010-2023

Señores
BANCOLOMBIA
Floridablanca

Cordial Saludo,

Solicitamos realizar traslado de la cuenta de ahorros No. 79900002055 que figura a nombre del CONSORCIO VIAL RURAL con Nit. No. 901.551.905-2. El valor de ONCE MILLONES QUINIENTOS UN MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE ($11.501.200) para la cuenta corriente No. 79900001937 a nombre del CONSORCIO VIAL RURAL con Nit. No. 901.551.905-2. Así mismo, autorizamos al señor SERGIO PUENTES, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.244.279 de Bucaramanga, para realizar dicho traslado en su oficina.

Atentamente,

JUAN AMADO LIZARAZO
C.C. 91.206.554 de Bucaramanga
Representante Legal
CONSORCIO VIAL RURAL

ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
C.C. 78.699.484 de Montería
Supervisor
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

c.c. Archivo

Bancolombia
NIT: 890.903.938-8

Registro de Operación: 051971807
Transferencia de fondos Cuenta Ahorros/Corriente
Sucursal: 726 - PARQUE CARACOLÍ
Ciudad: FLORIDABLANCA
Fecha: 18/04/2023 Hora: 9:46:26
Secuencia : 101 Código usuario: 004
Tipo Cuenta a Debitar: CUENTA DE AHORROS
Cuenta a Debitar: 79900002055
Tipo Cuenta a Acreditar: CUENTA CORRIENTE
Cuenta a Acreditar: 79900001937
Valor a Transferir: $ 11.501,200.00 ***
Costo Transacción: $ 10,877.81 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACIÓN ORDENADA AL BANCO

- de C r o re ro r ci de C r ro do
  M I M l R

• e i ie to de C r M l M l R

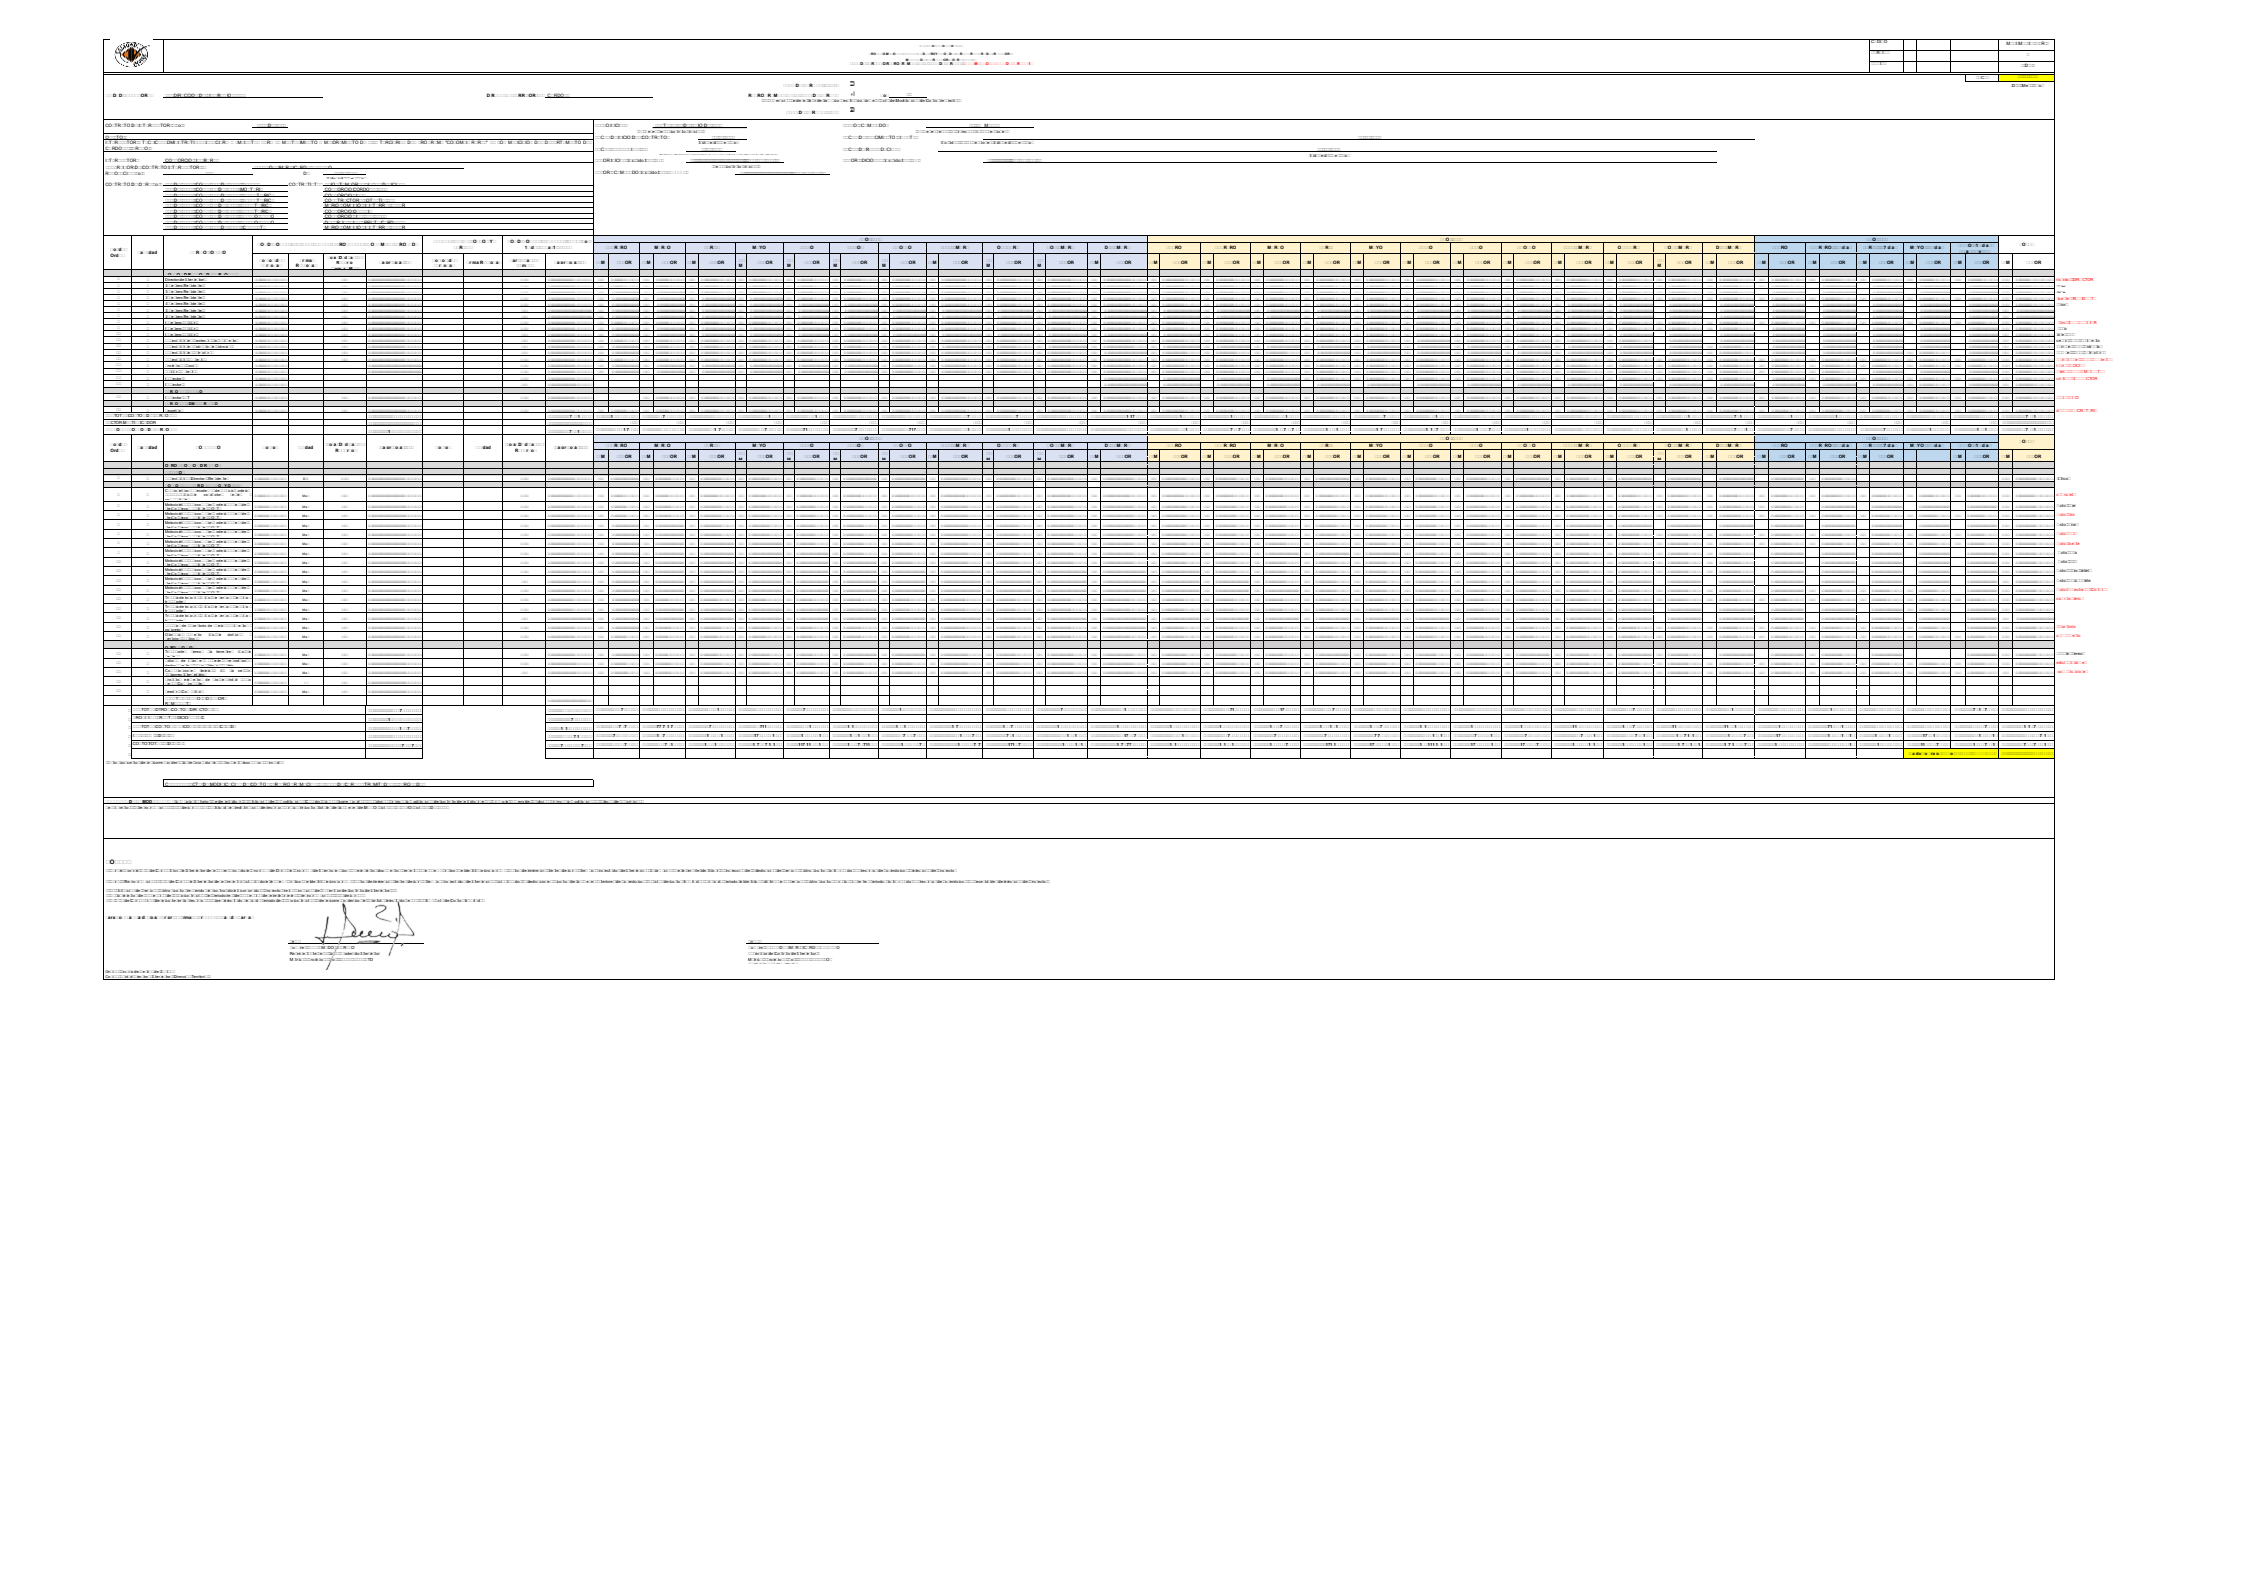

7 O O Y R OM D O

ec de i icio r e co tr to de i ter e tor e dio rtir de de e rero de ie tr e r o co tr to de o r e ir ro ct de i icio e i ie te ec e de e rero de i icio de co tr to de ici io de e o e o de e rero de i icio de co tr to de ici io de e et Ric de r o de i icio de co tr to de ici io de Mo ter de oct re de i icio e co tr to de ici io de C ete

o ra o 1 d 1 d m o d ya e e c e tr e ec t do e o co tr ct e ci e de dicie re de et ic e ec t d e de etro de c e er do e et ic i ici de co tr to c er de etro e re e t ro ore c tid de e e te de ir do e e co te re e o co te ri de ir do de e d r de ordi o de c et o r o de c e re e o ter e

co tr ti t re i e tre de o r e co to co i ter e tor d i i tr ci ici co id de corre i ie to de De ici e d de dicie re de o r e reci i ti cci c ie do co o di e o e eci ic cio e t c ic de ro ecto e re i ct de reci o i de o r co c e co tr ti t de e ct i r i de co tr to

ce de o ra o d 1 d m o d Mo r a e ec ci de o r ic de er odo re re e t ce e ec t do c do de ce ro r do de de c erdo re ro r ci de i er io e ro do

co tr ti t re i e tre de o r e co to co i ter e tor d i i tr ci ici co id de de o di ti to corre i ie to e d de io de o r e reci i ti cci c ie do co o di e o e eci ic cio e t c ic de ro ecto

e re i ct de reci o i de o r co c e co tr ti t de e ct i r i de co tr to

orce t e de ce de e ec ci r e te eriodo e e o ra o 11 d 1 d m o d a a R a e e c e tr e ec t do e co tr ct e ci e de ri de D r te et de e ec ci de co tr to e re i dici e te er itie do e c ce de et ic co tr ct

e re i o i it re i reci i ie to de tr o e i ter e ci or rte de l ter e tor d i i tr ci ici De o terior ri ero o er cio e rre o o c e e co tr ti t e co ro eti re i r e re ed d de o o i e r e c o e corre o die te reci o ti cci de o r

orce t e de ce de e ec ci r e te eriodo e e o ra o 11 d d m o d a a R a e e c e tr e ec t do e tot id d co orce t e de e ec ci de cie or cie to de or de co tr to reci id ti cci or i ter e tor e ici io de et Ric c ie do co e eci ic cio e t c ic de ro ecto

ce de o ra o 7 d d m o d a a R a co r do co e ro r de i er io e i e te e e c e tr e e i ie te e t do

Valor Total ejecutado acumulado al mes 8	**$ 2.172.552.096,00**
Valor Obra Básica en el mes 8	**$ 362.432.949,00**
Valor Básico Estudios y Diseños	**$7.000.000,00**
Valor total Iva	**$ 1.330.000,00**
Porcentaje ejecutado acumulado obra básico	100%
Porcentaje programado obra básico	100%

e ec ci de o r ic de er odo re re e t ce e ec t do c do de ce ro r do de re e t do tr o de de c erdo re ro r ci de i er io e ro do

e re i o i it re i reci i ie to de tr o e i ter e ci or rte de l ter e tor
d i i tr ci ici De o terior r iero o er cio e rre o o c e e
co tr ti t e co ro eti re i r e re ed d de o o i e r e c o e
corre o die te reci o ti cci de o r

orce t e de ce de e ec ci r e te eriodo e e **o ra o 1 d 1 d**
m o d a a R a e e c e tr e ec t do e o co tr ct e ci e
de e tie re de D r te et de e ec ci de co tr to e re i dici e te
er itie do e c ce de et ic co tr ct

e re i o i it re i reci i ie to de tr o e i ter e ci or rte de l ter e tor
d i i tr ci ici De o terior r iero o er cio e rre o o c e e
co tr ti t e co ro eti re i r e re ed d de o o i e r e c o e
corre o die te reci o ti cci de o r

o ra o 1 d 1 d m o d o o tie e ce e ec t do de cie
or cie to ec de ter i ci e e de oct re de de c erdo co r rro o
d d or e ici io de e o e o or e

ro ecto e e ec t e tot id d te ie do recorte e et ic i ici e e tr o de
ci t r de etro o c e de i i c i de re o ici de t er de c ed cto
e e e co tr de o de i e to e c ido id ti de
i c ero cti id de dicio e co o co tr cci de rete de etro de to r
rotecci de t d e e e i t ci de red ctore de e ocid d o c e o e t
co te do e e re e to

c id d de o teri e ti i do e o r ido corro or d co ti e te de c erdo
co or e o ic e c d de cti id de de ro ecto re i do e
o re ecti o e o de or torio o c e c e co re eridoe e ecific cio e

o ra o 1 – o o e e c e tr e ec t do e e ci e de io de D r te et de e ec ci de co tr to e re i dici e te er itie do e c ce de et ic co tr ct

e re i o i it re i reci i ie to de tr o e i ter e ci or rte de l ter e tor d i i tr ci ici De o terior r iero o er cio e rre o o c e e co tr ti t e co ro eti re i r e re ed d de o o i e r e c o e corre o die te reci o ti cci de o r

o ra o 1 d d M o d a e e c e tr ter i do e ec t do e ec de i i ci e e de io de et ic e ec t d e e etro de i e tor ido MR er do et ic i ici c er de etro de e ec t ro o r de co tr cci de oc c e ordi o de e e i t ci de e i ci ertic de rc ci ori o t o r o de tr o i ter e ido e tre ci ie do co o di e o e ecific cio e t c ic de ro ecto

i ter e tor reco ie d e ec t r ro o er e e o de reco e d cio e e rece e e de te i ie to de r r ti r e t id d de o tr o

R ardo R ad a
Director l ter e tor

O

1 Re ci de corre o de ci e er d e tre co tr ti t e i ter e tor i c e do to re ere ci ec de reci o

Re i tro oto r ico ideo de ce de o r

Re i tro oto r ico ideo de cti id de ie t e oci e redi e de o te i i id d de t d

Co i de it cor de e corre o die te

CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
CVR 1281 2024	31/05/2024	CONSORCIO CORDOBA 020	Solicitud de pendientes de gestión social contrato LP SPM 020 2021
CVR 1282 2024	1/06/2024	DABERLIS E. ARRIETA CARDENAS	Solicitud de Informes Ambientales y documentos para el cierre ambiental del contrato 105-2023
CVR 1283 2024	1/06/2024	CONSORCIO ONASSIS	Requerimiento de la Comunidad del Corregimiento de Carolina - contrato de Obra No.097 de 2023
CVR 1284 2024	6/06/2024	MUNICIPIO DE MONTERIA	Concepto sobre solicitud de suspensión 02 para el contrato de obra No. LP-SPM-020-2021
CVR 1285 2024	6/06/2024	CONSORCIO CORDOBA 020	Respuesta a comunicado del Contratista No. OFIC-CC020-338
CVR 1286 2024	6/06/2024	SUBSIRECCIÓN SOSTENIBILIDAD INVIAS	Entrega de Informe Trimestral Ambiental No. 2 – Cto. No. 097-2023 – Carolina Etapa 2.
CVR 1287 2024	6/06/2024	SUBSIRECCIÓN SOSTENIBILIDAD INVIAS	Respuesta Oficio Invias 2024S-VBOG-033200 – CTO. No. 105-2023 – Pueblo Nuevo Etapa II.
CVR 1288 2024	6/06/2024	MUNICIPIO DE MONTERIA	Concepto sobre solicitud de Prorroga 07 para el contrato de obra No. LP-SPM-020-2021 –
CVR 1289 2024	6/06/2024	CONSORCIO CORDOBA 020	Respuesta Oficio OFIC-CC020-327 – Contrato LP-SPM-020-2021
CVR 1290 2024	6/06/2024	DABERLIS E. ARRIETA CARDENAS	Revisión informes ambientales diciembre 2023, enero y febrero 2024 – CTO. No. 105-2023
CVR 1291 2024	6/06/2024	CONSORCIO CORDOBA 020	Respuesta Oficio OFIC-CC020-337 – Contrato LP-SPM-020-2021
CVR 1292 2024	6/06/2024	SUBSIRECCIÓN SOSTENIBILIDAD INVIAS	Respuesta Oficio 2024S-VBOG-035489 – CTO. No. 105-2023 – Pueblo Nuevo Etapa II.
CVR 1293 2024	6/06/2024	CONSORCIO CORDOBA 020	Recibo de reparaciones para proyectos viales del Kilómetro 12 y Las Cruces San Felipe–
CVR 1294 2024	6/06/2024	CONSORCIO CORDOBA 020	Requerimiento de informes de cumplimiento de resoluciones de permisos ambientales –
CVR 1295 2024	6/06/2024	SUBSIRECCIÓN SOSTENIBILIDAD INVIAS	Entrega de Informe Trimestral Social No.02 del contrato de Obra No. - 097-2023.
CVR 1296 2024	7/06/2024	SUBSIRECCIÓN VIAS REGIONALES INVIAS	Suspensión No.02 para el contrato de Interventoría No. 2273 de 2021
CVR 1297 2024	11/06/2024	CONSORCIO CORDOBA 020	Informe de revisión #02 Prueba de Carga Puente Balsal -comunicado OFIC-CC020-343.
CVR 1298 2024	19/06/2024	SUBSIRECCIÓN SOSTENIBILIDAD INVIAS	Respuesta Oficio 2024S-VBOG-037077 – Cto. No. 097-2023 – Carolina Etapa 2
CVR 1299 2024	19/06/2024	MUNICIPIO DE PLANETA RICA	Publicación de documentos en plataforma SECOP - carolina
CVR 1300 2024	19/06/2024	MUNICIPIO DE PLANETA RICA	Publicación de documentos en plataforma SECOP - almendro
CVR 1301 2024	19/06/2024	MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO	Publicación de documentos en plataforma SECOP
CVR 1302 2024	19/06/2024	MUNICIPIO DE MONTERIA	Publicación de documentos en plataforma SECOP
CVR 1303 2024	19/06/2024	MUNICIPIO DE CANALETE	Publicación de documentos en plataforma SECOP
CVR 1304 2024	25/06/2024	MUNICIPIO DE MONTERIA	Reinicio de actividades del contrato de Interventoría No. 2273-2021 y Terminación del contrato de obra.
CVR 1305 2024	28/06/2024	SUBSIRECCIÓN VIAS REGIONALES INVIAS	Derecho de Petición - pago acta de costos 20
CVR 1306 2024	29/06/2024	MUNICIPIO DE PLANETA RICA	Transferencia de Rendimientos cuenta del convenio - carolina
CVR 1307 2024	29/06/2024	MUNICIPIO DE PLANETA RICA	Transferencia de Rendimientos cuenta del convenio - almendro
CVR 1308 2024	29/06/2024	MUNICIPIO DE CANALETE	Transferencia de Rendimientos cuenta del convenio
CVR 1309 2024	3/07/2024	CONSORCIO CORDOBA 020	Respuesta Oficios OFIC-CC020-345/346 - aval inf ambientales de abril y mayo 2024
CVR 1310 2024	19/07/2024	SUBSIRECCIÓN SOSTENIBILIDAD INVIAS	Respuesta Oficio Invias 2024S-VBOG-045936 – Cto. No. 105-2023 – Pueblo Nuevo
CVR 1311 2024	29/07/2024	SUBSIRECCIÓN SOSTENIBILIDAD INVIAS	Entrega de Informe Trimestral Ambiental No. 2 – Cto. No. 105-2023 – Pueblo Nuevo
CVR 1312 2024	31/07/2024	CONSORCIO CORDOBA 020	Solicitud de documentación para Balance de cierre de la Gestión Social del Contrato LP-SPM-020-2021.
CVR 1313 2024	31/07/2024	DABERLIS E. ARRIETA CARDENAS	Solicitud de documentación para Liquidación del Contrato No.105 de 2023.
CVR 1314 2024	31/07/2024	CONSORCIO ONASSIS	Solicitud de documentación para Liquidación del Contrato No.097 de 2023
CVR 1315 2024	31/07/2024	MUNICIPIO DE PLANETA RICA	Solicitud de documentación para Liquidación del Contrato No.097 de 2023
CVR 1316 2024	31/07/2024	MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO	Solicitud de documentación para Liquidación del Contrato No.105 de 2023.
CVR 1317 2024	2/08/2024	MUNICIPIO DE MONTERIA	Entrega de Caracterizaciones Viales del contrato No. LP-SPM-020-2021.
CVR 1319 2024	13/08/2024	INVIAS - ING. ELLEN AICARDY G.	Pendientes para Liquidación del Contrato No.097 de 2023 y para el Cierre del convenio 925-2021
CVR 1318 2024	14/08/2024	INVIAS - ING. ELLEN AICARDY G.	Pendientes para Liquidación del Contrato No.105 de 2023 y para el Cierre del convenio 992-2021.
CVR 1320 2024	14/08/2024	INVIAS - ING. ELLEN AICARDY G.	Pendientes para Liquidación del Contrato No. LP SPM 020 2021 y para el Cierre del convenio 920-2021

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

MEDIO DE ENVIO	FECHA	OFICIO	REMITENTE	ASUNTO
CORREO ELECTRONICO	29/05/2024	OFIC-CC020-336	CONSORCIO CORDOBA 020	ENTREGA DE CARACTERIZACION VIAL PROYECTO KM 12
CORREO ELECTRONICO	31/05/2024	OFIC-CC020-337	CONSORCIO CORDOBA 020	ENTREGA DE INFORMES AMBIENTALES DE MAYO 2024
CORREO ELECTRONICO	4/06/2024	OFIC-CC020-338	CONSORCIO CORDOBA 020	REPORTE DE DIFICULTAD DE TRANSPORTE DE MATERIALES Y CUANTIFICACION DE POSIBLES DESVIOS
CORREO ELECTRONICO	4/06/2024	OFIC-CC020-339	CONSORCIO CORDOBA 020	ENTREGA DE CARACTERIZACION VIAL PROYECTO LAS CRUCES - SAN FELIPE
CORREO ELECTRONICO	5/06/2024	OFIC-CC020-340	CONSORCIO CORDOBA 020	SOLICITUD DE SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA
CORREO ELECTRONICO	6/06/2024	OFIC-CC020-341	CONSORCIO CORDOBA 020	SOLICITUD PRORROGA 07
CORREO ELECTRONICO	6/06/2024	OFIC-CC020-342	CONSORCIO CORDOBA 020	REPARACIONES EN PROYECTO DEL KM 12...informe de reparaciones
CORREO ELECTRONICO	6/06/2024	OFIC-CC020-343	CONSORCIO CORDOBA 020	ENTREGA DE DISEÑO DE PRUEBA DE CARGA ESTATICA PUENTE EL BALSAL y anexos
CORREO ELECTRONICO	6/06/2024	OFIC-CC020-344	CONSORCIO CORDOBA 020	REPARACIONES EN PROYECTO DE LAS CRUCES - SAN FELIPE...informe de reparaciones
CORREO ELECTRONICO	6/06/2024	OFIC-CC020-345	CONSORCIO CORDOBA 020	ENTREGA DE SUBSANACION DE OBSERVACIONES INFORMES AMBIENTALES ABRIL 2024
CORREO ELECTRONICO	7/06/2024	OFIC-CC020-346	CONSORCIO CORDOBA 020	ENTREGA DE SUBSANACION DE OBSERVACIONES INFORMES AMBIENTALES MAYO 2025
CORREO ELECTRONICO	7/06/2024	OFIC-CC020-347	CONSORCIO CORDOBA 020	ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA CIERRE AMBIENTAL - RTA CVR-1269-2024
CORREO ELECTRONICO	18/06/2024	OFIC-CC020-348	CONSORCIO CORDOBA 020	ENTREGA DE DISEÑO DE PRUEBA DE CARGA ESTATICA PUENTE EL BALSAL y anexos - VERSION FINAL
CORREO ELECTRONICO	19/06/2024	OFIC-CC020-349	CONSORCIO CORDOBA 020	REQUERIMIENTOS PRUEBA DE CARGA - complemento ofic 348
CORREO ELECTRONICO	20/06/2024	OFIC-CC020-350	CONSORCIO CORDOBA 020	PRUEBA DE CARGA...citación a prueba de carga
CORREO ELECTRONICO	27/06/2024	OFIC-CC020-354	CONSORCIO CORDOBA 020	ENTREGA DE BALANCE FINAL (#6) Y APUS NO PREVISTOS
CORREO ELECTRONICO	28/06/2024	OFIC-CC020-355	CONSORCIO CORDOBA 020	APROBACION PLAN DE COMPENSACION POR PERMISOS AMBIENTALES
CORREO ELECTRONICO	3/07/2024	OFIC-CC020-356	CONSORCIO CORDOBA 020	ENTREGA DE DOC CANTERA CENTRACOR Y CERTIF. MATERIALES
CORREO ELECTRONICO	5/07/2024	OFIC-CC020-358	CONSORCIO CORDOBA 020	ENTREGA DE INFORMES AMBIENTALES JUNIO 2024
CORREO ELECTRONICO	5/07/2024	OFIC-CC020-359	CONSORCIO CORDOBA 020	ENTREGA DE INFORME DE COMPENSACION POR PERMISOS AMBIENTALES
CORREO ELECTRONICO	15/08/2024	OFIC-CC020-361	CONSORCIO CORDOBA 020	ENTREGA REQUERIMIENTOS PARA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO - RTA CVR-1320-2024
CORREO ELECTRONICO	31/05/2024	C.I SIM-484-2024	MUNICIPIO DE MONTERIA	Solicitud de inicio de proceso de incumplimiento mayo 2024
CORREO ELECTRONICO	6/06/2024	C.E SIM-1305-2024	MUNICIPIO DE MONTERIA	Requerimientos infos. seguimiento resoluciones CVS...Pendiente cc020
CORREO ELECTRONICO	6/06/2024	C.E SIM-1316-2024	MUNICIPIO DE MONTERIA	Remisión acta de suspensión contrato de obra
CORREO ELECTRONICO	5/07/2024	C.I SIM-591-2024	MUNICIPIO DE MONTERIA	Solicitud terminación proceso incumplimiento julio 2024
CORREO ELECTRONICO	5/07/2024	C.E SIM-1615-2024	MUNICIPIO DE MONTERIA	Remisión de acta de final de obra
CORREO ELECTRONICO	25/07/2024	C.E SIM-1895-2024	MUNICIPIO DE MONTERIA	CGR seguimiento contrato LP SPM 020 2021 Monteria
CORREO ELECTRONICO	6/08/2024	C.E SIM-2015-2024	MUNICIPIO DE MONTERIA	Entrega de caracterizaciones viales a Ministerio de Transporte
CORREO ELECTRONICO	9/08/2024	C.E SIM-2077-2024	MUNICIPIO DE MONTERIA	SOLICITUD MUNICIPIO AL CONTRATISTA DOCS CIERRE SOCIAL
CORREO ELECTRONICO	30/05/2024	SIN CODIFICACIÓN	DABERLIS ARRIETA CARDENAS	CITACIÓN A REUNIÓN SOCIAL DE CIERRE DEL CONTRATO
CORREO ELECTRONICO	26/06/2024	OFICIO DEAC-045	DABERLIS ARRIETA CARDENAS	ENTREGA POLIZAS ACTUALIZADAS ACTA FINAL...falta el acta de aprobación
CORREO ELECTRONICO	1/06/2024	2024S-VBOG-035489	SUB. DE SOSTENIBILIDAD INVIAS	Obs. PAGA -Trimestral 01 y aclaraciones - P.NUEVO E2
CORREO ELECTRONICO	6/06/2024	2024S-VCOR-036638	INVIAS CORDOBA	Solicitud de documentación para suspensión del Contrato de Interventoría 2273-2021.
CORREO ELECTRONICO	9/06/2024	2024S-VBOG-037077	SUB. DE SOSTENIBILIDAD INVIAS	Observaciones paga carolina 2 cto 097-2023 P.RICA
CORREO ELECTRONICO	14/06/2024	2024S-VBOG-038323	SUB. DE SOSTENIBILIDAD INVIAS	Aprobación balance final social cto 119-2023 almendro ET2
CORREO ELECTRONICO	14/06/2024	2024S-VBOG-038324	SUB. DE SOSTENIBILIDAD INVIAS	Obs. info trimestral social 01 cto 119-2023 almendro ET2
CORREO ELECTRONICO	14/06/2024	2024S-VBOG-038325	SUB. DE SOSTENIBILIDAD INVIAS	Aprobación del balance social final cto 129-2021 pnuevo ET1
CORREO ELECTRONICO	14/06/2024	2024S-VBOG-038326	SUB. DE SOSTENIBILIDAD INVIAS	Obs. inf. trimestral social 1 cto 105-2023 puevo ET 2...aprobación
CORREO ELECTRONICO	21/06/2024	2024S-VBOG-040640	SUB. DE SOSTENIBILIDAD INVIAS	Aval Invias cierre ambiental PNUEVO ET 1 - CTO 129 2021
CORREO ELECTRONICO	11/07/2024	2024S-VBOG-045933	SUB. DE SOSTENIBILIDAD INVIAS	Aval baja complejidad & ok inf trimestal AMB 01- cto097 2023 carolina
CORREO ELECTRONICO	11/07/2024	2024S-VBOG-045934	SUB. DE SOSTENIBILIDAD INVIAS	Aprobación trimestral ambiental 02 - cto 097-2023 PRICA carolina
CORREO ELECTRONICO	11/07/2024	2024S-VBOG-045936	SUB. DE SOSTENIBILIDAD INVIAS	Obs. Informar estado CTO 105 2023 y actualizar MASPS-MN1-IN-1-FR-1
CORREO ELECTRONICO	12/07/2024	2024S-VBOG-046191	SUB. DE SOSTENIBILIDAD INVIAS	Obs. inf. trimestral social 02 - cto 097-2023 carolina...aprobación
CORREO ELECTRONICO	12/07/2024	2024S-VBOG-046232	SUB. DE SOSTENIBILIDAD INVIAS	Aprobación trimestral ambiental 01 - cto 105-2023 PNUEVO
CORREO ELECTRONICO	2/08/2024	2024S-VBOG-052594	SUB. DE SOSTENIBILIDAD INVIAS	Solicitud Balance de cierre CTO 105-2023 P.NUEVO
CORREO ELECTRONICO	23/08/2024	2024S-VBOG-058683	SUB. DE SOSTENIBILIDAD INVIAS	Aprobación info trimestral 02 cto 105- PNUEVO 2
CORREO ELECTRONICO	12/08/2024	E-MAIL	INVIAS CORDOBA	ACTAS DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVOS CONVENIOS 2021 - : 925 de 2021, 992 de 2021 y 920 de 2021
CORREO ELECTRONICO	15/08/2024	E-MAIL	MUNICIPIO DE PLANETA RICA	Requerimiento de información URGENTE para liquidación del contrato de Obra No.097 …al contratista

Re i tro oto r ico ideo de ce de o r

	R□□ □□RO□□O□O□R□□□O□□ □□ORM□□M□□□□□□D□□□□R□□□□OR□□□o□□□□ □□rodo□1a□□□d□□□o□d□□□□□□ □O□□R□□O□D□□□□R□□□□OR□□□o□□7□D□□□□1□ □	CONSORCIO VIAL RURAL

CAROLINA CTO 097	
	
□oto□□o□□□Co□□tr□cci□□□de□□□i□e□to□r□□ido□MR□□□ □ro□ecto□□□i□e□to□R□□ido□□C□roi□□□	□oto□□o□□□Co□□tr□cci□□□de□□□i□e□to□r□□ido□MR□□□ □ro□ecto□□□i□e□to□R□□ido□□C□roi□□□

PUEBLO NUEVO CTO 129	
	
□oto□□o□□□□t□do□□ct□□□de□□□□□□□ro□ecto□□□i□e□to□ r□□ido□-□Ci□t□r□□□□□	□oto□□o□□□□t□do□□ct□□□de□□□□□□□ro□ecto□□□i□e□to□ r□□ido□-□Ci□t□r□□□□□

	R□□ □□RO□□O□O□R□□□O□□ **□□ORM□□M□□□□□□D□□□□R□□□□OR□□ □□o□□□□** **□□rodo□1a□□□□d□□□□o d□□□□□□□** **□O□□R□□O□D□□□□R□□□□OR□□ □□o□□7□D□□□□1□**	CONSORCIO VIAL RURAL

	
□oto□□o□□□□□t□do□□ct□□□de□□□□□□□□ro□ecto□□□□i□e□to□ r□□ido□→□□erto□□□to□□□□	□oto□□o□□□□Co□□tr□cci□□□de□□□□i□e□to□MR□□□□ro□ecto□□ □□□i□e□tor□□ido□→□□erto□□□to□□□□

PUEBLO NUEVO CTO 105	
	
□oto□□o□□□□□□□did□□de□o□□□□de□□□□i□e□to□□ro□ecto□□ □□□i□e□tor□□ido□→□Ci□t□r□□□□□	□oto□□o□□□□□□□did□□de□o□□□□de□□□□i□e□to□□ro□ecto□□ □□□i□e□tor□□ido□→□□erto□□□to□□□□

	R□□ □□RO□O□O□R□□□O□	CONSORCIO VIAL RURAL

CAROLINA CTO 129	
	
□oto□□o□□□□□□t□do□□ct□□□□de□□□□□□□□□□ro□ecto□□□□i□e□to□ □□□□tico□–□C□ro□i□□□□□R□	□oto□□o□□□□□□t□do□□ct□□□□de□□□□□□□□□□ro□ecto□□□□i□e□to□ □□□□tico□–□C□ro□i□□□□□R□

ALMENDRO CTO 119	
	
□oto□□o□□□□□□t□do□□ct□□□□de□□□□□□□□□□ro□ecto□□Co□creto□ r□□ido□–□□□e□dro□□R□	□oto□□o□□□□□□t□do□□ct□□□□de□□□□□□□□□□ro□ecto□□Co□creto□ r□□ido□–□□□e□dro□□R□

	R□□ □□RO□O□O□R□□□O□□ **□□ □ORM□□M□□□□□□D□□□ □□R□□□□OR□□ □□o□□□□** **□□r□odo□1 a□□□□d□□□□□o□d□□□□□□□** **□O□□R□□O□D□□□ □□R□□□□OR□□ □□o□□7□D□□□□1□**	CONSORCIO VIAL RURAL

MONTERIA	
	
□oto□□o□□□□□□□t□do□□ct□□□□de□□□□□□□□□□□□□□r□□□ie□□□ □R□□□□□□□□ro□ecto□Mo□ter□□	□oto□□o□□□□□□□t□do□□ct□□□□de□□□□□□□□□□□□□□r□□□ie□□□ □□ci□□□ □R□□□□□□□□ro□ecto□Mo□ter□□
	
□oto□□o□□□□□□tri□o□□de□□□e□te□-□□e□te□□□ro□ecto□□□ □□□□□□ □□Mo□ter□□	□oto□□o□□□□□□□i□□□□l□□d□□□-□□□e□te□□□ro□ecto□□□ □□□□□□□ Mo□ter□□

	R□□ □□RO□O□O□R□□□O□□ **□□ORM□□M□□□□□□D□□□ □□R□□□OR□□ □□o□□□□** **□□rodo□1a□□□d□□□□o d□□□□□□□** **□O□□R□□O□D□□□ □□R□□□OR□□ □□o□□7□D□□□□1□**	CONSORCIO VIAL RURAL

MONTERIA	
 □oto□□o□□□□□De□ □rc□ci□□□□ori□o□t□□□□□□□□□i□□□etro□□□□	 □oto□□o□□□□□De□ □rc□ci□□□□ori□o□t□□□□□□□□□i□□□etro□□□□
Tr□□ o□□□□□ci□□□R□□□□□□□ro□ecto□Mo□ter□	Tr□□ o□□□□□ci□□□R□□□□□□□ro□ecto□Mo□ter□
 □oto□□o□□□□□t□do□ct□□□de□□□□□□□ro□ecto□Mo□ter□	 □oto□□o□□□□□t□do□ct□□□de□□□□□□□ro□ecto□Mo□ter□

Re i tro oto r ico ideo de cti id de ie t e oci e redi e de
o te i id de de t d

	R□□ □□RO□□O□O□R□ □□O□□ **□□ □ORM□□M□ □□□□□D□□□ □□R□□□□OR□□ □□o□□□□□** **□□r□odo□1a□□□□d□□□□□o□d□□□□□□□** **□O□□R□□O□D□□□□ □□R□□□□OR□□ □□o□□7□□D□□□□□1□**	CONSORCIO VIAL RURAL

	
□oto□□o□□□Re□□i□□□de□□eed□r□□□corre□i□ie□to□□□ro□ecto□□□ Mo□ter□□	□oto□□o□□□l□ □e□ e□t□ci□□□de□□□□□□□ro□ecto□□□□□□Cr□ce□→□ □□□□□e□i□e

	
□oto□□o□□□□e□□i□□ci□□□e□□□itio□□de□o□r□□□ro□ecto□□□ C□roi□□□□	□oto□□o□□□□e□□i□□ci□□□□re□e□ti□□□□ro□ecto□□i□□□□ro□ecto□□□ C□roi□□□

	R□□ □□RO□O□O□R□□□O□□ **□□ □ORM□□M□□□□□□D□□□ □□R□□□□OR□□ □□o□□□□□** **□□r□odo□1a□□□□d□□□□□o□d□□□□□□□** **□O□□R□□O□D□□□ □□R□□□□OR□□ □□o□□7□□D□□□□□1□**	CONSORCIO VIAL RURAL

	
□oto□□o□□□□oci□i□□ci□□□de□□□□□ce□de□o□r□□□ro□ecto□□i□□□ C□roi□□□□ro□ecto□□□ □□et□Ric□□	□oto□□o□□□□e□□i□□ci□□□de□o□r□□□ro□ecto□Mo□ter□□

	
□oto□□o□□□□ode□□□e□i□ □e□ e□to□□de□□□□□□□ro□ecto□□ C□roi□□□□	□oto□ □o□ □□re□□i□□□ □e□□□□□co□□ □eed□r□□□ci□d□d□□□□ □ro□ecto□i□□□□ □ □□□□ro□ecto□Mo□ter□□

OR D O R

O R O – 1

M O D MO R

01-06-2024
Estado del tiempo: Se presentan lluvias en horas de la madrugada y por la mañana de 8:00 am a 9:30 a.m.
- Se realizan actividades de construcción para los gaviones del puente.

Residente de obra
María Cabrales.

Residente de Interventoría
Jorge Jalal C.

02-06-2024 (Domingo)
- No se realizan actividades en el sitio de ejecución del puente.

Residente de Obra
María Cabrales.

Residente de Interventoría
Jorge Jalal C.

03-06-2024 (festivo)
No se realizan actividades para la ejecución de los trabajos en el puente.

Residente de Obra
María Cabrales.

Residente de Interventoría
Jorge Jalal C

04-06-2024
Estado del tiempo: Se presentan lluvias durante la madrugada y en la mañana desde las 10:00 am hasta las 11:00 a.m.
- Se realizan actividades para la construcción de los gaviones.

Powered by CamScanner

- Se realiza conformación del terraplén instalado para los accesos del puente.

Residente de Obra
Maria Cabrales.

Residente de Interventoría
Jorge Jubal C.

05-06-2024

Estado del tiempo: se presentan lluvias durante la madrugada y en la mañana desde las 9:30 hasta las 12:00 p.m.

- Se trabaja en actividades de instalación y construcción de gaviones en el puente.
- En el tramo las cruces se realizan reparaciones y/o ajustes consignados en el acta de visita previa, se avanza en la realización de estos ajustes.

Residente de Obra
Maria Cabrales.

Residente de Interventoría
Jorge Jubal C.

OR D O R

O R O 1 –

M O D O O

30-05-2024

Estado del tiempo: seco

- Se realiza aseo y Limpieza general de obra, sello de juntas de dilatación en el pavimento rígido construido y relleno y conformación del talud. Instalado para los pandillos en ambos frentes de trabajo.
- En el tramo puerto santo adamas se realiza protección en piedra pegada para taludes inclinados.

Residente de Obra
Claudia Ibañez

Residente de Interventoría
Ingc Fabio C.

31-05-2024

Estado del tiempo: Lluvias de 2:00 pm a 4:00 pm.

- Se trabaja en actividades de sello de juntas de dilatación, conformación del relleno para los espaldares de los pandillos y limpieza y aseo general de obra en ambos frentes de trabajo (cintura y puerto santo).

Residente de obra
Claudia Ibañez

Residente de Interventoría
Ingc Fabio C.

01-06-2024:

- Estado del tiempo: lluvias de 11:00 am hasta las 12:00 pm.
- Se trabaja en los ajustes requeridos en el

acta de visita previa para poder dar trámite al recibo definitivo de las obras.

Residente de obra
Claudia Ibañez.

Residente de Interventoría
Jugo Fidalc

02-06-2024 (Domingo)
- No se realizan actividades de obra.

Residente de Obra Interventoría
Jugo Fidalc.

Residente de obra
Claudia Ibañez

03-06-2024 (festivo)
- Se trabaja en los ajustes solicitados y consignados en el acta de visita previa los cuales son indispensables para el recibo a satisfacción y definitivo de las obras.

Residente de obra
Claudia Ibañez.

Residente de Interventoría
Jugo Fidalc

04-06-2024
Estado del tiempo: Seco.
- Se continua trabajando en los ajustes necesarios para el recibo definitivo de las obras consignados en el acta de visita previa.

Residente de Obra
Claudia Ibañez

Residente de Interventoría,
Jorge Fidalgo

05-06-2024
Estado del tiempo:
- En ambas frentes se trabaja en los ajustes solicitados en el acta de visita previa para el recibo a satisfacción de los trabajos.

Residente de obra
Claudia Ibañez.

Residente de Interventoría
Jorge Fidalgo.

Powered by CamScanner

	R□□ □□RO□CIFRA □□□ORM□□M□□□□□□D□□□□R□□□□OR□□□o□□□ □□r□odo□1□a□□□d□□□□o□d□□□□4 □O□□R□□O□D□□□□R□□□□OR□□□o□□7□□D□□□□1□	

