6643

AVAL DE INTERVENTORIA
ACTA PARCIAL No. 2

CPS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023
y No. INTERNO 1987 DE 2023.

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

"REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

CONTRATO DE CONSULTORIA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-019-2023 y No. INTERNO 2023-DE 2023-09-06





AVAL DEL PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DEL 2024

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

Contenido

INTRODUCCIÓN 3
CAPITULO I 4
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA 5
2. ORGANIGRAMA DE LA CONSULTORIA 6
3. CAMBIOS TECNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y/O PROYECTO 7
4. ACTA DE INICIO 7
5. ESTADO GENERAL DE LAS POLIZAS 7
6. PAGO DE ESTAMPILLAS 7
7. RP Y CDP 8
8. RELACIÓN DE PERSONAL OFERTADO Y VINCULADO AL PROYECTO 8
9. RELACION DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 9
10. COSTOS DIRECTOS 9
11. CORRESPONDENCIA ENVIADA 9
12. RELACION DE EJECUCION DEL ANTICIPO CONTRATO DE CONSULTORIA. 13
13. PRÓRROGA No.1 AL CONTRATO 2023 DE 2023 – 09 - 06. 13
14. SUSPENSIÓN No.1 AL CONTRATO 2023 DE 2023 – 09 - 06. 13
15. REINICIO No.1 AL CONTRATO 2023 DE 2023 – 09 - 06 14
16. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA (PLAN DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO) 14
16.1. ASPECTOS GENERALES 14
16.2. ASPECTO ADMINISTRATIVO 17
16.3. ASPECTO LEGAL 22
16.4. ASPECTO TÉCNICO: 22
16.5. ASPECTO FINANCIERO Y CONTABLE 24
16.6. ASPECTOS AMBIENTALES 25
17. AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DE LA INTERVENTORIA 26
18. COMITÉS TÉCNICOS 29
19. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA 40
COMPONENTE 1: IMPLEMENTAR EFICIENTES PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS TÉCNICAS RELACIONADAS CON LA PRODUCCIÓN DE FORRAJE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPÓSITO. 41
ACTIVIDAD No. 1.1: REALIZAR JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DIRIGIDO A LOS MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN 41
ACTIVIDAD No. 1.2. REALIZAR LA ORIENTACIÓN TÉCNICA A LOS 175 PRODUCTORES BENEFICIARIOS DEL PROYECTO EN COMPETENCIAS RELACIONADAS CON LA PRODUCCIÓN DE FORRAJE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE GANADERIA TIPO DOBLE PROPÓSITO. 48
1.2.1. **JORNADA DE ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN PRÁCTICAS DE MECANIZACIÓN DE TERRENO PARA SIEMBRA DE FORRAJES.** 127
PRODUCTOR 5: KATHLEEN ROJAS CRUZ, **VEREDA**: BELLA VISTA, **PREDIO**: LA ESPERANZA 136
PRODUCTOR 6: RITA GLADYS MOLANO BARRE **VEREDA**: BELLA VISTA, **PREDIO**: TRES PALMAS 136
1.2.2. JORNADA DE ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN PRÁCTICAS DE APLICACIÓN DE ENMIENDAS PARA SIEMBRA DE FORRAJES. 144
PRODUCTOR 5: KATHLEEN ROJAS CRUZ, **VEREDA**: BELLA VISTA, **PREDIO**: LA ESPERANZA 153
PRODUCTOR 6: RITA GLADYS MOLANO BARRE **VEREDA**: BELLA VISTA, **PREDIO**: TRES PALMAS 153
1.2.3. JORNADA DE ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN PRÁCTICAS DE SIEMBRA DE FORRAJES. 162
PRODUCTOR 5: KATHLEEN ROJAS CRUZ, **VEREDA**: BELLA VISTA, **PREDIO**: LA ESPERANZA 167
PRODUCTOR 6: RITA GLADYS MOLANO BARRE **VEREDA**: BELLA VISTA, **PREDIO**: TRES PALMAS 167

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CAPITULO II 178
CAPITULO 2: INFORME JURIDICO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE Y FINANCIERO 179
INFORME LEGAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 179
ESTUDIO PREVIO 179
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 179
RESOLUCIÓN DE APERTURA DEL PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA No. CAS-OAJ-LP-013-2023. 179
PLIEGO DEFINITIVO DE CONDICIONES DEL PROCESO DE LICITACIÓN 179
APERTURA DE LA FIDUCIA. 181
BUEN MANEJO E INVERSIÓN DEL ANTICIPO 183
PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO EJECUTOR 184
MATRIZ DE EJECUCIÓN FISICO - FINANCIERA. 185
RECOMENDACIONES 187
INDICE DE ANEXOS ..... ¡Error! Marcador no definido.

INTRODUCCIÓN

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

La Interventoría mediante el presente CONTRATO DE CONSULTORIA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-019-2023 y No. INTERNO 2023-DE 2023-09-06 CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE en marco del seguimiento que se realiza al contratista Fundación Creo País, donde realizara la respectiva ejecución de las actividades del contrato No. 1987 de 2023, cuyo Objeto es: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

La firma de interventoría realiza el seguimiento, verificación y acompañamiento a todas labores que realice la firma contratista comprobando su correcta ejecución en todos los aspectos; técnicos, jurídicos, administrativos, contables y financiero del contrato vigilado, realizado por la Fundación Creo País en el periodo de ejecución: del 14 de diciembre de 2023 al 18 de julio de 2024.

Así mismo participará y dará viabilidad a actos administrativos y legales que el contrato de prestación de servicios amerite para su correcto desarrollo y cumpliendo con las obligaciones contractuales pactadas.

El aval del informe **Acta Parcial No. 2**, que se presenta sintetiza los avances y ejecutorias del Contratista Fundación Creo País, desde actividades generales contratadas, observándose el avance que ha desarrollado en el presente periodo de ejecución, que corresponde del del 14 de diciembre de 2023 al 18 de julio de 2024; así como las actividades de seguimiento, aprobación y demás realizadas por la Interventoría, para la adecuada ejecución del contrato de prestación de servicios.

CAPITULO I

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

EJECUCION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. SECOP II CAS-OAJ-CMA-019-2023 y No. INTERNO 2023-DE 2023-09-06 CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

LOCALIZACION DEL PROYECTO (NUCLEOS DE PRODUCCION)

El proyecto se ubica en el departamento del Casanare, específicamente y su mayor influencia será en los pequeños productores de los municipios de AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE



Fuente: Propia

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA

CONTRATO No:	CAS-OAJ-CMA-019-2023 y No. INTERNO 2023-DE 2023-09-06

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONTRATANTE:	GOBERNACION DE CASANARE		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERPRADERAS 2023		
NIT:	Nit: 901750131-2		
REPRESENTANTE LEGAL:	ALEXANDER DUARTE SIERRA		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL DOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MCTE ($457.906.278)		
OBJETO:	"REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"		
VALOR DEL ANTICPIO 40%: VALOR INICIAL	$ 183.162.511,20		
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	SEIS (6) MESES		
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO:	6 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
SUPERVISOR (A) INICIAL	ALEXANDER BARRERA GIRON		
SUPERVISOR (A) ACTUAL	CRISTIAN ROLANDO CIFUENTES ESTEBAN		
FECHA ACTA DE INICIO:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	13 DE MARZO DE 2024		
PRORROGA No. 1 (2 MESES)	12/12/2023		
FECHA DE TERMINACION ACTUAL	13/06/2024		
FECHA DE SUSPENSIÓN	21 DE DICIEMBRE DE 2023		
FECHA DE REINICION	18 DE ABRIL DE 2024		
FECHA DE TERMINACION ACTUAL	09 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
ACTA PARCIAL No. 01	$ 358.693.251,37 Equivale al 78,33 %		
AVANCE DEL CONTRATO:	PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO	95,00%	
	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	0,75	
	AVANCE FINANCIERO	$	**435.010.964**
	AVANCE PROGRAMADO	$	**435.010.964**

2. ORGANIGRAMA DE LA CONSULTORIA

ALEXANDER DUARTE SIERRA R.L. CONSORCIO INTERPRADERAS 2023 Nit: 901750131-2	**EDUAR JAVIER ACEVEDO MONTAÑEZ** DIRECTOR **HERLEY CACERES SANCHEZ** ZOOTECNISTA **OMNIME BARRERA CHAPARRO** Ing. Agrícola

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

	ROSA MARIA VALLEJO L. CONTADOR
	HILDA LUZ MENDOZA MURILLO ABOGADA
	EMMA YERALDIN NAVARRO Secretaria

3. CAMBIOS TECNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y/O PROYECTO

Durante el transcurso del presente periodo no se han presentado cambios EJECUCION ADMINISTRATIVA

4. ACTA DE INICIO

La supervisión en representación de ALEXANDER BARRERA GIRON y ALEXANDER DUARTE SIERRA representante legal de CONSORCIO INTERPRADERAS 2023 suscribió acta de inicio para el contrato de consultoría CAS-OAJ-CMA-019-2023 y N° INTERNO 2023 de 2023-09-06. Con fecha de inicio 14 de septiembre de 2023.

5. ESTADO GENERAL DE LAS POLIZAS

Con el propósito de legalizar el contrato de consultoría CAS-OAJ-CMA-019-2023 y No. INTERNO 2023-DE 2023-09-06. El CONSORCIO INTERPRADERAS 2023 adquirió pólizas para garantizar los siguientes Amparos.

Evento		Descripción de los amparos (ajuste según contrato)					
		Cumplimiento.	Buen manejo Anticipo	Pago de salarios, Prestaciones Sociales	Calidad del servicio.	Responsabilidad Civil.	Adicione conforme al contrato
		57-44-101004237	57-44-101004237	57-44-101004237	57-44-101004237	N° Póliza	N° Póliza
Contrato/convenio Inicial.	% - SMLV	10%	100%	5%	10%	Porcentaje	Porcentaje
	Desde	06/09/2023	06/09/2023	06/09/2023	06/09/2023	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
	Hasta	15/07/2024	15/07/2024	15/03/2027	15/07/2024	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
Fecha de aprobación de la póliza		14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
Acta de Inicio	% - SMLV	10%	100%	5%	10%	Porcentaje	Porcentaje
	Desde	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023		
	Hasta	23/07/2024	23/07/2024	23/03/2027	23/07/2024		
Fecha de aprobación de la póliza		21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023		

6. PAGO DE ESTAMPILLAS

El consorcio Interpraderas 2023, consignó el departamento de Casanare, la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES SEICIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHO PESOS MCTE. ($34.631.708), por conceptos referentes a estampillas: Pro-cultura, Pro-Adulto Mayor, Pro-Deporte, Pro-desarrollo y Pro-Unitrópico, conforme se relaciona en la siguiente tabla.

CONCEPTO	FECHA DE PAGO ESTAMPILLAS	FECHA REGISTRO NOTAS CREDITO	VALOR
ESTAMPILLA PROCULTURA	14/09/2023	14/09/2023	$ 3.848.000
ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO	14/09/2023	14/09/2023	$3.848.000

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONCEPTO	FECHA DE PAGO ESTAMPILLAS	FECHA REGISTRO NOTAS CREDITO	VALOR
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR	14/09/2023	14/09/2023	$11.543.900
TASA PRO-DEPORTE	14/09/2023	14/09/2023	$9.619.880
ESTAMPILLA UNITROPICO	14/09/2023	14/09/2023	$5.771.928
TOTAL			**$34.631.708**

7. RP Y CDP

El 13 de septiembre de 2023, el Departamento de Casanare generó Registro de Disponibilidad Presupuestal – RP No. 2302023, para el CONTRATO DE CONSULTORIA N° CAS-OAJ-CMA-019-2023 y No. INTERNO 2023-DE 2023-09-06, CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE", por un valor de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($457.906.278,00)

El 11 de julio de 2023, el Departamento de Casanare generó Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP No. 23000214, para el CONTRATO DE CONSULTORIA N° CAS-OAJ-CMA-019-2023 y No. INTERNO 2023-DE 2023-09-06, CUYO OBJETO ES "REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE", por un valor de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($457.906.293,00)M/CTE

La copia del RP y CDP se anexaron en el informe No. 1.

8. RELACIÓN DE PERSONAL OFERTADO Y VINCULADO AL PROYECTO

De conformidad con lo establecido en la Propuesta presentada por el CONSORCIO INTERPRADERAS 2023, se relaciona a continuación el personal contratado para realizar dicha consultoría, tiempo de duración y porcentajes de dedicación según lo ofertado y aprobado.

N°	NOMBRE	DURACION	DEDICACION	FECHA DE INICIO
1	EDUAR JAVIER ACEVEDO MONTAÑEZ	6 MESES	100%	14/09/2023
2	HERLEY CACERES SANCHEZ	6 MESES	100%	14/09/2023
3	OMNIME BARRERA CHAPARRO	6 MESES	100%	14/09/2023
4	ANGELA LUCERO SOLER ZAMORA	6 MESES	50%	14/09/2023
5	NANCY MILENA CASTRO	6 MESES	50%	14/09/2023
6	EMMA YERALDIN NAVARRO	6 MESES	100%	14/09/2023

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

9. RELACION DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

A continuación, se relaciona los pagos realizados por el personal profesional vinculado al contrato en cumplimiento de las obligaciones parafiscales:

N°	NOMBRE	IDENTIFICACION	MES/AÑO	N° PLANILLA
1	EDUAR JAVIER ACEVEDO MONTAÑEZ	74.754.523	DICIEMBRE/2023	9461480574
			ABRIL/2024	9466719365
			MAYO/2024	9468274027
			JUNIO/2024	9469525951
2	HERLEY CACERES SANCHEZ	7.365.663	DICIEMBRE/2023	9461480574
			ABRIL/2024	9466719365
			MAYO/2024	9468274027
			JUNIO/2024	9469525951
3	OMNIME BARRERA CHAPARRO	4.156.692	DICIEMBRE/2023	9461480574
			ABRIL/2024	9466719365
			MAYO/2024	9468274027
			JUNIO/2024	9469525951
4	ANGELA LUCERO SOLER ZAMORA	24.228.376	DICIEMBRE/2023	9461480574
			ABRIL/2024	9466719365
			MAYO/2024	9468274027
			JUNIO/2024	9469525951
5	NANCY MILENA CASTRO	33.646.724	DICIEMBRE/2023	9461480574
			ABRIL/2024	9466719365
			MAYO/2024	9468274027
			JUNIO/2024	9469525951
6	EMMA YERALDIN NAVARRO	1.006.443.100	DICIEMBRE/2023	9461480574
			ABRIL/2024	9466719365
			MAYO/2024	9468274027
			JUNIO/2024	9469525951

Que la firma de interventoría presenta de manera mensual los informes y en ellos están los soportes de seguridad social y nóminas del equipo de trabajo de interventoría.

10. COSTOS DIRECTOS

La firma interventora dispone de vehículos tipo campero PC KUP, camioneta o similar, con cilindraje desde 2000 cc hasta 2999 cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible para realizar actividades de campo, de la misma manera cuenta con oficina ubicada en la carrera 17 No. 14 – 11 del municipio de Aguazul, Casanare, igualmente dispone de facturación por parte de tercero que presta los servicios de elaboración de fotografías y procesamiento de documentos – Papelería. Se aclara que los soportes de pago de los costos directos se allegarán en cada informe para cobro de acta parcial.

11. CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

Durante el periodo comprendido entre el 14 de diciembre de 2023 al 18 de julio del 2024 se han enviado oficios por parte de la interventoria en medio fisico como por correo electrónico, a los cuales se le han notificado el seguimiento del cumplimiento de las actividades del contrato.

FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
14/12/2023	Contratista Fundación Creo País	Interventoria – Consorcio Interpraderas 2023	Presentación informe de inversión y buen manejo del anticipo del contrato 1987 de 2023
14/12/2023	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Director Técnico De Desarrollo Rural	Radicación informe de buen manejo de anticipo del contrato 1987 de 2023, radicado 015418
14/12/2023	Contratista Fundación Creo País	Interventoria – Consorcio Interpraderas 2023	Ajuste de informe de actividades No. 1 contrato 1987 de 2023
14/12/2023	Contratista Fundación Creo País	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Ajuste del informe de actividades No. 2, contrato 1987 de 2023
14/12/2023	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Director Técnico De Desarrollo Rural	Radicación de informe mensuales No. 1 y 2 del del contrato 1987 de 2023, radicado 015419
14/12/2023	Contratista Fundación Creo País	Interventoria – Consorcio Interpraderas 2023	Remisión de informe corregido acta parcial No. 1 contrato 1987 de 2023
15/12/2023	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Director Técnico De Desarrollo Rural	Radicación aval para pago de acta parcial No. 1 del contrato 1987 de 2023, radicado 015433
21/12/2023	Contratista Fundación Creo País	Interventoria – Consorcio Interpraderas 2023	Solicitud de suspensión No. 1 del contrato 1987 de 2023
21/12/2023	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Director Técnico De Desarrollo Rural	Solicitud de suspensión No. 1 del contrato de consultoría 2023 de 2023
25/04/2024	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Contratista Fundación Creo País	solicitud de cronograma mediante correo electronico
30/04/2024	Director Técnico De Desarrollo Rural	Interventoria – Consorcio Interpraderas 2023	Invitacion comité tecnico de preseleccion
7/05/2024	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Contratista Fundación Creo País	Solicitar ejecución físico financiera del contrato 1987 de 2023 vía correo electrónico
15/05/2024	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Contratista Fundación Creo País, Desarrollo Rural	Solicitud de cronograma de siembras y hojas de vida, vía correo electrónico
16/05/2024	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Contratista Fundación Creo País	Solicitud de cronograma de siembras y hojas de vida,
16/05/2024	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Contratista Fundación Creo País	Presentación informe No. 3 del contrato 1987 de 2023

6654

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
16/05/2024	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Contratista Fundación Creo País, Desarrollo Rural	Solicitud de comité, vía correo electrónico
21/05/2024	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Cristian Rolando Cifuentes	Remisión de informe No. 3 del contrato 1987 de 2023, radicado 007690
22/05/2024	Contratista Fundación Creo País,	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Remisión informe No. 4 del contrato 1987 de 2023
22/05/2024	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Cristian Rolando Cifuentes	Remisión informe No. 4 del contrato 1987 de 2023, radicado 007692
29/05/2024	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Contratista Fundación Creo País	Solicitud de información al contrato 1987 de 2023, vía correo electrónico
5/06/2024	Contratista Fundación Creo País	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Relación de beneficiarios a recibir material vegetal del contrato 1987 del 2023
5/06/2024	Contratista Fundación Creo País	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Solicitud de aplazamiento comité técnico programado para el día 06 de junio de 2024, vía correo electrónico
5/06/2024	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Desarrollo rural, Cristian Rolando Cifuentes	Solicitud de aplazamiento técnico programado el 06 de junio de 2024, vía correo electrónico
10/06/2024	Contratista Fundación Creo País	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Información afectaciones actividades de mecanización y siembra contrato 1987 de 2023, vía correo electrónico
11/06/2024	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Contratista Fundación Creo País	Solicitud de plan de acción y la reprogramación según oficio enviado, vía correo electrónico
11/06/2024	Contratista Fundación Creo País	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Programación del 11 al 15 de junio de 2024 del contrato 1987 de 2023, vía correo electrónico
11/06/2024	Contratista Fundación Creo País	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Remisión del informe mensual No. 5
12/06/2024	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Cristian Rolando Cifuentes	Informe de acta parcial No. 1, del contrato 2023, radicado 009114
13/06/2024	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Cristian Rolando Cifuentes	Presentación informe No. 6 del contrato 2023 de 2023, radicado 009226
17/06/2024	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Contratista Fundación Creo País	Devolución del informe No. 5, para correcciones del contrato 1987 de 2023

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

FECHA	REMITENTE	DESTINATARIO	ASUNTO
24/06/2024	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Cristian Rolando Cifuentes	Solicitud reunión de comité contrato 2023 de 2023 y contrato 1987 de 2023, radicado 009944
24/06/2024	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Contratista Fundación Creo País	Solicitud reunión de comité del contrato 1987 de 2023
26/06/2024	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Carlos Alberto Madrid, Representante Legal del Codepla	Solicitud de reunión de comité del contrato 1987 de 2023
26/06/2024	Contratista Fundación Creo País	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Solicitud cambio de predio del señor JUAN CARLOS PULIDO
02/07/2024	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Contratista Fundación Creo País	Seguimiento al proceso de establecimiento de pasto CLON 51
15/07/2024	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Contratista Fundación Creo País	Solicitud de información
17/07/2024	Contratista Fundación Creo País	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Remisión de informe mensual No. 5 corregido
17/07/2024	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Contratista Fundación Creo País	Devolución del informe mensual de actividades No. 6
18/07/2024	Contratista Fundación Creo País	Interventoría – Consorcio Interpraderas 2023	Remisión de informe mensual No. 6

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

12. RELACION DE EJECUCION DEL ANTICIPO CONTRATO DE CONSULTORIA.

A continuación, se describe el cuadro de inversión del anticipo, presentado y aprobado por supervisión para el presente contrato de consultoria.

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
1	costos de personal	$ 126.820.103,00	69%
2	Transporte	$ 51.408.000,00	28%
3	documentación y papelería y oficina	$ 4.934.408,20	3%
TOTAL		$ 183.162.511,20	100%

El día 26 de septiembre de 2023, efectuaron EL ACTA NO. 1 DE ENTREGA DE ANTICIPO por valor de 183.162.511,20 que corresponde al 40%

Con los recursos entregados a título de anticipo del presente contrato de consultoría la interventoría los utilizo para los costos y pagos acorde a lo programado y aprobado por la supervisión durante la ejecución del contrato.

Se dio orden de pago No. 05-230451 de fecha 02 de octubre de 2023

13. PRÓRROGA No.1 AL CONTRATO 2023 DE 2023 – 09 - 06.

El día 07 de diciembre del 2023, se radicó solicitud de prórroga a la **Supervisión**, y esta fue dada el día 12 de diciembre de 2023, firmando Supervisor del CAS-OAJ-CMA-019-2023 Y NÚMERO INTERNO 2023 DE 2023-09-06, cuyo objeto es "REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, Y FINANCIERA, A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJES EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERIA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANI, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.", prorroga otorgada por 2 meses

Evento		Descripción de los amparos (ajuste según contrato)					
		Cumplimiento.	Buen manejo Anticipo	Pago de salarios, Prestaciones Sociales	Calidad del servicio.	Responsabilidad Civil.	Adicione conforme al contrato
		57-44-101004237	57-44-101004237	57-44-101004237	57-44-101004237	N° Póliza	N° Póliza
PRÓRROGA No.1	% - SMLV	10%	100%	5%	10%	Porcentaje	Porcentaje
	Desde	14/09/2023	14/09/2023	06/09/2023	14/09/2023	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
	Hasta	25/09/2024	25/09/2024	25/05/2027	25/09/2024	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
Fecha de aprobación de la póliza		18/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	18/12/2023	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)

14. SUSPENSIÓN No.1 AL CONTRATO 2023 DE 2023 – 09 - 06.

El día 21 de diciembre del 2023, se radicó solicitud de suspensión a la **Supervisión**, firma Supervisor del CAS-OAJ-CMA-019-2023 Y NÚMERO INTERNO 2023 DE 2023-09-06, cuyo objeto es "REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, Y FINANCIERA, A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

FORRAJES EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERIA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANI, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.", solicitando la suspensión al contrato por un periodo de tres (03) meses, hasta que se resuelvan los inconvenientes de fuerza mayor planteados por el contratista.

15. REINICIO No.1 AL CONTRATO 2023 DE 2023 – 09 - 06.

La supervisión en representación de CRISTIAN ROLANDO CIFUENTES ESTEBAN y ALEXANDER DUARTE SIERRA representante legal de CONSORCIO INTERPRADERAS 2023 suscribió acta de Reinicio para el contrato de consultoría CAS-OAJ-CMA-019-2023 y N° INTERNO 2023 de 2023-09-06. Con fecha de Reinicio de 18 de abril de 2024.

Evento		Descripción de los amparos (ajuste según contrato)					
		Cumplimiento.	Buen manejo Anticipo	Pago de salarios, Prestaciones Sociales	Calidad del servicio.	Responsabilidad Civil.	Adicione conforme al contrato
		57-44-101004237	57-44-101004237	57-44-101004237	57-44-101004237	N° Póliza	N° Póliza
REINICIO No.1	% - SMLV	10%	100%	5%	10%	Porcentaje	Porcentaje
	Desde	14/09/2023	14/09/2023	06/09/2023	14/09/2023	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
	Hasta	13/01/2025	13/01/2025	13/09/2027	13/01/2025	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
Fecha de aprobación de la póliza		09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)

16. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA (PLAN DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO)

A continuación, se describen las actividades ejecutadas por la Interventoría durante el 14 de diciembre de 2023 al 18 de julio de 2024 inmersas en las obligaciones del contrato; cláusula segunda del contrato CAS-OAJ-CMA-019-2023 y N° INTERNO 2023 de 2023-09-06.

16.1. ASPECTOS GENERALES

1. Conocer en todas sus partes el contenido del contrato, pliego de condiciones y demás documentos correspondientes al contrato objeto de interventoria.

   Se realizó consulta en el secop II y se descargó toda la información correspondiente del contrato objeto de intervención. Esto se realizó en el mes 1.

2. Realizar el control financiero del Contrato objeto de interventoría.

   A la fecha se realizó viabilidad de pago del:

   Anticipo correspondiente al 40%,

   Acta parcial No. 1 un avance fisico financiero de **34,06%** que corresponde a $ **1.457.557.500,00**

   Para el presente informe de aval de acta parcial No. 2, lleva un avance fisico financiero de **26,29%** que corresponde a **$ 1.875.340.000,00**

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

Monitorear por el cumplimiento de la resolución No. 256 del 17 de mayo de 2004 del Manual de Interventoría.

La interventoría ha realizado la solicitud de la presentación de la vinculación del personal a la seguridad social.

3. Revisar que el contratista mantenga la vigencia y/o valor de las garantías según lo pactado.

Se reviso que la FUNDACIÓN CREO PAIS, garantizara la actualización de las vigencias de las pólizas

Evento		Descripción de los amparos (ajuste según contrato)					
		Cumplimiento.	Buen manejo Anticipo	Pago de salarios, Prestaciones Sociales	Calidad del servicio.	Responsabilidad Civil.	Adicione conforme al contrato
		N° 69884	N° 69884	N° 69884	N° 69884	N° 20414	N° Póliza
SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22		10%	100%	5%	10%	500 S.M.M.L.V	Porcentaje
	Desde	25/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	25/08/2023	(dd/mm/aaaa)
	Hasta	26/05/2024	26/05/2024	26/01/2027	26/05/2024	26/01/2024	(dd/mm/aaaa)
Fecha de aprobación de la póliza		12/09/2023	12/09/2023	12/09/2023	12/09/2023	12/09/2023	(dd/mm/aaaa)
Acta de Inicio N° 1 Digite el Evento	% - SMLV	10%	100%	5%	10%	500 S.M.M.L.V	Porcentaje
	Desde	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	(dd/mm/aaaa)
	Hasta	15/04/2024	15/06/2024	15/02/2027	15/04/2024	15/02/2024	(dd/mm/aaaa)
Fecha de aprobación de la póliza		19/09/2023	19/09/2023	19/09/2023	19/09/2023	19/09/2023	(dd/mm/aaaa)
Prorroga N° 1 Digite el Evento	% - SMLV	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
	Desde	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	(dd/mm/aaaa)
	Hasta	15/09/2024	15/09/2024	15/05/2027	15/09/2024	15/05/2024	(dd/mm/aaaa)
Fecha de aprobación de la póliza		20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	(dd/mm/aaaa)
Acta de Reinicio N° 1 Digite el Evento	% - SMLV	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
	Desde	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	(dd/mm/aaaa)
	Hasta	15/01/2025	15/01/2025	15/09/2027	15/01/2025	15/09/2024	(dd/mm/aaaa)
Fecha de aprobación de la póliza		29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	(dd/mm/aaaa)

4. Exigir al contratista, el cumplimiento de las especificaciones técnicas generales y particulares del objeto contratado.

En el primer comité técnico que se realizó se revisaron los aspectos técnicos que debe cumplir el contratista y se les dejo claro que se debe dar cumplimiento tal cual está en dicho documento.

Se verifica la entrega de insumos y materiales.

Se verifica la producción de material vegetal pasto de corte CLON 51 que cumpla con las especificaciones técnicas para ser suministrada a los diferentes municipios del proyecto

Se verifica las actividades jornadas 1,2 y 3, como mecanización, enmiendas y siembra, que se cumpla con las especificaciones dadas por el contrato.

5. informar al personero municipal o veedurías ciudadanas cuando sea requerido.

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

Se le informo al señor CARLOS ALBERTO MADRID ORTIZ, Representante Legal Sector Pecuario CODEPLA reunión de comité para tocar temas de presentación de carpetas de posibles beneficiarios pendientes (preselección y selección). En el mes de junio

6. Consolidar actas de los comités técnicos durante la ejecución del contrato.

   A la fecha de corte del presente informe de acta parcial se han realizado 15 comités técnicos interinstitucionales los cuales se pueden ver más detallados en el numeral 18 COMITÉS TÉCNICOS

7. Liquidar el contrato de acuerdo con la normatividad nacional vigente, la Interventoría contratada tendrá que vigilar que se entregue todos los productos terminados de acuerdo con las condiciones contractuales y realizar la respectiva liquidación del contrato.

   La interventoría realizara el proceso en su debido momento.

8. Realizar entrega y dar respuesta oportuna a la solicitud de información para dar cumplimiento a los requerimientos de la SDEAGYMA

   La interventoría da respuesta a los requerimientos realizados por la SDEAGYMA

9. Efectuar el Seguimiento y monitoreo al avance físico y financiero de los componentes y actividades del contrato objeto de la interventoría

   La interventoría ha realizado solicitud al contratista de la matriz de ejecución físico-financiera para realizar el reporte al Gesproy.

   Para el presente informe de aval de acta parcial No. 2, lleva un avance físico financiero de **26,29%** que corresponde a **$ 1.875.340.000,00,** desglosado de los siguientes componentes:

   REALIZAR JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DIRIGIDO A LOS MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN ..... $ 39.000.000,0

   REALIZAR LA ORIENTACIÓN TÉCNICA A LOS 175 PRODUCTORES BENEFICIARIOS DEL PROYECTO EN COMPETENCIAS RELACIONADAS CON LA PRODUCCIÓN DE FORRAJE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPÓSITO..... $ 33.600.000,0

   IMPLEMENTACIÓN DE BANCOS DE FORRAJE EN 175 UNIDADES PRODUCTIVAS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPÓSITO EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE...$ 1.802.740.000,0

10. Realizar entrega y dar respuesta oportuna a la solicitud de información por parte de la supervisión

    La interventoría realiza el proceso de respuesta a los comunicados realizados por la supervisión del contrato.

11. Realizar un monitoreo constante a los Riesgos de la ejecución del objeto a intervenir identificados en la matriz de riesgos.

    La interventoría esta presta a detectar los riesgos que puedan presentarse en la ejecución del contrato.

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

En los comités realizados la firma de interventoría ha realizado petición de plan de acción, así como la entrega oportuna de los informes.

12. Identificar e informar a la supervisión sobre nuevos riesgos que puedan surgir durante la ejecución del contrato a intervenir, además de los contenidos en la matriz de administración de Riesgos.

    A la fecha del presente informe no se presentan nuevos riesgos

13. La interventoría debe tener en cuenta la fuente de financiación del contrato vigilado, por lo tanto, exigirá el cumplimiento del objeto contractual, así mismo velará porque se cumpla con la normatividad que para tal efecto se expide en lo relacionado al sistema general de regalias.

    La interventoría realiza el seguimiento a la ejecución del contrato y exige al contratista se dé cumplimiento al objeto contractual como esta en el anexo de especificaciones técnicas.

14. Consolidar y presentar informe mensual del avance fisico y financiero del contrato objeto del seguimiento.

    Con corte a la fecha del presente informe la interventoria ha presentado 7 informes mensuales y 6 informes para Gesproy a la supervisión.

16.2. ASPECTO ADMINISTRATIVO

1. Conocer los estudios técnicos del contrato principal e informar en caso de encontrar alguna inconsistencia para efecto de subsanar la misma.

   La interventoría descargo del Secop II el estudio previo del contrato y se realizó estudio de este.

2. Conocer el clausulado de los contratos realizados por el departamento y verificar el cumplimiento de los requisitos de legalización.

   La interventoría reviso el contrato de prestación de servicios No. 1987/2023 junto con sus clausulados y verifico que el contratista realizo el pago de las estampillas a la Gobernación de Casanare y todo lo concerniente a su legalización.

3. Conocer y hacer cumplir cada una de las cláusulas contractuales.

   La interventoría esta presta a verificar que el contratista cumpla con cada una de las actividades previstas en el contrato y el anexo de especificaciones técnicas para dar cumplimento al objeto contractual.

   Se avala el cumplimiento de las actividades:

   ACTIVIDAD No. 1.1.: CONVOCATORIA, SOCIALIZACIÓN, INSCRIPCIÓN, VERIFICACIÓN DE PREDIOS Y SELECCIÓN DE PRODUCTORES A BENEFICIAR CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO .... **$ 39.000.000,00**

   ACTIVIDAD No. 1.2. REALIZAR LA ORIENTACIÓN TÉCNICA A LOS 175 PRODUCTORES BENEFICIARIOS DEL PROYECTO EN COMPETENCIAS RELACIONADAS CON LA PRODUCCIÓN DE FORRAJE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPÓSITO... **$ 33.600.000,00**

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

ACTIVIDAD No. 2.1.: IMPLEMENTACIÓN DE BANCOS DE FORRAJE EN 175 UNIDADES PRODUCTIVAS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPÓSITO EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.....**$ 1.802.740.000,00,** se detalla a continuación lo que se cobra de esta actividad:

ITEM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR TOTAL
2.1.1	Mecanización de terreno para siembra de forrajes			
2.1.1.1	Servicio de mecanización, preparación tipo convencional. Servicio de maquinaria agrícola a todo costo (Tractor con implementos agrícolas, rastra, rastrillo pulidor, boleadora abonadora, caballoneador y remolque.) 12 horas por terreno de una hectarea	Hora	840	$ 114.240.000,00
2.1.3.1	Semilla asexual de pasto de corte -Clon 51- cortada en esquejes de longitud mínima de 75 centímetros, los cuales deben presentar un óptimo estado fitosanitario y contar con mínimo 5 yemas funcionales.	Ton	420	$ 1.281.000.000,00
ITEM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR TOTAL
2.1.9	Transporte de Materiales y Equipos a unidades productivas			
2.1.9.1	Transporte de carga terrestre - flete intermunicipal - capacidad de carga superior a 8 toneladas - Transporte de insumos.	Flete	150	$ 127.500.000,00
.9.2	Transporte de carga terrestre - flete intermunicipal - capacidad de carga superior a 6 toneladas - Transporte de semilla.	Flete	70	$ 59.500.000,00
2.1.10	Mano de obra no calificada establecimiento unidades productivas			
2.1.10.1	Mano de obra no calificada (Adecuación, trazado, ahoyado, distribución y siembra de semilla)	Jornal	3500	$ 220.500.000,00
TOTAL				**1.802.740.000,00**

4. Informar a la secretaria de Desarrollo Económico, Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente el incumplimiento de cualquier obligación contractual.

   A la fecha no se ha evidenciado incumplimiento del contrato. Sin embargo, se tiene la alerta de la no inscripción de usuarios para poder tener la selección y la implementación del contrato acorde a lo planificado en el estudio previo.

5. Solicitar a la secretaria de Desarrollo Económico, Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y/o quien haga sus veces de supervisión los documentos mediante los cuales se haga constar las modificaciones del contrato.

   Para el informe de aval se hizo modificaciones en cuanto se firmo prorrogas y suspensiones para el mes de diciembre y su reinicio el 18 de abril de 2024

6. Conocer la propuesta presentada por el contratista y verificar la consistencia de la misma.

   La interventoria descargo del portal Secop II la oferta presentada por Creo País y realizo verificación de esta.

7. Solicitar al contratista: programación de trabajo y organigrama del personal contratado.

   El contratista envía programación semanal por correo electrónico para su seguimiento.

8. Verificar la vinculación por parte del contratista del personal profesional y técnico de acuerdo con la propuesta aprobada por el departamento.

Para el cobro de acta parcial No2. Se verifica la vinculación por cada item a cobrar de la siguiente manera:

ACTIVIDAD No. 1.1

Socialización:

JORGE ARMANDO BARRERA NIETO; CPSP-FRR- 001 – 2023, FECHA INICIO: 20/11/2023, FECHA DE FINALIZACION: 29/11/2023
CRISTHIAN GERMAN GALAN NOVOA. CPS- FRR- 001 – 2023, FECHA INICIO: 20/11/2023, FECHA DE FINALIZACION: 29/11/2023
YURIBEL VARGAS FIGUEROA. CPS- FRR- 002 – 2023, FECHA INICIO: 20/11/2023, FECHA DE FINALIZACION: 29/11/2023
JOHAN SEBASTIAN CARDENAS SANCHEZ, CPS- FRR- 003 – 2023, FECHA INICIO: 20/11/2023, FECHA DE FINALIZACION: 29/11/2023,

Visitas de verificación:

CARLOS ARMANDO GONZALEZ HERNANDEZ; CPSP-FRR- 002 – 2023, FECHA INICIO: 22/11/2023, FECHA DE FINALIZACION: 29/11/2023
JOHN ALEXANDER LOPEZ MARTINEZ; CPSP-FRR- 003 – 2023, FECHA INICIO: 22/11/2023, FECHA FINALIZACION: 21/12/2023
ANTONIO PEREIRA FONSECA, CPSP-FRR- 004 – 2023, FECHA INICIO: 22/11/2023, FECHA FINALIZACION: 21/12/2023
MILLER ANTONIO RODRIGUEZ NAVARRO; CPSP-FRR- 005 – 2023, FECHA INICIO: 22/11/2023, FECHA FINALIZACION: 21/12/2023
JORGE ARMANDO BARRERA NIETO; CPSP-FRR- 006 – 2023, FECHA INICIO: 22/11/2023, FECHA FINALIZACION: 21/12/2023

ACTIVIDAD No. 1.2

MIGUEL ANDRÉS RAMOS CABALLERO; CPSP-FRR- 001 – 2024, FECHA INICIO: 10/05/2024, **FECHA FINALIZACION:** 09/09/2024
VIGDONIA GUTIERREZ DIAZ; CPSP- FRR- 002 – 2024, FECHA INICIO: 25/05/2024, **FECHA FINALIZACION:** 09/09/2024
OSCAR REYNALDO CADENA CASTRO; CPSP- FRR- 003 – 2024, FECHA INICIO: 10/06/2024, **FECHA FINALIZACION:** 09/09/2024
EDGAR FERNANDO GUIZA SANCHEZ; CPSP- FRR- 004 – 2024, FECHA INICIO: 18/06/2024, **FECHA FINALIZACION:** 09/09/2024

9. Resolver las consultas que formule al contratista y hacer observaciones necesarias. - Las dudas que no pueda absolver deberá remitirlas para consulta y decisión de la secretaria de Desarrollo

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

Económico, Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y/o quien haga sus veces de supervisión con la debida anticipación.

Se ha dado respuesta a las inquietudes presentadas por el contratista, esto se ha hecho a través de los comités técnicos llevados a cabo durante la ejecución del contrato.

10. Remitir oportunamente a la oficina asesora jurídica de la Gobernación de Casanare para aprobación del ordenador del gasto los estudios, modificatorios al contrato, como son, adicional en plazo, actividades complementarias o adicionales o la prórroga al plazo inicial del contrato con la debida justificación, indicando si hay lugar a aplicar o no sanciones.

    Para el presente informe de aval se avaló una prórroga para el día 12 de diciembre del 2023 por un plazo de 3 meses

11. Elaborar y firmar juntamente con el contratista y la supervisión las actas de recibo parciales y final de acuerdo al sistema integrado de gestión MECI-CALIDAD, empleado por el departamento y verificar su adecuado tramite.

    A la fecha del presente informe se avala el informe de cobro de acta parcial No.2

12. Recopilar y condensar toda la información técnica y administrativa con el contratista.

    La interventoria cuenta con archivo en medio digital de la información contractual del contratista.

13. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones que le correspondan con el sistema de seguridad social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF. Y servicio Nacional de Aprendizaje / SENA, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre la materia.

PERSONAL VINCULADO PARA LA SOCIALIZACION					
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. C.C.	CARGO	PERIODO	PLANILLA
1	JORGE ARMANDO BARRERA NIETO	C.C. 74.082.223 expedida en Sogamoso (Boyacá	Profesional	Noviembre de 2023	4548091091
2	CRISTHIAN GERMAN GALAN NOVOA.	C.C. 1.118.550.903 expedida en Yopal (Casanare)	Bachiller.	Noviembre de 2023	4561078274
3	YURIBEL VARGAS FIGUEROA	C.C.1.115.690.563 expedida en Nunchía – Casanare.	Bachiller.	Noviembre de 2023	4561079254
4	JOHAN SEBASTIAN CARDENAS SANCHEZ	C.C. 1.007.765.326 expedida en Yopal (Casanare)	Bachiller.	Noviembre de 2023	4561080139
PROFESIONALES VINCULADOS PARA VISITAS DE VERIFICACION					
5	CARLOS ARMANDO GONZALEZ HERNANDEZ	C.C. 1.118.536.947 de Yopal (Casanare)	Profesional	Noviembre de 2023	4548074529
				Diciembre de 2023	4548114318
				Abril de 2024	4561120041
6	JOHN ALEXANDER LOPEZ MARTINEZ	C.C. 74.753.113 de Aguazul (Casanare)	Profesional	Noviembre de 2023	9459118735
				Diciembre de 2023	9460720915
7			Profesional	Noviembre de 2023	9459633972

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

	ANTONIO PEREIRA FONSECA	C.C. 1.121.896.886 de Villavicencio (Meta)		Diciembre de 2023	9461159667
8	MILLER ANTONIO RODRIGUEZ NAVARRO	C.C. 74.860.171 expedida en Yopal - Casanare	Profesional	Noviembre de 2023	4561120912
				Diciembre de 2023	4561121277
9	JORGE ARMANDO BARRERA NIETO	C.C. 74.082.223 expedida en Sogamoso (Boyacá	Profesional	Noviembre de 2023	4548091091
				Diciembre de 2023	4548091547

ACTIVIDAD 1.2

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. C.C.	CARGO	PERIODO	PLANILLA
1	MIGUEL ANDRÉS RAMOS CABALLERO	C.C. 1.115.915.447 de Tauramena (Casanare)	Profesional	Mayo de 2024	4561124357
				Junio de 2024	4561125124
				Julio de 2024	4561126325
2	VIGDONIA GUTIERREZ DIAZ	C.C. 33.646.598 de Aguazul (Casanare)	Profesional	Mayo de 2024	4561138552
				Junio de 2024	4561138935
				Julio de 2024	4561139389
3	OSCAR REYNALDO CADENA CASTRO.	C.C. 1.102.716.019 de San Vicente de Chucuri (Sant)	Profesional	Junio de 2024	4561129367
				Julio de 2024	4561129766
4	EDGAR FERNANDO GUIZA SANCHEZ	C.C. 17.415.339 expedida en Acacias (Meta)	Profesional	Junio de 2024	4561130594
				Julio de 2024	4561130934

14. Exigir que la calidad de los bienes entregados y/o de los servicios prestados se ajusten a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas pertinentes y las características y especificaciones estipuladas en los contratos y/o concertados a través de actas con la secretaria de Desarrollo Económico, Agricultura, Ganaderia y Medio Ambiente y/o quien haga sus veces de supervisión.

    A corte del presente informe se viabilizo los ingresos a almacén departamental según la solicitud presentada por el contratista, dichos ingresos fueron verificados por el profesional de la Interventoría, el Dr Herley Cáceres, verificando que los elementos a ingresar a almacén -departamental cumplen las especificaciones técnicas acorde a lo contemplado en el contrato, se han verificado las salidas de estos insumos al igual que la producción del material vegetal CLON 51, este material vegetal ya ha sido aprobado y cumple con las medidas sanitarias según profesional enviado por el INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA

15. Realizar la liquidación dentro de los términos legales o contractuales estipulados en los contratos de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1.993 y la Ley 1150 de 2.007 informando los pagos efectuados al contratista, los saldo a favor del mismo y/o del departamento de Casanare.

    Esta actividad se realizará en el momento que se requiera.

16. Elaboración de informes periódicos mensuales, los cuales deben contener de acuerdo a la información disponible, aspectos importantes como: Información de los contratos bajo interventoría •

Información financiera del contrato. • Descripción de las obligaciones ejecutadas. • Cronograma de actividades. • Avance físico y real de la ejecución de los contratos. • Informe de equipo y personal • Programa de inversiones • Dificultades presentadas durante el periodo y determinaciones tomadas. • Estado del contrato y pólizas • Alertas • Control a la afiliación y pagos al personal de contratistas al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales (articulo 50 de la Ley 780 de 2002 y articulo 1° Ley 828 de 2004). Información del contrato de interventoria: • Información del contrato • Actividades desarrolladas por interventoria • Personal y equipo • Porcentaje de ejecución • Estado del contrato y pólizas • Comentarios • Registros fotográficos • Anexos • Actas suscritas durante el periodo • Oficios y demás documentos generados durante el periodo.

A la fecha el contratista ha presentado 6 informes mensuales y un informe de acta parcial No.1 y 1 informe para cobro de acta parcial No. 2; Asi mismo la interventoria ha radicado 7 informes mensuales y 6 informes para Gesproy. Y 1 informe para de acta parcial No. 1

16.3. ASPECTO LEGAL

1. Deberá velar porque se reporte en forma oportuna toda la información que la entidad requiera a fin de mantener el estado y avance del contrato objeto de interventoria; así mismo atender cualquier alerta, requerimiento, sanción, hallazgo o plan de mejora que llegare a incurrir al Departamento-secretaria de Desarrollo Económico, Agricultura, Ganaderia y Medio Ambiente con ocasión al incumplimiento, falta u omisión por parte del contratista o que afecte la ejecución del plan de intervenciones colectivas departamental .

   A la fecha el contrato se ha venido realizando dentro de parámetros normales, Se reporto las afectaciones de las actividades alterando los tiempos de las programaciones y reprogramando de nuevo

2. Manifestar sobre la viabilidad de modificaciones que se realicen, velando por el cumplimiento de la normatividad aplicable a las intervenciones y acciones contratadas Resolución 3280 de 2018, Resolución 518 de 2015 y demás.

   A la fecha del presente informe se ha venido velando por el cumplimiento de la normatividad aplicable a las intervenciones y acciones contratadas Resolución 3280 de 2018, Resolución 518 de 2015 y demás.

16.4. ASPECTO TÉCNICO:

1. Elaborar un plan de seguimiento al desarrollo de las actividades programadas por el contratista.

   Para las entregas de insumos y equipos efectuadas, han venido enviando programación para el respectivo acompañamiento. Al igual que el material vegetal y las actividades de establecimiento del forraje.

2. Revisar, ajustar y aprobar las fichas técnicas para la verificación del cumplimiento de las actividades programadas por el contratista en ejecución del contrato.

   A la fecha no se ha realizado ajuste de fichas técnicas, se está trabajando con las que están en la propuesta.

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

3. Realizar visitas de campo aleatorias para la verificación de las actividades programadas por el contratista en ejecución del contrato.

   La interventoría ha realizado el acompañamiento y seguimiento aleatorio a las actividades ejecutadas por el contratista en campo.

4. Conceptuar sobre el planteamiento de alternativas de solución con el contratista cuando se presenten dificultades para llevar a cabo alguna(s) actividad(es) programada(s), mediante actas de concentración entre las partes.

   El día 26 de junio de 2024 mediante correo electrónico llega una solicitud de cambio de predio del señor JUAN CARLOS PULIDO por causa de cancelación de contrato en el predio con el que paso papeles, en comité técnico del 27 de junio se conceptuó el tema y se dio solución

5. Validar la información presentada por el contratista en la presentación de informes parciales de ejecución de actividades e informe final. Proyectar y tramitar las actas de pago parcial y acta de liquidación final del contrato, verificando detalladamente el cumplimiento de las actividades contratadas.

   Se validan 6 informes de mensuales de actividades y el pago de acta parcial No. 1 presentada por el contratista y se valida en el presente informe de aval para acta parcial No.2.

6. Mantener informado al departamento a través de la supervisión delegada por la secretaria de Desarrollo Económico, Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de los avances físicos y financieros de los recursos contratados.

   A la fecha de corte del presente informe se ha enviado 6 informes de ejecución físico financieras para los reportes a las plataformas de Gesproy y Ciresi.

7. Generar los informes administrativos, financieros y técnicos solicitados por el departamento o entes de control, de las acciones en relación a los contratos intervenidos.

   A la fecha no han solicitado informes por parte de estas entidades.

8. Verificar junto con la supervisión la entrega de los insumos utilizados para la ejecución de la actividad incluyendo los elementos de protección personal, que correspondan a las cantidades y calidad requerida para la ejecución de la actividad, garantizando el cumplimiento del protocolo de bioseguridad por parte de todo el personal.

   La interventoría realiza la verificación, seguimiento y acompañamiento para la entrega de insumos y material vegetal a los beneficiarios del proyecto. Así mismo se hizo verificación de los insumos a ser ingresados a almacén Departamental, verificando que cumplen con las especificaciones técnicas del contrato, también que se cuente con los EPP en el momento de su manipulación.

9. Verificar que se cumpla con las especificaciones técnicas requeridas o concertadas.

   Se cumple con las especificaciones técnicas requeridas por la minuta.

10. Hacer los requerimientos necesarios ante la detección de incumplimiento por parte del contratista.

    Se ha hecho requerimientos de programaciones de actividades de campo

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

11. Realizar apoyo técnico a las veedurias que se conformen en el desarrollo del contrato o rendir los informes que le sean requeridos por la administración incluyendo informes del producto de los objetos contratados y aquellos que se hayan establecido en el contrato, dichos informes deben ser entregados cumpliendo con la tabla de retención documental para archivo, dispuesta mediante la ley general de archivo (5942 de 2000 y decreto 4124 de 2004).

    A la fecha no se ha presentado veedurías para el contrato. La interventoria esta presta a dar la información que requieran en su momento.

12. El interventor tendrá que verificar la concertación del uso y manejo de los CREDITOS INSTITUCIONALES Y DERECHOS DE AUTOR, las partes de común acuerdo establecen que respetaran los derechos de autor, de propiedad intelectual e industrial establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Ley 719 de 2001 y decreto 1721 de 2002 y demás disposiciones complementarias así como las actividades que requieren de aprobación y concertación de la secretaria de Desarrollo Económico, Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente o Abstenerse de suscribir documentos y dar órdenes verbales al contratista que modifiquen o maltraten las decisiones inicialmente pactadas en los contratos siendo de competencia de quien suscribe el mismo, para lo cual deberán informar lo pertinente a la secretaria de Desarrollo Económico, Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y/o quien haga sus veces de supervisión, con el fin de proyectar y tramitar los actos respectivos.

    A la fecha no se ha recibido solicitud de dichos créditos.

16.5. ASPECTO FINANCIERO Y CONTABLE

1. Revisar y tramitar ante la oficina o dependencia del departamento donde corresponda, las solicitudes de pago formuladas por el contratista y llevar un registro cronológico de los pasos, y ajustes y deducciones efectuados.

    A la fecha del presente informe se revisa y tramita el informe de cobro acta parcial No. 2 del contrato 1987 de 2023

2. Verificar que el contrato esté debidamente soportado con los recursos presupuestales requeridos y en este sentido informar o solicitar a quien corresponda a fin de obtener los certificados de disponibilidad, reserva, y registro cuando se requiera.

    La interventoría verifico que la contratista cuenta con un C.D.P. por valor de $7.132.362.500 y No.23000207 Así mismo verifico que cuentan con R.P. por valor de $7.132.362.500 y No.2301987

3. Proyectar y tramitar las actas de pago parcial y acta de liquidación final del contrato, verificando detalladamente el cumplimiento de las actividades contratadas definiendo claramente los valores a cancelar, discriminando las fuentes de los recursos.

    A la fecha del presente informe se revisa y tramita el informe de cobro acta parcial No. 2 del contrato 1987 de 2023

4. Presentar los informes de ejecución y avances financieros que sean requeridos por el supervisor o las entidades de control.

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

Se presentará la información financiera que requiera la entidad o los entes de control. A la fecha se han presentado 6 informe para el reporte a Gesproy y 6 informes mensuales por parte de la interventoría.

16.6. ASPECTOS AMBIENTALES

1. Coordinar la Reunión Técnicas a los predios a intervenir.

   El contratista realizo el proceso de socialización en cada uno de los municipios objeto de intervención, donde les dejaron claro a los posibles beneficiarios las actividades que deben realizar para dar cumplimiento al contrato.

2. Exigir al Contratista el cumplimiento de todas las normas sobre seguridad y salud en el trabajo del personal a su cargo.

   Se exige al contratista el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo para el personal que requiera el contrato y el pago del ARL

3. Asegurar la calidad del objeto del contrato intervenido, mediante una acción proactiva. Para el caso concreto, su intervención exige la revisión, vigilancia de los servicios prestados por el contratista intervenido, verificar su cumplimiento de conformidad a los requerimientos técnicos, ambientales, legales, contables, jurídicos y financieros contractuales y del servicio público contratado establecido en los pliegos de condiciones y en el contrato.

   Se exige y se da cumplimiento a lo requerido.

4. Verificar de acuerdo con la naturaleza del contrato que se cumplan a cabalidad las normas técnicas de protección al medio ambiente.

   Se verifica que al realizar la intervención de los predios, el contratista cumpla con las normas ambientales.

5. Realizar el control ambiental y verificar el cumplimiento de todas las normas condicionantes, actividades y procesos recomendados en la, normatividad ambiental.

   Se verifica y se solicita al contratista el cumplimiento de las normas ambientales y la recomendación a los usuarios de estas.

6. Resolver las consultas e inquietudes de las comunidades con respecto al manejo ambiental del proyecto.

   A la fecha no se han presentado consultas por parte de las comunidades.

7. Efectuar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que las ejecuciones de las obras se enmarquen dentro de los requerimientos ambientales, y que sus resultados correspondan a los esperados, y diseñar o recomendar los correctivos necesarios.

   Se ha venido dando seguimiento y acompañamiento y hasta la fecha las ejecuciones realizadas están dando los resultados esperados, sin embargo, por cuestiones de clima se han visto retrasos en el cronograma.

17. AVANCE FÍSICO - FINANCIERO DE LA INTERVENTORIA

	AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA					
MESES CONTRATADOS	PRÓRROGA No.1	MESES EJECUTADOS	VALOR CONTRATO	% FISICO MENSUAL	% FISICO EJECUTADO	VALOR EJECUTADO
6	2	5 MESES y 21 DÍAS	$ 45.906.278,00	0,75	95,00%	$ 435.010.964

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

PERSONAL	No	SUELDO MES	DIAS	TIEMPO MES	TIEMPO EFECTIVO	PRIMA	VR. BASICO	F.M.	VR. PARCIAL	ejecucion financiera del 14 de septiembre al 30 de SEPTIEMBRE DE 2023	ejecucion financiera del 1 de octubre al 30 de octubre de 2023	EJECUCIÓN FINANCIERA DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	EJECUCIÓN FINANCIERA DEL 1 DE DICIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2023	EJECUCIÓN FINANCIERA DEL 18 DE ABRIL DE 2024 AL 30 DE ABRIL DE 2024	EJECUCIÓN FINANCIERA DEL 1 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2024	EJECUCIÓN FINANCIERA DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024	ACUMULADO TOTAL
PERSONAL PROFESIONAL																	
Un Profesional Categoria 6	1	$ 4.639.999,1		6,00	100,0 %		$ 27.839.994,78	2,32	$ 64.588.788	$ 6.100.052	$ 10.764.797,98	$ 10.764.797,98	$ 7.535.358,59	$ 4.664.745,79	$ 10.764.797,98	$ 10.764.797,98	$ 61.359.348,50
Dos (2) Profesionales Categoria 6	2	$ 4.640.000,00		6,00	100,0 %		$ 55.680.000,00	2,32	$ 129.177.600,00	$ 12.200.107	$ 21.529.600,00	$ 21.529.600,00	$ 15.070.720,00	$ 9.329.493,33	$ 21.529.600,00	$ 21.529.600,00	$ 122.718.720,00
Un (1) Profesional Categoria 8	1	$ 3.480.000,00		6,00	50,0 %		$ 10.440.000,00	2,32	$ 24.220.800,00	$ 2.287.520	$ 4.036.800,00	$ 4.036.800,00	$ 2.825.760,00	$ 1.749.280,00	$ 4.036.800,00	$ 4.036.800,00	$ 23.009.760,00
Un (1) Profesional Categoria 8	1	$ 3.480.000,00		6,00	50,0 %		$ 10.440.000,00	2,32	$ 24.220.800,00	$ 2.287.520	$ 4.036.800,00	$ 4.036.800,00	$ 2.825.760,00	$ 1.749.280,00	$ 4.036.800,00	$ 4.036.800,00	$ 23.009.760,00
PERSONAL ADMINISTRATIVO																	
Secretaria 1	1	$ 1.740.000,00		6,00	100,0 %		$ 10.440.000,00	2,32	$ 24.220.800,00	$ 2.287.520	$ 4.036.800,00	$ 4.036.800,00	$ 2.825.760,00	$ 1.749.280,00	$ 4.036.800,00	$ 4.036.800,00	$ 23.009.760,00
					G												
					TOTAL COSTOS DE PERSONAL				**$ 266.428.787,89**	**$ 25.162.718,86**	**$ 44.404.797,98**	**$ 44.404.797,98**	**$ 31.083.358,59**	**$ 19.242.079,13**	**$ 44.404.797,98**	**$ 44.404.797,98**	**$ 253.107.348,50**
2. COSTOS DIRECTOS																	
CONCEPTO	**UND**	**VALOR**	**DIAS**	**TIEMPO MES**	**TIEMPO EFECTIVO**	**CANT**	**VR. PARCIAL**										
Transporte																	
vehiculos tipo campero PC KUP, camioneta o similar, con cilindraje desde 2000 cc hasta 2999 cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustibleValor Mensual $ 9.000.000	2	9.000.000,00		6,00	100,0 %	2,00	$ 108.000.000,00			$ 10.200.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	$ 12.600.000,00	$ 7.800.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	$ 102.600.000,00
Elaboracion y procesamiento de fotografias	1	780.360,00		6,00	100,0 %	1,00	$ 4.682.160,00			$ 442.204,00	780.360,00	780.360,00	$ 546.252,00	$ 338.156,00	780.360,00	780.360,00	$ 4.448.052,00
Aquiler de oficina	1	947.374,00		6,00	100,0 %	1,00	$ 5.684.244,00			$ 536.845,27	947.374,00	947.374,00	$ 663.161,80	$ 410.528,73	947.374,00	947.374,00	$ 5.400.031,80

CARRERA 17 No. 14-11
Email. consorciointerforrajes@gmail.com
CEL. 3134489057
Aguazul Casanare

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 118.366.404,00	$ 11.179.049,27	$ 19.727.734,00	$ 19.727.734,00	$ 13.809.413,80	$ 8.548.684,73	$ 19.727.734,00	$ 19.727.734,00	$ 112.448.083,80	
									0.00	
3. COSTOS DE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS	$ 384.795.191,89	$ 36.341.768,12	$ 64.132.531,98	$ 64.132.531,98	$ 44.892.772,39	$ 27.790.763,86	$ 64.132.531,98	$ 64.132.531,98	$ 365.555.432,30	
									$ 69.455.532,14	
4. IVA 19.00%	$ 73.111.086,46	$ 6.904.935,94	$ 12.185.181,08	$ 12.185.181,08	$ 8.529.626,75	$ 5.280.245,13	$ 12.185.181,08	$ 12.185.181,08	$ 69.455.532,14	
									$ -	
5. COSTO FINAL	$ 457.906.278,35	$ 43.246.704,07	$ 76.317.713,06	$ 76.317.713,06	$ 53.422.399,14	$ 33.071.008,99	$ 76.317.713,06	$ 76.317.713,06	$ 435.010.964,43	
5. COSTO FINAL (AJUSTADO AL PESO)	$ 457.906.278,00	$ 43.246.704,00	$ 76.317.713,00	$ 76.317.713,00	$ 53.422.399,00	$ 33.071.009,00	$ 76.317.713,00	$ 76.317.713,00	$ 435.010.964	
		9,44%	16,67%	16,67%	11,67%	7,22%	16,67%	176,47%	95,00%	

CARRERA 17 No. 14-11
Email. consorciointerforrajes@gmail.com
CEL. 3134489057
Aguazul Casanare

1351

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

18. COMITÉS TÉCNICOS

LUGAR:	Despacho Oficina Dirección Rural	**FECHA:** 07-05-2024
OBJETIVO:	Comité de preselección y selección de Usuarios	

AGENDA/ACTIVIDADES

1. Presentación del representante del Consejo Departamental de Planeación del Sector Pecuario.
2. Presentación por parte del contratista del proyecto

DESARROLLO: Se dio inicio al comité interinstitucional de preselección y selección de beneficiarios y/o usuarios al proyecto en la cual se inició en compañía con el representante del CODEPLA, supervisión, contratista e interventoría, donde el contratista realiza una socialización del avance del proyecto al representante Legal del Consejo Departamental de Planeación del Sector Pecuario, Carlos Madrid, el contratista presenta avance de usuarios preseleccionados y seleccionados por Municipio.

Ítem	Municipios	No. De cupos por municipio	No. Productores seleccionados	No. Cupos por seleccionar	No. Carpetas presentadas para revisión
1	AGUAZUL	50	47	3	4
2	MANI	50	48	2	2
3	TAMARA	15	14	1	
4	TAURAMENA	35	23	12	4
5	VILLANUEVA	25	23	2	
TOTAL		**175**	**155**	**20**	**10**

Total, de usuarios seleccionados 155 y pendientes 20 usuarios, en la cual a la fecha presenta el contratista carpetas para revisión; Aguazul: 4, Maní: 2, Tauramena: 3, para un total de 9 carpetas. Se realiza la respectiva revisión de las carpetas de Aguazul, donde se selecciona un (1) beneficiario y se devuelven dos (2) carpetas para completar documentación y se considera No Viable una carpeta por uso de suelo, seguidamente se presentan 2 carpetas (usuarios) del municipio de Maní, las cuales son preseleccionadas para la respectiva visita técnica.

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

Se revisan cuatro (4) carpetas de Tauramena, de lo cual se selecciona una (1) carpeta y las tres (3) restantes quedan pendientes de subsanar documentación.

Total de carpetas seleccionadas; 2 carpetas (1 Aguazul, 1 Tauramena), pendientes para selección 18.
Teniendo en cuenta el consolidado quedaría pendiente 18 carpetas (2 Aguazul, 2 Maní, 1 Támara, 11 Tauramena y 2 de Villanueva).

Compromisos:

El contratista se compromete a presentar las respectivas carpetas para el viernes 24 de mayo de 2024.

REGISTRO FOTOGRAFICO





CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

LUGAR:	Sala De Juntas Dirección De Desarrollo Rural	**FECHA:** 20-05-2024
OBJETIVO:	Seguimiento contratos 1987 de 2023 y de interventoría el 2023 de 2023	

AGENDA/ACTIVIDADES

1. Intervención del doctor Cristian Cifuentes, director de desarrollo rural
2. Intervención del RL Fundación Creo País
3. Revisión por miembros del comité los usuarios a seleccionar y a preseleccionar
4. Intervención de interventoría
5. Proposiciones y Varios

DESARROLLO:

1. El doctor Cristian director de desarrollo rural da la bienvenida a los miembros del comité y solicita que se realice cumplimiento de todas las actividades dentro de los tiempos dados que se generó un PAC por el DNP, por las suspensiones y que sin duda esto hará que se reprograme el horizonte del proyecto así mismo se solicita que presente el cronograma semanal para poder hacer acompañamiento a la ejecución de actividades de establecimiento

2. El ingeniero Gerardo Guerrero presenta informe de ejecución así:

- Entrega de insumos: Cal 106 – Insumos 87
- Mecanización: 14 Aguazul
- Usuarios seleccionados: 157 para seleccionar 18
- Usuarios para seleccionar: 4
- Usuarios para preseleccionar: 0
- Se recibe informe de los usuarios caracterizados para seleccionar:

Presentan 4 completas: 2 de Maní y 2 Aguazul y para preselección 6 del municipio de Tauramena, los 3 que se habían aprobado para completar la documentación. No allegaron documentación: Pedro Calixto, William López, Gonzalo Marín

Aguazul	48	2 x Seleccionar	2	
Maní	48	2 x Seleccionar	2	
Tamara	14	1 x Seleccionar		1
Tauramena	24	11 x Seleccionar		11
Villanueva	23	2 x Seleccionar		2
	157		Por completar	14

Son 157 usuarios seleccionados y para el comité de hoy se suman 4 carpetas más a seleccionar.
Se revisan las 6 carpetas del municipio Tauramena:

- Jorge Luis Enciso
- Pedro Nel Ávila
- Oscar Daniel Garzón
- Lina Belén Becerra
- Rafael Perdomo

Se hace revisión de la documentación encontrando que todos cumplen con documentos pero Deben actualizarlos dado que son de diciembre las fechas.

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

- El doctor Cristian en calidad de supervisor solicita que tanto el apoyo a la supervisión como la firma de interventoría y contratista presentan la documentación y soportes de informes tanto del mes como gesproy para poder contar con la información a tiempo y poder subir a las plataformas que se requiere por el departamento nacional de planeación y demás entes que lo soliciten.
- Se solicita a Fundación Creo País la reprogramación acorde a la suspensión y la prorroga
- Se solicita que presenten cronogramas diarios y semanal de las actividades
- Se realizó verificación de carpetas, pero no hay selección dado que el miembro del CODEPLA no asistió
- Presentar informes con corte al 30 de cada mes

COMPROMISOS:

- Se cita para el 30 de mayo Comité de Seguimiento, preselección y selección
- Citar Codepla de parte de supervisión Hora 9 A.M

REGISTRO FOTOGRAFICO






6626

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

LUGAR:	Sala De Juntas Dirección De Desarrollo Rural	**FECHA:** 30-05-2024
OBJETIVO:	Seguimiento del contrato 1987 y 2323 de 2023 de 2023 y selección y preselección usuarios	

AGENDA/ACTIVIDADES

1. Intervención de la supervisión del doctor Cristian Cifuentes
2. Intervención del Apoderado Creo País
3. Intervención de interventoría
4. Verificación de carpetas para selección y para preselección – presentación informes - ingresos
5. Proposiciones y varias – cronograma – visitas

RESUMEN DEL COMITÉ

1. El doctor Cristian director de desarrollo rural da la bienvenida a todos los asistentes del comité y solicita se realice en el tiempo y a tiempo cada una de las actividades y poder dar cumplimiento a todo el proceso a cada uno de los predios a ser intervenidos
2. El apoderado expone que en lo referente que refiere para asunto de carpetas a suplir cupos faltantes. Se realizó la recepción de carpetas para el día de hoy se presentan 14 carpetas para que sean verificados y que para el día de hoy se tiene ejecución así:
    - Entrega de insumos – 136 Se anexa copia de entrega a los usuarios
    - Entrega de equipos – 136
    - Cronograma preparación – 18
    - Cronograma entrega semilla – 31 mayo
    - Cronograma de siembras – 31 mayo

❖ Las 4 carpetas a seleccionar en características se tienen:
- Aguazul 2
- Maní 2

Entregas insumos	Equipos	Preparados
48 de Aguazul	X	18
47 de Maní	X	-
7 de Tamara	X	-
20 de Villanueva	X	-
14 de Tauramena	X	-

En lo referente a las siembras ya la empresa presenta record de visitas de fecha 27 de mayo de 2024 con concepto del ICA donde indica que el pasto de cortes para agropecuaria la fe tiene 37 hras establecidas y listas en condiciones fito sanitarias. Se observan en óptimas condiciones.

❖ Cronograma para preparación de terrenos y cronograma de siembras, la supervisión solicita que los cronogramas sean con mucha firmeza para que abran frentes de trabajo que permitan ampliar y avanzar al máximo la implementación de los proyectos en cada predio de cada municipio

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

- Fundación Creo País informa que para el día de hoy radica, y de igual forma la solicitud para viabilidad de ingresos a Almacén Departamental de pasto de corte
- Los 4 usuarios a seleccionar
  - Nasly Tarache – Maní – Cumple con todo
  - Johan Walteros – Maní – Cumple con todo
  - Mirta Ballesteros – Aguazul – Cumple con todo
  - Fundación Yovanny Quevedo – Aguazul – Cumple con todo
- Carpetas a preseleccionar
  - Lina Belén Becerra – Tauramena
  - Jorge Armando Rojas – Tauramena
  - Aulí Moreno – Tauramena
  - María de Jesús Torres – Tauramena
  - José Reyes Toro – Tauramena
  - Carlos Daniel Encizo – Tauramena – Actualizar contactos
  - Carmen Rosa Torres – Tauramena – Actualizar fechas
  - Rafael Perdomo – Tauramena – Actualizar Fechas
  - Diomedes Cepeda – Tauramena – Actualizar Fechas
  - Pedro Nel Ávila – Tauramena – Actualizar Documentos
  - José Luis Calixto – Tauramena – Actualizar Documentos

  Total preseleccionados 11 del municipio de Tauramena, para la reunión de selección debe contar con el total de documentos actualizados para selección el próximo jueves 6 de Junio
  - Henry Ortiz Sánchez – Villanueva – Actualizar Documentos
    Actualizar las caracterizaciones

3. La supervisión solicita que radiquen la solicitud y viabilidad para ingresos a almacén departamental, se coordina la visita para ir al vivero a verificar el material y hacer un aforo, acorde al concepto de record de visita al municipio de Maní donde tienen las 37 hectáreas de pasto de corte Clon 51, así mismo los ingresos se hacen para semilla de pasto de corte Clon 51 acorde al cronograma y preparación de terrenos.
   Se realiza concertación para hacer visita a verificación y peso de cada esqueje de 70 centímetros máximo 75 centímetros; el almacenista informa que todo lo deben radicar y mañana 31 de mayo se realiza visitas al vivero

- La interventoría y supervisión dejan constancia que el miembro del Codepla se le notificó por escrito para el comité de hoy y vía telefónica no contesto

COMPROMISOS:

1. Entregar cronograma y planes de trabajo para preparación tierras, siembras e ingresos – creo país
   - Cronograma de entregas de insumos – Creo País
   - Entrega de informes – contratista – interventoría – Supervisión


REGISTRO FOTOGRAFICO

6678

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

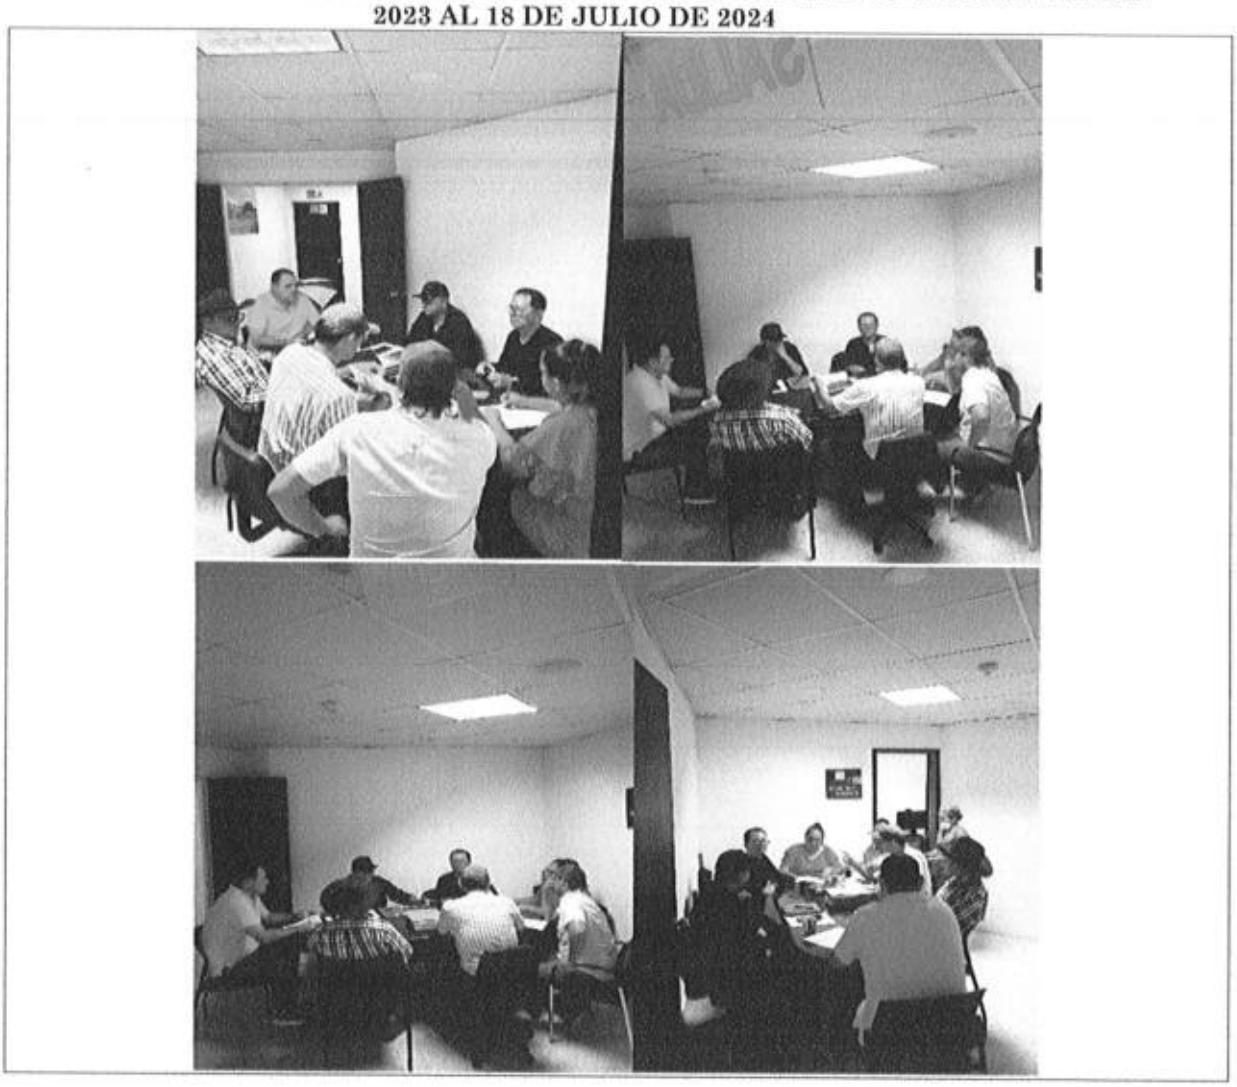

LUGAR:	Sala de juntas Dirección Desarrollo Rural.	**FECHA:**	27/06/2024

CARRERA 17 No. 14-11
Email. consorciointerforrajes@gmail.com
CEL. 3134489057
Aguazul Casanare

6679

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

OBJETIVO:	Seguimiento del contrato 1987 y 2023 de 2023

AGENDA/ACTIVIDADES

3. Intervención de la supervisión.
4. Intervención del apoderado creo país.
5. Intervención del codepla.
6. Intervención de interventoria.
7. Verificación de carpetas.

DESARROLLO: 1. El doctor Cristian Cifuentes da la bienvenida a todos los asistentes del comité y solicita puntualidad con los informes de actividades y se termine la selección y preselección de beneficiarios teniendo en cuenta que el contrato se termina el 9 de septiembre de 2024.

2. El Contratista presenta al comité las siguientes carpetas para selección:

- Municipio de tauramena
- Jorge Luis Calixto Arias
- Lina Belen Becerra Estrada
- Pedro Nel Avila Rincon
- Jose Reyes Toro Sanchez
- Carlos Daniel Encizo Tovar
- Rafael Perdomo Martinez

Hoy se seleccionaron 6 carpetas, quedando pendientes 6 por seleccionar, faltando proceso de caracterización y elaboración de diagnostico.

3. Municipio de villanueva, el contratista manifiesta según oficio tecnado 24 de mayo, enviado al correo de la Dirección en interventoria, en el cual solicita cambio de predio teniendo en cuenta que la persona que le arrendo el predio le cancelo el contrato, el mismo propone un nuevo predio en la vereda caiman Alto. Respecto a esa solicitud de interventoria manifiesta que el beneficierio presente una nueva carpeta con la documentación y el comité de preselección y selección se aprobó por unanimidad la solicitud del beneficiario, dando un tiempo perentorio de 8 dias habiles, para allegar la carpeta con ls requisitos del nuevo predio a intervenir.

4. El contratista aporta las siguientes carpetas para preselección.

- Diber Vargas Amaya – Tauramena
- Rafael Antonio Martinez Perez – Tamara
- Abraham Arevalo Arroyave – Villanueva

5. Se establece como fecha del ultimo comité de selección de carpetas el jueves 4 de julio de 2024 a las 2:30 p.m. para el cierre definitivo de la base social y posterior publicación del acto administrativo el cartelera.

6680

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

Presentar informe o reprogramación de actividades de Gesproy maximo el día martes 2 de julio y el informe mensual de actividades.

REGISTRO FOTOGRAFICO









Comité interinstitucional de preselecion y selección de usuarios

LUGAR:	Sala de juntas Dirección Desarrollo Rural.	**FECHA:** 04/07/2024

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

OBJETIVO:	Seguimiento del contrato 1987 y 2023 de 2023

AGENDA/ACTIVIDADES

8. Intervención de la supervisión.
9. Intervención del apoderado creo país.
10. Intervención del codepla.
11. Intervención de interventoria.
12. Verificación de carpetas.

DESARROLLO: El comité técnico se desarrollo de la siguiente manera:

El doctor Cristian da la bienvenida a los asistentes, el contratista informa que a la fecha se cuenta con 167 seleccionados así:

Comité del 30 de noviembre de 2023, 53 seleccionados.

Comité del 5 de diciembre de 2023, 38 seleccionados

Comité del 7 diciembre de 2023, 47 seleccionados.

Comité del 11 de diciembre de 2023, 17 seleccionados.

Comité del 7 de mayo de 2024, 2 seleccionados.

Comité del 30 de mayo de 2024, 4 seleccionados.

Comité del 27 de junio de 2024 6 seleccionados.

Que a la fecha se han presentado los seleccionados por municipio así: 14 seleccionados del municipio de Támara de 15 que se deben seleccionar, de Aguazul 50 seleccionados de 50 en Total.

Maní 50 seleccionados de 50 que son en total. De Tauramena 30 seleccionados de 35 que son el total y Villanueva 23 seleccionados del 25 que son el total. El ingeniero Gerardo informa que se han presentado algunas novedades sobre los usuarios seleccionados así:

Para el municipio de Tauramena el señor Jorge Luis Calixto cuando se le iba a entregar los insumos se le llamó por teléfono para informarle y él respondió que ya no está interesado en el proyecto.

Para el municipio de Aguazul se presentan tres casos de usuarios que ya no cuentan con el terreno, los cuales son: Yadith Silva, María Esperanza Espinel y Mirian García para estos tres casos se programó visita conjunta con Interventoría, supervisión y contratista para evaluar los casos

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

Para el municipio de Villanueva se presenta la novedad para el señor Juan Carlos Pulido quien a través del correo electrónico solicitó cambio de predio y en el comité realizado el día 27 de junio de 2024, se autorizó pero el señor debía actualizar la documentación, por lo que la Fundación lo llamó y el señor informó que no contaba con la disponibilidad de tiempo para sacar papeles por lo tanto desiste del proyecto.

El contratista presenta al comité tres carpetas para hacer selección, se revisa y evalúa el concepto técnico según la visita de caracterización y por unanimidad se aprueban las tres para la implementación de 1 Ha de pasto de corte Clon 51 de la siguiente manera:

Para Tamara un usuario.

Para Tauramena dos usuarios.

Con esta selección se tiene que la fecha la siguiente información: Villanueva 100% de selección 50/ 50. Tamara 100% de selección 15 / 15. Aguazul cuenta con el 100% de seleccionados, pero con tres novedades de posibles retiro. Tauramena se cuenta con el 82% de selección 29/35. Villanueva se cuenta con el 88% de selección 22/25.

En total falta siete productores por seleccionar sin tener en cuenta las tres novedades de Aguazul la Interventoría solicita que se realice la visita conjunta lo antes posible ya que se debe tomar decisiones sobre los tres casos en particular.

La interventoria solicita se presente los informes mensuales y para Gesproy dentro de los tiempos establecidos.

El ingeniero Gerardo presenta el informe de avance de ejecución así:

Aguazul 45 mecanizados 3 en proceso de siembra y 41 sembrados.

Maní 12 mecanizados 12 en proceso de siembra 5 sembrados.

Tamara 6 mecanizados 2 en proceso de siembra 3 sembradas.

Tauramena 17 mecanizados 0 proceso de siembra y 4 sembrados.

Villanueva en proceso de mecanización 8.

Para un total de: 80mecanizados 49 sembrados 11 en proceso de siembra y 11 en proceso de mecanización.

La supervisión presenta preocupación por no contar con el 100% de la base social y solicita que de parte del contratista se realice las acciones necesarias para

conseguir los usuarios faltantes ya que el contrato le quedan dos meses y cinco días de ejecución.

Se da por terminada la reunión y se programa la próxima reunión una vez realicen las visitas conjuntas a los tres usuarios de Aguazul a través de los correos informarán fecha y hora.

Los compromisos presentar cronograma presentar informes a tiempo completar la base Social. A continuación

REGISTRO FOTOGRAFICO





19. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

COMPONENTE 1: IMPLEMENTAR EFICIENTES PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS TÉCNICAS RELACIONADAS CON LA PRODUCCIÓN DE FORRAJE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPÓSITO.

ACTIVIDAD No. 1.1: REALIZAR JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DIRIGIDO A LOS MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN

1.1. ACTIVIDAD No. 1.1: REALIZAR JORNADAS DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DIRIGIDO A LOS MUNICIPIOS OBJETO DE INTERVENCIÓN.

1.1.1. Socialización del proyecto:

Esta actividad ya fue realizada al 100% y entregada en el informe No.1 y en el acta parcial No.1

USUARIOS SELECCIONADOS A CORTE 04 DE JULIO DE 2024

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CEDULA	MUNICIPIO	PREDIO	VEREDA
1	NANCY BARRERA BERNAL	39645823	AGUAZUL	CAMPO REAL-MILAGROSA	ALTAMIRA
2	EMMA DEL CARMEN JARRO AVELLA	24104139	AGUAZUL	LUCHA	ATALAYAS
3	KELLY JOHANA VILLAREAL OSPINO	1065236878	AGUAZUL	LOTE 3 VILLA ISABEL	ATALAYAS
4	ANTHONY LOPEZ OREJUELA	1118562376	AGUAZUL	LOS ANGELES	BELLA VISTA
5	DIEGO ALEJANDRO CALA MARTHA	1118528677	AGUAZUL	LA ESMERALDA	BELLA VISTA
6	FERNANDO BARRERA MONTAÑA	74751202	AGUAZUL	LA REFORMA II	BELLA VISTA
7	KATHLEEN ROJAS CRUZ	1118547801	AGUAZUL	LA ESPERANZA	BELLA VISTA
8	RITA GLADYS MOLANO BARRERA	24228417	AGUAZUL	TRES PALMAS	BELLA VISTA
9	YULIETH GRACIELA CORREA RINCON	31656480	AGUAZUL	EL IMPERIO	BELLA VISTA
10	SANDRA MILENA PEREZ DIAZ	24228920	AGUAZUL	LA DORADA	BELLA VISTA/LLANO LINDO
11	CIELO DEL LLANO MONTAÑA AVELLA	1006441382	AGUAZUL	DESENGAÑO	BELLAVISTA
12	ELISA EUGENIA PEREZ DIAZ	24227251	AGUAZUL	LA ETERNIDAD	BELLAVISTA
13	LEONARDO RAMIREZ VILLALOBOS	79852508	AGUAZUL	MATAPALOS	BELLAVISTA

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CEDULA	MUNICIPIO	PREDIO	VEREDA
14	MARIA ESPERANZA ESPINEL FONSECA	33646428	AGUAZUL	EL DIAMANTE	EL GUAIMARO
15	FREDY GUSTAVO PINTO	74866225	AGUAZUL	SAN DIEGO	ESMERALDA
16	MARLENY SANTIAGO SANCHEZ	68247338	AGUAZUL	BONANZA	ESMERALDA
17	JORGE ELIECER LOPEZ LOPEZ	9523093	AGUAZUL	BUENOS AIRES	ESPERANZA
18	RONNIE HUERTAS SIERRA	74754442	AGUAZUL	VILLA ROSA	GRACIELA
19	ALBA INES PUERTO URINTIVE	47441024	AGUAZUL	EL DIAMANTE	GUAIMARO
20	MARIANO CHAPARRO TOVAR	4193177	AGUAZUL	LOS ANGELES	LA GRACIELA
21	YADITH SILVA WILCHEZ	47440852	AGUAZUL	BUENOS AIRES	LA UNION
22	LEONILDE DIAZ NIÑO	24117365	AGUAZUL	EL ESTERO	LLANO LINDO
23	RUTH CRUZ JARRO	46367417	AGUAZUL	LA ESPERANZA	LLANO LINDO
24	ANDRES ENRIQUE MOLANO RODRIGUEZ	74750178	AGUAZUL	VILLA CAROLA	PALO SOLO
25	CLARA PATRICIA NUÑEZ SALAMANCA	47435371	AGUAZUL	LA VORAGINE	PALO SOLO
26	ERICA LILIANA AVELLA MOLANO	1116542220	AGUAZUL	FUNDO BONITO	PALO SOLO
27	GRACIELA MOLANO BARRERA	1116542557	AGUAZUL	LA MILAGROSA	PALO SOLO
28	HECTOR MANUEL ARIAS VARGAS	74751362	AGUAZUL	TRES ESQUINAS	PALO SOLO
29	ISABEL CRISTINA ACEVEDO YEPES	39522307	AGUAZUL	ATENAS II	RINCON DEL BUBUY
30	JORGE HUGO MONTOYA ACOSTA	74373019	AGUAZUL	SANTA HELENA	RINCON DEL BUBUY
31	PASCUAL GONZALEZ CACERES	74752133	AGUAZUL	ESPERANZA PRIMAVERAL	RINCON DEL BUBUY
32	WILSON BEYER BARRERA CUBIDES	79560296	AGUAZUL	SANTA CECILIA LOTE 2	RINCON DEL BUBUY
33	MARYI DANIT RODRIGUEZ JIMENEZ	1118553070	AGUAZUL	LA ELEGIDA	RIO CHIQUITO
34	WILSON ORLANDO PERILLA	74860017	AGUAZUL	ESMERALDA	RIO CHIQUITO
35	SHIRLEY YAZMIN BULLA MARIÑO	1118534426	AGUAZUL	BELGICA	SALITRE
36	LUZ STELLA CASTRO MACIAS	46372329	AGUAZUL	ILUSION	SALITRICO
37	ANGELA ROCIO NIÑO NEIRA	33645597	AGUAZUL	PA QUE MAS	SAN JOSE DE BUBUY
38	ANYELA LORENA BRAVO BENAVIDES	1053608718	AGUAZUL	LA AMISTAD	SAN JOSE DE BUBUY
39	MARIELA TORRES TORRES	24227735	AGUAZUL	ENVIDIA	SAN LORENZO
40	RENAN GONZALEZ CRISTANCHO	74751203	AGUAZUL	LA ENVIDIA	SAN LORENZO

6686

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CEDULA	MUNICIPIO	PREDIO	VEREDA
41	ANDREA BALLESTEROS MARTINEZ	24228278	AGUAZUL	PARAISO	SAN MIGUEL DE FARALLONES
42	ILBIA MARTINEZ GARZON	28790090	AGUAZUL	BUENOS AIRES	SAN MIGUEL DE FARALLONES
43	ROLFEN CHAPARRO LOPEZ	74343182	AGUAZUL	SAN ANTONIO	SAN MIGUEL DE FARALLONES
44	JORGE ALIRIO DIAZ RODRIGUEZ	74754265	AGUAZUL	LA COTIZA	SAN RAFAEL
45	MIRTA BALLESTEROS MARTINEZ	33645159	AGUAZUL	BRISAS DEL LLANO	SAN RAFAEL
46	MARCO AURELIO SUAREZ	74750567	AGUAZUL	LA BALSORA	SAN RAFAEL
47	FREDY MAURICIO CORREA LOPEZ	74750600	AGUAZUL	VILLA LAURA	SEVILLA
48	FUNDACION YOVANY QUEVEDO LAZOS DE VIDA R.L. LADY JOHANA ROSAS MORENO	33646057	AGUAZUL	ALGARROBO	TESORO BUBUY
49	LUIS HUMBERTO CARDENAS	9651455	AGUAZUL	BUENOS AIRES	TURUA
50	MIRIAM GARCIA PUERTO	24227857	AGUAZUL	YULIMAR	RINCON BUBUY
51	OLGA MARIA JIMENEZ MATEUS	24230828	MANI	LA ARGELIA	AGUALINDA
52	DORIS YANEHT VARGAS TORRES	23725158	MANI	LA GUAIRA	BEBEA
53	AXEL ODILIO ADAN PERANQUIVE	79321492	MANI	TRES PALMAS	BELGRADO
54	EVELIA GARCIA RONDON	40369159	MANI	AÑORANZAS	BELGRADO
55	FLOR STELLA FLOREZ DE ADAN	23724870	MANI	LOS MANANTIALES	BELGRADO
56	JAVIER SAAVEDRA	4121077	MANI	VILLA LOLITA	BELGRADO
57	JOHN SEBASTIAN WALTEROS FLOREZ	1116615340	MANI	BERKELEY	BELGRADO
58	NANCY GARCIA RONDON	23725169	MANI	LOS ZANCUDOS	BELGRADO
59	OLGA MORERI CARREÑO SARMIENTO	23725750	MANI	MATEPALMA	BELGRADO
60	RICARDO PEREZ CABALLERO	80844067	MANI	LA RESERVA LOTE 6 VILLA BONITA	BELGRADO
61	RITA YOLIMA COGUA SALINAS	23466967	MANI	LOS NAPOLES	BELGRADO
62	TITO AGUSTIN PALENCIA GARCIA	1006446548	MANI	ARRENDAJOS	BELGRADO
63	VICTOR ELIAS MORA GAMEZ	74811141	MANI	TRES PALMAS	BELGRADO
64	WILSON PALENCIA GARCIA	74811781	MANI	LOS ALMENDROS	BELGRADO

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CEDULA	MUNICIPIO	PREDIO	VEREDA
65	YESICA ADILFA ADAN GARCIA	1116613116	MANI	VANGUARDIA	BELGRADO
66	FLORENTINO ADAN GARCIA	4156459	MANI	MANANTIALES	BELGRADO
67	OLIVA RONDON DE PEREZ	23724451	MANI	BALALAIKA	BELGRADO
68	GILBERTO SALINAS RINCON	4156467	MANI	LOS CORAZONES	BRISAS
69	JOSE EXEOMO CARDENAS LUNA	74811576	MANI	LA CHARANGA	BRISAS
70	CHELMAN LARA ALFONSO	74795395	MANI	VILLA SOFIA	CHAVINAVE
71	CARLOS ANDRES CHAPARRO MERIDA	74755535	MANI	EL DORADO/SAN SEBASTIAN	CORALIA
72	VICENTE HERNANDEZ DIAZ	9510327	MANI	LA SIBERIA	EL VISO
73	NASLY TARACHE CARREÑO	33481659	MANI	VILLA MARIANA	FRONTERA
74	SEVERO CHAPARRO RIVAS	4156665	MANI	EL PORFIN	GAVIOTAS
75	CAMILO EDUARDO FONSECA MARTINEZ	1118529066	MANI	LAS CAYENAS	GUARIAMENA
76	ORLANDO CHAPARRO MEDINA	74811241	MANI	VENTUARIO	GUAYANA
77	WILLIAM RIVERA NIÑO	4156474	MANI	CONQUISTA	ISLAS
78	REINALDO CARDENAS CARDENAS	4156787	MANI	TELAVIT	LA LLANERITA
79	FLOR ALBA BELLO SIERRA	33448984	MANI	EL TRIUNFO	LAS BRISAS
80	ROSA AURORA ACEVEDO MESA	46356591	MANI	LA ENVIDIA	LAS BRISAS
81	HILDA MARIA MALDONADO BENITEZ	23740684	MANI	LA ESPERANZA	LAS ISLAS
82	IVAN EDUARDO BARRERA RIVERA	74795141	MANI	MIRAFLORES	LLANERITA
83	EFRAIN NOSSA HURTADO	9515060	MANI	LA PONDEROSA	MACUCO
84	EFRAIN NOSSA PARRA	74182182	MANI	LA LEONA	MACUCO
85	ROSARIO ANDREA NOSSA PARRA	46377955	MANI	PASO BARINAS 3	MACUCO
86	BERTULFO GUERRERO CARDENAS	74811162	MANI	PLATA	MARARABE
87	MANFREDY GUERRERO TOVAR	74795730	MANI	DURANIA	MARARABE
88	RIQUELMER GUERRERO BECERRA	74811183	MANI	ACEITES	MARARABE
89	CLAUDIA PATRICIA DIAZ GIL	46376647	MANI	MARKETALIA	MUNDO NUEVO
90	JACKELINE CEBALLOS ROJAS	40316227	MANI	VAIVEN	MUNDO NUEVO
91	LUZ STELLA FLOREZ	23724911	MANI	SAN PASCUAL	MUNDO NUEVO
92	CARLOS ANDRES FONSECA	1116612936	MANI	CAMPO HERMOSO	PASO REAL DE GUARIAMENA

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CEDULA	MUNICIPIO	PREDIO	VEREDA
93	LUIS FRANCISCO BONILLA TEATIN	4156233	MANI	TAMARINDO	PASO REAL DE GUARIAMENA
94	SOFI LORENA MARIN IBAGUE	28182482	MANI	LA BENDICION	PASO REAL GUARIAMENA
95	EDGAR ENRIQUE LEGUIZAMON ALBERTO	1009191	MANI	LA BAHÌA 1	SANTA ELENA
96	EDGAR ENRIQUE LEGUIZAMON TOVAR	7181366	MANI	LA PRIMAVERA	SANTA ELENA
97	GRACIELA TOVAR RAMIREZ	23741710	MANI	LA BAHIA II	SANTA ELENA
98	NELLY PATRICIA LEGUIZAMON TOVAR	1049604590	MANI	LA BAHIA 2	SANTA ELENA
99	GILBER JARBEY SUAREZ MESA	1118530596	MANI	ACAPULCO	SANTA MARIA
100	LUIS ALFONSO TORRES PARAMO	4153275	MANI	ACAPULCO	SANTA MARIA
101	ALEXANDER PORTILLA PEÑALOZA	7365193	TÁMARA	RIÑON	CHITACOTE
102	ELMER ANTONIO BOHORQUEZ BENITEZ	74852906	TÁMARA	BUENA VISTA	CRUZ VERDE
103	FACUNDO ABRIL ESTRADA	7362738	TÁMARA	VILLA LUZ	EL TABLON
104	HEIDY ALEXANDRA TUMAY ANZUETA	1118568095	TÁMARA	GRANJA EL EMUNA	EL TABLON
105	JUAN PABLO CARDENAS SUAREZ	1118535525	TÁMARA	ACAPULCO	EL TABLON
106	MARCO FIDEL SUAREZ	9431201	TÁMARA	ACAPULCO	EL TABLON
107	WILBER NIÑO RODRIGUEZ	7365444	TÁMARA	VILLA MARINA	EL TABLON
108	WILMAN FERNANDO LATRIGLIA ORTIZ	7364275	TÁMARA	GRANJA EMUNA	EL TABLON
109	FREDY ALONSO SARMIENTO QUINTERO	1006635707	TÁMARA	SILENCIO	FRAGUA
110	NOEL PLAZAS ARCINIEGAS	1167077	TÁMARA	GRANJA	LA PICACHA
111	LEYDER ARCADIO PALENCIA NIÑO	9434474	TÁMARA	ESPERAZA	LAJA
112	LUIS ANGEL FUENTES RODRIGUEZ	74852824	TÁMARA	MARBELLA	LAJA
113	YINA KATERINE SILVA PATIÑO	1116042540	TÁMARA	LA SARITA	LAS ISABELAS
114	CARLOS JAVIER BOHORQUEZ BENITEZ	79746466	TÁMARA	PORVENIR	SAN PEDRO
115	RAFAEL ANTONIO MARTINEZ PEREZ	74182028	TÁMARA	LAS MALVINAS	TABLON
116	TARSISIO MORENO VARGAS	74856827	TAURAMENA	NARANJITOS	ACEITE
117	LUZ STELLA MORENO VARGAS	40445104	TAURAMENA	SAN ANTONIO	ACEITE ALTO

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CEDULA	MUNICIPIO	PREDIO	VEREDA
118	JULIETH ANDREA FIGUEREDO MATHEUS	1098788453	TAURAMENA	VILLA JULIETH 1	AGUA BLANCA
119	YAMILE ACEVEDO PERILLA	24230269	TAURAMENA	SURIMENITA	AGUABLANCA
120	JOSE REYES TORO SANCHEZ	74845531	TAURAMENA	REFORMA	CHAPARRAL
121	FABIO NEL LOZANO GONZALEZ	79348468	TAURAMENA	SAN NICOLAS	DELICIAS
122	LUZ ANGELA ARIAS TORRES	24231842	TAURAMENA	EL MIRADOR	DELICIAS
123	PABLO ANTONIO FIGUEREDO RODRIGUEZ	74845265	TAURAMENA	LLANO GRANDE	DELICIAS
124	PEDRO NEL AVILA RINCON	74352153	TAURAMENA	EL DIAMANTE	DELICIAS
125	MARCOLINO RODRIGUEZ CARDENAS	4088055	TAURAMENA	VERGEL	IQUIA
126	ROSA CELIA RODRIGUEZ LEGUIZAMO	23467230	TAURAMENA	VERGEL	IQUIA
127	AMANDA LUCERO LOPEZ VEGA	33625128	TAURAMENA	CAYENAS	JAGUITO
128	CARLOS FABIAN AMAYA ALVARADO	1115914599	TAURAMENA	JORDAN	JAGUITO
129	MARIA CEILA IBAÑEZ CARDOZO	51660068	TAURAMENA	VILLA CAROLA	JAGUITO
130	PEDRO MIGUEL AMAYA LOPEZ	4088252	TAURAMENA	LA VEREMOS	JAGUITO
131	LINA BELEN BECERRA ESTRADA	1096242790	TAURAMENA	EL TESORO	JAGUITO
132	SILVIO HUMBERTO ALVARADO GUERRERO	74845742	TAURAMENA	LOS RECUERDOS DE ELLA	JUVE
133	MARIA LILIA MONTAÑA FERNANDEZ	33625553	TAURAMENA	NAPOLES	PALMAR
134	MIGUEL IDEBRANDO MATEUS MATEUS	19440278	TAURAMENA	VILLA KARINA	RAIZAL
135	RAMON EUCLIDES MORA CONTRERAS	17528083	TAURAMENA	SANTA MARIA	RAIZAL
136	CARLOS DANIEL ENCIZO TOVAR	1006415510	TAURAMENA	ESTRELLA	TUNUPE
137	RAFAEL PERDOMO MARTINEZ	86041716	TAURAMENA	SANTA TERESA	TUNUPE
138	CELIA VARGAS MENDOZA	31016205	TAURAMENA	MANANTIALES	VILLA ROSA
139	NEYLA MARIA MORENO	52097134	TAURAMENA	GUANOTA	VILLA ROSA
140	AUDELIA RODRIGUEZ LEGUIZAMO	23467231	TAURAMENA	ARAUCA	YAGUAROS
141	DIMURIED NIÑO	86073526	TAURAMENA	ARRECIFES	YAGUAROS
142	MELIDA SANCHEZ DE BARRERA	24226151	TAURAMENA	VILLA SOFIA	YAGUAROS
143	PEDRO RAFAEL SARMIENTO PARADA	74795208	TAURAMENA	CAMPO ALEGRE	YAGUAROS
144	CARMEN ROSA TORRES MUÑOZ	23467503	TAURAMENA	EL PARAISO D&C	JUVE
145	DILBER VARGAS AMAYA	74856572	TAURAMENA	ISLA DEL CAJA	PASO CUSIANA

6690

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

ITEM	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CEDULA	MUNICIPIO	PREDIO	VEREDA
146	JOSE ARMANDO SANCHEZ	4165103	TAURAMENA	LA CORDILLERA	CHAPARRAL
147	JOSE RICARDO RICO HERNANDEZ	7063292	VILLANUEVA	EL ROBLE	AEROPUERTO
148	NOHEMI GUTIERREZ BELTRAN	21182416	VILLANUEVA	EL ROSAL	BUENOS AIRES
149	YASMINE MARTINEZ DAZA	1031131009	VILLANUEVA	EL ALCARAVAN	CARACOLI
150	JUAN CARLOS PULIDO BELTRAN	1122649455	VILLANUEVA	ALBANIA	CARIBAYONA
151	IDINAEL RAMOS ALDANA	7060447	VILLANUEVA	BELLAVISTA	COLMENA
152	JEINER LEANDRO RAMOS LOZANO	1118199075	VILLANUEVA	BELLAVISTA	COLMENA
153	MARIA DOLORES SALAZAR NIÑO	21198950	VILLANUEVA	LOS CAMBULOS	EL TRIUNFO
154	HECTOR ANGEL PLAZAS PINEDA	12195119	VILLANUEVA	LOS ALMENDROS	FLOR AMARILLO
155	MARIANA PLAZAS ORTIZ	1118202061	VILLANUEVA	LOS ALMENDROS	FLOR AMARILLO
156	HECTOR MIGUEL PIÑEROS PRIETO	2991007	VILLANUEVA	LOS GUAYABOS	HORQUETON
157	JOSE GABINO BONILLA TORRES	2746602	VILLANUEVA	GUADUALITO	HORQUETON
158	MARIA ANTONIA SALGADO DAZA	39948156	VILLANUEVA	EL BAMBU	HORQUETON
159	MELQUISEDEC TEJADA JIMENEZ	7061192	VILLANUEVA	MIRALINDO	HORQUETON
160	PORFIDIO ORTEGA DAZA	7061676	VILLANUEVA	LA PULGUITA	HORQUETON
161	RAFAEL ANTONIO VARGAS VACA	4077407	VILLANUEVA	LOS GUARATAROS	HORQUETON
162	JAIRO QUELVIS REYES MORENO	11280836	VILLANUEVA	CHICHARRA	HORQUETON
163	SONIA STELLA SOSA FERNANDEZ	52583804	VILLANUEVA	LOS GUAYABOS	HORQUETON
164	FABIAN ENRIQUE MEDINA ROJAS	1118197279	VILLANUEVA	PALESTINA	LECHE MIEL
165	JESUS ENRIQUE MEDINA LOPEZ	4076212	VILLANUEVA	PALESTINA	LECHE MIEL
166	RUBEN DARIO CANO MARQUEZ	17342952	VILLANUEVA	BISMARCKIA	PUERTO MIRIAM
167	CONSUELO DONCEL NIETO	23606482	VILLANUEVA	LA FORTUNA	SANTA ELENA
168	LLIDHI CEBALLOS TOVAR	31016431	VILLANUEVA	ALGARROBO	SANTA HELENA
169	FERNANDO FLORIDO SALAZAR	7061861	VILLANUEVA	VERGEL	TRIUNFO

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

ACTIVIDAD No. 1.2. REALIZAR LA ORIENTACIÓN TÉCNICA A LOS 175 PRODUCTORES BENEFICIARIOS DEL PROYECTO EN COMPETENCIAS RELACIONADAS CON LA PRODUCCIÓN DE FORRAJE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE GANADERIA TIPO DOBLE PROPÓSITO.

Contempla el desarrollo de actividades de Transferencia de habilidades, conocimientos, tecnologías y métodos de producción de forrajes, mediante la estrategia de orientación y acompañamiento técnico, las cuales se deben desarrollar en el lugar de trabajo de cada productor, bajo la metodología "Aprender-Haciendo".

Con corte al presente informe de aval esta actividad se encuentra en proceso de ejecución dado que la empresa presento cronograma para hacer intervención a 150 entregas de materiales y equipos para el desarrollo de actividades

COMPONENTE 2. AUMENTAR LA DISPONIBILIDAD DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO Y COSECHA DE FORRAJE EN LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPÓSITO EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ACTIVIDAD 2.1 IMPLEMENTACIÓN DE BANCOS DE FORRAJE EN 175 UNIDADES PRODUCTIVAS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPÓSITO EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Con el propósito de promover el establecimiento de sistemas de bancos de forraje en 175 unidades productivas de Ganadería doble propósito de los Municipios de Aguazul, Tauramena, Tamara, Maní y Villanueva, se contempla la disponibilidad de medios de producción a través de la entrega de materiales e insumos necesarios para el establecimiento de bancos de forraje y para el desarrollo de cada una de las 8 jornadas de orientación y acompañamiento técnico a cada uno de los productores beneficiarios del proyecto, en las temáticas relacionadas con establecimiento, manejo, cosecha y conservación de forrajes; esto obedece a un proceso integral y que los materiales e insumos se hicieron los procesos de ingresos a almacén Departamental.

2.1.1. INGRESOS A ALMACÉN DEPARTAMENTAL

El día 24 de abril de 2024, se dio viabilidad y se remitió a la supervisión la solicitud de salida de insumos del Almacén Departamental como se describe a continuación:

No.	ESPECIFICACIÓN TECNICA	UNIDAD	CANTIDAD
1	Fertilizante Orgánico para aplicación al suelo granulado bulto de 50 kilos: Nitrógeno Total (N) 1,3%; Fosforo total (P205) 3,1%; Potasio Total (K20) 2%; Calcio (CaO) 10 %; Magnesio (MgO) 1,3%; Azufre Soluble en Hcl (S) 0,5 %; Boro soluble en Hcl (B) 0,01%; Hierro soluble en Hcl (Fe) 1%; Manganeso Soluble en Hcl (Mn) 0,09%; Zinc Soluble en Hcl (Zn) 3,03% Silicio Total (Si02) 25%; Carbono Orgánico Oxidable total C 11%; con registro Ica.	Bulto	5250

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

2	Fertilizante fosforado Granulado (P205 25%, CaO 29%, MgO 6,5%, S 3%, SiO 22%, Zn 0,5%) Bulto de 50 kilos con registro Ica.	Bulto	1050
3	fertilizante mezcla física NPK 28-6-7 + 3%Mg+2%S+0, 15%Cu+0, 15%Zn+0, 15%B Bulto de 50 kilos con registro Ica.	Bulto	875
4	Insecticida de síntesis química Methomyl 216g/l - con Registro ICA.	Litro	525
5	herbicida Atrazina con registro Ica.	Kilogramo	525
6	Picapasto (picadora de alta velocidad para uso de ración diaria o ensilaje con producción mínima de 400 kilos diarios, con motor a gasolina de mínimo 5 hp9).	Unidad	150
7	Ensiladora manual ara bolsa de hasta 60 kilogramos.	Unidad	50

Ingreso 1. Material Vegetal. Anexo. Remisión No. 004 por valor de $ 329.400.000,00 Rut de la Fundación Creo País, Fichas Técnicas, Registro fotográfico de los insumos a ingresar, viabilidad por interventoría y certificado de entrada de bienes almacén

Se realizó la verificación acorde a las especificaciones técnicas y que estas cumplen a satisfacción, entregando las cantidades y valor como se menciona en la siguiente tabla y así como se presenta en la remisión ***No. 004*** expedida por la fundación Creo País. En la cual a la fecha ya están almacenadas en las instalaciones autorizadas por la Gobernación de Casanare y el Almacén Departamental; Donde el almacenista de la gobernación de Casanare, realizo la verificación en campo y viabilidad técnica dada el 30 de mayo de 2024 para su respectiva aprobación y entrada de los siguientes insumos cumpliendo sus especificaciones técnicas. A continuación, se presentan los Insumos, herramientas Agrícolas y su registro fotográfico.

Insumos ingresados a Almacén Departamental.

No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Semilla asexual de pasto de corte -Clon 51- cortada en esquejes de longitud mínima de 75 centímetros, los cuales deben presentar un óptimo estado fitosanitario y contar con mínimo 5 yemas funcionales.	Ton	108

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

Ingreso 2. Material Vegetal. Anexo. Remisión No. 005 por valor de $ 457.500.000,00 Rut de la Fundación Creo País, Fichas Técnicas, Registro fotográfico de los insumos a ingresar, viabilidad por interventoría y certificado de entrada de bienes almacén

Se realizó la verificación acorde a las especificaciones técnicas y que estas cumplen a satisfacción, entregando las cantidades y valor como se menciona en la siguiente tabla y así como se presenta en la remisión ***No. 005*** expedida por la fundación Creo País. En la cual a la fecha ya están almacenadas en las instalaciones autorizadas por la Gobernación de Casanare y el Almacén Departamental; Donde la interventoría realizo la verificación en campo y viabilidad técnica que quedo descrita desde el día 07 de junio de 2024, por parte de almacén para su respectiva aprobación y entrada de los siguientes insumos cumpliendo sus especificaciones técnicas. A continuación, se presentan los Insumos, herramientas Agrícolas y su registro fotográfico.

Insumos ingresados a Almacén Departamental.

No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Semilla asexual de pasto de corte -Clon 51- cortada en esquejes de longitud mínima de 75 centímetros, los cuales deben presentar un óptimo estado fitosanitario y contar con mínimo 5 yemas funcionales.	Ton	150

Ingreso 3. Material Vegetal. Anexo. Remisión No. 006 por valor de $ 183.000.000,00 Rut de la Fundación Creo País, Fichas Técnicas, Registro fotográfico de los insumos a ingresar, viabilidad por interventoría y certificado de entrada de bienes almacén

Se realizó la verificación acorde a las especificaciones técnicas y que estas cumplen a satisfacción, entregando las cantidades y valor como se menciona en la siguiente tabla y así como se presenta en la remisión ***No. 005*** expedida por la fundación Creo País. En la cual a la fecha ya están almacenadas en las instalaciones autorizadas por la Gobernación de Casanare y el Almacén Departamental; Donde el almacenista de la gobernación de Casanare, Donde la interventoría realizo la verificación en campo y viabilidad técnica que quedo descrita desde el día 20 de junio de 2024 para su respectiva aprobación y entrada de los siguientes insumos cumpliendo sus especificaciones técnicas. A continuación, se presentan los Insumos, herramientas Agrícolas y su registro fotográfico.

Insumos ingresados a Almacén Departamental.

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Semilla asexual de pasto de corte -Clon 51- cortada en esquejes de longitud mínima de 75 centímetros, los cuales deben presentar un óptimo estado fitosanitario y contar con mínimo 5 yemas funcionales.	Ton	60

Ingreso 4. Material Vegetal. Anexo. Remisión No. 007 por valor de $ 366.000.000,00 Rut de la Fundación Creo País, Fichas Técnicas, Registro fotográfico de los insumos a ingresar, viabilidad por interventoría y certificado de entrada de bienes almacén

Se realizó la verificación acorde a las especificaciones técnicas y que estas cumplen a satisfacción, entregando las cantidades y valor como se menciona en la siguiente tabla y así como se presenta en la remisión ***No. 007*** expedida por la fundación Creo País. En la cual a la fecha ya están almacenadas en las instalaciones autorizadas por la Gobernación de Casanare y el Almacén Departamental; Donde el almacenista de la gobernación de Casanare, Donde la interventoría realizo la verificación en campo y viabilidad técnica que quedo descrita desde el día 28 de junio de 2024 para su respectiva aprobación y entrada de los siguientes insumos cumpliendo sus especificaciones técnicas. A continuación, se presentan los Insumos, herramientas Agrícolas y su registro fotográfico.

Insumos ingresados a Almacén Departamental.

No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Semilla asexual de pasto de corte -Clon 51- cortada en esquejes de longitud mínima de 75 centímetros, los cuales deben presentar un óptimo estado fitosanitario y contar con mínimo 5 yemas funcionales.	Ton	120

A continuación, la tabla de entrega realizadas por la Fundación Creo País, de insumos, predios mecanizados, enmiendas aplicadas, entrega de material vegetal entregado, y siembras por municipio.

MUNICIPIO	ENTREGA INSUMOS	MECANIZADOS	ENMIENDAS	ENTREGA MATERIAL VEGETAL	SIEMBRAS
AGUAZUL	50	45	45	45	45
MANI	50	7	7	7	7
TAMARA	14	7	7	7	7
TAURAMENA	16	7	7	7	7
VILLANUEVA	20	4	4	4	4
TOTAL	150	70	70	70	70

6695

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

SEGUIMIENTO A LAS ENTREGAS DE INSUMOS:

CONSOLIDADO ENTREGA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS VILLANUEVA





PRODUCTOR 1 : FABIAN ENRIQUE MEDINA ROJAS, VEREDA:LECHE MIEL, PREDIO:PALESTINA





PRODUCTOR 2 : HECTOR ANGEL PLAZAS PINEDA, VEREDA:FLOR AMARILLO, PREDIO:LOS ALMENDROS





Productor 3: HECTOR MIGUEL PIÑEROS PRIETO Vereda: El Horqueton, Predio: Los Guayabos

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO ENTREGA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS VILLANUEVA





PRODUCTOR 4 : IDINAEL RAMOS ALDANA, VEREDA:COLMENA, PREDIO:BELLAVISTA





Productor 5: JAIRO QUELVIS REYES MORENO, Vereda: El Horqueton, Predio: Chicharra





PRODUCTOR 6 : JEINER LEANDRO RAMOS LOZANO, VEREDA:COLMENA, PREDIO:BELLAVISTA

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024


CONSOLIDADO ENTREGA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS VILLANUEVA



PRODUCTOR 7 : JESUS ENRIQUE MEDINA LOPEZ, VEREDA:LECHE MIEL, PREDIO:PALESTINA



Productor 8: JOSE GAVINO BONILLA TORRES, Vereda: El Horqueton, Predio: Guadualito

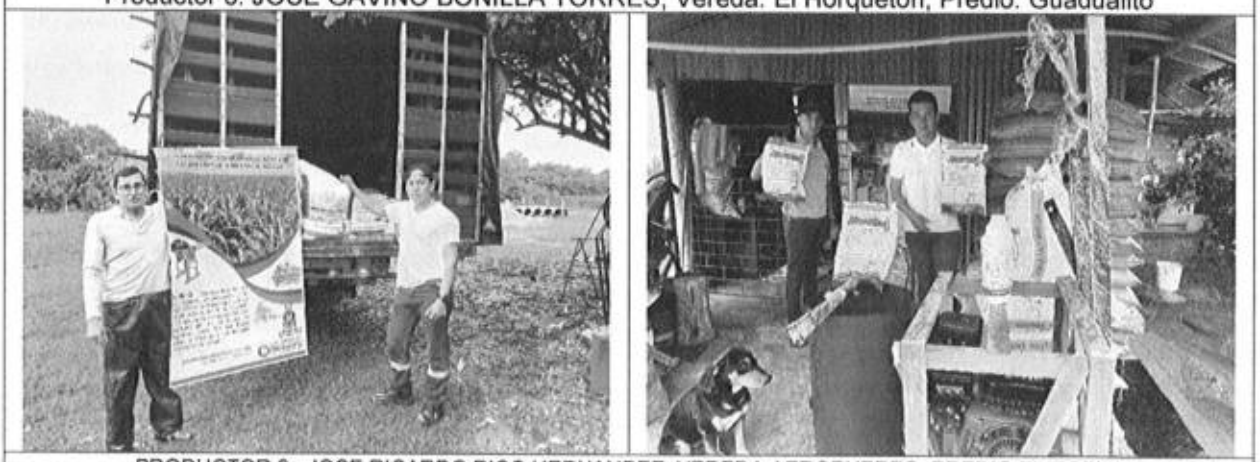

PRODUCTOR 9 : JOSE RICARDO RICO HERNANDEZ, VEREDA:AEROPUERTO, PREDIO:EL ROBLE

CARRERA 17 No. 14-11
Email. consorciointerforrajes@gmail.com
CEL. 3134489057
Aguazul Casanare

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024


CONSOLIDADO ENTREGA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS VILLANUEVA



PRODUCTOR 10 : LLIDHI CEBALLOS TOVAR, VEREDA:SANTA HELENA, PREDIO:ALGARROBO



PRODUCTOR 11 : MARIA DOLORES SALAZAR NIÑO, VEREDA:EL TRIUNFO , PREDIO:LOS CAMBULOS

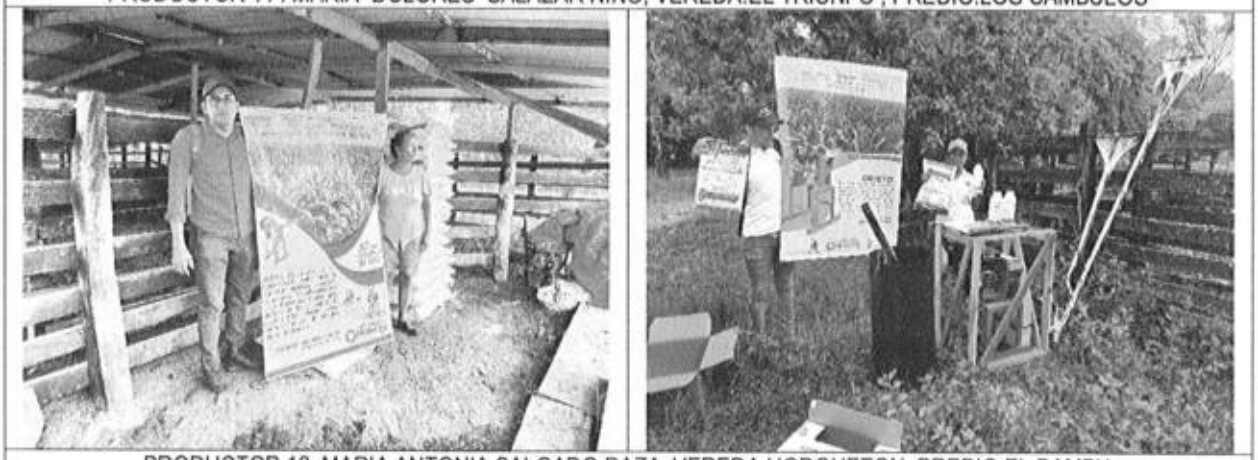

PRODUCTOR 12: MARIA ANTONIA SALGADO DAZA, VEREDA:HORQUETON, PREDIO:EL BAMBU

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO ENTREGA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS VILLANUEVA





PRODUCTOR 13: MARIANA PLAZAS ORTIZ, VEREDA:FLOR AMARILLO, PREDIO:LOS ALMENDROS





Productor 14: MELQUISIDEC TEJADA JIMENEZ, Vereda: El Horqueton, Predio: Miralindo





Productor 15: NOHEMI GUTIERREZ BELTRAN, Vereda: Buenos Aires Alto, Predio: El Rosal

CARRERA 17 No. 14-11
Email. consorciointerforrajes@gmail.com
CEL. 3134489057
Aguazul Casanare

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO ENTREGA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS VILLANUEVA





Productor 16: PORFIDIO ORTEGA DAZA, Vereda: El Horqueton, Predio: La Pulguita





Productor 17: RAFAEL ANTONIO VARGAS VACA, Vereda: El Horqueton, Predio: Los Guarataros





PRODUCTOR 18 : RUBEN DARIO CANO MARQUEZ, VEREDA:PUERTO MIRIAM , PREDIO:BISMARCKIA


CARRERA 17 No. 14-11
Email. consorciointerforrajes@gmail.com
CEL. 3134489057
Aguazul Casanare

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO ENTREGA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS VILLANUEVA

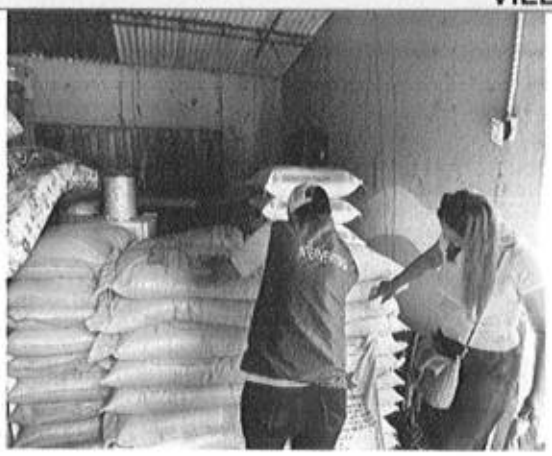



Productor 19: SONIA STELLA SOSA HERNANDEZ, Vereda: El Horqueton, Predio: Los Guayabos





PRODUCTOR 20 : YASMINE MARTINEZ DAZA, VEREDA:CARACOLI, PREDIO:EL ALCARAVAN

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO ENTREGA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS TÁMARA





PRODUCTOR 1 : ALEXANDER PORTILLA PEÑALOZA, VEREDA:CHITACOTE, PREDIO:RIÑON





PRODUCTOR 2 : CARLOS JAVIER BOHORQUEZ BENITEZ, VEREDA:SAN PEDRO, PREDIO:PORVENIR





PRODUCTOR 3 : ELMER ANTONIO BOHORQUEZ BENITEZ, VEREDA:CRUZ VERDE, PREDIO:BUENA VISTA

CARRERA 17 No. 14-11
Email. consorciointerforrajes@gmail.com
CEL. 3134489057
Aguazul Casanare

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO ENTREGA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS TÁMARA





PRODUCTOR 4 : FACUNDO ABRIL ESTRADA , VEREDA:EL TABLON, PREDIO:VILLA LUZ





PRODUCTOR 5 : FREDY ALONSO SARMIENTO QUINTERO, VEREDA:FRAGUA , PREDIO:SILENCIO





CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO ENTREGA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS TÁMARA

PRODUCTOR 6 : HEIDY ALEXANDRA TUMAY ANZUETA, VEREDA:EL TABLON, PREDIO:GRANJA EL EMUNA





PRODUCTOR 7 : JUAN PABLO CARDENAS SUAREZ, VEREDA:EL TABLON, PREDIO:ACAPULCO





PRODUCTOR 8 : LEYDER ARCADIO PALENCIA NIÑO, VEREDA:LAJA, PREDIO:ESPERAZA

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO ENTREGA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS TÁMARA





PRODUCTOR 9 : LUIS ANGEL FUENTES RODRIGUEZ, VEREDA:LAJA, PREDIO:MARBELLA





PRODUCTOR 10 : MARCO FIDEL SUAREZ, VEREDA:EL TABLON, PREDIO:ACAPULCO





CARRERA 17 No. 14-11
Email. consorciointerforrajes@gmail.com

CEL. 3134489057
Aguazul Casanare

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO ENTREGA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS TÁMARA

PRODUCTOR 11 : NOEL PLAZAS ARCINIEGAS, VEREDA:LA PICACHA, PREDIO:GRANJA





PRODUCTOR 12 : WILBER NIÑO RODRIGUEZ, VEREDA:EL TABLON, PREDIO:VILLA MARINA





PRODUCTOR 13 : WILMAN FERNANDO LATRIGLIA ORTIZ, VEREDA:EL TABLON, PREDIO:GRANJA EMUNA





PRODUCTOR 14 : YINA KATERINE SILVA PATIÑO, VEREDA:LAS ISABELAS, PREDIO:LA SARITA

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO ENTREGA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS AGUAZUL





PRODUCTOR 1: NANCY BARRERA BERNAL, **VEREDA**: ALTAMIRA, **PREDIO**: CAMPO REAL





PRODUCTOR 2: ANTHONY LÓPEZ OREJUELA, **VEREDA**: BELLA VISTA, **PREDIO**: LOS ÁNGELES

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO ENTREGA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS AGUAZUL





PRODUCTOR 3: DIEGO ALEJANDRO CALA MARTHA, **VEREDA**: BELLA VISTA, **PREDIO**: LA ESMERALDA





PRODUCTOR 4: FERNANDO BARRERA MONTAÑA, **VEREDA**: BELLA VISTA, **PREDIO**: LA REFORMA II





PRODUCTOR 5: KATHLEEN ROJAS CRUZ, **VEREDA**: BELLA VISTA, **PREDIO**: LA ESPERANZA

CARRERA 17 No. 14-11
Email. consorciointerforrajes@gmail.com

CEL. 3134489057
Aguazul Casanare

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO ENTREGA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS AGUAZUL






PRODUCTOR 6: RITA GLADYS MOLANO BARRE **VEREDA**: BELLA VISTA, **PREDIO**: TRES PALMAS





PRODUCTOR 7: YULIETH GRACIELA CORREA RINCÓN, **VEREDA**: BELLA VISTA, **PREDIO**: EL IMPERIO

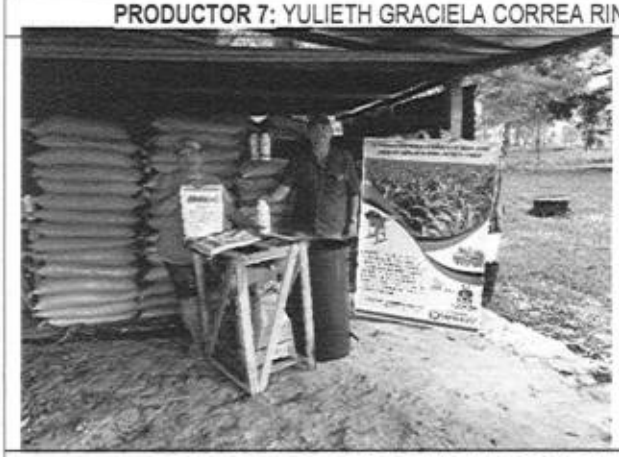



PRODUCTOR 8: SANDRA MILENA PÉREZ DIAZ, **VEREDA**: BELLA VISTA, **PREDIO**: LA DORADA

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2


AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO ENTREGA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS AGUAZUL





PRODUCTOR 9: CIELO DEL LLANO MONTAÑA AVELLA, **VEREDA**: BELLA VISTA, **PREDIO**: DESENGAÑO

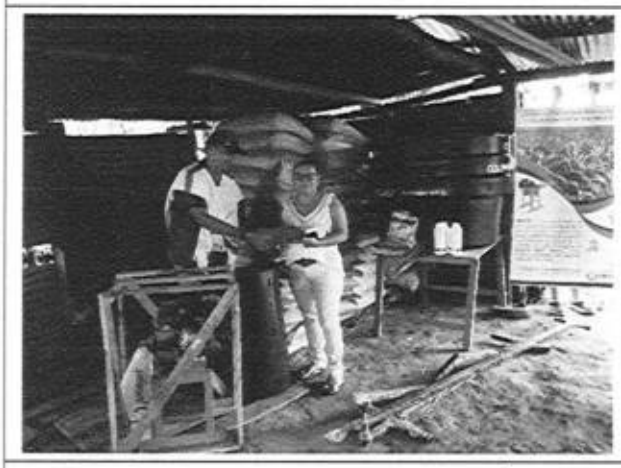



PRODUCTOR 10: ELISA EUGENIA PÉREZ DIAZ, **VEREDA**: BELLA VISTA, **PREDIO**: LA ETERNIDAD





PRODUCTOR 11: LEONARDO RAMÍREZ VILLALOBOS, **VEREDA**: BELLA VISTA, **PREDIO**: MATAPALOS

CARRERA 17 No. 14-11
Email. consorciointerforrajes@gmail.com

CEL. 3134489057
Aguazul Casanare

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024


CONSOLIDADO ENTREGA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS AGUAZUL





PRODUCTOR 12: RONNIE HUERTAS SIERRA, **VEREDA**: LA GRACIELA, **PREDIO**: VILLA ROSA



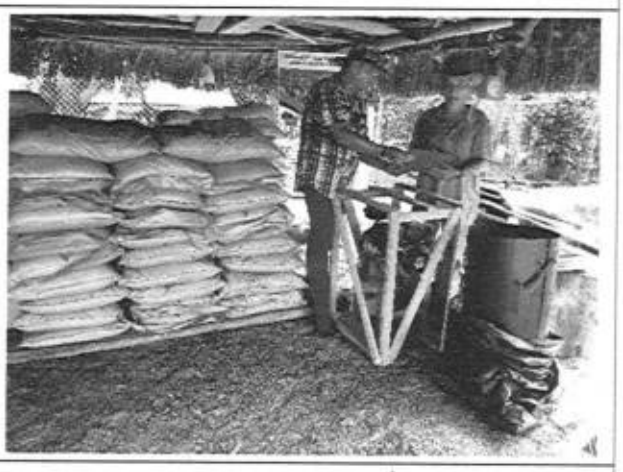

PRODUCTOR 13: MARIANO CHAPARRO TOVAR, **VEREDA:** LA GRACIELA, **PREDIO:** LOS ÁNGELES





PRODUCTOR 14: LEONILDE DIAZ NIÑO, **VEREDA:** LLANO LINDO, **PREDIO:** EL ESTERO

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2


AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO ENTREGA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS AGUAZUL





PRODUCTOR 15: RUTH CRUZ JARRO, **VEREDA:** LLANO LINDO, **PREDIO:** LA ESPERANZA

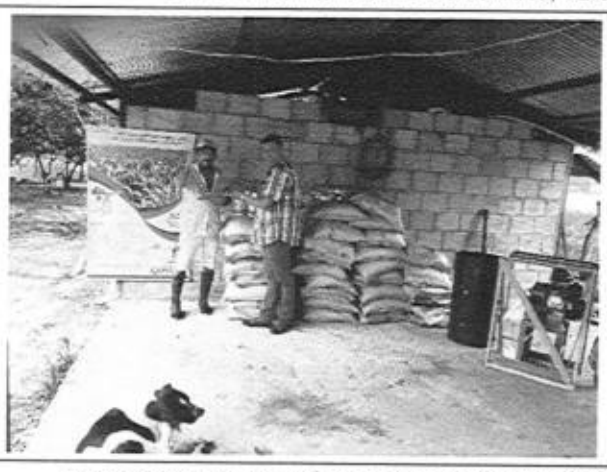



PRODUCTOR 16: ANDRÉS ENRIQUE MOLANO RODRÍGUEZ, **VEREDA:**PALO SOLO, **PREDIO:** VILLA CAROLA





PRODUCTOR 17: CLARA PATRICIA NÚÑEZ SALAMANCA, **VEREDA:** PALO SOLO, **PREDIO:** LA VORÁGINE

CARRERA 17 No. 14-11
Email. consorciointerforrajes@gmail.com

CEL. 3134489057
Aguazul Casanare

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO ENTREGA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS AGUAZUL






PRODUCTOR 18: ERICA LILIANA AVELLA MOLANO, **VEREDA:**PALO SOLO, **PREDIO:** FUNDO BONITO





PRODUCTOR 19: GRACIELA MOLANO BARRERA, **VEREDA:** PALO SOLO, **PREDIO:** LA MILAGROSA

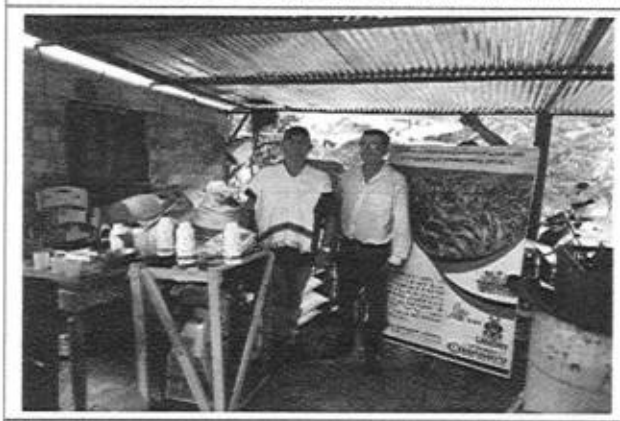



PRODUCTOR 20: HÉCTOR MANUEL ARIAS VARGAS, **VEREDA:** PALO SOLO, **PREDIO:** TRES ESQUINAS

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO ENTREGA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS AGUAZUL





PRODUCTOR 21: MIRTA BALLESTEROS MARTÍNEZ, **VEREDA:** SAN RAFAEL, **PREDIO:** BRISAS DEL LLANO





PRODUCTOR 22: MARCO AURELIO SUAREZ, **VEREDA:** SAN RAFAEL, **PREDIO:** LA BALSORA





PRODUCTOR 23: ANDREA BALLESTEROS, **VEREDA:** SAN MIGUEL DE FARALLONES, **PREDIO:** PARAISO

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO ENTREGA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS AGUAZUL





PRODUCTOR 24: ILBIA MARTINEZ G., **VEREDA:** SAN MIGUEL DE FARALLONES, **PREDIO:** BUENOS AIRES





PRODUCTOR 25: ROLFEN CHAPARRO, **VEREDA:** SAN MIGUEL DE FARALLONES, **PREDIO:** SAN ANTONIO





PRODUCTOR 26: ALBA PUERTO URINTIVE, **VEREDA:** GUAIMARO, **PREDIO:** EL DIAMANTE

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO ENTREGA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS AGUAZUL





PRODUCTOR 27: ANYELA LORENA BRAVO, **VEREDA:** SAN JOSE DE BUBUY, **PREDIO:** LA AMISTAD





PRODUCTOR 28: MARIELA TORRES TORRES, **VEREDA:** SAN LORENZO, **PREDIO:** ENVIDIA






PRODUCTOR 29: RENAN GONZALEZ CRISTANCHO, **VEREDA:** SAN LORENZO, **PREDIO:** LA ENVIDIA

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO ENTREGA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS AGUAZUL

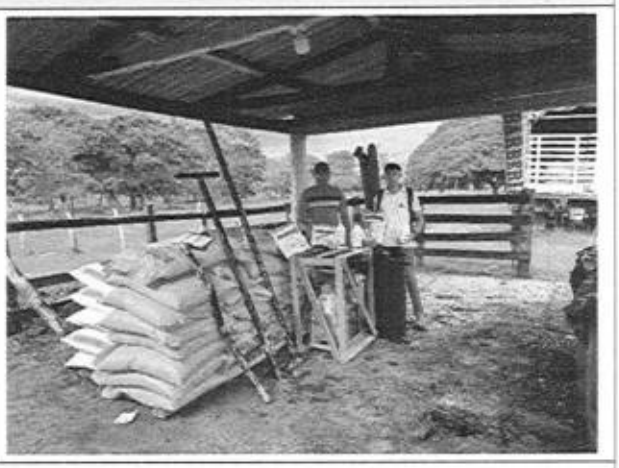PRODUCTOR 30: MARYI DANIT RODRIGUEZ, **VEREDA:** RIO CHIQUITO, **PREDIO:** LA ELEGIDA




PRODUCTOR 31: WILSON ORLANDO PERILLA, **VEREDA:** RIO CHIQUITO, **PREDIO:** ESMERALDA




PRODUCTOR 32: MARLENY SANTIAGO SANCHEZ, **VEREDA:** ESMERALDA, **PREDIO:** BONANZA

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024


CONSOLIDADO ENTREGA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS AGUAZUL





PRODUCTOR 33: WILSON BARRERA, **VEREDA:** RINCON DEL BUBUY, **PREDIO:** SANTA CECILIA LOTE 2



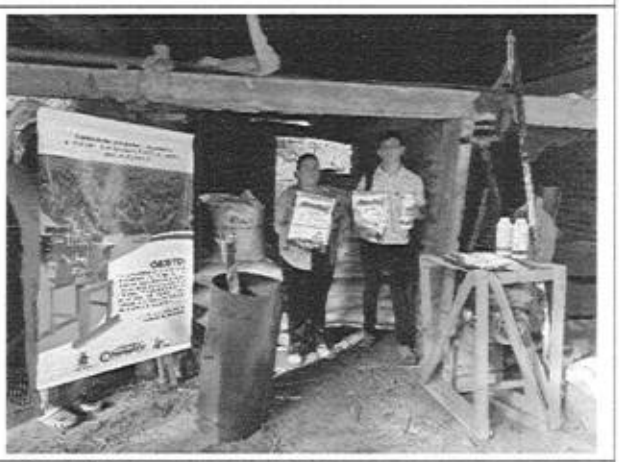

PRODUCTOR 34: SHIRLEY YAZMIN BULLA MARIÑO, **VEREDA:** SALITRE, **PREDIO:** BELGICA





PRODUCTOR 35: ANGELA ROCIO NIÑO NEIRA, **VEREDA:** SAN JOSE DE BUBUY, **PREDIO:** PA QUE MAS

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2


AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO ENTREGA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS AGUAZUL





PRODUCTOR 36: FREDY MAURICIO CORREA LOPEZ, **VEREDA:** SALITRE, **PREDIO:** BELGICA

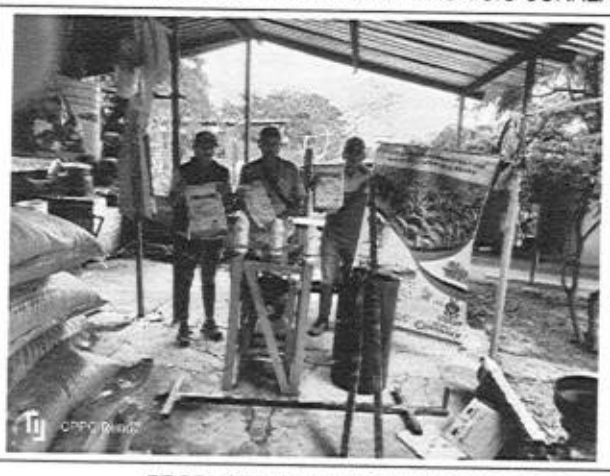



PRODUCTOR 37: LUIS HUMBERTO CARDENAS, **VEREDA:** TURUA, **PREDIO:** BUENOS AIRES





PRODUCTOR 38: EMMA DEL CARMEN JARRO AVELLA, **VEREDA:** ATALAYAS, **PREDIO:** LUCHA

CARRERA 17 No. 14-11
Email. consorciointerforrajes@gmail.com

CEL. 3134489057
Aguazul Casanare

6726

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO ENTREGA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS AGUAZUL





PRODUCTOR 39: JORGE ELIECER LOPEZ, **VEREDA:** ESPERANZA, **PREDIO:** BUENOS AIRES





PRODUCTOR 40: FUNDACION YOVANY QUEVEDO, **VEREDA:** TESORO BUBUY, **PREDIO:** ALGARROBO





PRODUCTOR 41: JORGE HUGO MONTOYA, **VEREDA:** RINCON DEL BUBUY, **PREDIO:** SANTA HELENA


CARRERA 17 No. 14-11
Email. consorciointerforrajes@gmail.com
CEL. 3134489057
Aguazul Casanare

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO ENTREGA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS AGUAZUL

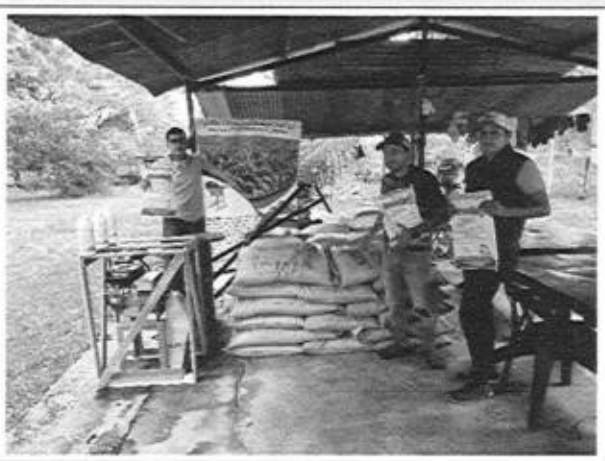



PRODUCTOR 42: JORGE ALIRIO DIAZ RODRIGUEZ, **VEREDA:** SAN RAFAEL, **PREDIO:** LA COTIZA





PRODUCTOR 43: FREDY GUSTAVO PINTO, **VEREDA:** ESMERALDA, **PREDIO:** SAN DIEGO





PRODUCTOR 44: ISABEL CRISTINA ACEVEDO YEPES **VEREDA:** RINCON DEL BUBUY, **PREDIO:** ATENAS II

6722

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO ENTREGA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS AGUAZUL





PRODUCTOR 45: KELLY JOHANA VILLAREAL OSPINO, **VEREDA:** ATALAYAS, **PREDIO:** LOTE 3 VILLA ISABEL.





PRODUCTOR 46: LUZ STELLA CASTRO MACIAS, **VEREDA:** SALITRICO, **PREDIO:** ILUSION





PRODUCTOR 47: MARIA ESPERANZA ESPINEL FONSECA, **VEREDA:** EL GUAIMARO, **PREDIO:** EL DIAMANTE

CARRERA 17 No. 14-11
Email. consorciointerforrajes@gmail.com
CEL. 3134489057
Aguazul Casanare

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO ENTREGA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS AGUAZUL





PRODUCTOR 48: MIRIAM GARCIA PUERTO, **VEREDA:** RINCON BUBUY, **PREDIO:** YULIMAR





PRODUCTOR 49: PASCUAL GONZALEZ, **VEREDA:** RINCON DEL BUBUY, **PREDIO:** ESPERANZA PRIMAVERAL





PRODUCTOR 50: YADITH SILVA WILCHEZ, **VEREDA:** LA UNION, **PREDIO:** BUENOS AIRES

CARRERA 17 No. 14-11
Email. consorciointerforrajes@gmail.com

CEL. 3134489057
Aguazul Casanare

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO ENTREGA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS MANI





PRODUCTOR 1: AXEL ODILIO ADAN PERANQUIVE, VEREDA: BELGRADO, PREDIO: TRES PALMAS





PRODUCTOR 2: BERTULFO GUERRERO CARDENAS, VEREDA: MARARABE, PREDIO: PLATA





PRODUCTOR 3: CAMILO EDUARDO FONSECA MARTINEZ, VEREDA: GUARIAMENA, PREDIO: LAS CAYENAS

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO ENTREGA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS MANI





PRODUCTOR 4: CARLOS ANDRES CHAPARRO, VEREDA: CORALIA, PREDIO: EL DORADO/SAN SEBASTIAN





PRODUCTOR 5: CARLOS FONSECA, VEREDA: PASO REAL DE GUARIAMENA, PREDIO: CAMPO HERMOSO





PRODUCTOR 6: CHELMAN LARA ALFONSO, VEREDA: CHAVINAVE, PREDIO: VILLA SOFIA

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO ENTREGA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS MANI





PRODUCTOR 7: CLAUDIA PATRICIA DIAZ GIL, VEREDA: MUNDO NUEVO, PREDIO: MARKETALIA





PRODUCTOR 8: DORIS YANEHT VARGAS TORRES, VEREDA: BEBEA, PREDIO: LA GUAIRA





PRODUCTOR 9: EDGAR ENRIQUE LEGUIZAMON ALBERTO, VEREDA: SANTA ELENA, PREDIO: LA BAHÌA 1

CARRERA 17 No. 14-11
Email. consorciointerforrajes@gmail.com
CEL. 3134489057
Aguazul Casanare

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO ENTREGA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS MANI





PRODUCTOR 10: EDGAR ENRIQUE LEGUIZAMON, VEREDA: SANTA ELENA, PREDIO: LA PRIMAVERA





PRODUCTOR 11 : EFRAIN NOSSA HURTADO, VEREDA:MACUCO, PREDIO:LA PONDEROSA





PRODUCTOR 12 : EFRAIN NOSSA PARRA, VEREDA:MACUCO, PREDIO:LA LEONA

CARRERA 17 No. 14-11
Email. consorciointerforrajes@gmail.com

CEL. 3134489057
Aguazul Casanare

6728

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO ENTREGA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS MANI





PRODUCTOR 13 : EVELIA GARCIA RONDON, VEREDA:BELGRADO, PREDIO:AÑORANZAS





PRODUCTOR 14 : FLOR ALBA BELLO SIERRA, VEREDA:LAS BRISAS, PREDIO:EL TRIUNFO





PRODUCTOR 15 : FLOR STELLA FLOREZ DE ADAN, VEREDA:BELGRADO, PREDIO:LOS MANANTIALES

CARRERA 17 No. 14-11
Email. consorciointerforrajes@gmail.com
CEL. 3134489057
Aguazul Casanare

6729

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO ENTREGA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS MANI





PRODUCTOR 16 : FLORENTINO ADAN GARCIA, VEREDA:BELGRADO , PREDIO:MANANTIALES





PRODUCTOR 17 : GILBER JARBEY SUAREZ MESA, VEREDA:SANTA MARIA, PREDIO:ACAPULCO





PRODUCTOR 18 : GILBERTO SALINAS RINCON, VEREDA:BRISAS, PREDIO:LOS CORAZONES

CARRERA 17 No. 14-11
Email. consorciointerforrajes@gmail.com
CEL. 3134489057
Aguazul Casanare

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO ENTREGA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS MANI





PRODUCTOR 19 : GRACIELA TOVAR RAMIREZ, VEREDA:SANTA ELENA, PREDIO:LA BAHIA II





PRODUCTOR 20 : HILDA MARIA MALDONADO BENITEZ, VEREDA:LAS ISLAS, PREDIO:LA ESPERANZA





PRODUCTOR 21 : IVAN EDUARDO BARRERA RIVERA, VEREDA:LLANERITA, PREDIO:MIRAFLORES

CARRERA 17 No. 14-11
Email. consorciointerforrajes@gmail.com
CEL. 3134489057
Aguazul Casanare

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO ENTREGA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS MANI





PRODUCTOR 22 : JACKELINE CEBALLOS ROJAS, VEREDA:MUNDO NUEVO, PREDIO:VAIVEN





PRODUCTOR 23 : JAVIER SAAVEDRA, VEREDA:BELGRADO, PREDIO:VILLA LOLITA





PRODUCTOR 24 : JOHN SEBASTIAN WALTEROS FLOREZ, VEREDA:BELGRADO, PREDIO:BERKELEY

CARRERA 17 No. 14-11
Email. consorciointerforrajes@gmail.com

CEL. 3134489057
Aguazul Casanare

6732

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO ENTREGA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS MANI





PRODUCTOR 25 : JOSE EXEOMO CARDENAS LUNA, VEREDA:BRISAS , PREDIO:LA CHARANGA





PRODUCTOR 26 : LUIS ALFONSO TORRES PARAMO, VEREDA:SANTA MARIA, PREDIO:ACAPULCO





PRODUCTOR 27 : LUIS FRANCISCO BONILLA TEATIN, VEREDA:PASO REAL DE GUARIAMENA, PREDIO:TAMARINDO

CARRERA 17 No. 14-11
Email. consorciointerforrajes@gmail.com

CEL. 3134489057
Aguazul Casanare

6733

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO ENTREGA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS MANI





PRODUCTOR 28 : LUZ STELLA FLOREZ, VEREDA:MUNDO NUEVO, PREDIO:SAN PASCUAL





PRODUCTOR 29 : MANFREDY GUERRERO TOVAR, VEREDA:MARARABE, PREDIO:DURANIA





PRODUCTOR 30 : NANCY GARCIA RONDON, VEREDA:BELGRADO, PREDIO:LOS ZANCUDOS

CARRERA 17 No. 14-11
Email. consorciointerforrajes@gmail.com
CEL. 3134489057
Aguazul Casanare

6734

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO ENTREGA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS MANI





PRODUCTOR 31 : NASLY TARACHE CARREÑO, VEREDA:FRONTERA, PREDIO:VILLA MARIANA





PRODUCTOR 32 : NELLY PATRICIA LEGUIZAMON TOVAR, VEREDA:SANTA ELENA, PREDIO:LA BAHIA 2





PRODUCTOR 33 : OLGA MARIA JIMENEZ MATEUS, VEREDA:AGUALINDA, PREDIO:LA ARGELIA

CARRERA 17 No. 14-11
Email. consorciointerforrajes@gmail.com

CEL. 3134489057
Aguazul Casanare

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO ENTREGA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS MANI





PRODUCTOR 34 : OLGA MORERI CARREÑO SARMIENTO, VEREDA:BELGRADO, PREDIO:MATEPALMA





PRODUCTOR 35 : OLIVA RONDON DE PEREZ, VEREDA:BELGRADO , PREDIO:BALALAIKA





PRODUCTOR 36 : ORLANDO CHAPARRO MEDINA, VEREDA:GUAYANA, PREDIO:VENTUARIO

CARRERA 17 No. 14-11
Email. consorciointerforrajes@gmail.com
CEL. 3134489057
Aguazul Casanare

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO ENTREGA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS MANI





PRODUCTOR 37 : REINALDO CARDENAS CARDENAS, VEREDA:LA LLANERITA, PREDIO:TELAVIT





PRODUCTOR 38 : RICARDO PEREZ CABALLERO, VEREDA:BELGRADO, PREDIO:LA RESERVA LOTE 6 VILLA BONITA





PRODUCTOR 39 : RIQUELMER GUERRERO BECERRA, VEREDA:MARARABE, PREDIO:ACEITES

CARRERA 17 No. 14-11
Email. consorciointerforrajes@gmail.com
CEL. 3134489057
Aguazul Casanare

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO ENTREGA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS MANI





PRODUCTOR 40 : RITA YOLIMA COGUA SALINAS, VEREDA:BELGRADO, PREDIO:LOS NAPOLES





PRODUCTOR 41 : ROSA AURORA ACEVEDO MESA, VEREDA:LAS BRISAS, PREDIO:LA ENVIDIA





PRODUCTOR 42 : ROSARIO ANDREA NOSSA PARRA, VEREDA:MACUCO, PREDIO:PASO BARINAS 3

CARRERA 17 No. 14-11
Email. consorciointerforrajes@gmail.com

CEL. 3134489057
Aguazul Casanare

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO ENTREGA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS MANI






PRODUCTOR 43 : SEVERO CHAPARRO RIVAS, VEREDA:GAVIOTAS, PREDIO:EL PORFIN





PRODUCTOR 44 : SOFI LORENA MARIN IBAGUE, VEREDA:PASO REAL GUARIAMENA, PREDIO:LA BENDICION



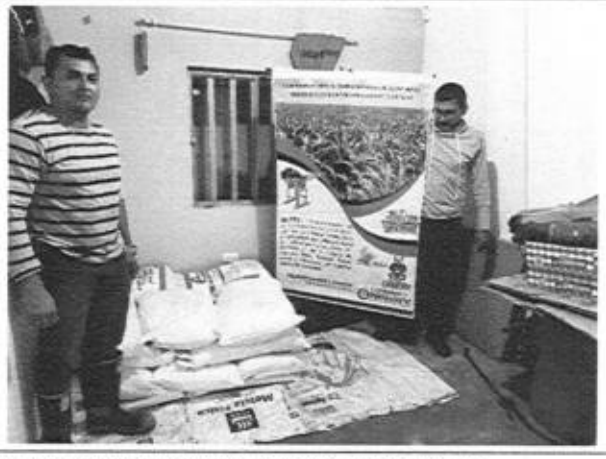

PRODUCTOR 45 : TITO AGUSTIN PALENCIA GARCIA, VEREDA:BELGRADO, PREDIO:ARRENDAJOS

CARRERA 17 No. 14-11
Email. consorciointerforrajes@gmail.com

CEL. 3134489057
Aguazul Casanare

6739

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2


AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO ENTREGA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS MANI





PRODUCTOR 46 : VICENTE HERNANDEZ DIAZ, VEREDA:EL VISO, PREDIO:LA SIBERIA

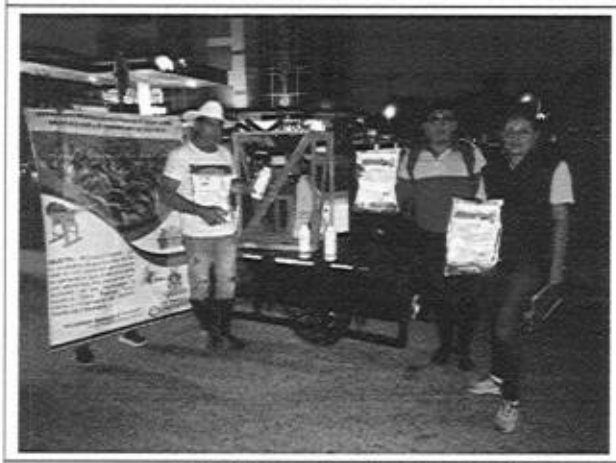



PRODUCTOR 47 : VICTOR ELIAS MORA GAMEZ, VEREDA:BELGRADO, PREDIO:TRES PALMAS





PRODUCTOR 48 : WILLIAM RIVERA NIÑO, VEREDA:ISLAS, PREDIO:CONQUISTA

CARRERA 17 No. 14-11
Email. consorciointerforrajes@gmail.com
CEL. 3134489057
Aguazul Casanare

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO ENTREGA DE HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS MANI





PRODUCTOR 49 : WILSON PALENCIA GARCIA, VEREDA:BELGRADO, PREDIO:LOS ALMENDROS





PRODUCTOR 50 : YESICA ADILFA ADAN GARCIA, VEREDA:BELGRADO, PREDIO:VANGUARDIA


CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO ENTREGA HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS TAURAMENA



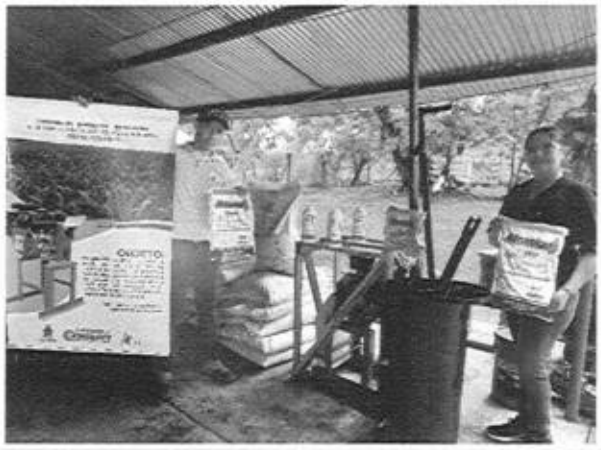

PRODUCTOR 1 : AUDELIA RODRIGUEZ LEGUIZAMO, VEREDA:YAGUAROS, PREDIO:ARAUCA





PRODUCTOR 2 : CARLOS FABIAN AMAYA ALVARADO, VEREDA:JAGUITO, PREDIO:JORDAN





PRODUCTOR 3 : CELIA VARGAS MENDOZA, VEREDA:VILLA ROSA, PREDIO:MANANTIALES

6742

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO ENTREGA HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS TAURAMENA





PRODUCTOR 4 : DIMURIED NIÑO, VEREDA:YAGUAROS, PREDIO:ARRECIFES





PRODUCTOR 5 : FABIO NEL LOZANO GONZALEZ, VEREDA:DELICIAS, PREDIO:SAN NICOLAS





PRODUCTOR 6: LUZ ANGELA ARIAS TORRES, VEREDA:DELICIAS, PREDIO:EL MIRADOR


CARRERA 17 No. 14-11
Email. consorciointerforrajes@gmail.com
CEL. 3134489057
Aguazul Casanare

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO ENTREGA HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS TAURAMENA

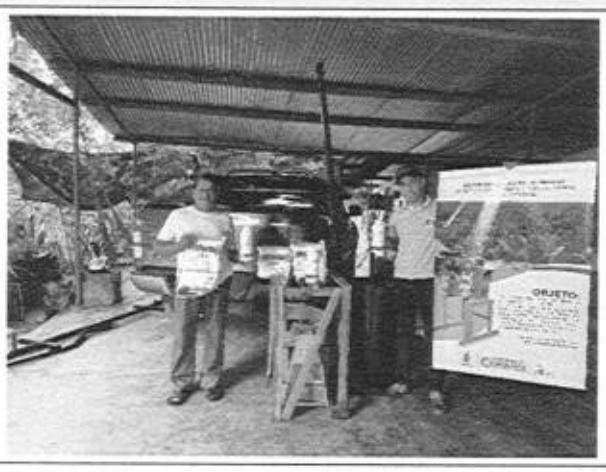



PRODUCTOR 7 : MARCOLINO RODRIGUEZ CARDENAS, VEREDA:IQUIA , PREDIO:VERGEL





PRODUCTOR 8 : MARIA LILIA MONTAÑA FERNANDEZ, VEREDA:PALMAR, PREDIO:NAPOLES





PRODUCTOR 9 : MELIDA SANCHEZ DE BARRERA , VEREDA:YAGUAROS, PREDIO:VILLA SOFIA

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO ENTREGA HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS TAURAMENA





PRODUCTOR 10 : MIGUEL IDEBRANDO MATEUS MATEUS, VEREDA:RAIZAL, PREDIO:VILLA KARINA





PRODUCTOR 11 : NEYLA MARIA MORENO , VEREDA:VILLA ROSA, PREDIO:GUANOTA





PRODUCTOR 12 : PABLO ANTONIO FIGUEREDO RODRIGUEZ, VEREDA:DELICIAS, PREDIO:LLANO GRANDE

CARRERA 17 No. 14-11
Email. consorciointerforrajes@gmail.com
CEL. 3134489057
Aguazul Casanare

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO ENTREGA HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS TAURAMENA





PRODUCTOR 13 : PEDRO MIGUEL AMAYA LOPEZ , VEREDA:JAGUITO, PREDIO:LA VEREMOS





PRODUCTOR 14 : PEDRO RAFAEL SARMIENTO PARADA, VEREDA:YAGUAROS, PREDIO:CAMPO ALEGRE





PRODUCTOR 15 : RAMON EUCLIDES MORA CONTRERAS, VEREDA:RAIZAL, PREDIO:SANTA MARIA

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO ENTREGA HERRAMIENTAS E INSUMOS AGRÍCOLAS TAURAMENA





PRODUCTOR 16 : ROSA CELIA RODRIGUEZ LEGUIZAMO, VEREDA:IQUIA , PREDIO:VERGEL

SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE MATERIAL VEGETAL

La firma de interventoría realiza el seguimiento y verificación a la entrega de material vegetal, en cada uno de los municipios, verificando que este cumpla con los requerimientos establecidos en la minuta del contrato y que se encuentre en buenas condiciones fitosanitarias.

CONSOLIDADO ENTREGA DE MATERIAL VEGETAL AGUAZUL





PRODUCTOR 1: NANCY BARRERA BERNAL, **VEREDA**: ALTAMIRA, **PREDIO**: CAMPO REAL

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024





PRODUCTOR 2: ANTHONY LÓPEZ OREJUELA, **VEREDA**: BELLA VISTA, **PREDIO**: LOS ÁNGELES





PRODUCTOR 3: DIEGO ALEJANDRO CALA MARTHA, **VEREDA**: BELLA VISTA, **PREDIO**: LA ESMERALDA





PRODUCTOR 4: FERNANDO BARRERA MONTAÑA, **VEREDA**: BELLA VISTA, **PREDIO**: LA REFORMA II

CARRERA 17 No. 14-11
Email. consorciointerforrajes@gmail.com

CEL. 3134489057
Aguazul Casanare

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024




PRODUCTOR 5: KATHLEEN ROJAS CRUZ, **VEREDA**: BELLA VISTA, **PREDIO**: LA ESPERANZA




PRODUCTOR 6: RITA GLADYS MOLANO BARRE **VEREDA**: BELLA VISTA, **PREDIO**: TRES PALMAS




PRODUCTOR 7: YULIETH GRACIELA CORREA RINCÓN, **VEREDA**: BELLA VISTA, **PREDIO**: EL IMPERIO

CARRERA 17 No. 14-11
Email. consorciointerforrajes@gmail.com
CEL. 3134489057
Aguazul Casanare

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024





PRODUCTOR 8: SANDRA MILENA PÉREZ DIAZ, **VEREDA**: BELLA VISTA, **PREDIO**: LA DORADA





PRODUCTOR 9: CIELO DEL LLANO MONTAÑA AVELLA, **VEREDA**: BELLA VISTA, **PREDIO**: DESENGAÑO





PRODUCTOR 10: ELISA EUGENIA PÉREZ DIAZ, **VEREDA**: BELLA VISTA, **PREDIO**: LA ETERNIDAD

6750

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024





PRODUCTOR 11: LEONARDO RAMÍREZ VILLALOBOS, **VEREDA**: BELLA VISTA, **PREDIO**: MATAPALOS





PRODUCTOR 12: RONNIE HUERTAS SIERRA, **VEREDA**: LA GRACIELA, **PREDIO**: VILLA ROSA





PRODUCTOR 13: MARIANO CHAPARRO TOVAR, **VEREDA:** LA GRACIELA, **PREDIO:** LOS ÁNGELES

CARRERA 17 No. 14-11
Email. consorciointerforrajes@gmail.com
CEL. 3134489057
Aguazul Casanare

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024





PRODUCTOR 14: LEONILDE DIAZ NIÑO, **VEREDA:** LLANO LINDO, **PREDIO:** EL ESTERO





PRODUCTOR 15: RUTH CRUZ JARRO, **VEREDA:** LLANO LINDO, **PREDIO:** LA ESPERANZA





PRODUCTOR 16: ANDRÉS ENRIQUE MOLANO RODRÍGUEZ, **VEREDA:**PALO SOLO, **PREDIO:** VILLA CAROLA

6752

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024





PRODUCTOR 17: CLARA PATRICIA NÚÑEZ SALAMANCA, **VEREDA:** PALO SOLO, **PREDIO:** LA VORÁGINE





PRODUCTOR 18: ERICA LILIANA AVELLA MOLANO, **VEREDA:**PALO SOLO, **PREDIO:** FUNDO BONITO





PRODUCTOR 19: GRACIELA MOLANO BARRERA, **VEREDA:** PALO SOLO, **PREDIO:** LA MILAGROSA

CARRERA 17 No. 14-11
Email. consorciointerforrajes@gmail.com
CEL. 3134489057
Aguazul Casanare

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024





PRODUCTOR 20: HÉCTOR MANUEL ARIAS VARGAS, **VEREDA:** PALO SOLO, **PREDIO:** TRES ESQUINAS





PRODUCTOR 21: MIRTA BALLESTEROS MARTÍNEZ, **VEREDA:** SAN RAFAEL, **PREDIO:** BRISAS DEL LLANO





PRODUCTOR 22: MARCO AURELIO SUAREZ, **VEREDA:** SAN RAFAEL, **PREDIO:** LA BALSORA

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024





PRODUCTOR 23: ANDREA BALLESTEROS, **VEREDA:** SAN MIGUEL DE FARALLONES, **PREDIO:** PARAISO





PRODUCTOR 24: ILBIA MARTINEZ G., **VEREDA:** SAN MIGUEL DE FARALLONES, **PREDIO:** BUENOS AIRES





PRODUCTOR 25: ROLFEN CHAPARRO, **VEREDA:** SAN MIGUEL DE FARALLONES, **PREDIO:** SAN ANTONIO

CARRERA 17 No. 14-11
Email. consorciointerforrajes@gmail.com

CEL. 3134489057
Aguazul Casanare

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024




PRODUCTOR 26: ALBA PUERTO URINTIVE, **VEREDA:** GUAIMARO, **PREDIO:** EL DIAMANTE




PRODUCTOR 27: ANYELA LORENA BRAVO, **VEREDA:** SAN JOSE DE BUBUY, **PREDIO:** LA AMISTAD




PRODUCTOR 28: MARIELA TORRES TORRES, **VEREDA:** SAN LORENZO, **PREDIO:** ENVIDIA

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024





PRODUCTOR 29: RENAN GONZALEZ CRISTANCHO, **VEREDA:** SAN LORENZO, **PREDIO:** LA ENVIDIA





PRODUCTOR 30: MARYI DANIT RODRIGUEZ, **VEREDA:** RIO CHIQUITO, **PREDIO:** LA ELEGIDA





PRODUCTOR 31: WILSON ORLANDO PERILLA, **VEREDA:** RIO CHIQUITO, **PREDIO:** ESMERALDA

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024





PRODUCTOR 32: MARLENY SANTIAGO SANCHEZ, **VEREDA:** ESMERALDA, **PREDIO:** BONANZA





PRODUCTOR 33: WILSON BARRERA, **VEREDA:** RINCON DEL BUBUY, **PREDIO:** SANTA CECILIA LOTE 2





PRODUCTOR 34: SHIRLEY YAZMIN BULLA MARIÑO, **VEREDA:** SALITRE, **PREDIO:** BELGICA

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024





PRODUCTOR 35: ANGELA ROCIO NIÑO NEIRA, **VEREDA:** SAN JOSE DE BUBUY, **PREDIO:** PA QUE MAS





PRODUCTOR 36: FREDY MAURICIO CORREA LOPEZ, **VEREDA:** SALITRE, **PREDIO:** BELGICA





PRODUCTOR 37: LUIS HUMBERTO CARDENAS, **VEREDA:** TURUA, **PREDIO:** BUENOS AIRES

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024





PRODUCTOR 38: EMMA DEL CARMEN JARRO AVELLA, **VEREDA:** ATALAYAS, **PREDIO:** LUCHA





PRODUCTOR 39: JORGE ELIECER LOPEZ, **VEREDA:** ESPERANZA, **PREDIO:** BUENOS AIRES





PRODUCTOR 40: FUNDACION YOVANY QUEVEDO, **VEREDA:** TESORO BUBUY, **PREDIO:** ALGARROBO

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024





PRODUCTOR 41: JORGE HUGO MONTOYA, **VEREDA:** RINCON DEL BUBUY, **PREDIO:** SANTA HELENA





PRODUCTOR 42: JORGE ALIRIO DIAZ RODRIGUEZ, **VEREDA:** SAN RAFAEL, **PREDIO:** LA COTIZA





PRODUCTOR 43: FREDY GUSTAVO PINTO, **VEREDA:** ESMERALDA, **PREDIO:** SAN DIEGO

CARRERA 17 No. 14-11
Email. consorciointerforrajes@gmail.com

CEL. 3134489057
Aguazul Casanare

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024





PRODUCTOR 44: ISABEL CRISTINA ACEVEDO YEPES **VEREDA:** RINCON DEL BUBUY, **PREDIO:** ATENAS II





PRODUCTOR 45: KELLY JOHANA VILLAREAL OSPINO, **VEREDA:** ATALAYAS, **PREDIO:** LOTE 3 VILLA ISABEL

CONSOLIDADO ENTREGA MATERIAL VEGETAL MANI





PRODUCTOR 1 : EVELIA GARCIA RONDON, VEREDA:BELGRADO, PREDIO:AÑORANZAS

CARRERA 17 No. 14-11
Email. consorciointerforrajes@gmail.com

CEL. 3134489057
Aguazul Casanare

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO ENTREGA MATERIAL VEGETAL MANI





PRODUCTOR 2 : OLGA MARIA JIMENEZ MATEUS, VEREDA:AGUALINDA, PREDIO:LA ARGELIA





PRODUCTOR 3 : OLIVA RONDON DE PEREZ, VEREDA:BELGRADO , PREDIO:BALALAIKA





PRODUCTOR 4 : RITA YOLIMA COGUA SALINAS, VEREDA:BELGRADO, PREDIO:LOS NAPOLES

CARRERA 17 No. 14-11
Email. consorciointerforrajes@gmail.com

CEL. 3134489057
Aguazul Casanare

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO ENTREGA MATERIAL VEGETAL MANI





PRODUCTOR 5: VICENTE HERNANDEZ DIAZ, VEREDA:EL VISO, PREDIO:LA SIBERIA





PRODUCTOR 6 : WILLIAM RIVERA NIÑO, VEREDA:ISLAS, PREDIO:CONQUISTA





PRODUCTOR 7 : YESICA ADILFA ADAN GARCIA, VEREDA:BELGRADO, PREDIO:VANGUARDIA

6764

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024


CONSOLIDADO ENTREGA MATERIAL VEGETAL TÁMARA





PRODUCTOR 1: FACUNDO ABRIL ESTRADA, **VEREDA**: EL TABLON, **PREDIO**: VILLA LUZ



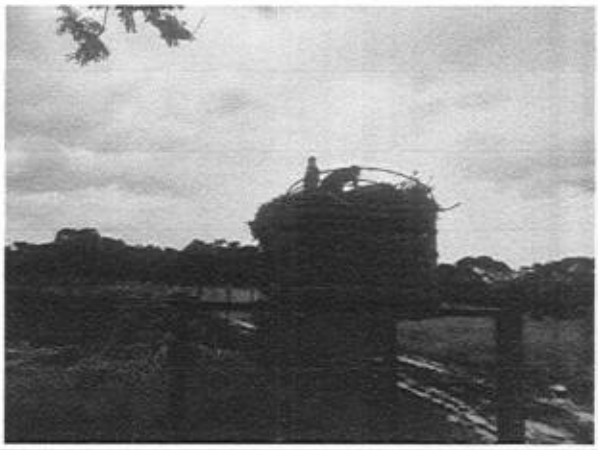

PRODUCTOR 2: HEIDY ALEXANDRA TUMAY ANZUETA, **VEREDA**: EL TABLON, **PREDIO**: GRANJA EL EMUNA





PRODUCTOR 3: WILBER NIÑO RODRIGUEZ, **VEREDA**: EL TABLON, **PREDIO**: VILLA MARINA

CARRERA 17 No. 14-11
Email. consorciointerforrajes@gmail.com

CEL. 3134489057
Aguazul Casanare

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO ENTREGA MATERIAL VEGETAL TÁMARA





PRODUCTOR 4: WILMAN FERNANDO LATRIGLIA ORTIZ, **VEREDA**: EL TABLON, **PREDIO**: GRANJA EL EMUNA





PRODUCTOR 5: LEYDER ARCADIO PALENCIA NIÑO, **VEREDA**: LAJA, **PREDIO**: ESPERANZA





PRODUCTOR 6: LUIS ANGEL FUENTES RODRIGUEZ, **VEREDA**: LAJA, **PREDIO**: MARBELLA

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO ENTREGA MATERIAL VEGETAL TÁMARA





PRODUCTOR 7: YINA KATERINE SILVA PATIÑO, **VEREDA**: LAS ISABELAS, **PREDIO**: LA SARITA

CONSOLIDADO ENTREGA DE MATERIAL VEGETAL - TAURAMENA





PRODUCTOR 1: AUDELIA RODRIGUEZ LEGUIZAMO, **VEREDA**: YAGUAROS, **PREDIO**: ARAUCA

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO ENTREGA DE MATERIAL VEGETAL - TAURAMENA





PRODUCTOR 2: CARLOS FABIAN AMAYA ALVARADO, **VEREDA**: JAGUITO, **PREDIO**: JORDAN





PRODUCTOR 3: MARIA LILIA MONTAÑA FERNANDEZ, **VEREDA**: PALMAR, **PREDIO**: NAPOLES





PRODUCTOR 4: MELIDA SANCHEZ DE BARRERA, **VEREDA**: YAGUAROS, **PREDIO**: VILLA SOFIA

CARRERA 17 No. 14-11
Email. consorciointerforrajes@gmail.com
CEL. 3134489057
Aguazul Casanare

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO ENTREGA DE MATERIAL VEGETAL - TAURAMENA





PRODUCTOR 5: PABLO ANTONIO FIGUEREDO RODRIGUEZ, **VEREDA**: DELICIAS, **PREDIO**: LLANO GRANDE





PRODUCTOR 6: PEDRO MIGUEL AMAYA LOPEZ, **VEREDA**: JAGUITO, **PREDIO**: LA VEREMOS





PRODUCTOR 7: ROSA CELIA RODRIGUEZ LEGUIZAMO, **VEREDA**: IQUIA, **PREDIO**: VERGEL

CARRERA 17 No. 14-11
Email. consorciointerforrajes@gmail.com
CEL. 3134489057
Aguazul Casanare

6769

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO MATERIAL VEGETAL VILLANUEVA





PRODUCTOR 1: IDINAEL RAMOS ALDANA, **VEREDA**: COLMENA, **PREDIO**: BELLAVISTA





PRODUCTOR 2: JAIRO QUELVIS REYES MORENO, **VEREDA**: HORQUETON, **PREDIO**: CHICHARRA





PRODUCTOR 3: JEINER LEANDRO RAMOS LOZANO, **VEREDA**: COLMENA, **PREDIO**: BELLAVISTA

CARRERA 17 No. 14-11
Email. consorciointerforrajes@gmail.com
CEL. 3134489057
Aguazul Casanare

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO MATERIAL VEGETAL VILLANUEVA





PRODUCTOR 4: JOSE GABINO BONILLA TORRES, **VEREDA**: HORQUETON**PREDIO**: GUADUALITO

JORNADAS DE ORIENTACIÓN (CANTIDAD 8)

1.2.1. **JORNADA DE ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN PRÁCTICAS DE MECANIZACIÓN DE TERRENO PARA SIEMBRA DE FORRAJES.**
Se hace seguimiento por parte de la interventoría al contratista para verificar las jornadas de orientación se estén cumpliendo según especificaciones técnicas en cuanto a tiempo, materiales e insumos y temáticas

Se registra la entrega del siguiente folleto:

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

1 RECONOCIMIENTO DE TERRENO

El suelo es la capa superficial de la tierra y constituye el medio en el cual crecen las plantas. Es capaz de aportar los nutrientes fundamentales para el crecimiento de los vegetales y almacenar agua de lluvias cediéndola a las plantas a medida que la necesitan.

- ✓ Conocer propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos.
- ✓ Analizar los distintos tipos de suelo.
- ✓ Identificar el perfil de un suelo.



2 PROPIEDADES DEL SUELO Y SU RELACIÓN CON LA LABRANZA

Como no todos los suelos presentan las mismas condiciones físicas, debe hacerse un diagnóstico de los limitantes físicos, de los suelos para seleccionar el sistema de labranza más acorcoiado de acuerdo con las propiedades físicas y el cultivo a sembrar para corregir esas limitantes.



3 PROFUNDIDAD EFECTIVA


Es la profundidad a la cual pueden llegar las raí ces de las plantas en un suelo, sin ningun tipo de obstáculos (físicos o químicos).

1.nivel freático
2.Capas endurecidas
3.Arenas sueltas
4.Arcillas impermeables
5.Presencia de sales



4 TEXTURA

Es la cantidad de arena, de limo y de arcilla contenidos en el suelo y expresados en porcentaje.



Arenoso
Limoso
Franco-limoso
Franco-arenoso
Areno-franco
Franco-arcilloso
Arcillo-arenoso
Arcilloso

5 ESTRUCTURA

Es la forma como se agrupan las particulas del suelo para formar agregados o terrones. Esta propiedad no puede ser medada directamente, pero es evaluada en términos de otras propiedades como densidad aparente, porosidad, infiltración, etc.




6 RESISTENCA A LA PENETRACIÓN

La resistencia a la penetración es un indicador del nivel de compactación de un suelo. La compactación limita el crecimiento radicular y la cantidad de aire y agua de que disponen las raíces.



7 CONSISTENCIA

La consistencia del suelo es la firmeza con que se unen los materiales que lo componen o la resistencia de los suelos a la deformación y la ruptura. La consistencia del suelo se made por muestras de suelo mojado, húmedo y seco.



8 CALIBRACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

La calibracion de equipos de cosecha, picado y ensilado es un proceso importante para garantizar la calidad del producto final. Una calibracion incorrecta puede provocar perdidas de rendimiento, daños a la cosecha y problemas de calidad del ensilado.



Pasos para la calibración:

1. Ajuste la altura del cabezal de corte.

2. Ajuste la velocidad de avance.


3. El pasto de corte se debe cortar de 30 a 60 días despues del último corte, cuando ha alcanzado una altura de entre 1.20 y 1.80 metros.

4. El tamaño de particula óptimo debe ser entre 2 y 8 cm. Picadoras de disco, picadoras de martillo, picadoras de cuchillas.

5. Un flujo de aire demasiado bajo puede provocar problemas de fermentacion, mientras que un flujo de aire demasiado alto puede secar la cosecha.

9 EVALUACIÓN DE LOS HORIZONTES DEL SUELO


Se le llamara horizonte a cada una de las capas que se observan en el perfil del suelo y se diferencian una de la otra por el color, la textura, la estructura o la pedregosidad.



Horizonte 0
Horizonte A
Horizonte B
Horizonte C
Horizonte D

E-mail: fcpforrajes2023@gmail.com

Yopal - Casanare



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 No. INTERNO 1987 de 2023-08-22

TEMA 1: Jornada de Orientación y acompañamiento técnico en prácticas de Mecanización de terreno para siembra de forrajes.

Fundación Creo País
NIT 900176984-2

6772

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO: TEMA 1. MECANIZACIÓN DE TERRENO - VILLANUEVA



PRODUCTOR 1: IDINAEL RAMOS ALDANA, **VEREDA**: COLMENA, **PREDIO**: BELLAVISTA



PRODUCTOR 2: JAIRO QUELVIS REYES MORENO, **VEREDA**: HORQUETON, **PREDIO**: CHICHARRA



PRODUCTOR 3: JEINER LEANDRO RAMOS LOZANO, **VEREDA**: COLMENA, **PREDIO**: BELLAVISTA



PRODUCTOR 4: JOSE GABINO BONILLA TORRES, **VEREDA**: HORQUETON**PREDIO**: GUADUALITO

CARRERA 17 No. 14-11
Email. consorciointerforrajes@gmail.com
CEL. 3134489057
Aguazul Casanare

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO: TEMA 1. MECANIZACIÓN DE TERRENO - TÁMARA



PRODUCTOR 1: WILMAN FERNANDO LATRIGLIA ORTIZ, **VEREDA**: EL TABLON, **PREDIO**: GRANJA EMUNA



PRODUCTOR 2: HEIDY ALEXANDRA TUMAY ANZUETA, **VEREDA**: EL TABLON, **PREDIO**: GRANJA EL EMUNA



PRODUCTOR 3: WILBER NIÑO RODRIGUEZ, **VEREDA**: EL TABLON, **PREDIO**: VILLA MARINA



PRODUCTOR 4: FACUNDO ABRIL ESTRADA, **VEREDA**: EL TABLON, **PREDIO**: VILLA LUZ

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023


Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO: TEMA 1. MECANIZACIÓN DE TERRENO - TÁMARA



PRODUCTOR 5: YINA KATERINE SILVA PATIÑO, **VEREDA**: LAS ISABELAS, **PREDIO**: LA SARITA

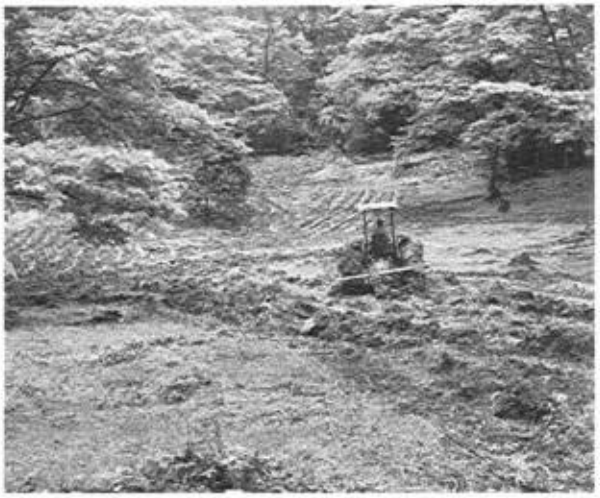

PRODUCTOR 6: LEYDER ARCADIO PALENCIA NIÑO, **VEREDA**: LAJA, **PREDIO**: ESPERANZA



PRODUCTOR 7: LUIS ANGEL FUENTES RODRIGUEZ, **VEREDA**: LAJA, **PREDIO**: MARBELLA

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO: TEMA 1. MECANIZACIÓN DE TERRENO - TAURAMENA





PRODUCTOR 1: AUDELIA RODRIGUEZ LEGUIZAMO, **VEREDA**: YAGUAROS, **PREDIO**: ARAUCA

PRODUCTOR 2: CARLOS FABIAN AMAYA ALVARADO, **VEREDA**: JAGUITO, **PREDIO**: JORDAN





PRODUCTOR 3: MARIA LILIA MONTAÑA FERNANDEZ, **VEREDA**: PALMAR, **PREDIO**: NAPOLES

PRODUCTOR 4: MELIDA SANCHEZ DE BARRERA, **VEREDA**: YAGUAROS, **PREDIO**: VILLA SOFIA





CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO: TEMA 1. MECANIZACIÓN DE TERRENO - TAURAMENA

PRODUCTOR 5: PABLO ANTONIO FIGUEREDO RODRIGUEZ, **VEREDA**: DELICIAS, **PREDIO**: LLANO GRANDE	**PRODUCTOR 6:** PEDRO MIGUEL AMAYA LOPEZ, **VEREDA**: JAGUITO, **PREDIO**: LA VEREMOS



PRODUCTOR 7: ROSA CELIA RODRIGUEZ LEGUIZAMO, **VEREDA**: IQUIA, **PREDIO**: VERGEL

CONSOLIDADO: TEMA 1. MECANIZACIÓN DE TERRENO - MANI



PRODUCTOR 1: WILLIAM RIVERA NIÑO, **VEREDA**: ISLAS, **PREDIO**: CONQUISTA



PRODUCTOR 2: OLGA MARIA JIMENEZ MATEUS, **VEREDA**: AGUALINDA, **PREDIO**: LA ARGELIA

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO: TEMA 1. MECANIZACIÓN DE TERRENO - MANI



PRODUCTOR 3: EVELIA GARCIA RONDON, **VEREDA**: BELGRADO, **PREDIO**: AÑORANZAS



PRODUCTOR 4: VICENTE HERNANDEZ DIAZ, **VEREDA**: EL VISO, **PREDIO**: LA SIBERIA



PRODUCTOR 5: OLIVA RONDON DE PEREZ, **VEREDA**: BELGRADO, **PREDIO**: BALALAIKA



PRODUCTOR 6: YESICA ADILFA ADAN GARCIA, **VEREDA**: BELGRADO, **PREDIO**: VANGUARDIA



PRODUCTOR 7: RITA GLADYS MOLANO BARRERA, **VEREDA**: BELLA VISTA, **PREDIO**: TRES PALMAS

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO: TEMA 1. MECANIZACIÓN DE TERRENO - AGUAZUL



PRODUCTOR 1: NANCY BARRERA BERNAL, **VEREDA**: ALTAMIRA, **PREDIO**: CAMPO REAL



PRODUCTOR 2: ANTHONY LÓPEZ OREJUELA, **VEREDA**: BELLA VISTA, **PREDIO**: LOS ÁNGELES



PRODUCTOR 3: DIEGO ALEJANDRO CALA MARTHA, **VEREDA**: BELLA VISTA, **PREDIO**: LA ESMERALDA



PRODUCTOR 4: FERNANDO BARRERA MONTAÑA, **VEREDA**: BELLA VISTA, **PREDIO**: LA REFORMA II

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO: TEMA 1. MECANIZACIÓN DE TERRENO - AGUAZUL



PRODUCTOR 5: KATHLEEN ROJAS CRUZ, **VEREDA:** BELLA VISTA, **PREDIO**: LA ESPERANZA



PRODUCTOR 6: RITA GLADYS MOLANO BARRE **VEREDA:** BELLA VISTA, **PREDIO**: TRES PALMAS



PRODUCTOR 7: YULIETH GRACIELA CORREA RINCÓN, **VEREDA**: BELLA VISTA, **PREDIO**: EL IMPERIO



PRODUCTOR 8: SANDRA MILENA PÉREZ DIAZ, **VEREDA:** BELLA VISTA, **PREDIO**: LA DORADA

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO: TEMA 1. MECANIZACIÓN DE TERRENO - AGUAZUL



PRODUCTOR 9: CIELO DEL LLANO MONTAÑA AVELLA, **VEREDA**: BELLA VISTA, **PREDIO**: DESENGAÑO



PRODUCTOR 10: ELISA EUGENIA PÉREZ DIAZ, **VEREDA**: BELLA VISTA, **PREDIO**: LA ETERNIDAD



PRODUCTOR 11: LEONARDO RAMÍREZ VILLALOBOS, **VEREDA**: BELLA VISTA, **PREDIO**: MATAPALOS



PRODUCTOR 12: RONNIE HUERTAS SIERRA, **VEREDA**: LA GRACIELA, **PREDIO**: VILLA ROSA

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO: TEMA 1. MECANIZACIÓN DE TERRENO - AGUAZUL



PRODUCTOR 13: MARIANO CHAPARRO TOVAR, **VEREDA:** LA GRACIELA, **PREDIO:** LOS ÁNGELES



PRODUCTOR 14: LEONILDE DIAZ NIÑO, **VEREDA:** LLANO LINDO, **PREDIO:** EL ESTERO



PRODUCTOR 15: RUTH CRUZ JARRO, **VEREDA:** LLANO LINDO, **PREDIO:** LA ESPERANZA



PRODUCTOR 16: ANDRÉS ENRIQUE MOLANO RODRÍGUEZ, **VEREDA:**PALO SOLO, **PREDIO:** VILLA CAROLA

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO: TEMA 1. MECANIZACIÓN DE TERRENO - AGUAZUL



PRODUCTOR 17: CLARA PATRICIA NÚÑEZ SALAMANCA,
VEREDA: PALO SOLO, **PREDIO:** LA VORÁGINE



PRODUCTOR 18: ERICA LILIANA AVELLA MOLANO,
VEREDA:PALO SOLO, **PREDIO:** FUNDO BONITO



PRODUCTOR 19: GRACIELA MOLANO BARRERA,
VEREDA: PALO SOLO, **PREDIO:** LA MILAGROSA



PRODUCTOR 20: HÉCTOR MANUEL ARIAS VARGAS,
VEREDA: PALO SOLO, **PREDIO:** TRES ESQUINAS





CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO: TEMA 1. MECANIZACIÓN DE TERRENO - AGUAZUL

PRODUCTOR 21: MIRTA BALLESTEROS MARTÍNEZ, **VEREDA:** SAN RAFAEL, **PREDIO:** BRISAS DEL LLANO



PRODUCTOR 22: MARCO AURELIO SUAREZ, **VEREDA:** SAN RAFAEL, **PREDIO:** LA BALSORA



PRODUCTOR 23: ANDREA BALLESTEROS, **VEREDA:** SAN MIGUEL DE FARALLONES, **PREDIO:** PARAISO



PRODUCTOR 24: ILBIA MARTINEZ G., **VEREDA:** SAN MIGUEL DE FARALLONES, **PREDIO:** BUENOS AIRES



PRODUCTOR 25: ROLFEN CHAPARRO, **VEREDA:** SAN MIGUEL DE FARALLONES, **PREDIO:** SAN ANTONIO

PRODUCTOR 26: ALBA PUERTO URINTIVE, **VEREDA:** GUAIMARO, **PREDIO:** EL DIAMANTE

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO: TEMA 1. MECANIZACIÓN DE TERRENO - AGUAZUL



PRODUCTOR 27: ANYELA LORENA BRAVO, **VEREDA:** SAN JOSE DE BUBUY, **PREDIO:** LA AMISTAD



PRODUCTOR 28: MARIELA TORRES TORRES, **VEREDA:** SAN LORENZO, **PREDIO:** ENVIDIA



PRODUCTOR 29: RENAN GONZALEZ CRISTANCHO, **VEREDA:** SAN LORENZO, **PREDIO:** LA ENVIDIA



PRODUCTOR 30: MARYI DANIT RODRIGUEZ, **VEREDA:** RIO CHIQUITO, **PREDIO:** LA ELEGIDA





CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO: TEMA 1. MECANIZACIÓN DE TERRENO - AGUAZUL

PRODUCTOR 31: WILSON ORLANDO PERILLA, **VEREDA:** RIO CHIQUITO, **PREDIO:** ESMERALDA	**PRODUCTOR 32:** MARLENY SANTIAGO SANCHEZ, **VEREDA:** ESMERALDA, **PREDIO:** BONANZA
	
PRODUCTOR 33: WILSON BARRERA, **VEREDA:** RINCON DEL BUBUY, **PREDIO:** SANTA CECILIA LOTE 2	**PRODUCTOR 34:** SHIRLEY YAZMIN BULLA MARIÑO, **VEREDA:** SALITRE, **PREDIO:** BELGICA
	
PRODUCTOR 35: ANGELA ROCIO NIÑO NEIRA, **VEREDA:** SAN JOSE DE BUBUY, **PREDIO:** PA QUE MAS	**PRODUCTOR 36:** FREDY MAURICIO CORREA LOPEZ, **VEREDA:** SALITRE, **PREDIO:** BELGICA

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO: TEMA 1. MECANIZACIÓN DE TERRENO - AGUAZUL





PRODUCTOR 37: LUIS HUMBERTO CARDENAS, **VEREDA:** TURUA, **PREDIO:** BUENOS AIRES

PRODUCTOR 38: EMMA DEL CARMEN JARRO AVELLA, **VEREDA:** ATALAYAS, **PREDIO:** LUCHA





PRODUCTOR 39: JORGE ELIECER LOPEZ, **VEREDA:** ESPERANZA, **PREDIO:** BUENOS AIRES

PRODUCTOR 40: FUNDACION YOVANY QUEVEDO, **VEREDA:** TESORO BUBUY, **PREDIO:** ALGARROBO





CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO: TEMA 1. MECANIZACIÓN DE TERRENO - AGUAZUL	
PRODUCTOR 41: JORGE HUGO MONTOYA, **VEREDA:** RINCON DEL BUBUY, **PREDIO:** SANTA HELENA	**PRODUCTOR 42:** JORGE ALIRIO DIAZ RODRIGUEZ, **VEREDA:** SAN RAFAEL, **PREDIO:** LA COTIZA
	
PRODUCTOR 43: FREDY GUSTAVO PINTO, **VEREDA:** ESMERALDA, **PREDIO:** SAN DIEGO	**PRODUCTOR 44:** ISABEL CRISTINA ACEVEDO YEPES, **VEREDA:** RINCON DEL BUBUY, **PREDIO:** ATENAS II
	
PRODUCTOR 45: KELLY JOHANA VILLAREAL OSPINO, **VEREDA:** ATALAYAS, **PREDIO:** LOTE 3 VILLA ISABEL	

1.2.2. JORNADA DE ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN PRÁCTICAS DE APLICACIÓN DE ENMIENDAS PARA SIEMBRA DE FORRAJES.

Se hace seguimiento por parte de la interventoría al contratista para verificar las jornadas de orientación se estén cumpliendo según especificaciones técnicas en cuanto a tiempo, materiales e insumos materiales e insumos y temáticas

Se registra la entrega del siguiente folleto:

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

1 TIPOS DE ENMIENDAS AGRICOLAS

Una "enmienda agricola" es un producto que se le adiciona a un suelo para la corrección y mejora de al menos una condicion fisica, quimica o biológica del mismo.

Con esta correccion de dicha deficiencia se permite mantener la productividad de las plantas; de lo contrario, en caso de mantenerse sin esta aportación, no permitiria que el cultivo o la planta se desarrollase adecuadamente.

Enmiendas Agricolas

Cal agricola (roca caliza molida o carbonato de calcio mineral).

Cal Dolomita (roca dolomita molida o mezcla natural de carbonato de calcio y carbonato de magnesio).

Roca fosfórica (roca fluor apatita molida o fosfato de calcio mineral).

Silicato de Magnesio (rocas serpentinas molidas o silicatos de magnesio).

Yeso agricola (yeso de mina molido o sulfato de calcio mineral).

Materias orgánicas compostadas (residuos animales y vegetales).

Tipos de Enmiendas

1.Húmicas, hechas con materia prima Animal o vegetal (turba, lignito o leonardita).




2.Turba de musgo, realizada con materia prima Musgo, principalmente género Sphagnum.



3.Turba herbáceas, realizada con materia prima Turberas bajas principalmente Carex, Phragmytes.





2 METODOS DE APLICACIÓN

La adopción de uno u otro tipo de aplicación está relacionada con el producto a ser aplicado, con el cultivo y con el sistema de producción.

A-Al voleo
B- En fajas
C- En líneas abajo y a un lado de las semillas.

La otra forma de aplicación de fertilizante más utilizada es la localización en banda continua a lo largo del surco, lo que direcciona la distribución del producto a las hileras de siembra del cultivo buscando colocar los fertilizantes al alcance del sistema radicular de las plantas.




CARRERA 17 No. 14-11
Email. consorciointerforrajes@gmail.com
CEL. 3134489057
Aguazul Casanare

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

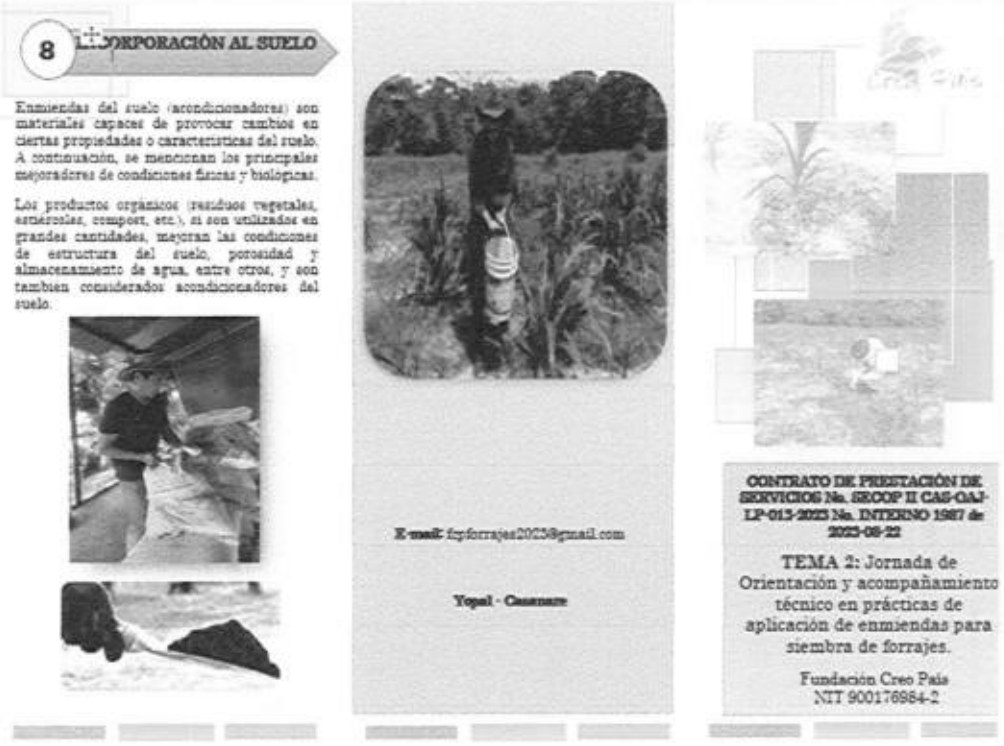

CONSOLIDADO: TEMA 2. ENMIENDAS DE TERRENO - TÁMARA



PRODUCTOR 1: WILMAN FERNANDO LATRIGLIA ORTIZ,
VEREDA: EL TABLON, **PREDIO**: GRANJA EMUNA



PRODUCTOR 2: HEIDY ALEXANDRA TUMAY ANZUETA,
VEREDA: EL TABLON, **PREDIO**: GRANJA EL EMUNA

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO: TEMA 2. ENMIENDAS DE TERRENO - TÁMARA



PRODUCTOR 3: WILBER NIÑO RODRIGUEZ, **VEREDA**: EL TABLON, **PREDIO**: VILLA MARINA



PRODUCTOR 4: FACUNDO ABRIL ESTRADA, **VEREDA**: EL TABLON, **PREDIO**: VILLA LUZ



PRODUCTOR 5: YINA KATERINE SILVA PATIÑO, **VEREDA**: LAS ISABELAS, **PREDIO**: LA SARITA



PRODUCTOR 6: LEYDER ARCADIO PALENCIA NIÑO, **VEREDA**: LAJA, **PREDIO**: ESPERANZA



PRODUCTOR 7: LUIS ANGEL FUENTES RODRIGUEZ, **VEREDA**: LAJA, **PREDIO**: MARBELLA

CARRERA 17 No. 14-11
Email. consorciointerforrajes@gmail.com
CEL. 3134489057
Aguazul Casanare

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO: TEMA 2. ENMIENDAS DE TERRENO - VILLANUEVA	
	
PRODUCTOR 1: IDINAEL RAMOS ALDANA, **VEREDA**: COLMENA, **PREDIO**: BELLAVISTA	**PRODUCTOR 2:** JAIRO QUELVIS REYES MORENO, **VEREDA**: HORQUETON, **PREDIO**: CHICHARRA
	
PRODUCTOR 3: JEINER LEANDRO RAMOS LOZANO, **VEREDA**: COLMENA, **PREDIO**: BELLAVISTA	**PRODUCTOR 4:** JOSE GABINO BONILLA TORRES, **VEREDA**: HORQUETON**PREDIO**: GUADUALITO

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO: TEMA 2. ENMIENDAS DE TERRENO - TAURAMENA



PRODUCTOR 1: AUDELIA RODRIGUEZ LEGUIZAMO, **VEREDA**: YAGUAROS, **PREDIO**: ARAUCA



PRODUCTOR 2: CARLOS FABIAN AMAYA ALVARADO, **VEREDA**: JAGUITO, **PREDIO**: JORDAN



PRODUCTOR 3: MARIA LILIA MONTAÑA FERNANDEZ, **VEREDA**: PALMAR, **PREDIO**: NAPOLES



PRODUCTOR 4: MELIDA SANCHEZ DE BARRERA, **VEREDA**: YAGUAROS, **PREDIO**: VILLA SOFIA





CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO: TEMA 2. ENMIENDAS DE TERRENO - TAURAMENA

PRODUCTOR 5: PABLO ANTONIO FIGUEREDO RODRIGUEZ, **VEREDA**: DELICIAS, **PREDIO**: LLANO GRANDE	**PRODUCTOR 6:** PEDRO MIGUEL AMAYA LOPEZ, **VEREDA**: JAGUITO, **PREDIO**: LA VEREMOS



PRODUCTOR 7: ROSA CELIA RODRIGUEZ LEGUIZAMO, **VEREDA**: IQUIA, **PREDIO**: VERGEL

CONSOLIDADO: TEMA 2. ENMIENDAS DE TERRENO - MANI



PRODUCTOR 1: WILLIAM RIVERA NIÑO, **VEREDA**: ISLAS, **PREDIO**: CONQUISTA



PRODUCTOR 2: OLGA MARIA JIMENEZ MATEUS, **VEREDA**: AGUALINDA, **PREDIO**: LA ARGELIA

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO: TEMA 2. ENMIENDAS DE TERRENO - MANI



PRODUCTOR 3: EVELIA GARCIA RONDON, **VEREDA**: BELGRADO, **PREDIO**: AÑORANZAS



PRODUCTOR 4: VICENTE HERNANDEZ DIAZ, **VEREDA**: EL VISO, **PREDIO**: LA SIBERIA



PRODUCTOR 5: OLIVA RONDON DE PEREZ, **VEREDA**: BELGRADO, **PREDIO**: BALALAIKA



PRODUCTOR 6: YESICA ADILFA ADAN GARCIA, **VEREDA**: BELGRADO, **PREDIO**: VANGUARDIA



PRODUCTOR 7: RITA GLADYS MOLANO BARRERA, **VEREDA**: BELLA VISTA, **PREDIO**: TRES PALMAS

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO: TEMA 2. ENMIENDA DE TERRENO - AGUAZUL



PRODUCTOR 1: NANCY BARRERA BERNAL, **VEREDA**: ALTAMIRA, **PREDIO**: CAMPO REAL



PRODUCTOR 2: ANTHONY LÓPEZ OREJUELA, **VEREDA**: BELLA VISTA, **PREDIO**: LOS ÁNGELES



PRODUCTOR 3: DIEGO ALEJANDRO CALA MARTHA, **VEREDA**: BELLA VISTA, **PREDIO**: LA ESMERALDA



PRODUCTOR 4: FERNANDO BARRERA MONTAÑA, **VEREDA**: BELLA VISTA, **PREDIO**: LA REFORMA II

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO: TEMA 2. ENMIENDA DE TERRENO - AGUAZUL



PRODUCTOR 5: KATHLEEN ROJAS CRUZ, **VEREDA**: BELLA VISTA, **PREDIO**: LA ESPERANZA



PRODUCTOR 6: RITA GLADYS MOLANO BARRE **VEREDA**: BELLA VISTA, **PREDIO**: TRES PALMAS



PRODUCTOR 7: YULIETH GRACIELA CORREA RINCÓN, **VEREDA**: BELLA VISTA, **PREDIO**: EL IMPERIO



PRODUCTOR 8: SANDRA MILENA PÉREZ DIAZ, **VEREDA**: BELLA VISTA, **PREDIO**: LA DORADA

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO: TEMA 2. ENMIENDA DE TERRENO - AGUAZUL



PRODUCTOR 9: CIELO DEL LLANO MONTAÑA AVELLA, **VEREDA**: BELLA VISTA, **PREDIO**: DESENGAÑO



PRODUCTOR 10: ELISA EUGENIA PÉREZ DIAZ, **VEREDA**: BELLA VISTA, **PREDIO**: LA ETERNIDAD



PRODUCTOR 11: LEONARDO RAMÍREZ VILLALOBOS, **VEREDA**: BELLA VISTA, **PREDIO**: MATAPALOS



PRODUCTOR 12: RONNIE HUERTAS SIERRA, **VEREDA**: LA GRACIELA, **PREDIO**: VILLA ROSA

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO: TEMA 2. ENMIENDA DE TERRENO - AGUAZUL



PRODUCTOR 13: MARIANO CHAPARRO TOVAR, **VEREDA:** LA GRACIELA, **PREDIO:** LOS ÁNGELES



PRODUCTOR 14: LEONILDE DIAZ NIÑO, **VEREDA:** LLANO LINDO, **PREDIO:** EL ESTERO



PRODUCTOR 15: RUTH CRUZ JARRO, **VEREDA:** LLANO LINDO, **PREDIO:** LA ESPERANZA



PRODUCTOR 16: ANDRÉS ENRIQUE MOLANO RODRÍGUEZ, **VEREDA:**PALO SOLO, **PREDIO:** VILLA CAROLA

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO: TEMA 2. ENMIENDA DE TERRENO - AGUAZUL



PRODUCTOR 17: CLARA PATRICIA NÚÑEZ SALAMANCA,
VEREDA: PALO SOLO, **PREDIO:** LA VORÁGINE



PRODUCTOR 18: ERICA LILIANA AVELLA MOLANO,
VEREDA:PALO SOLO, **PREDIO:** FUNDO BONITO



PRODUCTOR 19: GRACIELA MOLANO BARRERA,
VEREDA: PALO SOLO, **PREDIO:** LA MILAGROSA



PRODUCTOR 20: HÉCTOR MANUEL ARIAS VARGAS,
VEREDA: PALO SOLO, **PREDIO:** TRES ESQUINAS

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO: TEMA 2. ENMIENDA DE TERRENO - AGUAZUL



PRODUCTOR 21: MIRTA BALLESTEROS MARTÍNEZ, **VEREDA:** SAN RAFAEL, **PREDIO:** BRISAS DEL LLANO



PRODUCTOR 22: MARCO AURELIO SUAREZ, **VEREDA:** SAN RAFAEL, **PREDIO:** LA BALSORA



PRODUCTOR 23: ANDREA BALLESTEROS, **VEREDA:** SAN MIGUEL DE FARALLONES, **PREDIO:** PARAISO



PRODUCTOR 24: ILBIA MARTINEZ G., **VEREDA:** SAN MIGUEL DE FARALLONES, **PREDIO:** BUENOS AIRES

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO: TEMA 2. ENMIENDA DE TERRENO - AGUAZUL



PRODUCTOR 25: ROLFEN CHAPARRO, **VEREDA:** SAN MIGUEL DE FARALLONES, **PREDIO:** SAN ANTONIO



PRODUCTOR 26: ALBA PUERTO URINTIVE, **VEREDA:** GUAIMARO, **PREDIO:** EL DIAMANTE



PRODUCTOR 27: ANYELA LORENA BRAVO, **VEREDA:** SAN JOSE DE BUBUY, **PREDIO:** LA AMISTAD



PRODUCTOR 28: MARIELA TORRES TORRES, **VEREDA:** SAN LORENZO, **PREDIO:** ENVIDIA





6802

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO: TEMA 2. ENMIENDA DE TERRENO - AGUAZUL

PRODUCTOR 29: RENAN GONZALEZ CRISTANCHO, **VEREDA:** SAN LORENZO, **PREDIO:** LA ENVIDIA



PRODUCTOR 30: MARYI DANIT RODRIGUEZ, **VEREDA:** RIO CHIQUITO, **PREDIO:** LA ELEGIDA



PRODUCTOR 31: WILSON ORLANDO PERILLA, **VEREDA:** RIO CHIQUITO, **PREDIO:** ESMERALDA



PRODUCTOR 32: MARLENY SANTIAGO SANCHEZ, **VEREDA:** ESMERALDA, **PREDIO:** BONANZA



PRODUCTOR 33: WILSON BARRERA, **VEREDA:** RINCON DEL BUBUY, **PREDIO:** SANTA CECILIA LOTE 2



PRODUCTOR 34: SHIRLEY YAZMIN BULLA MARIÑO, **VEREDA:** SALITRE, **PREDIO:** BELGICA



CARRERA 17 No. 14-11
Email. consorciointerforrajes@gmail.com

CEL. 3134489057
Aguazul Casanare

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO: TEMA 2. ENMIENDA DE TERRENO - AGUAZUL

PRODUCTOR 35: ANGELA ROCIO NIÑO NEIRA, **VEREDA:** SAN JOSE DE BUBUY, **PREDIO:** PA QUE MAS	**PRODUCTOR 36:** FREDY MAURICIO CORREA LOPEZ, **VEREDA:** SALITRE, **PREDIO:** BELGICA
	
PRODUCTOR 37: LUIS HUMBERTO CARDENAS, **VEREDA:** TURUA, **PREDIO:** BUENOS AIRES	**PRODUCTOR 38:** EMMA DEL CARMEN JARRO AVELLA, **VEREDA:** ATALAYAS, **PREDIO:** LUCHA
	
PRODUCTOR 39: JORGE ELIECER LOPEZ, **VEREDA:** ESPERANZA, **PREDIO:** BUENOS AIRES	**PRODUCTOR 40:** FUNDACION YOVANY QUEVEDO, **VEREDA:** TESORO BUBUY, **PREDIO:** ALGARROBO

6804

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO: TEMA 2. ENMIENDA DE TERRENO - AGUAZUL



PRODUCTOR 41: JORGE HUGO MONTOYA, **VEREDA:** RINCON DEL BUBUY, **PREDIO:** SANTA HELENA



PRODUCTOR 42: JORGE ALIRIO DIAZ RODRIGUEZ, **VEREDA:** SAN RAFAEL, **PREDIO:** LA COTIZA



PRODUCTOR 43: FREDY GUSTAVO PINTO, **VEREDA:** ESMERALDA, **PREDIO:** SAN DIEGO



PRODUCTOR 44: ISABEL CRISTINA ACEVEDO YEPES, **VEREDA:** RINCON DEL BUBUY, **PREDIO:** ATENAS II



PRODUCTOR 45: KELLY JOHANA VILLAREAL OSPINO, **VEREDA:** ATALAYAS, **PREDIO:** LOTE 3 VILLA ISABEL


CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

1.2.3. JORNADA DE ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN PRÁCTICAS DE SIEMBRA DE FORRAJES.

Se hace seguimiento por parte de la interventoría al contratista para verificar las jornadas de orientación se estén cumpliendo según especificaciones técnicas en cuanto a tiempo, materiales e insumos, se verifica clasificación, tipos y cuidado de la semilla y tipos de siembra, materiales e insumos materiales e insumos y temáticas

Se registra la entrega del siguiente folleto:

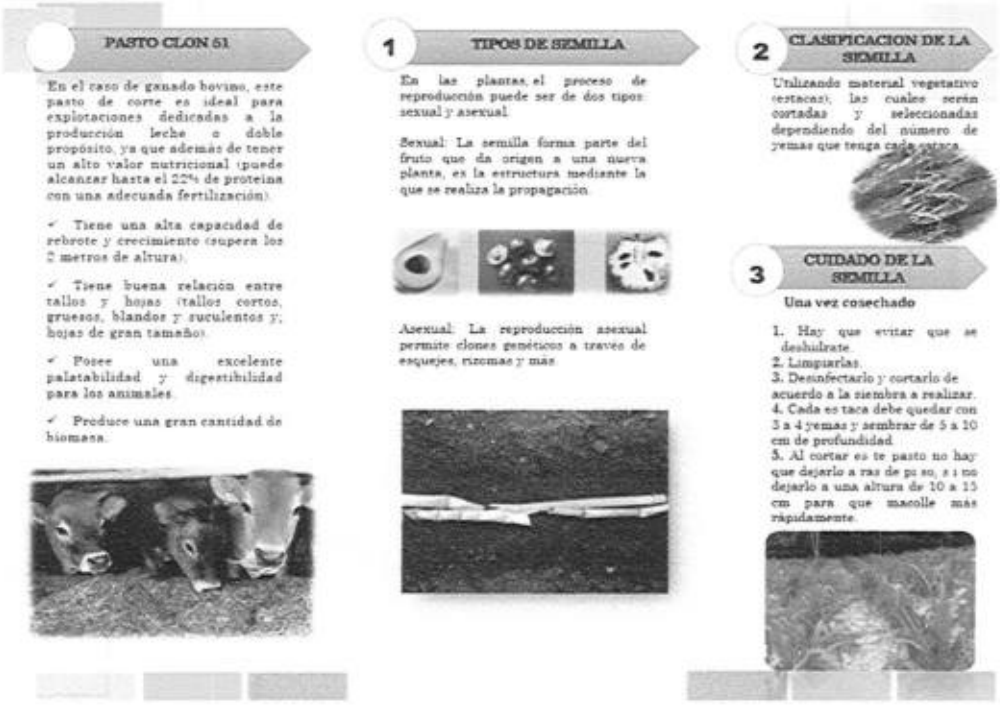

PASTO CLON 51

En el caso de ganado bovino, este pasto de corte es ideal para explotaciones dedicadas a la producción leche o doble propósito, ya que además de tener un alto valor nutricional (puede alcanzar hasta el 22% de proteína con una adecuada fertilización):

- ✓ Tiene una alta capacidad de rebrote y crecimiento (supera los 2 metros de altura).
- ✓ Tiene buena relación entre tallos y hojas (tallos cortos, gruesos, blandos y suculentos y; hojas de gran tamaño).
- ✓ Posee una excelente palatabilidad y digestibilidad para los animales.
- ✓ Produce una gran cantidad de biomasa.

1 TIPOS DE SEMILLA

En las plantas el proceso de reproducción puede ser de dos tipos: sexual y asexual.

Sexual: La semilla forma parte del fruto que da origen a una nueva planta, es la estructura mediante la que se realiza la propagación.

Asexual: La reproducción asexual permite clones genéticos a través de esquejes, rizomas y más.

2 CLASIFICACION DE LA SEMILLA

Utilizando material vegetativo (estacas); las cuales serán cortadas y seleccionadas dependiendo del número de yemas que tenga cada estaca.

3 CUIDADO DE LA SEMILLA


Una vez cosechado

1. Hay que evitar que se deshidrate.
2. Limpiarlas.
3. Desinfectarlo y cortarlo de acuerdo a la siembra a realizar.
4. Cada es taca debe quedar con 3 a 4 yemas y sembrar de 5 a 10 cm de profundidad.
5. Al cortar es te pasto no hay que dejarlo a ras de pi so, s i no dejarlo a una altura de 10 a 15 cm para que macolle más rápidamente.

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

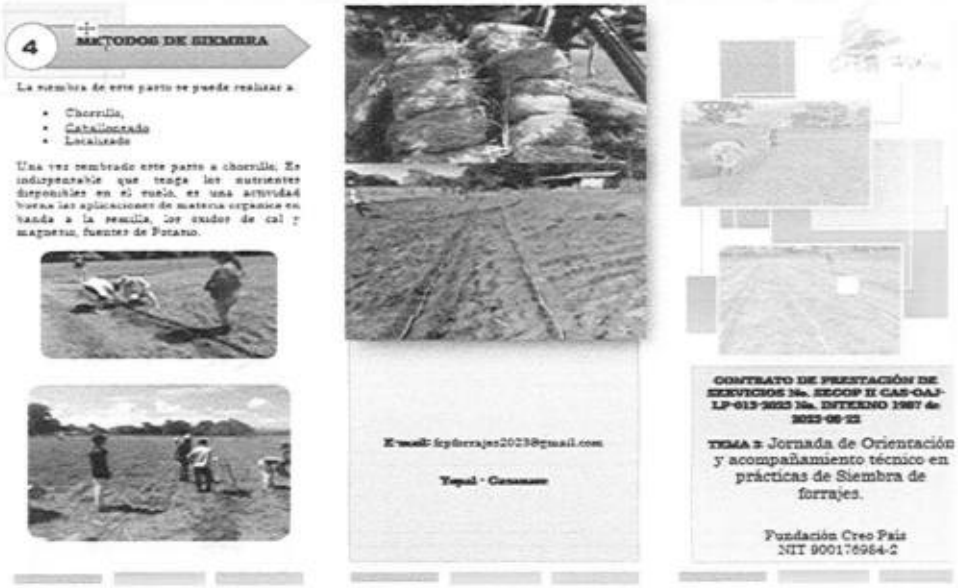

CONSOLIDADO: TEMA 3. SIEMBRA - TÁMARA	
	
PRODUCTOR 1: WILMAN FERNANDO LATRIGLIA ORTIZ, **VEREDA**: EL TABLON, **PREDIO**: GRANJA EMUNA	**PRODUCTOR 2:** HEIDY ALEXANDRA TUMAY ANZUETA, **VEREDA**: EL TABLON, **PREDIO**: GRANJA EL EMUNA

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO: TEMA 3. SIEMBRA - TÁMARA



PRODUCTOR 3: WILBER NIÑO RODRIGUEZ, **VEREDA**: EL TABLON, **PREDIO**: VILLA MARINA



PRODUCTOR 4: FACUNDO ABRIL ESTRADA, **VEREDA**: EL TABLON, **PREDIO**: VILLA LUZ



PRODUCTOR 5: YINA KATERINE SILVA PATIÑO, **VEREDA**: LAS ISABELAS, **PREDIO**: LA SARITA



PRODUCTOR 6: LEYDER ARCADIO PALENCIA NIÑO, **VEREDA**: LAJA, **PREDIO**: ESPERANZA

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO: TEMA 3. SIEMBRA - TÁMARA



PRODUCTOR 7: LUIS ANGEL FUENTES RODRIGUEZ, **VEREDA**: LAJA, **PREDIO**: MARBELLA

CONSOLIDADO: TEMA 3. SIEMBRA - VILLANUEVA



PRODUCTOR 1: IDINAEL RAMOS ALDANA, **VEREDA**: COLMENA, **PREDIO**: BELLAVISTA



PRODUCTOR 2: JAIRO QUELVIS REYES MORENO, **VEREDA**: HORQUETON, **PREDIO**: CHICHARRA

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO: TEMA 3. SIEMBRA - VILLANUEVA



PRODUCTOR 3: JEINER LEANDRO RAMOS LOZANO, **VEREDA**: COLMENA, **PREDIO**: BELLAVISTA



PRODUCTOR 4: JOSE GABINO BONILLA TORRES, **VEREDA**: HORQUETON**PREDIO**: GUADUALITO

CONSOLIDADO: TEMA 3. SIEMBRA - AGUAZUL



PRODUCTOR 1: NANCY BARRERA BERNAL, **VEREDA**: ALTAMIRA, **PREDIO**: CAMPO REAL



PRODUCTOR 2: ANTHONY LÓPEZ OREJUELA, **VEREDA**: BELLA VISTA, **PREDIO**: LOS ÁNGELES

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO: TEMA 3. SIEMBRA - AGUAZUL



PRODUCTOR 3: DIEGO ALEJANDRO CALA MARTHA, **VEREDA**: BELLA VISTA, **PREDIO**: LA ESMERALDA



PRODUCTOR 4: FERNANDO BARRERA MONTAÑA, **VEREDA**: BELLA VISTA, **PREDIO**: LA REFORMA II



PRODUCTOR 5: KATHLEEN ROJAS CRUZ, **VEREDA**: BELLA VISTA, **PREDIO**: LA ESPERANZA



PRODUCTOR 6: RITA GLADYS MOLANO BARRE **VEREDA**: BELLA VISTA, **PREDIO**: TRES PALMAS

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO: TEMA 3. SIEMBRA - AGUAZUL



PRODUCTOR 7: YULIETH GRACIELA CORREA RINCÓN, **VEREDA**: BELLA VISTA, **PREDIO**: EL IMPERIO



PRODUCTOR 8: SANDRA MILENA PÉREZ DIAZ, **VEREDA**: BELLA VISTA, **PREDIO**: LA DORADA



PRODUCTOR 9: CIELO DEL LLANO MONTAÑA AVELLA, **VEREDA**: BELLA VISTA, **PREDIO**: DESENGAÑO



PRODUCTOR 10: ELISA EUGENIA PÉREZ DIAZ, **VEREDA**: BELLA VISTA, **PREDIO**: LA ETERNIDAD

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO: TEMA 3. SIEMBRA - AGUAZUL



PRODUCTOR 11: LEONARDO RAMÍREZ VILLALOBOS, **VEREDA**: BELLA VISTA, **PREDIO**: MATAPALOS



PRODUCTOR 12: RONNIE HUERTAS SIERRA, **VEREDA**: LA GRACIELA, **PREDIO**: VILLA ROSA



PRODUCTOR 13: MARIANO CHAPARRO TOVAR, **VEREDA:** LA GRACIELA, **PREDIO:** LOS ÁNGELES



PRODUCTOR 14: LEONILDE DIAZ NIÑO, **VEREDA:** LLANO LINDO, **PREDIO:** EL ESTERO

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO: TEMA 3. SIEMBRA - AGUAZUL



PRODUCTOR 15: RUTH CRUZ JARRO, **VEREDA:** LLANO LINDO, **PREDIO:** LA ESPERANZA



PRODUCTOR 16: ANDRÉS ENRIQUE MOLANO RODRÍGUEZ, **VEREDA:**PALO SOLO, **PREDIO:** VILLA CAROLA



PRODUCTOR 17: CLARA PATRICIA NÚÑEZ SALAMANCA, **VEREDA:** PALO SOLO, **PREDIO:** LA VORÁGINE



PRODUCTOR 18: ERICA LILIANA AVELLA MOLANO, **VEREDA:**PALO SOLO, **PREDIO:** FUNDO BONITO

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO: TEMA 3. SIEMBRA - AGUAZUL



PRODUCTOR 19: GRACIELA MOLANO BARRERA, **VEREDA:** PALO SOLO, **PREDIO:** LA MILAGROSA



PRODUCTOR 20: HÉCTOR MANUEL ARIAS VARGAS, **VEREDA:** PALO SOLO, **PREDIO:** TRES ESQUINAS



PRODUCTOR 21: MIRTA BALLESTEROS MARTÍNEZ, **VEREDA:** SAN RAFAEL, **PREDIO:** BRISAS DEL LLANO



PRODUCTOR 22: MARCO AURELIO SUAREZ, **VEREDA:** SAN RAFAEL, **PREDIO:** LA BALSORA

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO: TEMA 3. SIEMBRA - AGUAZUL



PRODUCTOR 23: ANDREA BALLESTEROS, **VEREDA:** SAN MIGUEL DE FARALLONES, **PREDIO:** PARAISO



PRODUCTOR 24: ILBIA MARTINEZ G., **PREDIO**: SAN MIGUEL DE FARALLONES, **VEREDA:** BUENOS AIRES



PRODUCTOR 25: ROLFEN CHAPARRO, **PREDIO**: SAN MIGUEL DE FARALLONES, **VEREDA:** SAN ANTONIO



PRODUCTOR 26: ALBA PUERTO URINTIVE, **VEREDA:** GUAIMARO, **PREDIO:** EL DIAMANTE

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO: TEMA 3. SIEMBRA - AGUAZUL

	
PRODUCTOR 27: ANYELA LORENA BRAVO, **VEREDA:** SAN JOSE DE BUBUY, **PREDIO:** LA AMISTAD	**PRODUCTOR 28:** MARIELA TORRES TORRES, **VEREDA:** SAN LORENZO, **PREDIO:** ENVIDIA
	
PRODUCTOR 29: RENAN GONZALEZ CRISTANCHO, **VEREDA:** SAN LORENZO, **PREDIO:** LA ENVIDIA	**PRODUCTOR 30:** MARYI DANIT RODRIGUEZ, **VEREDA:** RIO CHIQUITO, **PREDIO:** LA ELEGIDA

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO: TEMA 3. SIEMBRA - AGUAZUL



PRODUCTOR 31: WILSON ORLANDO PERILLA, **VEREDA:** RIO CHIQUITO, **PREDIO:** ESMERALDA



PRODUCTOR 32: MARLENY SANTIAGO SANCHEZ, **VEREDA:** ESMERALDA, **PREDIO:** BONANZA



PRODUCTOR 33: WILSON BARRERA, **VEREDA:** RINCON DEL BUBUY, **PREDIO:** SANTA CECILIA LOTE 2



PRODUCTOR 34: SHIRLEY YAZMIN BULLA MARIÑO, **VEREDA:** SALITRE, **PREDIO:** BELGICA

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO: TEMA 3. SIEMBRA - AGUAZUL



PRODUCTOR 35: ANGELA ROCIO NIÑO NEIRA, **VEREDA:** SAN JOSE DE BUBUY, **PREDIO:** PA QUE MAS



PRODUCTOR 36: FREDY MAURICIO CORREA LOPEZ, **VEREDA:** SALITRE, **PREDIO:** BELGICA



PRODUCTOR 37: LUIS HUMBERTO CARDENAS, **VEREDA:** TURUA, **PREDIO:** BUENOS AIRES



PRODUCTOR 38: EMMA DEL CARMEN JARRO AVELLA, **VEREDA:** ATALAYAS, **PREDIO:** LUCHA

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO: TEMA 3. SIEMBRA - AGUAZUL



PRODUCTOR 39: JORGE ELIECER LOPEZ, **VEREDA:** ESPERANZA, **PREDIO:** BUENOS AIRES



PRODUCTOR 40: FUNDACION YOVANY QUEVEDO, **VEREDA:** TESORO BUBUY, **PREDIO:** ALGARROBO



PRODUCTOR 41: JORGE HUGO MONTOYA, **VEREDA:** RINCON DEL BUBUY, **PREDIO:** SANTA HELENA



PRODUCTOR 42: JORGE ALIRIO DIAZ RODRIGUEZ, **VEREDA:** SAN RAFAEL, **PREDIO:** LA COTIZA

6820

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CONSOLIDADO: TEMA 3. SIEMBRA - AGUAZUL



PRODUCTOR 43: FREDY GUSTAVO PINTO, **VEREDA:** ESMERALDA, **PREDIO:** SAN DIEGO



PRODUCTOR 44: ISABEL CRISTINA ACEVEDO YEPES, **VEREDA:** RINCON DEL BUBUY, **PREDIO:** ATENAS II



PRODUCTOR 45: KELLY JOHANA VILLAREAL OSPINO, **VEREDA:** ATALAYAS, **PREDIO:** LOTE 3 VILLA ISABEL

CARRERA 17 No. 14-11
Email. consorciointerforrajes@gmail.com
CEL. 3134489057
Aguazul Casanare

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CAPITULO II

CONTROL Y SEGUIMIENTO INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO N° SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 Y NUMERO INTERNO 1987 DE 2023-08-22- DE PRESTACION DE SERVICIOS OBJETO DE LA INTERVENTORIA CUYO OBJETO ES "FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

RESUMEN GENERAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATO No.:	SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 Y NUMERO INTERNO 1987 DE 2023-08-22
CONTRATISTA:	**FUNDACIÓN CREO PAÍS -** NIT. 900.176.984-2
REPRESENTANTE LEGAL:	**FABIO ALFONSO VERA OTALORA; -** C.C. 1.116.543.925 de Aguazul
OBJETO:	"FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE
FECHA ACTA INICIO:	14 DE SEPTIEMBRE DE 2023
VALOR DEL CONTRATO:	SIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS MCTE. ($ 7.132.362.500,00).
VALOR DEL ANTICIPO (40%) - VALOR ADICIONAL:	DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE. ($ 2.852.945.000,00)
ACTA PARCIAL No. 01	$2.429.262.500,00
PLAZO:	CINCO (5) MESES
PRORROGA	3 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN	21 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DE SUSPENSIÓN No.1:	TRES (03) MESES
AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No. 1	UN (1) MES
FECHA ACTA DE REINICIO:	18 DE ABRIL DE 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	9 DE SEPTIEMBRE DE 2024
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERPRADERAS 2023 R.L. ALEXANDER DUARTE SIERRA

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CAPITULO 2: INFORME JURIDICO, ADMINISTRATIVO, CONTABLE Y FINANCIERO

INFORME LEGAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

La firma interventora ha realizado seguimiento y verificación a la ejecución de las actividades jurídicas, administrativas, contables y financieras del contrato de prestación de servicios No. 1987 DE 2023, por tal razón se relacionan las siguientes acciones.

ESTUDIO PREVIO

El día 16 de junio de 2023, se generó el estudio previo para el proyecto "FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJES EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERIA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIO DE AGUAZUL, MANI, TAMARA, TAURAMENA Y VILLANUENVA EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE", que beneficia a 175 pequeños y medianos productores ganaderos del Departamento de Casanare.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El día 23 de junio de 2023, el Departamento de Casanare, generó el Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP No. 23000207, para el proyecto "FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN GANADERA EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE" por un valor de SIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS MCTE. ($ 7.132.362.500,00)., por concepto de: "FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJES EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERIA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIO DE AGUAZUL, MANI, TAMARA, TAURAMENA Y VILLANUENVA EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

RESOLUCIÓN DE APERTURA DEL PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA No. CAS-OAJ-LP-013-2023.

Mediante resolución 0240 del 14 de julio de 2023, el jefe de la Oficina Jurídica de la Gobernación de Casanare ordena la apertura de un proceso contractual.

PLIEGO DEFINITIVO DE CONDICIONES DEL PROCESO DE LICITACIÓN

El día 18 de julio de 2023 se publicó por parte del Departamento de Casanare en la Plataforma SECOP II, los pliegos PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVOS para el desarrollo del Proceso de Licitación Pública CAS-OAJ-LP-013-2023, que tiene por objeto: "FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA.

Mediante Resolución de Adjudicación No. 0275, el dieciséis (16) de agosto de 2023, se llevó a cabo la AUDIENCIA PÚBLICA DE ADJUDICACIÓN y después de efectuada la evaluación de la propuesta, la verificación de requisitos habilitantes y ponderación, el comité evaluador recomienda a la jefe de la oficina asesora jurídica adjudicar la Licitación Pública CAS-OAJ-LP-013-2023, cuyo objeto es: "FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE" al oferente FUNDACIÓN CREO PAÍS con Nit. 900.176.984 – 2, representada legalmente por FABIO ALFONSO VERA OTALORA, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.116.543.925 expedida en Aguazul (Casanare); al considerar que su propuesta resulta favorable técnica, jurídica y financieramente para la entidad tras obtener 99,75 puntos y el primer lugar de elegibilidad, por un valor de SIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS MCTE. ($ 7.132.362.500,00).

FIRMA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2242 DE 2021.

El día veintidós (22) de agosto de 2023 firmaron el Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 Y NUMERO INTERNO 1987 DE 2023-08-22, que tiene por objeto: "FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE", con un plazo de ejecución de cinco (5) meses y por valor de SIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS MCTE. ($ 7.132.362.500,00), entre la FUNDACIÓN CREO PAÍS con Nit. 900.176.984-2 y el DEPARTAMENTO DE CASANARE.

PÓLIZAS PRESENTADAS Y APROBADAS PARA EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2242 DE 2021.

Firmado el Contrato de Prestación de Servicios No. . SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 Y NUMERO INTERNO 1987 DE 2023-08-22 y conforme a lo establecido en la Cláusula Novena del mismo, se constituyó a favor del DEPARTAMENTO DE

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

CASANARE las garantías únicas expedidas por la compañía de seguros **Colombia S.A.**, las cuales se encuentran aprobadas por la oficina asesora jurídica de la Gobernación de Casanare, de acuerdo al siguiente detalle:

Evento		Descripción de los amparos (ajuste según contrato)					
		Cumplimiento.	Buen manejo Anticipo	Pago de salarios, Prestaciones Sociales	Calidad del servicio.	Responsabilidad Civil.	Adicione conforme al contrato
		N° 69884	N° 69884	N° 69884	N° 69884	N° 20414	N° Póliza
SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22	Desde.	10% 25/08/2023	100% 25/08/2023	5% 25/08/2023	10% 25/08/2023	500 S.M.M.L.V 25/08/2023	Porcentaje (dd/mm/aaaa)
	Hasta.	26/05/2024	26/05/2024	26/01/2027	26/05/2024	26/01/2024	(dd/mm/aaaa)
Fecha de aprobación de la póliza		12/09/2023	12/09/2023	12/09/2023	12/09/2023	12/09/2023	(dd/mm/aaaa)
Acta de Inicio N° 1 Digite el Evento	% - SMLV	10%	100%	5%	10%	500 S.M.M.L.V	Porcentaje
	Desde.	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	(dd/mm/aaaa)
	Hasta.	15/04/2024	15/06/2024	15/02/2027	15/04/2024	15/02/2024	(dd/mm/aaaa)
Fecha de aprobación de la póliza		19/09/2023	19/09/2023	19/09/2023	19/09/2023	19/09/2023	(dd/mm/aaaa)
Prorroga N° 1 Digite el Evento	% - SMLV	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
	Desde.	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	(dd/mm/aaaa)
	Hasta.	15/09/2024	15/09/2024	15/05/2027	15/09/2024	15/05/2024	(dd/mm/aaaa)
Fecha de aprobación de la póliza		20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	20/12/2023	(dd/mm/aaaa)
Acta de Reinicio. N° 1 Digite el Evento	% - SMLV	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
	Desde.	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	14/09/2023	(dd/mm/aaaa)
	Hasta.	15/01/2025	15/01/2025	15/09/2027	15/01/2025	15/09/2024	(dd/mm/aaaa)
Fecha de aprobación de la póliza		29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	(dd/mm/aaaa)

APERTURA DE LA FIDUCIA.

La firma interventora verificó que el día 16 de diciembre de 2021, se celebró entre FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. y la FUNDACION CREO PAIS, el contrato de fiducia Mercantil irrevocable para la administración y pago para el manejo de anticipos con No. 16571, de igual manera se apertura la cuenta de ahorros No. 36300006168 – P.A. ANT. FUNDACIÓN CREO PAÍS 1987, para el desembolso del 40% del anticipo del Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. 1987 DE 2023-08-22.

PAGO DE ESTAMPILLAS

La interventoría verificó que la **FUNDACIÓN CREO PAIS** consignó al DEPARTAMENTO DE CASANARE, la suma de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 534.927.163,00), por los conceptos referentes a estampilla pro-cultura, estampilla pro-desarrollo, estampilla pro-adulto mayor, tasa pro deporte Y Tasa Pro-Unitropico, como se enuncia en la siguiente tabla:

Concepto	Estampilla Pro-cultura Cód: 130588001	Estampilla Pro-Adulto Mayor Cód: 130588002	Estampilla Pro-Desarrollo Cód: 130588003	Tasa Pro-Deporte y Recreación Cód:131101005	Estampilla Pro-Unitrópico Cód: 130588005	Número	Fecha
	Valor	Valor	Valor	Valor			
Valor Total Inicial	$ 71.323.600,00	$ 213.970.900,00	$ 71.323.600,00	$ 178.309.063,00	$106.985.438.00	NC 23027312 NC 23027314 NC 23027313 NC 23027315 NC 23027317	06/09/2023

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

APROBACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

El día 20 de septiembre de 2023, la interventoría dio viabilidad para el pago de anticipo, la supervisión aprobó el Plan de Inversión del Anticipo, presentado por la Fundación Creo País, tal como se detalla a continuación:

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
1	Pago de salarios y jornales		0,00%
2	Compra de equipos y repuestos		0,00%
3	Transporte y alquiler de maquinaria	$ 106.080.000,00	3,72%
4	Compra de materiales y accesorios	$ 2.746.865.000,00	96,28%
	TOTAL	**$ 2.852.945.000,00**	**100%**

PRORROGA NO. 1:

El 7 de diciembre de 2023 la Fundación Creo País realizo solicitud de prórroga No 1 al CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22 cuyo objeto contractual es "FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERIA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES EN LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANI, TAMARA, TAURAMENA, Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DECASANARE". Por un término de 3 Meses y fue viabilizado por la interventoría CONSORCIO INTERPRADERAS 2023 el 7 de diciembre de 2023.

El 12 de diciembre de 2023 se suscribió Prorroga No 1 al CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22 por un término de Tres (3) Meses.

ACTA PARCIAL No.1

La Fundación Creo País presentó informe con sus respectivos soportes para Acta parcial No. 1, del periodo comprendido entre el 14 de septiembre al 13 de diciembre de 2023, la cual fue avalada por la interventoría y se suscribió acta parcial No. 1 con la Entidad contratante el día 15 de diciembre de 2023 por un valor de $ 2.429.262.500 que equivale el 34.06% del valor del contrato, del cual se amortizó el 40% en calidad de anticipo.

SUSPENSIÓN No.1

El día 21 de diciembre del 2023, se radicó solicitud de suspensión al **CONSORCIO INTERPRADERAS 2023**, firma interventora del Contrato de Prestación de Servicios No. 1 SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22, cuyo

objeto es "FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE", solicitando la suspensión al contrato por un periodo de tres (03) meses, hasta que se resuelvan los inconvenientes de fuerza mayor planteados por el contratista. Mismo día en el que la interventoría contratada da viabilidad a la suspensión solicitada, la misma es viabilizada por la supervisión del contrato y protocolizada mediante acta de suspensión de fecha 21 de diciembre de 2023, suscrita por la supervisión, interventoría y contratista.

AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No.1

El día 18 de marzo de 2024, se radicó solicitud de ampliación a la suspensión No. 1 a la interventoría contratada **CONSORCIO INTERPRADERAS 2023** del Contrato de Prestación de Servicios No. 1 SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22, cuyo objeto es "FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE", solicitando la ampliación a la suspensión al contrato por un periodo de un mes (01) mes, hasta que se resuelvan los inconvenientes de fuerza mayor planteados por el contratista. Ante lo cual la interventoría da la viabilidad y radica a la Gobernación de Casanare el día 19 de marzo de 2024 la respectiva de viabilidad con sus soportes.

REINICIO No.1

El día 18 de abril de 2024, superada las causales de suspensión y ampliación a la suspensión se suscribe acta de reiniciación al Contrato de Prestación de Servicios No. 1 SECOP II CAS-OAJ-LP-013-2023 y No. INTERNO 1987 DE 2023-08-22, cuyo objeto es "FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE FORRAJE EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPOSITO QUE ADELANTAN LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE AGUAZUL, MANÍ, TÁMARA, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE", el cual tiene nueva fecha de terminación el día 09 de septiembre de 2024.

BUEN MANEJO E INVERSIÓN DEL ANTICIPO

Acta de anticipo

El día 20 de septiembre de 2023, se firma el acta de entrega del anticipo No. 1, la cual se encuentra firmada por el Ing. ALEXANDER BARRERA GIRÓN en calidad de Supervisor, el Ing. FABIO ALFONSO VERA OTALORA, representante legal de

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

la FUNDACION CREO PAIS, y el Ing. ALEXANDER DUARTE SIERRA, interventoría Contratada, por un valor de $ 2.852.945.000,00 que equivale al anticipo del 40%.

Desembolso Anticipo

El día 21 de septiembre de 2023, mediante orden de pago No. 230435 se giró por parte del Departamento de Casanare el anticipo a la Fiduciaria Bancolombia.

Ordenes de Operación generadas para el desembolso de los recursos de anticipo.

Para el desembolso del valor del anticipo se generaron las siguientes ordenes de operación:

- Ordenes de operación generadas para el desembolso del Anticipo.

No.	CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE	NOMBRE PROVEEDOR O CONTRATISTA	ORDEN DE OPERACIÓN No.	VALOR
1	Transporte y alquiler de maquinaria	$ 106.080.000,00	3,72%	AGROPECUARIA LA FE G&T S.A.S Z	3	$ 106.080.000,00
2	Compra de materiales y accesorios	$ 2.746.865.000,00	96,28%			$ 2.746.865.000,00
TOTAL		**$ 2.852.945.000,00**	**100,00%**	**TOTAL PROVEEDORES**		**$ 2.852.945.000,00**

- **ORDEN DE OPERACIÓN No. 3 – SUMINISTRO Y SERVICIOS DE MECANIZACION,** se giró a nombre de AGROPECUARIA LA FE G&T S.A.S NIT. 901.244.917- 4, por valor de DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE ($ 2.852.945.000,00).

Las Ordenes de Operación No. 1 y 2 fueron anuladas por observaciones de la Fiduciaria, por tanto, la Orden Aprobada corresponde al No.

PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO EJECUTOR

Para el desarrollo de estas actividades la Fundación Creo Pais presento a la interventoría el personal requerido para la actividad 1.2 de acuerdo con los siguientes perfiles:

CANTIDAD	PROFESIONAL	EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA
Cantidad: 5 PROFESIONAL 1	Profesional en Zootecnista o Médico veterinario y Zootecnista	Título Profesional Universitario y Tarjeta Profesional; experiencia profesional de Dos (2) años, de los cuales se debe acreditar como mínimo Un (1) año de experiencia relacionada en el desarrollo de proyectos relacionados con el establecimiento de praderas y/o bancos de forrajes Categoría 4 según Decreto

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

		0002 del 04 de enero de 2021 de la Gobernación de Casanare - marco de referencia de experiencia y costo honorarios por prestación de servicios.
Cantidad: 5 PROFESIONAL 2	Profesional en Ingeniería Agronómica o Agronomía	Título Profesional Universitario y Tarjeta Profesional; experiencia profesional de Dos (2) años, de los cuales se debe acreditar como mínimo Un (1) año de experiencia relacionada en el desarrollo de actividades de establecimiento de praderas y/o bancos de forraje Categoría 4 según Decreto 0002 del 04 de enero de 2021 de la Gobernación de Casanare - marco de referencia de experiencia y costo honorarios por prestación de servicios.

Siendo así los profesionales aprobados son los siguientes:

Profesional	Perfil Requerido	Nombre del profesional	Profesión
1	Profesional en medicina veterinaria y zootecnia o en zootecnia, con título profesional universitario y tarjeta profesional; experiencia profesional de dos (2) años, de los cuales se debe acreditar como mínimo un (1) año de experiencia relacionada en el desarrollo de actividades de establecimiento de praderas y/o bancos de forraje.	JORGE ARMANDO BARRERA NIETO	MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA
		CARLOS ARMANDO GONZÁLEZ HERNANDEZ	ZOOTECNISTA
		JOHN ALEXANDER LÓPEZ MARTINEZ	ZOOTECNISTA
2	Profesional en ingeniería agronómica o agronomía, con título profesional universitario y tarjeta profesional; experiencia profesional de dos (2) años, de los cuales se debe acreditar como mínimo un (1) año de experiencia relacionada en el desarrollo de actividades de establecimiento de praderas y/o bancos de forraje.	Marilú Soracá Reyes	Ingeniero Agrónomo
		Vigdonia Gutiérrez	Ingeniero Agrónomo
		Oscar Cadena	Ingeniero Agrónomo
		Miguel Andres Ramos Caballero	Ingeniero Agrónomo
		Edgar Fernando Guiza Sanchez	Ingeniero Agrónomo

MATRIZ DE EJECUCIÓN FISICO - FINANCIERA.

La firma interventora en la siguiente tabla presenta el resumen físico-financiero avalado por la interventoría del contrato de prestación de servicios No. 1987 de 2023.

6829

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023

Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

RESUMEN EJECUCIÓN FISICO - FINANCIERA DEL PROYECTO					
No. ACTIVIDAD	**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD**	**VALOR CONTRATADO**	**ACTA PARCIAL No 1**	**ACTA PARCIAL No 2**	**ACUMULADO TOTAL**
1.1.	CONVOCATORIA, SOCIALIZACIÓN, INSCRIPCIÓN, VERIFICACIÓN DE PREDIOS Y SELECCIÓN DE PRODUCTORES A BENEFICIAR CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO	**$ 39.000.000,00**	$ -	$ 39.000.000,00	$ 39.000.000,00
1.2.	REALIZAR LA ORIENTACIÓN TÉCNICA A LOS 175 PRODUCTORES BENEFICIARIOS DEL PROYECTO EN COMPETENCIAS RELACIONADAS CON LA PRODUCCIÓN DE FORRAJE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPÓSITO.	**$ 224.000.000,00**	$ -	$ 33.600.000,00	$ 33.600.000,00
2.1.	IMPLEMENTACIÓN DE BANCOS DE FORRAJE EN 175 UNIDADES PRODUCTIVAS DE GANADERÍA TIPO DOBLE PROPÓSITO EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE	**$ 6.869.362.500,00**	$ 2.429.262.500,00	$ 1.802.740.000,00	$ 4.232.002.500,00
SUB-TOTAL		**$7.132.362.500,00**	**$2.429.262.500,00**	**$ 1.875.340.000,00**	**$ 4.304.602.500,00**
AMORTIZACIÒN DEL ANTICIPO (40%)			$ 971.705.000,00	$ 750.136.000,00	$ 1.721.841.000,00
VALOR PARA COBRAR			**$ 1.457.557.500,00**	**$ 1.125.204.000,00**	**$ 2.582.761.500,00**
PORCENTAJE			**34,06%**	**26,29%**	**60,35%**

A la fecha llevan una ejecución físico-financiera del 60,35% acumulado equivalente a (**$ 4.304.602.500,0**), con un porcentaje de avance para este mes de 18,74%

6830

CONSORCIO INTERPRADERAS 2023
Nit: 901750131-2

AVAL INFORME ACTA PARCIAL No. 2 DEL PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 18 DE JULIO DE 2024

RECOMENDACIONES

- Se recomienda a la empresa ejecutora completar la base social del proyecto al corte del informe de aval llevan un total de 169 seleccionados
- Se recomienda a la empresa ejecutora presentar los informes dentro de los plazos establecidos.
- Se recomienda a la empresa ejecutora cumplir con el cronograma presentado semanalmente para la intervención de predios en cuanto a jornadas e implementación de los bancos de forrajes de los beneficiarios ya seleccionados

Atentamente;

Alexander Duarte Sierra
ALEXANDER DUARTE SIERRA
Representante Legal
CONSORCIO INTERPRADERAS 2023.
