INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS No. 2374 de 2024, CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA – CODALTEC,
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE MARZO DE 2025

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	Contratar el desarrollo e implementación de un sistema integral de Anti Drones (Contra Aeronaves No Tripuladas C-UAS) para el Ejército Nacional.		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	BOGOTÁ D.C.		
BENEFICIARIO:	EJÉRCITO NACIONAL		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 61.811.415.199,00
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO		$ 61.811.415.199,00
FECHA SUSCRIPCIÓN	27/11/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	03/06/2025		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	MARLENY RIVERA GALEANO		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	MARLENY RIVERA GALEANO	01/12/2024	A LA FECHA
	SERGIO SANJUAN SANTIAGO	27/11/2024	01/12/2024
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	FAIVER RIVERA MONTES	04/12/2024	31/12/2024
	FAIVER RIVERA MONTES	11/02/2025	A LA FECHA
	SERGIO O. BERNAL J.	18/02/2025	A LA FECHA
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No.106024	15/11/2024	$ 50.067246.311,00
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No.1924	15/11/2024	$ 11.744.168.888,00
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL			
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 30-44-101060994	04/12/2024	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	04/12/2024		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	Cumplimiento del Contrato FECHA: 06/12/2025		
	Calidad del Servicio FECHA: 06/06/2028		
	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales FECHA: 06/12/2025		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	N/A		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	N/A		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	$1.207.490.041 + IVA		
VALOR DE OBRA	$60.374.502.050		
VALOR INTERVENTORÍA	N/A		
VALOR TOTAL	$ 61.811.415.199,00		

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	Contra entrega de los siguientes documentos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Aprobación de Póliza. C. Acta de aprobación del cronograma de ejecución del proyecto por el comité de seguimiento técnico operativo.	NO APLICA	16/12/2024 y 21/02/2025	$ 24.451.673.330
SEGUNDO DESEMBOLSO	Contra entrega de los siguientes productos: A. Carta del fabricante de la solución donde certifique la recepción y aceptación de las órdenes de compra generadas por el contratista. B. Certificación del contratista derivado en la que indique que los elementos se encuentran en fabricación indicando la fecha de inicio y fecha estimada del término de fabricación y envío de los equipos que componen los sistemas. C. El correspondiente informe del avance de ejecución.	NO APLICA	24/02/2025	$ 25.615.572.981
TERCER DESEMBOLSO	Contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación de los supervisores del proyecto donde se acredite que la totalidad de los bienes adquiridos han sido despachados de fábrica y se encuentran en proceso de nacionalización en territorio colombiano, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe con registro fotográfico; 2) Certificación de despacho de los equipos por parte del fabricante	NO APLICA	DD/MM/AAAA	$5.872.084.444
ÚLTIMO DESEMBOLSO	Contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación de los supervisores del proyecto que acredite el cumplimiento del 100% de ejecución del contrato derivado, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe final con registro fotográfico. 2) Acta de recibo a satisfacción firmada por el Ejército Nacional. 3) Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado. 4) Todos los informes financieros, informes técnicos de supervisión que se han derivado de la ejecución contractual, inventario de equipos, manuales de operación y mantenimiento, certificaciones de capacitación y entrenamiento y demás documentos que evidencien la transferencia del conocimiento asociado a los equipos objeto del contrato. Los impuestos, tasas y contribuciones municipales, departamentales o nacionales que pudieran generarse serán asumidos por medio de los recursos disponibles para la ejecución de los proyectos priorizados.	100%	DD/MM/AAAA	$5.872.084.444
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$ 50.067.246.311
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA CONTRATO

Nombre Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
30-44-101060994	Cumplimiento 20% (del valor de la Administración de recursos)	$ 287.382.629,76	03/12/2024	06/12/2025
	Calidad de servicio 20% (del valor de la Administración de recursos)	$ 287.382.629,76	03/12/2024	06/06/2028
	Pagos de salarios 5% (del valor de la Administración de recursos)	$ 71.845.657,44	06/06/2025	06/12/2025

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución implementación***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. 097 de 2024	ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE ANTIDRONES (CONTRA AERONAVES NO TRIPULADAS C-UAS) PARA ELEJÉRCITO NACIONAL	$ 60.371.994.550,00
	DD/MM/AAAA	$ 0,00


Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NEWSAT SAS		NIT 830.513.366-3
Fecha de Acta de inicio del contrato	19/12/2024		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	19/06/2025		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 60.371.994.550,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA SA**		
PÓLIZA No.	84763 y 24532		
FECHA DE LA PÓLIZA	18/12/2024		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DE CODALTEC: ENERO DE 2025:	**SI**	**NO**
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA		NO
INFORME FINANCIERO	X	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	$7.805.804.817,88	A CORTE DE MARZO DE 2025
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS	X	

6. INFORMEDEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**55%**
% EJECUTADO DE OBRA	**54%**

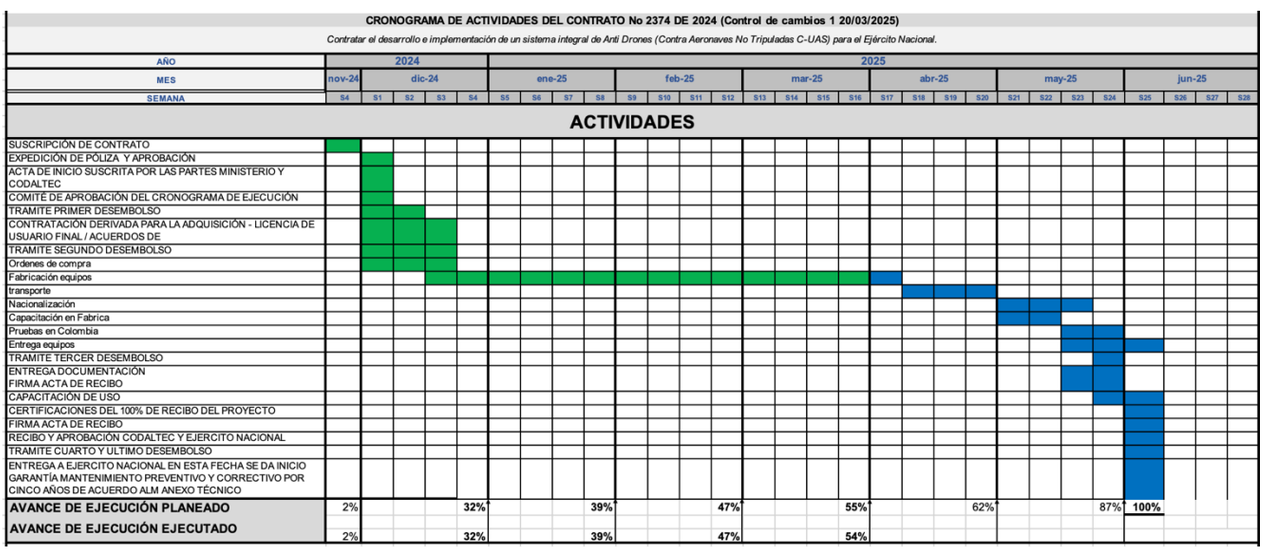

Gestión realizada:

El día 3 de marzo de 2025, mediante correo electrónico se le envió la documentación del contrato interadministrativo No. 2374 de 2024, indicando que dicha información se encuentra en SECOP II, lo anterior porque CODALTEC mediante llamada telefónica solicitó dicha documentación.

El día 6 de marzo de 2025, mediante correo electrónico CODALTEC remitió el contrato No. 097 de 2024, correspondiente a la contratación derivada con NEWSAT SAS

El día 10 de marzo de 2025, mediante correo electrónico se le solicitó a CODALTEC acta de inicio y el cronograma de la contratación derivada, discriminando el tiempo de fabricación de los equipos, el tiempo para las pruebas en fabrica, el transporte, la nacionalización entrega de equipos, puesta en marcha, entrega de documentación, capacitación y entrega formal, con el fin de validar si era necesario hacer un control de cambios al cronograma de ejecución.

El día 10 de marzo de 2025, mediante oficio con radicado No. 2025-2-003123-006984, se le relacionó a CODALTEC la información del supervisor por parte del Ministerio del Interior atendiendo el comunicado No. 2025010044241

El día 12 de marzo de 2025, mediante correo electrónico CODALTEC envió oficio con radicado 20250100044341, donde solicitaba información de seguimiento del contrato 2374 de 2024, modificación del cronograma y aclaración a unas cantidades, se atendió dicho requerimiento mediante oficio con radicado No. 2025-2-003123-009844 del día 28 de marzo de 2025, donde se les recordó las obligaciones escritas en el contrato 2374 de 2024, y se les evidenció que es claro que los informes de seguimiento los debe realizar CODALTEC, también se les enunció el procedimiento escrito en el contrato 2374, para la modificación del cronograma, así como las aclaraciones a los documentos que hagan parte integral del contrato (funciones del comité de seguimiento técnico y operativo).

El día 12 de marzo de 2025, se realizó una reunión de seguimiento con representantes de CODALTEC donde se les aclaró las obligaciones específicas y generales del contrato 2374, así como los procedimientos para hacer cualquier control de cambios y/o aclaración a los documentos que hagan parte integral del contrato mencionado, también se hicieron recomendaciones a tener en cuenta, para el control de cambios del cronograma.

El día 17 de marzo de 2025, mediante correo electrónico se invitó a comité de seguimiento técnico y operativo del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS No. 2374 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN-MINITERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA, FONSECON Y LA CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA - CODALTEC. A los representantes del Ejercito Nacional, CODALTEC y Ministerio del Interior, para el día jueves 20 de marzo de 2025 a las 11 de la mañana de manera presencial en las instalaciones del Ministerio del Interior, edificio Bancol, Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia, en el piso 10.

El día 18 de marzo de 2025, mediante correo electrónico se le reiteró a CODALTEC la solicitud de allegar de manera inmediata, las pólizas que permitan brindar garantía de acuerdo a la siguiente obligación: Asegurar que el contratista derivado constituya garantía con amparo de calidad y correcto funcionamiento de los bienes entregados y que en la misma esté como beneficiario el Ministerio del Interior. A lo que el día 19 de marzo de 2025, mediante correo electrónico, CODALTEC remitió las pólizas solicitadas.

El día 19 de marzo de 2025, mediante correo electrónico CODALTEC remitió la agenda para el comité de seguimiento técnico y operativo No. 3.

El día 20 de marzo de 2025, se realizó el comité de seguimiento técnico y operativo No. 3. En presencia de los representantes del Ejercito Nacional, CODALTEC y Ministerio del Interior, en el cual inicialmente CODALTEC hizo una presentación del avance del contrato y se realizaron las siguientes aprobaciones:

1. Aclaración cuadro de cantidades del anexo 5 teniendo en cuenta que:
    - Según lo descrito por el proveedor en la carta de "Justificación de la solución integral SISTEMA TÁCTICO CONTRA DRONES" del 13 de Diciembre de 2024, no es posible discriminar los valores de licencias, softwares y capacitaciones ya que estás hacen parte integral del sistema y es indivisible del mismo, por lo que su adquisición por separado no es posible.
    - Los valores no coinciden con el valor mencionado en el documento "ANALISIS DEL SECTOR Y ESTUDIO DE MERCADO - PROCESO DE SELECCIÓN", página 16 de 18. SECRETO.

- Los valores no coinciden con el valor aprobado por documento Radicado N° 2024229001583431, con asunto: "Aval técnico del departamento de comunicaciones CEDE 6" del Ejército Nacional, de fecha 11 de septiembre de 2024. PUBLICA RESERVADA.
- Es de aclarar que la Política OFFSET no hace parte del presente contrato, toda vez que de acuerdo al "ANÁLISIS DEL SECTOR Y ESTUDIOS DE MERCADO - PROCESOS DE SELECCIÓN" que hace parte integral del contrato, y textualmente dice: "Si bien no se ha considerado la política de compensación industrial (offset) de Colombia en esta cotización, es importante destacar que, de incluirse, los costos podrian aumentar significativamente debido a los acuerdos que deben establecerse con los proveedores internacionales en términos de transferencia de tecnología y soporte logístico"
- Esta solicitud no afecta financieramente el proyecto, ya que no modifica el costo total del proyecto.
- La presente solicitud se encuentra dentro del objeto, alcance técnico y presupuesto asignado.

Se aprueba la solicitud de aclaración, quedando el cuadro de cantidades del anexo 5, así:

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR
1	6	SISTEMA TACTICO ANTIDRONES	$715.957.690	$ 4.295.746.140
2	16	DOMO PORTABLE	$2.801.884.610	$ 44.830.153.760
3	1	SISTEMA FIJO 360°	$11.248.602.150	$ 11.248.602.150
TOTAL				$ 60.374.502.050

2. Aclaración miembros de la comisión inspectora: En el documento de Requisitos Generales Radicado N ° 2024229001583361: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE6-DIPCO 29.25, en el ítem 3.1.9 "Pruebas técnicas", ', se hace mención a la conformación de la comisión inspectora, "Para este propósito se destinará una comisión inspector conformada por: El supervisor, un funcionario técnico y el gerente del proyecto.", se realiza la aclaración que:
   a. Supervisor: Supervisor del Ministerio del Interior.
   b. Funcionario técnico: Funcionario técnico del Ejército Nacional.
   c. Gerente del proyecto: Gerente del proyecto o administrador de parte de CODALTEC.

3. Actualización de Cronograma: se hace el primer control de cambios al cronograma, atendiendo los tiempos de fabricación e importación sin superar el 4 de junio.

El día 28 de marzo de 2025, mediante correo electrónico CODALTEC remitió oficio con radicado No. 20250100044761 con información previa a la solicitud de prórroga.

El día 28 de marzo de 2025, mediante correo electrónico se invitó a comité de seguimiento técnico y operativo del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS No. 2374 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN-MINITERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA, FONSECON Y LA CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA - CODALTEC. A los representantes del Ejercito Nacional, CODALTEC y Ministerio del Interior, para el día 31 de marzo de 2025 a las 10 de la mañana de manera presencial en las instalaciones del Ministerio del Interior, edificio Bancol, Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia, en el piso 10.

El día 31 de marzo de 2025, se realizó el comité de seguimiento técnico y operativo No. 3. En presencia de los representantes del Ejercito Nacional, CODALTEC y Ministerio del Interior, en el cual inicialmente CODALTEC hizo una presentación del avance financiero del contrato y luego un reporte de avance de fabricación, con un avance preliminar del 86% ejecutado vs un 94%, este 8% de retraso fue validado y ajustado en el informe para el mes de marzo, reportando un avance del 90% en fabricación, con un retraso del 4%, por lo que el contratista se comprometió a contar con los equipos listos para el 10 de abril y así ponerse al día.

El día 7 de abril de 2025, mediante correo electrónico, CODALTEC remite el informe de ejecución correspondiente al mes de marzo, sin embargo, se le solicitó a CODALTEC un ajuste y ampliación a dicho informe mediante oficio con radicado No. 2025-2-003123-011692.

El día 11 de abril de 2025, mediante correo electrónico, CODALTEC remite el informe de ejecución correspondiente al mes de marzo ajustado.

A continuación se presentan registros fotográficos de los equipos fabricados:












DRONESHIELD
DroneSentry-X Mk2
Serial No. 0835979542116
droneshield.com
DRONESHIELD
DroneSentry-X Mk2
Serial No. 0835979542117
droneshield.com
DRONESHIELD
DroneSentry-X Mk2
Serial No. 0835979542114
droneshield.com
DRONESHIELD
DroneSentry-X Mk2
Serial No. 0835979542115
droneshield.com
DRONESHIELD
DroneSentry-X Mk2
Serial No. 0835979542112
droneshield.com
DRONESHIELD
DroneSentry-X Mk2
Serial No. 0835979542113
droneshield.com
DRONESHIELD
DroneSentry-X Mk2
Serial No. 0835979542110
droneshield.com
DRONESHIELD
DroneSentry-X Mk2
Serial No. 0835979542111
droneshield.com





JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:
Durante el mes de marzo, el avance del proyecto se encuentra dentro de los tiempos establecidos, sin evidencia de un retraso significativo en la ejecución de las actividades programadas. Actualmente, la fabricación de los equipos presenta un avance del 90%, mientras que el transporte, la nacionalización y la entrega aún no han iniciado. Se mantiene un seguimiento constante para garantizar el cumplimiento de los plazos y la ejecución puntual del proyecto.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

MARLENY RIVERA GALEANO Supervisor Contrato No. 2374 de 2024 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana Ministerio -FONSECON	**FAIVER RIVERA MONTES** Apoyo a la supervisión Contrato No. 2374 de 2024 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana - FONSECON
	SERGIO OSWALDO BERNAL JIMÉNEZ Apoyo a la supervisión Contrato No. 2374 de 2024 Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana - FONSECON

Outlook

RE: Solicitud de acceso y documentación del proceso CD-2374-2024

Desde Marleny Rivera Galeano <marleny.rivera@mininterior.gov.co>
Fecha Lun 03/03/2025 15:03
Para Luis Mateo Ochoa Cañon <lochoa@codaltec.com>
CC Sergio Oswaldo Bernal Jiménez <sergio.bernal@mininterior.gov.co>; Marco Fidel Rodriguez Solano <marco.rodriguez@mininterior.gov.co>; Havid Alexander Numa Marchena <havid.numa@mininterior.gov.co>

Respetado Señor,

Reciba un saludo especial,

En atención a su comunicación me permito informar que dicha información se encuentra en SECOP II, como CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N. 2374 ANTIDRONES.7z se había informado en su momento, y se dieron recomendaciones para su acceso, en el entendido que contiene información de seguridad nacional, adjunto al presente documentos que hacen parte integral del contrato los cuales son del conocimiento de contratista. (CODALTEC).

Quedo atenta,

Area: Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana Grupo: Sistemas Integrados de Emergencia y Seguridad (SIES)

Nombre completo: MARLENY RIVERA GALEANO
Profesional especializado código 2028
marleny.rivera@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00 ext. 2800
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

De: Luis Mateo Ochoa Cañon <lochoa@codaltec.com>
Enviado: lunes, 3 de marzo de 2025 14:30
Para: Marleny Rivera Galeano <marleny.rivera@mininterior.gov.co>
Cc: MY. Cristian Alexander Beltran Morales <cbeltran@codaltec.com>; Sergio Oswaldo Bernal Jiménez <sergio.bernal@mininterior.gov.co>
Asunto: Fwd: Solicitud de acceso y documentación del proceso CD-2374-2024

Buena tarde,

Re envío la solicitud de la información precontractual.

Muchas gracias.

---------- Forwarded message ---------
From: **Luis Mateo Ochoa Cañon** <lochoa@codaltec.com>
Date: Fri, Feb 28, 2025 at 12:21PM
Subject: Solicitud de acceso y documentación del proceso CD-2374-2024
To: marleny.rivera@mininterior.gov.co <Marleny.rivera@mininterior.gov.co>
Cc: <sergio.bernal@mininterior.gov.co>, <faiver.rivera@mininterior.gov.co>, MY. Cristian Alexander Beltran Morales <cbeltran@codaltec.com>

Estimados,

Reciban un cordial saludo.

Por medio del presente, me permito reiterar la solicitud realizada en diciembre referente al acceso a los documentos del proceso CD-2374-2024 del SECOP. Asimismo, agradezco su amable colaboración con el envío de la documentación completa de la carpeta contractual de dicho proceso.

Quedo atento a sus comentarios. Aprecio mucho su apoyo.

--

Luis Mateo Ochoa Cañón
Ingeniero de Desarrollo de Hardware
Oficina Principal - Cl. 25 Bis #31A 97

Teléfonos 7557352/60
lochoa@codaltec.com
www.codaltec.com

--

Luis Mateo Ochoa Cañón
Ingeniero de Desarrollo de Hardware
Oficina Principal - Cl. 25 Bis #31A 97

Teléfonos 7557352/60
lochoa@codaltec.com
www.codaltec.com

Outlook

Re: Envio carta IKR SOLUCIÓN INTEGRAL INHIBIDOR DE DRONES CD-2374-2024

Desde Luis Mateo Ochoa Cañon <lochoa@codaltec.com>
Fecha Jue 06/03/2025 17:13
Para Marleny Rivera Galeano <marleny.rivera@mininterior.gov.co>
CC Sergio Oswaldo Bernal Jiménez <sergio.bernal@mininterior.gov.co>

1 archivo adjunto (387 KB)
7_CONTRATO ANTIDRONES CODALTEC NEWSAT 097 (1).pdf;

Buena tarde,

Envío el contrato del contratista derivado.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

On Thu, Mar 6, 2025 at 4:57 PM Luis Mateo Ochoa Cañon <lochoa@codaltec.com> wrote:

> Estimada señora Marleny espero que se encuentre muy bien, atendiendo a su solicitud realizada por llamada telefónica, de la manera mas atenta me permito enviar la carta allegada por nuestro proveedor NewSat donde especifica el valor de los equipos de manera nominal
>
> Muchas gracias
> --
>
> **Luis Mateo Ochoa Cañón**
>
> Ingeniero de Desarrollo de Hardware
>
> Oficina Principal - Cl. 25 Bis #31A 97
>
> Teléfonos 7557352/60
>
> lochoa@codaltec.com
>
> www.codaltec.com

--

Luis Mateo Ochoa Cañón

Ingeniero de Desarrollo de Hardware

Oficina Principal - Cl. 25 Bis #31A 97

Teléfonos 7557352/60

lochoa@codaltec.com

www.codaltec.com

CONTRATO NRO. 097 DE 2024
SUMINISTRO DE BIENES PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I.

CONTRATANTE:	**CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA. NIT. 900576075-9.**
CONTRATISTA:	**NEWSAT SAS NIT 830.513.366-3**
OBJETO:	**ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE ANTI DRONES (CONTRA AERONAVES NO TRIPULADAS C-UAS) PARA EL EJÉRCITO NACIONAL.**
VALOR:	**SESENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($60.371.994.550) VALOR QUE INCLUYE IMPUESTOS Y TODAS LAS TASAS Y CONTRIBUCIONES ASOCIADAS AL CONTRATO**
PLAZO:	**SEIS (06) MESES**
FECHA DEL CONTRATO:	**17 de diciembre de 2024.**

Entre los suscritos, de una parte, la **CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA**, entidad sin ánimo de lucro, constituida mediante Documento Privado debidamente inscrito ante la Cámara de Comercio de Bogotá del 7 de diciembre de 2012, representada en este contrato por la **Señora Coronel NILSSEN JANETH GUTIERREZ SUAREZ,** identificado con la Cédula de Ciudadanía nro. 42.110.825 de Pereira, en su condición de Gerente de la **CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA**, debidamente facultada, para celebrar el presente Contrato, y quien en adelante para los efectos del presente contrato se denominará **LA CORPORACIÓN** y de otra parte **NEWSAT SAS, persona jurídica con Nit. 830.513.366-3** representada legalmente para este acto por **CARLOS ENRIQUE ROSERO CERON,** persona mayor de edad, identificado con la C.C. Nro. 6.386.024**,** en adelante se denominará **EL CONTRATISTA,** y en conjunto **LAS PARTES** hemos acordado celebrar el presente Contrato de **SUMINISTRO**, que se regirá por las siguientes cláusulas previas las consideraciones descritas a continuación: **1)** Que el **Señor Luis Mateo Ochoa Cañón**, Ingeniero de desarrollo, justificó la necesidad y oportunidad de llevar a cabo la presente Contratación por las razones y condiciones debidamente sustentadas en los Estudios Previos. **2)** Que con la celebración de este Contrato la **CORPORACIÓN** pretende desarrollar el contrato Interadministrativo de Administración de Proyectos No. 2374 de 2024 entre la Nación- Ministerio del Interior - Fondo Nacional de seguridad y Convivencia Ciudadana, FONSECON y la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa – CODALTEC. **3)** Que, para el desarrollo de este Contrato, se adelantaron los procedimientos que para el efecto se encuentran contemplados en el Manual de Adquisición de Bienes, Obras y Servicios de la Corporación. **4)** Que esta Contratación se adelantó por la modalidad de Selección Directa del Contratista, en virtud del objeto a contratar, de conformidad con lo descrito en el numeral 6, Selección Directa, Literal b el cual establece “Cuando los bienes, obras y/o servicios a adquirir se requieran para la ejecución por parte de CODALTEC de proyectos”. igualmente resulta aplicable el literal J. correspondiente a la consecución de bienes y/o servicios destinados a proyectos cuya naturaleza o fin sea la Defensa y Seguridad Nacional. **5)** Que se cuenta con el Certificado de

Disponibilidad Presupuestal Nro. 487 expedido por el Jefe de Presupuesto (E) de CODALTEC, de Fecha, 13 de diciembre de 2024. **6).** Que el presente Contrato se celebrará en un todo de acuerdo con las leyes civiles y comerciales debidamente aplicables a este Contrato, así como lo establecido en los estudios previos y la propuesta presentada por el Contratista, documentos que hacen parte integral de este Contrato.

Teniendo en cuenta las anteriores Consideraciones puede procederse a la suscripción, perfeccionamiento y legalización de este Contrato, el cual se regirá por las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE ANTI DRONES (CONTRA AERONAVES NO TRIPULADAS C-UAS) PARA EL EJÉRCITO NACIONAL. El presente Objeto contractual se desarrollará de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos, debidamente aceptadas por **NEWSAT SAS, NIT. 830.513.366-3,** en su propuesta, la cual hace parte integral de este Contrato, Documento que no podrá ser modificado sino por virtud de la Ley o por voluntad expresa de las partes.

ENTREGABLES MÍNIMOS

A continuación, se presenta el presupuesto aprobado para la adquisición de los equipos:

A. PRESUPUESTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANT**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**VALOR UNITARIO**	**SUBTOTAL**
1	SISTEMA FIJO CONTRA DRONES 360°	1	Unit	**$60.371.994.550**	**$60.371.994.550**
2	SISTEMA SEMI-FIJO CONTRA DRONES	16	Unit		
3	SISTEMA TÁCTICO CONTRA DRONES	6	Unit		
4	GARANTÍA DE TODOS LOS ÍTEMS POR 24 MESES	1	Unit		
5	EL CONTRATISTA DEBERÁ ASUMIR DURANTE EL PERIODO DE LA GARANTÍA, LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y LOS MANTENIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOS MANUALES DEL SISTEMA, INCLUIDAS LAS ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE Y FIRMWARE.	NA	Unit		
6	SE REQUIERE CAPACITACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO Y MANEJO DE LOS	NA	unit		

	SISTEMAS, EN EL PUNTO DE FÁBRICA PARA UN TOTAL DE 8 PERSONAS. EL CONTRATISTA SE DEBE HACER CARGO DE TODOS LOS COSTOS INCURRIDOS, TIQUETES AÉREOS, ALIMENTACIÓN, DESPLAZAMIENTO EN EL PAÍS DEL FABRICANTE, ETC.				
7	SE REQUIEREN DE DOS EQUIPOS DE SUSTITUCIÓN DEL SISTEMA	NA	unit		

El valor del contrato está exonerado de IVA, en razón a la exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para equipos de inhibidores de drones destinados al Ejército Nacional de Colombia está regulada por el artículo 476 del Estatuto Tributario, específicamente en el numeral 18. Este artículo establece que ciertos bienes y servicios, incluyendo los equipos de inhibición de drones, están exentos del IVA cuando son adquiridos para la defensa nacional. Además, esta exención se encuentra respaldada por el Decreto 1074 de 2015, que reglamenta las condiciones y procedimientos para la aplicación de dicha exención. Es fundamental que la adquisición de estos equipos cuente con la certificación del Ministerio de Defensa, asegurando su uso exclusivo por las Fuerzas Militares y de Policía

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES

El contratista deberá:

- Proveer los siguientes equipos con las actualizaciones y licencias necesarias para su normal operación, visualización y uso por 24 meses:
    - Un (1) sistema contra aeronaves no tripuladas Fijo 360°. El cual incluye los accesorios, software, licencias y actualizaciones necesarios para su normal operación.
    - Diez y seis (16) Sistemas contra aeronaves no tripuladas Semi-Fijo. El cual incluye los accesorios, software, licencias y actualizaciones necesarios para su normal operación.
    - Seis (6) Sistemas contra aeronaves no tripuladas tácticos. El cual incluye los accesorios, software, licencias y actualizaciones necesarios para su normal operación.
- El contratista deberá proveer la garantía de los sistemas por un periodo de 24 meses.
- El contratista otorgará garantía por un periodo igual a doce (12) meses, por los bienes y servicios suministrados durante los trabajos de garantía.
- El contratista deberá asumir durante el periodo de la garantía, los mantenimientos preventivos y los mantenimientos establecidos en los manuales del sistema, incluidas las actualizaciones de software y firmware.
- Se requiere capacitación del funcionamiento y manejo de los sistemas, en el punto de fábrica para un total de 8 personas. El contratista se debe hacer cargo de todos los costos incurridos, tiquetes aéreos, alimentación, desplazamiento en el país del fabricante, etc.

- Se debe realizar transferencia de conocimiento acorde a las especificaciones.
- El contratista se compromete a presentar al usuario final y a CODALTEC el protocolo de pruebas estableciendo los insumos necesarios para su ejecución, el alistamiento de equipos, las actividades a realizar, parámetros de aprobación y responsabilidad de daños, e inconvenientes presentados durante la ejecución de las pruebas. El protocolo de pruebas deberá ser aprobado por el contratista, CODALTEC y el usuario final para su ejecución.
- El contratista deberá contar con dos sistemas de respaldo en el país para atender las fallas que se presenten en los sistemas adquiridos por las Fuerzas.
- El contratista deberá garantizar un tiempo de suministro de repuestos en el país de (05) cinco años como mínimo.
- Todos los costos asociados a la instalación, configuración y puesta en funcionamiento serán asumidos por el contratista. En las localizaciones definidas por las Fuerzas.
- El contratista deberá garantizar los riesgos profesionales e industriales del personal designado para la instalación de los equipos.
- Cumplir a cabalidad los requisitos generales y las especificaciones técnicas del sistema descritos en los Anexos 001 y Anexos 002.

Nota: Se debe cumplir los anexos técnicos entregados por el EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA:

- Anexo 001, SISTEMA CONTRA AERONAVES NO TRIPULADAS No. JEMOP-DAVAA-ET – 05701 / AVI -00, 28 folios. Se entrega una copia en físico, bajo la transferencia de la reserva de información realizada en la Acta de reunión 001 “Reunión CODALTEC NewSat Inhibidores de drones MinInterior”
- Anexo 002, REQUISITOS GENERALES, Radicado N° 2024229001583361: MDN-COGFMCOEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE6-DIPCO-29.25, 5 folios. Se entrega una copia en físico, bajo la transferencia de la reserva de información realizada en la Acta de reunión 001 “Reunión CODALTEC NewSat Inhibidores de drones MinInterior)

CLAUSULA SEGUNDA – TÉRMINO DEL CONTRATO: El término de duración del presente contrato será de **SEIS (06) MESES,** contados a partir de la firma del Acta de Inicio suscrita entre el contratista y el supervisor del contrato.

CLAUSULA TERCERA – VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del presente Contrato es por la suma de **SESENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($60.371.994.550) VALOR QUE INCLUYE IMPUESTOS Y TODAS LAS TASAS Y CONTRIBUCIONES ASOCIADAS AL CONTRATO**. Este valor incluye todos los gastos en los que incurra el contratista por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, como impuestos, publicaciones, constitución garantías, transporte, operarios, etc.

CONCEPTO	VALOR TOTAL
Adquisición e implementación de un sistema integral de Anti Drones (Contra Aeronaves No Tripuladas C-UAS) para el Ejército Nacional.	$60.371.994.550
TOTAL	**$60.371.994.550**

La **CORPORACIÓN**, cancelará al **CONTRATISTA** el valor del contrato de la siguiente manera:

- **PRIMER PAGO: POR VALOR DE DIECISIETE MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS MILLONES DE PESOS ($17.523.000.000,00.).** Previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y los entregables descritos en la presente solicitud que soporten y que de CODALTEC que acredite el cumplimiento de la ejecución del proyecto el cual debe incluir:

1. Plan de trabajo
2. Cronograma de entrega de equipos
3. Carta del fabricante de la solución donde certifique la recepción y aceptación de las órdenes de compra generadas por el contratista
4. Certificación generada por el contratista en la que indique que los elementos se encuentran en fabricación indicando la fecha de inicio y fecha estimada del término de fabricación y envío de los equipos que componen los sistemas.

- **SEGUNDO PAGO: POR VALOR DE VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS ($ 24.737.396.185,00).** Previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y los entregables descritos en la presente solicitud que soporten y que de CODALTEC que acredite el cumplimiento de la ejecución del proyecto el cual debe incluir:

1. Informe y certificación de fabricación mayor al 50%.

- **TERCER PAGO: POR VALOR DE DIECIOCHO MIL CIENTO ONCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($ 18.111.598.365,00.).** Previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y los entregables descritos en la presente solicitud que soporten y que de CODALTEC que acredite el cumplimiento de la ejecución del proyecto el cual debe incluir:

1. Entrega a satisfacción y certificación por parte del usuario final de la puesta en marcha de los equipos.

Para los pagos se requiere previa certificación por parte del supervisor del contrato en el que conste la entrega total de lo exigido en el presente contrato, y se pueda verificar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para los pagos EL CONTRATISTA deberá presentar la factura de acuerdo con las normas vigentes.

PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA asumirá el costo de todos los impuestos, tasas y similares, que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia.

***PARÁGRAFO TERCERO*:** El pago se ajustará de acuerdo con el plan de caja del proyecto.

***PARÁGRAFO CUARTO*:** Los pagos serán girados por la tesorería de CODALTEC.

CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Durante la ejecución del objeto contractual, el contratista además de las obligaciones inherentes a su naturaleza y las derivadas de

las disposiciones legales sobre la materia debe cumplir las siguientes obligaciones:

- Cumplir con el objeto contractual, su alcance y especificaciones, dentro de los plazos establecidos y con el cumplimiento de las normas técnicas que aplican a estos bienes.

- Actuar siempre en función del interés colectivo, excluyendo toda acción que pueda redundar en beneficio personal o de terceros absteniéndose de pactar pagos anticipados en los contratos que celebre para la ejecución del objeto del Contrato.

- Solicitar con suficiente antelación al vencimiento del plazo contractual, las prórrogas, adiciones o modificaciones que se requieran, indicando detalladamente los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento acompañado con los respectivos soportes.

- Realizar recibo y entrega de bienes cumpliendo con los anexos técnicos del Ministerio del Interior de acuerdo con los formatos anexos de especificaciones técnicas entregados por el Ministerio, SISTEMA CONTRA AERONAVES NO TRIPULADAS No. JEMOP-DAVAA-ET – 05701 / AVI -00, 28 folios y REQUISITOS GENERALES, Radicado N° 2024229001583361: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE6-DIPCO-29.25, 5 folios

- Presentar, para aprobación las garantías solicitadas en el presente contrato. Las garantías solicitadas deberán tener como beneficiario al usuario final, EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA, así como las garantías solicitadas a CODALTEC.

- Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas y personal mínimo requerido para la implementación, el cual se encuentra descrito en los anexos técnicos aportados por el EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA. La anterior información será suministrada por el Ministerio del interior, así como todos aquellos documentos anexos que hacen parte de la viabilidad del proyecto y la propuesta económica, las cuales harán parte integral del Contrato a suscribir.

- Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el Ministerio del Interior y el EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA.

- Desarrollar la entrega de los bienes objeto del contrato dentro del plazo de ejecución contractual.

- Realizar la entrega a satisfacción, del proyecto objeto del contrato dentro de los plazos establecidos en el cronograma de actividades del mismo, previa verificación de cumplimiento de los requisitos técnicos por parte del comité de seguimiento técnico y operativo.
- Realizar las acciones administrativas y técnicas necesarias para garantizar la ejecución de todas las actividades del objeto del contrato en el plazo establecido y conforme al cronograma de hitos acordados.

- Presentar a CODALTEC un (1) informe de gestión, técnico, administrativo y financiero, respecto de la ejecución del proyecto objeto del contrato, así como del estado de la ejecución del contrato los primeros 2 días hábiles del mes siguiente al periodo informado.

- Presentar a CODALTEC un (1) informe final a la terminación del contrato, adjuntando las

actas de cumplimiento de la entrega y puesta en marcha de los sistemas, también debe adjuntar evidencia del cumplimiento de las capacitaciones, además de los ítems expuestos en los anexos técnicos entregados por el Ministerio, SISTEMA CONTRA AERONAVES NO TRIPULADAS No. JEMOP-DAVAA-ET – 05701 / AVI -00, 28 folios y REQUISITOS GENERALES, Radicado N° 2024229001583361: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE6-DIPCO-29.25, 5 folios

- Entregar los documentos e información requerida para la liquidación del contrato y suscribir en tres (3) meses la correspondiente acta de liquidación.

- Llevar un archivo cronológico de todas las actuaciones surtidas en el desarrollo del contrato.

- Responder por la veracidad de la información remitida al Ministerio del Interior y Codaltec.

- Dar respuesta a los requerimientos relacionados con la ejecución del contrato por parte del supervisor del Ministerio del Interior, Ejército Nacional y personas que integran el Comité Técnico Operativo, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al recibo de los mismos.

- Velar porque el Ministerio del Interior, el Ejército Nacional de Colombia y CODALTEC, se mantengan indemnes de cualquier reclamación de terceras personas, subcontratistas y proveedores y demás servicios que de forma indirecta se hayan requerido para la ejecución del contrato.

- Designar el personal idóneo necesario para realizar la entrega definitiva de los bienes.

- Responder por cualquier situación (excepto fuerza mayor o caso fortuito) que afecte la ejecución del cabal cumplimiento del objeto del contrato.

- Realizar por su propia cuenta y riesgo los trámites aduaneros y tributarios pertinentes que surjan del cumplimiento del objeto contractual.

- Las demás que se deriven del cumplimiento del objeto del contrato y que guarden relación directa con el mismo.

- Responder, en caso de pérdida, hurtos y otras circunstancias que puedan afectar el correcto funcionamiento de los bienes y la infraestructura entregada, desde el inicio de la implementación hasta la fecha de entrega real y efectiva de los bienes objeto del presente contrato al EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA.

- Cumplir con los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, según corresponda, de acuerdo con lo establecido por la normatividad vigente y presentar los comprobantes de pago.

- Ejecutar a cabalidad el objeto del contrato.

- Obrar con lealtad y buena fe para con la Corporación, en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones.

- Realizar la entrega de lo contratado, garantizando su calidad y resultado. Igualmente, realizar lo pertinente en caso de que se requiera algún tipo de corrección.

- El contratista deberá sanear los inconvenientes que puedan presentar los bienes.

- Reemplazar o corregir los entregables que resulten defectuosos, de mala calidad o que no cumplan con las normas colombianas, el contratista deberá restituir a su costa, sin que implique modificación al plazo de entrega.

- Proveer bienes de óptima calidad y de conformidad a las normas técnicas.

- Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.

- No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.

- Para entregar el pago, el contratista deberá aportar el original de la factura, la cual debe cumplir con todos los requisitos legales y en donde se estipulen todos los servicios y/o productos y/o bienes prestados.

- Cumplir con las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones o reglamentos vigentes que tengan relación con el objeto del presente contrato. En caso de que cualquiera de las disposiciones normativas antes mencionadas ocasione gastos o costos no previstos, éstos serán a cargo de EL CONTRATISTA.

- EL CONTRATISTA asumirá su responsabilidad por cualquier violación de la ley en la ejecución del contrato.

- Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.

- Poner a disposición los recursos tecnológicos complementarios necesarios para el desarrollo del objeto contractual.

- Firmar los acuerdos de confidencialidad de la información a que haya lugar.

- Presentar la Factura de los entregables con la respectiva planilla de pago de Seguridad Social.

- El CONTRATISTA guardará confidencialidad sobre la información que le facilite la Corporación para la ejecución del Contrato o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

- El CONTRATISTA responderá, por tanto, de las infracciones en que pudiera incurrir en el caso de que destine los datos personales a otra finalidad, los comunique a un tercero, o en general, los utilice de forma irregular, así como cuando no adopte las medidas correspondientes para el almacenamiento y custodia de los mismos. A tal efecto, se obliga a indemnizar a CODALTEC o al EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA, por cualesquiera daños y perjuicios que sufra directamente, o por toda reclamación, acción o procedimiento, que traiga su causa de un incumplimiento o cumplimiento defectuoso por parte del CONTRATISTA de lo dispuesto tanto en el Contrato como lo dispuesto en la normativa reguladora de la protección de datos de carácter personal.

- El CONTRATISTA deberá adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter reservado y personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural. A estos efectos el CONTRATISTA deberá aplicar los niveles de seguridad que se establecen en la Ley Colombiana de acuerdo con la naturaleza de los datos que trate.

- El CONTRATISTA responderá de los daños y perjuicios que se deriven para la CORPORACIÓN y de las reclamaciones que pueda realizar un tercero, y que tengan su causa directa en errores del CONTRATISTA, o de su personal, en la ejecución del Contrato o que deriven de la falta de diligencia referida anteriormente.

- El CONTRATISTA se compromete a obtener legítimamente las licencias y derechos sobre cualquier elemento que entregue a la CORPORACIÓN.

- Las demás que se deriven de la naturaleza del Contrato.

- Cumplir normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo, en especial las descritas en la ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015 y resolución 0312 de 2019 referente a los requisitos mínimos del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el trabajo y demás normas que deroguen, modifiquen o sustituyan.

- El contratista deberá Proporcionar a los trabajadores los elementos de protección personal (EPP) con las recomendaciones para el uso seguro y la ropa de trabajo adecuados para el desarrollo de su trabajo y acorde con los riesgos a los que estarán expuestos, de conformidad con las normas legales vigentes, requeridos en la dependencia a la que se dirijan, Éstos correrán por cuenta del contratista y/o proveedor.

- En caso de realizar actividades de trabajo a una altura superior de 2m, el Contratista debe dar cumplimiento a los requerimientos definidos en la resolución 4272 de 2021 y presentar un programa de prevención contra caídas, con mínimo dos (2) días anterioridad para su verificación y aprobación, así como:

- Certificados vigentes que acrediten curso avanzado de trabajo en altura en cumplimiento a la Resolución 4272 de 2021 de todos los involucrados en la actividad.

NOTA ACLARATORIA: Los anteriores requerimientos contractuales son de OBLIGATORIO cumplimiento y los costos serán asumidos por el Contratista.

CLAUSULA QUINTA. OBLIGACIONES DE LA CORPORACIÓN:

a) Hacer los pagos en los términos convenidos.
b) Suministrar al contratista la documentación y demás información que disponga para dar cumplimiento al objeto del contrato.
c) Designar un funcionario para que supervise la ejecución del contrato.
d) Revisar cada uno de los informes de actividades realizados durante la ejecución del contrato.
e) Exigir al contratista ejercer cada una de sus actividades aplicando los valores de transparencia, responsabilidad, celeridad y lealtad.
f) Exigir al contratista cotizar en el sistema de seguridad social, de acuerdo a la normatividad vigente.
g) Exigir al contratista que para cada pago parcial y final deberá anexar soporte del pago a seguridad social.

CLAUSULA SEXTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: Manifiesta el CONTRATISTA, bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del presente Contrato, que no se halla incurso en ninguna causal de inhabilidad y/o incompatibilidad prevista en la Ley, si llegare a sobrevenir alguna, actuara conforme a la Constitución y la Ley.

CLAUSULA SEPTIMA – RELACION LABORAL: El presente contrato no genera relación laboral alguna con el CONTRATISTA, ni con quien este emplee para el cumplimiento del objeto de la misma y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales ni de ningún tipo de emolumentos diferentes al valor aquí acordado.

CLAUSULA OCTAVA – PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Se entiende perfeccionado con la firma de las partes, para la ejecución se requiere la aprobación de las garantías y la firma del acta de inicio.

CLAUSULA NOVENA – GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. EL CONTRATISTA se obliga a constituir y presentar a CODALTEC, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato y a favor de la CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA, NIT Nro. 900576075-9, una PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PÚBLICAS CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN, otorgadas a través de una compañía de seguros o entidad bancaria cuya póliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Financiera.

NOTA: En las garantías solicitadas a los contratistas derivados del contrato se deberá determinar cómo beneficiario a la NACIÓN–MINISTERIO DEL INTERIOR–FONSECON, NIT 830.114.475-6, al EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA identificado con NIT No. 899.999.003-1 y a CODALTEC.

La garantía de cumplimiento de las obligaciones cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales del contratista, así:

1. **CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES** por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, cuya vigencia será por el término de duración del contrato y seis (6) meses más

contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

2. **CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES:** por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia por el término de duración del contrato y veinticuatro (24) meses más.

3. **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES INDEMNIZACIONES LABORALES:** por una cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia por el término de duración del contrato y tres (03) años más.

4. **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL:** por una cuantía equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al término de duración del contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO. - ALCANCE DE LOS AMPAROS: En la póliza deberá constar expresamente que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de las multas y de la cláusula penal pecuniaria convenidas. En todo caso deberá reponer la garantía cuando el valor de la misma se vea afectada por razón de siniestros, dentro de los cinco (05) días calendario siguiente a la ejecutoria del acto o sentencia que así lo declare. Tratándose de pólizas no expirará por falta de pago de la prima o revocatoria unilateral.

PARÁGRAFO SEGUNDO. - RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSIÓN: En la póliza deberá constar que la aseguradora renuncia al beneficio de excusión.

PARÁGRAFO TERCERO: Si la aseguradora establece en las pólizas algún porcentaje deducible y lo hace efectivo en caso de siniestro, el mismo será asumido por EL CONTRATISTA.

CLAUSULA DÉCIMA. - CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. En caso de incumplimiento parcial o total de las obligaciones derivadas del presente contrato por cualquiera de las partes, a modo de tasación anticipada de perjuicios, la parte incumplida pagará a la otra a título de pena la suma equivalente al diez (10%) por ciento del valor total del incumplimiento, bien sea este parcial o total.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA. - CONFIDENCIALIDAD. EL CONTRATISTA deberá cumplir con las obligaciones de confidencialidad necesarias para la ejecución del contrato, así mismo, mantener bajo la más estricta reserva toda la información a la que tenga acceso con ocasión del presente Contrato de Compraventa.

PARÁGRAFO PRIMERO. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN:

a) Información confidencial: Para efectos del presente Contrato se entiende por información confidencial toda aquella información, entre la que se encuentra, sin que se trate de un listado taxativo, procesos y procedimientos; "know how"; proyectos regionales, locales, nacionales y mundiales; servicios; comisiones; flujos de caja; claves de acceso a los sistemas; bases de datos; estrategias y proyecciones comerciales, de mercadeo, de inversión y financiera, y en general cualquier información relacionada con operaciones de la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa, las Fuerzas Militares o el Ministerio de Defensa Nacional. Esta información podrá encontrarse inscrita en cualquier tipo de documento, grabada o almacenada en memoria o cinta, disco, cassette, diskette o cualquier medio análogo similar. Si fuera transmitida oralmente, la información deberá ser trasladada a cualquier soporte de los mencionados anteriormente y se

señalará en los mismos los términos su carácter de confidencial. De la misma manera, se entenderá como información confidencial toda aquella que sea considerada como confidencial por la normatividad colombiana.

b) Cada Parte se obliga a no hacer uso de la información confidencial recibida de la otra Parte para cualquier propósito diferente al de colaboración, que atente contra los fines del presente documento, o para los eventos de la ejecución de algún Proyecto.

c) La entrega de información confidencial no concede a ninguna de las Partes, ni explícita ni implícitamente, autorización, permiso o licencia de uso de marcas comerciales, patentes, derechos de autor o de cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual, ni de cualquier otro derecho de contenido económico sobre la información confidencial de la otra Parte.

d) Cada Parte garantizará que aplicará todas las medidas de seguridad necesarias para evitar divulgación, fuga o uso no autorizado de la información confidencial, y declaran que protegerán la información confidencial en la misma manera y en el mismo grado en que protegen su propia información confidencial, y que en ningún caso recibirá menor cuidado que el razonable.

e) Cada una de las Partes tomará las medidas necesarias para cumplir y hacer cumplir a sus empleados y subcontratistas las obligaciones de confidencialidad establecidas en el presente numeral.

PARÁGRAFO SEGUNDO. INFORMACIÓN NO CONFIDENCIAL: No se considera Información Confidencial aquella que:

a) Haya provenido de fuente de dominio público, sin haberse producido incumplimiento del presente contrato o de la ley;
b) Haya sido revelada expresamente y por escrito como PÚBLICA por cualquiera de las Partes;
c) Sea revelada en desarrollo de orden de autoridad competente en ejercicio de sus funciones, previa consulta a la Parte afectada;
d) Haya sido obtenida de un tercero con legítimo derecho, siempre que haya sido revelada a cualquiera de las Partes sin obligación de confidencialidad.

PARÁGRAFO TERCERO. DURACIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE RESERVA: Las obligaciones derivadas de la presente cláusula tendrán una duración de cinco (5) años contados a partir de la fecha de terminación del presente Contrato o de la última de sus prórrogas.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - CAUSALES DE TERMINACIÓN. Serán causales de terminación del presente contrato, las siguientes:

1. Por mutuo acuerdo entre las partes.
2. Por vencimiento del plazo de ejecución del presente contrato.
3. Por incumplimiento de las obligaciones que lleve a la imposibilidad de la ejecución del objeto contractual.

CLAUSULA DÉCIMA TERCERA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. En el caso de cualquier disputa entre la CORPORACIÓN y el CONTRATISTA surgidas con ocasión de la ejecución, las

partes deberán, en primera instancia, hacer todos los esfuerzos razonables para llegar a una solución amigable dentro de un período de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la fecha en que por escrito una cualquiera de ellas lo manifieste a la otra. Cualquier decisión tomada, o concesión hecha, que dé por terminada la disputa será definitiva y vinculante tanto para la CORPORACIÓN como para el CONTRATISTA.

CLAUSULA DÉCIMA CUARTA. - CESIONES Y SUBCONTRATOS. EL CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato a persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, sin previa autorización escrita de la Corporación. La celebración de subcontratos para el cumplimiento el presente contrato, no relevará al Contratista de las responsabilidades y obligaciones que asume en virtud del mismo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. INDEMNIDAD. Será obligación del CONTRATISTA mantener indemne a la CORPORACIÓN de cualquier daño o perjuicio originado en sus actuaciones en ejecución del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integral del presente contrato los documentos correspondientes a la etapa previa, así como la propuesta presentada por el Contratista, Especificaciones Técnicas Mínimas Requeridas y los que se produzcan durante la ejecución del mismo.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. LIQUIDACION DEL CONTRATO. El presente contrato deberá liquidarse dentro los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución contractual o a la expedición del acto de la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. Si el **CONTRATISTA** no se presenta dentro de este plazo a la liquidación o si la CORPORACIÓN y el contratista no llegaren a ningún acuerdo, la Entidad liquidará el contrato de manera unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: LUGAR DE EJECUCIÓN: El lugar de ejecución para el proyecto se desarrollará a nivel nacional, territorio Colombia a necesidad del EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA y la documentación técnica e informes deberán ser entregados en las oficinas de CODALTEC, oficina principal calle 25 bis N° 31 A -97, barrio Gran América – Bogotá.

CLAUSULA DECIMA NOVENA. PUBLICACIÓN DEL CONTRATO: El contrato que surja será publicado en la página web de la Corporación.

CLAUSULA VIGÉSIMA. GASTOS E IMPUESTOS: Todos los gastos e impuestos que se causen debido al perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato serán por cuenta del contratista. **LA CORPORACIÓN** efectuará a las cuentas del **CONTRATISTA** las retenciones que en materia de impuestos tenga establecida la Ley.

CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. SUPERVISIÓN. El seguimiento y/o supervisión del contrato que se celebre en desarrollo del presente proceso de contratación, será ejercido por quien designe el Gerente o Subgerente de la Corporación, quien deberá vigilar el cumplimiento del objeto del presente contrato, así como también las calidades y demás aspectos inherentes a la ejecución del mismo.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES. EL presente Contrato podrá modificarse

previo acuerdo de las partes el cual deberá reposar por escrito.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. RELACIÓN CONTRACTUAL. La relación contractual en la ejecución de este contrato solo es entre el contratista y CODALTEC. Cualquier comunicado, autorización, instrucción, escrito o similares, que provengan de terceras personas ajenas a las partes, no obligaran a CODALTEC y no serán responsabilidad de la Corporación, las actuaciones que el contratista ejecute en virtud de esas disposiciones, las cuales no son vinculantes para CODALTEC y los riesgos que se deriven de esta actuación, serán única y exclusivamente del Contratista así como de los posibles efectos económicos.

El presente contrato se suscribe el día diez y siete (17) del mes de diciembre del año 2024**.**

POR LA CORPORACIÓN	POR EL CONTRATISTA
CR. NILSSEN JANETH GUTIERREZ SUAREZ **Gerente CODALTEC**	**CARLOS ENRIQUE ROSERO CERON** **Representante Legal NEWSAT SAS**

Reviso: CARLOS ALBERTO GARZÓN.
Asesor Legal - CODALTEC.

Outlook

RE: Envio carta IKR SOLUCIÓN INTEGRAL INHIBIDOR DE DRONES CD-2374-2024

Desde Sergio Oswaldo Bernal Jiménez <sergio.bernal@mininterior.gov.co>
Fecha Lun 10/03/2025 15:06
Para Luis Mateo Ochoa Cañon <lochoa@codaltec.com>
CC Marleny Rivera Galeano <marleny.rivera@mininterior.gov.co>

Cordial saludo,

Amablemente solicito el acta de inicio y el cronograma de la contratación derivada, discriminando el tiempo de fabricación de los equipos, el tiempo para las pruebas en fabrica, el transporte, la nacionalización entrega de equipos, puesta en marcha, entrega de documentación, capacitación y entrega formal.

Cordialmente,

Subdirección de Proyectos SCC
Sergio Oswaldo Bernal Jiménez
sergio.bernal@mininterior.gov.co
Celular: 3183516693
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá,
Colombia
www.mininterior.gov.co

De: Luis Mateo Ochoa Cañon <lochoa@codaltec.com>
Enviado: jueves, 6 de marzo de 2025 17:12
Para: Marleny Rivera Galeano <marleny.rivera@mininterior.gov.co>
Cc: Sergio Oswaldo Bernal Jiménez <sergio.bernal@mininterior.gov.co>
Asunto: Re: Envio carta IKR SOLUCIÓN INTEGRAL INHIBIDOR DE DRONES CD-2374-2024

Buena tarde,

Envío el contrato del contratista derivado.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

On Thu, Mar 6, 2025 at 4:57 PM Luis Mateo Ochoa Cañon <lochoa@codaltec.com> wrote:

> Estimada señora Marleny espero que se encuentre muy bien, atendiendo a su solicitud realizada por llamada telefónica, de la manera mas atenta me permito enviar la carta allegada por nuestro proveedor NewSat donde especifica el valor de los equipos de manera nominal
>
> Muchas gracias
> --
>
> **Luis Mateo Ochoa Cañón**
> Ingeniero de Desarrollo de Hardware
> Oficina Principal - Cl. 25 Bis #31A 97
>
> Teléfonos 7557352/60
> lochoa@codaltec.com
> www.codaltec.com

--

Luis Mateo Ochoa Cañón
Ingeniero de Desarrollo de Hardware
Oficina Principal - Cl. 25 Bis #31A 97

Teléfonos 7557352/60
lochoa@codaltec.com
www.codaltec.com

Interior

Al contestar cite Radicado 2025-2-003123-006984 Id: 505242
Folios: 1 Fecha: 10-03-2025 17:15:20
Anexos: 1 Documentos electrónicos, 1 Documentos electrónicos,
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: NILSSEN JANETH GUTIERREZ SUAREZ

Bogotá D.C.

Coronel
NILSSEN JANETH GUTIERREZ SUAREZ
GERENTE
CODALTEC

Asunto: Respuesta a comunicado No. 2025010044241

Referencia: Asignación Comisión Inspectora CD-2374-2024

Respetado Coronel Nilssen,

Atendiendo su solicitud, me permito relacionar la información del Supervisor por parte del Ministerio del Interior para el Contrato Interadministrativo de Administración No. 2374 de 2024 de acuerdo al : Id: 455942 de la Secretaria General del Ministerio del Interior de fecha 03 de diciembre de 2024, designación de Supervisora a la Ing MARLENY RIVERA GALEANO, identificada con Cedula de Ciudadanía N. 63.435.009.

Es preciso indicar que la comisión esta contemplada en el **ítem 4.1.9 Pruebas técnicas**, del anexo análisis del sector que hace parte Integral del Contrato Interadministrativo No. 2374 de 2024 suscrito con CODALTEC, para tal efecto es pertinente solicitar al ejercito el delegado o Funcionario Tecnico.

Quedamos atento,

Atentamente,

MARLENY RIVERA GALEANO
Profesional Especializado
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Supervisor Contrato Interadministrativo 2665 de 2023.

Se adjunta:
- Copia de designación de supervisión

Proyectó: Ing. Sergio Bernal– Contratista / Profesional de apoyo a la supervisión SPS

Outlook

Fwd: Oficio Seguimiento contrato CD-2374-2024

Desde Luis Mateo Ochoa Cañon <lochoa@codaltec.com>
Fecha Mié 12/03/2025 15:00
Para Sergio Oswaldo Bernal Jiménez <sergio.bernal@mininterior.gov.co>

3 archivos adjuntos (416 KB)

Oficio seguimiento MININT 20250100044341.pdf; CRONOGRAMA CONTRATO 2374 SIN PRÓRROGA.pdf; CRONOGRAMA CONTRATO 2374 - PRÓRROGA.pdf;

PSI

---------- Forwarded message ---------
From: **MY. Cristian Alexander Beltran Morales** <direcciontic@codaltec.com>
Date: Wed, Mar 12, 2025 at 11:19 AM
Subject: Oficio Seguimiento contrato CD-2374-2024
To: Marleny Rivera Galeano <marleny.rivera@mininterior.gov.co>, Luis Mateo Ochoa Cañon <lochoa@codaltec.com>, MY. Cristian Alexander Beltran Morales <DIRECCIONTIC@codaltec.com>

Doctora Marleny buenos días,

Me permito enviar el presente oficio con el seguimiento del contrato, así como algunas precisiones que consideramos son de suma importancia para el desarrollo del proyecto.

Agradecemos su atención y apoyo continuo, y quedamos a su disposición para resolver cualquier duda o aclaración respecto a los puntos que se mencionan. Es fundamental que estos aspectos sean considerados para asegurar el éxito y cumplimiento de los plazos establecidos.

Muchas gracias !!!

Cordialmente,

Mayor CRISTIAN ALEXANDER BELTRÁN MORALES
Director Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Corporación de Alta Tecnología - CODALTEC

Ministerio de Defensa Nacional

direcciontic@codaltec.com

Tel: +57 320703983

Carrera 38 No. 25B - 27 Bogotá - Colombia

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de CODALTEC, son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidamos lo que es de todos.
*Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El **Medio Ambiente** es responsabilidad de todos.*

*Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. **Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente.***

Bogotá D.C, 11 de marzo de 2025

20250100044341
Fecha radicación: 11/03/2025

Doctora
MARLENY RIVERA GALEANO
Supervisora Contrato CD-2374-2024 MININTERIOR
Ministerio del Interior
Marleny.rivera@mininterior.gov.co
Bogotá. -

ASUNTO: Solicitud información Seguimiento contrato CD-2374-2024.

Con toda atención, me permito dirigir la presente comunicación a la señora Supervisora del Contrato CD-2374-2024 del Ministerio del Interior, con el fin de solicitar se lleve a cabo una revisión y pronta respuesta a las solicitudes elevadas con respecto a los avances relacionados con el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS No. 2374 de 2024, celebrado entre la Nación - Ministerio del Interior - Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON) y la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa (CODALTEC), conforme a los aspectos que se detallan a continuación:

PRIMERO: Se solicita la modificación del cronograma, conforme a lo señalado por CODALTEC durante el Comité de Seguimiento Técnico y Operativo realizado en diciembre de 2024. En dicha reunión, se indicó que el cronograma propuesto por el Ministerio del Interior no contemplaba el tiempo necesario para el transporte y la nacionalización de los equipos. En respuesta a esta observación, el Ministerio solicitó la presentación por escrito del cronograma con los tiempos proporcionados por el fabricante, con el fin de obtener su aprobación en el Comité de Seguimiento Técnico y Operativo de enero de 2025. No obstante, dicha aprobación no se llevó a cabo, por lo que CODALTEC envió el cronograma modificado por correo electrónico en febrero de 2025. En consecuencia, la supervisión del contrato señaló que la mencionada aprobación debería realizarse en el comité programado para el mes de marzo de 2025, reunión que aún está pendiente de llevarse a cabo.

Adicionalmente, se tuvo en cuenta la solicitud recibida en esta Corporación el pasado 4 de marzo de 2025, mediante correo electrónico enviado por la supervisión del contrato, quien solicitó la reprogramación de la fecha para la visita técnica y capacitación en las instalaciones del fabricante, debido a razones internas del Ministerio del Interior. En respuesta, se informó lo siguiente:

El cronograma propuesto en enero contemplaba la visita y capacitación en la semana del 24 al 28 de marzo de 2025. No obstante, de acuerdo con lo solicitado por el Ministerio del Interior, el fabricante comunicó que, debido a los plazos necesarios para trámites como la obtención de visa, permisos en el país de fabricación, acceso

a la fábrica y otros procedimientos administrativos, la disponibilidad para reprogramar la visita técnica está contemplada para la semana del 21 al 23 de abril de 2025. Se destaca que esta visita resulta indispensable, ya que constituye un requisito para la importación de los equipos desde su lugar de fabricación (según el ítem 3.1.9 del documento Radicado N° 2024229001583361: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE6-DIPCO-29.25). Cabe señalar que la reprogramación implica un retraso de un mes con respecto a la fecha inicialmente establecida.

En virtud de lo anterior, el fabricante ha señalado que, debido a la reprogramación mencionada, podría ser necesario ajustar los plazos establecidos en el contrato, cuyo vencimiento actual está previsto para el 6 de junio de 2025. En este sentido, y con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, solicitamos que nos comunique su preferencia respecto a las dos opciones siguientes:

- **Prórroga del contrato**: Esta opción permitiría extender el plazo vigente del contrato, asegurando así que todos los compromisos puedan cumplirse dentro de un nuevo marco temporal ajustado a los cambios planteados por la reprogramación.

- **Modificación del contrato:** En este caso, se podrían considerar los ajustes necesarios a las condiciones del contrato, con el objetivo de no depender de la visita técnica programada. En su lugar, se permitiría el envío de los equipos, respaldado por una carta oficial de la empresa, que certificaría que los equipos cumplen con las especificaciones y requisitos establecidos en la ficha técnica. Este enfoque, de ser aceptado, podría facilitar la continuidad del proceso sin la necesidad de esperar la visita técnica, contribuyendo así a mantener los plazos previstos.

Además de lo anterior, una vez aprobado el cronograma, será necesario enviar a CODALTEC los nombres del personal designado para llevar a cabo las visitas correspondientes a la fábrica, de acuerdo con el siguiente cronograma:

- Equipo visita técnica **(21 al 23 abril 2025):**

Supervisor del contrato (1 persona)
Funcionario Técnico (1 persona)
Gerente (1 persona)

- Equipo capacitación fábrica **(mes de mayo 2025):**

Ministerio del Interior (2 personas)
Ejército Nacional (4 personas)
Codaltec (2 personas)

Asimismo, conforme a lo establecido en el ítem 4.1.9 del ANEXO 1, "ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO", será fundamental que el personal designado realice con antelación los trámites necesarios, tales como la obtención de visas, permisos, cartas

de invitación y cualquier otro procedimiento administrativo requerido en el país de origen del fabricante. Esto garantizará que no surjan inconvenientes para llevar a cabo las visitas en las fechas programadas. Dichos trámites deberán ser coordinados con el tiempo suficiente para asegurar que todas las gestiones se realicen de manera eficiente y cumpliendo con las normativas vigentes.

SEGUNDO: Respecto a las especificaciones técnicas, es imperativo aclarar:

En el documento titulado "Anexo 1: ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO", firmado el 21 de noviembre de 2024 y recibido por esta corporación el 3 de marzo de 2025, se incluyen las especificaciones técnicas de los sistemas objeto del contrato "Contratar el desarrollo e implementación de un sistema integral de Anti-Drones (Contra Aeronaves No Tripuladas C-UAS) para el Ejército Nacional". No obstante, es importante señalar las siguientes novedades identificadas en el documento.

Las características técnicas de los sistemas requeridos en el documento difieren de las características de los sistemas ofrecidos por el fabricante requerido por el Ejército Nacional, las cuales se describen en el documento *ANÁLISIS DEL SECTOR Y ESTUDIOS DEL MERCADO - PROCESOS DE SELECCIÓN*, relacionado con el objeto de contratación: "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE DEFENSA CONTRA SISTEMAS REMOTAMENTE TRIPULADOS PARA LA PROTECCIÓN DE LA VIDA, LA SEGURIDAD NACIONAL Y LA CONVIVENCIA DE TODOS LOS COLOMBIANOS EN LA BÚSQUEDA DE VIVIR EN PAZ". Este análisis se encuentra en el apartado "Análisis de la oferta" y en la cotización del sistema recomendado, incluida en el anexo *COL-FON-JC-00010-24*, con fecha del 18 de septiembre de 2024 y recibido en CODALTEC el 3 de octubre de 2024, siendo estos documentos la base para la contratación con el proveedor derivado. Además, el 27 de diciembre de 2024, se envió al representante designado del Ejército Nacional, a través del correo electrónico *Robinson.gomezgr@buzonejercito.mil.co*, las fichas técnicas de los sistemas seleccionados y su fabricante, sin haber recibido observaciones al respecto.

Bajo estas consideraciones, y en virtud de lo establecido en la cláusula SEGUNDA: *OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES*, ítem 38: "Solicitar por escrito al Ministerio la aprobación de las modificaciones a las especificaciones técnicas y actividades adicionales, siempre que estén dentro del objeto, alcance técnico y presupuesto asignado. Estas modificaciones deberán ser aprobadas por el comité de seguimiento técnico y deben incluir un análisis técnico, jurídico, financiero y administrativo que las justifique", contenida en el Anexo de Condiciones Contractuales del contrato Interadministrativo de Administración de Proyectos No. 2374 de 2024, CODALTEC refiere se utilicen las especificaciones técnicas del documento *"Sistema contra aeronaves no tripuladas No. JEMOP – DAVAA – ET 05701 / AVI – 00"* presentado por el Ejército Nacional para describir parte del proyecto, dado que estas están alineadas con el documento *"ANÁLISIS DEL SECTOR Y ESTUDIOS DEL MERCADO - PROCESOS DE SELECCIÓN"* mencionado anteriormente.

Se considera que estas modificaciones no afectarán los requisitos técnicos del cliente final ni generarán un impacto financiero sobre el proyecto.

TERCERO: Por último, es importante detallar la información relevante en relación con las cantidades y valores a considerar, así:

En el documento titulado "ANEXO 1: ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO", firmado el 21 de noviembre de 2024, se presenta de manera detallada el "PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA", así:

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR
1	5	SISTEMA TACTICO ANTIDRONES	$ 512.461.610	$ 3.074.770.800
2	9	DOMO PORTABLE	$ 2.398.667.296	$ 38.378.676.746
3	1	SISTEMA FIJO 360°	$9.318.477.383	$ 9.318.477.383
4	…	Entrenamiento, y capacitacion, Politica OFFSET, Costos asociados a la Nacionalizacion e Instalacion de equipos	16%	$ 9.602.577.121
TOTAL				**$ 60.374.502.050**

En el documento se ha identificado que las cantidades indicadas son incorrectas, ya que el valor de cada ítem no coincide con el resultado de multiplicar la cantidad por el valor unitario. Por lo tanto, las cantidades correctas que deben considerarse son las siguientes:

1. 6 - SISTEMA TÁCTICO ANTI-DRONES
2. 16 - DOMO PORTABLE
3. 1 - SISTEMA FIJO 360°

Así mismo, en el ítem 2, el valor total, según las cantidades anteriores, debería ser de $38.378.676.736, lo que difiere en $10 respecto al monto reportado en el documento. Adicionalmente, es importante señalar que los valores unitarios de cada ítem no coinciden con los establecidos en el documento Radicado N° 202422900158343l, con asunto: "Aval técnico del departamento de comunicaciones CEDE 6" del Ejército Nacional, fechado el 11 de septiembre de 2024. Este documento forma parte de la carpeta contractual del proceso y contempla el presupuesto para la adquisición de los sistemas del proyecto, como se detalla a continuación

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR
1	6	SISTEMA TACTICO ANTIDRONES	$715.957.690	$ 4.295.746.140
2	16	DOMO PORTABLE	$2.801.884.610	$ 44.830.153.760
3	1	SISTEMA FIJO 360°	$11.248.602.150	$ 11.248.602.150
TOTAL				**$ 60.374.502.050**

Sumado a esto, según el anexo 5 FONSECON MODELO DE PRESUPUESTO PROYECTO SIES de fecha 11 de junio de 2024, se describe el siguiente "PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA":

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR
1	6	SISTEMA PORTATIL	$ 512.461.610	$ 3.074.770.800
2	16	SISTEMA SEMI-FIJO	$ 2.398.667.296	$ 38.378.676.746
3	1	SISTEMA FIJO	$9.318.477.383	$ 9.318.477.383
4	…	Entrenamiento, y capacitación, Política OFFSET, Costos asociados a la Nacionalización e Instalación de equipos.	16%	$ 9.602.577.121
TOTAL				**$ 60.374.502.050**

Es importante destacar que los documentos mencionados anteriormente (con excepción del ANEXO 1) no se encuentran disponibles en la plataforma SECOP II. No obstante, estos forman parte integral del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS No. 2374 de 2024, dado que pertenecen a la carpeta contractual del proceso, la cual fue compartida por el Ministerio del Interior con CODALTEC mediante correo electrónico.

SOLICITUD

En conclusión, la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa solicita la siguiente información respecto a la ejecución del contrato referido, con el fin de garantizar la correcta implementación de las actividades previstas y asegurar el cumplimiento de los plazos y objetivos establecidos. Dicha información es esencial para evaluar el progreso del proyecto y tomar las decisiones necesarias que faciliten el desarrollo adecuado de las acciones contractuales.

A continuación, se detallan los aspectos específicos que requieren que sean tenidos en cuenta:

- Teniendo en cuenta lo expuesto en la sección 1, titulada "Modificación del Cronograma", es necesario proceder con el ajuste de este, con el fin de asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos. En virtud de lo anterior, adjuntamos el cronograma propuesto, el cual contempla las modificaciones necesarias para adaptar el desarrollo de las actividades a las circunstancias actuales.

- De acuerdo con lo descrito en la sección 2, titulada "Aclaración de Especificaciones Técnicas", solicitamos se utilicen las especificaciones técnicas detalladas en el documento "Sistema contra Aeronaves No Tripuladas No. JEMOP – DAVAA – ET 05701 / AVI – 00". Dichas especificaciones cumplen con los requisitos y necesidades del cliente final, garantizando la eficiencia y efectividad del sistema, sin que ello implique un impacto negativo en el presupuesto del proyecto ni en los plazos establecidos. Esta recomendación busca asegurar el cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto, manteniendo la calidad y viabilidad financiera del mismo evitando contradicciones entre los diferentes documentos que hacen parte de la carpeta contractual.

- En atención a las novedades observadas entre las cantidades y precios de los sistemas objeto del contrato, según lo detallado en la sección 3, titulada "Información a Considerar Frente a Cantidades y Valores", solicitamos que se utilicen las cantidades y valores establecidos en el documento N° 2024229001583431, con asunto: "Aval técnico del departamento de comunicaciones CEDE 6" del Ejército Nacional de fecha 11 de septiembre de 2024, el cual es el documento enviado al Ministerio del Interior, donde se contempló la adquisición y presupuesto para la adquisición de los sistemas del proyecto, toda vez que estos valores están ajustados a las condiciones vigentes y a las necesidades específicas del contrato, lo que los convierte en la referencia más confiable para la correcta definición de las cantidades y precios en este proceso, lo anterior con el fin de evitar contradicciones entre los diferentes documentos que hacen parte de la carpeta contractual.

Atentamente,

Coronel
NILSSEN JANETH GUTIÉRREZ SUÁREZ
Gerente

Elaboró. Ing. Luis Mateo Ochoa Cañón - Ingeniero desarrollador
Elaboró. MY. Cristian Alexander Beltrán Morales - Director TIC
Revisó. TE. Jaime Téllez Pinzón - Asesor Legal Administrativo

CC. *Cr Lewis Chaith Mahecha Ardila: lewis.mahecha@buzonejercito.mil.co*
TC. Braulio Ernesto Prato Melo: braulio.prato@buzonejercito.mil.co

Documentos adjuntos:

1. *CRONOGRAMA CONTRATO 2374 Antidrones_modificación.pdf*
2. *CRONOGRAMA CONTRATO 2374 Antidrones_modificación.pdf (Prórroga)*

Documentos mencionados: Reposan en la carpeta contractual para consulta por parte de MININTERIOR y EJC.

3. *Anexo 001 ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO firmado el 21nov2024.*
4. *Formato ANÁLISIS DEL SECTOR Y ESTUDIOS DEL MERCADO - PROCESOS DE SELECCIÓN (Carácter Secreto)*
5. *Sistema contra aeronaves no tripuladas No. JEMOP – DAVAA – ET 05701 / AVI – 00 (Carácter Secreto)*
6. *Aval técnico del departamento de comunicaciones CEDE 6 del 11sept2024 (Carácter Público Reservado)*
7. *Anexo 5 FONSECON MODELO DE PRESUPUESTO PROYECTO SIES 5junio2024 (Carácter Reservado y cifrado)*

REPUBLICA DE COLOMBIA
CORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA - CODALTEC

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No 2374 DE 2024 (PROYECCIÓN PRÓRROGA)

Contratar el desarrollo e implementación de un sistema integral de Anti Drones (Contra Aeronaves No Tripuladas C-UAS) para el Ejército Nacional.

AÑO	2024					2025																							
MES	nov-24	dic-24				ene-25				feb-25				mar-25				abr-25				may-25				jun-25			
SEMANA	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28
ACTIVIDADES																													
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE ADMINISTRACION																													
EXPEDICIÓN DE PÓLIZA Y APROBACIÓN																													
ACTA DE INICIO SUSCRITA POR LAS PARTES MINISTERIO Y CODALTEC																													
COMITÉ DE APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN																													
TRAMITE PRIMER DESEMBOLSO																													
CONTRATACION DERIVADA PARA LA ADQUISICIÓN LICENCIA DE USUARIO FINAL/ACUARDOS DE																													
TRAMITE SEGUNDO DESEMBOLSO																													
Ordenes de compra - Equipos - Fabricación equipos																													
PRUEBAS EN FABRICA																													
Transporte																													
Nacionalización																													
Cpacitación en fábrica																													
Entrega equipos																													
TRAMITE TERCER DESEMBOLSO																													
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, MANUALES DE LOS SISTEMAS Y CAPACITACIÓN DE USO																													
CERTIFICACIONES DEL 100% DE RECIBO DEL PROYECTO																													
FIRMA ACTA RECIBO																													
RECIBO Y APROBACIÓN MININT - EJERCITO NACIONAL																													
TRAMITE CUARTO Y ULTIMO DESEMBOLSO																													
ENTREGA A EJERCITO NACIONAL EN ESTA FECHA SE DA INICIO GARANTIA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRCTIVO POR 18 MESES DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO.																													
AVANCE DE EJECUCIÓN IMPLEMENTACIÓN	0%			**0%**				**5%**				**20%**				**40%**				70%				85%		**100%**			
AVANCE DE EJECUCIÓN CONTRATO	0%			**0%**				**5%**				**20%**				**40%**				**70%**				**85%**		**100%**			

CORONEL NILSSEN JANETH GUTIERREZ SUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL CODALTEC

Dra. MARLENY RIVERA GALEANO
SUPERVISOR CONTRATO No. 2374-2024 - MINISTERIO DEL INTERIOR

REPUBLICA DE COLOMBIA
CORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA- CODALTEC

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No 2374 DE 2024 (SIN PRÓRROGA)

Contratar el desarrollo e implementación de un sistema integral de Anti Drones (Contra Aeronaves No Tripuladas C-UAS) para el Ejército Nacional.

AÑO	2024					2025																							
MES	nov-24	dic-24				ene-25				feb-25				mar-25				abr-25				may-25				jun-25			
SEMANA	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28
ACTIVIDADES																													
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE ADMINISTRACION																													
EXPEDICIÓN DE PÓLIZA Y APROBACIÓN																													
ACTA DE INICIO SUSCRITA POR LAS PARTES MINISTERIO Y CODALTEC																													
COMITÉ DE APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN																													
TRAMITE PRIMER DESEMBOLSO																													
CONTRATACION DERIVADA PARA LA ADQUISICIÓN LICENCIA DE USUARIO FINAL/ACUARDOS DE																													
TRAMITE SEGUNDO DESEMBOLSO																													
Ordenes de compra - Equipos - Fabricación equipos																													
Transporte																													
Nacionalización																													
Capacitación en fábrica																													
Entrega equipos																													
Pruebas en Colombia																													
TRAMITE TERCER DESEMBOLSO																													
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, MANUALES DE LOS SISTEMAS Y CAPACITACIÓN DE USO																													
CERTIFICACIONES DEL 100% DE RECIBO DEL PROYECTO																													
FIRMA ACTA RECIBO																													
RECIBO Y APROBACIÓN MININT Y EJERCITO NACIONAL																													
TRAMITE CUARTO Y ULTIMO DESEMBOLSO																													
ENTREGA A EJERCITO NACIONAL EN ESTA FECHA SE DA INICIO GARANTIA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRCTIVO POR 18 MESES DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO																													
AVANCE DE EJECUCIÓN IMPLEMENTACIÓN	0%			**0%**				**5%**				**20%**				**40%**				70%				85%	**100%**				
AVANCE DE EJECUCIÓN CONTRATO	0%			**0%**				**5%**				**20%**				**40%**				**70%**				**85%**	**100%**				

CORONEL NILSSEN JANETH GUTIERREZ SUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL CODALTEC

Dra. MARLENY RIVERA GALEANO
SUPERVISOR CONTRATO No. 2374-2024 - MINISTERIO DEL INTERIOR

ACTA No.	REUNIÓN DE SEGUIMIENTO
FECHA	12-03-2025
CIUDAD	BOGOTÁ D.C
No. CONTRATO y/o CONVENIO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 2374 DE 2024
OBJETO:	**Contratar el desarrollo e implementación de un sistema integral de Anti Drones (Contra Aeronaves No Tripuladas C-UAS) para el Ejército Nacional.**
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	24% de 40%
MOTIVO:	Reunión de seguimiento del Contrato Interadministrativo 2374 de 2024, aclaración de temas varios del contrato

PARTES

Ministerio del Interior	**Contratista/Convenido**
Nombre: MARLENY RIVERA GALEANO C.C.: 63.435.009 Cargo: Supervisora	Nombre: Luis Mateo Ochoa Cañón C.C.: 1005334707 Cargo: Administrador del proyecto
Nombre: Sergio Oswaldo Bernal Jiménez C.C.: 80.549.196 Cargo: Apoyo a la supervisión del contrato	Nombre: CRISTIAN BELTRAN MORALES C.C.: 7183926 Cargo: Apoyo administrativo proyecto

DESARROLLO DE LA REUNION

Se inicia aclarando que de acuerdo al contrato "***CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO.*** *Forman parte integral del presente Contrato los siguientes documentos: 1) Estudio previo del Contrato. 2) Carta de presentación del proyecto en lo que no sea contrario a las disposiciones del contrato. 3) Proyecto presentado por EL Ejército Nacional 4) Los documentos viabilidad y evaluación revisados y aprobados por el Grupo de Planeación y Viabilización de la Subdirección de Proyectos a través de los formatos que reposan igualmente en el expediente del SIPI. 5) Cupo de aprobación de vigencias futuras con radicado N°2-2024-004715 de fecha 06 de febrero de expedido por el Director General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 5) Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 41424 del 08 de noviembre de 2024 6) Los demás que acompañan la carpeta contractual",* y se aclara que la carta de presentación del proyecto, es con la cual el ejercito presentó el proyecto. Se concluye que CODALTEC, cuenta con todos los anexos de viabilidad, análisis del sector, anexo 4, anexo 5, estudio de mercado, especificaciones entre otros.

Se aclara que para hacer cualquier ajuste que no requiera cambios estructurales, el comité de seguimiento técnico tiene las facultades de hacerlo, teniendo en cuenta la "*CLÁUSULA UNDÉCIMA: COMITÉ DE SEGUIMIENTO TÉCNICO Y OPERATIVO: Para el seguimiento de la ejecución de los componentes y actividades que se desarrollarán en virtud del contrato Interadministrativo a suscribir, se crea un comité técnico operativo el cual estará conformado por: (…)* ***I)*** *Para efectos de modificaciones a los anexos viabilizados y de los cuales no se requieran cambios estructurales en el objeto en cuanto a los componentes*" por lo anterior la revisión del anexo 5 y análisis de sector, se hará en comité de seguimiento técnico y operativo previa solicitud por parte de CODALTEC.

CODALTEC manifiesta que el Ejercito Nacional le ha solicitado premura con el envío de los equipos a Colombia de manera informal, y pone en la mesa la posibilidad de realizar las pruebas técnicas en Colombia, Ministerio indica que se puede evaluar la posibilidad, siempre y cuando, se tenga la solicitud formal del Ejercito Nacional y se garantice que las "pruebas en fabrica", se homologarían en Colombia, con los mismos equipos de medición, solicitud que se debe revisar y aprobar en el comité técnico operativo.

Con corte 28 de febrero, el avance programado de acuerdo al cronograma inicial es del 40% y que con las evidencias entregadas por CODALTEC, se evidencia un avance del 24%, CODALTEC aclara que este cronograma corresponde al inicial del contrato, y que el cronograma que está pidiendo ajustar, ya tiene en cuenta la contratación derivada con los tiempos de fabricación, transporte y nacionalización de acuerdo al país de origen, la cual se ajusta al tiempo total del contrato, Ministerio solicita que se discrimine los tiempos de fabricación de los equipos, el tiempo para las pruebas en fabrica, el transporte, la nacionalización entrega de equipos, puesta en marcha, entrega de documentación, capacitación y entrega formal, adicionalmente que los pagos se declaren como hitos. Esta modificación se deberá revisar y aprobar en el comité técnico.

Se indica que es responsabilidad del administrador del contrato realizar el seguimiento técnico, financiero y jurídico, y que tiene a ejercito como beneficiario final, por tratarse de un proyecto que contribuye a la seguridad nacional, algunos temas técnicos son de carácter reservado.

COMPROMISOS

RESPONSABLE		FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO

En constancia de lo anterior, se adjunta formato LISTA DE ASISTENTES en (2) folios.

Anexos: FORMATO LISTA DE ASISTENTES
Elaboró: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA CONVICENCIA Y SEGUIRDAD
Copia: Subdirección de Gestión Contractual

Interior	PROCESO	PLANEACIÓN, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y COMUNICACIONES	VERSIÓN	08
	FORMATO	LISTA DE ASISTENTES	PÁGINA	1 de 2
			FECHA VIGENCIA	09/09/2024

Tema:	Reunion de seguimiento al Contrato Interadministrativo 2374 de 2024				
Responsable u organizador:	Ministerio del Interior	Dependencia:	Subdirección de Proyectos		
Ciudad:	Bogotá	Lugar y/o enlace:	Edificio Bancol Piso 10	☒ Presencial ☐ Virtual	Fecha: Día 12 Mes 03 Año 25
Tipo ☐ Comité ☐ Junta ☒ Reunión ☐ Inducción ☐ Reinducción ☐ Capacitación ☐ Actividad ☐ Otro: ¿Cuál?_____					Hora inicial / Hora final

Para el diligenciamiento del siguiente formato, tener en cuenta los siguientes acrónimos: * **Sexo de Nacimiento (SN):** Mujer (M); Hombre (H); Intersexual (I); Prefiero no decirlo (PN). **Persona con Discapacidad (PD):** Física (F); Visual (V); Auditiva (A); Intelectual (I); Psicosocial (P); Múltiple (M); Sordoceguera (S) **Pertenencia Étnica (PE)**: Indígena (I); Gitano(a) (G); Raizal (R); Palenquero(a) (P); Afrocolombiano (a)/Afrodescendiente (A); No Aplica (NA).

N°	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EDAD	SN	PD	PE	¿ES USTED VICTIMA DEL CONFLICTO, DE VIOLACIONES AL DDHH O INFRACIONES AL DIH? SI	NO	PN	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO / ROL	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO / EXTENSIÓN	FIRMA
1	Cristian Beltran	7183926	41					X		CODALTEC	Apoyo Admin	direccionTIC@codaltec.com	3202039837	
2	Mateo Ochoa	1005334707	25					X		CODALTEC	Adm. Proyecto	lochoa@codaltec.com	3024874348	
3	Sergio D Bernal Jiménez	80.549.196	40					X		Min Interior	Apoyo Supervisión	sergio.bernal@mininterior.gov.co	3183516693	
4	Marleny Rivera G.	63485007	—					—		MININTERIOR	SUPERVISIÓN	marleny.rivera@mininterior.gov.co	3185816140	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														

- Insertar las filas que sean necesarias
- Los datos anteriormente consignados son acogidos según la política de tratamiento y protección de datos personales en el Ministerio del Interior en el marco la ley 1581 de 2012.

Interior	PROCESO	PLANEACIÓN, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y COMUNICACIONES	VERSIÓN	08
	FORMATO	LISTA DE ASISTENTES	PÁGINA	1 de 2
			FECHA VIGENCIA	09/09/2024

1. RESUMEN DE LA REUNIÓN: (Aspectos relevantes)

2. OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES GENERALES

1.
2.
3.
4.

- . En el Item *"2. Observaciones y/o conclusiones generales"*, se sugiere incluir el listado de compromisos, sus responsables y fechas de cumplimiento.
-

Elaboró resumen y conclusiones
Firma: _____ Nombres: _____ Cargo o Rol: _____ Área: _____

Outlook

RE: Invitación a Comité técnico, contrato No. 2374 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN -MINITERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA, FONSECON Y LA CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA - CODALTEC.

Desde Sergio Oswaldo Bernal Jiménez <sergio.bernal@mininterior.gov.co>
Fecha Lun 17/03/2025 16:54
Para Marleny Rivera Galeano <marleny.rivera@mininterior.gov.co>; braulio.prato@buzonejercito.mil.co <braulio.prato@buzonejercito.mil.co>; Angela Jaramillo Gomez <angela.jaramillo@mininterior.gov.co>; Luis Mateo Ochoa Cañon <lochoa@codaltec.com>; MY. Cristian Alexander Beltran Morales <cbeltran@codaltec.com>
CC cede6@ejercito.mil.co <cede6@ejercito.mil.co>

Cordial saludo,

Por agenda de algunos de los integrantes del comité, se reprograma el comité técnico para el jueves 20 de marzo a las 11 de la mañana, por lo que la invitación se actualiza de la siguiente forma:

Amablemente los invito a comité técnico del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS No. 2374 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN -MINITERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA, FONSECON Y LA CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA - CODALTEC. que se llevará a cabo el día jueves 20 de marzo de 2025 a las 11 de la mañana de manera presencial en las instalaciones del Ministerio del Interior, edificio Bancol, Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia, en el piso 10. Con la siguiente agenda:

1. Verificación de quorum.
2. Revisión y aprobación ajuste al cronograma de ejecución.
3. Consideraciones de solicitud de adición al contrato 2374 de 2024, realizadas en el comité anterior.
4. Proposiciones y varios.

Nota: se recuerda que, en el caso de haber cambiado el delegado para el comité técnico, debe contar con delegación formal, para poder tener voz y voto en la reunión.

Cordialmente,

Cordialmente,

Subdirección de Proyectos SCC
Sergio Oswaldo Bernal Jiménez
sergio.bernal@mininterior.gov.co
Celular: 3183516693
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá,
Colombia
www.mininterior.gov.co

De: Sergio Oswaldo Bernal Jiménez <sergio.bernal@mininterior.gov.co>
Enviado: lunes, 17 de marzo de 2025 16:52
Para: Marleny Rivera Galeano <marleny.rivera@mininterior.gov.co>; braulio.prato@buzonejercito.mil.co <braulio.prato@buzonejercito.mil.co>; Angela Jaramillo Gomez <angela.jaramillo@mininterior.gov.co>; Luis Mateo Ochoa Cañon <lochoa@codaltec.com>; MY. Cristian Alexander Beltran Morales <cbeltran@codaltec.com>
Cc: cede6@ejercito.mil.co <cede6@ejercito.mil.co>
Asunto: RE: Invitación a Comité técnico, contrato No. 2374 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN -MINITERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA, FONSECON Y LA CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA - CODALTEC.

Cordial saludo,

Por agenda de algunos de los integrantes del comité, se reprograma el comité técnico para el jueves 20 de marzo a las 11 de la mañana, por lo que la invitación se actualiza de la siguiente forma:

Amablemente los invito a comité técnico del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS No. 2374 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN -MINITERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA, FONSECON Y LA CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA - CODALTEC. que se llevará a cabo el día martes 20 de marzo de 2025 a las 11 de la mañana de manera presencial en las instalaciones del Ministerio del Interior, edificio Bancol, Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia, en el piso 10. Con la siguiente agenda:

1. Verificación de quorum.
2. Revisión y aprobación ajuste al cronograma de ejecución.
3. Consideraciones de solicitud de adición al contrato 2374 de 2024, realizadas en el

comité anterior.
4. Proposiciones y varios.

Nota: se recuerda que, en el caso de haber cambiado el delegado para el comité técnico, debe contar con delegación formal, para poder tener voz y voto en la reunión.

Cordialmente,

Subdirección de Proyectos SCC
Sergio Oswaldo Bernal Jiménez
sergio.bernal@mininterior.gov.co
Celular: 3183516693
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá,
Colombia
www.mininterior.gov.co

De: Sergio Oswaldo Bernal Jiménez <sergio.bernal@mininterior.gov.co>
Enviado: viernes, 14 de marzo de 2025 12:19
Para: Marleny Rivera Galeano <marleny.rivera@mininterior.gov.co>; braulio.prato@buzonejercito.mil.co <braulio.prato@buzonejercito.mil.co>; Angela Jaramillo Gomez <angela.jaramillo@mininterior.gov.co>; Luis Mateo Ochoa Cañon <lochoa@codaltec.com>; MY. Cristian Alexander Beltran Morales <cbeltran@codaltec.com>
Cc: cede6@ejercito.mil.co <cede6@ejercito.mil.co>
Asunto: RE: Invitación a Comité técnico, contrato No. 2374 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN -MINITERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA, FONSECON Y LA CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA - CODALTEC.

Cordial saludo,

Por solicitud de CODALTEC, la reunión programada inicialmente para las 11 de la mañana del día martes 18 de marzo, se re programa para las 3 de la tarde, por lo que la invitación se actualiza de la siguiente forma:

Amablemente los invito a comité técnico del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS No. 2374 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN -MINITERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA, FONSECON Y LA CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA - CODALTEC. que se llevará a cabo el día martes 18 de marzo de 2025 a las 3 de la tarde de manera presencial en las instalaciones del Ministerio del Interior, edificio Bancol, Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia, en el piso 10. Con la siguiente agenda:

1. Verificación de quorum.
2. Revisión y aprobación ajuste al cronograma de ejecución.
3. Consideraciones de solicitud de adición al contrato 2374 de 2024, realizadas en el comité anterior.
4. Proposiciones y varios.

Nota: se recuerda que, en el caso de haber cambiado el delegado para el comité técnico, debe contar con delegación formal, para poder tener voz y voto en la reunión.

Cordialmente,

Subdirección de Proyectos SCC
Sergio Oswaldo Bernal Jiménez
sergio.bernal@mininterior.gov.co
Celular: 3183516693
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá,
Colombia
www.mininterior.gov.co

De: Sergio Oswaldo Bernal Jiménez
Enviado: jueves, 13 de marzo de 2025 15:49
Para: Marleny Rivera Galeano <marleny.rivera@mininterior.gov.co>; braulio.prato@buzonejercito.mil.co <braulio.prato@buzonejercito.mil.co>; Angela Jaramillo Gomez <angela.jaramillo@mininterior.gov.co>; Luis Mateo Ochoa Cañon <lochoa@codaltec.com>; MY. Cristian Alexander Beltran Morales <cbeltran@codaltec.com>
Cc: cede6@ejercito.mil.co <cede6@ejercito.mil.co>
Asunto: Invitación a Comité técnico, contrato No. 2374 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN -MINITERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA, FONSECON Y LA CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA - CODALTEC.

Cordial saludo,

Amablemente los invito a comité técnico del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS No. 2374 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN -MINITERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA, FONSECON Y LA CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA - CODALTEC. que se llevará a cabo el día martes 18 de marzo de 2025 a las 11 de la mañana de manera presencial en las instalaciones del Ministerio del Interior, edificio

Bancol, Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia, en el piso 10. Con la siguiente agenda:

1. Verificación de quorum.
2. Revisión y aprobación ajuste al cronograma de ejecución.
3. Consideraciones de solicitud de adición al contrato 2374 de 2024, realizadas en el comité anterior.
4. Proposiciones y varios.

Nota: se recuerda que, en el caso de haber cambiado el delegado para el comité técnico, debe contar con delegación formal, para poder tener voz y voto en la reunión.

Cordialmente,

Subdirección de Proyectos SCC
Sergio Oswaldo Bernal Jiménez
sergio.bernal@mininterior.gov.co
Celular: 3183516693
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá,
Colombia
www.mininterior.gov.co

Outlook

SOLICITUD DE POLIZA PARA ASEGURAR QUE EL CONTRATISTA DERIVADO CONSTITUYA GARANTIA DE AMPARO

Desde Marleny Rivera Galeano <marleny.rivera@mininterior.gov.co>
Fecha Mar 18/03/2025 21:50
Para Luis Mateo Ochoa Cañon <lochoa@codaltec.com>
CC 'MY. Cristian Alexander Beltran Morales' <direcciontic@codaltec.com>; Faiver Rivera Montes <faiver.rivera@mininterior.gov.co>; Sergio Oswaldo Bernal Jiménez <sergio.bernal@mininterior.gov.co>

Respetados Señores,

En atención al contrato INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS No.2374 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓNMINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON Y LA CORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA- CODALTEC., me permito reiterar la solicitud de allegara a esta supervisión de manera inmediata, las pólizas que permitan brindar garantía de acuerdo a la siguiente obligación:

....Asegurar que el contratista derivado constituya garantía con amparo de calidad y correcto funcionamiento de los bienes entregados y que en la misma esté como beneficiario el Ministerio del Interior.

Agradecemos su prota colaboración.

Area: Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana Grupo: Sistemas Integrados de Emergencia y Seguridad (SIES)
Nombre completo: MARLENY RIVERA GALEANO
Profesional especializado código 2028
marleny.rivera@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00 ext. 2800
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

Outlook

Fwd: Oficio Agenda Comité Técnico cto 2374-2024 20250100044541

Desde Luis Mateo Ochoa Cañon <lochoa@codaltec.com>
Fecha Mié 19/03/2025 8:19
Para Sergio Oswaldo Bernal Jiménez <sergio.bernal@mininterior.gov.co>; braulio.prato@buzonejercito.mil.co <braulio.prato@buzonejercito.mil.co>

2 archivos adjuntos (448 KB)

Oficio Agenda Comité Técnico cto 2374-2024 20250100044541.pdf; Cronograma Técnico cto 2374-2024 20250100044541.pdf;

Buen día,

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Muchas gracias.

---------- Forwarded message ---------
From: **MY. Cristian Alexander Beltran Morales** <Proyectos@codaltec.com>
Date: Wed, Mar 19, 2025 at 8:16 AM
Subject: Oficio Agenda Comité Técnico cto 2374-2024 20250100044541
To: Marleny Rivera Galeano <marleny.rivera@mininterior.gov.co>, <lewis.mahecha@buzonejercito.mil.co>, Luis Mateo Ochoa Cañon <lochoa@codaltec.com>, MY. Cristian Alexander Beltran Morales <proyectos@codaltec.com>

Dra Marleny buenos días, respetuosamente me permito compartir oficio Agenda Comité Técnico cto 2374-2024 para su conocimiento y fines pertinentes.

Muchas gracias !!!

Cordialmente,

Mayor CRISTIAN ALEXANDER BELTRÁN MORALES
Director Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Corporación de Alta Tecnología - CODALTEC

Ministerio de Defensa Nacional

direcciontic@codaltec.com

Tel: +57 320703983

Carrera 38 No. 25B - 27 Bogotá - Colombia

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de CODALTEC, son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.
*Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El **Medio Ambiente** es responsabilidad de todos.*

*Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. **Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente.***

Outlook

Re: SOLICITUD DE POLIZA PARA ASEGURAR QUE EL CONTRATISTA DERIVADO CONSTITUYA GARANTIA DE AMPARO

Desde Luis Mateo Ochoa Cañon <lochoa@codaltec.com>
Fecha Mié 19/03/2025 8:17
Para Marleny Rivera Galeano <marleny.rivera@mininterior.gov.co>
CC MY. Cristian Alexander Beltran Morales <direcciontic@codaltec.com>; Faiver Rivera Montes <faiver.rivera@mininterior.gov.co>; Sergio Oswaldo Bernal Jiménez <sergio.bernal@mininterior.gov.co>

1 archivo adjunto (170 KB)
GARANTIA CUMPLIMIENTO 097.PDF;

Buen día,

Envío adjunto la póliza del contratista derivado.

Muchas gracias, quedo atento.

On Tue, Mar 18, 2025 at 9:50 PM Marleny Rivera Galeano <marleny.rivera@mininterior.gov.co> wrote:

> Respetados Señores,
>
> En atención al contrato INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS No.2374 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓNMINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON Y LA CORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA- CODALTEC., me permito reiterar la solicitud de allegara a esta supervisión de manera inmediata, las pólizas que permitan brindar garantía de acuerdo a la siguiente obligación:
>
> *....Asegurar que el contratista derivado constituya garantía con amparo de calidad y correcto funcionamiento de los bienes entregados y que en la misma esté como beneficiario el Ministerio del Interior.*
>
> Agradecemos su prota colaboración.

Area: Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana Grupo: Sistemas Integrados de Emergencia y Seguridad (SIES)
Nombre completo: MARLENY RIVERA GALEANO
Profesional especializado código 2028
marleny.rivera@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00 ext. 2800
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

CONTRATO Nro.	097-2024	**DE FECHA:**	17 DE DICIEMBRE 2024
OBJETO	ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE ANTI DRONES (CONTRA AERONAVES NO TRIPULADAS C-UAS) PARA EL EJÉRCITO NACIONAL.		
CONTRATISTA	**CONTRATISTA**	NEWSAT SAS	
	NIT NO.	830.513.366-3	
	R/L:	CARLOS ENRIQUE ROSERO CERON	
	C.C. NRO.	6.386.024	
VALOR DEL CONTRATO:	SESENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($60.371.994.550) VALOR QUE INCLUYE IMPUESTOS Y TODAS LAS TASAS Y CONTRIBUCIONES ASOCIADAS AL CONTRATO		
ASEGURADORA:	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.		
PÓLIZA No.:	**84763 ANEXO 0**		

NOMBRE DEL AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO EN PESOS**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	17/12/2024	17/12/2025	$6.037.199.455.00
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	17/12/2024	17/06/2028	$3.018.599.727.50
CALIDAD DE ELEMENTOS, BIENES Y EQUIPOS QUE ENTREGUE EL CONTRATISTA	17/12/2024	17/06/2027	$12.074.398.910.00

En Bogotá D.C., el día diecinueve (19) de diciembre de 2024, el suscrito Gerente (E) de la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa, aprueba las Garantías de cumplimiento y calidad del contrato de suministro de bienes No. 097 del 2024, presentadas por el contratista **NEWSAT SAS,** las cuales se encuentran ajustadas a los requerimientos exigidos dentro del contrato en mención.

Cordialmente;

CR. ABELARDO MORENO LEMOS
Gerente (E) CODALTEC

Revisó: CARLOS ALBERTO GARZÓN ROJAS - Asesor Legal CODALTEC
Elaboró: ALIX A. HIGUERA RAMOS - ASISTENTE ADMINISTRATIVA

Berkley Colombia Seguros
a Berkley Company

CERTIFICACIÓN POLIZA NO REVOCABLE

Berkley International Seguros Colombia S.A., con NIT 900-814-916-1, hace constar que la prima correspondiente a la póliza de **CUMPMIMIENTO No 84763/0, TOMADOR NEWSAT SAS** no será revocada o anulada por falta de pago.

Se expide la presente certificación en BOGOTÁ, D.C. a los 19 días del mes de Diciembre de 2024.

OSCAR ANDRES COGUA B.
Gerente Financiero
Berkley International Seguros Colombia S.A.
NIT.900.814.916-1

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
NEWSAT SAS CL 98 A 60 87 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA NIT: 8305133663 Teléf. 7456579	CUMPLIM ENT.PCAS C/REG PRIV DE CONT	84763 / 0

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA
BOGOTÁ, D.C., 18/12/2024. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 17/12/2024, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 17/06/2028.

NUMERO DE FACTURA	05 - 0084763 / 000

ASEGURADO	BENEFICIARIO
CORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA CR 50 15 35 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA NIT: 9005760759 Teléf. 3102118222	CORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA CR 50 15 35 BOGOTÁ, D.C. BOGOTA NIT: 9005760759 Teléf. 3102118222

NEGOCIO NUEVO

CODIGO DE VERIFICACION :
050008476300001BOG202412181357453

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Circular Conjunta 001 del 20 de agosto de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia informamos que mediante el correo electrónico certificacionespolizas@berkley.com.co podrá solicitar cualquier requerimiento orientado a absolver consultas sobre este documento.

PRIMA	GASTOS DE EXPEDICIÓN	IVA	PRIMA TOTAL	VENCIMIENTO PAGO
COP 93.551.781,00	COP 10.000,00	COP 17.776.738,00	COP 111.338.519,00	17/01/2025

INTERMEDIARIOS :
SEGUROS Y ASESORIAS AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS CLASE: AGENCIAS CLAVE: 600510

CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA

Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.

La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIM ENT.PCAS C/REG PRIV DE CONT registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 19092024-1347-P-05-000000CUESTRPC08-000I para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula

Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.
Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.
No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511.
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

MARIA YOLANDA ARDILA GUARIN
PRESIDENTE

Firma Autorizada

EL TOMADOR

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
19092024-1347-P-05-000000CUESTRPC08-000I y 19092024-1347-NTP-05-0000000000CUES08-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
NEWSAT SAS	CUMPLIM ENT.PCAS C/REG PRIV DE CONT	84763 / 0

CL 98 A 60 87
BOGOTÁ, D.C.
BOGOTA

NIT: 8305133663 Teléf. 7456579

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA

BOGOTÁ, D.C., 18/12/2024.

VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 17/12/2024,
VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 17/06/2028.

NUMERO DE FACTURA	05 - 0084763 / 000

CARATULA

==========

OBJETO DEL CONTRATO

==========

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO. 097 CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE ANTI DRONES (CONTRA AERONAVES NO TRIPULADAS C-UAS) PARA EL EJÉRCITO NACIONAL

BENEFICIARIO: NACIÓN–MINISTERIO DEL INTERIOR–FONSECON, NIT 830.114.475-6 y al EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA identificado con NIT No. 899.999.003-1 y a CODALTEC

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ---------- COP 6.037.199.455,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 17/12/2024, hasta las 0 hs del 17/12/2025
Prima de la Cobertura : COP 12.074.399,00

PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES ---------- COP 3.018.599.727,50
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 17/12/2024, hasta las 0 hs del 17/06/2028
Prima de la Cobertura : COP 21.138.468,00

CALIDAD DE ELEMENTOS, BIENES Y EQUIPOS QUE ENTREGUE EL CONTRATISTA -------- COP 12.074.398.910,00
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 17/12/2024, hasta las 0 hs del 17/06/2027
Prima de la Cobertura : COP 60.338.914,00

CÓDIGO DE PRODUCTO Y NOTA TECNICA REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA :
19092024-1347-P-05-000000CUESTRPC08-000I y 19092024-1347-NTP-05-0000000000CUES08-000I

REPUBLICA DE COLOMBIA
CORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA - CODALTEC

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No 2374 DE 2024

Contratar el desarrollo e implementación de un sistema integral de Anti Drones (Contra Aeronaves No Tripuladas C-UAS) para el Ejército Nacional.

AÑO	2024					2025																										
MES	nov-24	dic-24				ene-25				feb-25				mar-25				abr-25				may-25				jun-25				jul-25			
SEMANA	S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	29	30	31	32
ACTIVIDADES																																
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE ADMINISTRACION	■																															
EXPEDICIÓN DE PÓLIZA Y APROBACIÓN		■																														
ACTA DE INICIO SUSCRITA POR LAS PARTES MINISTERIO Y CODALTEC		■																														
COMITÉ DE APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN		■																														
TRAMITE PRIMER DESEMBOLSO		■	■																													
CONTRATACION DERIVADA PARA LA ADQUISICIÓN LICENCIA DE USUARIO FINAL/ACUARDOS DE		■	■	■																												
TRAMITE SEGUNDO DESEMBOLSO		■	■	■																												
Ordenes de compra		■	■	■																												
Fabricación equipos				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■														
PRUEBAS EN FABRICA																					■											
Transporte																						■	■	■								
Nacionalización																									■	■	■					
Cpacitación en fábrica																						■	■	■	■	■						
Entrega equipos																												■	■	■		
TRAMITE TERCER DESEMBOLSO																												■				
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, MANUALES DE LOS SISTEMAS																											■	■				
CAPACITACIÓN DE USO																													■	■		
CERTIFICACIONES DEL 100% DE RECIBO DEL PROYECTO																													■	■		
FIRMA ACTA RECIBO																													■	■		
RECIBO Y APROBACIÓN CODALTEC Y EJERCITO NACIONAL																													■	■		
TRAMITE CUARTO Y ULTIMO DESEMBOLSO																													■	■		
ENTREGA A EJERCITO NACIONAL EN ESTA FECHA SE DA INICIO GARANTIA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRCTIVO POR 18 MESES DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO.																													■	■		
AVANCE DE EJECUCIÓN IMPLEMENTACIÓN	0%			**0%**				**5%**				**20%**				**40%**				45%				70%				85%	**100%**			
AVANCE DE EJECUCIÓN CONTRATO	0%			**0%**				**5%**				**20%**				**40%**				**45%**				**70%**				**85%**	100%			

CORONEL NILSSEN JANETH GUTIERREZ SUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL CODALTEC

MARLENY RIVERA GALEANO
SUPERVISOR CONTRATO No. 2374-2024 - MINISTERIO DEL INTERIOR

Defensa

CODALTEC
CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA

Bogotá D.C, 18 de marzo de 2025

20250100044541
Fecha radicación: 18/03/2025

Doctora
MARLENY RIVERA GALEANO
Supervisora Contrato CD-2374-2024 MININTERIOR
Ministerio del Interior
Marleny.rivera@mininterior.gov.co
Bogotá -

ASUNTO: Agenda Comité Técnico CD-2374-2024 Ministerio del Interior.

Con toda atención, me permito dirigir la presente comunicación a la señora Supervisora del Contrato CD-2374-2024 del Ministerio del Interior, con el fin de tratar las peticiones que se llevarán a cabo en el COMITÉ DE SEGUIMIENTO TÉCNICO Y OPERATIVO programado para el día 20 de marzo de 2025.

En caso de ser necesario y haciendo uso de las cláusulas del "ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS No.2374 DE 2024":

- Cláusula SEGUNDA: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES, I. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE CODALTEC, ítem 38: "Solicitar por escrito al Ministerio la aprobación de las modificaciones a las especificaciones técnicas y actividades adicionales, siempre que estén dentro del objeto, alcance técnico y presupuesto asignado. Estas modificaciones deberán ser aprobadas por el comité de seguimiento técnico y deben incluir un análisis técnico, jurídico, financiero y administrativo que las justifique".

- CLÁUSULA UNDÉCIMA: COMITÉ DE SEGUIMIENTO TÉCNICO Y OPERATIVO, El Comité tendrá las siguientes funciones, ítem "l", "Para efectos de modificaciones a los anexos viabilizados y de los cuales no se requieran cambios estructurales en el objeto en cuanto a los componentes y/o cantidades, no requiere validación del comité SIES, siendo función de este Comité avalar los ajustes técnicos a los que haya lugar de acuerdo con la justificación de las unidades beneficiarias."

CODALTEC solicita:

1. Precisar que la contratación derivada se realiza con las especificaciones técnicas descritas en los documentos:

   a. SISTEMA CONTRA AERONAVES NO TRIPULADAS No. JEMOP-DAVAA-ET –05701 / AVI -00, 28 folios. (01 de septiembre de 2024) **SECRETO**

b. REQUISITOS GENERALES, Radicado N° 2024229001583361: MDN-COGFMCOEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE6-DIPCO-29.25, 5 folios. (sin fecha) **PÚBLICA RESERVADA**

En contraste, en el "Anexo 1. ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO" en el ítem "Descripción técnica de los productos" se evidencia que las especificaciones técnicas no corresponden a lo presentado por los fabricantes y tiene diferencias respecto a los documentos descritos en los ítems 1.a y 1.b. Anexos "COL-FON-JC-00010-24" y "Q-09737" del documento "ANÁLISIS DEL SECTOR Y ESTUDIO DE MERCADO – PROCESO DE SELECCIÓN".

2. Aclarar los valores del anexo 5 "FONSECON MODELO DE PRESUPUESTO PROYECTO SIES" con fecha de 11 junio 2024:

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR
1	6	SISTEMA PORTÁTIL	$ 512.461.610	$ 3.074.770.800
2	16	SISTEMA SEMI-FIJO	$ 2.398.667.296	$ 38.378.676.746
3	1	SISTEMA FIJO	$9.318.477.383	$ 9.318.477.383
4	…	Entrenamiento, y capacitación, Política OFFSET, Costos asociados a la Nacionalización e Instalación de equipos.	16%	$ 9.602.577.121
TOTAL				**$ 60.374.502.050**

Por los valores descritos en el documento "Aval técnico del departamento de comunicaciones CEDE 6" del 11 septiembre 2024:

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR
1	6	SISTEMA TACTICO ANTIDRONES	$715.957.690	$ 4.295.746.140
2	16	DOMO PORTABLE	$2.801.884.610	$ 44.830.153.760
3	1	SISTEMA FIJO 360°	$11.248.602.150	$ 11.248.602.150
TOTAL				**$ 60.374.502.050**

Justificación:

A. Según lo descrito por el proveedor en la carta de "Justificación de la solución integral SISTEMA TÁCTICO CONTRA DRONES" del 13 de Diciembre de 2024,

no es posible discriminar los valores de licencias, softwares y capacitaciones ya que estás hacen parte integral del sistema y es indivisible del mismo, por lo que su adquisición por separado no es posible.

B. Los valores no coinciden con el valor mencionado en el documento "ANÁLISIS DEL SECTOR Y ESTUDIO DE MERCADO – PROCESO DE SELECCIÓN", página 16 de 18. SECRETO.
C. Los valores no coinciden con el valor aprobado por documento Radicado N° 2024229001583431, con asunto: "Aval técnico del departamento de comunicaciones CEDE 6" del Ejército Nacional, de fecha 11 de septiembre de 2024.. PUBLICA RESERVADA.

Viabilidad:

A. Esta solicitud no afecta financieramente el proyecto, ya que no modifica el costo total del proyecto.
B. La presente solicitud se encuentra dentro del objeto, alcance técnico y presupuesto asignado.

3. En el documento de Requisitos Generales Radicado N° 2024229001583361: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE6-DIPCO 29.25, en el ítem 3.1.9 "Pruebas técnicas", se hace mención a la conformación de la comisión inspectora, "Para este propósito se destinará una comisión inspectora conformada por: El supervisor, un funcionario técnico y el gerente del proyecto.", se realiza la aclaración que:

a. Supervisor: Supervisor del Ministerio del Interior.
b. Funcionario técnico: Funcionario técnico del Ejército Nacional.
c. Gerente del proyecto: Gerente del proyecto o administrador de parte de CODALTEC.

4. Teniendo en cuenta que el cronograma original no contempla los tiempos de transporte y nacionalización, y así mismo por la demora en los trámites administrativos para realizar la visita técnica en fábrica, CODALTEC solicita la modificación del cronograma con la prórroga de 1 mes, necesaria para el cumplimiento de las actividades del contrato.

Cronograma Adjunto.

5. Viabilidad de la adición aprobada en el COMITÉ DE SEGUIMIENTO TÉCNICO Y OPERATIVO del día 13 de febrero de 2025.

Atentamente,

Coronel
ABELARDO MORENO LEMOS
Gerente (E)

CC. *Cr Lewis Chaith Mahecha Ardila:* *lewis.mahecha@buzonejercito.mil.co*
TC. Braulio Ernesto Prato Melo: *braulio.prato@buzonejercito.mil.co*
Sergio Oswaldo Bernal Jimenez: *braulio.prato@miniterior.gob.co*

Documentos Anexos:

1. *CRONOGRAMA CONTRATO 2374 Antidrones_modificación.pdf*

Elaboró. Ing. Luis Mateo Ochoa Cañón - Ingeniero desarrollador
Revisó. MY. Cristian Alexander Beltrán Morales - Director TIC

CODALTEC
CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA

CONTRATO CD-2374-2024
MININTERIOR INHIBIDORES
EJERCITO NACIONAL

Bogotá D.C. 18 de marzo de 2025



AGENDA

1. Objeto
2. Presupuesto
3. Resumen Financiero
4. Avances Del Proyecto
5. Solicitud aclaraciones



1. OBJETO

PRINCIPAL – MININTERIOR - CODALTEC

Contratar el desarrollo e implementación de un sistema integral de Anti Drones (Contra Aeronaves No Tripuladas C-UAS) para el Ejército Nacional.

DERIVADOS – CODALTEC - EJECUTORES

ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE ANTI-DRONES (CONTRA AERONAVES NO TRIPULADAS C-UAS) PARA EL EJÉRCITO NACIONAL.

2. PRESUPUESTO

No. CONTRATO	FIRMA DE MINUTA	TIEMPO DE ENTREGA EN MESES	VALOR TOTAL	Proyecto	V / ADMINISTRACIÓN
2374	OK	6	$61.811.415.199	$ 60.374.502.050	$1.436.913.149
TOTALES			**$61.811.415.199**	**$ 60.374.502.050**	**$1.436.913.149**

3. Resumen Financiero

Facturas presentadas por CODALTEC:

1. FE 364 por valor de **$24.451.673.330** de 10 de diciembre de 2024
2. FE 369 por valor de **$24.451.673.330** de 20 de diciembre de 2024
3. FE 370 por valor de **$1.163.899.651** incluyendo IVA de 20 de diciembre de 2024 por concepto de administración de recursos

Pagos realizados al contratista derivado:

1. Primer pago de **$17.523.000.000** realizado el 27 de diciembre de 2024
2. Segundo pago (parcial) de **$857.398.151,78** correspondientes al pago de retenciones realizadas el 28 de febrero de 2025
3. Segundo pago de **$23.879.998.033,22** realizado el 7 de marzo de 2025

Descripción	Valor
Facturado proyecto FONSECON	$ 48.903.346.660,00
Facturado Administración de recursos	$ 1.163.899.651,00
Total Facturado	$ 50.067.246.311,00
Girado Ministerio del Interior Proyecto	$ 48.903.346.660,00
Girado Ministerio del Interior Adm.	$ 1.163.899.651,00
Total Girado Ministerio del Interior	**$ 50.067.246.311,00**

Descripción	Valor
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	$ 50.029.923.276,00
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	$ 42.260.396.185,00
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	$ 15.396.982,89
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	$ -
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	$ 15.396.982,89
	$ -
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	**$ 7.784.924.073,89**

4. AVANCES DEL PROYECTO

Ítem	Tareas	Estado
1	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN	✅
2	EXPEDICIÓN DE PÓLIZA	✅
3	CERTIFICACIÓN BANCARÍA	✅
4	APROBACIÓN DE PÓLIZA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	✅
5	NOMBRAMIENTO EQUIPO DE TRABAJO CODALTEC Y DESIGNADOS COMITÉ OPERATIVO	✅
6	ACTA DE INICIO SUSCRITA POR LAS PARTES MINISTERIO Y CODALTEC (4 de diciembre de 2024)	✅
7	COMITÉ DE APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (5 de diciembre de 2024)	✅
8	TRAMITE PRIMER DESEMBOLSO (10 de diciembre de 2024)	✅
9	CONTRATACIÓN DERIVADA PARA LA ADQUISICIÓN (17 de diciembre de 2024)	✅

4. AVANCES DEL PROYECTO

CONTRATACIÓN DERIVADA

1. “ANÁLISIS DEL SECTOR Y ESTUDIO DE MERCADO – PROCESO DE SELECCIÓN“ Página 18 de 18, ítem “Recomendación”, el ejercito nacional recomienda la empresa contratista que cumple con los requerimientos técnicos, además de contar con la capacidad de mantenimiento y sostenimiento de los sistemas proyectada a 5 años.

2. “Estudio previo” del 12 de diciembre de 2024, ítem 3 “Oportunidad”, CODALTEC acoge la recomendación del ejercito Nacional dado que:


a) El contratista derivado cumple con los requerimiento técnicos exigidos por el Ejercito Nacional de Colombia, y se encuentra dentro del presupuesto.
b) Ejercito Nacional realiza el análisis del sector y estudio de mercado, donde se evidencia que el contratista derivado es el que mejor cumple con sus necesidades.

3. La contratación derivada se realiza teniendo en cuenta las especificaciones técnicas y requerimientos descritos en los documentos:

a) SISTEMA CONTRA AERONAVES NO TRIPULADAS No. JEMOP-DAVAA-ET –05701 / AVI -00, 28 folios. (01 de septiembre de 2024) **SECRETO**
b) REQUISITOS GENERALES, Radicado N° 2024229001583361: MDN-COGFMCOEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE6-DIPCO-29.25, 5 folios. (sin fecha) **PÚBLICA RESERVADA**
c) En el “Anexo 1. ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO“ en el ítem “Descripción técnica de los productos” se evidencia que las especificaciones técnicas no son acorde a lo ofrecido por los fabricantes y tienen discrepancias respecto a los documentos descritos en los ítems 3.a y 3.b. Anexos “COL-FON-JC-00010-24” y “Q-09737” del documento “ANÁLISIS DEL SECTOR Y ESTUDIO DE MERCADO – PROCESO DE SELECCIÓN“.

4. AVANCES DEL PROYECTO



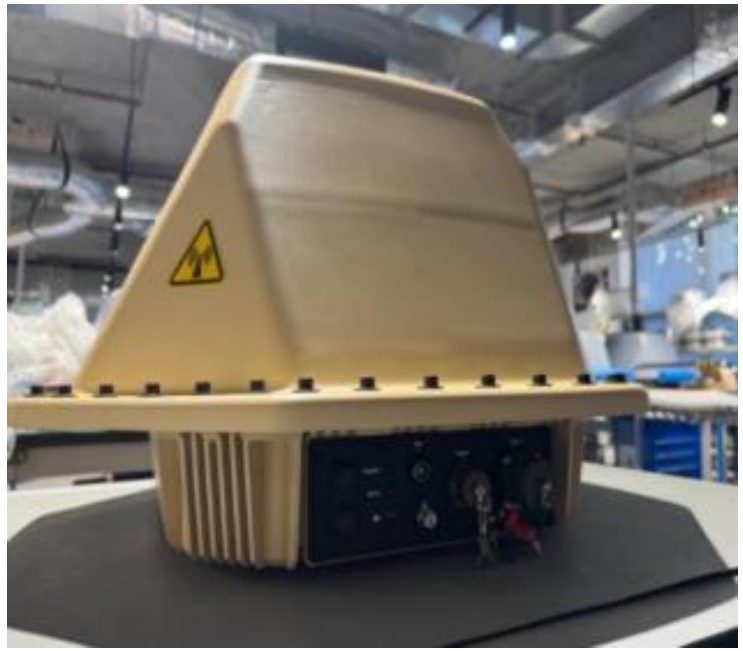



4. AVANCES DEL PROYECTO

Ítem	Tareas	Estado
10	ORDENES DE COMPRA (20 de diciembre de 2024)	☑
11	TRAMITE SEGUNDO DESEMBOLSO (20 de diciembre de 2024)	☑
12	FORMULARIO AUSTRALIANO DEC04	☑
13	FABRICACIÓN DE EQUIPOS (78,5%) (prevén finalizar - últimos días marzo 2025)	☑
14	CERTIFICACIÓN DE USUARIO FINAL (Se solicitó carta a EJERCITO NACIONAL el YY marzo 2025) Excepción del impuesto de IVA.	☑

5. Solicitud aclaraciones

CODALTEC haciendo uso de las cláusulas del “ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS No.2374 DE 2024”:

1. En la cláusula SEGUNDA: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES, ítem 38: “Solicitar por escrito al Ministerio la aprobación de las modificaciones a las especificaciones técnicas y actividades adicionales, siempre que estén dentro del objeto, alcance técnico y presupuesto asignado. Estas modificaciones deberán ser aprobadas por el comité de seguimiento técnico y deben incluir un análisis técnico, jurídico, financiero y administrativo que las justifique”.

2. En la CLÁUSULA UNDÉCIMA: COMITÉ DE SEGUIMIENTO TÉCNICO Y OPERATIVO, El Comité tendrá las siguientes funciones, ítem “l”, “Para efectos de modificaciones a los anexos viabilizados y de los cuales no se requieran cambios estructurales en el objeto en cuanto a los componentes y/o cantidades, no requiere validación del comité SIES, siendo función de este Comité avalar los ajustes técnicos a los que haya lugar de acuerdo con la justificación de las unidades beneficiarias.”

5. Solicitud aclaraciones

1. Aclarar los valores del anexo 5 “FONSECON MODELO DE PRESUPUESTO PROYECTO SIES” con fecha de 11 junio 2024:

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR
1	6	SISTEMA PORTÁTIL	$512.461.610	$3.074.770.800
2	16	SISTEMA SEMI-FIJO	$2.398.667.296	$38.378.676.746
3	1	SISTEMA FIJO	$9.318.477.383	$9.318.477.383
4	…	Entrenamiento, y capacitación, Política OFFSET, Costos asociados a la Nacionalización e Instalación de equipos.	16%	$ 9.602.577.121
TOTAL				**$ 60.374.502.050**

Por los valores descritos en el documento “Aval técnico del departamento de comunicaciones CEDE 6” del 11 septiembre 2024:

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR
1	6	SISTEMA TACTICO ANTIDRONES	$715.957.690	$ 4.295.746.140
2	16	DOMO PORTABLE	$2.801.884.610	$ 44.830.153.760
3	1	SISTEMA FIJO 360°	$11.248.602.150	$ 11.248.602.150
TOTAL				**$ 60.374.502.050**

5. Solicitud aclaraciones

Debido a:

1. Según lo descrito por el proveedor en la carta de “Justificación de la solución integral SISTEMA TÁCTICO CONTRA DRONES” del 13 de Diciembre de 2024 no es posible discriminar los valores de licencias, softwares y capacitaciones ya que estás hacen parte integral del sistema y es indivisible del mismo, por lo que su adquisición por separado no es posible.
2. Los valores no coinciden con el valor mencionado en el documento “ANÁLISIS DEL SECTOR Y ESTUDIO DE MERCADO – PROCESO DE SELECCIÓN”, página 16 de 18. **SECRETO.**
3. Los valores no coinciden con el valor aprobado por documento Radicado N° 2024229001583431, con asunto: “Aval técnico del departamento de comunicaciones CEDE 6” del Ejército Nacional, de fecha 11 de septiembre de 2024.. **PUBLICA RESERVADA.**

Viabilidad:

1. Esta solicitud no afecta financieramente el proyecto, ya que no modifica el costo total del proyecto.
2. La presente solicitud se encuentra dentro del objeto, alcance técnico y presupuesto asignado.


5. Solicitud aclaraciones

2. En el documento de Requisitos Generales Radicado N° 2024229001583361: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE6-DIPCO 29.25, en el ítem 3.1.9 “Pruebas técnicas”, se hace mención a la conformación de la comisión inspectora, “Para este propósito se destinará una comisión inspectora conformada por: el supervisor, un funcionario técnico y el gerente del proyecto.”, se realiza la aclaración que:

A. Supervisor: Supervisor del Ministerio del Interior
B. Funcionario técnico: Funcionario técnico de parte del Ejército Nacional
C. Gerente del proyecto: Gerente del proyecto o administrador de parte de CODALTEC.

5. Solicitud aclaraciones

3. Teniendo en cuenta que el cronograma original no contempla los tiempos de transporte y nacionalización, y así mismo por la demora en los trámites administrativos para realizar la visita técnica en fábrica, CODALTEC solicita el cambio del cronograma:

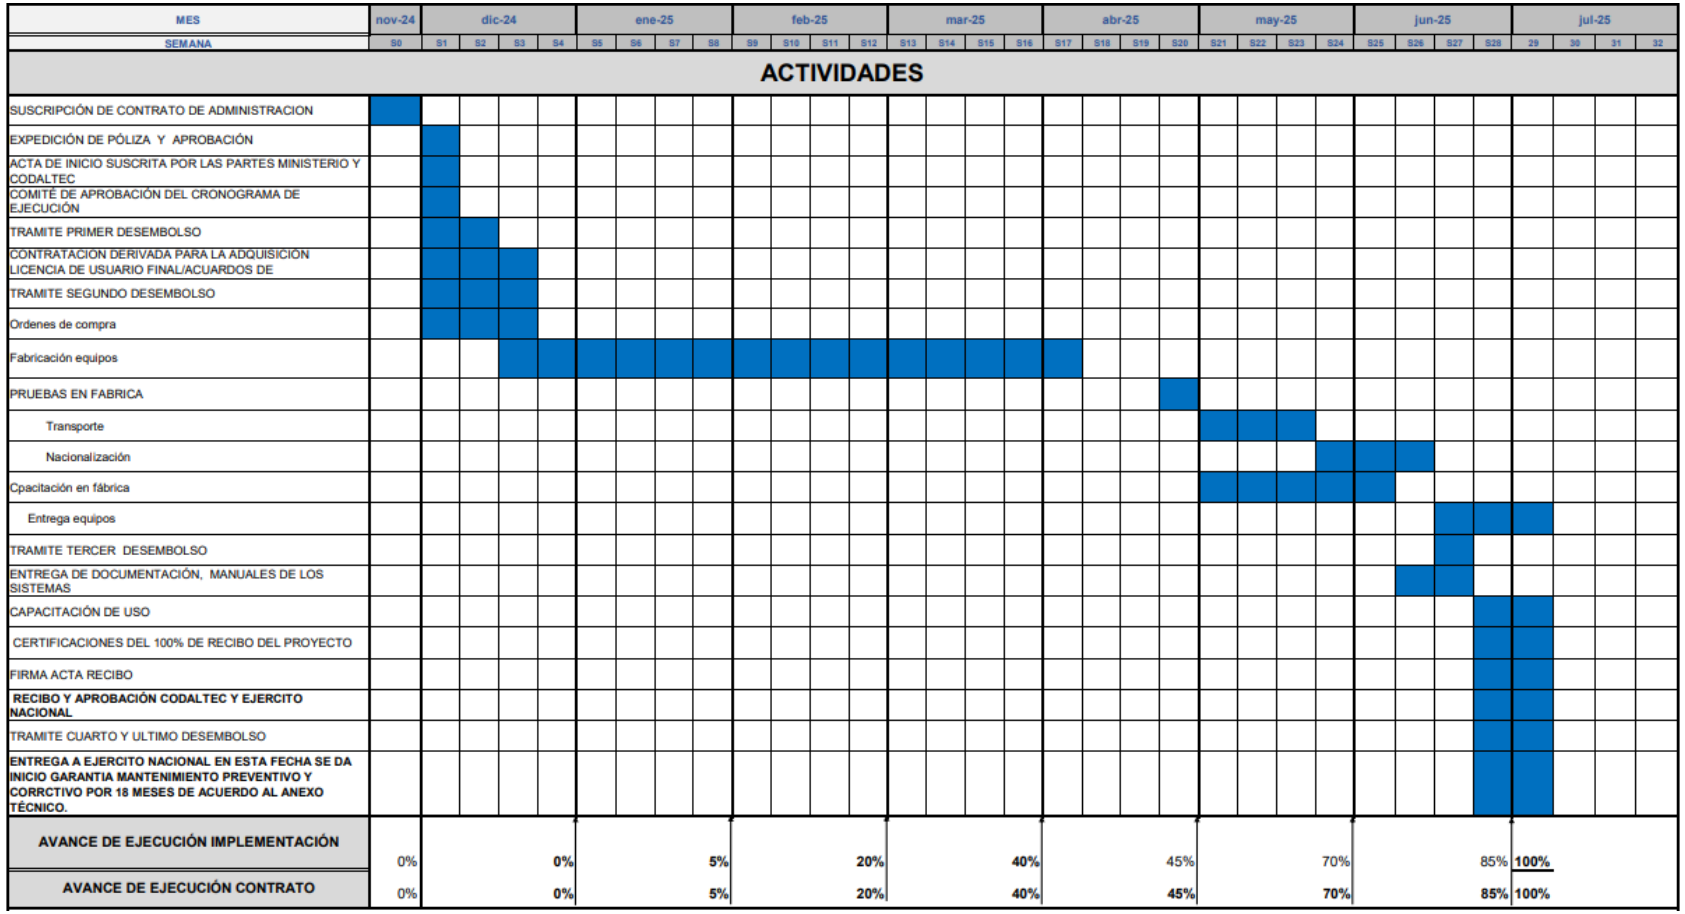

MES	nov-24	dic-24				ene-25				feb-25				mar-25				abr-25				may-25				jun-25				jul-25			
SEMANA	S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	29	30	31	32
ACTIVIDADES																																	
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE ADMINISTRACION																																	
EXPEDICIÓN DE PÓLIZA Y APROBACIÓN																																	
ACTA DE INICIO SUSCRITA POR LAS PARTES MINISTERIO Y CODALTEC																																	
COMITÉ DE APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN																																	
TRAMITE PRIMER DESEMBOLSO																																	
CONTRATACION DERIVADA PARA LA ADQUISICIÓN LICENCIA DE USUARIO FINAL/ACUARDOS DE																																	
TRAMITE SEGUNDO DESEMBOLSO																																	
Ordenes de compra																																	
Fabricación equipos																																	
PRUEBAS EN FABRICA																																	
Transporte																																	
Nacionalización																																	
Cpacitación en fábrica																																	
Entrega equipos																																	
TRAMITE TERCER DESEMBOLSO																																	
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, MANUALES DE LOS SISTEMAS																																	
CAPACITACIÓN DE USO																																	
CERTIFICACIONES DEL 100% DE RECIBO DEL PROYECTO																																	
FIRMA ACTA RECIBO																																	
RECIBO Y APROBACIÓN CODALTEC Y EJERCITO NACIONAL																																	
TRAMITE CUARTO Y ULTIMO DESEMBOLSO																																	
ENTREGA A EJERCITO NACIONAL EN ESTA FECHA SE DA INICIO GARANTIA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRCTIVO POR 18 MESES DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO.																																	
AVANCE DE EJECUCIÓN IMPLEMENTACIÓN	0%				**0%**				**5%**				**20%**				**40%**				45%				70%				85%	**100%**			
AVANCE DE EJECUCIÓN CONTRATO	0%				**0%**				**5%**				**20%**				**40%**				**45%**				**70%**				**85%**	**100%**			

GRACIAS





CODALTEC
CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA



ACTA No. 3	COMITÉ TÉCNICO
FECHA	20/03/2025
CIUDAD	BOGOTA D.C
No. CONTRATO y/o CONVENIO	2374-2024
OBJETO:	CONTRATAR EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE ANTI DRONES (CONTRA AERONAVES NO TRIPULADAS C-UAS) PARA EL EJÉRCITO NACIONAL.
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	27 % con corte a 28 de febrero de 2025.
MOTIVO:	Aclaración de Anexo 5 "FONSECON MODELO DE PRESUPUESTO PROYECTO SIES" y Actualización de Cronograma

Miembros del Comité Técnico

Ministerio del Interior	**EJERCITO NACIONAL**
Nombre: Sergio Oswaldo Bernal Jiménez C.C.: 80.549.196 Cargo: Designado en Representación del Subdirector Técnico Subdirección de Proyectos (E)	Nombre: TC. Alvaro Yessid Niño Barreto C.C.: 91.352.449 Cargo: Designado por T.C. Braulio Ernesto Prato Melo
Nombre: Marleny Rivera Galeano C.C.: 63.435.009 Cargo: Supervisora Contrato	Nombre: C.C.: Cargo:
Corporación de Alta Tecnología para la Defensa – CODALTEC	
Nombre: Abelardo Moreno Lemos C.C.: 10.489.571 Cargo: Representante designando por CODALTEC	Nombre: C.C.: Cargo:

ASISTENTES

EJERCITO NACIONAL	
Nombre: CT. Carlos Esteban Vargas C.C.: 1072960560 Cargo: Oficial de Estructuración y Formulación de Proyectos C5	Nombre: CR. Rincón Rico Esequiel C.C.: 9534240 Cargo: Enlace Ejercito Nacional con Ministerio del Interior
Corporación de Alta Tecnología para la Defensa – CODALTEC	
Nombre: MY. Cristian Beltrán Morales C.C.: 7183926 Cargo: Dirección Proyectos Especiales	Nombre: Luis Mateo Ochoa C.C.: 1005334707 Cargo: Administrador del Proyecto

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO CONTRATO: 04/12/2024
FECHA TERMINACION CONTRATO: 04/06/2025
VALOR DEL CONTRATO $ 61.811.415.199

DESARROLLO DE LA REUNION

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del Quorum
2. Resumen de la ejecución del proyecto a cargo de CODALTEC
3. Informar con que especificaciones se realizó la contratación derivada
4. Aclaración cuadro de cantidades del anexo 5
5. Aclaración miembros de la comisión inspectora
6. Actualización de Cronograma
7. Consideraciones de solicitud de adición al contrato 2374 de 2024, realizadas en el comité anterior.
8. Votación y acuerdos
9. Temas varios.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Se abre reunión donde Ministerio del Interior, indica que este comité fue citado teniendo en cuenta la solicitud enviada por CODALTEC mediante comunicación 20250100044541.

1. **Verificación del Quorum**

   Se hace verificación del Quorum por parte de CODALTEC, EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA y MINISTERIO DEL INTERIOR:

   TC. ALVARO YESSID NIÑO BARRETO – Ejercito Nacional de Colombia
   ABELARDO MORENO LEMOS - CODALTEC
   MARLENY RIVERA GALEANO C.C.– Ministerio del Interior
   SERGIO OSWALDO BERNAL JIMÉNEZ - Ministerio del Interior

El Ministerio confirma que se cuenta con la asistencia de las personas delegadas por cada una de las partes, por lo tanto, hay Quorum para iniciar comité.

   Se adjuntan las delegaciones de TC. ALVARO YESSID NIÑO BARRETO – Ejercito Nacional de Colombia y SERGIO OSWALDO BERNAL JIMÉNEZ - Ministerio del Interior

2. **Resumen de la ejecución del proyecto a cargo de CODALTEC**

   CODALTEC procede a realizar un resumen de la ejecución del proyecto (se adjunta presentación)

3. **Informar con que especificaciones se realizó la contratación derivada**

CODALTEC solicita: 1. Precisar que la contratación derivada se realiza con las especificaciones técnicas descritas en los documentos:

a) SISTEMA CONTRA AERONAVES NO TRIPULADAS No. JEMOP-DAVAA-ET –05701 / AVI -00, 28 folios. (01 de septiembre de 2024) SECRETO
b) REQUISITOS GENERALES, Radicado N° 2024229001583361: MDNCOGFMCOEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE6-DIPCO-29.25, 5 folios. (sin fecha) PÚBLICA RESERVADA En contraste, en el "Anexo 1. ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO" en el ítem "Descripción técnica de los productos" se evidencia que las especificaciones técnicas no corresponden a lo presentado por los fabricantes y tiene diferencias respecto a los documentos descritos en los ítems 1.a y 1.b. Anexos "COL-FON-JC-00010-24" y "Q09737" del documento "ANÁLISIS DEL SECTOR Y ESTUDIO DE MERCADO – PROCESO DE SELECCIÓN".

4. **Aclaración cuadro de cantidades del anexo 5**

Aclarar los valores del anexo 5 "FONSECON MODELO DE PRESUPUESTO PROYECTO SIES" con fecha de 11 junio 2024:

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR
1	6	SISTEMA PORTÁTIL	$ 512.461.610	$ 3.074.770.800
2	16	SISTEMA SEMI-FIJO	$ 2.398.667.296	$ 38.378.676.746
3	1	SISTEMA FIJO	$9.318.477.383	$ 9.318.477.383
4	...	Entrenamiento, y capacitación, Política OFFSET, Costos asociados a la Nacionalización e Instalación de equipos.	16%	$ 9.602.577.121
TOTAL				**$ 60.374.502.050**

Por los valores descritos en el documento "Aval técnico del departamento de comunicaciones CEDE 6" del 11 septiembre 2024:

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR
1	6	SISTEMA TACTICO ANTIDRONES	$715.957.690	$ 4.295.746.140
2	16	DOMO PORTABLE	$2.801.884.610	$ 44.830.153.760
3	1	SISTEMA FIJO 360°	$11.248.602.150	$ 11.248.602.150
TOTAL				**$ 60.374.502.050**

Justificación:

a) Según lo descrito por el proveedor en la carta de "Justificación de la solución integral SISTEMA TÁCTICO CONTRA DRONES" del 13 de Diciembre de 2024, no es posible discriminar los valores de licencias, softwares y capacitaciones ya que estás hacen parte

integral del sistema y es indivisible del mismo, por lo que su adquisición por separado no es posible. (se adjunta justificación)

b) Los valores no coinciden con el valor mencionado en el documento "ANÁLISIS DEL SECTOR Y ESTUDIO DE MERCADO – PROCESO DE SELECCIÓN", página 16 de 18. SECRETO.

c) Los valores no coinciden con el valor aprobado por documento Radicado N° 202422900158343l, con asunto: "Aval técnico del departamento de comunicaciones CEDE 6" del Ejército Nacional, de fecha 11 de septiembre de 2024.. PUBLICA RESERVADA.

d) Es de aclarar que la Política OFFSET no hace parte del presente contrato, toda vez que de acuerdo al *"ANÁLISIS DEL SECTOR Y ESTUDIOS DE MERCADO – PROCESOS DE SELECCIÓN"* que hace parte integral del contrato, y textualmente dice: *"Si bien no se ha considerado la política de compensación industrial (offset) de Colombia en esta cotización, es importante destacar que, de incluirse, los costos podrían aumentar significativamente debido a los acuerdos que deben establecerse con los proveedores internacionales en términos de transferencia de tecnología y soporte logístico"*

Viabilidad:

a) Esta solicitud no afecta financieramente el proyecto, ya que no modifica el costo total del proyecto.
b) La presente solicitud se encuentra dentro del objeto, alcance técnico y presupuesto asignado.

5. **Aclaración miembros de la comisión inspectora**

En el documento de Requisitos Generales Radicado N° 202422900158336l: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE6-DIPCO 29.25, en el ítem 3.1.9 "Pruebas técnicas", se hace mención a la conformación de la comisión inspectora, "Para este propósito se destinará una comisión inspectora conformada por: El supervisor, un funcionario técnico y el gerente del proyecto.", se realiza la aclaración que:


a. Supervisor: Supervisor del Ministerio del Interior.
b. Funcionario técnico: Funcionario técnico del Ejército Nacional.
c. Gerente del proyecto: Gerente del proyecto o administrador de parte de CODALTEC.

6. **Actualización de Cronograma**

Teniendo en cuenta que el cronograma original no contempla los tiempos de transporte y nacionalización, y así mismo por la demora en los trámites administrativos para realizar la visita técnica en fábrica, CODALTEC solicita la modificación del cronograma con la prórroga de 1 mes, necesaria para el cumplimiento de las actividades del contrato.

Ministerio del Interior, solicita a CODALTEC se radique formalmente la solicitud de prorroga con los documentos que justifiquen la misma, para poder hacer el debido proceso.

Se presenta cronograma de ejecución para el contrato No. 2374 de 2024, que no supera el 4 de junio

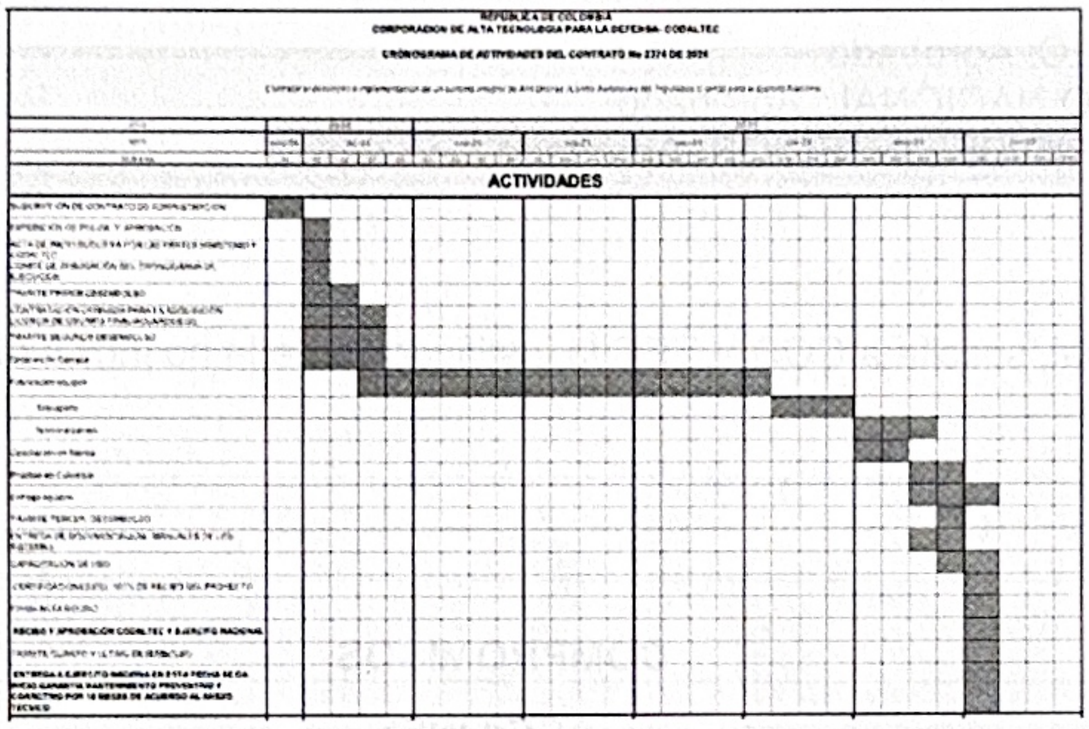

7. Consideraciones de solicitud de adición al contrato 2374 de 2024, realizadas en el comité anterior.

   Se deja sin efectos el Comité Técnico del 13 de febrero, teniendo en cuenta que no se cumplieron los requisitos para realizar la adición.

8. Votación y acuerdos

Se aprueba la aclaración de que las especificaciones son de carácter secreto y publico reservado

Voto CODALTEC: Aprobado
Voto EJERCITO NACIONAL: Aprobado
Voto MINISTERIO DEL INTERIOR: Aprobado

Se aprueba la aclaración de los valores y los ítem del anexo 5

Voto CODALTEC: Aprobado
Voto EJERCITO NACIONAL: Aprobado
Voto MINISTERIO DEL INTERIOR: Aprobado

Se aprueba la aclaración de la comisión inspectora

Voto CODALTEC: Aprobado
Voto EJERCITO NACIONAL: Aprobado
Voto MINISTERIO DEL INTERIOR: Aprobado

Se aprueba la actualización de cronograma que no supera el 4 de junio

Voto CODALTEC: Aprobado
Voto EJERCITO NACIONAL: Aprobado

Voto MINISTERIO DEL INTERIOR: Aprobado

Se aprueba dejar sin efectos el tema de la adición presentado en el comité técnico anterior

Voto CODALTEC: Aprobado
Voto EJERCITO NACIONAL: Aprobado
Voto MINISTERIO DEL INTERIOR: Aprobado

9. Temas varios:

Ejército Nacional, solicita a CODALTEC la justificación de la no inclusión de la Política OFFSET

COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO
CODALTEC	Enviar a los miembros del comité la justificación de la no inclusión de la Política OFFSET	20 de abril de 2025
CODALTEC	Radicar solicitud de PRORROGA	3 de abril de 2025

En constancia de lo anterior, firman el presente documento en tres (3) originales,

Miembros del Comité Técnico

Nombre: Sergio Oswaldo Bernal Jiménez
C.C.: 80.549.196
Cargo: Designado por Subdirector Técnico Subdirección de Proyectos
MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombre: TC. Alvaro Yessid Niño Barreto
C.C.: 91.352.449
Cargo: Designado por T.C. Braulio Ernesto Prato Melo
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

Nombre: Marleny Rivera Galeano
C.C.: 63.435.009
Cargo: Supervisora del Contrato

MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombre: Abelardo Moreno Lemos
C.C.: 10.489.571
Cargo: Representante designando por CODALTEC
Corporación de Alta Tecnología para la Defensa – CODALTEC

ASISTENTES

Nombre: CT. Carlos Esteban Vargas
C.C.: 1072960560
Cargo: Oficial de Estructuración y Formulación de Proyectos C5
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

Nombre: CR. Rincón Rico Esequiel
C.C.: 9534240
Cargo: Enlace Ejercito Nacional con Ministerio del Interior **EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA**

Nombre: MY. Cristian Beltrán Morales
C.C.: 7183926
Cargo: Dirección Proyectos Especiales
Corporación de Alta Tecnología para la Defensa – CODALTEC

Nombre: Luis Mateo Ochoa
C.C.: 1005334707
Cargo: Administrador del Proyecto
Corporación de Alta Tecnología para la Defensa – CODALTEC

Anexos:

- Presentación de CODALTEC.
- Oficio de las consideraciones presentado por CODALTEC.
- Designación realizada por el Subdirector Técnico Subdirección de Proyectos del Ministerio del Interior.
- Designación realizada por TC Braulio Ernesto Prato Melo del Ejercito Nacional.
- Justificación de la solución integral SISTEMA TÁCTICO CONTRA DRONES.

Copia: Subdirección de Gestión Contractual

REPUBLICA DE COLOMBIA
CORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA- CODALTEC

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No 2374 DE 2024

Contratar el desarrollo e implementación de un sistema integral de Anti Drones (Contra Aeronaves No Tripuladas C-UAS) para el Ejército Nacional.

AÑO	2024					2025																							
MES	nov-24	dic-24				ene-25				feb-25				mar-25				abr-25				may-25				jun-25			
SEMANA	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28
ACTIVIDADES																													
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE ADMINISTRACION																													
EXPEDICIÓN DE PÓLIZA Y APROBACIÓN																													
ACTA DE INICIO SUSCRITA POR LAS PARTES MINISTERIO Y CODALTEC																													
COMITÉ DE APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN																													
TRAMITE PRIMER DESEMBOLSO																													
CONTRATACION DERIVADA PARA LA ADQUISICIÓN LICENCIA DE USUARIO FINAL/ACUARDOS DE																													
TRAMITE SEGUNDO DESEMBOLSO																													
Ordenes de Compra																													
Fabricación equipos																													
Transporte																													
Nacionalización																													
Cpacitación en fábrics																													
Pruebas en Colombia																													
Entrega equipos																													
TRAMITE TERCER DESEMBOLSO																													
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN. MANUALES DE LOS SISTEMAS																													
CAPACITACIÓN DE USO																													
CERTIFICACIONES DEL 100% DE RECIBO DEL PROYECTO																													
FIRMA ACTA RECIBO																													
RECIBO Y APROBACIÓN CODALTEC Y EJERCITO NACIONAL																													
TRAMITE CUARTO Y ULTIMO DESEMBOLSO																													
ENTREGA A EJERCITO NACIONA EN ESTA FECHA SE DA INICIO GARANTIA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRCTIVO POR 18 MESES DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO																													

Interior	PROCESO	PLANEACIÓN, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y COMUNICACIONES	VERSIÓN	08
	FORMATO	LISTA DE ASISTENTES	PÁGINA	1 de 2
			FECHA VIGENCIA	09/09/2024

Tema: Comité Técnico CI 2374 de 2024

Responsable u organizador: Min Interior | Dependencia: Subdirección de Proyectos

Ciudad: Bogotá | Lugar y/o enlace: Bancol Piso 10 | ☒ Presencial ☐ Virtual

Tipo ☒ Comité ☐ Junta ☐ Reunión ☐ Inducción ☐ Reinducción ☐ Capacitación ☐ Actividad ☐ Otro: ¿Cuál?_____

Fecha			Hora inicial	Hora final
Día	Mes	Año		
20	03	25	11:00 a.m.	1:00 p.m.

Para el diligenciamiento del siguiente formato, tener en cuenta los siguientes acrónimos: * **Sexo de Nacimiento (SN):** Mujer (M); Hombre (H); Intersexual (I); Prefiero no decirlo (PN). **Persona con Discapacidad (PD):** Física (F); Visual (V); Auditiva (A); Intelectual (I); Psicosocial (P); Múltiple (M); Sordoceguera (S) **Pertenencia Étnica (PE)**: Indígena (I); Gitano(a) (G); Raizal (R); Palenquero(a) (P); Afrocolombiano (a)/Afrodescendiente (A); No Aplica (NA).

Nº	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EDAD	SN	PD	PE	¿ES USTED VICTIMA DEL CONFLICTO, DE VIOLACIONES AL DDHH O INFRACIONES AL DIH?			ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO / ROL	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO / EXTENSIÓN	FIRMA
							SI	NO	PN					
1	Sergio O Bernal f.	80549196						X		Min Interior	Apoyo Superior	Sergio.bernal@mininterior.gov.co	3183516693	
2	Marleny Rivera-G	G343[illegible]	—	—	—		—	—		M.Interior	SUPERVISORA	marleny.rivera@mn.	3185726140	
3	TC. YEZZID HARB B	91352449								EJERCITO NACIONAL	DIRECTOR PROYECTOS	alvaro.vinda@ejercito.mil.co	3204622670	
4	CT. Carlos Goldan Vargas	1072760560								Ejercito Nacional	Oficial de Estructuracion	Carlos.vargas.rod@ejercito.mil.co	3133780037	
5	CR Rodriguez Ramirez	9536192								Ejercito	Enlace	Grupcomm6@gmail.com	3169437004	
6	CR Abelardo Marco	1048934								CODALTEC	Subgerente	subgerente@codaltec.co	3167763160	
7	My Cristian Beltran	7183926								CODALTEC	Apoyo Proyecto	proyectos@codaltec.com	3107039837	
8	Mateo Ochoa	1005334707								CODALTEC	Administrador proyecto	lochoa@codaltec.com	3024874343	
9														
10														
11														
12														
13														

- Insertar las filas que sean necesarias
- Los datos anteriormente consignados son acogidos según la política de tratamiento y protección de datos personales en el Ministerio del Interior en el marco la ley 1581 de 2012.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025226000743941**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE6-95.5

Bogotá, D.C., 20 de marzo de 2025

Señora
MARLENY RIVERA GALEANO
Supervisora contrato anti-drones
Ministerio del Interior
Bogotá D.C

Asunto: Delegación asistencia a la reunión del comité técnico

Con toda atención, me permito informar a la señora Supervisora contrato anti-drones del Ministerio del Interior la delegación de señor Teniente Coronel NIÑO BARRETO ALVARO YEZZID con cedula N° 91352449 para que actúe en mi nombre con voz y voto en la reunión del comité técnico contracto N° 2374 del 2024 celebrado entre Ministerio del Interior Fondo de Seguridad Nacional Convivencia y Corporación alta tecnología.

Teniente Coronel BRAULIO ERNESTO PRATO MELO
Supervisan del Contrato N° 2374

Elaboró: Tania Acevedo
Oficial enlace proyecto

Interior

Al contestar cite Radicado 2025-3-003123-010244 Id: 510247
Folios: 2 Fecha: 20-03-2025 10:39:07
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: SUBDIRECCION DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA

MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: **SERGIO OSWALDO BERNAL JIMÉNEZ**
Apoyo a la Supervisión Contrato de Administración N. 2374-2024

DE: **SUBDIRECTOR DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (E)**

ASUNTO: DESIGNACIÓN COMO DELEGADO ANTE EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO TÉCNICO Y OPERATIVO

Cordial Saludo.

De manera atenta y respetuosa, me permito informar que fue designado como integrante del COMITÉ DE SEGUIMIENTO TÉCNICO Y OPERATIVO, en representación del SUBDIRECTOR DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (E) del Contrato Interadministrativo de Administración No. 2374 de 2024. Cuyo objeto es: Contratar el desarrollo e implementación de un sistema integral de Anti Drones (Contra Aeronaves No Tripuladas C-UAS) para el Ejército Nacional. Para el Comité Técnico y Operativo.

Lo anterior atendiendo lo escrito en la *CLÁUSULA UNDÉCIMA: COMITÉ DE SEGUIMIENTO TÉCNICO Y OPERATIVO: Para el seguimiento de la ejecución de los componentes y actividades que se desarrollarán en virtud del contrato Interadministrativo a suscribir, se crea un comité técnico operativo el cual estará conformado por: (…) literal b) El Subdirector de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, o quien éste designe por parte del Ministerio del Interior.*

Cordialmente

ANGELA JARAMILLO GOMEZ
Subdirector Técnico (E)
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno

Elaboró: Sergio Bernal Contratista/Apoyo a la Supervisión SPSCC

Reviso: Marleny Rivera/ Profesional Especializado

Ministerio del Interior – Sede Correspondencia
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

Interior

Al contestar cite Radicado 2025-3-003123-010244 Id: 510247
Folios: 2 Fecha: 20-03-2025 10:39:07
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: SUBDIRECCION DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA

Ministerio del Interior – Sede Correspondencia
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

Outlook

Invitación a Comité de seguimiento técnico y operativo - Marzo de 2025, contrato No. 2374 DE 2024

Desde Sergio Oswaldo Bernal Jiménez <sergio.bernal@mininterior.gov.co>

Fecha Vie 28/03/2025 17:31

Para Marleny Rivera Galeano <marleny.rivera@mininterior.gov.co>; braulio.prato@buzonejercito.mil.co <braulio.prato@buzonejercito.mil.co>; Luis Mateo Ochoa Cañon <lochoa@codaltec.com>; Angela Jaramillo Gomez <angela.jaramillo@mininterior.gov.co>; MY. Cristian Alexander Beltran Morales <cbeltran@codaltec.com>

CC cede6@ejercito.mil.co <cede6@ejercito.mil.co>

Cordial saludo,

Amablemente los invito a comité de seguimiento técnico y operativo del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS No. 2374 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN -MINITERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA, FONSECON Y LA CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA - CODALTEC. que se llevará a cabo el día lunes 31 de marzo de 2025 a las 10 de la mañana de manera presencial en las instalaciones del Ministerio del Interior, edificio Bancol, Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia, en el piso 10.

Cordialmente,

Subdirección de Proyectos SCC
Sergio Oswaldo Bernal Jiménez
sergio.bernal@mininterior.gov.co
Celular: 3183516693
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá,
Colombia
www.mininterior.gov.co

Interior

Al contestar cite Radicado 2025-2-003123-009844 Id: 514307
Folios: 4 Fecha: 28-03-2025 09:27:40
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: NILSSEN JANETH GUTIERREZ SUAREZ y Otros...

Bogotá D.C.

Coronel
NILSSEN JANETH GUTIERREZ SUAREZ
GERENTE
CODALTEC

ASUNTO: RESPUESTA SOLICITUD DE INFORMACION SEGUIMIENTO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N. 2374-204

REFERENCIA: Comunicación con radicado 20250100044341

Reciba un cordial saludo.

En atención a su comunicación referente a la "Solicitud de información sobre el seguimiento del contrato CD-2374-2024", nos permitimos informar lo siguiente:

El Ejército Nacional radicó ante el Ministerio del Interior el proyecto denominado “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE DEFENSA CONTRA SISTEMAS REMOTAMENTE TRIPULADOS PARA LA PROTECCIÓN DE LA VIDA, LA SEGURIDAD NACIONAL Y LA CONVIVENCIA DE TODOS LOS COLOMBIANOS EN LA BÚSQUEDA DE VIVIR EN PAZ”, a través de la plataforma SIPI, cumpliendo con los requisitos técnicos y de viabilidad exigidos.

Considerando la necesidad planteada por el Ejército Nacional, la especialización técnica requerida, y las funciones establecidas para el Fondo Nacional para la Seguridad y Convivencia (FONSECON), se estableció la importancia de contar con un aliado estratégico que cuente con la experiencia, la capacidad tecnológica y la garantía de cumplir con los protocolos de seguridad establecidos para el sector Defensa.

Con base en la oferta presentada por CODALTEC, entidad descentralizada indirecta del Grupo Social y Empresarial del Sector Defensa (GSED) y conforme al numeral 2 del Artículo 1.2.3.1 del Decreto 1070 de 2015, y al literal A del Artículo 2 de la Ley 80 de 1993, el Ministerio del Interior suscribió el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS No. 2374 DE 2024, entre la Nación - Ministerio del Interior - FONSECON y la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa (CODALTEC).

Al contestar cite Radicado 2025-2-003123-009844 Id: 514307
Folios: 4 Fecha: 28-03-2025 09:27:40
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: NILSSEN JANETH GUTIERREZ SUAREZ y Otros...

En marco de lo anteriormente descrito CODALTEC al desarrollar el proyecto presentado por el Ejército Nacional ofrece los siguientes beneficios para el Ministerio del Interior:

1. Entidad adscrita al Ministerio de Defensa con la misión de reducir la brecha tecnológica en seguridad y defensa.
2. Experiencia en proyectos de seguridad con el Ejército Nacional, Fuerza Aérea y Ministerio de Defensa.
3. Ahorro en el cronograma de ejecución y optimización de recursos.
4. Tecnología de última generación adaptada a necesidades de seguridad ciudadana.
5. Cumplimiento de normativas locales y estándares de protección de datos.
6. Capacidad de soporte técnico rápido y eficiente.
7. Seguridad Nacional al tratarse de un proyecto con reserva

En razón a lo antes expuesto es preciso indicar que el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS No.2374 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON Y LA CORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA- CODALTEC**. … CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO:** Contratar el desarrollo e implementación de un sistema integral de Anti Drones (Contra Aeronaves No Tripuladas C-UAS) para el Ejército Nacional. ***CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE LAS PARTES: I. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE CODALTEC 1).*** *Designar un administrador para el proyecto que represente a CODALTEC en la ejecución del contrato administrativo, así como los integrantes del Comité de Seguimiento Técnico Operativo.* ***2).*** *Contar con el personal técnico y administrativo requerido para la ejecución del presente contrato.* ***3).*** *Durante la ejecución del presente contrato cumplir con la seguridad de la información, de acuerdo con lo estipulado en los manuales e instructivos del Ejercito Nacional expedidos para el mismo. ….**16).*** *Atender los requerimientos que realice el Ejército Nacional como usuarios finales de los bienes objeto del contrato sobre el funcionamiento, operación y/o mantenimiento, así como las cartas de garantías de los bienes, en su calidad de Usuario Final, (…)*, entre otras obligaciones permite el cumplimiento del objeto contractual.

Sin embargo, recibimos su comunicación donde solicita información seguimiento contrato CD-2374-2024, cabe aclarar que de acuerdo a lo antes expuesto es de competencia de CODALTEC *"entregar al supervisor por parte del Ministerio y al personal de apoyo técnico que sea designado, los documentos e información que se requiera para la verificación y seguimiento de*

Al contestar cite Radicado 2025-2-003123-009844 Id: 514307
Folios: 4 Fecha: 28-03-2025 09:27:40
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: NILSSEN JANETH GUTIERREZ SUAREZ y Otros...

cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales y permitir las visitas de inspección de seguimiento que sean necesarias" , nos permitimos dar respuesta en los siguientes términos:

- Teniendo en cuenta lo expuesto en la sección 1, titulada "Modificación del Cronograma",

Se recibió por parte de CODALTEC mediante correo electrónico borrador del cronograma para aprobar en comité técnico.

- De acuerdo con lo descrito en la sección 2, titulada "Aclaración de Especificaciones Técnicas", me permito indicar que de acuerdo al Contrato Interadministrativo De Administración De Proyectos No.2374 De 2024 establece:

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO. *Forman parte integral del presente Contrato los siguientes documentos: 1) Estudio previo del Contrato. 2) Carta de presentación del proyecto en lo que no sea contrario a las disposiciones del contrato. 3) Proyecto presentado por EL Ejército Nacional 4) Los documentos viabilidad y evaluación revisados y aprobados por el Grupo de Planeación y Viabilización de la Subdirección de Proyectos a través de los formatos que reposan igualmente en el expediente del SIPI. 5) Cupo de aprobación de vigencias futuras con radicado N°2-2024-004715 de fecha 06 de febrero de expedido por el Director General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 5) Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 41424 del 08 de noviembre de 2024 6) Los demás que acompañan la carpeta contractual….*

Dichos documentos son de su conocimiento toda vez que hacen parte integral del contrato, si embargo en la ejecución fueron allegados por la supervisión vía correo electrónico al Ing. Luis Mateo Ocho Cañón, el día 3 de marzo de 2025.

- En atención a las novedades observadas entre las cantidades y precios de los sistemas objeto del contrato, según lo detallado en la sección 3, titulada "Información a Considerar Frente a Cantidades y Valores"

CLÁUSULA UNDÉCIMA: COMITÉ DE SEGUIMIENTO TÉCNICO Y OPERATIVO*: l) Para efectos de modificaciones a los anexos viabilizados y de los cuales no se requieran cambios estructurales en el objeto en cuanto a los componentes y/o cantidades, no requiere validación del comité SIES, siendo función de este Comité avalar los ajustes técnicos a los que haya lugar de acuerdo con la justificación de las unidades beneficiarias. Sesiones del Comité: El Comité se reunirá una vez al mes o extraordinariamente cuando se requiera y/o a solicitud de parte, por medio de reuniones virtuales o presenciales en sesiones individuales. De las decisiones que adopte este Comité se dejará un acta. Todas las decisiones serán tomadas por consenso entre sus integrantes. La Secretaría Técnica estará*

Al contestar cite Radicado 2025-2-003123-009844 Id: 514307
Folios: 4 Fecha: 28-03-2025 09:27:40
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: NILSSEN JANETH GUTIERREZ SUAREZ y Otros...

a cargo de la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior.

Por lo anterior, cualquier anexo que durante la ejecución del contrato, se evidencie la necesidad de ser ajustado y/o aclarado, CODALTEC hará la respectiva solicitud al comité técnico y operativo debidamente sustentada para ser revisada y si es el caso, ser aprobada la modificación a los anexos correspondientes.

Atentamente,

MARLENY RIVERA GALEANO
Profesional Especializado
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Supervisor Contrato Interadministrativo 2665 de 2023.
Proyectó: Ing. Sergio Bernal– Contratista / Profesional de apoyo a la supervisión SPS

Outlook

RV: Envío oficio 20250100044761

Desde Marleny Rivera Galeano <marleny.rivera@mininterior.gov.co>
Fecha Vie 28/03/2025 9:30
Para Sergio Oswaldo Bernal Jiménez <sergio.bernal@mininterior.gov.co>

1 archivo adjunto (325 KB)
Oficio previo prórroga CODALTEC MININT 20250100044761.pdf;

psi

Interior

Area: Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana Grupo: Sistemas Integrados de Emergencia y Seguridad (SIES)
Nombre completo: MARLENY RIVERA GALEANO
Profesional especializado código 2028
marleny.rivera@mininterior.gov.co
Teléfono: 601 242 74 00 ext. 2800
Cra 8 No 12B – 31 Bogotá, Colombia
www.mininterior.gov.co

De: Luis Mateo Ochoa Cañon <lochoa@codaltec.com>
Enviado: viernes, 28 de marzo de 2025 8:40
Para: Marleny Rivera Galeano <marleny.rivera@mininterior.gov.co>
Asunto: Envío oficio 20250100044761

Buen día,

Envío adjunto el oficio 20250100044761 de CODALTEC con información previa a la solicitud de la prórroga del CD-2374-2024, para su conocimiento.

Muchas gracias.

--


CODALTEC
CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA
Defensa
LUIS MATEO OCHOA CAÑON
DESARROLLADOR JUNIOR
+57 302 487 43 48
lochoa@codaltec.com
Calle 25 Bis # 31A - 97 Barrio Gran América
WWW.CODALTEC.COM
Grupo Social y Empresarial
de la Defensa

Defensa

CODALTEC
CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA

Bogotá D.C, 25 de marzo de 2025

20250100044761
Fecha radicación: 25/03/2025

Doctora
ANGELA JARAMILLO
Subdirectora (E)
Subdirección de Proyectos de Seguridad y Convivencia Ciudadana
Ministerio del Interior
Angela.jaramillo@mininterior.gov.co
Bogotá. -

ASUNTO: Información previa solicitud prórroga contrato CD-2374-2024.

Cordial saludo,

Con toda atención me permito informar a la señora Subdirectora (E) Subdirección de Proyectos de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que de acuerdo con lo establecido en la CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS No. 2374 DE 2024, en el ítem 17 de las OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE CODALTEC, se contempla la capacitación en fábrica para 06 personas del Ministerio del Interior y del Ejército Nacional y según lo estipulado en el ítem 3.1.9 del documento radicado bajo el N° 2024229001583361: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE6-DIPCO-29.25, se contempla la formación de una comisión inspectora compuesta por tres personas: El supervisor, un funcionario técnico y el gerente del proyecto, quienes tienen la función de realizar pruebas técnicas previo envío de los equipos desde el país fabricante.

En virtud de lo expuesto anteriormente, nos permitimos compartir las siguientes precisiones, dado que se han presentado una serie de situaciones que han impactado el desarrollo y la planificación habitual del proyecto. A fin de asegurar que la toma de decisiones se realice de manera informada y adecuada, le agradeceríamos mucho si pudiera considerar estas situaciones y brindarnos su orientación respecto a la decisión final sobre el desarrollo y la implementación del proyecto, con el objetivo de garantizar su correcta ejecución conforme a los lineamientos establecidos.

- El día 30 de enero de 2025, CODALTEC comunicó, a través de correo electrónico, la fecha tentativa para la visita técnica (comisión inspectora) y la capacitación en fábrica.

- El 31 de enero de 2025, el Ministerio del Interior solicitó formalmente una carta de invitación por parte de la fábrica, en la cual se incluyeran las fechas de la visita y capacitación, así como los cupos asignados para cada entidad.

- El 11 de febrero de 2025, se envió la carta de invitación por parte de la fábrica y el contratista derivado, especificando las fechas programadas del 22 al 29 de marzo de 2025. En dicha carta, y por medio de correo electrónico, se informó que, en virtud de nuevas regulaciones del gobierno de Australia, cada participante deberá completar una solicitud utilizando el formato 10A, cuya tramitación requiere un plazo mínimo de 35 días. Además, se indicaron los plazos necesarios para otros procedimientos administrativos, tales como la obtención de visas, permisos en el país de fabricación, acceso a la fábrica, entre otros. Así mismo se estableció que la relación del personal debía ser enviada a más tardar el 17 de febrero de 2025, con el fin de permitir que los designados completaran el trámite correspondiente dentro del plazo establecido por el gobierno de Australia.

- El 21 de febrero de 2025, el Ejército Nacional remitió la relación del personal, información entregada fuera del plazo inicialmente previsto para el trámite de la solicitud 10A. Para esa fecha, el Ministerio del Interior aún no había enviado la relación del personal. Posteriormente, el Ejército Nacional, de manera informal, comunicó que se requería realizar algunas modificaciones a la relación inicialmente enviada. De igual manera, el Ministerio del Interior informó, también de manera informal, que, por razones internas de la administración, aún no había sido posible establecer la relación del personal.

- El 4 de marzo de 2025, la supervisión del Ministerio del Interior remitió, a través de correo electrónico dirigido a CODALTEC, una solicitud formal en la que solicitó una prórroga para la realización de la visita técnica en fábrica por razones internas de la administración.

De acuerdo con la información previamente proporcionada, el fabricante ha informado que, debido a los plazos necesarios para completar trámites como la obtención de visas, permisos en el país de fabricación, acceso a la fábrica y otros procedimientos administrativos, la disponibilidad para reprogramar la comisión inspectora (visita técnica) se ha establecido para la semana del 21 al 23 de abril de 2025. Es relevante señalar que esta comisión inspectora es de vital importancia, ya que constituye un requisito indispensable para la importación de los equipos desde su lugar de fabricación, según lo dispuesto en el ítem 3.1.9 del documento radicado bajo el N° 2024229001583361: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE6-DIPCO-29.25.

Con base en lo anterior, se destaca que podría ser necesario ajustar los plazos establecidos en el contrato, cuyo vencimiento está previsto para el 6 de junio de 2025. Sin embargo, el fabricante ha confirmado que, para el 28 de marzo de 2025, los equipos estarán completamente construidos y listos para su despacho hacia Colombia. Cabe mencionar que, a pesar de que los equipos estarán listos, el envío no podrá realizarse hasta que se efectúe la visita técnica programada, dado que esta es un requisito contractual indispensable para cumplir con los trámites de importación y obtener la autorización del despacho.

Con el objetivo de asegurar el cumplimiento pleno de las obligaciones contractuales y considerando las circunstancias excepcionales derivadas del actual contexto de orden público, nos permitimos presentar a su consideración dos opciones que consideramos pertinentes en el desarrollo del proyecto. Antes de proceder con la solicitud formal de prórroga, tal como se menciona en el oficio, le solicitamos amablemente que se analicen estas opciones y se nos comunique cuál se considera la más adecuada, con el fin de garantizar la cumplida ejecución del proyecto y minimizar cualquier posible impacto. Agradecemos de antemano su atención y colaboración en este asunto.

- **Modificación del contrato:** Esta opción considera realizar ajustes necesarios a las condiciones del contrato, con el objetivo de no depender de la visita técnica programada para el envío de los equipos. En su lugar, se permitiría el envío de los equipos, respaldado por una carta oficial de la empresa que certifique que los equipos cumplen con las especificaciones y requisitos establecidos en la ficha técnica. Este enfoque, en caso de ser aprobado, facilitaría la continuidad del proceso sin necesidad de esperar la visita técnica, contribuyendo así a cumplir con los plazos inicialmente previstos.

- **Prórroga del contrato:** De no optarse por la anterior opción, se requeriría extender el plazo del contrato vigente, asegurando así que todos los compromisos puedan cumplirse dentro de un nuevo marco temporal ajustado a los cambios generados por las nuevas fechas de visita técnica establecidas.

Asimismo, conforme a lo establecido en el ítem 4.1.9 del ANEXO 1, "ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO", se recalca que será fundamental que el personal designado para la visita técnica y capacitación realice con antelación los trámites necesarios, tales como la obtención de visas, permisos, cartas de invitación y cualquier otro procedimiento administrativo requerido en el país de origen del fabricante. Esto garantizará que no surjan inconvenientes para llevar a cabo las visitas en las nuevas fechas programadas. Dichos trámites deberán ser coordinados con el tiempo suficiente para asegurar que todas las gestiones se realicen de manera eficiente y cumpliendo con las normativas vigentes.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

Coronel
NILSSEN JANETH GUTIÉRREZ SUÁREZ
Gerente

Elaboró. Ing. Luis Mateo Ochoa Cañón - Ingeniero desarrollador
Revisó. MY. Cristian Alexander Beltrán Morales - Director DIPES

CC. *Marleny Rivera Galeano: marleny.rivera@mininterior.gov.co*
Sergio Oswaldo Bernal: sergio.bernal@mininterior.gov.co
Cr Lewis Chaith Mahecha Ardila: lewis.mahecha@buzonejercito.mil.co
TC. Braulio Ernesto Prato Melo: braulio.prato@buzonejercito.mil.co

CODALTEC
CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA

CONTRATO CI-2374-2024
MININTERIOR ANTI DRONES
EJÉRCITO NACIONAL

Bogotá D.C. 31 de marzo de 2025



AGENDA

1. Objeto
2. Presupuesto
3. Resumen Financiero
4. Avances Del Proyecto
5. Cronograma



1. OBJETO

PRINCIPAL – MININTERIOR - CODALTEC

Contratar el desarrollo e implementación de un sistema integral de Anti Drones (Contra Aeronaves No Tripuladas C-UAS) para el Ejército Nacional.

DERIVADOS – CODALTEC - EJECUTORES

ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE ANTI-DRONES (CONTRA AERONAVES NO TRIPULADAS C-UAS) PARA EL EJÉRCITO NACIONAL.

2. PRESUPUESTO

No. CONTRATO	FIRMA DE MINUTA	TIEMPO DE ENTREGA EN MESES	VALOR TOTAL	Proyecto	V / ADMINISTRACIÓN
2374	OK	6	$61.811.415.199	$ 60.374.502.050	$1.436.913.149
TOTALES			**$61.811.415.199**	**$ 60.374.502.050**	**$1.436.913.149**

3. Resumen Financiero

Facturas presentadas por CODALTEC:

1. FE 364 por valor de **$24.451.673.330** de 10 de diciembre de 2024
2. FE 369 por valor de **$24.451.673.330** de 20 de diciembre de 2024
3. FE 370 por valor de **$1.163.899.651** incluyendo IVA de 20 de diciembre de 2024 por concepto de administración de recursos

Pagos realizados al contratista derivado:

1. Primer pago de **$17.523.000.000** realizado el 27 de diciembre de 2024
2. Segundo pago (parcial) de **$857.398.151,78** correspondientes al pago de retenciones realizadas el 28 de febrero de 2025
3. Segundo pago de **$23.879.998.033,22** realizado el 7 de marzo de 2025

Descripción	Valor
Facturado proyecto FONSECON	$ 48.903.346.660,00
Facturado Administración de recursos	$ 1.163.899.651,00
Total Facturado	$ 50.067.246.311,00
Girado Ministerio del Interior Proyecto	$ 48.903.346.660,00
Girado Ministerio del Interior Adm.	$ 1.163.899.651,00
Total Girado Ministerio del Interior	**$ 50.067.246.311,00**


Descripción	Valor
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	$ 50.029.923.276,00
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	$ 42.260.396.185,00
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	$ 15.396.982,89
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	$ -
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	$ 15.396.982,89
	$ -
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	**$ 7.784.924.073,89**

4. AVANCES DEL PROYECTO

Ítem	Tareas	Estado
1	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN	✅
2	EXPEDICIÓN DE PÓLIZA	✅
3	CERTIFICACIÓN BANCARÍA	✅
4	APROBACIÓN DE PÓLIZA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	✅
5	NOMBRAMIENTO EQUIPO DE TRABAJO CODALTEC Y DESIGNADOS COMITÉ OPERATIVO	✅
6	ACTA DE INICIO SUSCRITA POR LAS PARTES MINISTERIO Y CODALTEC (4 de diciembre de 2024)	✅
7	COMITÉ DE APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (5 de diciembre de 2024)	✅
8	TRAMITE PRIMER DESEMBOLSO (10 de diciembre de 2024)	✅
9	CONTRATACIÓN DERIVADA PARA LA ADQUISICIÓN (17 de diciembre de 2024)	✅

4. AVANCES DEL PROYECTO



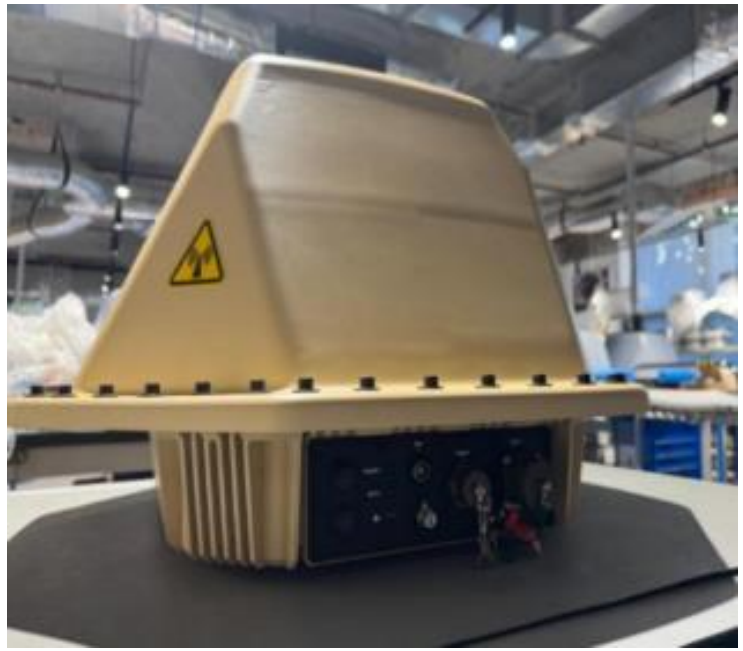




4. AVANCES DEL PROYECTO

Ítem	Tareas	Estado
10	ORDENES DE COMPRA (20 de diciembre de 2024)	☑
11	TRAMITE SEGUNDO DESEMBOLSO (20 de diciembre de 2024)	☑
12	FORMULARIO AUSTRALIANO DEC04	☑
13	FABRICACIÓN DE EQUIPOS (86%) (por normativa del gobierno australiano no es posible compartir registro fotográfico)	☑
14	CERTIFICACIÓN DE USUARIO FINAL (Se solicitó carta a EJERCITO NACIONAL el 11 marzo 2025) • Excepción del impuesto de IVA.	☑
15	Conformación de la Comisión Inspectora (planeada para el 19 de abril al 25 de abril de 2025) • Diligenciamiento del formulario del fabricante • Tramite visas de los delegados	☑
16	Conformación de la relación para la capacitación en fábrica (planeada para 10 al 18 de mayo de 2025) • Relación del Personal de cada una de las entidades (31 de marzo de 2025) • Diligenciamiento del formulario del fabricante (31 de marzo de 2025)	☑
17	Visita Site Survey lugar de instalación del equipo fijo. • Planeada para los días 2 y 3 de abril de 2025	☑

5. Cronograma

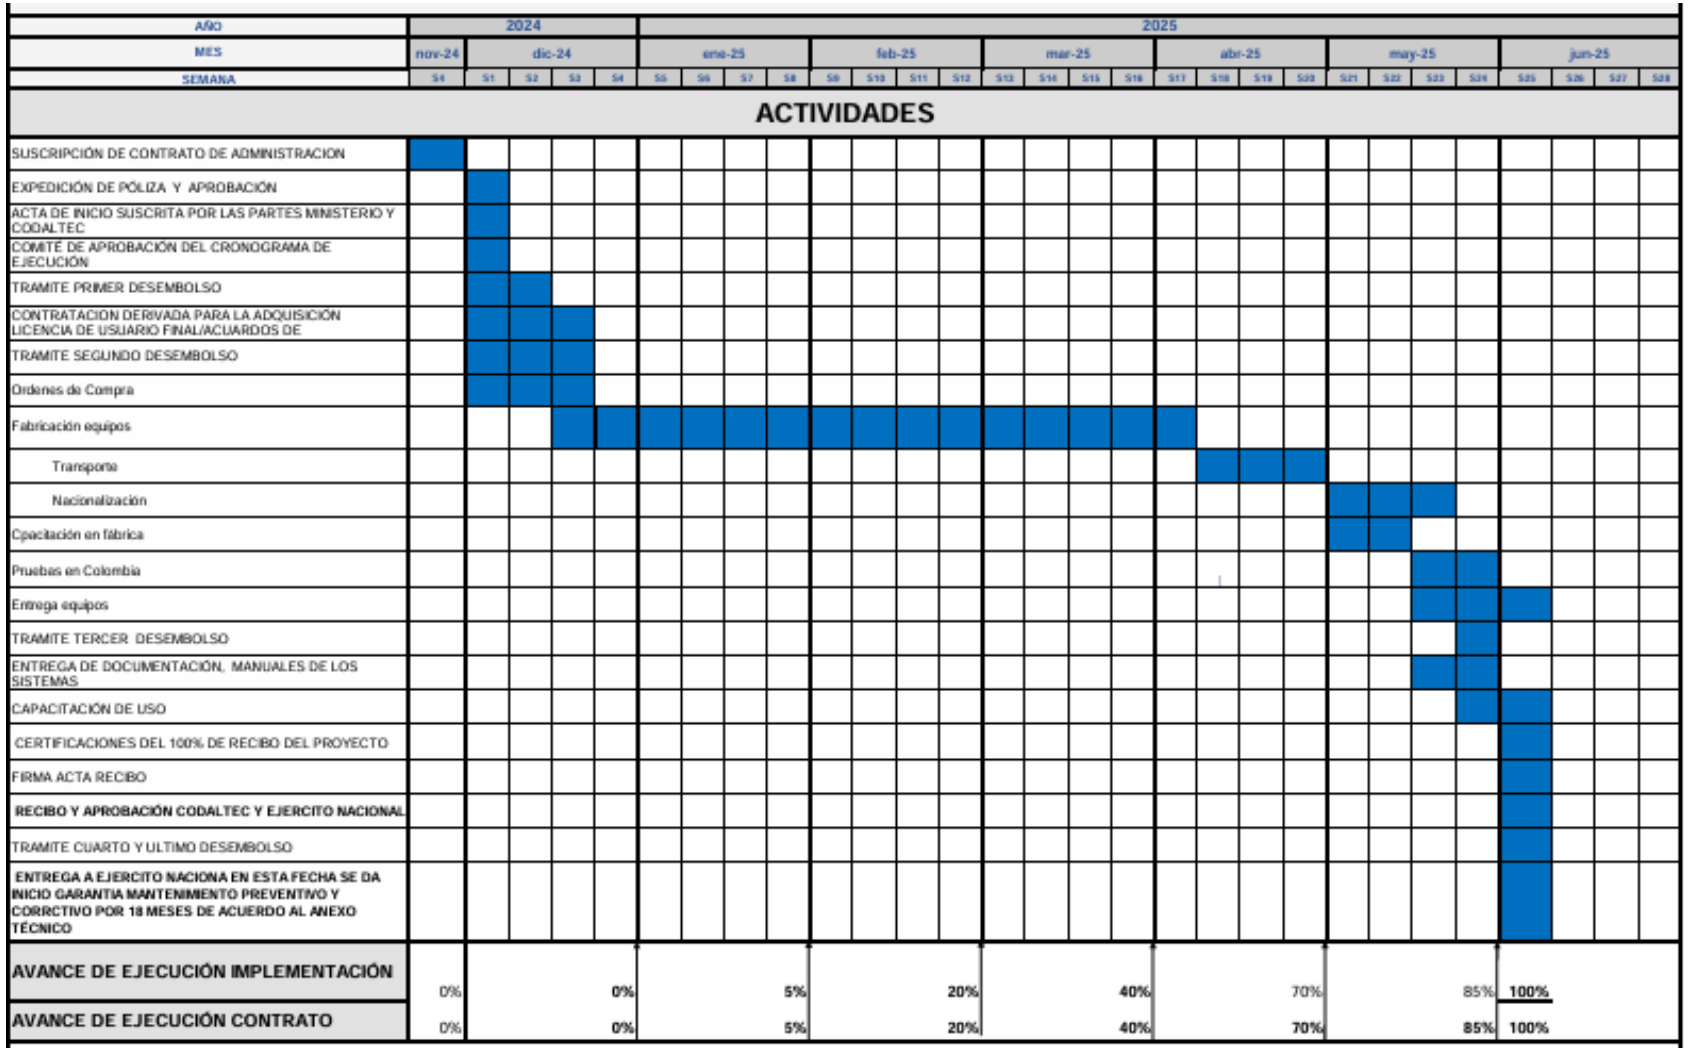

Año	2024					2025																							
MES	nov-24	dic-24				ene-25				feb-25				mar-25				abr-25				may-25				jun-25			
SEMANA	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28
ACTIVIDADES																													
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE ADMINISTRACION																													
EXPEDICIÓN DE PÓLIZA Y APROBACIÓN																													
ACTA DE INICIO SUSCRITA POR LAS PARTES MINISTERIO Y CODALTEC																													
COMITÉ DE APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN																													
TRAMITE PRIMER DESEMBOLSO																													
CONTRATACION DERIVADA PARA LA ADQUISICIÓN LICENCIA DE USUARIO FINAL/ACUARDOS DE																													
TRAMITE SEGUNDO DESEMBOLSO																													
Ordenes de Compra																													
Fabricación equipos																													
Transporte																													
Nacionalización																													
Capacitación en fábrica																													
Pruebas en Colombia																													
Entrega equipos																													
TRAMITE TERCER DESEMBOLSO																													
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN, MANUALES DE LOS SISTEMAS																													
CAPACITACIÓN DE USO																													
CERTIFICACIONES DEL 100% DE RECIBO DEL PROYECTO																													
FIRMA ACTA RECIBO																													
RECIBO Y APROBACIÓN CODALTEC Y EJERCITO NACIONAL																													
TRAMITE CUARTO Y ULTIMO DESEMBOLSO																													
ENTREGA A EJERCITO NACIONA EN ESTA FECHA SE DA INICIO GARANTIA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRCTIVO POR 18 MESES DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO																													
AVANCE DE EJECUCIÓN IMPLEMENTACIÓN	0%	0%				5%				20%				40%				70%				85%				100%			
AVANCE DE EJECUCIÓN CONTRATO	0%	0%				5%				20%				40%				70%				85%				100%			

GRACIAS





CODALTEC
CORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA



ACTA No. 4	COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO
FECHA	31/03/2025
CIUDAD	BOGOTA D.C
No. CONTRATO y/o CONVENIO	2374-2024
OBJETO:	CONTRATAR EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE ANTI DRONES (CONTRA AERONAVES NO TRIPULADAS C-UAS) PARA EL EJÉRCITO NACIONAL.
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	47 % con corte a 28 de febrero de 2025, de acuerdo al cronograma aprobado el 20 de marzo de 2025.
MOTIVO:	Seguimiento mensual al contrato

Miembros del Comité Técnico

Ministerio del Interior	**EJERCITO NACIONAL**
Nombre: Sergio Oswaldo Bernal Jiménez C.C.: 80.549.196 Cargo: Designado en Representación del Subdirector Técnico Subdirección de Proyectos (E)	Nombre: CT. Edson Farid Macias Cifuentes C.C.: 1.083.455.463 Cargo: Designado por T.C. Braulio Ernesto Prato Melo
Nombre: Marleny Rivera Galeano C.C.: 63.435.009 Cargo: Supervisora Contrato	Nombre: C.C.: Cargo:
Corporación de Alta Tecnología para la Defensa – CODALTEC	
Nombre: Abelardo Moreno Lemos C.C.: 10.489.571 Cargo: Representante designando por CODALTEC	Nombre: C.C.: Cargo:

ASISTENTES

EJERCITO NACIONAL	
Nombre: ST. Jefferson González Blanco C.C.: 1032483165 Cargo: Apoyo a la Supervisión	Nombre: C.C.: Cargo:
MINISTERIO DEL INTERIOR	
Nombre: Havid Numa C.C.: 80.074.427 Cargo: Apoyo a la Supervisión	
Corporación de Alta Tecnología para la Defensa – CODALTEC	
Nombre: MY. Cristian Beltrán Morales C.C.: 7183926 Cargo: Dirección Proyectos Especiales	Nombre: Luis Mateo Ochoa C.C.: 1005334707 Cargo: Administrador del Proyecto

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO CONTRATO: 04/12/2024
FECHA TERMINACION CONTRATO: 04/06/2025
VALOR DEL CONTRATO $ 61.811.415.199
CONTROL DE CAMBIOS AL CRONOGRAMA: 20 DE MARZO (SIN PRORROGA)

DESARROLLO DE LA REUNION

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del Quorum
2. Resumen Financiero
3. Avances del Proyecto
4. Proposiciones y Varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. Verificación del Quorum

Se hace verificación del Quorum por parte de CODALTEC, EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA y MINISTERIO DEL INTERIOR:

CT. EDSON FARID MACIAS CIFUENTES – Ejercito Nacional de Colombia
ABELARDO MORENO LEMOS - CODALTEC
MARLENY RIVERA GALEANO C.C.– Ministerio del Interior
SERGIO OSWALDO BERNAL JIMÉNEZ - Ministerio del Interior

El Ministerio confirma que se cuenta con la asistencia de las personas delegadas por cada una de las partes, por lo tanto, hay Quorum para iniciar comité.

Se adjuntan las delegaciones de CT. EDSON FARID MACIAS CIFUENTES – Ejercito Nacional de Colombia y SERGIO OSWALDO BERNAL JIMÉNEZ - Ministerio del Interior

2. Resumen Financiero

No. CONTRATO	FIRMA DE MINUTA	TIEMPO DE ENTREGA EN MESES	VALOR TOTAL	Proyecto	V / ADMINISTRACIÓN
2374	OK	6	$61.811.415.199	$ 60.374.502.050	$1.436.913.149
TOTALES			**$61.811.415.199**	**$ 60.374.502.050**	**$1.436.913.149**

Facturas presentadas por CODALTEC:

a) FE 364 por valor de **$24.451.673.330** de 10 de diciembre de 2024
b) FE 369 por valor de **$24.451.673.330** de 20 de diciembre de 2024
c) FE 370 por valor de **$1.163.899.651** incluyendo IVA de 20 de diciembre de 2024 por concepto de administración de recursos


Pagos realizados al contratista derivado:

a) Primer pago de **$17.523.000.000** realizado el 27 de diciembre de 2024
b) Segundo pago (parcial) de **$857.398.151,78** correspondientes al pago de retenciones realizadas el 28 de febrero de 2025
c) Segundo pago de **$23.879.998.033,22** realizado el 7 de marzo de 2025

Descripción	Valor
Facturado proyecto FONSECON	$ 48.903.346.660,00
Facturado Administración de recursos	$ 1.163.899.651,00
Total Facturado	$ 50.067.246.311,00
Girado Ministerio del Interior Proyecto	$ 48.903.346.660,00
Girado Ministerio del Interior Adm.	$ 1.163.899.651,00
Total Girado Ministerio del Interior	**$ 50.067.246.311,00**

Descripción	Valor
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	$ 50.029.923.276,00
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	$ 42.260.396.185,00
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	$ 15.396.982,89
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	$ -
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	$ 15.396.982,89
	$ -
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	**$ 7.784.924.073,89**

3. Avances del Proyecto

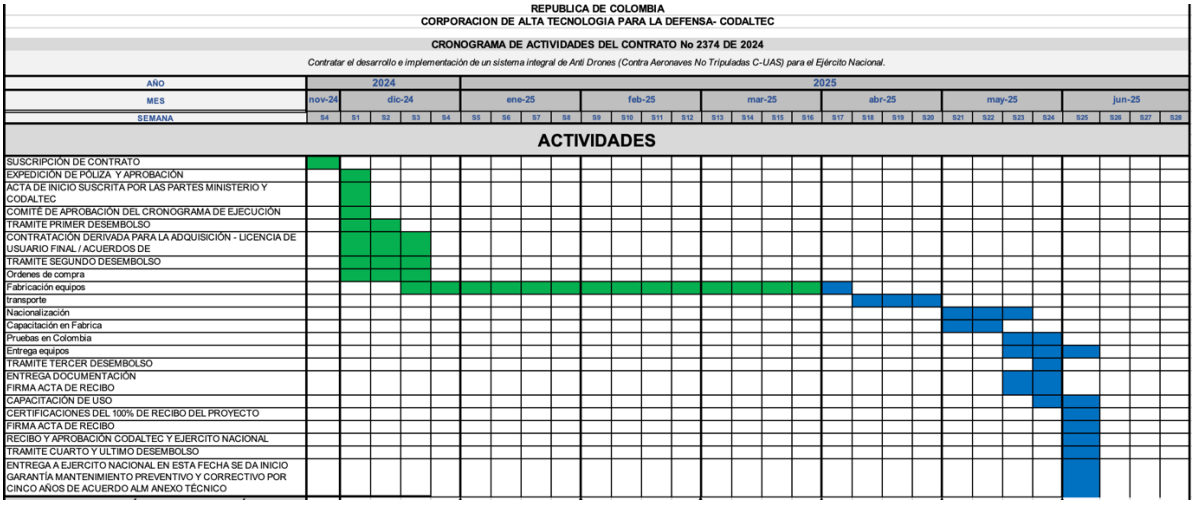

CODALTEC reporta un avance de la fabricación del 86%, Ministerio solicita se haga llegar las evidencias del avance en el informe del mes de marzo.

Avance planeado de fabricación es del 94%
Avance ejecutado de fabricación es del 86%
Retraso en fabricación es del 8%

Avance planeado del contrato es del 55%
Avance ejecutado del contrato es del 53%
Retraso del contrato es del 2%

CODALTEC manifiesta que los equipos estarán listos de acuerdo con el cronograma, Ministerio solicita una vez finalizada la fabricación, se envíe la evidencia a los miembros del comité.

4. Proposiciones y Varios

   Con respecto a la solicitud de Prorroga por parte de CODALTEC, compromiso del comité anterior, se acuerda por los miembros del comité, que se realice luego de las pruebas en fábrica, esto con el fin de no tener reprocesos en las solicitud de prórroga, teniendo una fecha de importación más acertada, así como la fecha fin de cumplimiento del objeto contractual.

COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO

Anexos:

- Presentación de CODALTEC.
- Designación realizada por el Subdirector Técnico Subdirección de Proyectos del Ministerio del Interior.
- Designación realizada por TC Braulio Ernesto Prato Melo del Ejercito Nacional.
- Firmas de asistentes

Copia: Subdirección de Gestión Contractual

Interior	PROCESO	PLANEACIÓN, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y COMUNICACIONES	VERSIÓN	08
	FORMATO	LISTA DE ASISTENTES	PÁGINA	1 de 2
			FECHA VIGENCIA	09/09/2024

Tema: Comité de Seguimiento Técnico y Operativo #4 Contrato 2374 de 2024

Responsable u organizador: Min Interior Dependencia: Min Interior - Subdirección de Inspectores

Ciudad: Bogotá Lugar y/o enlace: ☒ Presencial ☐ Virtual

Tipo ☒ Comité ☐ Junta ☐ Reunión ☐ Inducción ☐ Reinducción ☐ Capacitación ☐ Actividad ☐ Otro: ¿Cuál?_____

Fecha			Hora inicial
Día	Mes	Año	10:00
31	03	2025	Hora final

Para el diligenciamiento del siguiente formato, tener en cuenta los siguientes acrónimos: * **Sexo de Nacimiento (SN):** Mujer (M); Hombre (H); Intersexual (I); Prefiero no decirlo (PN). **Persona con Discapacidad (PD):** Física (F); Visual (V); Auditiva (A); Intelectual (I); Psicosocial (P); Múltiple (M); Sordoceguera (S) **Pertenencia Étnica (PE)**: Indígena (I); Gitano(a) (G); Raizal (R); Palenquero(a) (P); Afrocolombiano (a)/Afrodescendiente (A); No Aplica (NA).

Nº	NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	EDAD	SN	PD	PE	¿ES USTED VICTIMA DEL CONFLICTO, DE VIOLACIONES AL DDHH O INFRACIONES AL DIH?			ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO / ROL	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO / EXTENSIÓN	FIRMA
							SI	NO	PN					
1														
2	Sergio O Bernal Jiménez	80549196	40					X		Min Interior	Apoyo Supervisión	sergio.bernal@mininterior.gov.co	3183516693	
3	HAVID NUMC	80074427	40					X		MININTERIOR	APOYO JURIDICO	havidnunc@mininterior.gov.co	3007119846	
4	Abelardo Mollo L.	1081894571	38					X		CODALTEC	Subgerente	subgerencia@codaltec.com	3167213260	
5	Jefferson González Ramo	1032483165	28					X		EJC	Apoyo a la Supervisión	Jefferson.gonzalezbl@buboni	3219688193	
6	Edson Farid Macías Cifuentes	1083457463	38					X		EJC	Apoyo a Supervisión	edson.macias@ejercito.mil.co	3005170532	
7	Luis Mateo Ochoa Cossio	1005334707	25					X		CODALTEC	Adm. proyecto	lochoa@codaltec.com	3024374348	
8	Hy Cristian A. Beltran M	7183926	41					X		CODALTEC	Director TIC	direccion.tic@codaltec.com	3207037837	
9	MARLENY RIVERA	63435009	—					—		MINISTERIO DEL INTERIOR	SUPERVISORA	marleny.rivera@mininterior.gov.co	3185826740	
10														
11														
12														
13														

- Insertar las filas que sean necesarias
- Los datos anteriormente consignados son acogidos según la política de tratamiento y protección de datos personales en el Ministerio del Interior en el marco la ley 1581 de 2012.

1. RESUMEN DE LA REUNIÓN: (Aspectos relevantes)

2. OBSERVACIONES Y/O CONCLUSIONES GENERALES

1.
2.
3.
4.

- . En el Item *"2. Observaciones y/o conclusiones generales"*, se sugiere incluir el listado de compromisos, sus responsables y fechas de cumplimiento.
-

Elaboró resumen y conclusiones
Firma:
Nombres: Sergio D Bernal S.
Cargo o Rol: Apoyo Supervisión
Área:

Interior

Al contestar cite Radicado 2025-3-003123-010244 Id: 510247
Folios: 2 Fecha: 20-03-2025 10:39:07
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: SUBDIRECCION DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA

MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: **SERGIO OSWALDO BERNAL JIMÉNEZ**
Apoyo a la Supervisión Contrato de Administración N. 2374-2024

DE: **SUBDIRECTOR DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (E)**

ASUNTO: DESIGNACIÓN COMO DELEGADO ANTE EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO TÉCNICO Y OPERATIVO

Cordial Saludo.

De manera atenta y respetuosa, me permito informar que fue designado como integrante del COMITÉ DE SEGUIMIENTO TÉCNICO Y OPERATIVO, en representación del SUBDIRECTOR DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (E) del Contrato Interadministrativo de Administración No. 2374 de 2024. Cuyo objeto es: Contratar el desarrollo e implementación de un sistema integral de Anti Drones (Contra Aeronaves No Tripuladas C-UAS) para el Ejército Nacional. Para el Comité Técnico y Operativo.

Lo anterior atendiendo lo escrito en la *CLÁUSULA UNDÉCIMA: COMITÉ DE SEGUIMIENTO TÉCNICO Y OPERATIVO: Para el seguimiento de la ejecución de los componentes y actividades que se desarrollarán en virtud del contrato Interadministrativo a suscribir, se crea un comité técnico operativo el cual estará conformado por: (…) literal b) El Subdirector de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, o quien éste designe por parte del Ministerio del Interior.*

Cordialmente

ANGELA JARAMILLO GOMEZ
Subdirector Técnico (E)
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno

Elaboró: Sergio Bernal Contratista/Apoyo a la Supervisión SPSCC

Reviso: Marleny Rivera/ Profesional Especializado

Ministerio del Interior – Sede Correspondencia
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

Interior

Al contestar cite Radicado 2025-3-003123-010244 Id: 510247
Folios: 2 Fecha: 20-03-2025 10:39:07
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: SUBDIRECCION DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA

Ministerio del Interior – Sede Correspondencia
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025226000834971**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMPP-CEDE6-95.5

Bogotá, D.C., 31 de marzo de 2025

Señora
MARLENY RIVERA GALEANO
Supervisora contrato anti-drones
Ministerio del Interior
Bogotá D.C

Asunto: Delegación asistencia a la reunión del comité técnico

Con toda atención, me permito informar a la señora Supervisora contrato anti-drones del Ministerio del Interior la delegación de señor Capitán MACIAS CIFUENTES EDSON FARID con cedula N° 911083455463 para que actúe en mi nombre con voz y voto en la reunión del comité técnico contracto N° 2374 del 2024 celebrado entre Ministerio del Interior Fondo de Seguridad Nacional Convivencia y Corporación alta tecnología.

Teniente Coronel BRAULIO ERNESTO PRATO MELO
Supervisan del Contrato N° 2374

Elaboró: ST Tania Acevedo
Ayudante CEDE6

Carrera 54 N 26 – 25 Edificio Fortaleza Oficina 358
Bogotá, D.C.
cede6@buzonejercito.mil.co/ www.ejercito.mil.co

Outlook

Informe 005 Administración de Proyectos CODALTEC CD-2374-2024

Desde MY. Cristian Alexander Beltran Morales <Proyectos@codaltec.com>
Fecha Lun 07/04/2025 13:38
Para Marleny Rivera Galeano <marleny.rivera@mininterior.gov.co>
CC Sergio Oswaldo Bernal Jiménez <sergio.bernal@mininterior.gov.co>; Luis Mateo Ochoa Cañon <lochoa@codaltec.com>

4 archivos adjuntos (2 MB)

20250100045111 Informe Marzo - CD-2374-2024.pdf; 3_Informe avance proyecto CADATEC-02-ABRIL-25.pdf; 2_Informe de avance financiero mes de Marzo contrato 2374-1.pdf; 1_Informe de avance de ejecución 005 mes de Marzo contrato 2374.pdf;

No suele recibir correo electrónico de proyectos@codaltec.com. Por qué es esto importante

Doctora Marleny, buena tarde.

Espero que se encuentre muy bien. De manera atenta me permito enviar informe correspondiente al mes de marzo de 2025 referente a la administración del proyecto CD-2374-2024. En el documento se detallan los avances, actividades realizadas, así como los aspectos más relevantes de la gestión en dicho periodo.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de CODALTEC, son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.
Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El ***Medio Ambiente*** *es responsabilidad de todos.*

Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. ***Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente.***

Interior

Al contestar cite Radicado 2025-2-003123-011692 Id: 520566
Folios: 3 Fecha: 08-04-2025 15:22:40
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: NILSSEN JANETH GUTIERREZ SUAREZ

Bogotá D.C.

Coronel
NILSSEN JANETH GUTIERREZ SUAREZ
GERENTE
CODALTEC


ASUNTO: Solicitud de ajuste y ampliación al informe No. 5 del avance en la fabricación de los bienes y el estado de la ejecución del contrato.

REFERENCIA: Comunicación con radicado 20250100045111

Reciba un cordial saludo.

En atención a su comunicación referente a la " Entrega 005 Informe de Administración de Proyectos CODALTEC CD- 2374-2024", en cumplimiento a las obligaciones contractuales "*I. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE CODALTEC en el numeral 26) Presentar al MINISTERIO-FONSECON un (1) informe mensual respecto del avance en la fabricación de los bienes objeto del contrato que lo requieran, así como del estado de la ejecución del contrato.*", con el fin de poder conocer el estado real del proyecto, adicional al informe financiero, nos permitimos solicitar que en los informes se pueda evidenciar como mínimo la siguiente información:

1. Avance General del Proyecto
   - Porcentaje de ejecución programado: XXX%
   - Porcentaje de ejecución real: XXX%

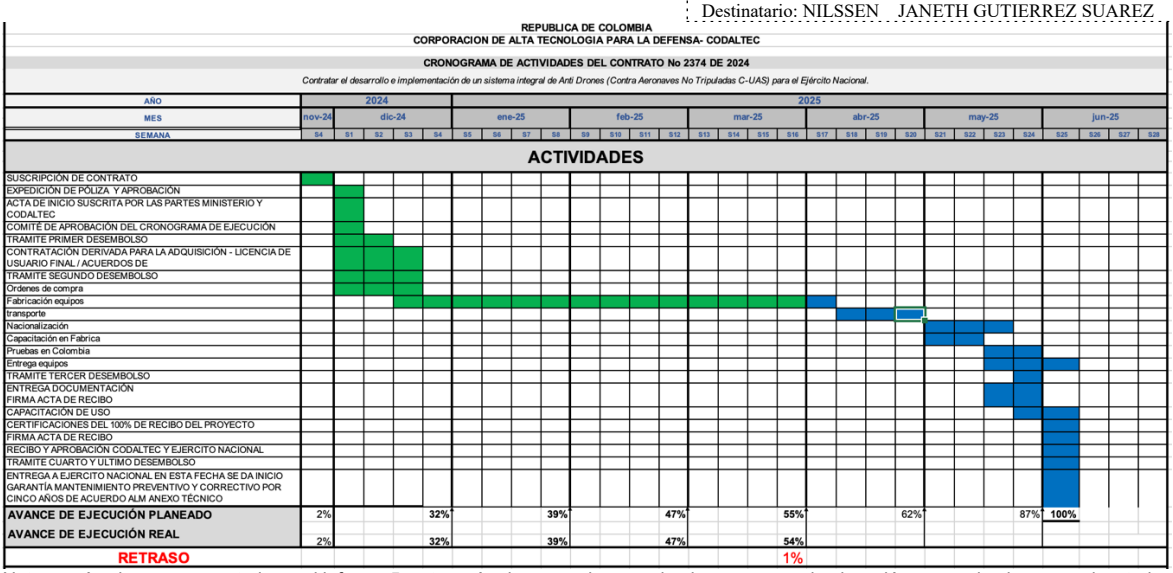

REPUBLICA DE COLOMBIA
CORPORACION DE ALTA TECNOLOGIA PARA LA DEFENSA- CODALTEC
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO No 2374 DE 2024
Contratar el desarrollo e implementación de un sistema integral de Anti Drones (Contra Aeronaves No Tripuladas C-UAS) para el Ejército Nacional.

AÑO	2024					2025																				
MES	nov-24	dic-24				ene-25				feb-25				mar-25				abr-25				may-25				jun-25			
SEMANA	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28
ACTIVIDADES																													
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO																													
EXPEDICIÓN DE PÓLIZA Y APROBACIÓN																													
ACTA DE INICIO SUSCRITA POR LAS PARTES MINISTERIO Y CODALTEC																													
COMITÉ DE APROBACIÓN DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN																													
TRAMITE PRIMER DESEMBOLSO																													
CONTRATACIÓN DERIVADA PARA LA ADQUISICIÓN - LICENCIA DE USUARIO FINAL / ACUERDOS DE																													
TRAMITE SEGUNDO DESEMBOLSO																													
Ordenes de compra																													
Fabricación equipos																													
transporte																													
Nacionalización																													
Capacitación en Fabrica																													
Pruebas en Colombia																													
Entrega equipos																													
TRAMITE TERCER DESEMBOLSO																													
ENTREGA DOCUMENTACIÓN FIRMA ACTA DE RECIBO																													
CAPACITACIÓN DE USO																													
CERTIFICACIONES DEL 100% DE RECIBO DEL PROYECTO																													
FIRMA ACTA DE RECIBO																													
RECIBO Y APROBACIÓN CODALTEC Y EJERCITO NACIONAL																													
TRAMITE CUARTO Y ULTIMO DESEMBOLSO																													
ENTREGA A EJERCITO NACIONAL EN ESTA FECHA SE DA INICIO GARANTÍA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR CINCO AÑOS DE ACUERDO ALM ANEXO TÉCNICO																													
AVANCE DE EJECUCIÓN PLANEADO	2%			32%				39%				47%				55%			62%			87%	100%					
AVANCE DE EJECUCIÓN REAL	2%			32%				39%				47%				54%													
RETRASO																1%													

Nota: según el avance reportado en el informe 5, este sería el avance de acuerdo al cronograma de ejecución, en verde el avance ejecutado y en azul, lo pendiente por ejecutar.

- Estado general; en el caso de haber un retraso, describir el plan de choque indicando fecha en la que se pondrían al día.

2. Hitos y/o tareas alcanzadas durante el periodo, con evidencias

3. Actividades en ejecución indicando su porcentaje de avance, con evidencias

4. Riesgos Identificados y Medidas Mitigadoras

No.	Riesgo	Mitigación

5. Próximas Etapas de acuerdo al cronograma

6. Actuaciones realizadas durante el periodo, con evidencias, en las cuales se evidencie también las actuaciones realizadas con respecto a la contratación derivada (reuniones, oficios, comunicaciones… de la contratación derivada)
7. Recomendaciones

Por lo anterior, solicito se actualice el informe No. 5, y esta misma información sea suministrada en todos los informes de aquí en adelante.

Interior

Al contestar cite Radicado 2025-2-003123-011692 Id: 520566
Folios: 3 Fecha: 08-04-2025 15:22:40
Anexos: 0
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario: NILSSEN JANETH GUTIERREZ SUAREZ

Atentamente,

MARLENY RIVERA GALEANO
Profesional Especializado
Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
Supervisor Contrato Interadministrativo 2374 de 2024.

Proyectó: Ing. Sergio Bernal– Contratista / Profesional de apoyo a la supervisión SPS

Outlook

Informe 006 Administración de Proyectos CODALTEC CD-2374-2024

Desde MY. Cristian Alexander Beltran Morales <Proyectos@codaltec.com>

Fecha Vie 11/04/2025 7:46

Para Marleny Rivera Galeano <marleny.rivera@mininterior.gov.co>; Sergio Oswaldo Bernal Jiménez <sergio.bernal@mininterior.gov.co>; Luis Mateo Ochoa Cañon <lochoa@codaltec.com>; MY. Cristian Alexander Beltran Morales <Proyectos@codaltec.com>

4 archivos adjuntos (3 MB)

20250100045251 OFICIO Informe Marzo - CD-2374-2024 v2.pdf; Informe de avance de ejecución 006 mes de Marzo contrato 2374 v2.pdf; 3_Informe avance proyecto CADALTEC-02-ABRIL-25.pdf; 2_Informe de avance financiero mes de Marzo contrato 2374-1.pdf;

No suele recibir correo electrónico de proyectos@codaltec.com. Por qué es esto importante

Doctora Marleny, buen día.

Espero que se encuentre muy bien. De manera atenta y de acuerdo a lo solicitado me permito enviar informe correspondiente al mes de marzo de 2025 v2 referente a la administración del proyecto CD-2374-2024. En el documento se detallan los avances, actividades realizadas, así como los aspectos más relevantes de la gestión en dicho periodo.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de CODALTEC, son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.
Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El ***Medio Ambiente*** *es responsabilidad de todos.*

Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. ***Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente.***
