
| Id | Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea | Costo | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Sucesores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **CONTRATO DE OBRA GGC-070-2024** | **$ 311.753.900,05** | **106 días** | **lun 21/10/24** | **mié 5/02/25** | | |
| 2 | | | INICIO | $ 0,00 | 0 días | lun 21/10/24 | lun 21/10/24 | | 33 |
| 3 | | | SUSPENSION 1 | $ 0,00 | 11 días | lun 20/01/25 | jue 30/01/25 | 21 | 4 |
| 4 | | | REINICIO 1 | $ 0,00 | 1 día | jue 30/01/25 | vie 31/01/25 | 3 | 45;46;47;48;49;50;51; |
| 5 | | **1.0** | **COMPONENTE 1: BLOQUE ADMINISTRATIVO GENERAL** | **$ 0,00** | **0 días** | **lun 21/10/24** | **lun 21/10/24** | | |
| 6 | | 1.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PLEGABLE MILANO - 200 X 120 EN PVC DE CANALES, PARA POR SEPERADOR DE AMBIENTES O, PARA DIVIDIR AREA INTERNA Y AREA DE ATENCION AL USUARIO | $ 0,00 | 0 días | lun 21/10/24 | lun 21/10/24 | | |
| 7 | | **2.0** | **AREA ADMINISTRATIVA** | **$ 92.659.699,16** | **103 días** | lun 21/10/24 | lun 3/02/25 | | |
| 8 | | 2.01 | APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL PARA INTERIOR EN VINILO TIPO 1 EN MUROS, INCLUYE LIMPIEZA, RASPADO, RESANES, LIJADO FILOS EN ESCUADRAS DE MUROS DE VENTANA Y PUERTAS | $ 23.580.898,00 | 29 días | vie 6/12/24 | vie 3/01/25 | 33 | 12 |
| 9 | | 2.02 | APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL PARA INTERIORES EN VINILO TIPO 1 PARA CIELORASOS, INCLUYE LIMPIEZA, RASPADO, RESANES, LIJADO FILOS EN ESCUADRAS DE MUROS DE VENTANA Y PUERTAS | $ 7.580.381,44 | 29 días | vie 6/12/24 | vie 3/01/25 | 33 | 12 |
| 10 | | 2.03 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA ESTRUCTURA METALICA, INCLUYE LIMPIEZA, RASPADO, RESANES, LIJADO FILOS EN ESCUADRAS DE MUROS DE VENTANA Y PUERTAS | $ 44.527.210,56 | 29 días | vie 6/12/24 | vie 3/01/25 | 33 | 12 |
| 11 | | 2.04 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS METALICAS INCLUYE LIMPIEZA, LIJADO RASPADO, RESANES | $ 0,00 | 0 días | lun 21/10/24 | lun 21/10/24 | | |
| 12 | | 2.05 | DEMOLICION DE ENCHAPE EN BAÑOS DE MUJERES Y HOMBRES INCLUYE RECOGIDA Y RETIRADA DE ESCOMBROS A SITIO ESCOMBRERA CERTIFICADO | $ 895.849,42 | 8 días | vie 3/01/25 | sáb 11/01/25 | 10;9;8 | 13;19;14 |
| 13 | | 2.06 | INSTALACION DE ENCHAPE EN BAÑOS TIPO REFERENCIA PARED CERAMICA VERSILIA GRIS CARA DIFERENCIADA 23X35 CM A UNA ALTURA DE 2.12 METROS | $ 0,00 | 0 días | sáb 11/01/25 | sáb 11/01/25 | 12 | 69 |
| 14 | | 2.07 | DESBASTADA, RETAPADO,PULIDA, DESENMACHADA, , DESENGRASADA Y BRILLADA DE PISO DE PISO EN GRANITO INVLUYE, GUARDASESCOBAS | $ 13.873.356,90 | 7 días | sáb 11/01/25 | lun 20/01/25 | 12 | 69 |
| 15 | | 2.08 | INSTALACION DE PUERTA EN VIDRIO DE SEGURIDAD DE 2.05 DE ALTO X 1.20 DE ANCHO X 10mm DE LAS MISMAS ESPECIFICACIONES DE LA PUERTA EN ACCESO PRINCIPAL, CONSISTEMA DE SEGURIDAD Y MANIJA DE AGARRE EN ACERO INOXIDABLE | $ 1.392.492,84 | 2 días | vie 31/01/25 | lun 3/02/25 | 4 | 69 |
| 16 | | 2.09 | MANTENIMIENTO DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE, DESCAPADO MECANICO, REPULIDO CON PULIDORA CU LIJA MANUAL Y POSTERIOR APLICACIÓN DE PASIVADO POR FROTE INMERSION O ASPERSION | $ 809.510,00 | 2 días | vie 31/01/25 | lun 3/02/25 | 4 | 69 |
| 17 | | **3.0** | **PSG** | **$ 922.438,00** | **7 días** | **sáb 11/01/25** | **lun 20/01/25** | | |
| 18 | | 3.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE Y PUESTA EN MARCHA DE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU | $ 0,00 | 0 días | lun 20/01/25 | lun 20/01/25 | 21 | 69 |
| 19 | | 3.03 | ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE SALIDA DE AGUAS NEGRAS Y SUMINISTRO DE AGUA PARA BAÑOS DE MUJER Y DE HOMBRE EN PSG, PARA LAVAMANOS Y SANITARIOS | $ 513.240,00 | 4 días | sáb 11/01/25 | jue 16/01/25 | 12 | 20 |
| 20 | | 3.04 | CAMBIO DE KIT DE GRIFERIA DE DUCHA INCLUYE SUMINISTRO DE MANGUERA ACOPLE DE AGUA PARA SANITARIO DOBLE DESCARGA CON ACOPLES Y VALVULA REGULADORA Y MANGUERAS PARA LAVAMANOS. | $ 356.928,00 | 2 días | jue 16/01/25 | sáb 18/01/25 | 19 | 21 |
| 21 | | 3.05 | AJUSTE DE APERTURA Y CIERRE DE PUERTAS Y CAMBIO DE CHAPAS EN PUERTAS PARA BAÑO EN PSG | $ 52.270,00 | 1 día | sáb 18/01/25 | lun 20/01/25 | 20 | 18,3 |
| 22 | | **4.0** | **NUEVO BAÑO DE GERENCIA SECCIONAL** | **$ 2.368.248,00** | **106 días** | **lun 21/10/24** | **mié 5/02/25** | | |
| 23 | | 4.30 | DEMOLICIONES Y CORTES DE ELEMENTOS SANITARIOS E HIDRAULICAS INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS A SITIO CERTIFICADO. | $ 179.504,00 | 4 días | vie 31/01/25 | mié 5/02/25 | 4 | 69 |
| 24 | | 4.40 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES SANITARIA EN TUBERIA DE 4" INCLUYE PUNTO DE SALIDA DE 3" Y CONEXION A CAJA EXISTENTE | $ 1.328.112,00 | 4 días | vie 31/01/25 | mié 5/02/25 | 4 | 69 |
| 25 | | 4.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES SANITARIA EN TUBERÍA DE 2" INCLUYE PUNTO DE SALIDA DE 2" Y CONEXIÓN A CAJA EXISTENTE | $ 670.726,00 | 4 días | vie 31/01/25 | mié 5/02/25 | 4 | 69 |
| 26 | | 4.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES HIDRAULICA EN TUBERÍA DE1 / 2" INCLUYE PUNTO DE SALIDA DE 1/2" | $ 0,00 | 0 días | lun 21/10/24 | lun 21/10/24 | | |
| 27 | | 4.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PARED CERÁMICO AVELLANO TABACO 30X60CM CAJA 1.62 M2 | $ 0,00 | 0 días | lun 21/10/24 | lun 21/10/24 | | |
| 28 | | 4.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE 60X60 CM, 4 X 32 W, 120 V, 4000 K 120 V, INCLUYE ELEMENTOS DE SUJECIÓN, CAJA RAWELL 5800 Y DEMÁS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, INCLUYE CERTIFICADO DE PRODUCTO. | $ 0,00 | 0 días | lun 21/10/24 | lun 21/10/24 | | |
| 29 | | 4.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3/4"", INCLUYE CIRCUITO ELECTRICO F1X12+N.1X12+T.1X12 AWG THHN-THWN, EMPOTRADA EN MURO. INCLUYE UNIONES, TERMINALES, CODOS, CURVAS, CAJAS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | $ 0,00 | 0 días | lun 21/10/24 | lun 21/10/24 | | |
| 30 | | 4.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR PARA ILUMINACIÓN SENCILLO, INCLUYE CAJA, TAPA, TUBERÍA, ILUMINACIÓN, SOLUCIÓN Y DEMÁS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, INCLUYE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD | $ 189.906,00 | 4 días | vie 31/01/25 | mié 5/02/25 | 4 | 69 |

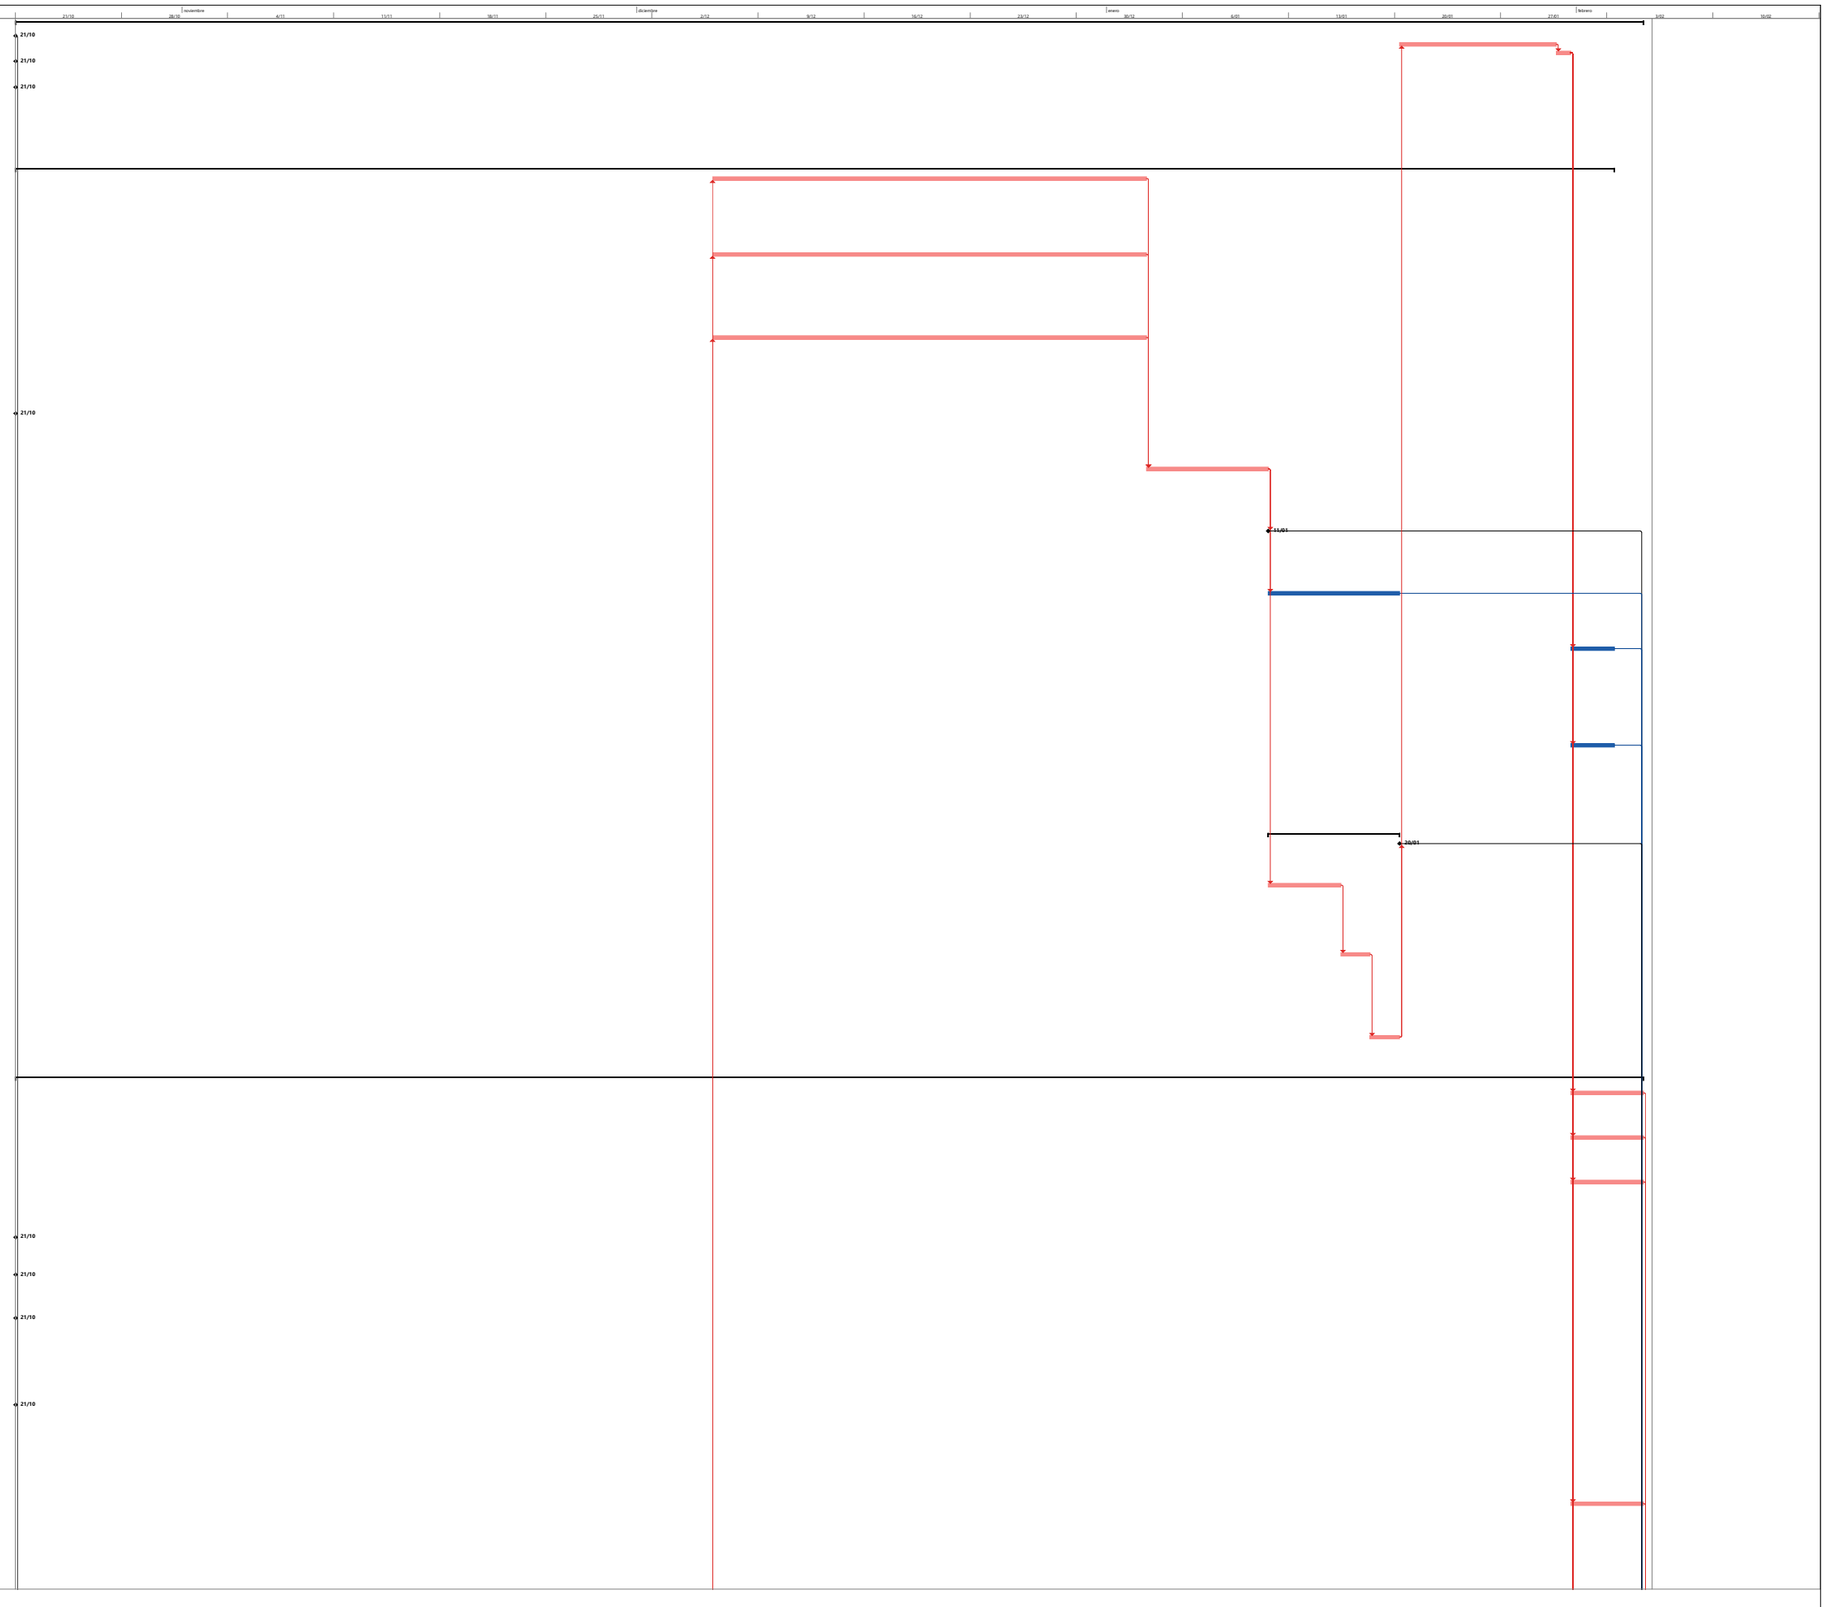


Proyecto: PROGRAMACION_IC
Fecha: jue 20/03/25

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual

| ID | Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea | Costo | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Sucesoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | | 4.11 | SALIDA PARA TOMA SENCILLA CON 1 PUNTO SENCILLA CON 2 PUNTOS TOMACORRIENTE, INCLUYE CAJA, TIPO LIGERO O PESADO, CABLE #12 AWG, TUBERIA PVC HASTA 1/2" DIAMETRO, TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO, INCLUYE CONDULETE, CONECTORES Y ACCESORIOS | $ 639 | 1 días | lun 21/10/24 | lun 21/10/24 | | |
| 32 | | 5 | **INSTALACIONES HIDRAULICAS** | **$ 144.986.886,00** | **105 días** | **lun 21/10/24** | **mié 5/02/25** | | |
| 33 | | 5.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DESVIO TEJITOCA CON TUBERIA PVC, ACCESORIOS, TRANSFERENCIA DE CAUDALES, DESCARGUES ANTI-RETORNO, SOPORTES CONEXIONES, LLAVES DE PASO Y CABLEADO PARA LA PUESTA EN MARCHA | $ 141.582.737,50 | 45 días | lun 21/10/24 | jue 9/12/24 | 2 | 69;69;6;10 |
| 34 | | 5.02 | EXCAVACION E ILUMINACION SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMBIO CLORIMAS 1/2" PVC, 2 UD JETAZOR, 1 UD MANOMETRO, 45 GOTEROS | $ 3.426.144,00 | 4 días | vie 31/01/25 | mié 5/02/25 | 4 | 69 |
| 35 | | | **ITEM NO PRESENTES** | **$ 79.944.629,9** | **4 días** | **vie 31/01/25** | **mié 5/02/25** | | |
| 36 | | NP-01 | DEMOLICION DE PISO | $ 237.884,80 | 4 días | vie 31/01/25 | mié 5/02/25 | 4 | |
| 37 | | NP-02 | MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE ARCILLA 6 HOM. INCLUYE PISO DE ESCOMBRO | $ 966.533,66 | 4 días | vie 31/01/25 | mié 5/02/25 | 4 | 69 |
| 38 | | NP-03 | DEBOCION PISO INCLUYE ALISTADO DE PISO | $ 141.630,32 | 4 días | vie 31/01/25 | mié 5/02/25 | 4 | 69 |
| 39 | | NP-04 | TUBERIA PVC SDR 41 RDE 35 | $ 142.818,00 | 4 días | vie 31/01/25 | mié 5/02/25 | 4 | 69 |
| 40 | | NP-05 | MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE ARCILLA 6 HOM. | $ 3.098.283,30 | 4 días | vie 31/01/25 | mié 5/02/25 | 4 | 69 |
| 41 | | NP-06 | PAÑETE LISO MORTERO 1:3 | $ 955.594,00 | 4 días | vie 31/01/25 | mié 5/02/25 | 4 | 69 |
| 42 | | NP-07 | ESTUCO Y PINTURA | $ 76.784,00 | 4 días | vie 31/01/25 | mié 5/02/25 | 4 | 69 |
| 43 | | NP-08 | BASE EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI | $ 765.052,58 | 4 días | vie 31/01/25 | mié 5/02/25 | 4 | 69 |
| 44 | | NP-09 | PUERTA EN MALLA ESLABONADA GALVANIZADA CAL 12 | $ 5.609.488,00 | 4 días | vie 31/01/25 | mié 5/02/25 | 4 | 69 |
| 45 | | NP-10 | GRANIPLAST EXTERIORES | $ 15.403.603,28 | 4 días | vie 31/01/25 | mié 5/02/25 | 4 | 69 |
| 46 | | NP-11 | INSTALACION DE TUBERIA EN PERFIL C | $ 965.895,00 | 4 días | vie 31/01/25 | mié 5/02/25 | 4 | 69 |
| 47 | | NP-12 | TUBERIA HIERRO 4 GALVANIZADA INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION Y CURVA DE 45° | $ 5.651.260,00 | 4 días | vie 31/01/25 | mié 5/02/25 | 4 | 69 |
| 48 | | NP-13 | CIELO RASO EN YESO CARTON, no incluye | $ 971.116,94 | 4 días | vie 31/01/25 | mié 5/02/25 | 4 | 69 |
| 49 | | NP-14 | DESMONTE DE ACERO BARGS | $ 318.994,00 | 4 días | vie 31/01/25 | mié 5/02/25 | 4 | 69 |
| 50 | | NP-15 | DESMONTE ANDENES | $ 1.783.874,00 | 4 días | vie 31/01/25 | mié 5/02/25 | 4 | 69 |
| 51 | | NP-16 | DESMONTE SANITARIOS Y LAVAMANOS ORINALES | $ 660.000,00 | 4 días | vie 31/01/25 | mié 5/02/25 | 4 | 69 |
| 52 | | NP-17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL, incluye todo lo necesario para su correcto | $ 1.327.288,00 | 4 días | vie 31/01/25 | mié 5/02/25 | 4 | 69 |
| 53 | | NP-18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE Grifería Oriwal Push Temporizada incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento | $ 1.079.098,00 | 4 días | vie 31/01/25 | mié 5/02/25 | 4 | 69 |
| 54 | | NP-19 | ALISTADO DE PISO | $ 1.316.916,96 | 4 días | vie 31/01/25 | mié 5/02/25 | 4 | 69 |
| 55 | | NP-20 | DESMONTE MESON CONCRETO | $ 95.946,40 | 4 días | vie 31/01/25 | mié 5/02/25 | 4 | 69 |
| 56 | | NP-21 | DESMONTE DE ESPEJOS | $ 76.420,00 | 4 días | vie 31/01/25 | mié 5/02/25 | 4 | 69 |
| 57 | | NP-22 | DESMONTE LAVAMANOS | $ 43.748,00 | 4 días | vie 31/01/25 | mié 5/02/25 | 4 | 69 |
| 58 | | NP-23 | INSTALACION DE SECADOR MANOS | $ 65.346,00 | 4 días | vie 31/01/25 | mié 5/02/25 | 4 | 69 |
| 59 | | NP-24 | INSTALACION DE PORCELANA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | $ 3.641.468,00 | 4 días | vie 31/01/25 | mié 5/02/25 | 4 | 69 |
| 60 | | NP-25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS BLANCO CON SOPORTE DE ACERO INOXIDABLE INCLUYE CRUZ, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO | $ 1.279.338,00 | 4 días | vie 31/01/25 | mié 5/02/25 | 4 | 69 |
| 61 | | NP-26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO BLANCO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | $ 3.862.696,00 | 4 días | vie 31/01/25 | mié 5/02/25 | 4 | 69 |
| 62 | | NP-27 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANITO NATURAL INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | $ 4.180.000,00 | 4 días | vie 31/01/25 | mié 5/02/25 | 4 | 69 |
| 63 | | NP-28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARGS, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento | $ 8.688.701,66 | 4 días | vie 31/01/25 | mié 5/02/25 | 4 | 69 |
| 64 | | NP-29 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTACEPILLOS PARA BARGS, incluye todo lo necesario para su correcto | $ 2.888.485,54 | 4 días | vie 31/01/25 | mié 5/02/25 | 4 | 69 |
| 65 | | NP-30 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA PUERTAS PINTURA ESPECIAL PISOS POR UNA MANO INCLUYE TODO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN | $ 4.021.947,83 | 4 días | vie 31/01/25 | mié 5/02/25 | 4 | 69 |
| 66 | | NP-31 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO PARA AEROPUERTO INCLUYE TODO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | $ 900.000,00 | 4 días | vie 31/01/25 | mié 5/02/25 | 4 | 69 |
| 67 | | NP-32 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PESTAL INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | $ 932.256,00 | 4 días | vie 31/01/25 | mié 5/02/25 | 4 | 69 |
| 68 | | | | | | | | | |
| 69 | | | FIN DEL CONTRATO | $ 0,00 | 0 días | mié 5/02/25 | mié 5/02/25 | 54;61;64;66;67 | |
