DOCUMENTOS QUE ALLEGA EL INTERVENTOR O SUPERVISOR	SI	NO	N.A.
Informe del Interventor o Supervisor justificando la necesidad de modificar el contrato, relacionando avance financiero, físico del contrato y demás información relevante del contrato a la fecha de la solicitud.	X		
Informe del contratista justificando la necesidad de modificar el contrato.	X		
Acta de Modificación (1010-F-GCT-82-V2)	X		
Acta de Fijación de Precios de Ítems No Previstos (1010-F-GCT-106-V1)	X		
Análisis de Precios Unitarios (1010-F-GCT-105-V1)	X		
Memoria de Calculo (1010-F-GCT-70-V3)	X		
Reprogramación de obra ajustada firmada por las partes	X		
Localización general y específica en planimetría.	X		
Diseños arquitectónicos o civiles, firmados por el profesional responsable. (planimetría y medio magnético CD)	X		
Detalles constructivos, firmados por el profesional responsable. (medio magnético CD)			X
Numero de folios, foliado en lápiz en la esquina inferior derecha			

Observaciones: _____

Revisado Oficina de Contratación: _____

INFORME SUPERVISOR

CR 24 A 8 125 CONJ CERRADO LA CABAÑA CA 1 IN 9. VILLAVICECNIO-META
SHARKYING10@GMAIL.COM-3222169909

Villavicencio, 9 de abril de 2025.

Doctor(a):
ALBA AURORA COLINA
Jefe de Oficina de Contratación
Alcaldía Municipal de Villavicencio
Ciudad.

Ref.: CONTRATO N°.2928 DE 2024, DEL PROCESO EN SECOP SAMC-013-2024 EL CUAL TIENE COMO OBJETO "REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"

OBJETIVO DEL INFORME: Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al municipio de Villavicencio acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011 y demás normativa aplicable.

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No. Y FECHA DEL CONTRATO (incluir el número del proceso en Secop)	**CONTRATO N°.2928 DE 2024, N°. DEL PROCESO EN SECOP SAMC-013-2024**		
PUBLICADO EN (Marque con X)	SECOP I ____ Ó SECOP II ___X___		
CLASE DE CONTRATO:	OBRA		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CONSORCIO ALSIPA		
No. DE IDENTIFICACIÓN	901.892.095-4		
OBJETO:	REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
NOMBRE DEL SUPERVISOR CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: (De todos los que haya tenido, empezando por el vigente)	DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALGRE C.C 1.121.838.448		
CONDICIONES INICIALES			
VALOR DEL CONTRATO (letras y número):	NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TREINTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MTCE ($965.030.477,00)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecucion sera hasta el 30 DE DICIEMBRE DE 2024 contados a partir de la suscripcion del acta de inicio		
FECHA DE INICIO:	11/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/12/2024		
MODIFICACIONES:			
CESIÓN:	N.A.	FECHA:	N.A.
VALOR DE ADICIÓN:	N. A.	FECHA:	N.A.
NUEVO VALOR DEL CONTRATO: (INICIAL + ADICIÓN)	N.A N.A		

PRORROGAS	001	FECHA:	28/01/2025
TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN (INICIAL + PRÓRROGAS)	TRES (03) MESES Y CINCO (05) DIAS		
SUSPENSIONES	FECHA:24/12/2024		
REINICIOS:	1	FECHA:	24/01/2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	15/04/2025		

2. **DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** Teniendo en cuenta que mediante acto administrativo del 12/12/2024 y en plataforma SECOP II, se me designó como SUPERVISOR del contrato de la referencia, me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente al PERIODO **el 11/12/2024 al 18/02/2025** de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Interventoría y Supervisión adoptado mediante Decreto No. 1000-21/293, vigente desde el 19 de julio de 2016. .

3. **JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICATORIA**

En mi calidad de Supervisor del Contrato de Obra No. 2928 del 03 de diciembre de 2024, cuyo objeto es la "Rehabilitación de parques en diferentes barrios en el municipio de Villavicencio", presento la siguiente justificación técnica en relación con la modificación N°001 por mayores y menores cantidades de obra e inclusión de ítems nuevos no previstos, todo ello sin requerir recurso adicional al valor inicialmente contratado.
El día 1 de abril del 2025 se recibió la solicitud de modificatoria No. 01 del constrato con oficio No. OFI-020-2928-03/12/2024 con radicado No. 1196 en la cual expresa los siguiente:

> *"La revisión documental detallada de planos y estudios técnicos urbanos, paisajísticos y del espacio público evidenció la necesidad de validar y optimizar los diseños propuestos para cada parque, con base en la realidad topográfica actual. En coherencia con lo establecido por la Interventoría y la Secretaría de Infraestructura Municipal, se identificó la importancia de realizar levantamientos topográficos en campo, con el fin de obtener mediciones exactas y precisas del espacio público existente, incluyendo elementos tales como el mobiliario urbano y la vegetación.*
>
> *Con base en la topografía existente se procede a realizar el replanteo e implantación de los diseños arquitectónicos en los parques, y en vista de la necesidad de dejar funcional estos espacios se presenta una variación de mayores y menores en las cantidades iniciales así como la supresión de ítems, e inclusión de ítems nuevos no previstos, lo anterior por variaciones propias de topografía y demás observadas al momento de realizar la implantación arquitectónica.*
> *Estos ajustes realizados a las cantidades presentan su debido soporte, mediante la cuantificación de cantidades en memorias de cálculo con operaciones básicas y medidas arquitectónicas tomadas de los diseños ajustados a la topografía existente, sobre los cuales se toman las medidas finales sobre el terreno y las obras a realizar, por tal razón se presentan el siguiente cuadro en el cual se detallan los ítems y/o actividades a realizar."*

Durante el seguimiento a la ejecución del contrato, se identificaron diferencias sustanciales entre las condiciones proyectadas en los diseños iniciales y las condiciones reales observadas en el terreno. Ante esta situación, y en coherencia con lo establecido en la minuta del contrato:

COMPONENTE: URBANISMO

ESPACIO PÚBLICO Y ARQUITECTURA. Estudios y diseños urbanos, paisajísticos y del espacio público deberán ser revisados y aprobados por parte de la interventoría y de ser necesario, revisados y aceptados por la secretaría de infraestructura municipal, los cuales deben incluir los predios, espacio, inventario, evaluación y valoración del espacio público existente incluyendo los elementos de mobiliario y vegetación.

Se debe establecer la existencia de un proyecto urbano que tenga como finalidad satisfacer las necesidades de los ciudadanos en términos de movilidad y espacio público de acuerdo con las normas vigentes.

El proponente deberá ejecutar el diseño geométrico, de texturas, accesorios de la estructura y sus accesos, de acuerdo con las restricciones técnicas dadas por las empresas de servicios públicos domiciliarios en cuanto a las redes de servicios públicos encontradas y a los lineamientos técnicos

El CONSORCIO ALSIPA adelanto levantamientos topográficos y revisiones en campo que permitieron validar la necesidad de ajustar las cantidades de obra.

Estos ajustes han sido documentados y soportados técnicamente por el contratista a través de memorias de cálculo, registros fotográficos, análisis de campo y justificaciones específicas para cada modificación. Las principales causas que motivan esta modificación son:

- Replanteo de senderos y áreas funcionales debido a la presencia de árboles y vegetación que se debe conservar, modificando así las áreas a intervenir.
- Inclusión de actividades necesarias que no fueron previstas en el diseño original, como desmontes de mástiles y mobiliario existente deteriorado.
- Sustitución de elementos obsoletos por mobiliario urbano moderno y funcional, garantizando durabilidad, seguridad y coherencia estética con los diseños ajustados.
- Ajustes en el sistema de iluminación interna de los parques, contemplando alturas de postes y tipo de luminarias más acordes con la arborización existente y los requerimientos funcionales de cada espacio.
- Implementación de sistemas de drenaje superficial adecuados, mediante instalación de cajas recolectoras, tuberías y rellenos en grava, con el fin de mejorar la evacuación de aguas lluvias y preservar las obras ejecutadas.
- Aplicación de concreto estampado con colores institucionales del municipio, con especificaciones técnicas completas que permiten una correcta ejecución y acabado del mismo.

Cabe resaltar que las modificaciones propuestas no generan un incremento en el valor total del contrato, ya que se presentan como una redistribución de recursos entre ítems que disminuyen y otros que se incorporan o aumentan, sin afectar la integridad presupuestal del contrato vigente.

Desde la supervisión técnica, se considera que las modificaciones propuestas son necesarias, viables y oportunas para el correcto cumplimiento del objeto contractual, asegurando que las intervenciones proyectadas se ajusten a las condiciones reales del entorno, cumplan con los criterios de calidad y funcionalidad requeridos, y respondan a las necesidades actuales de la comunidad usuaria de los parques.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.
1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2	4653.53
Actividad que aumenta considerablemente ya que surge la necesidad de realizar la localización y replanteo en los 4 parques, cantidad que haciendo la sumatoria de las áreas a intervenir aumenta la respecto a la cantidad contractual.			
1.2	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	218.62
Actividad que aumenta luego de la respectiva validación y cuantificación mediante memorias de cálculo, de los espacios que serán demolidos para llevar a cabo su rehabilitación.			
1.3	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS,SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0.00
Actividad que se suprime toda vez que las demoliciones no serán realizadas mecánicamente sino de manera manual			
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	294.23
Actividad que disminuye toda vez que al realizar la respectiva verificación con planos topográficos de levantamiento existente, se valida las cantidades reales para excavación.			
3.1	RELLENO CON MATERIAL MIXTODERIO SINPROCESAR TAMAÑO MAX.3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	279.07
Actividad que aumenta debido a la topografía propia de cada parque, toda vez que este material es usado para nivelación y replanteo base de las superficies en donde serán adecuados los corredores o andenes.			
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA NEGRA	M3	90.38
Actividad que aumenta en su cantidad toda vez que se proponen en los diseños arquitectónicos la rehabilitación de zonas verdes con carencia de material orgánico para siembra de prado o grama, y ampliaciones de zonas verdes para la unificación y mejoramiento de estas zonas blandas en cada uno de los parques.			
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA TRENZA	M2	1221.16
Actividad que al igual que el suministro e instalación de tierra negra, es aliada y actividad de complemento de esta, para el mejoramiento de las zonas blandas o verdes, aumenta debido a la unificación y ampliación de las zonas existentes en los parques objeto del contrato.			
4.1	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-8080X35X20CM. NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	366.37
Actividad que disminuye considerablemente, debido a que se cuantifica las cantidades de bordillo en piezas prefabricadas únicamente para la zona del perimetro de parque azotea, virrey y retiro en la calle 24 y carrera 24a, para parque macarena por las cotas en las que se encuentran sus andenes perimetrales se propone un muro de confinamiento ya que excede la altura de los bordillos prefabricados.			
4.2	MALLA ELECTROSOLDADA fy= 5000 kg/cm2,500 Mpa	KG	3012.79
Actividad que disminuye toda vez que las áreas de placa de concreto estampado se reducen, y esta actividad es el acero de refuerzo la anteriormente mencionada, por ello se reducen los kg inicialmente cuantificados			
4.3	PLACA CONTRAPISO e=10 cm (20.7 Mpa, 3000 psi) concreto estampado - color	M2	0.00

Actividad que es suprimida toda vez que no se especifica el tono colorante, y este dependiendo de su tono varía el rendimiento de la mano de obra de acuerdo al método de aplicación.			
5.1	LUMINARIA: MECANO V TEMPERTATURA DE COLOR: 4000 K POTENCIA: 33W CON BASE PARA FOTOCELDA IRC 70 ÓPTICA: R07	UN D	0.00
Actividad suprimida luego del respectivo análisis de mercado en el que se ve necesario reemplazarlo por uno similar, toda vez que esta referencia indicada no es comercial.			
5.2	MÁSTIL METÁLICO GALVANIZADO DE 6M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN D	0.00
Actividad que en conjunto con luminaria se suprime y se cambia por una referencia de menor altura permitiendo así instalar este elemento en espacios con altura reducida, además que se tiene en cuenta que la iluminación es para los parques Azotea y Virrey, parques en los cuales perimetralmente en las vías colindantes cuentan con iluminación de alumbrado público, e internamente por las condiciones de los parques con árboles grandes y frondosos no es posible instalar mástiles de 6 metros de altura.			
5.3	ESTRUCTURA LA321	UN D	2.00
Actividad que disminuye toda vez que se realizarán en los dos parques que tendrán intervención de iluminación como lo son el parque del barrio Azotea y Virrey.			
5.4	ESTRUCTURA CS400	UN D	2.00
Actividad que disminuye toda vez que esta hace referencia a la estructura de derivación de aire a tierra, las cuales se realizarán en los dos parques que tendrán intervención de iluminación como lo son el parque del barrio Azotea y Virrey.			
5.5	ACOMETIDA PARCIAL 2 No6+1No.6 AL	ML	139.11
Actividad que disminuye debido a que se toma en cuenta las cantidades lineales del circuito para los parques Azotea y Virrey			
5.6	ACOMETIDA PARCIAL 2 No8+1No.8 CU THHN	ML	139.11
Actividad que disminuye debido a que se toma en cuenta las cantidades lineales del circuito para los parques Azotea y Virrey			
5.7	CANALIZACION PVC 2X1" PARA AP	ML	0.00
Actividad que se suprime toda vez que el CONSORSIO ALSIPA realizara la instalación de esta sin costo alguno para no superar el valor inicial contratado, aprovechando el valor de este ítem en los demás del capítulo instalaciones eléctricas.			
5.8	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	0.00
Actividad que se suprime debido a que presentaba un error de digitación en su unidad de medida la cual realmente es en unidad, por ende se suprime este ítem con error de unidad de medida y se incluye el NP 18			
5.9	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UN D	14.00
Actividad que disminuye toda vez que esta comprende las cajas de control o inspección base de cada luminaria, se toman en cuenta las unidades necesarias para parque Azotea y Virrey los cuales se intervienen en su iluminación.			
6.1	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO ELIPTICA (ESQUÍ DE FONDO). SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00
Actividad que se mantienen sin cambios en la presente modificación			
6.2	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO SURF. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00
Actividad que se mantienen sin cambios en la presente modificación			
6.3	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO BARRAS PARALELAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00
Actividad que se mantienen sin cambios en la presente modificación			

6.4	MANTE Y REPA JUEGO BIOSALUDABLES EXIST	UN	13.00
Actividad que aumenta debido a que se realizó el respectivo conteo y validación de unidades de juegos bio saludables existentes arrojando una cantidad total de 13 para 6 unidades en el Retiro y 7 unidades en Macarena			
6.5	CANECA EN MALLA METÁLICA TIPO M120 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	UN	0.00
Actividad que se suprime toda vez que este mismo mobiliario es el mismo existente y se ha logrado evidenciar que su durabilidad o vida útil es muy corta por el material en el que está compuesto, deteriorándose su base y desprendiéndose, dejándolas inservibles.			
6.6	SUM E INST. COLUM SW. THREE, INCL. LOCALIZ Y EXC.	UN	0.00
Actividad que se suprime dado que la comunidad anuo esfuerzos para el suministro de juego con columpio incluido en parque azotea, de esta manera se suprime este ítem y se optimizan los recursos en otras actividades no previstas.			
6.7	PISO DUROPISO BLANCO 33,8X33,8 T. COMERCIAL	M2	0.00
Actividad que se suprime toda vez no es necesario la instalación de este elemento en ninguno de los parques.			
NP 1	DESMONTE DE MASTILES EXISTENTES (INC. DEMOLICION BASE Y CARGUE DE MATERIALES, Y SUSP RED CABLEADO EXIS)	UN	30.00
Actividad que se incluye en la presente modificación, debido a que no se tenía previsto en las actividades contractuales el desmonte de los mástiles de iluminación actual o anterior inhabilitada aun presente.			
NP 2	BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR TIPO M31. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	50.00
Actividad que se incluye debido a que en las visitas realizadas a campo en cada uno de los parques se apreció el deterioro de estas unidades, por lo anterior se optó por una silla económica y de aspecto más moderno, el cual con los mejoramientos propios del parque contribuye a la modernización de espacios.			
NP 3	DESMONTE DE BANCA incl retiro	UN	41.00
Actividad que se incluye toda vez que las bancas que son suministradas nuevas se debe hacer también el respectivo desmonte de las unidades existentes en los parques			
NP 4	DESMONTE DE CANECAS EXISTENTES (INC. DEMOLICION DE BASE EXISTENTE Y CARGUE DE MATERIALES)	UN	2.00
Actividad que se incluye debido a que no estaba previsto el desmonte del mobiliario existente, para ello se cuantifican 2 desmontes siendo ellos propios del parque AZOTEA			
NP 5	LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	M2	287.36
Esta actividad se incluye debido a que se evidencio pisos de senderos en estado aceptable, con presencia de suciedad y moho, el cual deteriora aún más el concreto, por esta razón y en vista de seguir conservando estos elementos, se incluye el lavado de estas áreas para hacer una entrega formal y adecuada de los espacios.			
NP 6	MURO CONFINAMIENTO ACABADO LISO 0.60>H>0.45 A=0.20 EN CONCRETO REF 3000 PSI	ML	73.00
Actividad incluida para realizar el confinamiento de áreas o terrazas de zonas verdes o andenes los cuales superan alturas de bordillos prefabricados o sardineles, en vista de la necesidad de confinar estos espacios se incluye este muro el cual incluye acero de refuerzo para brindar mayor durabilidad a la estructura de confinamiento.			
NP 7	CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR OCRE	M2	1445.87

	ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)		
Actividad que se incluye en reemplazo del ítem 4.3 el cual se suprime, esta actividad hace referencia al concreto color ocre estampado para las distintas áreas para placa de senderos de andenes externos como internos, teniendo en cuenta los rendimientos de la mano obra por las actividades propias del estampado.			
NP 8	CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR AZUL ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)	UN	156.49
Actividad que al igual que el ítem NP7 se incluye en reemplazo del ítem 4.3, haciendo referencia a las áreas de detalles en color azul según los diseños arquitectónicos de las zonas duras correspondientes a andenes, en este varia su precio tomando en cuenta en que el insumo del color azul es mucho más costoso que cualquier otro tono colorante endurecedor.			
NP 9	CAJA EN CONCRETO REF CON REJILLA .60*.30 P=.30 (MARCO < 11/2" 3/16")	UN	3.00
Actividad la cual se incluye para recolectar las aguas y drenarlas de espacios como área de juegos bio saludables y glorieta central.			
NP 10	BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4" PVC	ML	15.47
Suministro necesario para la conexión del punto recolector de aguas (caja rejilla) a punto de entrega final por escorrentía.			
NP 11	RELLENO EN GRAVA 1 1/2"<D<2" EP 15 CM (INC ALISTAMIENTO DE TERRENO HACIA DRENAJE)	M2	354.14
Esta actividad se incluye toda vez que el diseño propuesto de los juegos bio saludables como de los juegos parques infantiles, llevan en su plataforma base gravilla la cual le da un buen aspecto arquitectónico y evita corrosión por acumulación de humedad en material vegetal como se encuentran las unidades existentes.			
NP 12	LUMINARIA PARA PARQUE ENTRE 33-40 (W) 100000 H (SUMINISTRO E INSTALACION INC FOTOCELDA Y BRAZO)	UN	12.00
Actividad que comprende luminaria que cumple con las características de la contractual pero a un menor costo que se incluye en reemplazo del ítem 5.1, debido a que el costo de este nuevo ítem es más económico se optimizan los recursos para invertirlos en otras actividades no previstas.			
NP 13	POSTE 4 M METALCIO DIAM 3" CON CANSITILLAS Y ACABADO EN PINURA	UN	12.00
Actividad que en conjunto con el NP 12 se incluye para el capítulo de instalaciones eléctricas, en reemplazo del ítem 5.2, debido a que en campo se evidencia que se presentan obstrucciones para los mástiles en su parte superior, para ello se propone la inclusión de poste de la referencia mencionada el cual al ser 2 metros mas corto, es apto para la correcta instalación de luminarias.			
NP 14	BASECIRCULAR PARA JUEGOS D:2.00 INC REFUERZO DOS DIRECIONES	UN	16.00
Actividad que se incluye toda vez que no se tenía contemplada base circular o superficie de apoyo para los juegos tanto nuevos como de mantenimiento y reparación, comprende placa circular de 2 m de diámetro con acero de refuerzo.			
NP 15	SARDINEL 3000PSI B=0.2,b=0.15,H=0.40INC. EXC/RET	ML	1128.52
Actividad que se incluye toda vez que es necesario realizar el respectivo confinamiento de las placas correspondientes a senderos o andenes circulares, toda vez que en las actividades contractuales no se tomaba en cuenta, solo hacia referencia a bordillo prefabricado el cual por sus dimensiones se utiliza en las zonas delimitantes perimetrales de los parques.			

NP 16	PLACA CONTRAPISO e = 12 cm (24.13Mpa, 3500psi)	M2	7.45
Actividad que se incluye para dar continuidad de senderos, en placa de contrapiso normal sin estampado, dando continuidad a obra existente.			
NP 17	SUMINISTRO E INSTALACION CANECA M-121	UN	3.00
Actividad que se incluye toda vez que se evidencia que las presentes del contrato son las mismas canecas existentes en los sitios donde se van a cambiar, pero resulta que la vida útil de las misma es muy baja debido a la base en acero pintado y la maya en acero pintado igual a las existentes que al cabo de tres años ya pierden un 40% de su calidad a intemperie según se pudo notar desde su instalación; por tanto se optó por las canecas en acero inoxidable que presenta mayor vida útil a intemperie			
NP 18	PUESTA A TIERRA MASTIL LUMINARIA	UN	6.00
Actividad que se incluye en reemplazo del ítem 5.8 el cual presenta error en el contrato en cuanto a su unidad de medida establecida en metro lineal (ml) y no en unidad (un) como realmente es.			
NP 19	DESMONTE Y MONTAJE DE JUEGO DE NIÑOS EXISTENTE (INC. ADECUACION TUB MET, DADOS EN COCNRETO PARA CINENTACION, SOLDADURAS, ANTICORROSIVO Y PINTURAS)	UN	3.00
Esta actividad se incluye toda vez que se evidencio que al igual que los juegos bio saludables, los juegos de niños existentes presentan un sumo deterioro en su bases y empotramientos, sumado a ello la falta de accesorios y elementos, mal estado de pintura y corrosión, este ítem permite la recuperación de estos espacios y zonas infantiles para el fortalecimiento y conexión familiar.			

Despues de revisadas las respectivas memorias de cálculo y haber realizado correcciones desde mi supervisión se da por aprobada esta solicitud de modificatoria, optimizando el recurso y entregando un producto en relación al objeto.

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CANTIDADES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR
1	**PRELIMINARES**										
1,1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2	2.550,00	3.848,90	9.304.696,95	2.103,53	$ 7.675.572,22	-	$ -	4.653,53	$ 16.980.269,17
1,2	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	40,00	306.546,56	12.261.862,60	178,62	$ 54.755.347,42	-	$ -	218,62	$ 67.017.210,02
1,3	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS,SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	1,00	322.680,15	322.680,15	-	$ -	1,00	$ 322.680,15	-	$ 0,00
2	**EXCAVACION**										
2,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	410,00	72.258,02	29.625.786,26	-	$ -	115,77	$ 8.365.621,79	294,23	$ 21.260.164,47
3	**BASES Y RELLENOS**										
3,1	RELLENO CON MATERIAL MIXTODERÍO SINPROCESAR TAMAÑO MAX.3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	213,40	54.303,05	11.588.271,60	65,67	$ 3.566.077,07	-	$ -	279,07	$ 15.154.348,67
3,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA NEGRA	M3	60,00	163.865,65	9.831.938,93	30,38	$ 4.978.238,41	-	$ -	90,38	$ 14.810.177,34
3,3	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA TRENZA	M2	800,00	18.967,94	15.174.351,15	421,16	$ 7.988.537,16	-	$ -	1.221,16	$ 23.162.888,31
4	**ANDENES, SARDINELES, BORDILLLOS, ADOQUINES**										
4,1	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-8080X35X20CM. NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	890,00	80.637,40	71.767.290,08	-	$ -	523,63	$ 42.224.164,16	366,37	$ 29.543.125,92
4,2	MALLA ELECTROSOLDADA fy= 5000 kg/cm2,500 Mpa	KG	3.070,00	8.441,98	25.916.893,13	-	$ -	57,21	$ 482.965,95	3.012,79	$ 25.433.927,18
4,3	PLACA CONTRAPISO e=10 cm (20.7 Mpa, 3000 psi) concreto estampado - color	M2	2.005,00	126.035,11	252.700.404,58	-	$ -	2.005,00	$ 252.700.404,58	-	$ 0,00
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS**										

5,1	LUMINARIA: MECANO V TEMPERTATURA DE COLOR: 4000 K POTENCIA: 33W CON BASE PARA FOTOCELDA IRC 70 ÓPTICA: R07	UND	32,00	1.924.034,92	61.569.117,29	-	$ -	32,00	$ 61.569.117,29	-	$ 0,00
5,2	MÁSTIL METÁLICO GALVANIZADO DE 6M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	30,00	1.226.042,61	36.781.278,29	-	$ -	30,00	$ 36.781.278,29	-	$ 0,00
5,3	ESTRUCTURA LA321	UND	4,00	618.429,34	2.473.717,37	-	$ -	2,00	$ 1.236.858,69	2,00	$ 1.236.858,69
5,4	ESTRUCTURA CS400	UND	4,00	740.300,03	2.961.200,10	-	$ -	2,00	$ 1.480.600,05	2,00	$ 1.480.600,05
5,5	ACOMETIDA PARCIAL 2 No6+1No.6 AL	ML	459,05	42.392,00	19.460.174,78	-	$ -	319,94	$ 13.563.023,66	139,11	$ 5.897.151,12
5,6	ACOMETIDA PARCIAL 2 No8+1No.8 CU THHN	ML	705,78	34.394,00	24.274.597,32	-	$ -	566,67	$ 19.490.047,98	139,11	$ 4.784.549,34
5,7	CANALIZACION PVC 2X1" PARA AP	ML	653,00	34.123,70	22.282.775,32	-	$ -	653,00	$ 22.282.775,32	-	$ 0,00
5,8	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	47,00	413.401,92	19.429.890,41	-	$ -	47,00	$ 19.429.890,41	-	$ 0,00
5,9	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UND	41,00	520.301,06	21.332.343,50	-	$ -	27,00	$ 14.048.128,65	14,00	$ 7.284.214,85
6	**MOBILIARIO URBANO**										
6,1	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO ELIPTICA (ESQUÍ DE FONDO). SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	4.716.925,95	4.716.925,95	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 4.716.925,95
6,2	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO SURF. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	4.095.050,38	4.095.050,38	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 4.095.050,38
6,3	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO BARRAS PARALELAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	3.281.948,09	3.281.948,09	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 3.281.948,09
6,4	MANTE Y REPA JUEGO BIOSALUDABLES EXIST	UN	11,00	656.186,26	7.218.048,85	2,00	$ 1.312.372,52	-	$ -	13,00	$ 8.530.421,37
6,5	CANECA EN MALLA METÁLICA TIPO M120 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	UN	8,00	487.452,67	3.899.621,37	-	$ -	8,00	$ 3.899.621,37	-	$ 0,00
6,6	SUM E INST. COLUM SW. THREE, INCL. LOCALIZ Y EXC.	UN	1,00	2.659.673,28	2.659.673,28	-	$ -	1,00	$ 2.659.673,28	-	$ 0,00
6,7	PISO DUROPISO BLANCO 33,8X33,8 T. COMERCIAL	M2	25,00	53.161,07	1.329.026,72	-	$ -	25,00	$ 1.329.026,72	-	$ 0,00
	ÍTEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA										

NP 1	DESMONTE DE MASTILES EXISTENTES (INC. DEMOLICION BASE Y CARGUE DE MATERIALES, Y SUSP RED CABLEADO EXIS)	UN		100.790,00	-	30,00	$ 3.023.700,00	-	$ -	30,00	$ 3.023.700,00
NP 2	BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR TIPO M31. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		571.790,75	-	50,00	$ 28.589.537,50	-	$ -	50,00	$ 28.589.537,50
NP 3	DESMONTE DE BANCA incl retiro	UN		42.189,00	-	41,00	$ 1.729.749,00	-	$ -	41,00	$ 1.729.749,00
NP 4	DESMONTE DE CANECAS EXISTENTES (INC. DEMOLICION DE BASE EXISTENTE Y CARGUE DE MATERIALES)	UN		41.751,00	-	2,00	$ 83.502,00	-	$ -	2,00	$ 83.502,00
NP 5	LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	M2		5.276,00	-	287,36	$ 1.516.111,36	-	$ -	287,36	$ 1.516.111,36
NP 6	MURO CONFINAMIENTO ACABADO LISO 0.60>H>0.45 A=0.20 EN CONCRETO REF 3000 PSI	ML		348.664,00	-	73,00	$ 25.452.472,00	-	$ -	73,00	$ 25.452.472,00
NP 7	CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR OCRE ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)	M2		137.629,00	-	1.445,87	$ 198.993.642,23	-	$ -	1.445,87	$ 198.993.642,23
NP 8	CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR AZUL ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)	M2		187.558,00	-	156,49	$ 29.350.951,42	-	$ -	156,49	$ 29.350.951,42
NP 9	CAJA EN CONCRETO REF CON REJILLA .60*.30 P=.30 (MARCO < 11/2" 3/16")	UN		369.023,00	-	3,00	$ 1.107.069,00	-	$ -	3,00	$ 1.107.069,00
NP 10	BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4" PVC	ML		32.021,00	-	15,47	$ 495.364,87	-	$ -	15,47	$ 495.364,87
NP 11	RELLENO EN GRAVA 1 1/2"<D<2" EP 15 CM (INC ALISTAMIENTO DE TERRENO HACIA DRENAJE)	M2		43.783,00	-	354,14	$ 15.505.311,62	-	$ -	354,14	$ 15.505.311,62
NP 12	LUMINARIA PARA PARQUE ENTRE 36-60 (W) 100000 H (SUMINISTRO E INSTALACION INC FOTOCELDA Y BRAZO)	UN		1.452.795,00	-	12,00	$ 17.433.540,00	-	$ -	12,00	$ 17.433.540,00
NP 13	POSTE 4 M METALCIO DIAM 3" CON CANSITILLAS Y ACABADO EN PINURA	UN		1.072.121,00	-	12,00	$ 12.865.452,00	-	$ -	12,00	$ 12.865.452,00

NP 14	BASECIRCULAR PARA JUEGOS D:2.00 INC REFUERZO DOS DIRECIONES	UN		853.460,00	-	16,00	$ 13.655.360,00	-	$ -	16,00	$ 13.655.360,00
NP 15	SARDINEL 3000PSI B=0.2,b=0.15,H=0.40INC. EXC/RET	ML		50.757,00	-	1.128,52	$ 57.280.289,64	-	$ -	1.128,52	$ 57.280.289,64
NP 16	PLACA CONTRAPISO e = 12 cm (24.13Mpa, 3500psi)	M2		95.185,00	-	7,45	$ 709.128,25	-	$ -	7,45	$ 709.128,25
NP 17	SUMINISTRO E INSTALACION CANECA M-121	UN		1.947.961,00	-	3,00	$ 5.843.883,00	-	$ -	3,00	$ 5.843.883,00
NP 18	PUESTA A TIERRA MASTIL LUMINARIA	UN		380.570,00	-	6,00	$ 2.283.420,00	-	$ -	6,00	$ 2.283.420,00
NP 19	DESMONTE Y MONTAJE DE JUEGO DE NIÑOS EXISTENTE (INC. ADECUACION TUB MET, DADOS EN COCNRETO PARA CINENTACION, SOLDADURAS, ANTICORROSIVO Y PINTURAS)	UN		3.809.022,00	-	3,00	$ 11.427.066,00	-	$ -	3,00	$ 11.427.066,00
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO (A)					$ 676.259.564,45		$ 507.621.694,69		$ 501.865.878,34		$ 682.015.380,81
ADMINISTRACION					$ 236.690.847,56		$ 177.667.593,14		$ 175.653.057,42		$ 238.705.383,28
IMPEVISTOS					$ 6.762.595,64		$ 5.076.216,95		$ 5.018.658,78		$ 6.820.153,81
UTILIDAD					$ 27.050.382,58		$ 20.304.867,79		$ 20.074.635,13		$ 27.280.615,23
TOTAL AIU (B)					$ 270.503.825,78		$ 203.048.677,88		$ 200.746.351,34		$ 272.806.152,32
COMPONENTE AMBIENTAL (C)					3.400.390,60		3.400.390,60		3.400.390,60		$ 3.400.390,60
COMPONENTE SOCIAL (D)					3.400.390,60		3.400.390,60		3.400.390,60		$ 3.400.390,60
COMPONENTE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (E)					3.400.390,60		3.400.390,60		3.400.390,60		$ 3.400.390,60
COMPONENTE CERTIFICACIÓN ELECTRICA (F)					2.719.937,43				2.719.937,43		$0
VALOR PROPUESTA ECONÓMICA (CON LA CUAL SE EVALUARÁN LAS PROPUESTAS DE ACUERDO CON LAS FÓRMULAS DEL NUMERAL 4.1.4 DEL DOCUMENTO BASE O PLIEGO TIPO): (G = A + B + C + D + E + F)					$ 959.684.499,46		$ 720.871.544,37		$ 715.533.3399,91		$ 965.022.704,93
PROVISION OBRAS COMPLEMENTARIAS O ADICIONALES (INCLUYE SU PROPIO COSTO DIRECTO Y SU AIU DE OBRAS PROPUESTO, UNICAMENTE) (H)					5.345.977,54				5.345.977,54		
VALOR TOTAL COSTO DEL CONTRATO A EJECUTAR PROPUESTO: (I = G + H)					**$ 965.030.477,00**		**$ 720.871.544,00**		**$ 720.873.316,00**		**$ 965.022.705,00**

4. EVALUACION Y REEVALAUACIÓN DEL CONTRATISTA

RANGO DE CALIFICACIÓN	
EXCELENTE	El contratista superó las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
BUENA	El contratista cumplió las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
REGULAR	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades que no son graves, ni se considera que incumplió el mismo.
NO CUMPLE	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades graves y se considera que incumplió el mismo.

EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA	**CALIFICACIÓN**
CUMPLIMIENTO (Oportunidad en la entrega de los productos o servicios; Atención a compromisos adquiridos)	**EXCELENTE**
CALIDAD (Grado en el que el producto o servicio cumple las necesidades y expectativas contractuales)	**EXCELENTE**
COMUNICACIÓN (Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato)	**EXCELENTE**
EVALUACIÓN GENERAL (Percepción general sobre el producto y/o servicio suministrado)	**EXCELENTE**

5. **CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN MANEJADA POR EL CONTRATISTA**: Certifico que el contratista hizo entrega en medio magnético y físico de los archivos y documentos y demás información manejada resultante durante el presente periodo de ejecución (la información completa de la ejecución debe reposar en el expediente contractual, si aplica, anexar CD con la información).

6. CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN:

Certifico que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y lineamientos establecidos por el Sistema Integrado de Gestión de la siguiente manera:

Sistema de Gestión aplicable	Requisito	Cumplió / No Cumplió
Calidad	Usó la documentación vigente establecida aplicable el desarrollo de las obligaciones contractuales.	Cumplió
Seguridad y Salud en el Trabajo	Participó de las actividades programadas en SST.	Cumplió
	Realizó las obligaciones contractuales utilizando los elementos de protección personal o protocolos de bioseguridad.	Cumplió

	En el desarrollo de sus actividades no incurrió en actividades de riesgo sin el cumplimiento de las medidas y protocolos necesarios.	Cumplió
Documental	La documentación que generó el contratista está acorde a los lineamientos normativos en materia archivística y política de gestión documental de la entidad.	Cumplió
Seguridad y Privacidad de la Información	Se manejó reserva de la información utilizada para el desarrollo de sus obligaciones.	Cumplió
	Se garantizó la integridad y disponibilidad de la información generada de la gestión contractual.	Cumplió
Medio Ambiente	El desarrollo de las obligaciones contractuales está acorde a los lineamientos normativos vigentes.	Cumplió

NOTA: Se puede modificar esta información acorde a los requerimientos de cada contrato sin necesidad de actualización del formato, también puede ampliar el detalle de la evaluación.

7. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA. El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	FECHA	%
ANTICIPO	0		N.A	N.A
SALDO DEL CONTRATO PENDIENTE POR EJECUTAR	$965.030.477,00		11/12/2024 AL 30/01/2025	100%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$965.030.477,00		**11/12/2024 AL 30/01/2025**	100%

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
CARGO DEL SUPERVISOR: Director de obras civiles
SECRETARÍA U OFICINA: Secretaria de Infraestructura
TELÉFONO DEL SUPERVISOR: 320-861-3106

NIT: 901.892.095-4

Villavicencio, 02 de Abril de 2025 **OFI-020-2928-03/12/2024**

Señores:

Alcaldía de Villavicencio – Secretaria de infraestructura
Arq. Diego Orlando Barbosa Montealegre
Director de Obas Civiles – supervisor

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
02 ABR 2025 Hora 2:30
Folios 1196
No. Folios 2 carpetas
Recibido

REFERENCIA: CONTRATO **N° 2928 del 03 de Diciembre de 2024** , objeto " REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO".

ASUNTO: ENTREGA DE INFORME TECNICO DE MODIFICACION N°001 POR MAYORES Y MENORES CANTIDAES DE OBRA E INCLUSION DE ITEMS NUEVOS NO PREVISTOS SIN RECURSO ADICIONAL.

Cordial Saludo;

En atención a los ajustes realizados a los diseños arquitectónicos iniciales, según los compromisos pactados en los comités de obra realizados, ajustes cuya finalidad es para realizar la correcta implantación de los diseños respecto a la topografía real existente, y distribución de los recursos económicos para los parques con mayor necesidad, se presenta para su consideración esta solicitud de modificación por mayores y menores cantidades de obra e inclusión de ítems nuevos no previstos.

Anexo: INFORME TECNICO DE MODIFICACION POR MAYORES Y MENORES CANTIDAES DE OBRA E INCLUSION DE ITEMS NUEVOS NO PREVISTOS SIN RECURSO ADICIONAL.

Sin otro particular, y en espera de su aprobación y tramite respectivo

JOHN DANI NAGLES PACHON
R/L CONSORCIO ALSIPA


CR 24 A 8 125 CONJ CERRADO LA CABAÑA CA 1 IN 9. VILLAVICECNIO-META
SHARKYING10@GMAIL.COM-**3222169909**

NIT: 901.892.095-4

INFORME TÉCNICO DE MODIFICACIÓN N°001

CR 24 A 8 125 CONJ CERRADO LA CABAÑA CA 1 IN 9. VILLAVICECNIO-META
SHARKYING10@GMAIL.COM-3222169909

INFORME TECNICO DE MODIFICACION N°001 POR MAYORES Y MENORES CANTIDAES DE OBRA E INCLUSION DE ITEMS NUEVOS NO PREVISTOS SIN RECURSO ADICIONAL.

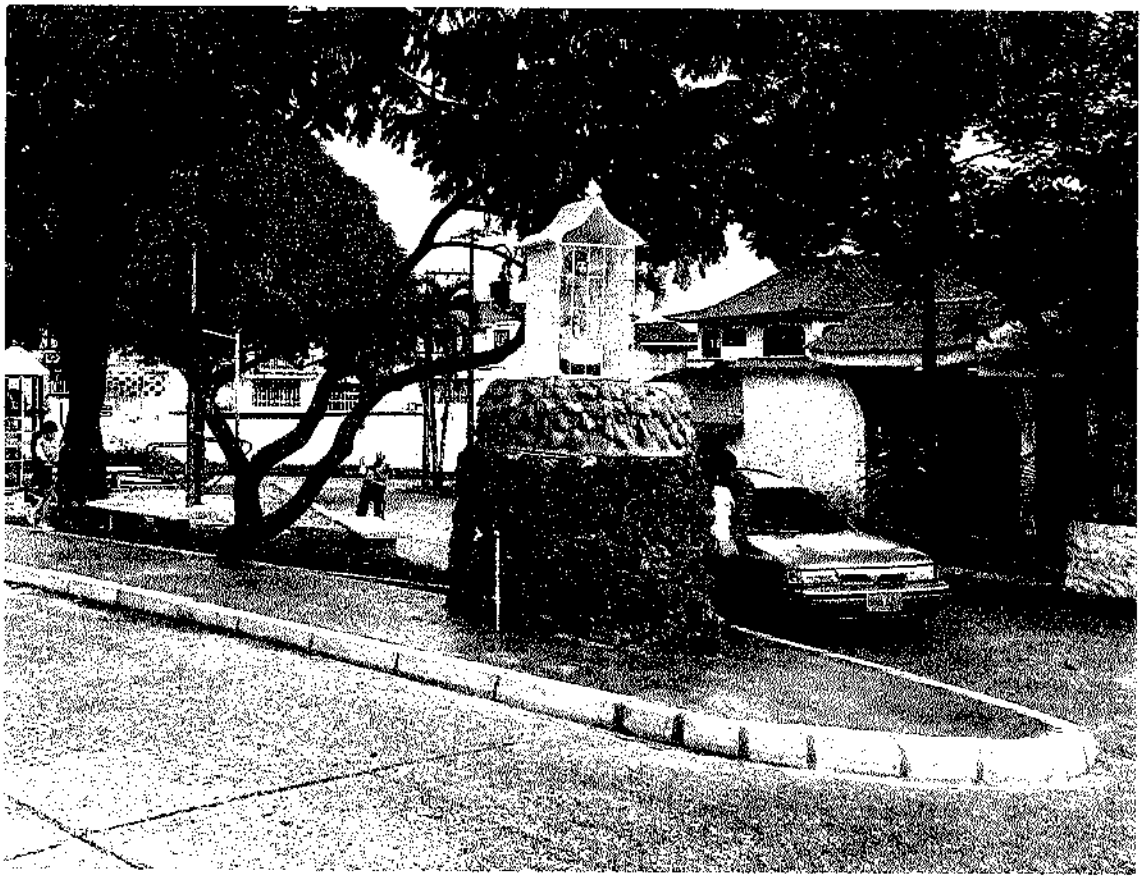

CONSORCIO ALSIPA

CR 24 A 8 125 CONJ CERRADO LA CABAÑA CA 1 IN 9. VILLAVICECNIO-META
SHARKYING10@GMAIL.COM-**3222169909**

INTRODUCCIÓN

Durante el periodo de ejecución de obra, CONSORCIO ALSIPA identifico la necesidad de realizar un ajuste de mayores y menores en las cantidades de obra, para cumplir con ciertas condiciones de cumplimiento al objeto del contrato, mediante esto se realizaron las respectivas mediciones de obra, levantamientos topográficos y demás, que ayudaron a la toma de cantidades específicas de los ítems que varían su cantidad, toda vez que se toman en cuenta las ubicaciones existentes de los árboles de mayor diámetro, y se ajustan los diseños arquitectónicos de los circulares internos como senderos y rotondas centrales, para conservar estas especies, para esto este consorcio se permitió realizar la documentación de modificación de cantidades de obra las cuales se especifican y detallan en este informe, las obras se encuentran en etapa de ejecución en labores de demolición en los parques del Barrio Azotea y Barrio Virrey, lo que se pretende es realizar la actualización de las cantidades a las medidas reales mediante una variación de mayores y menores cantidades de obra necesaria con las que se llegara al cumplimiento del objeto del contrato.

El presente informe técnico de obra corresponde a la modificación No. 001 que presenta CONSORCIO ALSIPA y que es elevado a la supervisión (Secretaria de Infraestructura) del contrato de obra No 2928 del 03 de Diciembre de 2024 el cual tiene por objeto "REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO", con la finalidad de que este sea tramitado ante el contratante por intermedio del supervisor Arq. DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE

OBJETIVO

El objetivo esencial del presente informe es dar a conocer, a la entidad contratante y a la supervisión, la necesidad de realizar modificación de mayores y menores cantidades de obra, para lograr el cumplimiento del objeto del contrato, en los diferentes parques del municipio.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

La ubicación de las actividades de obra es en el departamento del meta, municipio de Villavicencio, Y el desarrollo de la obra se lleva a cabo en el casco urbano del municipio de Villavicencio – Meta, en el parque VIRREY, AZOTEA, MACARENA Y RETIRO

PARQUE BARRIO EL VIRREY ENTRE CR 52 CON CLL 44

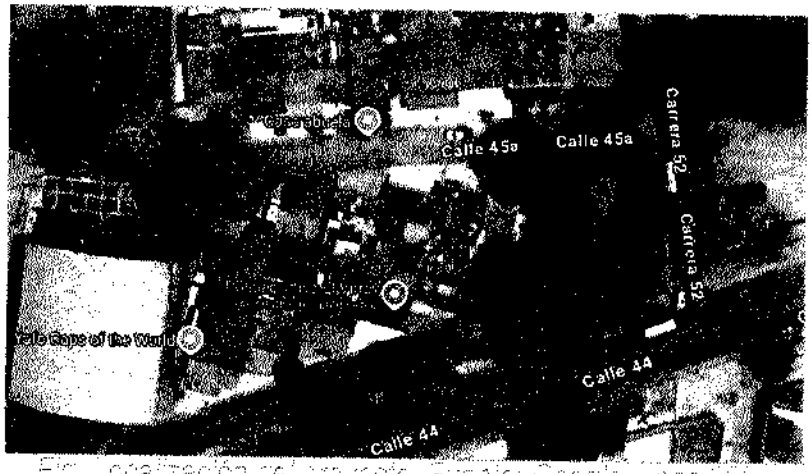


Fig. Localización del proyecto. Fuente: Google earth 2021

PARQUE BARRIO AZOTEA ENTRE CR 49, CLL 34 Y DG 34



Fig. Localización del proyecto. Fuente: Google earth 2021

PARQUE BARRIO MACARENA ENTRE CRS 20a y 20c, CLLS 20d Y 21

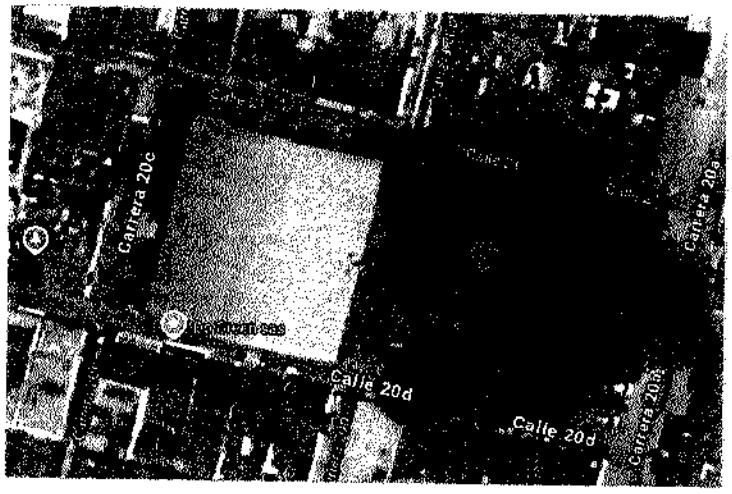


Fig. Localización del proyecto. Fuente: Google Earth 2021.

PARQUE BARRIO RETIRO ENTRE CRS 24 y 24a, CLLS 24 Y 24a

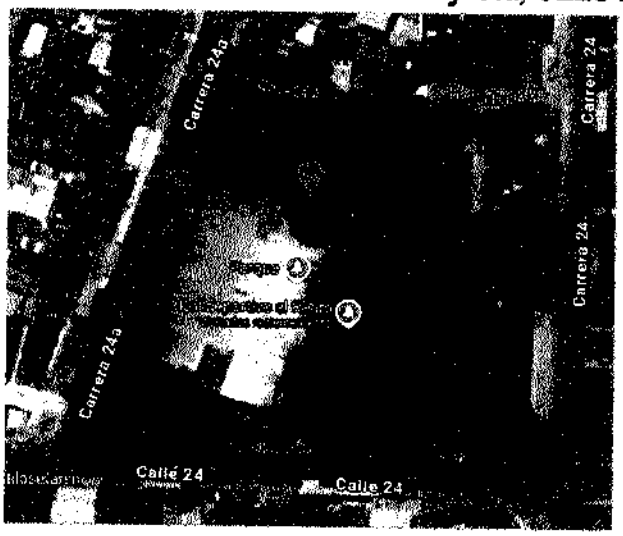


Fig. Localización del proyecto. Fuente: Google Earth 2021.

ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance principal de este proyecto es llegar y dar cumplimento al objeto del contrato, mediante "REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

N° DE CONTRATO	2928 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2024
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
OBJETO	REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
CONTRATRISTA	CONSORCIO ALSIPA
PLAZO INICIAL	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
VALOR INICIAL	NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TREINTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($ 965.030.477).
FECHA DE INCIO	11 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL	30 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSION N° 001	24 DE DICIEMBRE DE 2024
DURACION SUSPENSION N° 001	UN (01) MES
FECHA DE REINICIO N° 001	24 DE ENERO DE 2025
FECHA DE PRORROGA No.01	28 DE ENERO DE2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	15 DE ABRIL DE 2025
TIEMPO ACTUALIZADO DEL CONTRATO	TRES (03) MESES Y CINCO (05) DIAS
ESTADO ACTUAL	EN EJECUCION PLAZO CONTRACTUAL



ACTIVIDADES DE OBRA

Dentro de las actividades según las condiciones contractuales de obra se tienen:

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					
N°	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**V.UNITARIO**	**V.TOTAL**
1					
1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2	2,550.00	3,648.90	9,304,696.95
1.2	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	40.00	306,546.56	12,261,862.60
1.3	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS,SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	1.00	322,680.15	322,680.15
2					
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	410.00	72,258.02	29,625,786.26
3					
3.1	RELLENO CON MATERIAL MIXTODERÍO SINPROCESAR TAMAÑO MAX.3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	213.40	54,303.05	11,588,271.60
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA NEGRA	M3	60.00	163,865.65	9,831,938.93
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA TRENZA	M2	800.00	18,967.94	15,174,351.15
4					
4.1	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-8080X35X20CM. NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	890.00	80,637.40	71,767,290.08
4.2	MALLA ELECTROSOLDADA fy= 5000 kg/cm2,500 Mpa	KG	3,070.00	8,441.98	25,916,893.13

4.3	PLACA CONTRAPISO e=10 cm (20.7 Mpa, 3000 psi) concreto estampado - color	M2	2,005.00	126,035.11	252,700,404.58
5					
5.1	LUMINARIA: MECANO V TEMPERTATURA DE COLOR: 4000 K POTENCIA: 33W CON BASE PARA FOTOCELDA IRC 70 ÓPTICA: R07	UND	32.00	1,924,034.92	61,569,117.29
5.2	MÁSTIL METÁLICO GALVANIZADO DE 6M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	30.00	1,226,042.61	36,781,278.29
5.3	ESTRUCTURA LA321	UND	4.00	618,429.34	2,473,717.37
5.4	ESTRUCTURA CS400	UND	4.00	740,300.03	2,961,200.10
5.5	ACOMETIDA PARCIAL 2 No6+1No.6 AL	ML	459.05	42,392.00	19,460,174.78
5.6	ACOMETIDA PARCIAL 2 No8+1No.8 CU THHN	ML	705.78	34,394.00	24,274,597.32
5.7	CANALIZACION PVC 2X1" PARA AP	ML	653.00	34,123.70	22,282,775.32
5.8	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	47.00	413,401.92	19,429,890.41
5.9	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UND	41.00	520,301.06	21,332,343.50
6					
6.1	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO ELIPTICA (ESQUÍ DE FONDO). SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	4,716,925.95	4,716,925.95
6.2	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO SURF. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	4,095,050.38	4,095,050.38
6.3	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO BARRAS PARALELAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	3,281,948.09	3,281,948.09
6.4	MANTE Y REPA JUEGO BIOSALUDABLES EXIST	UN	11.00	656,186.26	7,218,048.85
6.5	CANECA EN MALLA METÁLICA TIPO M120 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	UN	8.00	487,452.67	3,899,621.37
6.6	SUM E INST. COLUM SW. THREE, INCL. LOCALIZ Y EXC.	UN	1.00	2,659,673.28	2,659,673.28

6.7	PISO DUROPISO BLANCO 33,8X33,8 T. COMERCIAL	M2	25.00	53,161.07	1,329,026.72
COSTO DIRECTO OBRAS INICIALES (A)					676,259,564.45
ADMINISTRACION				35.00%	236,690,847.55
IMPREVISTOS				1.00%	6,762,595.64
UTILIDAD				4.00%	27,050,382.58
TOTAL AIU (B)				40.00%	270,503,825.78
COMPONENTE AMBIENTAL (C)				0.50%	3,400,390.60
COMPONENTE SOCIAL (D)				0.50%	3,400,390.60
COMPONENTE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (E)				0.50%	3,400,390.60
COMPONENTE CERTIFICACIÓN ELECTRICA (F)				0.40%	2,719,937.43
VALOR PROPUESTA ECONÓMICA (CON LA CUAL SE EVALUARÁN LAS PROPUESTAS DE ACUERDO CON LAS FÓRMULAS DEL NUMERAL 4.1.4 DEL DOCUMENTO BASE O PLIEGO TIPO): (G = A + B + C + D + E + F)					$ 959,684,499.46
PROVISION OBRAS COMPLEMENTARIAS O ADICIONALES (INCLUYE SU PROPIO COSTO DIRECTO Y SU AIU DE OBRAS PROPUESTO, UNICAMENTE) (H)					$ 5,345,977.54
COSTO DEL CONTRATO A EJECUTAR PROPUESTO: (I = G + H)					$ 965,030,477.00

Las anteriores corresponden a las activades de obra que hacen parte de las cantidades contractuales según la minuta contractual, actividades las cuales mediante revisión de medidas en campo se evidencio la necesidad de realizar una modificación de cantidades de obra, toda vez que estas cantidades iniciales no son suficientes para llegar al cumplimiento del objeto del contrato y otras que no se realizaran en su totalidad disminuyendo su cantidad la cual nos permite realizar un balance de mayores y menores cantidades.

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACION POR MAYORES Y MENORES CANTIDADES E INLCUSION DE ITEMS NUEVOS NO PREVISTOS

La revisión documental detallada de planos y estudios técnicos urbanos, paisajísticos y del espacio público evidenció la necesidad de validar y optimizar los diseños propuestos para cada parque, con base en la realidad topográfica actual. En coherencia con lo establecido por la Interventoría y la Secretaría de Infraestructura Municipal, se identificó la importancia de realizar levantamientos topográficos en campo, con el fin de obtener mediciones exactas y precisas del espacio público existente, incluyendo elementos tales como el mobiliario urbano y la vegetación.

Con base en la topografía existente se procede a realizar el replanteo e implantación de los diseños arquitectónicos en los parques, y en vista de la necesidad de dejar funcional estos espacios se presenta una variación de mayores y menores en las cantidades iniciales así como la supresión de ítems, e inclusión de ítems nuevos no previstos, lo anterior por variaciones propias de topografía y demás observadas al momento de realizar la implantación arquitectónica.

Estos ajustes realizados a las cantidades presentan su debido soporte, mediante la cuantificación de cantidades en memorias de cálculo con operaciones básicas y medidas arquitectónicas tomadas de los diseños ajustados a la topografía existente, sobre los cuales se toman las medidas finales sobre el terreno y las obras a realizar, por tal razón se presentan el siguiente cuadro en el cual se detallan los ítems y/o actividades a realizar.

JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES POR INLUSION DE ITEMS NUEVOS NO PREVISTOS EN PARQUE AZOTEA

De acuerdo a las revisiones en campo se refleja la necesidad de realizar un ajuste al diseño inicial, ajuste que comprende el área real del parque para su localización y replanteo ajuste de senderos y trazos tomando en cuenta la topografía de este, mediante la cual se evidencia que se debe incluir ítems que permitan complementar las actividades contractuales para poder cumplir con el objeto del contrato.

Mediante esto se propone sea incluido los ítems NP1 (DESMONTE DE MASTILES EXISTENTES (INC. DEMOLICION BASE Y CARGUE DE MATERIALES, Y SUSP RED CABLEADO EXIS)), NP3 (DESMONTE DE BANCA incl retiro), NP4 (DESMONTE DE CANECAS EXISTENTES (INC. DEMOLICION DE BASE EXISTENTE Y CARGUE DE MATERIALES)) referentes a desmontes de mobiliario toda vez que inicialmente solo se contempla suministro de nuevos mobiliarios y carecía de actividades de desmonte como lo son mástiles de iluminación existente, bancas en concreto, canecas metálicas, los cuales se encuentran con su vida útil ya acabada y demás en estado obsoleto.

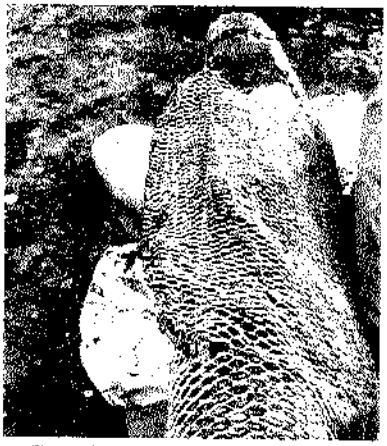








Fig. mobiliario de bancas existentes

Para el mobiliario de bancas se evidencia que las bancas existentes se encuentran deterioradas y poco convencionales para el diseño arquitectónico del parque, razón por la cual se opta por incluir el ítem NP2 (BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR TIPO M31. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.) proyectando de esta manera espacios y zonas de descanso con bancas de apariencia moderna que concuerden con el resultado final.

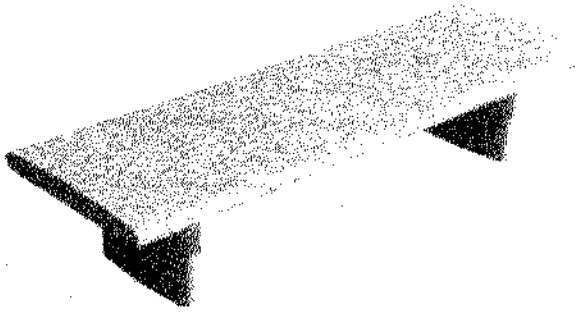


Fig. Imagen de referencia de la banca

Se incluye muro de confinamiento ítem NP6 (MURO CONFINAMIENTO ACABADO LISO 0.60>H>0.45 A=0.20 EN CONCRETO REF 3000 PSI) toda vez que la zona de Biosaludables, se traslada a la zona intermedia del parque y no en su posición propuesta, toda vez que en la parte superior del parque se encuentra una gruta (imagen del Divino Niño) la cual la comunidad realiza la petición para que se siga conservando este elemento que aduce el nombre del PARQUE DIVINO NIÑO, con lo anterior se realizan varias opciones de manejo de esta zona y se determina realizar el confinamiento de material interno de zona juegos para garantizar que esta quede a nivel y se un espacio de fácil circulación interna entre los biosaludables. Muro que por sus dimensiones y características como su acero de refuerzo permite el soporte de masas de tierra confinándolas y previniendo que se desplacen hacia zonas laterales.

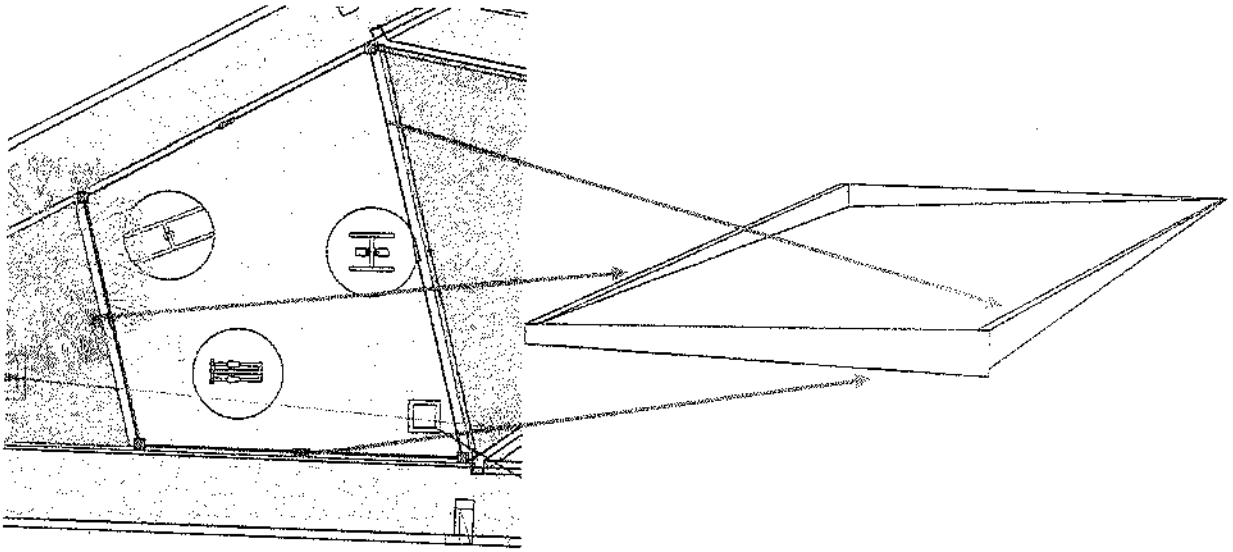


Fig. representación muros de contención

Así mismo se verifican los ítems contractuales como el 4.3 (PLACA CONTRAPISO e=10 cm (20.7 Mpa, 3000 psi) concreto estampado – color)) ítem que al hacer la respectiva verificación en sus especificaciones se evidencia que carece de todas las actividades de un concreto estampado, como lo es el lavado continuo al fraguado de las placas y previo a el sellado el cual permite realzar la tonalidad del colorante y no se especifica de manera precisa el tono del color, toda vez que es necesario saber la tonalidad del color endurecedor, debido a que estos varían su costo por el método y los lugares de extracción de materia prima base del colorante, por ello se incluye como actividad principal NP7 CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR OCRE ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF) concreto estampado color ocre, y como actividad complementaria NP8 CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR AZUL ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF) concreto estampado color azul, color institucional del municipio instalándolo en la zona central o rotonda del nuevo parque.

Sello realza la tonalidad, y protege el tono del color endurecedor de condiciones de intemperie.


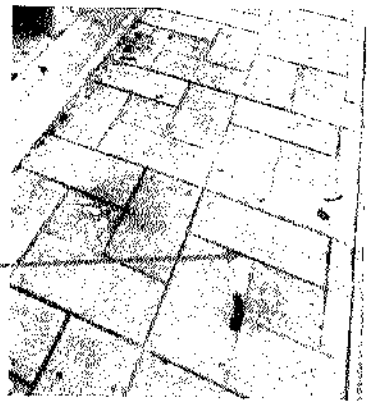


Fig. Imagen de referencia sellado

Para el manejo de las aguas internas (precipitaciones o lavados internos) se plantean cajas recolectoras ítem NP9 CAJA EN CONCRETO REF CON REJILLA .60*.30 P=.30 (MARCO < 11/2" 3/16") a la cual conducen las aguas por gravedad previo al replanteo del terreno, y NP10 BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4" PVC para el drenaje de estas y conducción a parte externa.

Caja rejilla, recolectora de aguas

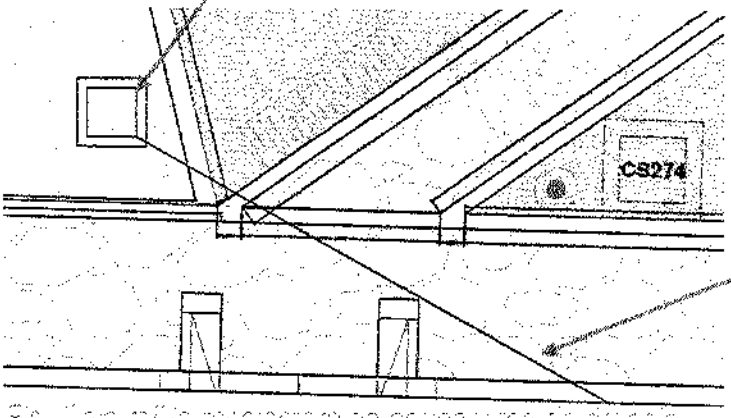

Línea de tubería para drenaje

Fig. Caja rejilla recolectora de aguas y red de drenaje

En actividad complementaria a la zona de Biosaludables se incluye NP11 RELLENO EN GRAVA 1 1/2"<D<2" EP 15 CM (INC ALISTAMIENTO DE TERRENO HACIA DRENAJE) Grava 1 ½" con su respectivo alistamiento de terreno para el manejo de aguas hacia el drenaje, se propone instalación de capa de 15cm para aislar el terreno natural, generando una zona peatonal libre de excesos de agua.


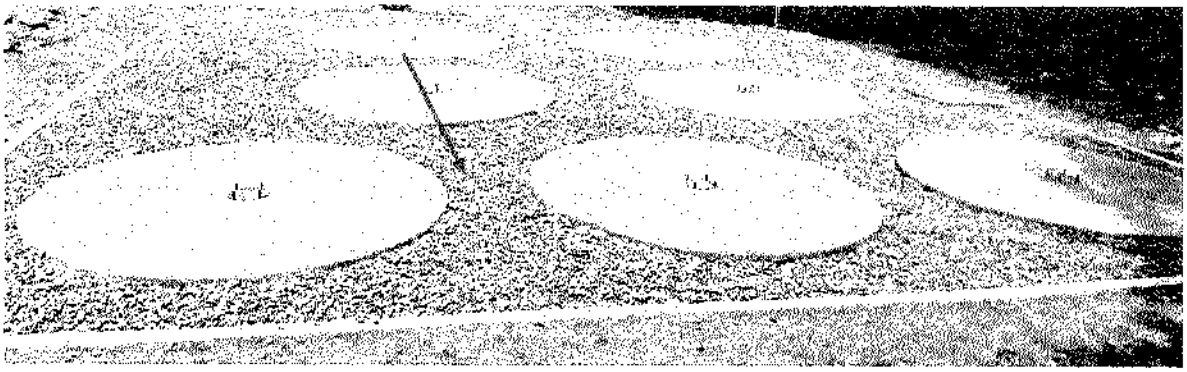


Fig. Imagen de referencia de superficie de piso en gravilla 1 1/2"

Por otra parte en cuanto al tema de las luminarias Consorcio Alsipa opta por seguir las mismas características lumínicas de potencia y demás de la ficha técnica de la luminaria inicial o contractual y se presenta dentro de la modificación una luminaria de estas características pero a un menor costo esto con el fin de incluir algunas actividades que surtieron de las verificaciones y que son necesarias para la rehabilitación de los parques, proponiendo de esta manera la inclusión del ítem NP 12. LUMINARIA PARA PARQUE ENTRE 36-60 (W) 100000 H (SUMINISTRO E INSTALACION INC FOTOCELDA Y BRAZO)





Luminaria LED para iluminación vial y exterior, con diseño moderno y robusto de un cuerpo en aluminio inyectado y compartimento independientes para el conjunto óptico y eléctrico. Montaje en tubo de soporte para poste horizontal o en punto. Proyección uniforme de la luz , reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

Diseño moderno con fuente LED SMD y lentes en policarbonato
Chasis robusto en aluminio inyectado, iviano con disipador de calor integrado.
Compartimentos para el conjunto eléctrico y óptico.
Vidrio plano de protección.
Driver atenuable 0-10VDC y programable.
Base para fotocelda 7 pines compatible con sistemas para tele gestión.
Soporte con ángulo ajustable para fácil instalación.

APLICACIONES

Alumbrado público en calles, avenidas y autopistas.
Iluminación general en exteriores.
Parques, plazoletas y parqueaderos.

Nota: Se anexa ficha técnica de luminaria propuesta

De igual forma en campo se evidencia que los parques cuentan con iluminación de alumbrado público en su perimetro, por tanto la iluminación se enfoca netamente en la parte interna de este espacio, Así mismo se observa que por las dimensiones y altura a la que se encuentran los árboles los mástiles de 6m por su longitud no son aptos para estas zonas internas, esto debido a que la frondosidad de las ramas obstruye el brazo y luminaria impidiendo que esta ilumine libremente, estas ramas se encuentran en promedio de 3.8m a 4.5m de altura, motivo por el cual se cambia este ítem por el ítem NP13 POSTE 4 M METALCIO DIAM 3" CON CANSITILLAS Y ACABADO EN PINURA suministro de un mástil de menor tamaño apto para la instalación de las luminarias.



Se observa que se hace necesario reducir el tamaño de los mástiles toda vez que la altura contractual sobrepasa las ramas de los árboles, técnicamente no pude cumplir la función de soportar la luminaria en un lugar con suficiente espacio para proyección de luz emitida por la luminaria.



Fig. Imágenes ilustrativas de certificación posibles precios [illegible]

En cuanto a los biosaludables se incluye el ítem NP14 BASECIRCULAR PARA JUEGOS D:2.00 INC REFUERZO DOS DIRECIONES mediante el cual se facilita el uso y anclaje de los juegos rodeando la base del biosaludable con un radio de 1 metro, el cual asegura una plataforma firme para el apoyo y posición de los usuarios.

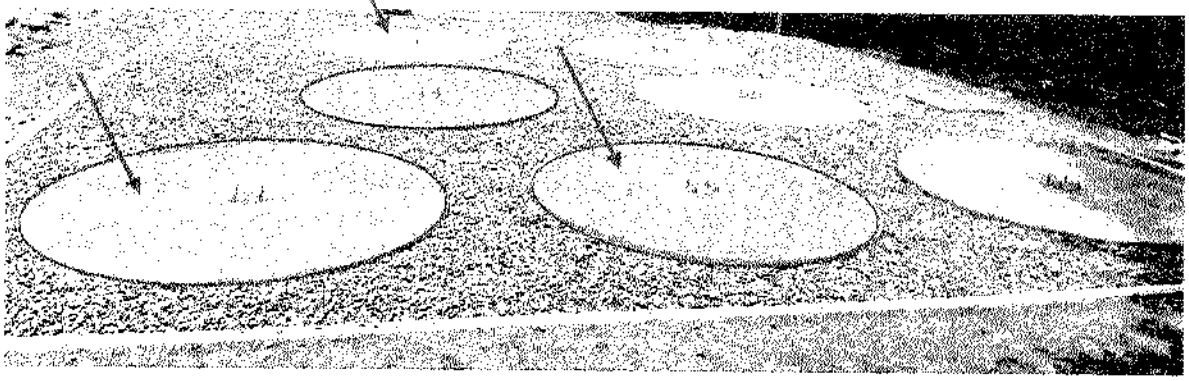


Fig. Imagen de referencia bases circulares para
soporte de biosaludables [illegible]

Para el confinamiento de las placas y/o zonas verdes se propone el ítem NP15 SARDINEL 3000PSI B=0.2,b=0.15,H=0.40INC. EXC/RET, el cual mediante mezcla en sitio se elabora sardinel fundido con su respectivo acero de refuerzo, de esta manera se mejoran los acabados internos y su durabilidad es mayor respecto a un bordillo prefabricado, tomando este último solamente para el perímetro vial del parque.

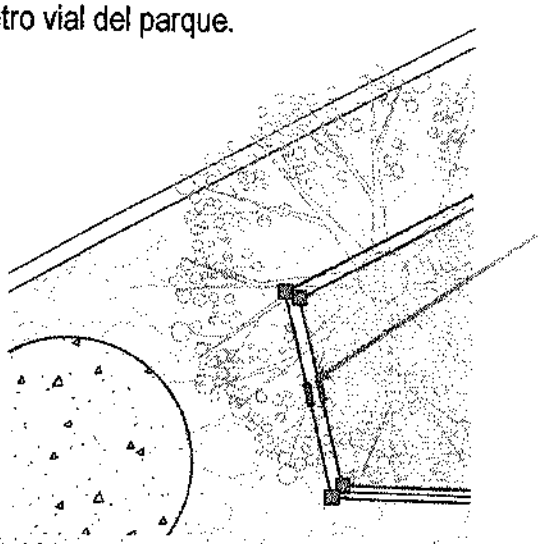


Fig. ubicación de placa de sardinel fundido para confinamiento de zonas verdes sendero peatonales.

En cuanto al mobiliario de canecas, se observa en los diferentes parques y en general en espacios públicos, que la durabilidad de la caneca inicialmente propuesta M-120 no supera los 2 años, por sus características e instalación en intemperie no se garantiza su durabilidad, razón por la cual se propone el ítem NP17 SUMINISTRO E INSTALACION CANECA M-121 que al poseer su estructura en acero inoxidable garantiza una durabilidad de 2 a 3 veces mayor y su apariencia es moderna contrastando con el rehabilitamiento de espacios del parque.

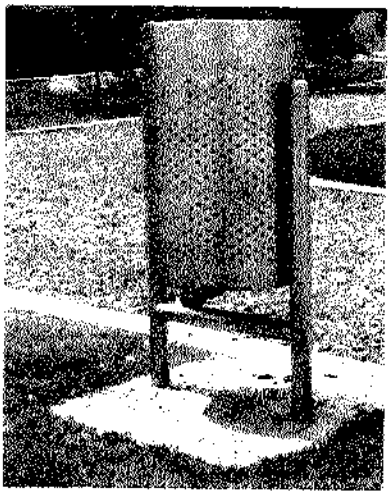


Fig. imagen caneca de referencia



Fig. caneca M-121

Estas al ser en material de acero inoxidable su vida útil y durabilidad es mayor permitiendo que estos elementos se conserven en excelente estado por el mayor tiempo posible.

JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES POR INLUSION DE ITEMS NUEVOS NO PREVISTOS EN PARQUE VIRREY

De acuerdo a lo observado en campo, se ve la necesidad de llevar a cabo la actividad NP1 DESMONTE DE MASTILES EXISTENTES (INC. DEMOLICION BASE Y CARGUE DE MATERIALES, Y SUSP RED CABLEADO EXIS), toda vez que se observa que este parque no cuenta con iluminación led la cual se va a instalar y al ser este objeto de rehabilitación y modificación se hace necesaria la inclusión de esta actividad.





Fig. Mastiles de iluminación en suelo

El mobiliario existente corresponde a bancas en concreto tipo jardín las cuales se encuentran en un deterioro considerable y posiblemente mayor al ser trasladadas de su posición para el ajuste de nuevos senderos, por ello se propone el desmonte de estas unidades traslado y cargue mediante el ítem NP3 (DESMONTE DE BANCA incl retiro) y para el respectivo reemplazo de unidades nuevas más modernas de mayor tamaño y comodidad se incluye ítem NP2 (BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR TIPO M31. SUMINISTRO E INSTALACIÓN).



Fig. Estado actual de mobiliario bancas




Fig. Banca

Para los senderos o circulares peatonales internos y externos estampados, se utilizará concreto estampado color ocre para senderos perimetrales e internos de acceso y azul para su zona central, de esta forma se incluye en estos espacios los ítems NP7 (CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR OCRE ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)) Y NP8 (CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR AZUL ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF))

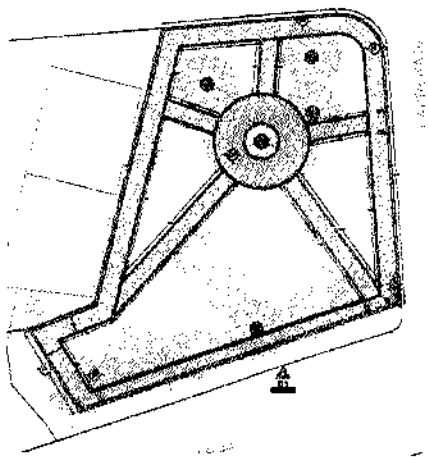


Fig. Diseño de color de senderos perimetrales, senderos de acceso y zonas

En el capítulo de instalaciones eléctricas mediante verificaciones en campo se toma la decisión de realizar un cambio del ítem 5.2 MÁSTIL METÁLICO GALVANIZADO DE 6M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN, toda vez que por cuestiones de la arborización con la que cuenta el parque no es viable la instalación de postes de esta altura, para ello se propone incluir ítem NP13 POSTE 4 M METALCIO DIAM 3" CON CANSITILLAS Y ACABADO EN PINURA, de esta forma se garantizan que las luminarias puedan ubicarse en una altura apta para su iluminación y libre de obstrucciones como ramas o troncos de árboles.



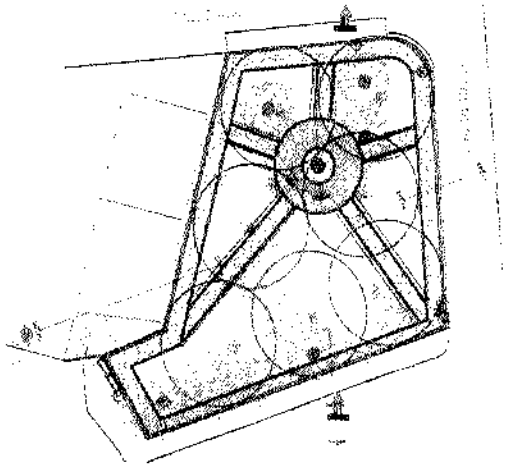


Fig. Verificación de instalación de mástiles actuales en el parque

Para el confinamiento de las zonas verdes y respectivamente confinamiento de circulares o senderos peatonales se propone el uso del NP 15 (SARDINEL 3000PSI B=0.2,b=0.15,H=0.40INC. EXC/RET), el cual por sus características es mucho más duradero que los prefabricados convencionales, ya que incluye acero de refuerzo en su interior, sumado que el tamaño de este da mejor estética a los acabados al ser de menor tamaño de un prefabricado.

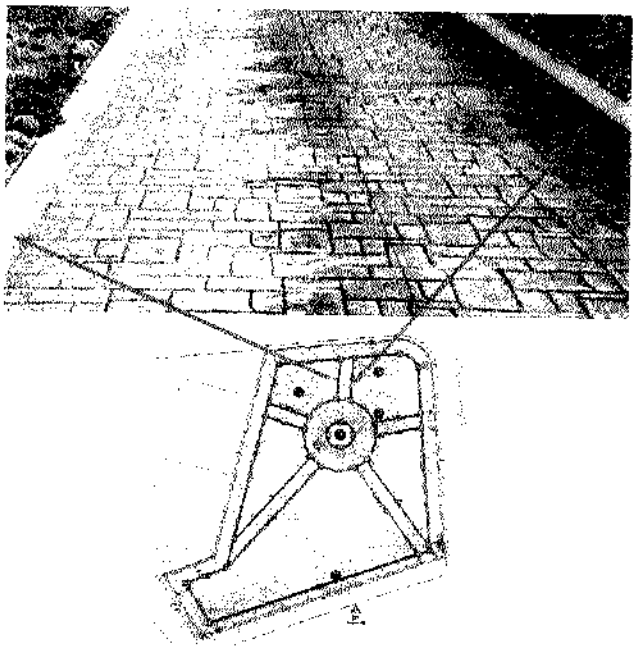


Fig. Imagen de referencia sardinel prefabricado

Se observa inicialmente que el parque virrey no cuenta con caneca, los usuarios dejan residuos desechables, como botellas, bolsas de basura y demás en las zonas verdes, mismas que pasados días u horas en su mayoría terminan rotas por acción del ambiente o animales, estas deben estar instaladas en caneca para asegurar que estos residuos permanezcan en su sitio mientras se hace su debida recolección para disposición final, por esto se incluye para este parque el item NP 18 SUMINISTRO E INSTALACION CANECA M-121





Fig. Parque sin caneca para depositar basura




Fig. Imagen de referencia propuesta para ubicación de canecas

JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES POR INLUSION DE ITEMS NUEVOS NO PREVISTOS EN PARQUE EL RETIRO

Para el parque del retiro, aunque no se contempla iluminación nueva, se evidencia la existencia de mástiles antiguos sin funcionamiento, los cuales deberán ser extraídos para liberar las zonas verdes de estos elementos que no cumplen ninguna función actualmente, para ello se incluye en este parque el ítem NP1 DESMONTE DE MASTILES EXISTENTES (INC. DEMOLICION BASE Y CARGUE DE MATERIALES, Y SUSP RED CABLEADO EXIS)

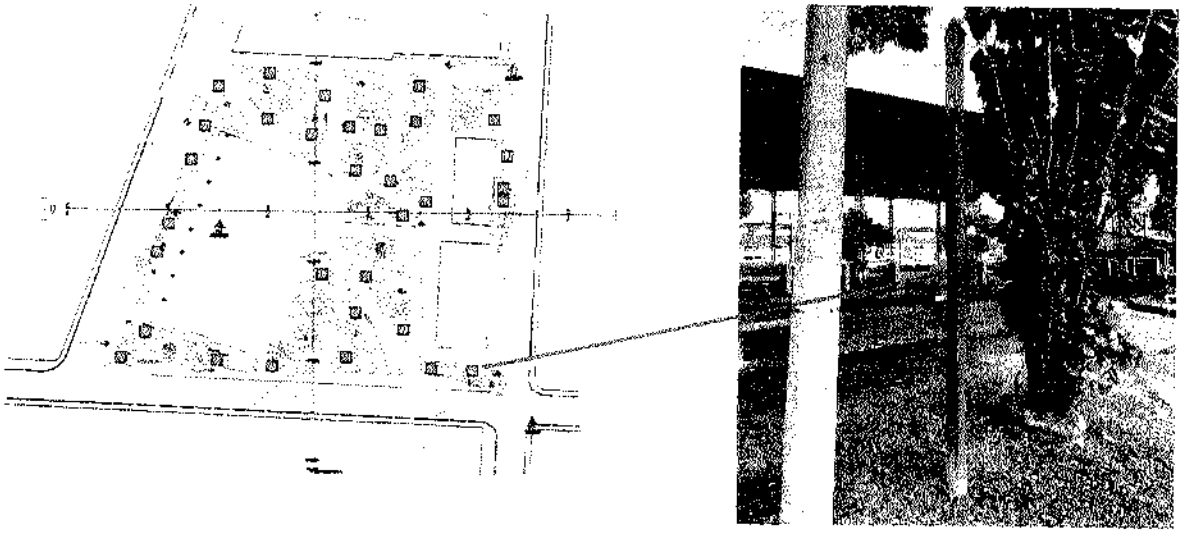


Fig. Ubicación de mástiles de alumbrado antiguos

En revisión de mobiliario se verifica que las bancas existentes corresponden a sobrantes de placas de gradería de antiguos trabajos en polideportivo el retiro, las cuales están ancladas y sobrepuestas sobre bases fundidas en sitio, estos elementos merecen un cambio por un mobiliario mucho más confortable, de esta manera se incluye el ítem NP3 DESMONTE DE BANCA incl retiro para la extracción de estos elementos para su posterior reemplazo.



Fig. Estado de bancas




Fig. Referencia de banca para retiro

Complementando la actividad anterior se incluye ítem NP2 BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR TIPO M31. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. mobiliario de bancas nuevas tipo m-31 de y su cantidad obedece a los diseños ajustados teniendo en cuenta zonas abiertas senderos y demás puntos de interés de la comunidad, por ello se aumenta la cantidad de unidades garantizando así un mobiliario suficiente y acorde con el área del parque.

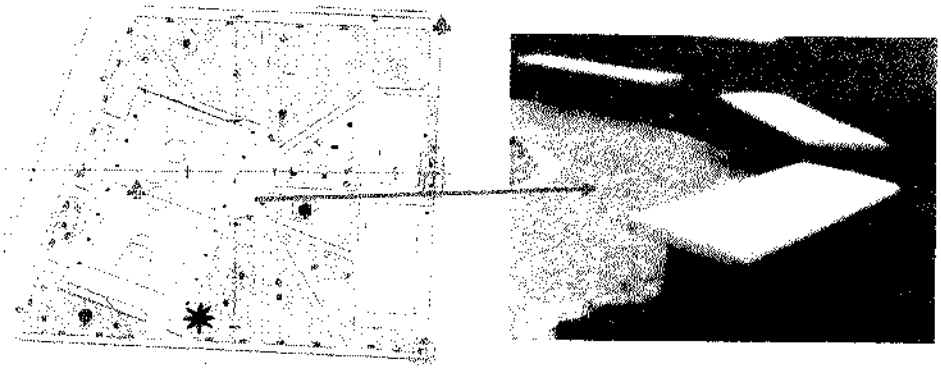
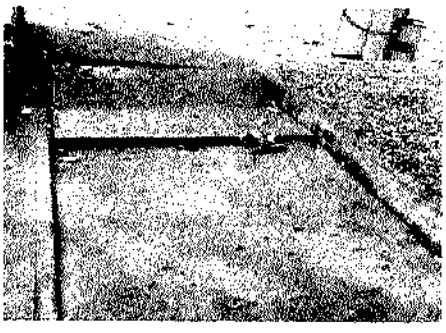


Fig. Distribución de mobiliario y bancas tipo m-31

Se evidencia que los senderos del parque presentan levantamientos grietas y roturas considerables que con el transcurso de los años van apareciendo en las placas ya que no cuentan con acero de refuerzo, y por otro lado raíces existentes que realizan un empuje de estas y fracturan el concreto, para ello se propone demolición de las placas internas y perimetrales para su reemplazo por placas de concreto estampado mediante NP7 CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR OCRE ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF) y NP8 CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR AZUL ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)






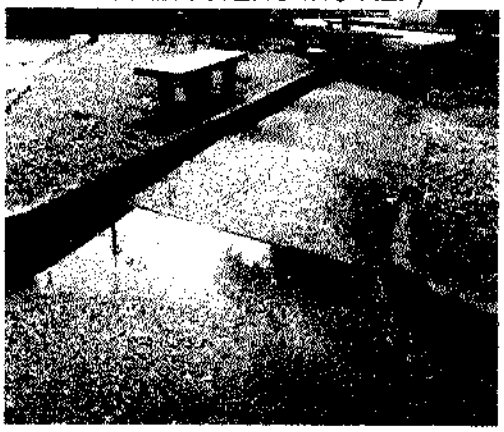


Fig. Estado actual de senderos internos y acometidas

El parque del retiro es un espacio constantemente visitado por familias, para ello se propone un mejoramiento de la zona de juegos infantiles y Biosaludables mediante la inclusión del ítem NP11 RELLENO EN GRAVA 1 1/2"<D<2" EP 15 CM (INC ALISTAMIENTO DE TERRENO HACIA DRENAJE) el cual consiste en un alistamiento de terreno con escorrentía hacia caja rejilla interna, terreno sobre el cual se instala gravilla la cual mantiene constantemente la superficie libre de encharcamientos, de esta forma también se evita que animales como gatos o perros que constantemente hacen sus necesidades en zonas verdes lo hagan en zona de juegos o parques infantiles.





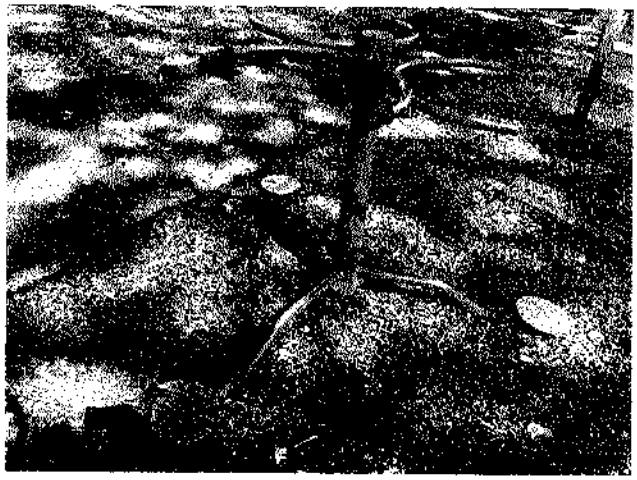

Nota: El anterior ítem permite que se realice en los puntos de juegos infantiles y biosaludables

Para el mantenimiento propuesto de los Biosaludables es decir el ítem contractual 6.4 solo se contempla mantenimiento de juego, para lo cual el consorcio en vista de que se realizara el mantenimiento de estos juegos propone una reubicación en un espacio más amplio mediante el cual estos equipos se deben instalar con la inclusión del ítem NP14 BASECIRCULAR PARA JUEGOS D:2.00 INC REFUERZO DOS DIRECIONES proyectando bases circulares de concreto garantizando una superficie firme en la cual se ancla el juego en un pedestal central a nivel.



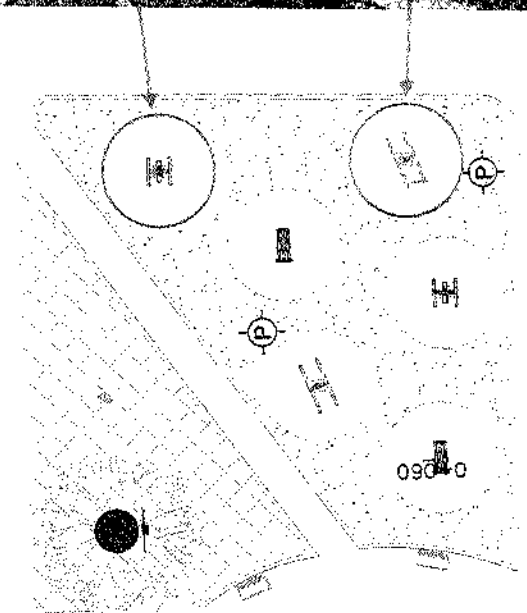


Fig. Distribución de biosaludables en el polideportivo ubicados en bases circulares independientes

Para confinar los nuevos senderos y en si las circulares peatonales tanto internas como externas, se incluye el ítem NP15 SARDINEL 3000PSI B=0.2,b=0.15,H=0.40INC. EXC/RET ya que en su mayoría los sardineles existentes presentan grietas y fisuras toda vez que llevan más de 25 años sin intervención o mantenimiento alguno. Mediante este ítem se busca confinar el terreno natural evitando que en temporada de fuertes lluvias se presenten escorrentías o lavado de material orgánico de las zonas verdes, y confinar las placas de concreto estampado.

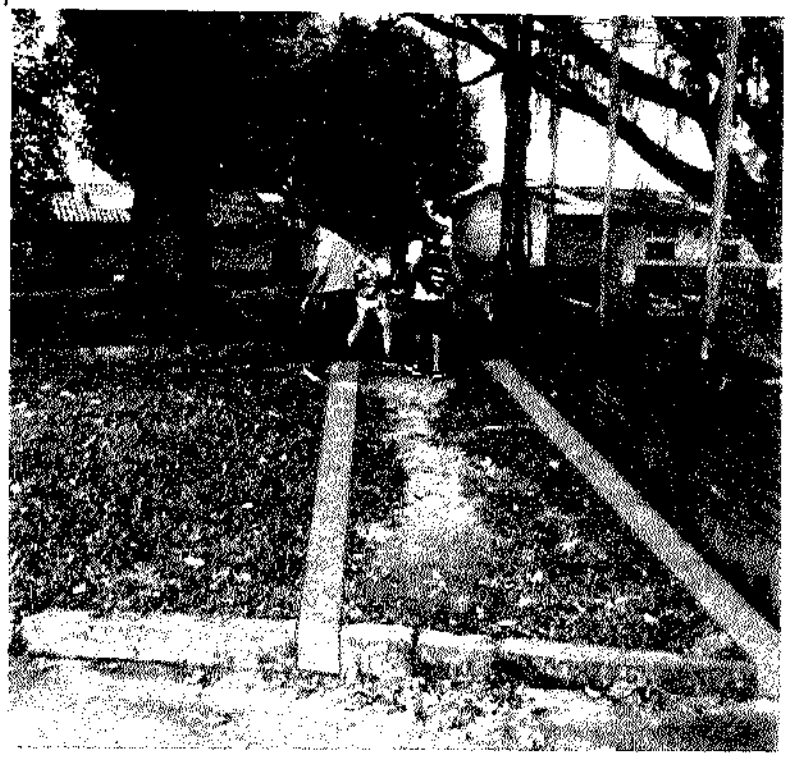


Fig. Proyección de nuevos senderos peatonales internos y circulares peatonales



Fig. Fisuras en sardineles existentes en el sector

En trabajos de campo se observa que el sendero al respaldo de las graderías no tiene finalización es decir se obstruye su continuidad hacia la cll 24, y con el fin de realizar esta conexión para conectar estos 2 puntos y tener un acceso directo al polideportivo se presenta el ítem NP16 PLACA CONTRAPISO e = 12 cm (24.13Mpa, 3500psi) placa de concreto la cual se hace con la misma textura o acabados de la existente para una que el sendero se observe uniforme en sus acabados.

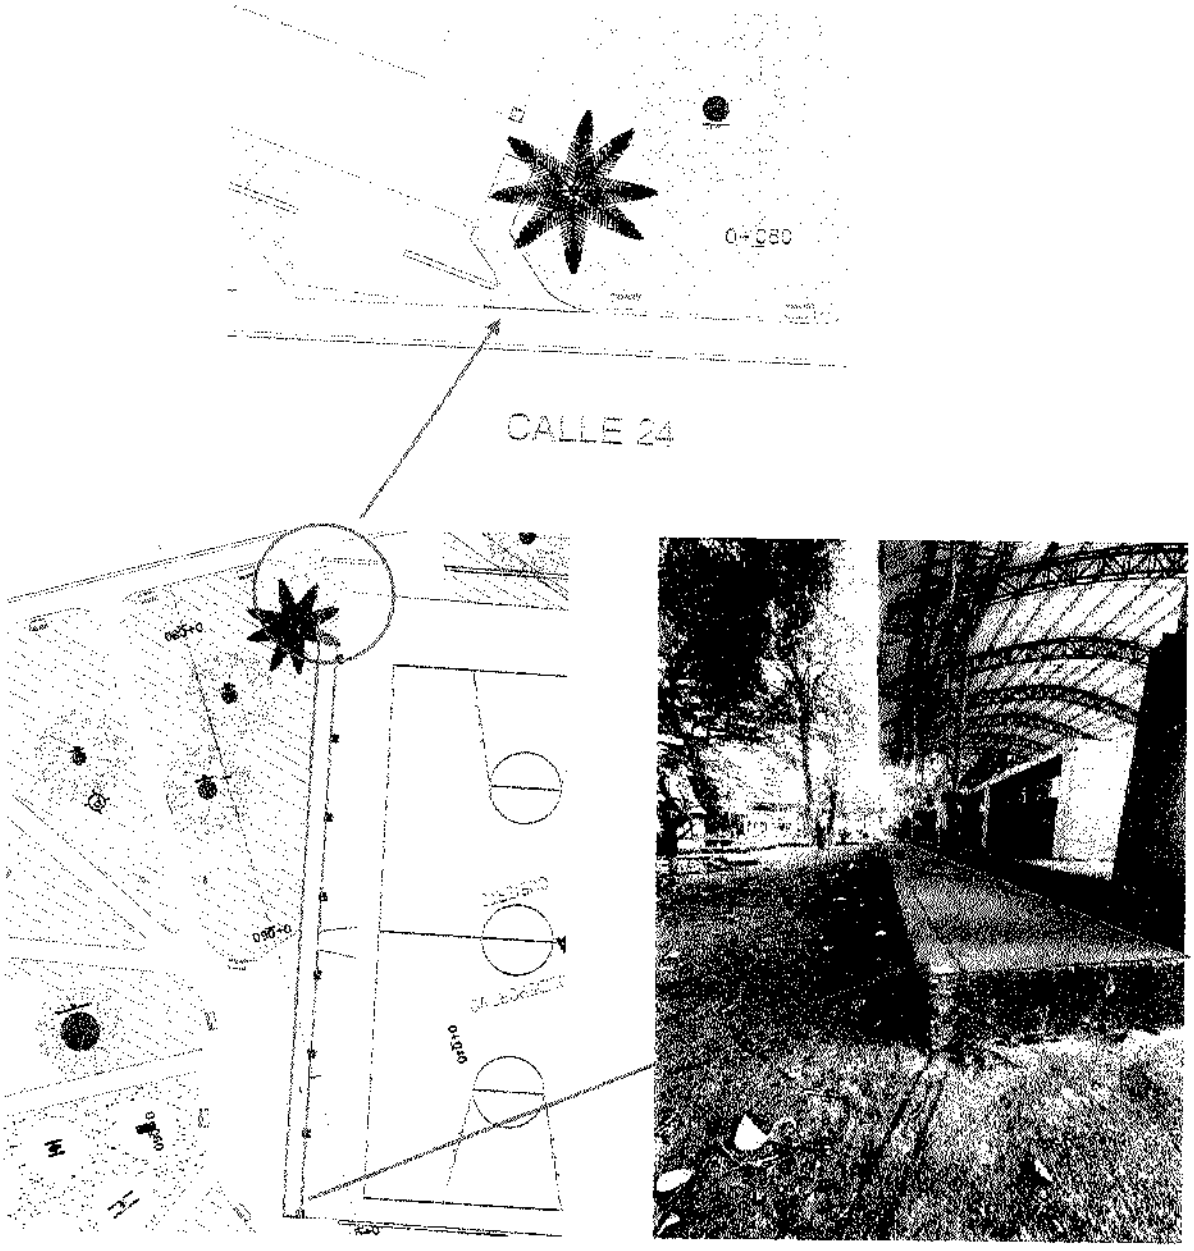


Fig. Ubicación de ampliación por el sendero peatonal a una de las [illegible] acceso directo al polideportivo

Para complementar la mejora a las zonas de juegos infantiles se propone el ítem NP19 DESMONTE Y MONTAJE DE JUEGO DE NIÑOS EXISTENTE (INC. ADECUACION TUB MET, DADOS EN COCNRETO PARA CINENTACION, SOLDADURAS, ANTICORROSIVO Y PINTURAS) el cual comprende desmontaje de estructura de juegos adecuación de sus partes mantenimiento soldaduras anclajes reemplazo de tubería en mal estado anclaje y acabado final en pintura, esto permite rehabilitar el juego infantil el cual por su estado actualmente no se pude aprovechar de manera correcta y segura.



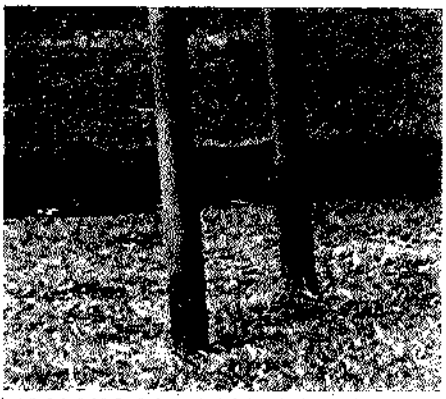
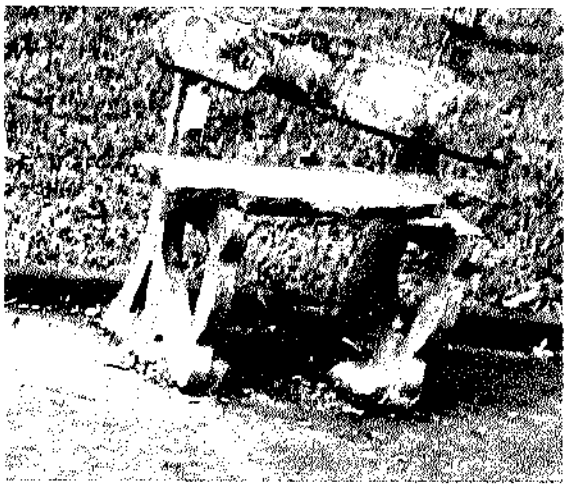


Fig. Estado general de estructura y componentes de juego infantil

JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES POR INLUSION DE ITEMS NUEVOS NO PREVISTOS EN PARQUE MACARENA

Desde las primeras visitas de obra se evidencio el estado de una silla central completamente deteriorada y riesgo para sus usuarios ya que tiene expuesto los aceros de refuerzo, se propone el desmonte y retiro de esta unidad mediante el ítem NP3 DESMONTE DE BANCA incl retiro y el cambio de esta unidad por el ítem NP2 BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR TIPO M31. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. mejorando la condición visual interna de este espacio.



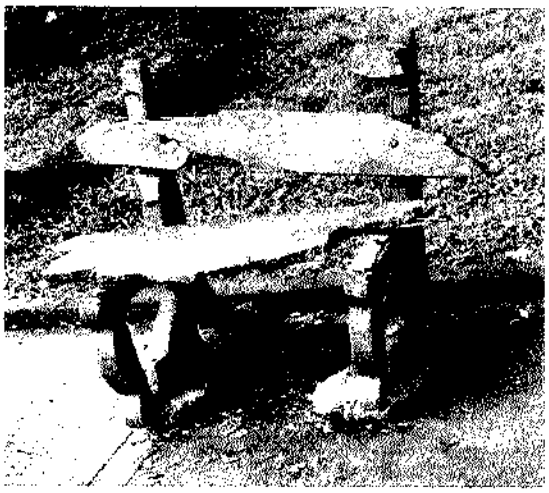


Fig. Estado de mobiliario central

Se aprecia que los corredores internos se encuentran considerablemente sucios y cubiertos por una capa de "lama" la cual se crea por acumulación de agua poca presencia de luz solar para evaporación, dejando así estos senderos internos con una apariencia verde que acumula humedad proporcionando a la superficie una capa sumamente resbalosa, por ello se propone incluir el ítem NP5 LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET para el lavado de pisos, senderos a presión con hidrojet y detergente dejando la superficie limpia y de color natural, previniendo accidentes por deslizamientos.

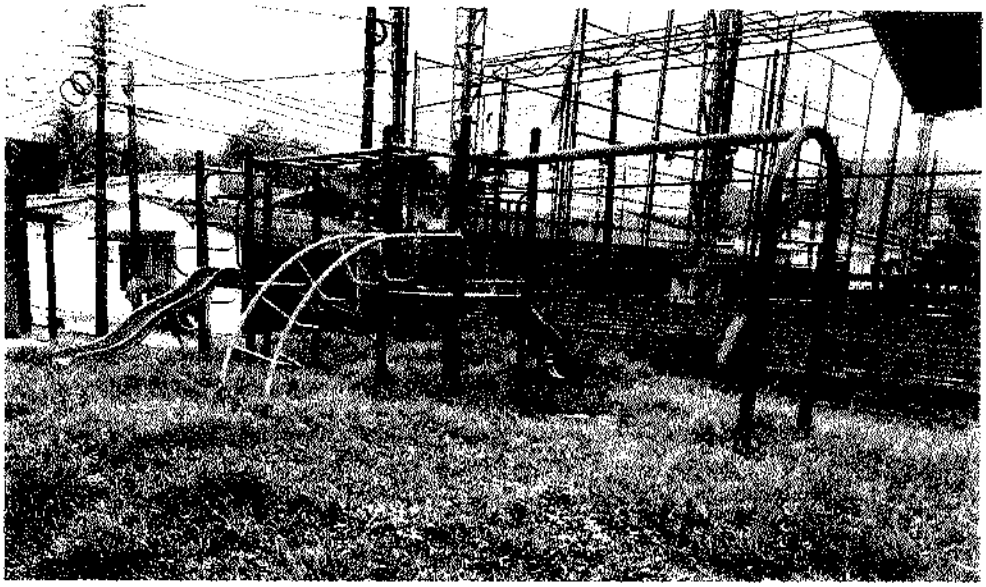






Fig. Estado de pisos internos de las viviendas que se encuentran en mal estado

Así mismo se aprecia el que la zona de juegos infantiles se encuentra en una zona verde, que acumula bastante agua misma que con el tiempo deteriora estos elementos, para ello se propone una caja rejilla ítem NP9 CAJA EN CONCRETO REF CON REJILLA .60*.30 P=.30 (MARCO < 11/2" 3/16") que recolecte las aguas y las traslade hacia la parte externa evitando que esta se acumule en esta zona.



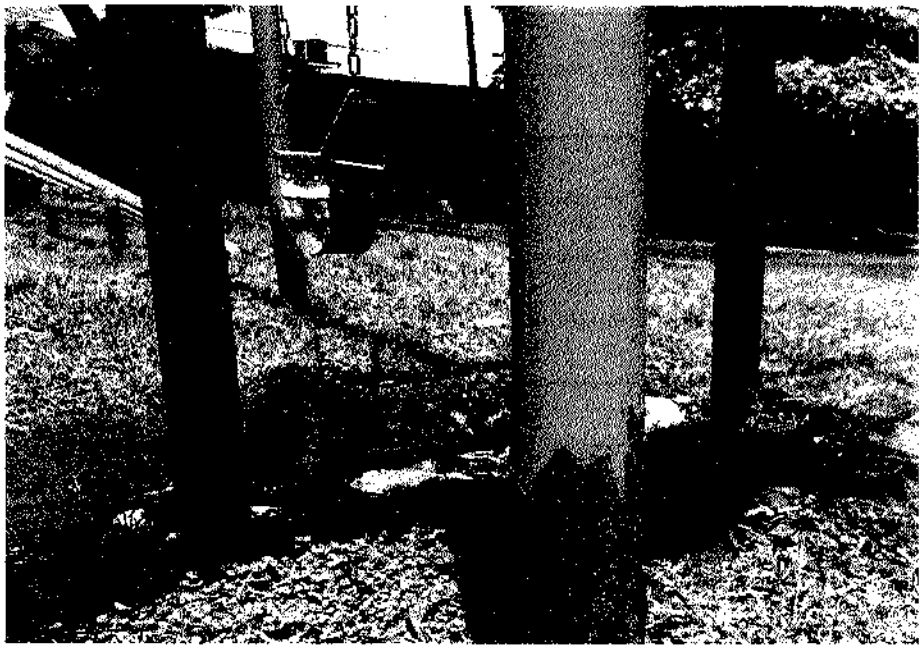


Fig. Registro de acumulación de agua en zona interna. Se evidencia el deterioro de elementos metálicos

En complemento al mejoramiento de parque infantil se propone el NP11 RELLENO EN GRAVA 1 1/2"<D<2" EP 15 CM (INC ALISTAMIENTO DE TERRENO HACIA DRENAJE) alistamiento de terreno hacia drenaje y relleno con grava de manera uniforme, evitando charcos en su superficie o invasión de maleza vegetal que invade actualmente estos espacios.

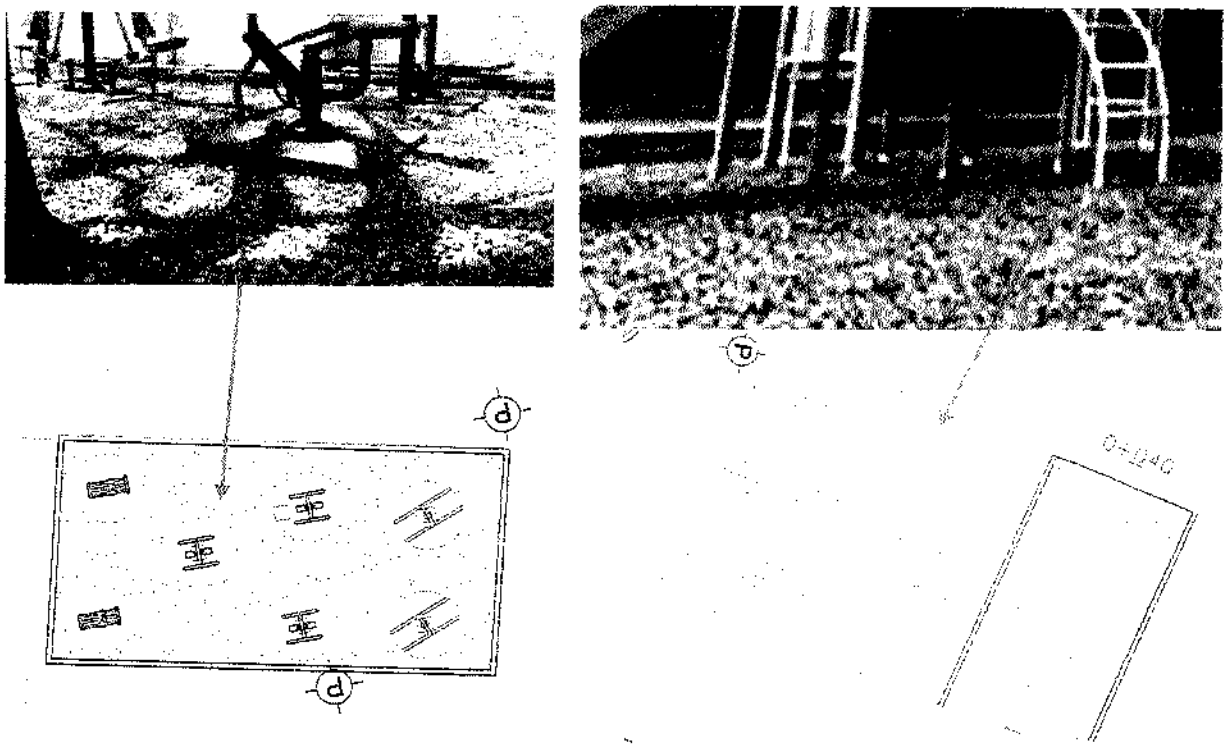


Fig. Proyección de los espacios con presencia de agua

En conjunto para el mantenimiento de biosaludables, se proponen bases circulares independientes en concreto mediante el ítem NP14 BASECIRCULAR PARA JUEGOS D:2.00 INC REFUERZO DOS DIRECIONES de esta manera los juegos quedan ubicados de manera independiente y libre de superficies lisas por acumulaciones de agua, además que al realizar el mantenimiento este se realiza de manera completa desde su parrilla de anclaje hasta el cuerpo de la máquina, por ello es necesaria la inclusión de la nueva "base circular"

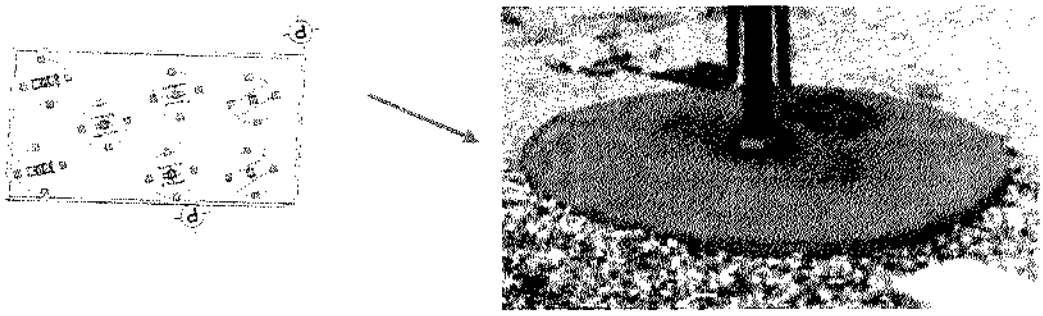
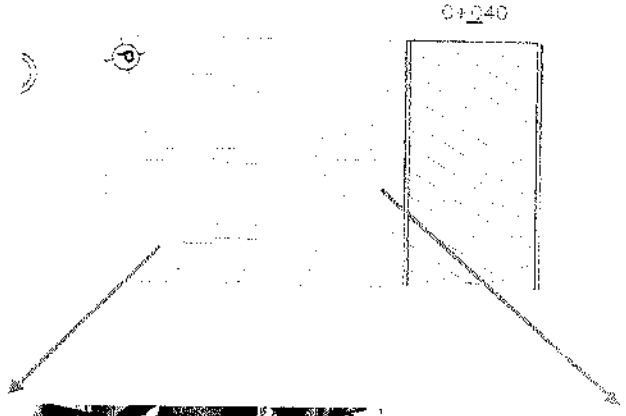


Fig. Proyección de bases circulares independientes

Se evidencia la necesidad de reorganizar el parque infantil y juego (ascensor o sube y baja) para un mejor aprovechamiento de espacios, para ello se incluye el item NP19 DESMONTE Y MONTAJE DE JUEGO DE NIÑOS EXISTENTE (INC. ADECUACION TUB MET, DADOS EN COCNRETO PARA CINENTACION, SOLDADURAS, ANTICORROSIVO Y PINTURAS) que así mismo se compone de un mantenimiento adecuación de tubería corroída y rota, incluye accesorios faltantes y acabados en pintura de estos juegos, mejorando considerablemente su condición y rehabilitando espacios .









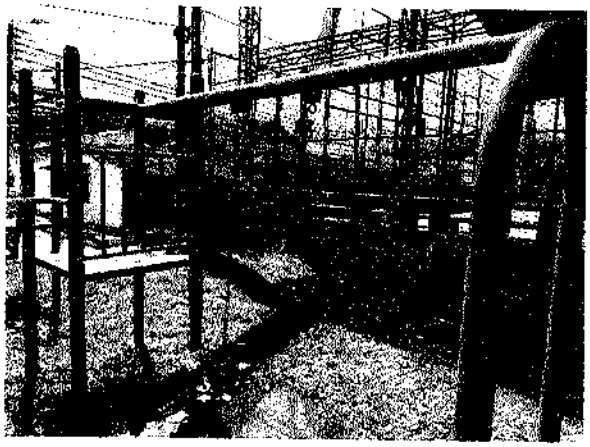




Fig. Estado de escalas urbanas deterioro en sus bases y pernos, tornillos oxidados



ANAILISIS DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES E INCLUSION DE ITEMS NUEVOS NO PREVISTOS GENERAL DE TODOS LOS PARQUES

Para ello se establece el siguiente cuadro con un análisis detallado ítem a ítem.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.
1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2	4653.53
Actividad que aumenta considerablemente ya que surge la necesidad de realizar la localización y replanteo en los 4 parques, cantidad que haciendo la sumatoria de las áreas a intervenir aumenta la respecto a la cantidad contractual.			
1.2	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	218.62
Actividad que aumenta luego de la respectiva validación y cuantificación mediante memorias de cálculo, de los espacios que serán demolidos para llevar a cabo su rehabilitación.			
1.3	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS,SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0.00
Actividad que se suprime toda vez que las demoliciones no serán realizadas mecánicamente sino de manera manual			
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	294.23
Actividad que disminuye toda vez que al realizar la respectiva verificación con planos topográficos de levantamiento existente, se valida las cantidades reales para excavación.			
3.1	RELLENO CON MATERIAL MIXTODERÍO SINPROCESAR TAMAÑO MAX.3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	279.07
Actividad que aumenta debido a la topografía propia de cada parque, toda vez que este material es usado para nivelación y replanteo base de las superficies en donde serán adecuados los corredores o andenes.			
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA NEGRA	M3	90.38
Actividad que aumenta en su cantidad toda vez que se proponen en los diseños arquitectónicos la rehabilitación de zonas verdes con carencia de material orgánico para siembra de prado o grama, y ampliaciones de zonas verdes para la unificación y mejoramiento de estas zonas blandas en cada uno de los parques.			
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA TRENZA	M2	1221.16
Actividad que al igual que el suministro e instalación de tierra negra, es aliada y actividad de complemento de esta, para el mejoramiento de las zonas blandas o verdes, aumenta debido a la unificación y ampliación de las zonas existentes en los parques objeto del contrato.			
4.1	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-8080X35X20CM. NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	366.37
Actividad que disminuye considerablemente, debido a que se cuantifica las cantidades de bordillo en piezas prefabricadas únicamente para la zona del perímetro de parque azotea, virrey y retiro en la calle 24 y carrera 24a, para parque macarena por las cotas en las que se encuentran sus andenes			

perimetrales se propone un muro de confinamiento ya que excede la altura de los bordillos prefabricados.			
4.2	MALLA ELECTROSOLDADA fy= 5000 kg/cm2,500 Mpa	KG	3012.79
Actividad que disminuye toda vez que las áreas de placa de concreto estampado se reducen, y esta actividad es el acero de refuerzo la anteriormente mencionada, por ello se reducen los kg inicialmente cuantificados			
4.3	PLACA CONTRAPISO e=10 cm (20.7 Mpa, 3000 psi) concreto estampado - color	M2	0.00
Actividad que es suprimida toda vez que no se especifica el tono colorante, y este dependiendo de su tono varía el rendimiento de la mano de obra de acuerdo al método de aplicación.			
5.1	LUMINARIA: MECANO V TEMPERTATURA DE COLOR: 4000 K POTENCIA: 33W CON BASE PARA FOTOCELDA IRC 70 ÓPTICA: R07	UND	0.00
Actividad suprimida luego del respectivo análisis de mercado en el que se ve necesario reemplazarlo por uno similar, toda vez que esta referencia indicada no es comercial.			
5.2	MÁSTIL METÁLICO GALVANIZADO DE 6M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	0.00
Actividad que en conjunto con luminaria se suprime y se cambia por una referencia de menor altura permitiendo así instalar este elemento en espacios con altura reducida, además que se tiene en cuenta que la iluminación es para los parques Azotea y Virrey, parques en los cuales perimetralmente en las vías colindantes cuentan con iluminación de alumbrado público, e internamente por las condiciones de los parques con árboles grandes y frondosos no es posible instalar mástiles de 6 metros de altura.			
5.3	ESTRUCTURA LA321	UND	2.00
Actividad que disminuye toda vez que se realizarán en los dos parques que tendrán intervención de iluminación como lo son el parque del barrio Azotea y Virrey.			
5.4	ESTRUCTURA CS400	UND	2.00
Actividad que disminuye toda vez que esta hace referencia a la estructura de derivación de aire a tierra, las cuales se realizarán en los dos parques que tendrán intervención de iluminación como lo son el parque del barrio Azotea y Virrey.			
5.5	ACOMETIDA PARCIAL 2 No6+1No.6 AL	ML	139.11
Actividad que disminuye debido a que se toma en cuenta las cantidades lineales del circuito para los parques Azotea y Virrey			
5.6	ACOMETIDA PARCIAL 2 No8+1No.8 CU THHN	ML	139.11
Actividad que disminuye debido a que se toma en cuenta las cantidades lineales del circuito para los parques Azotea y Virrey			
5.7	CANALIZACION PVC 2X1" PARA AP	ML	0.00
Actividad que se suprime toda vez que el CONSORSIO ALSIPA realizara la instalación de esta sin costo alguno para no superar el valor inicial contratado, aprovechando el valor de este ítem en los demás del capítulo instalaciones eléctricas.			
5.8	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	0.00

Actividad que se suprime debido a que presentaba un error de digitación en su unidad de medida la cual realmente es en unidad, por ende se suprime este ítem con error de unidad de medida y se incluye el NP 18			
5.9	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UND	14.00
Actividad que disminuye toda vez que esta comprende las cajas de control o inspección base de cada luminaria, se toman en cuenta las unidades necesarias para parque Azotea y Virrey los cuales se intervienen en su iluminación.			
6.1	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO ELIPTICA (ESQUÍ DE FONDO). SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00
Actividad que se mantienen sin cambios en la presente modificación			
6.2	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO SURF. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00
Actividad que se mantienen sin cambios en la presente modificación			
6.3	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO BARRAS PARALELAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00
Actividad que se mantienen sin cambios en la presente modificación			
6.4	MANTE Y REPA JUEGO BIOSALUDABLES EXIST	UN	13.00
Actividad que aumenta debido a que se realizó el respectivo conteo y validación de unidades de juegos bio saludables existentes arrojando una cantidad total de 13 para 6 unidades en el Retiro y 7 unidades en Macarena			
6.5	CANECA EN MALLA METÁLICA TIPO M120 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	UN	0.00
Actividad que se suprime toda vez que este mismo mobiliario es el mismo existente y se ha logrado evidenciar que su durabilidad o vida útil es muy corta por el material en el que está compuesto, deteriorándose su base y desprendiéndose, dejándolas inservibles.			
6.6	SUM E INST. COLUM SW. THREE, INCL. LOCALIZ Y EXC.	UN	0.00
Actividad que se suprime dado que la comunidad anuo esfuerzos para el suministro de juego con columpio incluido en parque azotea, de esta manera se suprime este ítem y se optimizan los recursos en otras actividades no previstas.			
6.7	PISO DUROPISO BLANCO 33,8X33,8 T. COMERCIAL	M2	0.00
Actividad que se suprime toda vez no es necesario la instalación de este elemento en ninguno de los parques.			
NP 1	DESMONTE DE MASTILES EXISTENTES (INC. DEMOLICION BASE Y CARGUE DE MATERIALES, Y SUSP RED CABLEADO EXIS)	UN	30.00
Actividad que se incluye en la presente modificación, debido a que no se tenia previsto en las actividades contractuales el desmonte de los mástiles de iluminación actual o anterior inhabilitada aun presente.			
NP 2	BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR TIPO M31. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	50.00
Actividad que se incluye debido a que en las visitas realizadas a campo en cada uno de los parques se apreció el deterioro de estas unidades, por lo anterior se optó por una silla económica y de aspecto más moderno, el cual con los mejoramientos propios del parque contribuye a la modernización de espacios.			
NP 3	DESMONTE DE BANCA incl retiro	UN	41.00



Actividad que se incluye toda vez que las bancas que son suministradas nuevas se debe hacer también el respectivo desmonte de las unidades existentes en los parques			
NP 4	DESMONTE DE CANECAS EXISTENTES (INC. DEMOLICION DE BASE EXISTENTE Y CARGUE DE MATERIALES)	UN	2.00
Actividad que se incluye debido a que no estaba previsto el desmonte del mobiliario existente, para ello se cuantifican 2 desmontes siendo ellos propios del parque AZOTEA			
NP 5	LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	M2	287.36
Esta actividad se incluye debido a que se evidencio pisos de senderos en estado aceptable, con presencia de suciedad y moho, el cual deteriora aún más el concreto, por esta razón y en vista de seguir conservando estos elementos, se incluye el lavado de estas áreas para hacer una entrega formal y adecuada de los espacios.			
NP 6	MURO CONFINAMIENTO ACABADO LISO 0.60>H>0.45 A=0.20 EN CONCRETO REF 3000 PSI	ML	73.00
Actividad incluida para realizar el confinamiento de áreas o terrazas de zonas verdes o andenes los cuales superan alturas de bordillos prefabricados o sardineles, en vista de la necesidad de confinar estos espacios se incluye este muro el cual incluye acero de refuerzo para brindar mayor durabilidad a la estructura de confinamiento.			
NP 7	CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR OCRE ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)	M2	1445.87
Actividad que se incluye en reemplazo del ítem 4.3 el cual se suprime, esta actividad hace referencia al concreto color ocre estampado para las distintas áreas para placa de senderos de andenes externos como internos, teniendo en cuenta los rendimientos de la mano obra por las actividades propias del estampado.			
NP 8	CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR AZUL ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)	UN	156.49
Actividad que al igual que el ítem NP7 se incluye en reemplazo del ítem 4.3, haciendo referencia a las áreas de detalles en color azul según los diseños arquitectónicos de las zonas duras correspondientes a andenes, en este varia su precio tomando en cuenta en que el insumo del color azul es mucho más costoso que cualquier otro tono colorante endurecedor.			
NP 9	CAJA EN CONCRETO REF CON REJILLA .60*.30 P=.30 (MARCO < 11/2" 3/16")	UN	3.00
Actividad la cual se incluye para recolectar las aguas y drenarlas de espacios como área de juegos bio saludables y glorieta central.			
NP 10	BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4" PVC	ML	15.47
Suministro necesario para la conexión del punto recolector de aguas (caja rejilla) a punto de entrega final por escorrentía.			
NP 11	RELLENO EN GRAVA 1 1/2"<D<2" EP 15 CM (INC ALISTAMIENTO DE TERRENO HACIA DRENAJE)	M2	354.14
Esta actividad se incluye toda vez que el diseño propuesto de los juegos bio saludables como de los juegos parques infantiles, llevan en su plataforma base gravilla la cual le da un buen aspecto			



	arquitectónico y evita corrosión por acumulación de humedad en material vegetal como se encuentran las unidades existentes.		
NP 12	LUMINARIA PARA PARQUE ENTRE 33-40 (W) 100000 H (SUMINISTRO E INSTALACION INC FOTOCELDA Y BRAZO)	UN	12.00
	Actividad que comprende luminaria que cumple con las caracteristicas de la contractual pero a un menor costo que se incluye en reemplazo del ítem 5.1, debido a que el costo de este nuevo ítem es más económico se optimizan los recursos para invertirlos en otras actividades no previstas.		
NP 13	POSTE 4 M METALCIO DIAM 3" CON CANSITILLAS Y ACABADO EN PINURA	UN	12.00
	Actividad que en conjunto con el NP 12 se incluye para el capítulo de instalaciones eléctricas, en reemplazo del ítem 5.2, debido a que en campo se evidencia que se presentan obstrucciones para los mástiles en su parte superior, para ello se propone la inclusión de poste de la referencia mencionada el cual al ser 2 metros mas corto, es apto para la correcta instalación de luminarias.		
NP 14	BASECIRCULAR PARA JUEGOS D:2.00 INC REFUERZO DOS DIRECIONES	UN	16.00
	Actividad que se incluye toda vez que no se tenía contemplada base circular o superficie de apoyo para los juegos tanto nuevos como de mantenimiento y reparación, comprende placa circular de 2 m de diámetro con acero de refuerzo.		
NP 15	SARDINEL 3000PSI B=0.2,b=0.15,H=0.40INC. EXC/RET	ML	1128.52
	Actividad que se incluye toda vez que es necesario realizar el respectivo confinamiento de las placas correspondientes a senderos o andenes circulares, toda vez que en las actividades contractuales no se tomaba en cuenta, solo hacia referencia a bordillo prefabricado el cual por sus dimensiones se utiliza en las zonas delimitantes perimetrales de los parques.		
NP 16	PLACA CONTRAPISO e = 12 cm (24.13Mpa, 3500psi)	M2	7.45
	Actividad que se incluye para dar continuidad de senderos, en placa de contrapiso normal sin estampado, dando continuidad a obra existente.		
NP 17	SUMINISTRO E INSTALACION CANECA M-121	UN	3.00
	Actividad que se incluye toda vez que se evidencia que las presentes del contrato son las mismas canecas existentes en los sitios donde se van a cambiar, pero resulta que la vida útil de las misma es muy baja debido a la base en acero pintado y la maya en acero pintado igual a las existentes que al cabo de tres años ya pierden un 40% de su calidad a intemperie según se pudo notar desde su instalación; por tanto se optó por las canecas en acero inoxidable que presenta mayor vida útil a intemperie		
NP 18	PUESTA A TIERRA MASTIL LUMINARIA	UN	6.00
	Actividad que se incluye en reemplazo del ítem 5.8 el cual presenta error en el contrato en cuanto a su unidad de medida establecida en metro lineal (ml) y no en unidad (un) como realmente es.		
NP 19	DESMONTE Y MONTAJE DE JUEGO DE NIÑOS EXISTENTE (INC. ADECUACION TUB MET, DADOS EN COCNRETO PARA CINENTACION, SOLDADURAS, ANTICORROSIVO Y PINTURAS)	UN	3.00
	Esta actividad se incluye toda vez que se evidencio que al igual que los juegos bio saludables, los juegos de niños existentes presentan un sumo deterioro en su bases y empotramientos, sumado a		

ello la falta de accesorios y elementos, mal estado de pintura y corrosión, este ítem permite la recuperación de estos espacios y zonas infantiles para el fortalecimiento y conexión familiar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS ÍTEMS NUEVOS NO PREVISTOS

ITEM	**NP 1**
ACTIVIDAD	DESMONTE DE MASTILES EXISTENTES (INC. DEMOLICION BASE Y CARGUE DE MATERIALES, Y SUSP RED CABLEADO EXIS).
UNIDAD DE MEDIDA	**UN**

1. Descripción

Consiste en los trabajos de cuadrillas de obra y eléctrica, acompañados de herramienta menor para proceder con el desmonte de los mástiles de las luminarias existentes y la desconexión eléctrica del mismo según las ubicaciones que se establezcan los planos del proyecto o lo indique la supervisión.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

No	PROCEDIMIENTO
1	Consultar Planos Arquitectónicos
2	Ubicación de los mástiles
3	Desmonte de mástiles
4	Disposición final de elementos

3. MATERIALES

No	MATERIALES

4. EQUIPOS

No	EQUIPOS

5. MANO DE OBRA

No	MANO DE OBRA
	HORA/Cuad. 2 Ayudantes - HORA/Cuad. ELECTR/1 Tecn elect+1 Ayu (M

6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagará por unidad de mástil (UN) desmontado a plena satisfacción del supervisor

ITEM	**NP 4**
ACTIVIDAD	DESMONTE DE CANECAS EXISTENTES (INC. DEMOLICION DE BASE EXISTENTE Y CARGUE DE MATERIALES)
UNIDAD DE MEDIDA	**UN**

1. Descripción

Consiste en los trabajos de cuadrillas de obra, acompañados de herramienta menor para proceder con el desmonte de las canecas existentes mismo según las ubicaciones que se establezcan los planos del proyecto o lo indique la supervisión.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

No	PROCEDIMIENTO
1	Consultar Planos Arquitectónicos
2	Ubicación de las canecas
3	Desmonte de canecas
4	Disposición final de elementos

3. MATERIALES

No	MATERIALES

4. EQUIPOS

No	EQUIPOS

5. MANO DE OBRA

No	MANO DE OBRA
	HORA/Cuad. 2 Ayudantes

6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagará por unidad de caneca (UN) desmontada a plena satisfacción del supervisor

ITEM	**NP 6**
ACTIVIDAD	MURO CONFINAMIENTO ACABADO LISO 0.60>H>0.45 A=0.20 EN CONCRETO REF 3000 PSI
UNIDAD DE MEDIDA	**ML**

1. Descripción

Consiste en los trabajos de cuadrillas de obra, acompañados de herramienta menor, equipos y materiales para la construcción mediante formaleta, concreto y aceros de un muro de espesor de 20 cm con altura variable, para contener materiales rellenos según se establezcan en los planos del proyecto o lo indique la supervisión.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

No	PROCEDIMIENTO
1	Consultar Planos Arquitectónicos
2	Replanteó del Muro
3	Excavaciones e instalación de formaleta y aceros

4	Fundición de concreto 3000 psi

3. MATERIALES

No	MATERIALES
	CONCRETO 3000 PSI (210N)
	ACERO FIGURADO NO.4 (1/2") F" Y=60000 PSI
	ALAMBRE NEGRO CAL. 18

4. EQUIPOS

No	EQUIPOS
	HERRAMIENTA MENOR %
	FORMALETA METALICA SEGUN DISEÑO

5. MANO DE OBRA

No	MANO DE OBRA
	HORA/Cuad. 2 Ayudantes

6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagará por metro lineal (ML) de muro terminado completamente y limpio de elementos utilizados en la elaboración del mismo y previamente recibido a satisfacción del supervisor	
ITEM	**NP 7**
ACTIVIDAD	CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR OCRE ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)
UNIDAD DE MEDIDA	**M2**

1. Descripción

Consiste en los trabajos de cuadrillas de obra, acompañados de herramienta menor, equipos y materiales para la construcción mediante concreto, malla electrosoldada, insumo de color, insumo de desmoldante en un espesor de 10 cm, según se establezcan en los planos del proyecto o lo indique la supervisión.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

No	PROCEDIMIENTO
1	Consultar Planos Arquitectónicos
2	Replanteó de la placa
3	Instalación de formaleta, malla electrosoldada y aplicación de concreto de 3000 psi
4	Aplicación de insumo de color, luego de 20 minutos de aplicación de desmoldante y finalmente el acabado con la plantilla tipo piedra.

3. MATERIALES

No	MATERIALES
	agua, arena lavada de rio, gravilla de rio 1/2", cemento gris, repisa 5 x.10x3 ordinario duro, listón 5*5 abarco flormorado
	puntilla con cabeza 2", tono colorante -ocre, desmoldante
	sellante

4. EQUIPOS

No	EQUIPOS



	herramienta menor %
	molde - mezcladora a gasolina

5. MANO DE OBRA

No	MANO DE OBRA
	HORA/Cuad. 2 Ayudantes

6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagará por metro cuadrado (M2) de placa terminada completamente y limpia de elementos utilizados en la elaboración del mismo y previamente recibido a satisfacción del supervisor	
ITEM	**NP 8**
ACTIVIDAD	CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR AZUL ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)
UNIDAD DE MEDIDA	**M2**

1. Descripción

Consiste en los trabajos de cuadrillas de obra, acompañados de herramienta menor, equipos y materiales para la construcción mediante concreto, malla electrosoldada, insumo de color, insumo de desmoldante en un espesor de 10 cm, según se establezcan en los planos del proyecto o lo indique la supervisión.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

No	PROCEDIMIENTO
1	Consultar Planos Arquitectónicos
2	Replanteó de la placa
3	Instalación de formaleta, malla electrosoldada y aplicación de concreto de 3000 psi
4	Aplicación de insumo de color, luego de 20 minutos de aplicación de desmoldante y finalmente el acabado con la plantilla tipo piedra.

3. MATERIALES

No	MATERIALES
	agua, arena lavada de rio, gravilla de rio 1/2", cemento gris, repisa 5 x.10x3 ordinario duro, listón 5*5 abarco flormorado
	puntilla con cabeza 2", tono colorante -azul, desmoldante
	sellante

4. EQUIPOS

No	EQUIPOS
	herramienta menor %
	molde - mezcladora a gasolina

5. MANO DE OBRA

No	MANO DE OBRA
	HORA/Cuad. 2 Ayudantes

6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagará por metro cuadrado (M2) de placa terminada completamente y limpia de elementos utilizados en la elaboración del mismo y previamente recibido a satisfacción del supervisor	
ITEM	**NP 9**
ACTIVIDAD	CAJA EN CONCRETO REF CON REJILLA .60*.30 P=.30 (MARCO < 11/2"



	3/16")
UNIDAD DE MEDIDA	**UN**

1. Descripción

Consiste en los trabajos de cuadrillas de obra, acompañados de herramienta menor, equipos y materiales para la construcción de la caja en concreto perforada con rejilla en ángulo y varilla para el drenaje de lechos en grava de los juegos biosaludables y juegos infantiles de niños según se establezcan en los planos del proyecto o lo indique la supervisión.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

No	PROCEDIMIENTO
1	Consultar Planos Arquitectónicos
2	Replanteó de la caja
3	Instalación de formaleta, aceros y aplicación de concreto de 3000 psi
4	Desmonte de formaleta e instalación de rejilla

3. MATERIALES

No	MATERIALES
	CONCRETO 3000 PSI (210N)
	ANGULO 1 1/2"X3/16", HIERRO A-37 CHIPA LISA 1/4", SOLDADURA ASW E6013 X 3/32
	ANTICORROSIVO TIPO PINTUCROM, ESMALTE SINT.TIPO PINTULUX PINTUCO

4. EQUIPOS

No	EQUIPOS
	herramienta menor %
	EQUIPO SOLDADURA ELECTRICA AC/DC 110/220

5. MANO DE OBRA

No	MANO DE OBRA
	HORA/Cuad. ALBA-IL/10f+2 Ayu (M) - HORA/Cuad. 1 Soldador + 1 ayudante

6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagará por unidad de caja (UN) con la rejilla de la caja terminada completamente y limpia de elementos utilizados en la elaboración del mismo y previamente recibido a satisfacción del supervisor

ITEM	**NP 11**
ACTIVIDAD	RELLENO EN GRAVA 1 1/2"<D<2" EP 15 CM (INC ALISTAMIENTO DE TERRENO HACIA DRENAJE)
UNIDAD DE MEDIDA	**M2**

1. Descripción

Consiste en los trabajos de cuadrillas de obra, acompañados de herramienta menor, equipos y materiales para el arreglo de la subrasante con pendiente hacia la caja de drenaje y luego la nivelación con gravilla en promedio 15 cm de espesor para el drenaje de los juegos biosaludables y juegos infantiles de niños según se establezcan en los planos del proyecto o lo indique la supervisión.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

No	PROCEDIMIENTO
1	Consultar Planos Arquitectónicos
2	Replanteó de la subrasante
3	Aplicación de gravilla

3. MATERIALES

No	MATERIALES
	GRAVA TRITURADA

4. EQUIPOS

No	EQUIPOS
	herramienta menor %

5. MANO DE OBRA

No	MANO DE OBRA
	HORA/Cuad. ALBA-IL/10f+2 Ayu (M) - HORA/Cuad. 1 Soldador + 1 ayudante

6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagará por metro cuadrado (M2) de grava plenamente terminada completamente y limpia de elementos utilizados en la elaboración del mismo y previamente recibido a satisfacción del supervisor

ITEM	**NP 12**
ACTIVIDAD	LUMINARIA PARA PARQUE ENTRE 36-60 (W) 100000 H (SUMINISTRO E INSTALACION INC FOTOCELDA Y BRAZO)
UNIDAD DE MEDIDA	**UN**

1. Descripción

Consiste en los trabajos de cuadrillas de obra y eléctricas, acompañados de herramienta menor, equipos y materiales para el suministro e instalación de las luminarias sobre los mástiles según se establezcan en los planos del proyecto o lo indique la supervisión.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

No	PROCEDIMIENTO
1	Consultar Planos Arquitectónicos
2	Ubicación de mástiles
3	Cableado e instalación de luminaria y fotocelda.

3. MATERIALES

No	MATERIALES
	BRAZO SOPORTE LUMIN TUBO GALV. 11/2"X1.2 M
	LUM LED 36-60 (W) 100000 H - FOTOCELDA PARA LUMINARIA GRIS
	CABLE COBRE AISL. NEUTRO CONCÉNTRICO 600V,2X14 AWG - CONCRETO 3000 PSI (210N)



4. EQUIPOS

No	EQUIPOS
	herramienta menor %

5. MANO DE OBRA

No	MANO DE OBRA
	HORA/Cuad. ALBA-IL/10f+2 Ayu (M) - HORA/Cuad. ELECTR/1 Tecn elect+2 Ayu (M

6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagará por unidad (UN) de luminaria con verificación de conexión y luz plenamente terminada y previamente recibido a satisfacción del supervisor

ITEM	**NP 13**
ACTIVIDAD	POSTE 4 M METALCIO DIAM 3" CON CANSITILLAS Y ACABADO EN PINURA
UNIDAD DE MEDIDA	**UN**

1. Descripción

Consiste en los trabajos de cuadrillas de obra y eléctricas, acompañados de herramienta menor, equipos y materiales para el suministro e instalación de los mástiles según se establezcan en los planos del proyecto o lo indique la supervisión.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

No	PROCEDIMIENTO
1	Consultar Planos Arquitectónicos
2	Ubicación de mástiles
3	Cableado e instalación de mástil

3. MATERIALES

No	MATERIALES
	MASTIL METALICO 4MX DIAM 3"
	CANASTA MET PARA ANCLAJE ST

4. EQUIPOS

No	EQUIPOS
	herramienta menor %

5. MANO DE OBRA

No	MANO DE OBRA
	HORA/Cuad. ELECTR/1 Tecn elect+2 Ayu (M

6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagará por unidad (UN) de mástil con verificación de verticalidad, plenamente terminado y previamente recibido a satisfacción del supervisor

ITEM	**NP 14**
ACTIVIDAD	BASECIRCULAR PARA JUEGOS D:2.00 INC REFUERZO DOS DIRECIONES
UNIDAD DE MEDIDA	**UN**

1. Descripción

Consiste en los trabajos de cuadrillas de obra, acompañados de herramienta menor, equipos y materiales para la construcción de las bases circulares de los juegos biosaludables y así evitar el deterioro rápido por agentes extenderos según se establezcan en los planos del proyecto o lo indique la supervisión.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

No	PROCEDIMIENTO
1	Consultar Planos Arquitectónicos
2	Ubicación de juegos
3	Replanteo, instalación de formaleta e instalación de aceros
4	Concreto de 3000 psi

3. MATERIALES

No	MATERIALES
	DESMOLDANTE SEPAROL SIKA Y/O ENCOFROIL MET
	CONCRETO (13,8 MPA, 2000 PS) - CONCRETO 24,13MPA,(3500 PSI)
	ACERO FIGURADO 1/4" A 1" F" Y=60000 PSI – alambre negro

4. EQUIPOS

No	EQUIPOS
	herramienta menor %
	FORMALETA METALICA SEGUN DISEÑO

5. MANO DE OBRA

No	MANO DE OBRA
	HORA/Cuad. 1 Of+3 Ayu (M)

6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagará por unidad (UN) de placa plenamente terminada y previamente recibido a satisfacción del supervisor

ITEM	**NP 19**
ACTIVIDAD	DESMONTE Y MONTAJE DE JUEGO DE NIÑOS EXISTENTE (INC. ADECUACION TUB MET, DADOS EN COCNRETO PARA CINENTACION, SOLDADURAS, ANTICORROSIVO Y PINTURAS
UNIDAD DE MEDIDA	**UN**

1. Descripción

Consiste en los trabajos de cuadrillas de obra y soldadores, acompañados de herramienta menor, equipos y materiales para el mantenimiento de los juegos intervenidos, con plena recuperación y mejoramientos según se establezcan en los planos del proyecto o lo indique la supervisión.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

No	PROCEDIMIENTO
1	Consultar Planos Arquitectónicos
2	Ubicación de juegos
3	Desmontes y arreglos
4	Instalación

3. MATERIALES

No	MATERIALES
	CONCRETO 3000 PSI (210N), TUBO GALVANIZADO IMC 4", TUBO GALVANIZADO 2"
	ANTICORROSIVO ROJO TIPO PINTUCO, DISCO ABRACOL PULIR CUCHILLA 6, ESMALTE SINT.TIPO PINTULUX PINTUCO
	LIJA DE AGUA PROFNAL *31*5 GRANO 120-150-180, SOLDADURA ASW E6013 X 3/32

4. EQUIPOS

No	EQUIPOS
	herramienta menor %
	EQUIPO OXICORTE, PULIDORA MANUAL CON DISCO (ALQUILER), VOLQUETA (VIAJE 5M3 Max.10 KM)

5. MANO DE OBRA

No	MANO DE OBRA
	HORA/Cuad 1 Of+2 Ayu (M) - Cuadrilla HH metalicas (Oficial 1ª + Ayudante+Soldador)

6. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagará por unidad (UN) de juego intervenido e instalado nuevamente en sitio y previamente recibido a satisfacción del supervisor



DE ACUERDO A LO ANTERIOR SE PRESENTAN LAS CONDICIONES ACTUALIZADAS CONFORME A LA PRESENTE MODIFICACION

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN PRESENTE ACTA DE MODIFICACION N° 001					
N°	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**V.UNITARIO**	**V.TOTAL**
1					
1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2	4,653.53	3,648.90	$ 16,980,269.17
1.2	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	218.62	306,546.56	$ 67,017,210.02
1.3	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS,SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	-	322,680.15	$ 0.00
2					
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	294.23	72,258.02	$ 21,260,164.47
3					
3.1	RELLENO CON MATERIAL MIXTODERÍO SINPROCESAR TAMAÑO MAX.3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	279.07	54,303.05	$ 15,154,348.67
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA NEGRA	M3	90.38	163,865.65	$ 14,810,177.34



3.3	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA TRENZA	M2	1,221.16	18,967.94	$ 23,162,888.31
4					
4.1	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-8080X35X20CM. NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	366.37	80,637.40	$ 29,543,125.92
4.2	MALLA ELECTROSOLDADA fy= 5000 kg/cm2,500 Mpa	KG	3,012.79	8,441.98	$ 25,433,927.18
4.3	PLACA CONTRAPISO e=10 cm (20.7 Mpa, 3000 psi) concreto estampado - color	M2	-	126,035.11	$ 0.00
5					
5.1	LUMINARIA: MECANO V TEMPERTATURA DE COLOR: 4000 K POTENCIA: 33W CON BASE PARA FOTOCELDA IRC 70 ÓPTICA: R07	UND	-	1,924,034.92	$ 0.00
5.2	MÁSTIL METÁLICO GALVANIZADO DE 6M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	-	1,226,042.61	$ 0.00
5.3	ESTRUCTURA LA321	UND	2.00	618,429.34	$ 1,236,858.69
5.4	ESTRUCTURA CS400	UND	2.00	740,300.03	$ 1,480,600.05
5.5	ACOMETIDA PARCIAL 2 No6+1No.6 AL	ML	139.11	42,392.00	$ 5,897,151.12
5.6	ACOMETIDA PARCIAL 2 No8+1No.8 CU THHN	ML	139.11	34,394.00	$ 4,784,549.34
5.7	CANALIZACION PVC 2X1" PARA AP	ML	-	34,123.70	$ 0.00
5.8	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	-	413,401.92	$ 0.00
5.9	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UND	14.00	520,301.06	$ 7,284,214.85



6					
6.1	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO ELIPTICA (ESQUÍ DE FONDO). SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	4,716,925.95	$ 4,716,925.95
6.2	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO SURF. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	4,095,050.38	$ 4,095,050.38
6.3	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO BARRAS PARALELAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	3,281,948.09	$ 3,281,948.09
6.4	MANTE Y REPA JUEGO BIOSALUDABLES EXIST	UN	13.00	656,186.26	$ 8,530,421.37
6.5	CANECA EN MALLA METÁLICA TIPO M120 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	UN	-	487,452.67	$ 0.00
6.6	SUM E INST. COLUM SW. THREE, INCL. LOCALIZ Y EXC.	UN	-	2,659,673.28	$ 0.00
6.7	PISO DUROPISO BLANCO 33,8X33,8 T. COMERCIAL	M2	-	53,161.07	$ 0.00
NP	**ÍTEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA**				
NP 1	DESMONTE DE MASTILES EXISTENTES (INC. DEMOLICION BASE Y CARGUE DE MATERIALES, Y SUSP RED CABLEADO EXIS)		30.00	100,790.00	$ 3,023,700.00
NP 2	BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR TIPO M31. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.		50.00	571,790.75	$ 28,589,537.50
NP 3	DESMONTE DE BANCA incl retiro		41.00	42,189.00	$ 1,729,749.00
NP 4	DESMONTE DE CANECAS EXISTENTES		2.00	41,751.00	$ 83,502.00



	(INC. DEMOLICION DE BASE EXISTENTE Y CARGUE DE MATERIALES)				
NP 5	LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET		287.36	5,276.00	$ 1,516,111.36
NP 6	MURO CONFINAMIENTO ACABADO LISO 0.60>H>0.45 A=0.20 EN CONCRETO REF 3000 PSI		73.00	348,664.00	$ 25,452,472.00
NP 7	CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR OCRE ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)		1,445.87	137,629.00	$ 198,993,642.23
NP 8	CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR AZUL ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)		156.49	187,558.00	$ 29,350,951.42
NP 9	CAJA EN CONCRETO REF CON REJILLA .60*.30 P=.30 (MARCO < 11/2" 3/16")		3.00	369,023.00	$ 1,107,069.00
NP 10	BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4" PVC		15.47	32,021.00	$ 495,364.87
NP 11	RELLENO EN GRAVA 1 1/2"<D<2" EP 15 CM (INC ALISTAMIENTO DE TERRENO HACIA DRENAJE)		354.14	43,783.00	$ 15,505,311.62



NP 12	LUMINARIA PARA PARQUE ENTRE 33-40 (W) 100000 H (SUMINISTRO E INSTALACION INC FOTOCELDA Y BRAZO)		12.00	1,452,795.00	$ 17,433,540.00
NP 13	POSTE 4 M METALCIO DIAM 3" CON CANSITILLAS Y ACABADO EN PINURA		12.00	1,072,121.00	$ 12,865,452.00
NP 14	BASECIRCULAR PARA JUEGOS D:2.00 INC REFUERZO DOS DIRECIONES		16.00	853,460.00	$ 13,655,360.00
NP 15	SARDINEL 3000PSI B=0.2,b=0.15,H=0.40INC. EXC/RET		1,128.52	50,757.00	$ 57,280,289.64
NP 16	PLACA CONTRAPISO e = 12 cm (24.13Mpa, 3500psi)		7.45	95,185.00	$ 709,128.25
NP 17	SUMINISTRO E INSTALACION CANECA M-121		3.00	1,947,961.00	$ 5,843,883.00
NP 18	PUESTA A TIERRA MASTIL LUMINARIA		6.00	380,570.00	$ 2,283,420.00
NP 19	DESMONTE Y MONTAJE DE JUEGO DE NIÑOS EXISTENTE (INC. ADECUACION TUB MET, DADOS EN COCNRETO PARA CINENTACION, SOLDADURAS, ANTICORROSIVO Y PINTURAS)		3.00	3,809,022.00	$ 11,427,066.00
COSTO DIRECTO OBRAS INICIALES (A)					$ 682,015,380.81
ADMINISTRACION				35.00%	$ 238,705,383.28
IMPREVISTOS				1.00%	$ 6,820,153.81
UTILIDAD				4.00%	$ 27,280,615.23
TOTAL AIU (B)				40.00%	$ 272,806,152.32
COMPONENTE AMBIENTAL (C)				0.50%	$ 3,400,390.60
COMPONENTE SOCIAL (D)				0.50%	$ 3,400,390.60
COMPONENTE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (E)				0.50%	$ 3,400,390.60
COMPONENTE CERTIFICACIÓN ELECTRICA (F)					
VALOR PROPUESTA ECONÓMICA (CON LA CUAL SE EVALUARÁN LAS PROPUESTAS DE ACUERDO CON					$ 965,022,705.00



LAS FÓRMULAS DEL NUMERAL 4.1.4 DEL DOCUMENTO BASE O PLIEGO TIPO): (G = A + B + C + D + E + F)		
PROVISION OBRAS COMPLEMENTARIAS O ADICIONALES (INCLUYE SU PROPIO COSTO DIRECTO Y SU AIU DE OBRAS PROPUESTO, UNICAMENTE) (H)		
COSTO DEL CONTRATO A EJECUTAR PROPUESTO: (I = G + H)		$ 965,022,704.93

CUADRO RESUMEN DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 965,030,477.00
VALOR MAYORES CANTIDADES	$ 720,871,544.00
VALOR MENORES CANTIDADES	$ 720,879,316.00
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	**$ 965,022,705.00**
DIFERENCIA A FAVOR DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	$ 7,772.00

PROGRAMACION DE FINAL DE OBRA

De acuerdo a los análisis realizados y las actividades con sus cantidades propuestas en la presente modificación se anexa un cuadro al presente informe en el cual se detalla el cronograma de obra, en el cual se expresa la programación de obra semana a semana para la ejecución de las actividades faltantes.

CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES

El alcance de estos análisis estuvo desde la implantación de los diseños arquitectónicos ajustados en los diferentes parques (AZOEA, VIRREY, RETIRO, MACARENA).

Se analizaron todos los ítems contractuales mediante, verificación que logro evidenciar la necesidad de reemplazo de ítems por otros debido a características, facilidad comercial de ellos, costos para aprovechamiento de recursos, así como también por errores en su cuantificación de medida.

La supervisión es conocedora del trabajo que ha venido realizando CONSORCIO ALSIPA toda vez que se han venido realizando entregas de pre-actas de proyección para su respectiva validación u observaciones al respecto de la información presentada.

La información aquí presentada es el resultado de la verificación de las cantidades con memorias de cálculo, las cuales presentaron su respectiva variación de mayor o menor cantidad, una vez ajustados los diseños arquitectónicos e implantados.

Para las nuevas actividades propuestas o ítems nuevos no previstos se crean sus respectivos APUs tomando como base de insumos materiales equipos y demás, el listado de insumos de referencia de la secretaria de infraestructura municipal – listado de insumos 2021 – anexo 1, resolución 1010-67,27-193 del 3 de agosto de 2021, Apu de agencia de infraestructura del meta 1010-GPY-FR-002-V04 del 11 de abril de 2023, así como también del Proceso gestión a la contratación y sus Análisis de precios unitarios según resolución 1010-67.27/193 actualizados el día 3 de agosto de 2021, así mismo se presentan suministros o materiales que son objeto de cotización, razón por la cual se realiza y se entrega al finalizar los APU el respectivo estudio de mercado, las cotizaciones y documentación en general de la empresa.

Se adjuntan al presente informe planos de levantamiento topográfico existente por cada parque y planos de diseño arquitectónico ajustados a las áreas a intervenir, para lo cual en la memoria de cálculo de localización y replanteo de obra arquitectónica obedece a la cantidad de área indicada en los planos arquitectónicos, toda vez que esta es menor al área neta del parque teniendo en cuenta que se realizan descuentos como polideportivos, salones comunales y demás que están internamente y que no se intervienen.

Bajo este orden de ideas, la supervisión será la encargada de realizar la revisión, de esta documentación y su posterior presentación ante la oficina de contratación del Municipio de Villavicencio y las demás partes, con el fin de que se tomen las decisiones más objetivas para poder llevar a cabo el desarrollo de este proyecto.

Sin otro particular y para su revisión y trámite correspondiente.

Cordialmente se firma el dia 26 de marzo de 2025;

JOHN DANI NAGLES PACHON
R/L CONSORCIO ALSIPA


FICHA TÉCNICA O CERTIFICADOS DE CALIDAD NUEVOS ELEMENTOS


CR 24 A 8 125 CONJ CERRADO LA CABAÑA CA 1 IN 9. VILLAVICECNIO-META
SHARKYING10@GMAIL.COM-3222169909

LED Syl-Street

LED SYL-STREET 36-60W NW 7P

P25901

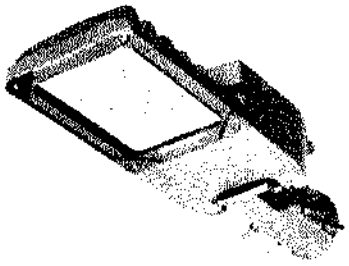

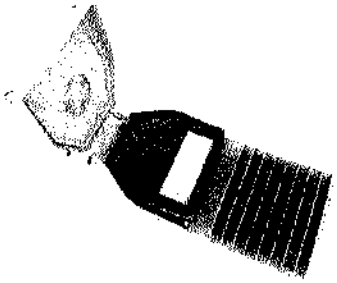

Luminaria LED para iluminación vial y exterior, con diseño moderno y robusto de un cuerpo en aluminio inyectado y compartimento independientes para el conjunto óptico y eléctrico. Montaje en tubo de soporte para poste horizontal o en punta. Proyección uniforme de la luz , reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

Diseño moderno con fuente LED SMD y lentes en policarbonato.

Chasis robusto en aluminio inyectado, liviano con disipador de calor integrado.

Compartimentos para el conjunto eléctrico y óptico.

Vidrio plano de protección.

Driver atenuable 0-10VDC y programable.

Base para fotocelda 7 pines compatible con sistemas para tele gestión.

Soporte con ángulo ajustable para fácil instalación.

APLICACIONES

Alumbrado público en calles, avenidas y autopistas.

Iluminación general en exteriores.

Parques, plazoletas y parqueaderos.

>22 años de vida (Uso 12 horas al día)

Tecnología Amigable con el medio ambiente

Ultra Resistente

ENCENDIDO INSTANTANEO


CE

RoHS

DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	4000K
Flujo luminoso nominal máximo	9000lm
Atenuable	SI
Tipo de distribución	Tipo II M
Vida útil estimada	100000h L70 *
Eficacia	150lm/W
Reproducción de color (IRC)	>70
Consistencia de color	SDCM ≤ 5
Tipo chip LED	TYF 5050
Número de chip LED	36 pzs
Corriente Máxima de entrada Módulo	1160mA
Tipo de Lente	PMMA
Transmitancia Lente	0.92
Lentes con distribución única	SI
Difusor	Vidrio plano de alta transmitancia
Ángulo de inclinación	0° a 20°

DISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA

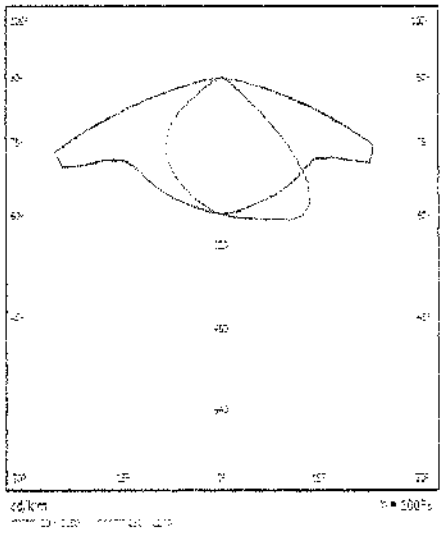

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

Acometida 3x14AWG con prensa estopa para asegurar hermeticidad.

Soporte para instalación en brazo horizontal o punta de poste.

Sistema de apertura fácil. No requiere herramienta especializada.

Conductores tipo cable con conectores en todas las conexiones.

CONFIGURACIÓN DE CORRIENTE DE OPERACIÓN


Corriente Módulo	Flujo Luminoso	Potencia
1160mA	9000lm	60 W
994mA	7712 lm	51 W
829mA	6432 lm	43 W
690mA	5353 lm	36 W

LED Syl-Street


LED SYL-STREET 36-60W NW 7P

P25901

DISTRIBUCIÓN ESPECTRAL

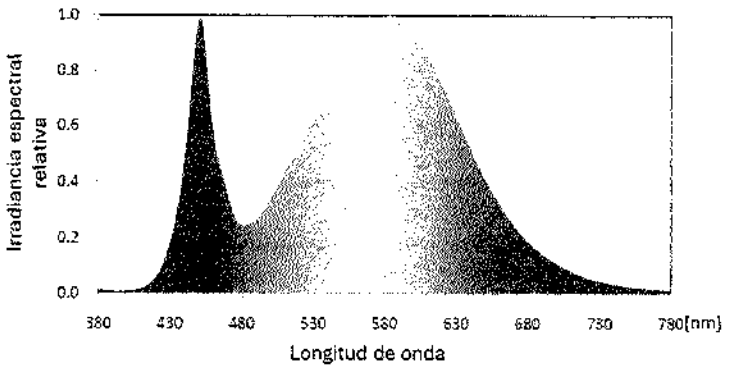


MANTENIMIENTO DE FLUJO LUMINOSO

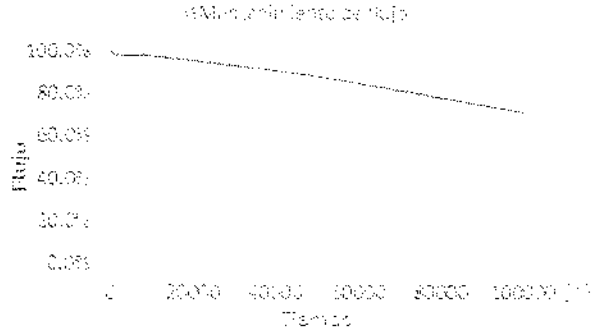

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada max.	60 W
Tensión de entrada	100-277 V 50/60 Hz
Corriente de entrada máx	0.3A @220V
Factor de potencia	0.9
Distorsión armónica (THD)	<20%
Tipo de driver	Corriente Constante
Atenuable	Señal 0-10V
Eficiencia driver	>90%
Protección integrada driver	10KV línea-tierra
Tensión de salida DC	28-52 VDC
Corriente de salida DC	670-1340 mA
Protecciones Corto Circuito / Temperatura	SI
Clase aislamiento	Clase I (Opc. Clase II)
Protección Transitorios externo	DPS 10KV
Base fotocelda	NEMA 7 pin

DIAGRAMA DE CONEXIÓN




La señal de control para la atenuación debe cumplir con el estándar IEC 60929 Anexo E, que define el driver o balasto como fuente de corriente.

Driver ensamblado en bandeja porta equipo anclada sobre la estructura interna de la luminaria, de fácil mantenimiento.
El Driver LED incluye la protección de sobrecarga interna.
La protección de sobre corriente del Driver desconecta la carga ante un corto circuito y reconecta automáticamente.

DATOS FÍSICOS

Acabado	Gris RAL7004
Proteccion IP conjunto óptico / eléctrico	IP66 / IP66
Protección IK conjunto óptico	IK09
Protección IK conjunto eléctrico	IK09
Dimensiones (LxWxH)	509x182x92 mm
Chasis	Aluminio inyectado
Tipo de montaje	Brazo horizontal
Diametro máx. brazo	42-60 mm
Peso	3.5 kg
Temperatura de operación Ta	-40° C ~ +55° C
EAN-13	770204825901
EAN-14	1770204825901

ESQUEMA PRODUCTO

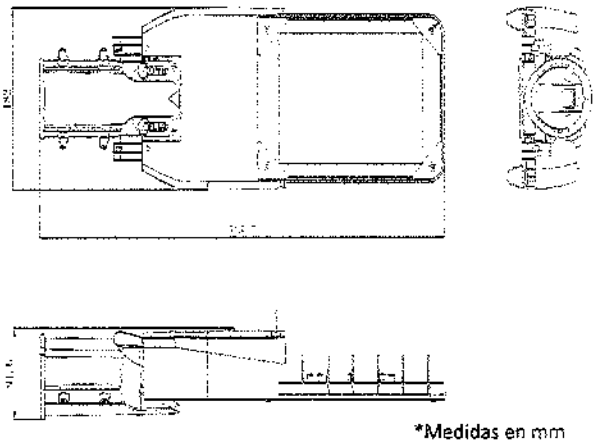

*Medidas en mm

Pisos y Paredes

CERTIFICADO DE CALIDAD CASACRETO COLOR ENDURECEDOR

CASACRETO SAS Certifica que el producto CASACRETO COLOR ENDURECEDOR fue hecho cumpliendo todos los procesos y normas establecidas. Controlado y supervisado bajo los estándares y requerimientos de nuestra empresa.

A continuación, mostramos los valores obtenidos para los lotes: 9246

Fecha de fabricación del producto: 15/03/2025

CASACRETO COLOR ENDURECEDOR:

TONALIDADES	AZUL
ASPECTO	Granulado fino con un porcentaje de gruesos.
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	R.24h= Min 180 KM/Cm2
GRANULOMETRIA	M16 = 10% ± 6% M20 = 40% ± 8% M30 = 8% ± 4% M40 = 12% ± 6% M50 = Max ± 10% M100 = Max ± 10% Fondo = Max ± 10%

Fraguado inicial. 65 min – Fraguado final máx.320 min

Diego Fernando Rubio B.
Jefe de Control de Calidad

CERTIFICADO DE CALIDAD CASACRETO DESMOLDANTE EN POLVO

CASACRETO SAS Certifica que el producto CASACRETO DESMOLDANTE EN POLVO fue hecho cumpliendo todos los procesos y normas establecidas. Controlado y supervisado bajo los estándares y requerimientos de nuestra empresa.
A continuación, mostramos los valores obtenidos para los lotes 9261

Fecha de fabricación del producto: 15/03/2025

CASACRETO DESMOLDANTE EN POLVO:

TONALIDAD	NEUTRO
ASPECTO	Polvo Higroscópico (capacidad de absorber humedad del medio circundante) de color establecido.
DENSIDAD APARENTE	1.4 – 1.5 g/cm3
TOXICIDAD	Atóxico (inherente)
GRANULOMETRIA	M200 = Max 70% M400 = Max 20% Fondo = Max 10%

Presentación: Bolsa plástica de alta resistencia de 10 KG respectivamente.

Diego Fernando Rubio B.
Jefe de Control de Calidad

CERTIFICADO DE CALIDAD CASACRETO MOLDES

CASACRETO SAS Certifica que el producto CASACRETO MOLDES fue hecho cumpliendo todos los procesos y normas establecidas. Controlado y supervisado bajo los estándares y requerimientos de nuestra empresa.

A continuación, mostramos los valores obtenidos para el lote: 957885

Fecha de fabricación del producto: 14/01/2025

CASACRETO COLOR ENDURECEDOR:

MOLDE	REF. EP-2010 PIEDRA LISA
COMPOSICIÓN	Poliuretano
RANGO TEMPERATURA DE TRABAJO	(-30°C a 121°C).
MOLDE SEMI-RIGIDO	Flexibilidad por encima de los 121°C

Cada pieza es revisada individualmente con un Durómetro Análogo tipo A con una precisión de +/-1 grado que rebasa la norma ASTM D2240 para pruebas de dureza.



Diego Fernando Rubio B.
Jefe de Control de Calidad

CERTIFICADO DE CALIDAD CASACRETO COLOR ENDURECEDOR

CASACRETO SAS Certifica que el producto CASACRETO COLOR ENDURECEDOR fue hecho cumpliendo todos los procesos y normas establecidas. Controlado y supervisado bajo los estándares y requerimientos de nuestra empresa.

A continuación, mostramos los valores obtenidos para los lotes: 9177

Fecha de fabricación del producto: 16/01/2025

CASACRETO COLOR ENDURECEDOR:

TONALIDADES	OCRE
ASPECTO	Granulado fino con un porcentaje de gruesos.
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	R.24h= Min 180 KM/Cm2
GRANULOMETRIA	M16 = 10% ± 6% M20 = 40% ± 8% M30 = 8% ± 4% M40 = 12% ± 6% M50 = Max ± 10% M100 = Max ± 10% Fondo = Max ± 10%

Fraguado inicial. 65 min – Fraguado final máx.320 min

Diego Fernando Rubio B.
Jefe de Control de Calidad

CERTIFICADO DE CALIDAD CASACRETO DESMOLDANTE EN POLVO

CASACRETO SAS Certifica que el producto CASACRETO DESMOLDANTE EN POLVO fue hecho cumpliendo todos los procesos y normas establecidas. Controlado y supervisado bajo los estándares y requerimientos de nuestra empresa.
A continuación, mostramos los valores obtenidos para los lotes 9180

Fecha de fabricación del producto: 16/01/2025

CASACRETO DESMOLDANTE EN POLVO:

TONALIDAD	OCRE
ASPECTO	Polvo Higroscópico (capacidad de absorber humedad del medio circundante) de color establecido.
DENSIDAD APARENTE	1.4 – 1.5 g/cm3
TOXICIDAD	Atóxico (inherente)
GRANULOMETRIA	M200 = Max 70% M400 = Max 20% Fondo = Max 10%

Presentación: Bolsa plástica de alta resistencia de 10 KG respectivamente.

Diego Fernando Rubio B.
Jefe de Control de Calidad

Pisos y Paredes

CERTIFICADO DE CALIDAD CASACRETO DESMOLDANTE EN POLVO

CASACRETO SAS Certifica que el producto CASACRETO DESMOLDANTE EN POLVO fue hecho cumpliendo todos los procesos y normas establecidas. Controlado y supervisado bajo los estándares y requerimientos de nuestra empresa.
A continuación, mostramos los valores obtenidos para los lotes 9171

Fecha de fabricación del producto: 16/01/2025

CASACRETO DESMOLDANTE EN POLVO:

TONALIDAD	NEUTRO
ASPECTO	Polvo Higroscópico (capacidad de absorber humedad del medio circundante) de color establecido.
DENSIDAD APARENTE	1.4 – 1.5 g/cm3
TOXICIDAD	Atóxico (inherente)
GRANULOMETRIA	M200 = Max 70% M400 = Max 20% Fondo = Max 10%

Presentación: Bolsa plástica de alta resistencia de 10 KG respectivamente.

Diego Fernando Rubio B.
Jefe de Control de Calidad

CERTIFICADO DE CALIDAD CASACRETO COLOR ENDURECEDOR

CASACRETO SAS Certifica que el producto **CASACRETO COLOR ENDURECEDOR** fue hecho cumpliendo todos los procesos y normas establecidas. Controlado y supervisado bajo los estándares y requerimientos de nuestra empresa.

A continuación, mostramos los valores obtenidos para los lotes: 9178

Fecha de fabricación del producto: 16/01/2025

CASACRETO COLOR ENDURECEDOR:

TONALIDADES	AZUL
ASPECTO	Granulado fino con un porcentaje de gruesos.
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	R.24h= Min 180 KM/Cm2
GRANULOMETRIA	M16 = 10% ± 6% M20 = 40% ± 8% M30 = 8% ± 4% M40 = 12% ± 6% M50 = Max ± 10% M100 = Max ± 10% Fondo = Max ± 10%

Fraguado inicial. 65 min – Fraguado final máx.320 min

Diego Fernando Rubio B.
Jefe de Control de Calidad

CERTIFICADO DE CALIDAD CASACRETO COLOR ENDURECEDOR

CASACRETO SAS Certifica que el producto CASACRETO COLOR ENDURECEDOR fue hecho cumpliendo todos los procesos y normas establecidas. Controlado y supervisado bajo los estándares y requerimientos de nuestra empresa.

A continuación, mostramos los valores obtenidos para los lotes: 9220

Fecha de fabricación del producto: 15/03/2025

CASACRETO COLOR ENDURECEDOR:

TONALIDADES	OCRE
ASPECTO	Granulado fino con un porcentaje de gruesos.
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	R.24h= Min 180 KM/Cm2
GRANULOMETRIA	M16 = 10% ± 6% M20 = 40% ± 8% M30 = 8% ± 4% M40 = 12% ± 6% M50 = Max ± 10% M100 = Max ± 10% Fondo = Max ± 10%

Fraguado inicial. 65 min – Fraguado final máx.320 min

Diego Fernando Rubio B.
Jefe de Control de Calidad

CERTIFICADO DE CALIDAD CASACRETO SELLADOR ACRILICO

CASACRETO SAS Certifica que el producto CASACRETO SELLADOR ACRILICO fue hecho cumpliendo todos los procesos y normas establecidas. Controlado y supervisado bajo los estándares y requerimientos de nuestra empresa.
A continuación, mostramos los valores obtenidos para los lotes: 78030

Fecha de Fabricación del producto: 16/01/2025

CASA SELLADOR ACRÍLICO

TONO	**TRANSPARENTE**
ACABADO	**BRILLANTE**
APARIENCIA	**LIQUIDO A TEMPERATURA AMBIENTE**
PUNTO DE INFLAMACION	**25°**
DENSIDAD	**0,86000 – 0,8800 gr/m**
OLOR	**CARACTERISTICO A SOLVENTE**
DENSIDAD	**0.90 - .95 Kg/ L**
VDC CALCULADO	**804,5 g/l**

CONTROLES DE EXPOSICION:

BASE	VALOR	LIMITES	OBSERVACIONES
ECTLV	**Límite Máximo permisible de exposición promedio ponderado:** **Limite permisible.**	**50ppm** **221 mg/m3** **100 ppm** **442 mg/m3**	
VLA	**Temporal:** **Clasificación a riesgo de la piel.** **Valor limite ambiental:** **Exposición corta:** **Duración (VLA-EC)** **Valor limite ambiental:** **Exposición diaria:** **Duración (VLA-EC)**	 **100 ppm** **442 mg/m3** **50 ppm** **221 mg/m3**	**Absorción a través de la piel.**

Diego Fernando Rubio B.
Jefe de Control de Calidad

CERTIFICADO DE CALIDAD CASACRETO SELLADOR ACRILICO

CASACRETO SAS Certifica que el producto CASACRETO SELLADOR ACRILICO fue hecho cumpliendo todos los procesos y normas establecidas. Controlado y supervisado bajo los estándares y requerimientos de nuestra empresa.
A continuación, mostramos los valores obtenidos para los lotes: 78738

Fecha de Fabricación del producto: 15/03/2025

CASA SELLADOR ACRÍLICO

TONO	**TRANSPARENTE**
ACABADO	**BRILLANTE**
APARIENCIA	**LIQUIDO A TEMPERATURA AMBIENTE**
PUNTO DE INFLAMACION	25°
DENSIDAD	0,86000 – 0,8800 gr/m
OLOR	**CARACTERISTICO A SOLVENTE**
DENSIDAD	0.90 - .95 Kg/ L
VDC CALCULADO	804,5 g/l

CONTROLES DE EXPOSICION:

BASE	VALOR	LIMITES	OBSERVACIONES
ECTLV	**Límite Máximo permisible de exposición promedio ponderado:** **Limite permisible.**	**50ppm** **221 mg/m3** **100 ppm** **442 mg/m3**	
VLA	**Temporal:** **Clasificación a riesgo de la piel.** **Valor limite ambiental:** **Exposición corta:** **Duración (VLA-EC)** **Valor limite ambiental:** **Exposición diaria:** **Duración (VLA-EC)**	 **100 ppm** **442 mg/m3** **50 ppm** **221 mg/m3**	**Absorción a través de la piel.**

Diego Fernando Rubio B.
Jefe de Control de Calidad

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality
Marca con Reglamentos Técnicos Colombianos
Sistema 5

No. 05616

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
POSTE METÁLICO	VER ANEXO	VER ANEXO

Las caracteristicas e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 página(s).
The characteristics and identification of this product is described in the attached document which is an integral part of this CERTIFICATE

Comercializado y fabricado por
Commercialized and fabricated by:

POSTES Y TAPAS S.A.S.

KM 5 VIA FUNZA LA PUNTA, FUNZA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

RESOLUCIÓN 18 0540 de 2010 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETILAP (Sección 390.2)

Fecha de Certificación: 2014/10/09
Fecha de Renovación: 2024/07/09
Fecha de Vencimiento: 2027/07/08

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 2025/07/08 y 2026/07/08

Julio Bonilla Gutiérrez
Coordinador Operación Certificación de Productos
CIDET Product Certification Operations Coordinator

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las caracteristicas del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 05616

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2014/10/09
FECHA DE RENOVACIÓN: 2024/07/09
FECHA DE VENCIMIENTO: 2027/07/08

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE POSTE METÁLICO

Tipo	Con brazo sencillo, doble y canasta de mantenimiento para alumbrado publico luminaria peatonal				
Referencia	3 m	4.5 m	6 m	18 m	20 m
Longitud (m)	3	4.50	6	18	20
Carga de rotura (kg)	150	150	150	450	500
Carga de trabajo (kg)	40	60	120	185	200
Flexión máxima bajo carga garantizada (mm)	90	700	33	540	600
Diámetro de la cima (mm)	50.80	76.20	110	200	200
Diámetro de la base (mm)	50.80	76.20	110	300	300
Número de secciones	1	1	1	2 de 4 m y 1 de 10 m	2 de 4 m y 1 de 12 m
Espesor de la lámina (mm)	3	3	4	6 mm x 4m 4.5 mm x 4m 4 mm x 10m	6 mm x 4 m 4.5 mm x 4 m 4 mm x 12 m
Tipo	Con brazo sencillo y doble			Canasta de mantenimiento	
Tipo de acero	Acero SAE 1010 y 1020				
Tipo de recubrimiento	Galvanizado en Caliente y Pintura Electrostatica				
Referencial	RESOLUCION 18 0540 de 2010 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - RETILAP (Sección 390.2)				

Tipo	Con brazo sencillo, doble y canasta de mantenimiento para alumbrado público Luminaria peatonal				
Referencia	9 m	10 m	12 m	14 m	16 m
Longitud (m)	9	10	12	14	16
Carga de rotura (kg)	280	252	280	312	358
Carga de trabajo (kg)	187	168	187	208	239
Flexión máxima bajo carga garantizada (mm)	630	700	840	980	1120
Diámetro de la cima (mm)	127	127	127	127	140
Diámetro de la base (mm)	190	190	195	250	250
Número de secciones	2 de 3y 6m	2 de 6 y 4m	2 de 6 y 6m	2 de 8 y 6m	2 de 8 y 8m
Espesor de la lámina (mm)	3	3	3	3	4
Tipo	Con brazo sencillo y doble				Canasta de mantenimiento
Tipo de acero	Acero SAE 1010 y 1020				
Tipo de recubrimiento	Galvanizado en Caliente y Pintura Electrostática				
Referencial	RESOLUCION 18 0540 de 2010 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - RETILAP (Sección 390.2)				

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 05616

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2014/10/09
FECHA DE RENOVACIÓN: 2024/07/09
FECHA DE VENCIMIENTO: 2027/07/08

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE POSTE METÁLICO

Tipo	Con brazo sencillo y doble para alumbrado público
Referencia	8 m
Longitud (m)	8
Diámetro cima	4"
Diámetro Base	4"
Espesor lámina	6 m Tubo 4mm, 2 m Tubo 3 mm
Número de secciones	2
Unión secciones	Si, soldado, 1 Tubo de 6 m y 1 Tubo de 2 m
Base	Platina 300x300x9 mm
Aletas Base	4 de 160x90x9 mm
Carga de Rotura mínima	150 kgf
Carga de Trabajo y Deflexión máxima a 200 mm de la cima	70 kg, 500 mm
Acabado	Galvanizado en Caliente y Pintura Electrostática
Aplicación	Para Alumbrado Público
Referencial	RESOLUCIÓN 18 0540 de 2010 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETILAP - (Sección 390.2)

Tipo	Con brazo sencillo y doble para alumbrado público
Referencia	6 m
Longitud (m)	6
Diámetro cima	3"
Diámetro Base	3"
Espesor lámina	3 mm
Número de secciones	1
Carga de Rotura mínima	150 kgf
Carga de Trabajo y Deflexión máxima a 200 mm de la cima	60 kg, 30 mm
Acabado	Galvanizado en Caliente y Pintura Electrostática
Aplicación	Para Alumbrado Público
Referencial	RESOLUCIÓN 18 0540 de 2010 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETILAP - (Sección 390.2)

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 05616

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2014/10/09
FECHA DE RENOVACIÓN: 2024/07/09
FECHA DE VENCIMIENTO: 2027/07/08

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE POSTE METÁLICO

Fábrica	Planta
POSTES Y TAPAS S.A.S.	MOSQUERA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA

Atentamente,

Julio Bonilla Gutiérrez
Coordinador Operación Certificación de Productos
CIDET Product Certification Operations Coordinator

GUANGDONG YONGJIN METAL TECHNOLOGY CO., LTD

Address: No.9 Haigang Sanheng Road, Port Industrial Park, Yangjiang High-tech Zone, Guangdong Province, China

Telephone: 0662-8891999

MILL TEST CERTIFICATE

Product name: COLD ROLLED STAINLESS STEEL COILS						Customer			SAMSUNG C AND T CORPORATION					Certificate No		YJ23/CCKT20I-SCT		
Type	304			Specification		ASTM A240								Certificate date		2024/3/14		
						Chemical composition %								Tensile				
No.	Bahru Qualities	Coil No.	Heat number	Size(mm)	Weight (kg)	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	N	Y.S (N/mm2)	Y.S (N/mm2)	Elong(%)	Hardness (HV) --	State
1	304	GD2402140013-001	Y23I121D24-5	1.50*1220*C	10469	0.054	0.340	1.080	0.029	0.003	8.010	18.020	0.066	692	294	62	172	solution annealing
2	304	GD2402140075-01	Y23I101G33-5	0.90*1524*C	10345	0.047	0.330	1.080	0.037	0.002	8.020	18.170	0.054	692	304	60	173	solution annealing
2	304	GD2402140075-02	Y23I101G33-5	0.90*1524*C	10300	0.047	0.330	1.080	0.037	0.002	8.020	18.170	0.054	692	304	60	173	solution annealing
2	304	GD2402140054-02	Y23I101G34-3	0.90*1524*C	10265	0.046	0.330	1.010	0.031	0.003	8.010	18.250	0.060	684	291	60	171	solution annealing
2	304	GD2402140054-01	Y23I101G34-3	0.90*1524*C	10320	0.046	0.330	1.010	0.031	0.003	8.010	18.250	0.060	684	291	60	171	solution annealing
3	304	GD2312140048-001	Y230731G20-6	1.20*1524*C	10361	0.043	0.360	1.020	0.034	0.002	8.020	18.070	0.052	695	284	59	171	solution annealing
3	304	GD2312140048-002	Y230731G20-5	1.20*1524*C	10315	0.043	0.360	1.020	0.034	0.002	8.020	18.070	0.052	695	284	59	171	solution annealing
3	304	GD2312140047-001	Y230731D26-5	1.20*1524*C	10366	0.043	0.310	1.020	0.035	0.003	8.000	18.050	0.069	682	287	59	171	solution annealing
3	304	GD2312140047-002	Y230731D26-6	1.20*1524*C	10340	0.043	0.310	1.020	0.035	0.003	8.000	18.050	0.069	682	287	59	171	solution annealing
4	304	GD2102140077-002	Y2310419C74-3	1.50*1524*C	10254	0.043	0.320	1.040	0.031	0.001	8.000	18.100	0.052	681	286	59	171	solution annealing
5	304	GD2402140068-002	Y231108A13-4	1.90*1524*C	9087	0.046	0.360	1.050	0.027	0.003	8.030	18.200	0.069	681	297	59	171	solution annealing
5	304	GD2102140068-001	Y231108A13-4	1.90*1524*C	10060	0.046	0.360	1.050	0.027	0.003	8.030	18.200	0.069	681	297	59	171	solution annealing
Total					123284													

Notes: *Tensile test: Following GB/T 228.1-2010 standard *Tensile Test case Standard GB/T 228.1-2010


*Hardness test: Follow GB/T4340.1-2009 standard *Hardness Test case Standard GB/T4340.1-2009

Quality Department


concretarte®

BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR

DESCRIPCIÓN



Elemento de tres piezas de alta resistencia y bajo mantenimiento que permite sentarse por cualquiera de sus costados.
Uso en áreas relacionadas con el ocio, el esparcimiento y la recreación como andenes, plazas, alamedas y parques.
Se recomienda utilizarlo en los casos en que existan dos opciones de visuales deseables y en zonas con alta probabilidad de vandalismo.

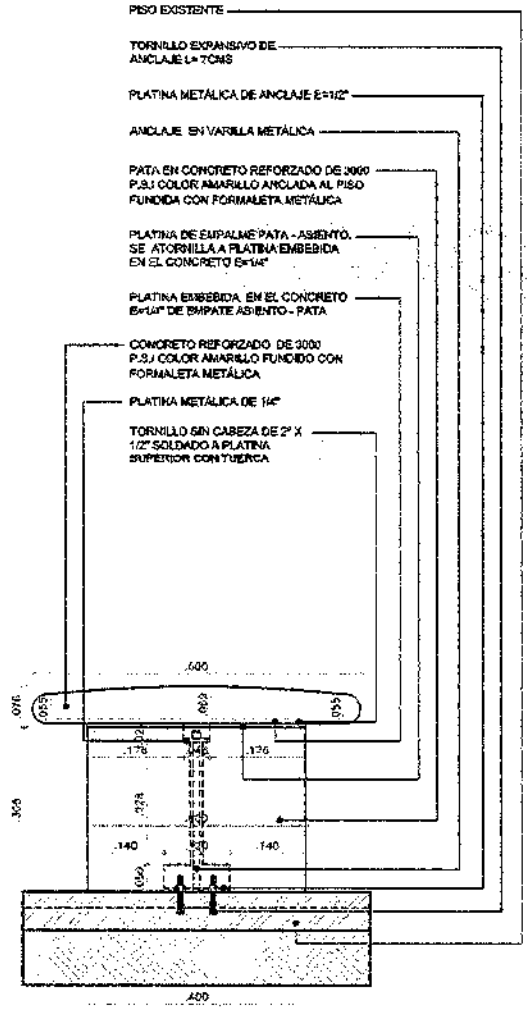

ALZADO LATERAL E:1:15

MATERIALES

Patas y pieza para sentarse en concreto reforzado de 3.000 p.s.i color amarillo, prefabricado con formaleta metálica de alta calidad con sistema de apertura para desmolde.

ACABADOS

Ninguno


MANTENIMIENTO

Sus piezas deben ser reemplazadas en caso de rotura.
Se deben lavar periódicamente con chorro a presión.

concretarte®

BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR

INSTALACIÓN

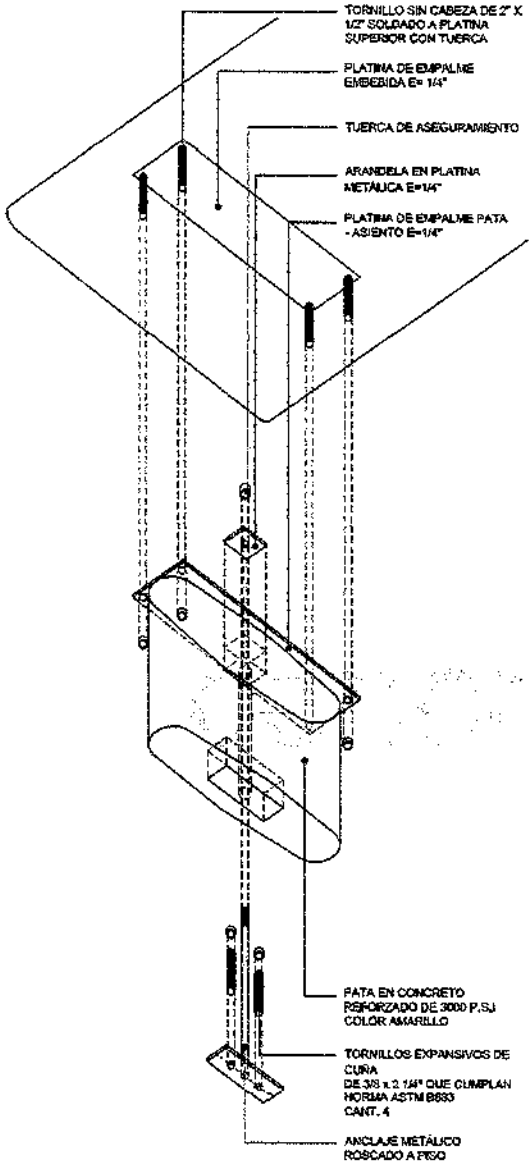

DETALLE ANCLAJE EMD

Se anclan los espigos principales al piso con pernos expansivos. Sobre estos se encajan las patas de la banca, colocandole una platina a manera de arandela y roscando la tuerca.
Sobre la platina ubicada en la parte superior de la pata, se encaja atornillando la pieza principal en concreto.


NOTACIONES

Nota 1: Para todos los elementos metálicos pintura electrostática color gris texturizado RAL 7010 excepto cuando se instale en parques, que llevaran pintura electrostática color verde RAL 6028.
Nota 2: Ver planos de despiece para sistemas de industrialización de piezas.
Nota 3: En terrenos altamente inclinados se deberá ubicar perpendicular a la pendiente y se deberá excavar de tal manera que la pata quede lo mas vertical posible.


concretarte®

BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR

PLANTA Y ALZADO

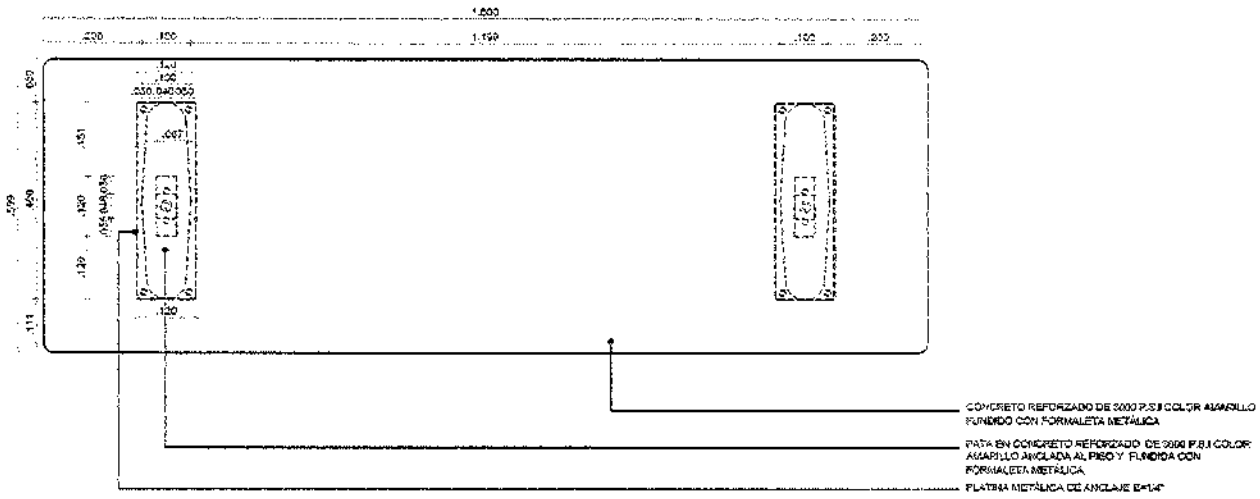

PLANTA E:1/15

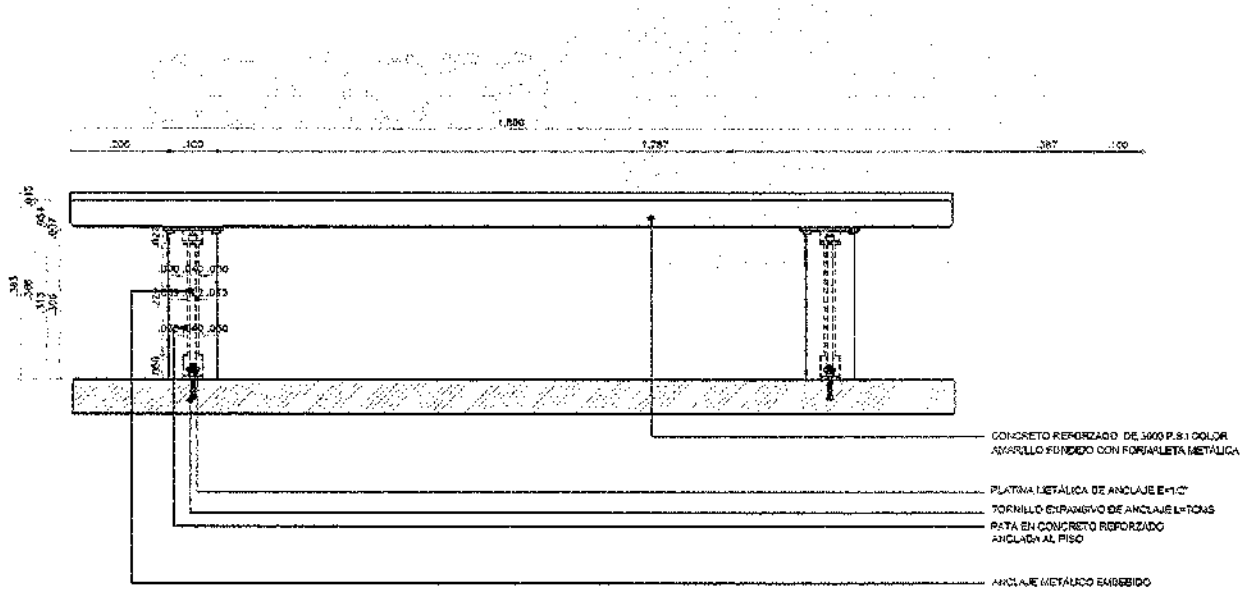

ALZADO FRONTAL E:1/15



ACTA DE MODIFICACIÓN N°001

CR 24 A 8 125 CONJ CERRADO LA CABAÑA CA 1 IN 9. VILLAVICECNIO-META
SHARKYING10@GMAIL.COM-3222169909

CONTRATO No : 2928 DE 2024	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VALOR ACTAS PARCIALES	FECHA DE INICIO CONTRATO
OBJETO: REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	$965.030.477,00	$ -	11/12/2024
	VALOR ANTICIPO:	VALOR AMORTIZADO PARCIALES	TIEMPO DE EJECUCIÓN
	$-	$ -	TRES (03) MESES Y CINCO (05) DIAS
CONTRATISTA:	VALOR ADICIONAL:	PORCENTAJE DE LA PRESENTE ACTA:	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:
CONSORCIO ALSIPA R/L JOHN DANI NAGLES PACHON	$ -	N/A	15/04/2025
INTERVENTOR :	VALOR ANTICIPO ADICIONAL	VALOR PRESENTE ACTA:	FECHA DE LA PRESENTE ACTA:
N/A	$ -	N/A	9/04/2025
SUPERVISOR:	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:
ARQ. DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE	$965.030.477,00	61,48%	61,48%
SECRETARIO DE DESPACHO Y/O JEFE DE OFICINA	ACTA MODIFICATORIA No 01		ESTADO: EN EJECUCIÓN
MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA			

En el Municipio de Villavicencio - Meta, a los NUEVE (09) días del mes de ABRIL del año ***2025***, se reunieron: ***JOHN DANI NAGLES PACHON*** Representante Legal de CONSORCIO ALSIPA como Contratista, DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE Supervisor Delegado, MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA como Secretario Despacho del sector solicitante, para dejar constancia de la presente ***Acta Modificatoria No. 001***, para lo cual se hace necesario realizar el siguiente análisis:

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES						MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CANTIDADES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR
1	PRELIMINARES										
1,1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2	2.550,00	3.648,90	9.304.696,95	2.103,53	$ 7.675.572,22	-	$ -	4.653,53	$ 16.980.269,17
1,2	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	40,00	306.546,56	12.261.862,60	178,62	$ 54.755.347,42	-	$ -	218,62	$ 67.017.210,02
1,3	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS,SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	1,00	322.680,15	322.680,15	-	$ -	1,00	$ 322.680,15	-	$ 0,00
2	EXCAVACION										
2,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	410,00	72.258,02	29.625.786,26	-	$ -	115,77	$ 8.365.621,79	294,23	$ 21.260.164,47
3	BASES Y RELLENOS										
3,1	RELLENO CON MATERIAL MIXTODERÍO SINPROCESAR TAMAÑO MAX.3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	213,40	54.303,05	11.588.271,60	65,67	$ 3.566.077,07	-	$ -	279,07	$ 15.154.348,67
3,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA NEGRA	M3	60,00	163.865,85	9.831.938,93	30,38	$ 4.978.238,41	-	$ -	90,38	$ 14.810.177,34
3,3	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA TRENZA	M2	800,00	18.967,94	15.174.351,15	421,16	$ 7.988.537,16	-	$ -	1.221,16	$ 23.162.888,31
4	ANDENES, SARDINELES, BORDILLLOS, ADOQUINES										
4,1	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-8080X35X20CM. NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	890,00	80.637,40	71.767.290,08	-	$ -	523,63	$ 42.224.164,16	366,37	$ 29.543.125,92
4,2	MALLA ELECTROSOLDADA fy= 5000 kg/cm2,500 Mpa	KG	3.070,00	8.441,98	25.916.893,13	-	$ -	57,21	$ 482.965,95	3.012,79	$ 25.433.927,18
4,3	PLACA CONTRAPISO e=10 cm (20.7 Mpa, 3000 psi) concreto estampado - color	M2	2.005,00	126.035,11	252.700.404,58	-	$ -	2.005,00	$ 252.700.404,58	-	$ 0,00
5	INSTALACIONES ELECTRICAS										
5,1	LUMINARIA: MECANO V TEMPERTATURA DE COLOR: 4000 K POTENCIA: 33W CON BASE PARA FOTOCELDA IRC 70 ÓPTICA: R07	UND	32,00	1.924.034,92	61.569.117,29	-	$ -	32,00	$ 61.569.117,29	-	$ 0,00

5,2	MÁSTIL METÁLICO GALVANIZADO DE 6M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	30,00	1.226.042,61	36.781.278,29	-	$ -	30,00	$ 36.781.278,29	-	$ 0,00
5,3	ESTRUCTURA LA321	UND	4,00	618.429,34	2.473.717,37	-	$ -	2,00	$ 1.236.858,69	2,00	$ 1.236.858,69
5,4	ESTRUCTURA CS400	UND	4,00	740.300,03	2.961.200,10	-	$ -	2,00	$ 1.480.600,05	2,00	$ 1.480.600,05
5,5	ACOMETIDA PARCIAL 2 No6+1No.6 AL	ML	459,05	42.392,00	19.460.174,78	-	$ -	319,94	$ 13.563.023,66	139,11	$ 5.897.151,12
5,6	ACOMETIDA PARCIAL 2 No8+1No.8 CU THHN	ML	705,78	34.394,00	24.274.597,32	-	$ -	566,67	$ 19.490.047,98	139,11	$ 4.784.549,34
5,7	CANALIZACION PVC 2X1" PARA AP	ML	653,00	34.123,70	22.282.775,32	-	$ -	653,00	$ 22.282.775,32	-	$ 0,00
5,8	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	47,00	413.401,92	19.429.890,41	-	$ -	47,00	$ 19.429.890,41	-	$ 0,00
5,9	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UND	41,00	520.301,06	21.332.343,50	-	$ -	27,00	$ 14.048.128,65	14,00	$ 7.284.214,85
6	MOBILIARIO URBANO											
6,1	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO ELIPTICA (ESQUÍ DE FONDO). SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	4.716.925,95	4.716.925,95	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 4.716.925,95
6,2	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO SURF. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	4.095.050,38	4.095.050,38	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 4.095.050,38
6,3	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO BARRAS PARALELAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	3.281.948,09	3.281.948,09	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 3.281.948,09
6,4	MANTE Y REPA JUEGO BIOSALUDABLES EXIST	UN	11,00	656.186,26	7.218.048,85	2,00	$ 1.312.372,52	-	$ -	13,00	$ 8.530.421,37
6,5	CANECA EN MALLA METÁLICA TIPO M120 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	UN	8,00	487.452,67	3.899.621,37	-	$ -	8,00	$ 3.899.621,37	-	$ 0,00
6,6	SUM E INST. COLUM SW. THREE, INCL. LOCALIZ Y EXC.	UN	1,00	2.659.673,28	2.659.673,28	-	$ -	1,00	$ 2.659.673,28	-	$ 0,00
6,7	PISO DUROPISO BLANCO 33,8X33,8 T. COMERCIAL	M2	25,00	53.161,07	1.329.026,72	-	$ -	25,00	$ 1.329.026,72	-	$ 0,00
	ÍTEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA										
NP 1	DESMONTE DE MASTILES EXISTENTES (INC. DEMOLICION BASE Y CARGUE DE MATERIALES, Y SUSP RED CABLEADO EXIS)	UN		100.790,00	-	30,00	$ 3.023.700,00	-	$ -	30,00	$ 3.023.700,00
NP 2	BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR TIPO M31. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN		571.790,75	-	50,00	$ 28.589.537,50	-	$ -	50,00	$ 28.589.537,50
NP 3	DESMONTE DE BANCA incl retiro	UN		42.189,00	-	41,00	$ 1.729.749,00	-	$ -	41,00	$ 1.729.749,00
NP 4	DESMONTE DE CANECAS EXISTENTES (INC. DEMOLICION DE BASE EXISTENTE Y CARGUE DE MATERIALES)	UN		41.751,00	-	2,00	$ 83.502,00	-	$ -	2,00	$ 83.502,00
NP 5	LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	M2		5.276,00	-	287,36	$ 1.516.111,36	-	$ -	287,36	$ 1.516.111,36
NP 6	MURO CONFINAMIENTO ACABADO LISO 0.60>H>0.45 A=0.20 EN CONCRETO REF 3000 PSI	ML		348.664,00	-	73,00	$ 25.452.472,00	-	$ -	73,00	$ 25.452.472,00
NP 7	CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR OCRE ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)	M2		137.629,00	-	1.445,87	$ 198.993.642,23	-	$ -	1.445,87	$ 198.993.642,23
NP 8	CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR AZUL ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)	M2		187.558,00	-	156,49	$ 29.350.951,42	-	$ -	156,49	$ 29.350.951,42

NP 9	CAJA EN CONCRETO REF CON REJILLA .60*.30 P=.30 (MARCO < 11/2" 3/16")	UN		369.023,00	-	3,00	$	1.107.069,00	-	$ -	3,00	$ 1.107.069,00
NP 10	BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4" PVC	ML		32.021,00	-	15,47	$	495.364,87	-	$ -	15,47	$ 495.364,87
NP 11	RELLENO EN GRAVA 1 1/2"<D<2" EP 15 CM (INC ALISTAMIENTO DE TERRENO HACIA DRENAJE)	M2		43.783,00	-	354,14	$	15.505.311,62	-	$ -	354,14	$ 15.505.311,62
NP 12	LUMINARIA PARA PARQUE ENTRE 36-60 (W) 100000 H (SUMINISTRO E INSTALACION INC FOTOCELDA Y BRAZO)	UN		1.452.795,00	-	12,00	$	17.433.540,00	-	$ -	12,00	$ 17.433.540,00
NP 13	POSTE 4 M METALCIO DIAM 3" CON CANSITILLAS Y ACABADO EN PINURA	UN		1.072.121,00	-	12,00	$	12.865.452,00	-	$ -	12,00	$ 12.865.452,00
NP 14	BASECIRCULAR PARA JUEGOS D:2.00 INC REFUERZO DOS DIRECIONES	UN		853.460,00	-	16,00	$	13.655.360,00	-	$ -	16,00	$ 13.655.360,00
NP 15	SARDINEL 3000PSI B=0.2,b=0.15,H=0.40INC. EXC/RET	ML		50.757,00	-	1.128,52	$	57.280.289,64	-	$ -	1.128,52	$ 57.280.289,64
NP 16	PLACA CONTRAPISO e = 12 cm (24.13Mpa, 3500psi)	M2		95.185,00	-	7,45	$	709.128,25	-	$ -	7,45	$ 709.128,25
NP 17	SUMINISTRO E INSTALACION CANECA M-121	UN		1.947.961,00	-	3,00	$	5.843.883,00	-	$ -	3,00	$ 5.843.883,00
NP 18	PUESTA A TIERRA MASTIL LUMINARIA	UN		380.570,00	-	6,00	$	2.283.420,00	-	$ -	6,00	$ 2.283.420,00
NP 19	DESMONTE Y MONTAJE DE JUEGO DE NIÑOS EXISTENTE (INC. ADECUACION TUB MET, DADOS EN COCNRETO PARA CINENTACION, SOLDADURAS, ANTICORROSIVO Y PINTURAS)	UN		3.809.022,00	-	3,00	$	11.427.066,00	-	$ -	3,00	$ 11.427.066,00
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO (A)					$ 676.259.564,45			$ 507.621.694,69		$ 501.885.878,34		$ 682.015.380,81
ADMINISTRACION					$ 236.690.847,56			$ 177.667.593,14		$ 175.653.057,42		$ 238.705.383,28
IMPEVISTOS					$ 6.762.595,64			$ 5.076.216,95		$ 5.018.658,78		$ 6.820.153,81
UTILIDAD					$ 27.050.382,58			$ 20.304.867,79		$ 20.074.635,13		$ 27.280.615,23
TOTAL AIU (B)					$ 270.503.825,78			$ 203.048.677,88		$ 200.746.351,34		$ 272.806.152,32
COMPONENTE AMBIENTAL (C)					3.400.390,60			3.400.390,60		3.400.390,60		$ 3.400.390,60
COMPONENTE SOCIAL (D)					3.400.390,60			3.400.390,60		3.400.390,60		$ 3.400.390,60
COMPONENTE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (E)					3.400.390,60			3.400.390,60		3.400.390,60		$ 3.400.390,60
COMPONENTE CERTIFICACIÓN ELECTRICA (F)					2.719.937,43					2.719.937,43		$ 0,00
VALOR PROPUESTA ECONÓMICA (CON LA CUAL SE EVALUARÁN LAS PROPUESTAS DE ACUERDO CON LAS FÓRMULAS DEL NUMERAL 4.1.4 DEL DOCUMENTO BASE O PLIEGO TIPO): (G = A + B + C + D + E + F)					$ 959.684.499,46			$ 720.871.544,37		$ 715.533.338,91		$ 965.022.704,93
PROVISION OBRAS COMPLEMENTARIAS O ADICIONALES (INCLUYE SU PROPIO COSTO DIRECTO Y SU AIU DE OBRAS PROPUESTO, UNICAMENTE) (H)					5.345.977,54					5.345.977,54		$ 0,00
VALOR TOTAL COSTO DEL CONTRATO A EJECUTAR PROPUESTO: (I = G + H)					$ 965.030.477,00			$ 720.871.544,00		$ 720.879.316,00		$ 965.022.705,00

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 965.030.477,00
VALOR MAYORES CANTIDADES	$ 720.871.544,00
VALOR MENORES CANTIDADES	$ 720.879.316,00
VALOR A ADICIONAR	$ 0,00
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 965.022.705,00
DIFERENCIA A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 7.772,00

LA PRESENTE ACTA MODIFICATORIA SE FIRMA A LOS NUEVE (09) DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Firma
CONSORCIO ALSIPA RL JOHN DANI NAGLES PACHON
CONTRATISTA

Firma N/A
N/A
INTERVENTORÍA

Firma
DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DELEGADO

Firma
MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA
SECRETARIO DESPACHO

N/A
Reviso Asesor Técnico

ACTA DE FIJACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS

CR 24 A 8 125 CONJ CERRADO LA CABAÑA CA 1 IN 9. VILLAVICECNIO-META
SHARKYING10@GMAIL.COM-3222169909

CONTRATO No. 2928 (Número de contrato) **DE** 2024 (Año de suscripción)

VIGENCIA El contrato tendrá como vigencia el término para la ejecucion del contrato de suministro y cuatro (04) meses más
(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

LICITACION PUBLICA ☐ **CONTRATACION DIRECTA** ☐ **OTRO** ☐

SELECCION ABREVIADA ☑ SAMC-013-2024
(Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa efectuada)

OBJETO DELCONTRATO

REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

LOCALIZACION DEL PROYECTO El desarrollo de la obra se lleva a cabo en el casco urbano del municipio de Villavicencio – Meta, en el parque VIRREY, AZOTEA, MACARENA Y RETIRO
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO El plazo de ejecucion sera hasta el 30 DE DICIEMBRE DE 2024 contados a partir de la suscripcion del acta de inicio
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

.CHA DE INICIACION DEL CONTRATO 11 (Día) DE DICIEMBRE (Mes) DE 2024 (Año)

FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO 30 (Día) DE DICIEMBRE (Mes) DE 2024 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 965.030.477,00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TREINTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MCTE
(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

CONTRATISTA CONSORCIO ALSIPA R/L JOHN DANI NAGLES PACHON NIT No 901892095-4
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A
(Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)

SUPERVISOR DELEGADO ARQUITECTO DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
(Indique el nombre del funcionario designado para ser Supervisor del contrato)

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
PRORROGA No. 001	DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DAIS

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS No	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
SUSPENSION No. 01	UN (01) MES

FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA 15 (Día) DE ABRIL (Mes) DE 2025 (Año)

VALOR ACTUALIZADO $ 965.030.477,00
(Indique el valor actual del contrato en números)

NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TREINTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MCTE
(Indique el valor actual del contrato en letras)

En la Ciudad de Villavicencio departamento del Meta; a los NUEVE (09) dias del mes ABRIL del 2025 se reunieron el Ingeniero (a) JOHN DANI NAGLES PACHON representante legal del contratista, el Ingeniero (a) N/A representante legal de interventoria, el ingeniero(a) MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA
(Nombre del representante legal o delegado de la interventoría)
Secretario(a) de Despacho y el arquitecto(a) DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE supervisor delegado del contrato con el fin de de pactar, fijar y viabilizar los precios unitarios no previstos en el contrato anteriormente mencionado, previo estudio y viabilidad de la

Interventoria. Dichos items, precios unitarios y cantidades aproximadas corresponden a:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD APROX	PRECIO UNITARIO
NP 1	DESMONTE DE MASTILES EXISTENTES (INC. DEMOLICION BASE Y CARGUE DE MATERIALES, Y SUSP RED CABLEADO EXIS)	UN	30,00	$ 100.790,00
NP 2	BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR TIPO M31. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	50,00	$ 571.790,75
NP 3	DESMONTE DE BANCA incl retiro	UN	41,00	$ 42.189,00
NP 4	DESMONTE DE CANECAS EXISTENTES (INC. DEMOLICION DE BASE EXISTENTE Y CARGUE DE MATERIALES)	UN	2,00	$ 41.751,00
NP 5	LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	M2	287,36	$ 5.276,00
NP 6	MURO CONFINAMIENTO ACABADO LISO 0.60>H>0.45 A=0.20 EN CONCRETO REF 3000 PSI	ML	73,00	$ 348.664,00
NP 7	CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR OCRE ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)	M2	1.445,87	$ 137.629,00
NP 8	CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR AZUL ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)	M2	156,49	$ 187.558,00
NP 9	CAJA EN CONCRETO REF CON REJILLA .60*.30 P=.30 (MARCO < 11/2" 3/16")	UN	3,00	$ 369.023,00
NP 10	BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4" PVC	ML	15,47	$ 32.021,00
NP 11	RELLENO EN GRAVA 1 1/2"<D<2" EP 15 CM (INC ALISTAMIENTO DE TERRENO HACIA DRENAJE)	M2	354,14	$ 43.783,00
NP 12	LUMINARIA PARA PARQUE ENTRE 33-40 (W) 100000 H (SUMINISTRO E INSTALACION INC FOTOCELDA Y BRAZO)	UN	12,00	$ 1.452.795,00
NP 13	POSTE 4 M METALCO DIAM 3" CON CANSITILLAS Y ACABADO EN PINURA	UN	12,00	$ 1.072.121,00
NP 14	BASECIRCULAR PARA JUEGOS D:2.00 INC REFUERZO DOS DIRECIONES	UN	16,00	$ 853.460,00
NP 15	SARDINEL 3000PSI B=0.2,b=0.15,H=0.40INC. EXC/RET	ML	1.128,52	$ 50.757,00
NP 16	PLACA CONTRAPISO e = 12 cm (24.13Mpa, 3500psi)	M2	7,45	$ 95.185,00
NP 17	SUMINISTRO E INSTALACION CANECA M-121	UN	3,00	$ 1.947.961,00
NP 18	PUESTA A TIERRA MASTIL LUMINARIA	UN	6,00	$ 380.570,00
NP 19	DESMONTE Y MONTAJE DE JUEGO DE NIÑOS EXISTENTE (INC. ADECUACION TUB MET, DADOS EN COCNRETO PARA CINENTACION, SOLDADURAS, ANTICORROSIVO Y PINTURAS)	UN	3,00	$ 3.809.022,00

Se anexa y hace parte de la presente acta los analisis de precios unitarios con su respectivos soportes de cotizacion

Para constancia de lo anterior, firman y aprueban la presente acta los que en ella intervinieron a los NUEVE (09)

.s del mes de ABRIL de 2025

Firma

Nombre CONSORCIO ALSIPA

R/L. JOHN DANI NAGLES PACHON

Contratista

Firma N.A

Nombre

R/L.

Interventor

Firma

Nombre DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE

Supervisor

NIT: 901.892.095-4

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ÍTEMS NUEVOS NO PREVISTOS

CR 24 A 8 125 CONJ CERRADO LA CABAÑA CA 1 IN 9. VILLAVICECNIO-META
SHARKYING10@GMAIL.COM-3222169909

DATOS GENERALES

CONTRATO N° 2928 **DE** 2024
OBJETO DEL CONTRATO

REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

CONTRATISTA	CONSORCIO ALSIPA R/L JOHN DANI NAGLES PACHON
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ARQ DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 1	DESMONTE DE MASTILES EXISTENTES (INC. DEMOLICION BASE Y CARGUE DE MATERIALES, Y SUSP RED CABLEADO EXIS)	UN	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR %		%MDEO	$ 93,811.07	3.00%	$ 2,814.00
				SUBTOTAL $	2,814.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
			SUBTOTAL $	0.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
VOLQUETA (M3/KM)0	0	5	0.7	$ 1,190.00	$ 4,165.00
				SUBTOTAL $	4,165.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HORA/Cuad. 2 Ayudantes	9,972.00	1.96	$ 19,545.12	1.6000	$ 31,272.19
HORA/Cuad. ELECTR/1 Tecn elect+1 Ayu (M	20,572.00	1.90	$ 39,086.80	1.6000	$ 62,538.88
				SUBTOTAL $	93,811.07
				TOTAL COSTO DIRECTO $	100,790.00

(Firma)
JOHN DANI NAGLES PACHON
R/L Contratista

OBSERVACIONES SUPERVISOR

(Firma)
ARQ DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR

Proceso Gestion de la Contratacion
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO No 2928 **DE** 2024
OBJETO DEL CONTRATO

REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

CONTRATISTA	CONSORCIO ALSIPA R/L JOHN DANI NAGLES PACHON
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ARQ DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 2	BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR TIPO M31. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
CARGADOR FRONTAL DE RUEDAS		HR	$ 176,687.66	0.17	$ 30,036.90
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (3% M.O.)		%	$ 43,317.38	3%	$ 1,299.52
				SUBTOTAL $	31,336.42

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR TIPO M31	UN	1.000	$ 448,690.03	$ 448,690.03
PERNO DE ANCLAJE 5/8" X 2" GRADO 8	UN	4.000	$ 4,986.61	$ 19,946.44
PLATINA 1/4" X 1"	ML	6.000	$ 4,750.08	$ 28,500.48
			SUBTOTAL $	497,136.95

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	U.M	PRESTACIONES	VR. UNITARIO	CANTIDAD	Vr. UNITARIO
CUADRILLA DE CONSTRUCCIÓN TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTES)	HC		$ 43,317.38	1.0000	$ 43,317.38
				SUBTOTAL $	43,317.38
				TOTAL COSTO DIRECTO $	571,790.75

(Firma)
JOHN DANI NAGLES PACHON
R/L Contratista

OBSERVACIONES SUPERVISOR

(Firma)
ARQ DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR

DATOS GENERALES

CONTRATO No 2928 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

CONTRATISTA	CONSORCIO ALSIPA R/L JOHN DANI NAGLES PACHON
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ARQ DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 3	DESMONTE DE BANCA incl retiro	UN	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR %		%MDEO	$ 31,251.00	5.00%	$ 1,563.00
				SUBTOTAL $	1,563.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
			SUBTOTAL $	0.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
TRANSPORTE %	30.00	0.01	0.2999904	$ 31,251.00	$ 9,375.00
				SUBTOTAL $	9,375.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HORA/Cuad. 2 Ayudantes	9,972.00	1.96	$ 19,532.00	1.6000	$ 31,251.00
				SUBTOTAL $	31,251.00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	42,189.00

(Firma)
JOHN DANI NAGLES PACHON
R/L Contratista

OBSERVACIONES SUPERVISOR

(Firma)
ARQ DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR

Municipio de Villavicencio

DATOS GENERALES

CONTRATO N° 2928 **DE** 2024
OBJETO DEL CONTRATO

REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

CONTRATISTA	CONSORCIO ALSIPA R/L JOHN DANI NAGLES PACHON
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ARQ DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 4	DESMONTE DE CANECAS EXISTENTES (INC. DEMOLICION DE BASE EXISTENTE Y CARGUE DE MATERIALES)	UN	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR %		%MDEO	$ 39,090.24	3.00%	$ 1,173.00
				SUBTOTAL $	1,173.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
			SUBTOTAL $	0.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
VOLQUETA (M3/KM)0	0	5.000	0.250	$ 1,190.00	$ 1,487.50
				SUBTOTAL $	1,487.50

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HORA/Cuad. 2 Ayudantes	9,972.00	1.96	$ 19,545.12	2.0000	$ 39,090.24
				SUBTOTAL $	39,090.24
				TOTAL COSTO DIRECTO $	41,751.00

(Firma)
JOHN DANI NAGLES PACHON
R/L Contratista

OBSERVACIONES SUPERVISOR

(Firma)
ARQ DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR

Alcaldía de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO No 2928 **DE** 2024

OBJETO DEL CONTRATO

REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

CONTRATISTA	CONSORCIO ALSIPA R/L JOHN DANI NAGLES PACHON
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ARQ DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 5	LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR %		%MDEO	$ 2,442.00	1.00%	$ 24.00
HIDROJET 1700 PSI (BOQUILLA ROTATIVA) .		DD	$ 72,827.09	0.033	$ 2,374.00
				SUBTOTAL $	2,398.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
AGUA	LT	12.000	$ 18.68	$ 224.00
CLORO GRANULADO TIPO HTH AMERICANO	KG	0.016	$ 13,424.53	$ 212.00
			SUBTOTAL $	436.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HORA/Cuad. 1 Ayudante	4,986.00	1.96	$ 9,772.56	0.250	$ 2,442.00
				SUBTOTAL $	2,442.00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	5,276.00

(Firma)
JOHN DANI NAGLES PACHON
R/L Contratista

OBSERVACIONES SUPERVISOR

(Firma)
ARQ DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR

Proceso Gestion de la Contratacion
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO N° 2928 **DE** 2024
OBJETO DEL CONTRATO

REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

CONTRATISTA	CONSORCIO ALSIPA R/L JOHN DANI NAGLES PACHON
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ARQ DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 6	MURO CONFINAMIENTO ACABADO LISO 0.60>H>0.45 A=0.20 EN CONCRETO REF 3000 PSI	ML	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR %		%MDEO	$ 117,270.72	3.00%	$ 3,518.00
FORMALETA METALICA SEGÚN DISEÑO		DD	$ 676,577.26	0.050	$ 33,828.86
				SUBTOTAL $	37,346.86

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CONCRETO 3000 PSI (210N)	M3	0.11025	$ 371,041.00	$ 40,907.27
ACERO FIGURADO NO.4 (1/2") F" Y=60000 PSI	KG	19.070	$ 7,217.00	$ 137,628.19
ALAMBRE NEGRO CAL. 18	KG	1.000	$ 7,300.00	$ 7,300.00
Desenconfrante emulsionado (16kg)	UN	0.030	$ 273,700.00	$ 8,211.00
			SUBTOTAL $	194,046.46

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HORA/Cuad. 2 Ayudantes	9,972.00	1.96	$ 19,545.12	6.0000	$ 117,270.72
				SUBTOTAL $	117,270.72
				TOTAL COSTO DIRECTO $	348,664.00

(Firma)
JOHN DANI NAGLES PACHON
R/L Contratista

OBSERVACIONES SUPERVISOR

(Firma)
ARQ DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR

DATOS GENERALES

CONTRATO Nº 2928 **DE** 2024

OBJETO DEL CONTRATO

REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

CONTRATISTA	CONSORCIO ALSIPA R/L JOHN DANI NAGLES PACHON
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ARQ DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 7	CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR OCRE ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)	M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR %		%MDEO	$ 34,805.14	3.00%	$ 1,044.00
MOLDE		DD	$ 3,000.00	0.50	$ 1,500.00
Mezcladora a gasolina		DD	$ 30,160.49	0.05	$ 1,508.02
				SUBTOTAL $	4,052.02

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
AGUA	LT	150.00	$ 18.68	$ 2,802.00
Arena lavada de rio	M3	0.07	$ 77,800.00	$ 5,057.00
Gravilla de rio 1/2"	M3	0.07	$ 75,892.00	$ 4,932.98
Cemento gris	KG	36.50	$ 600.00	$ 21,900.00
REPISA 5 X.10X3 ORDINARIO DURO	UN	0.50	$ 11,328.11	$ 5,664.06
LISTON 5*5 ABARCO FLORMORADO	UN	0.25	$ 12,973.28	$ 3,243.32
Puntilla con cabeza 2"	LB	0.02	$ 4,900.00	$ 98.00
TONO COLORANTE -OCR	KG	6.00	$ 3,446.72	$ 20,680.30
DESMOLDANTE	KG	2.00	$ 16,189.36	$ 32,378.71
SELLANTE	LT	1.00	$ 2,015.76	$ 2,015.76
			SUBTOTAL $	98,772.12

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ 0.00
				SUBTOTAL $	0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Ayudante albañileria (A) - Prest.	$ 4,273.99	1.95	$ 8,334.28	0.8000	$ 6,667.42
Cuadrilla AA albañileria (Oficial 1° + Ayudante)	$ 10,387.75	1.95	$ 20,256.11	0.8000	$ 16,204.89
Oficial albañileria (A) con prest	$ 6,119.40	1.95	$ 11,932.83	1.0000	$ 11,932.83
				SUBTOTAL $	34,805.14
				TOTAL COSTO DIRECTO $	137,629.00

(Firma)
JOHN DANI NAGLES PACHON
R/L Contratista

OBSERVACIONES SUPERVISOR

(Firma)
ARQ DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR

DATOS GENERALES

CONTRATO N° 2928 **DE** 2024
OBJETO DEL CONTRATO

REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

CONTRATISTA	CONSORCIO ALSIPA R/L JOHN DANI NAGLES PACHON
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ARQ DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 8	CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR AZUL ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)	M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR %		%MDEO	$ 32,418.58	3.00%	$ 973.00
MOLDE		DD	$ 3,000.00	0.50	$ 1,500.00
Mezcladora a gasolina		DD	$ 30,160.49	0.05	$ 1,508.02
				SUBTOTAL $	3,981.02

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
AGUA	LT	150.00	$ 18.68	$ 2,802.00
Arena lavada de rio	M3	0.07	$ 77,800.00	$ 5,057.00
Gravilla de rio 1/2"	M3	0.07	$ 75,892.00	$ 4,932.98
Cemento gris	KG	36.50	$ 600.00	$ 21,900.00
REPISA 5 X.10X3 ORDINARIO DURO	UN	0.50	$ 11,328.11	$ 5,664.06
LISTON 5*5 ABARCO FLORMORADO	UN	0.25	$ 12,973.28	$ 3,243.32
Puntilla con cabeza 2"	LB	0.02	$ 4,900.00	$ 98.00
TONO COLORANTE -AZ	KG	4.00	$ 22,313.93	$ 89,255.71
DESMOLDANTE	KG	1.00	$ 16,189.36	$ 16,189.36
SELLANTE	LT	1.00	$ 2,015.76	$ 2,015.76
			SUBTOTAL $	151,158.18

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
					$ 0.00
				SUBTOTAL $	0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Ayudante albañilería (A) - Prest.	$ 4,273.99	1.95	$ 8,334.28	0.8000	$ 6,667.42
Cuadrilla AA albañileria (Oficial 1ª + Ayudante)	$ 10,387.75	1.95	$ 20,256.11	0.8000	$ 16,204.89
Oficial albañileria (A) con prest	$ 6,119.40	1.95	$ 11,932.83	0.8000	$ 9,546.26
				SUBTOTAL $	32,418.58
				TOTAL COSTO DIRECTO $	187,558.00

(Firma)
JOHN DANI NAGLES PACHON
R/L Contratista

OBSERVACIONES SUPERVISOR

(Firma)
ARQ DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO N° 2928 **DE** 2024
OBJETO DEL CONTRATO

REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

CONTRATISTA	CONSORCIO ALSIPA R/L JOHN DANI NAGLES PACHON
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ARQ DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 9	CAJA EN CONCRETO REF CON REJILLA .60*.30 P=.30 (MARCO < 11/2" 3/16")	UN	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR %		%MDEO	$ 161,221.63	3.00%	$ 4,837.00
EQUIPO SOLDADURA ELECTRICA AC/DC 110/220		DD	$ 86,219.91	1.00	$ 86,219.91
				SUBTOTAL $	91,056.91

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CONCRETO 3000 PSI (210N)	M3	0.070	$ 371,041.00	$ 25,972.87
ANGULO 1 1/2"X3/16"	ML	1.890	$ 12,766.60	$ 24,128.87
HIERRO A-37 CHIPA LISA 1/4"	KG	8.910	$ 4,991.67	$ 44,475.78
SOLDADURA ASW E6013 X 3/32	KG	1.000	$ 10,752.31	$ 10,752.31
ANTICORROSIVO TIPO PINTUCROM	GAL	0.100	$ 9,597.66	$ 959.77
ESMALTE SINT.TIPO PINTULUX PINTUCO	GAL	0.150	$ 69,701.15	$ 10,455.17
			SUBTOTAL $	116,744.77

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HORA/Cuad. ALBA-IL/10f+2 Ayu (M)	17,987.00	1.95	$ 35,074.65	3.0000	$ 105,223.95
HORA/Cuad. 1 Soldador + 1 ayudante	14,893.00	1.86	$ 27,998.84	2.0000	$ 55,997.68
				SUBTOTAL $	161,221.63
				TOTAL COSTO DIRECTO $	369,023.00

(Firma)
JOHN DANI NAGLES PACHON
R/L *Contratista*

OBSERVACIONES SUPERVISOR

(Firma)
ARQ DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO No 2928 **DE** 2024
OBJETO DEL CONTRATO

DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO ALSIPA R/L JOHN DANI NAGLES PACHON
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ARQ DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 10	BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4" PVC	ML	1

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR %		%MDEO	$ 5,061.00	3.00%	$ 152.00
				SUBTOTAL $	152.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
LIMPIADOR 1/4 SOLDATUBOS	GAL	0.004	$ 36,522.59	$ 150.00
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 GL	UN	0.004	$ 29,718.00	$ 122.00
TUBO A/LLUVIAS 4" T. PAVCO	ML	1.020	$ 26,015.33	$ 26,536.00
			SUBTOTAL $	26,808.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HORA/Cuad. 1 Of+1 Ayu (M)	13,001.00	1.95	$ 25,304.00	0.2000	$ 5,061.00
				SUBTOTAL $	5,061.00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	32,021.00

(Firma)
JOHN DANI NAGLES PACHON
R/L Contratista

OBSERVACIONES SUPERVISOR

(Firma)
ARQ DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO N° 2928 **DE** 2024
OBJETO DEL CONTRATO

REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

CONTRATISTA	CONSORCIO ALSIPA R/L JOHN DANI NAGLES PACHON
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ARQ DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 11	RELLENO EN GRAVA 1 1/2"<D<2" EP 15 CM (INC ALISTAMIENTO DE TERRENO HACIA DRENAJE)	M2	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR %		%MDEO	$ 22,798.52	3.00%	$ 684.00
VOLQUETA (M3/KM)		M3/KM	$ 1,190.00	5.00	$ 5,950.00
				SUBTOTAL $	6,634.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
GRAVA TRITURADA 1"	M3	0.205	$ 70,000.00	$ 14,350.00
			SUBTOTAL $	14,350.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HORA/Cuad. ALBA-IL/10f+2 Ayu (M)	17,987.00	1.95	$ 35,074.65	0.6500	$ 22,798.52
				SUBTOTAL $	22,798.52
				TOTAL COSTO DIRECTO $	43,783.00

(Firma)
JOHN DANI NAGLES PACHON
R/L Contratista

OBSERVACIONES SUPERVISOR

(Firma)
ARQ DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO N° 2928 **DE** 2024

OBJETO DEL CONTRATO

REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

CONTRATISTA	CONSORCIO ALSIPA R/L JOHN DANI NAGLES PACHON
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ARQ DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 12	LUMINARIA PARA PARQUE ENTRE 36-60 (W) 100000 H (SUMINISTRO E INSTALACION INC FOTOCELDA Y BRAZO)	UN	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR %		%MDEO	$ 83,890.43	3.00%	$ 2,517.00
				SUBTOTAL $	2,517.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
LUM LED 36-60 (W) 100000 H	UN	1.000	$ 1,223,073.00	$ 1,223,073.00
BRAZO SOPORTE LUMIN TUBO GALV. 11/2"X1.2 M	UN	1.000	$ 51,975.00	$ 51,975.00
FOTOCELDA PARA LUMINARIA GRIS	UN	1.000	$ 35,320.62	$ 35,320.62
CABLE COBRE AISL. NEUTRO CONCENTRICO 600V,2X14 AWG	ML	4.090	$ 10,975.00	$ 44,887.75
CONCRETO 3000 PSI (210N)	M3	0.030	$ 371,041.00	$ 11,131.23
			SUBTOTAL $	1,366,387.60

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HORA/Cuad. ALBA-IL/10f+2 Ayu (M)	17,987.00	1.95	$ 35,074.65	1.0000	$ 35,074.65
HORA/Cuad. ELECTR/1 Tecn elect+2 Ayu (M	25,558.00	1.91	$ 48,815.78	1.0000	$ 48,815.78
				SUBTOTAL $	83,890.43
				TOTAL COSTO DIRECTO $	1,452,795.00

(Firma)
JOHN DANI NAGLES PACHON
R/L *Contratista*

OBSERVACIONES SUPERVISOR

(Firma)
ARQ DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR

Municipio en Movimiento

Proceso Gestion de la Contratacion
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO N° 2928 **DE** 2024

OBJETO DEL CONTRATO

REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

CONTRATISTA	CONSORCIO ALSIPA R/L JOHN DANI NAGLES PACHON
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ARQ DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 13	POSTE 4 M METALCIO DIAM 3" CON CANSITILLAS Y ACABADO EN PINURA	UN	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR %		%MDEO	$ 122,791.68	3.00%	$ 3,684.00
				SUBTOTAL $	3,684.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
MASTIL METALICO 4MX DIAM 3"	UN	1.000	$ 858,332.13	$ 858,332.13
CANASTA MET PARA ANCLAJE ST	UN	1.000	$ 87,313.28	$ 87,313.28
			SUBTOTAL $	945,645.40

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HORA/Cuad. ELECTR/1 Tecn elect+4 Ayu (M)	35,530.00	1.92	$ 68,217.60	1.8000	$ 122,791.68
				SUBTOTAL $	122,791.68
				TOTAL COSTO DIRECTO $	1,072,121.00

(Firma)
JOHN DANI NAGLES PACHON
R/L Contratista

OBSERVACIONES SUPERVISOR

(Firma)
ARQ DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO N° 2928 **DE** 2024

OBJETO DEL CONTRATO

REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

CONTRATISTA	CONSORCIO ALSIPA R/L JOHN DANI NAGLES PACHON
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ARQ DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 14	BASECIRCULAR PARA JUEGOS D:2.00 INC REFUERZO DOS DIRECIONES	UN	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR %		%MDEO	$ 176,432.64	3.00%	$ 5,293.00
FORMALETA METALICA SEGUN DISEÑO		DD	$ 676,577.26	0.10	$ 67,657.73
VIBRADOR A GASOLINA 5,5 hp		DD	$ 36,900.00	0.10	$ 3,690.00
				SUBTOTAL $	76,640.73

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
DESMOLDANTE SEPAROL SIKA Y/O ENCOFROIL MET	KG	1.00	$ 10,811.06	$ 10,811.06
CONCRETO (13,8 MPA, 2000 PS)	M3	0.16	$ 324,258.00	$ 51,881.28
CONCRETO 24,13MPA,(3500 PSI)	M3	0.63	$ 417,909.00	$ 263,282.67
ACERO FIGURADO 1/4" A 1" F" Y=60000 PSI	KG	36.00	$ 7,217.00	$ 259,812.00
ALAMBRE NEGRO CAL. 18	KG	2.00	$ 7,300.00	$ 14,600.00
			SUBTOTAL $	600,387.01

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HORA/Cuad. 1 Of+3 Ayu (M)	22,973.00	1.92	$ 44,108.16	4.0000	$ 176,432.64
				SUBTOTAL $	176,432.64
				TOTAL COSTO DIRECTO $	853,460.00

(Firma)
JOHN DANI NAGLES PACHON
R/L Contratista

OBSERVACIONES SUPERVISOR

(Firma)
ARQ DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR

Alcaldía de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO No 2928 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO

REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

CONTRATISTA	CONSORCIO ALSIPA R/L JOHN DANI NAGLES PACHON
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ARQ DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 15	SARDINEL 3000PSI B=0.2,b=0.15,H=0.40INC. EXC/RET	ML	1

I. EQUIPO

DESCRIPCION	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
FORMALETA SARDINEL ML 3 mts *0.4		DD	$ 1,400.73	0.14	$ 196.00
HERRAMIENTA MENOR %		%MDEO	$ 14,028.00	3.00%	$ 421.00
VIBRADOR A GASOLINA 5,5 hp		DD	$ 36,900.00	0.05	$ 1,845.00
				SUBTOTAL $	2,462.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI)	M3	0.07	$ 371,041.00	$ 25,973.00
ALAMBRE NEGRO CAL. 18	KG	0.25	$ 7,300.00	$ 1,825.00
DESMOLDANTE SEPAROL SIKA Y/O ENCOFROIL MET	KG	0.04	$ 10,811.06	$ 432.00
ANTISOL BLANCO (SIKA) 20 KILOS	KG	0.20	$ 5,222.88	$ 1,045.00
HIERRO 60.000 CORRU/RECTO 1/2"	KG	1.00	$ 4,991.67	$ 4,992.00
			SUBTOTAL $	34,267.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HORA/Cuad 1 Of+2 Ayu (M)	17,987.00	1.95	$ 35,070.00	0.4000	$ 14,028.00
				SUBTOTAL $	14,028.00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	50,757.00

(Firma)
JOHN DANI NAGLES PACHON
R/L Contratista

OBSERVACIONES SUPERVISOR

(Firma)
ARQ DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO No 2928 **DE** 2024
OBJETO DEL CONTRATO

REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

CONTRATISTA CONSORCIO ALSIPA R/L JOHN DANI NAGLES PACHON
INTERVENTOR N/A
SUPERVISOR ARQ DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 16	PLACA CONTRAPISO e = 12 cm (24.13Mpa, 3500psi)	M2	1

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR %		%MDEO	$ 36,682.00	3.00%	$ 1,100.00
MEZCLADORA DE CONCRETO		DD	$ 68,497.62	0.0089	$ 610.00
VIBRADOR A GASOLINA 5,5 hp		DD	$ 36,900.00	0.0600	$ 2,214.00
				SUBTOTAL $	3,924.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
AGUA	LT	25.2000	$ 18.68	$ 471.00
ARENA LAVADA DE RIO	M3	0.0971	$ 77,000.00	$ 7,477.00
CEMENTO GRIS (KG DEPÓS)	KG	53.9784	$ 600.00	$ 32,387.00
PLASTICO POLIETILENO CALIBRE 6	M2	1.0500	$ 920.82	$ 967.00
PUNTILLA 2" CON CABEZA	LB	0.0200	$ 2,679.25	$ 54.00
TABLA BURRA 0.15X.025X3 ORDINARIO	ML	2.0000	$ 3,043.24	$ 6,086.00
TRITURADO DE RIO	M3	0.0946	$ 75,442.42	$ 7,137.00
			SUBTOTAL $	54,579.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HORA/Cuad. 1 Of+4 Ayu (M)	27,959.00	1.95	$ 54,602.00	0.67180	$ 36,682.00
				SUBTOTAL $	36,682.00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	95,185.00

(Firma)
JOHN DANI NAGLES PACHON
R/L Contratista

OBSERVACIONES SUPERVISOR

(Firma)
ARQ DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO No 2928 **DE** 2024
OBJETO DEL CONTRATO

REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

CONTRATISTA CONSORCIO ALSIPA R/L JOHN DANI NAGLES PACHON
INTERVENTOR N/A
SUPERVISOR ARQ DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
NP 17	SUMINISTRO E INSTALACION CANECA M-121	UN	1

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR %		%MDEO	$ 71,734.00	3.00%	$ 2,152.00
				SUBTOTAL $	2,152.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
AGUA	LT	12.6000	$ 18.68	$ 235.00
ARENA DE PEÑA	M3	0.0739	$ 62,280.00	$ 4,602.00
CANECA M-121 (MALLA METALICA)	UN	1.0000	$ 1,762,688.00	$ 1,762,688.00
CEMENTO GRIS (KG DEPOS)	KG	23.1525	$ 600.00	$ 13,892.00
			SUBTOTAL $	1,781,417.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
TRANSPORTE %	5	0.01	0.05	$ 1,853,151.00	$ 92,658.00
				SUBTOTAL $	92,658.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HORA/Cuad. 1 Of+1 Ayu (M)	13,001.00	1.95	$ 25,904.00	0.06300	$ 1,594.00
HORA/Cuad 1 Of+2 Ayu (M)	17,987.00	1.95	$ 35,070.00	2.00000	$ 70,140.00
				SUBTOTAL $	71,734.00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	1,947,961.00

(Firma)
JOHN DANI NAGLES PACHON
R/L *Contratista*

OBSERVACIONES SUPERVISOR

(Firma)
ARQ DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO No 2928 **DE** 2024
OBJETO DEL CONTRATO

REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

CONTRATISTA CONSORCIO ALSIPA R/L JOHN DANI NAGLES PACHON
INTERVENTOR N/A
SUPERVISOR ARQ DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 18	PUESTA A TIERRA MASTIL LUMINARIA	UN	1

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR %		%MDEO	$ 58,502.00	3.00%	$ 1,755.00
MOLDE PARA SOLDADURA EXODERMICA		DD	$ 36,904.21	0.1000	$ 3,690.00
				SUBTOTAL $	5,445.00

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
BORNAS PARA PONCHAR CABLES 2 A 4/0	UN	1.0000	$ 10,100.00	$ 10,100.00
CABLE DE COBRE DESNUDO NO 1/0 AWG	ML	1.5000	$ 38,625.00	$ 57,938.00
SOLDADURA EXOTERMICA 150 GR	UN	1.0000	$ 28,272.32	$ 28,272.00
VARILLA COBRE 5/8" X 2.40M	UND	1.0000	$ 220,313.00	$ 220,313.00
			SUBTOTAL $	316,623.00

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HORA/Cuad. ELECTR/1 Tecn elect+1 Ayu (M	20,572.00	1.90	$ 39,001.00	1.50000	$ 58,502.00
				SUBTOTAL $	58,502.00
				TOTAL COSTO DIRECTO $	380,570.00

(Firma)
JOHN DANI NAGLES PACHON
R/L *Contratista*

OBSERVACIONES SUPERVISOR

(Firma)
ARQ DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR

Proceso Gestion de la Contratacion
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DATOS GENERALES

CONTRATO N° 2928 **DE** 2024

OBJETO DEL CONTRATO

REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

CONTRATISTA	CONSORCIO ALSIPA R/L JOHN DANI NAGLES PACHON
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	ARQ DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
NP 19	DESMONTE Y MONTAJE DE JUEGO DE NIÑOS EXISTENTE (INC. ADECUACION TUB MET, DADOS EN COCNRETO PARA CIMENTACION, SOLDADURAS, ANTICORROSIVO Y PINTURAS)	UN	

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR %		%MDEO	$ 1,778,850.78	3.00%	$ 53,366.00
EQUIPO OXICORTE		HR	$ 9,643.02	6.000	$ 57,858.12
PULIDORA MANUAL CON DISCO (ALQUILER)		DD	$ 28,739.97	3.000	$ 86,219.91
VOLQUETA (VIAJE 5M3 Max.10 KM)		VJ	$ 71,849.22	4.000	$ 287,396.88
				SUBTOTAL $	484,840.91

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CONCRETO 3000 PSI (210N)	M3	0.270	$ 371,041.00	$ 100,181.07
TUBO GALVANIZADO IMC 4"	ML	4.800	$ 73,250.00	$ 351,600.00
TUBO GALVANIZADO 2"	ML	2.400	$ 39,788.44	$ 95,492.26
ANTICORROSIVO ROJO TIPO PINTUCO	GLN	5.000	$ 33,915.00	$ 169,575.00
DISCO ABRACOL PULIR CUCHILLA 6"	UN	14.000	$ 19,741.94	$ 276,387.16
ESMALTE SINT.TIPO PINTULUX PINTUCO	GLN	5.000	$ 69,701.15	$ 348,505.75
LIJA DE AGUA PROFNAL *31*5 GRANO 120-150-180	UN	25.000	$ 1,692.17	$ 42,304.25
SOLDADURA ASW E6013 X 3/32	KG	15.000	$ 10,752.31	$ 161,284.65
			SUBTOTAL $	1,545,330.14

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M³ o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	0.00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HORA/Cuad 1 Of+2 Ayu (M)	17,987.00	1.95	$ 35,074.65	20.00	$ 701,493.00
Cuadrilla HH metalicas (Oficial 1ª + Ayudante+Soldador)	19,757.40	1.95	$ 38,526.93	27.96	$ 1,077,357.78
				SUBTOTAL $	1,778,850.78
				TOTAL COSTO DIRECTO $	3,809,022.00

(Firma)
JOHN DANI NAGLES PACHON
R/L Contratista

OBSERVACIONES SUPERVISOR

(Firma)
ARQ DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR

LISTADO DE INSUMOS DE REFERENCIA PARA CREACIÓN DE APUS ÍTEMS NUEVOS NO PREVISTOS

CR 24 A 8 125 CONJ CERRADO LA CABAÑA CA 1 IN 9. VILLAVICECNIO-META
SHARKYING10@GMAIL.COM-3222169909



Villavicencio

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
LISTADO DE INSUMOS 2021
ANEXO 1
RESOLUCION 1010-67,27-193
3 de agosto de 2021

	INSUMOS EQUIPOS		SIM 2021
2-N	EQUIPO		
378	CORTADORA DE LADRILLO	DD	30753.51191
1879	EQUIPO (CORTAD, SIERRA, PLANEAD, ELECTRICI....) %	%	0
814	EQUIPO DE TOPOGRAFIA incl.nivel precisión,estación	MES	3321379.287
3511	Equipo Decaldera y señales de seguridad	HR	219243.0166
1645	EQUIPO DIFERENCIAL 1 TON	DD	30753.51191
3101	EQUIPO DIFERENCIAL 5 TON	DD	36904.2143
54	EQUIPO TOPOGRAFIA: estación total, nivel, GPS	DD	156965.9248
3245	ESCALERA EXTENCIBLE EN AL. DE 6 Mts.	DD	21464.44429
922	ESCALERILLA Trans. VERTICAL	DD	998.8740669
843	FORMALETA ALCANTAR O POZO INSP. 36"	DD	3213.126925
3617	FORMALETA METALICA SEGUN DISEÑO	DD	676577.2621
3981	FORMALETAS METALICAS GEBOLSAS 14M3 ACERO	DD	145386.7167
3085	GRUA OPERACION EN CALIENTE. Incluye conduct	HR	493771.0064
2626	GUADAÑADORA DIA	DD	34900
47-N	EQUIPO LIVIANO ALQUILER		
1420-N	EQUIPO MEDICIONES	HR	40289.68
3410-N	FORMALETA CONCRETOS COSTO GLOBAL M3	M3	103800
3417-N	VIBRADOR DE CONCRETOS	HR	9861
5079-N	APISONADOR TIPO CANGURO A GASOLINA 3 HP	HR	9597.66
5280-N	VIBROCOMPACTADORA DIESEL	DIA	61761
5347-N	APISONADOR TIPO CANGURO A GASOLINA 3 HP	DIA	76781.28
5564-N	COMPACTADOR MANÚAL TIPO PLANCHA VIBRATORÍA	HR	10380
48-N	EQUIPO	0	0
368	ANDAMIO TUBULAR (SECC.)	DD	1290
396	PLANCHONES ALQUILADOS	DD	4090.76
388	MEZCLADORA DE CONCRETO	DD	68497.62
135-N	GRÚA EXTENSIÓN PARA MONTAJE DE POSTES	HR	88230
2745	GRUA EXTENSION PARA POSTES	HR	107637.2917
1843	TIRFOR	DD	28739.97
226-N	EQUIPOS DE TENSIONAMIENTO	HR	174588.61
2575	MOTOBOMBA BARNES MOD 2020HCE 7,5 HP TRIF	UN	3105641.3
2719	ELECTROBOMBA 1515HHE-5 HP Barnes	UN	3218589.39
1512-N	MANILAS	DIA	7386.44
49-N	REGISTRO POR DEFECTO		
376	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM	HR	32048.25
2423	GUADAÑADORA	HR	20760
4051-N	CAMION 350	HR	62280
1825	CARROTANQUE	HR	62280
3650	COMPRESOR ESTACIONARIO	DD	7525.5

	INSUMOS EQUIPOS		SIM 2021
4085-N	EQUIPO AUTOPROPULSADO PARA PINTURA TERMOPLASTICA	DIA	440615.43
4086-N	EQUIPO DE DEMARCACIÓN	HR	26731.84
4087-N	EQUIPO MANUAL APLICADOR DE BANDAS	HR	29583
4094-N	FORMALETA MADERA SARDINEL ML	ML	2802.6
4123-N	HIDROLAVADORA MOTOR A GASOLINA PRESION 3200 PSI CAUDAL 14-15 LT/MIN	HR	2161.12
4149-N	PLANTA ELECTRICA 4KW	HR	8096.4
8028	RETROEXCAV SOBRE ORUGA, CAPACI 0,7 A 1M3 INC	HR	259396.2
4952-N	MEZCLADORA DE CONCRETO A GASOLINA 2 BULTOS	DIA	62280
1933	BULLDOZERD8K, o Retroexcav.20T o sim inc ope y com	HR	301020
4966-N	CARGADOR FRONTAL 125 HP MOTOR RPM 2300	HR	166080
4975-N	CORTADORA DE PAVIMENTO	DIA	74295.51
4994-N	EQUIPO DE TOPOGRAFÍA (ESTACION TOTAL A LOS 5", NIVEL AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN Y ELEMENTOS)	HR	27280.72
4998-N	GUADAÑADORA CILINDRAJE 41.5 CM3, LONGITUD DEL MANGO 1450 MM, PESO 7.4 KG	HR	6383.7
479	MOTOBOMBA A GASOLINA DE 3"	DD	30900
2355	MOTOBOMBA A GASOLINA DE 4"	DD	77664
5016-N	MOTOBOMBA 6" DE ENTRADA Y SALIDA AUTOCEBANTE DIESEL. ALQUILER DÍA INCLUYE COMBUSTIBLE Y MANGUERA DE 6 M.	DIA	190368.2
5017-N	MOTOSIERRA 93.6 CM3 - 7.1 HP, 45-90 CM - 7.9 KG	HR	9705.3
5057-N	KIT ARNES Y ESLINGA	DIA	10162.02
372	BULLDOZER D-6 CATERPILLAR	HR	228360
5076-N	CARROTANQUE DE AGUA (1000 GALONES)	HR	62280
1824	IRRIGADOR DE ASFALTO (2500 GLN)	HR	112241
5146-N	MOTONIVELADORA 140 HP ANCHO CUCHILLA 3,66 M 11 TONELADAS	HR	186840
5147-N	MOTONIVELADORA 215 HP ANCHO CUCHILLA 4,27 M 18 TONELADAS	HR	217980
3473	RETROCARGADOR	HR	222339.6
5172-N	VIBROCOMPACTADOR 10 TONELADAS 153 HP	HR	134940
5177-N	COMPACTADOR NEUMATICO	HR	129750
5178-N	COMPACTADOR NEUMATICO 70 HP 13 TON	HR	171270
5180-N	COMPRESOR PARA BARRIDO Y SOPLADO	HR	23355
1633	FINISHER 150 hp	HR	276108
5189-N	VIBROCOMPACTADOR RODILLO 10 TONELADAS TIPO SD100	HR	166080
2037	CORTADORA DE DISCO DIAMANTADO	DD	77850
5240-N	ESPARCIDOR DE GRAVILLA. ANCHO DE ESPARCIMIENTO 3.10 M	HR	77850
2887	REGLA VIBRATORIA LIVIANA 4 mts	DD	46710
2970	BOMBA DE INYECCION TIPO DIAFRAGMA	HR	31264.56
5330-N	BOMBA PARA GATO TENSIONAMIENTO	HR	155700
5331-N	BOMBEO DE CONCRETO BOMBA ESTACIONARIA CON BRAZO	M3	59290.56
5341-N	CAMION GRUA CON BRAZO TELESCOPICO	HR	120330
5342-N	CAMISA PARA PILOTE D=1.00 M	UN	51889.62
5343-N	CAMISA PARA PILOTE D=1.20 M	UN	58927.26
5400-N	DIFERENCIAL 3 TON	HR	5651.91
5408-N	DOBLAMIENTO CAMISA PERDIDA DIAMETRO 0.8-1.5M	UN	21175.2
5411-N	DUCTOS METALICOS FLEXIBLES	ML	10120.5
2782	EQUIPO OXICORTE	DD	9643.02
719	EQUIPO DE PERFORACION TRACK-DRILL/ROTARIO DE	(en blanco)	181650
5415-N	EQUIPO DE PILOTAJE (INCLUYE OPERARIOS, MOVILIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE)	HR	700650

	INSUMOS EQUIPOS		SIM 2021
1364	MOTONIVELADORA 120 HP	HR	184784
52-N	FORMALETAS		
5242-N	FORMALETA METÁLICA SARDINEL	ML	2458.09
5802-N	FORMALETA METÁLICA CUNETA	ML	2546.84
53-N	EQUIPOS ALQUILER		
8-N	HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN TIPO HIDROJET 1700 PSI (BOQUILLA ROTATIVA)	DIA	72826.08
4108	TALADRO PERCUTOR DE 1/2" TIPO WALT	DD	14303.64
N108G	TALADRO PERCUTOR DE 3/4 TIPO WALT	DD	30901.3
4183-N	TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4"	HR	3944.4
5524-N	TALADRO INDUSTRIAL	HR	5158.86
5525-N	TALADRO PERCUTOR CON BROCA TUNGSTENO	HR	13426.53
2789	TALADRO PERCUTOR DE 3/4" TIPO WALT	DD	35924.96
401-N	RANURADORA	UN	2100
402	VOLQUETA (VIAJE 5M3 Max.10 KM)	VJ	71849.92
410-N	MEZCLADORA DE CONCRETO	DIA	68497.62
400	VIBRADOR A GASOLINA 5,5 hp	DD	36900
420-N	ANDAMIO TUBULAR	DIA	908.18
423-N	CAMILLA EN MADERA PLANCHON	DIA	977.7
380	EQUIPO SOLDADURA ELECTRICA AC/DC 110/220	DD	86219.91
1781	PULIDORA DESTRONCADORA AGUA	DD	28739.97
1737	PISTOLA DE FIJACION DX35	HR	5029.49
3248	VIBRO INGERSOLL RAND 3 TONELADAS	DD	5611.01
386	FORMALETA SARDINEL ML 3 mts *0.4	DD	1400.73
821-N	EQUIPO OXICORTE	DIA	57479.95
1924	COMPRESOR PORTATIL 1 HP 80 LBS	DD	50294.95
2939	PLANTA ELECTRICA MOD.4T 2600	DD	65000
2176	PULIDORA MANUAL CON DISCO (ALQUILER)	DD	28739.97
1957	HIDROJET 1700 PSI (BOQUILLA ROTATIVA) .	DD	72827.09
1638	ANDAMIO TUBULAR (SECC.)	MES	17243.98
3241	PULIDORA MANUAL SIN DISCO	DD	20117.99
3792	GRUA EXTENSION MONTAJE ESTRUCT METAL/ POSTES	DD	718499.28
977-N	TORNO ELECTRICO	HR	71849.92
1163-N	FORMALETA ENTREPISO	DIA	3999.42
2847	MOLDE TIPO TAPETE PARA CONCRETO ESTAMPADO	DD	14369.99
1353-N	EQUIPO GPS DE GEOREFERENCIACIÓN CON MEDIDOR LÁSER	GLB	393402

Villavicencio

	INSUMOS EQUIPOS		SIM 2021
2216	BOMBA CONCRETO	M3	45220
383	FORMALETA ENTREPISO 4 SEMANAS	M2	3424.711087
2054	FORMALETA METALICA	ML	984.1123812
3805	PALETA PARE SIGA 30cm	UN	22117.92577
1898	TIRO PISTOLA NEUMATICA HITTELL	UN	3690.42143
2366	VOLQUETA (M3/KM)	M3-KM	1190
3764	TRANSPORTE RETRO EXCAVADORA 20 T	HR	3690.42143
2870	VARILLA 1/2" sosten formaleta L= 0,4 mts (5 uso)	UN	861.0983336
3642	APAJARO METALICO P30KG PAR	DD	3106.104703
3644	ARNES DE SEURIDAD	DD	9517.596867
2517	BOMBA CONCRETO (PUENTES)	HR	58933.56995
3164	HERRAMIENTA MENOR	%MDEO	0
2936	HERRAMIENTA MENOR %	%MDEO	0
2948	HERRAMIENTA MENOR ELECTRICA %	%MDEO	0
3980	MAQUINA COSER SACOS, PORTATIL DOBLE COSTURA	DD	73685.41454
3252	MARTILLO ROMPEDOR	DD	61507.02383
3586	MOLDE PARA SOLDADURA EXODERMICA	DD	36904.2143
391	MOTOBOMBA A GASOLINA DE 2"	DD	28900
2514	MOTOBOMBA DIESEL 6"	DD	89233
3209	MOTOSIERRA ESPADA GRANDE STIHL 660	DD	43054.91668
3208	MOTOSIERRA ESPADA PEQUEÑA STIHL 250	DD	27836
1366	MOTOSIERRA STHILL 660 (10.000 RPM)	HR	4362.5
2791	PLANTAS ELECTRICA MOD.4T 2600	DD	79959.13097
3116	NIVEL DE PRECISION	DD	35271.4743
392	PARAL TELESCOPICO 2.2 A 3.50 MTS (UN)	MES	10500
3640	PESCATE 3,10X0,0,38M CARGA 5548N	DD	9234.664557
3146	PISTOLA SIKADUR ANCHOR FIX 4 doble embolo	HR	1845.210715
3979	PLANTA DE ENERGIA 120V-220V	DD	117109.3734
3512	PLANTILLAS MARCAS VIALES	HR	12746.71562
3639	PLATAFORMA ACM 2.65X0.83M CARGA MAX 410 KG	DD	73808.42859
2482	RANA A GASOLINA/DIA	DD	46321

	INSUMOS EQUIPOS		SIM 2021
SE-3	Retroexcavadora de oruga Cat 320	Hr	214200
SE-4	Arnes trabajo multiproposito	Un	24500.39
SE-5	Casco de seguridad	Un	15000.24
SE-6	Overol 2 piezas en dril	Un	32000.51
SE-7	Andamio colgante	Ms	33000.53
SE-8	Andamio tubular- seccion	Ms	17875
SE-9	Andamio tubular 1.5x1.5m cruceta, seccion	Dd	1290
SE-10	Cercha de 3 mt. 1 1/2x1/8"	Dd	150
SE-11	Cinturón de seguridad	Sm	45000.72
SE-12	Juego poleas con antenaya	Un	141522.25
SE-13	Juego uniones giratorias	Dd	195
SE-14	Mordaza para halar cable	Un	7888.13
SE-15	Paral metálico 2 a 3.28 mts.	Ms	10500
SE-16	Paral telescopico 2 a 4 mts.	Dd	309
SE-17	Paral telescopico 2.2 mts.	Dd	280
SE-18	Trinquetes con agarradoras	Dd	7389.12
SE-19	Andamio tubular 1.50x1.50 cruceta	Ms	17852
SE-20	Formaleta m2 con accesorios	Dd	3100
SE-21	Formaleta steel ply 1.20x0.10m	Ms	10231
SE-22	Planchon 2.5 - 3.0 mt - alquiler	Dd	715
SE-23	Regla vibratoria liviana 4.5 mt	Dd	53500
SE-24	Cortadora de pavimento-concreto	Dd	40600.65
SE-25	Equipo soldadura electrica ac/dc 110/220	Dd	86219
SE-26	Mezcladora a gasolina	Dd	30160.49
SE-27	Mezcladora 3 sacos electrohid.	Dd	74650
SE-28	Pulidora manual con disco	Dd	28740
SE-29	Vibrador concreto a gasolina	Dd	27850
SE-30	Vibrocompactador RD-11 para 10 ton.	Hr	109400
SE-31	Vibrocompactador gasolina 4 tiempos	Dd	52580
SE-32	Herramienta menor	%	20253
SE-33	Cargador frontal balde, combustible	Dd	491250

Villavicencio

	INSUMOS MATERIALES		SIM 2021	
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD		
813	ACOPLE SANITARIO 1/2" X 7/8" PLASTICO-PLASTICO	UN	$	4,512.45
4042	ACOPLE SANTARIO	UN	$	2,942.50
3049	CINTA ACERO INOXIDABLE 5/8"	ML	$	2,201.00
3737E	CINTA ACERO INOXIDABLE 5/8".	ML	$	3,075.35
950	CINTA AISLANTE	UN	$	1,845.21
3612	CINTA AISLANTE COLORES	UN	$	5,146.91
3611	CINTA AISLANTE NEGRA	UN	$	5,146.91
3720	CINTA AISLANTE PROFESIONAL 19MMX20M	ML	$	895.54
41B-N	**ADITIVOS PARA CONCRETO**			
3487	ANTIHONGOS- SIGMAG Y/O SIMIL	GAL	$	76,781.28
4040	ANTIQUE BLANCO 45 X 45 CM CL 1	M2	$	25,217.88
638	ANTISOL BLANCO (SIKA) 20 KILOS	KG	$	5,222.88
336	DESMOLDANTE SEPAROL SIKA Y/O ENCOFROIL MET	KG	$	10,811.06
337	MORTERO LISTO IMPERM SIKALISTO PISO 50 KG	KG	$	1,705.59
3647	SELLADOR EN POLIURETANO NP1	ML	$	17,915.05
2277	SEPAROL SIKA 15 KG NEUTRO	KG	$	14,101.39
678	SIKA 1 4 KILOS	KG	$	16,576.75
4102	SIKA ANCHORFIX X300ML	UN	$	89,357.00
3147	SIKA PLASTOCRETE DM	KG	$	10,601.35
2872	SIKA ROP (CORDON ELASTOMERICO) 3/8"	ML	$	1,291.00
710	SIKADUR 32 PRIMER 0.1 KILOS	KG	$	51,389.12
3771	SIKADUR ANCHOR FIX-4 X 600 ML	ML	$	64,562.38
3145	SIKADUR ANCHORFIX 4	KG	$	89,357.00
3982	SIKAFLEX -401 PAVEMENT SL X 1 GALON	GAL	$	324,426.00
2746	SIKAFLEX-1A BLANCO	UN	$	26,398.81
2886	SIKAFLEX-1A NEGRO/GRIS 305 CC	UN	$	43,322.00
2278	SIKAGUARD- DECOR 18 KILOS	KG	$	50,447.26
2846	SIKAPISO-DECOR 50 KILOS	KG	$	5,279.00
709	SIKASET L (ACELERANTE) 5 KILOS	KG	$	19,599.40
37A-N	**AGREGADOS PETREOS**			
2363	ARENA DE PENA	M3	$	62,280.00
60	ARENA DE PEÑA	M3	$	62,280.00
3136	ARENA LAVADA DE RIO	M3	$	51,900.00
867	ARENA LAVADA DE RIO (PLANTA)	M3	$	62,280.00
64	ARENA LAVADA DE RIO	M3	$	77,000.00
63	BALASTRO DE RIO	M3	$	22,562.22
3309	RECEBO BASE B-200	M3	$	45,000.00
2884	BASE GRANULAR SUELTA T.M 1 1/2"(PLANTA) .	M3	$	68,508.00
2478	CARBONILLA PARA CAPA FILTRATNTE 2 1/2"	M3	$	49,354.86
2181	GRAVA TRITURADA 1"	M3	$	70,000.00
868	GRAVA TRITURADA 1/2"	M3	$	32,477.00
2365	GRAVA TRITURADA 3/4 (PLANTA)	M3	$	87,500.00
869	GRAVA TRITURADA 3/4"	M3	$	76,000.00
2924	GRAVA TRITURADA FILTRO	M3	$	77,000.00
2725	GRAVILLA TRITURADA 1 1/2"	M3	$	54,572.37

	INSUMOS MATERIALES		SIM 2021	
	515 PIRLAN ALUMINIO DORADO	ML	$	1,645.62
	1166 ANTICORROSIVO CROMATO DE ZN VERDE	GAL	$	55,593.32
	1025 ANTICORROSIVO ROJO TIPO PINTUCO	GAL	$	33,915.00
	3474 ANTICORROSIVO ROJO TIPO PINTUCO	GAL	$	33,915.00
	1953 ANTICORROSIVO TIPO PINTUCROM	GAL	$	9,597.66
	2863 BARNIZ EXTERIOR BRILLANTE TRANSP. (TIPO KOLOR)	GAL	$	73,186.19
	1153 BARNIZ INTERIOR MATE (PINTUCO)	GAL	$	56,264.53
	3461 DIVISIONES ACERO INOX PARA BAÑOS PUBLICOS INC	UN	$	734,393.86
	2877 DOBLAMIENTO CAMISA PERDIDA. DIÁMETRO 0.8 -1.5 M	UN	$	21,175.20
	1037 ESMALTE DOMESTICO(INT) ALTA CALIDAD	GAL	$	48,920.00
	1811 ESMALTE SINT.TIPO PINTULUX PINTUCO	GAL	$	69,701.15
	4035 ESPACATO GRESS 12X4	M2	$	33,090.78
	1952 ESTUCO PLASTICO	GAL	$	23,831.34
35-N	**ESTUCOS Y PINTURAS**			
	1056 MASILLA GRIS TIPO PINTUCO	GAL	$	82,241.99
	3519 PINTURA ACRILICA NEGRA PINTUCO O SIM	GAL	$	72,556.20
	1135 PINTURA BASE DE AGUA TIPO KORAZA	GAL	$	76,570.54
	1167 PINTURA PARA TRAFICO BLANCO, AMARILLO	GAL	$	91,240.20
	3797 PINTURA POLIURETANO	GAL	$	82,653.87
	2762 PINTURA VINILO TIPO 1 (LAVABLE TIPO VINILTEX)	GAL	$	67,283.76
	4014 PINTURA ANTIHONGOS IMPERCICRIL GRIS	GAL	$	109,482.50
	3165 PINTURA EPOXICO	GAL	$	90,144.69
	3661 PINTURA VINILO GRIS BASALTO	GAL	$	52,530.69
	3525 PLASTICO EN FRIO DEMARCAC PAVIMENTO PINTUCO C	GAL	$	63,301.80
36A-N	**FERRETERIA**			
	3893 ALTERNADOR AUTOM CON ADICION MOTOBOMBAS	UN	$	282,932.31
	385 AMARRE METALICOS	UN	$	141.02

	INSUMOS MATERIALES		SIM 2021	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD		
	3588 CINTA AUTOFUNDENTE	UN	$	39,350.00
	412 CINTA DE ENMASCARAR 24MMX 40 M TESA	UN	$	6,900.00
	2185 CINTA FLEXIBLE PVC. 0-22 15 ML	ML	$	41,073.66
2183V	CINTA FLEXIBLE PVC. V-10 30 ML	ML	$	14,116.80
2184V	CINTA FLEXIBLE PVC. V-15 30 ML	ML	$	23,147.40
	1736 CINTA PAPEL TOPEX 30 MTS, ANCHO 50 MM	UN	$	4,935.48
	3587 CINTA PREMIUN AISLANTE NEGRA	UN	$	8,676.18
ND46	Cinta Teflón. Uso General Ancho 1Pulg x 10 m	UND	$	20,900.00
	416 CINTA TEFLON 1/2" X 10 MTS	UN	$	2,961.30
	3484 CLIP FIJACION CUBIERTA MALLA GALLINERO	UN	$	430.55
	448 DISCO ABRACOL PULIR CUCHILLA 6"	UN	$	19,741.94
	475 DISCO CORTE METAL 7"X1/8" DEWALT	UN	$	11,286.74
	476 DISCO DESBASTE METAL 7" X 1/4 DEWALT	UN	$	13,086.09
	2269 DISCO DIAMANTADO (CORTADORA DE PAVIMENTO) 14"	UN	$	105,814.42
	4080 EMPAQUE ESTRELLA VITRAL EC-453	ML	$	2,000.00
	3043 FRESCASA CON FOIL 31/2" AC.0.95NRC, RT11.18.6M2	RLL	$	1,300.00
	215 GANCHO PLACA OND.150MM ETERNIT	UN	$	590.91
	1639 GRAMA TRENZA	M2	$	5,938.40
	1874 GRANIPLAST	KG	$	3,243.32
815A	GRANITO 30 KG	BLT	$	29,650.00
	529 HOJA DE SEGUETA	UN	$	4,921.39
	3440 LIMPIADOR/SOLDADURA PVC 1	GAL	$	50,999.02
	3844 SOLDADURA 95-55 PLATA	LB	$	12,437.43
	2767 SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8" 6013	KG	$	9,653.40
	3753 2018 SOLDADURA CADWELD 115 GRAMOS	UN	$	21,308.49
	672 SOLDADURA 1/4 SOLDATUBOS	GAL	$	87,562.90
	2918 SOLDADURA CADWELLD	UN	$	26,389.74
	2824 ADHESIVO NOVAFORT PAVCO 310 ML	UN	$	62,016.49
	679 LIMPIADOR 1/4 SOLDATUBOS	GAL	$	36,522.59
	908 LIMPIADOR REMOVEDOR 1/8 NOVAFORT PAVCO	UN	$	23,502.31
2060E	LIMPIADOR REMOVEDOR 760 GR.	UN	$	39,350.00

Villavicencio

	INSUMOS MATERIALES		SIM 2021	
	691 PEGANTE COLBON MADERA	GAL	$	53,585.28
	665 PEGANTE DENSO FIBRATEX	GAL	$	20,164.99
	2902 PEGANTE EPOXICO SEÑAL VIAL (1.6 KG)	KG	$	34,890.00
	3503 PELICULA ANTIGRAFITI PARA SEÑALES VERTICALES	M2	$	230,650.11
	1355 SILICONA 250 MILI LITROS	UN	$	19,600.93
	2095 SOLDADURA ASW E6011X1/8	KG	$	9,165.90
	1009 SOLDADURA ASW E6013 X 1/8	KG	$	10,533.74
	1010 SOLDADURA ASW E6013 X 3/32	KG	$	10,752.31
	1410 SOLDADURA AWS E7018 X1/8" WIS 18	KG	$	9,165.90
	1826 SOLDADURA DE ESTAÑO	KG	$	21,998.17
	348 SOLDADURA ELECT. 1/8 WEST ARCO E6011	KG	$	7,332.72
	531 SOLDADURA ELECTRICA DE 1/8	KG	$	9,588.95
	1906 SOLDADURA ELECTRICA DE 3/32 6013	KG	$	10,251.29
	841 SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4 GL	UN	$	29,718.00
1912E	WALL PLATE AJUSTE SENCILL	UN	$	8,610.98
	3318 SOLDADURA EXOTERMICA 115G	UN	$	15,000.00
	439 LIJA DE AGUA PROFNAL *31*5 GRANO 120-150-180	UN	$	1,692.17
	440 LIJA DE AGUA PROFNAL *31*5 GRANO 220 A 600	UN	$	1,100.00
	438 LIJA DE AGUA PROFNAL *31*5 GRANO 60-80-100	UN	$	1,692.17
	1883 LIJA PARA MADERA	UN	$	1,692.17
	3834 LIMPIADOR 7070	UN	$	2,115.21
	1501 LUBRICANTE 500 GR TIPO PAVCO	UN	$	23,842.86
	2183 MALLA POLISOMBRA AL 80% * 4 M DE ANCHO	M2	$	2,804.77
	689 MERULEX I.F.S. TRANSPARENTE 3 KG	GAL	$	60,805.19
813A	MINERAL ALEMAN	KG	$	11,309.31
	814 MINERAL AMERICANO	KG	$	13,000.00
	3809 PEGANTE O SELLANTE FUERZA MEDIA	UN	$	46,957.63
	1344 PINTURA CANCHAS (ESMALT EPOXICO)	GAL	$	112,670.08
	2931 PLASTICO POLIETILENO CALIBRE 6	M2	$	920.82
	3791 PLEXIBOND PRIMER COATING	M2	$	9,447.93
	2868 REMACHE POP 1/4" X 1/8"	UN	$	42.31

	INSUMOS MATERIALES		SIM 2021	
3493	ANGULO 2"X1/4	ML	$	27,069.89
3494	ANGULO 2"X1/8	ML	$	15,992.50
3953	ANGULO 2"X3/8"	ML	$	32,824.06
2587	ANGULO 2"X3/16"	ML	$	20,181.55
1409	ANGULO 1 1/2"X3/16"	ML	$	12,766.60
2272	ANGULO 1 1/2"X3/16"	ML	$	12,766.60
2935	ANGULO 1 1/2"X3/16"	ML	$	12,766.60
2543	ANGULO 1 1/2"X1/8"	ML	$	9,285.29
3142	ANGULO 1 1/4"X1/8"	ML	$	7,517.00
4087	ANGULO CHAPETA 1 1/4*1 1/4* 1/8 CRUDO	ML	$	14,945.65
2530	ANGULO 1 1/4"X1/8" (3.0MM X 30MM)	ML	$	8,733.94
2542	ANGULO 1"X1/8" (2.5MM X 25MM)	ML	$	5,957.00
2532	ANGULO 1"X3/16" (4.5MM X 25MM)	ML	$	10,444.37
2049	ANGULO 3/4"X1/8" (REFUERZO DIAGONAL)	ML	$	3,893.58
6A-N	HIERROS, ACEROS Y MALLAS			
3486	LAMINA GALV. REVESTIDA EN ZINC CAL. 16 FORMATO1X2	UN	$	154,997.70
3540	LAMINA GALV. REVESTIDA EN ZINC CAL. 20 FORMATO1X2	UN	$	159,672.23
3059	LAMINA C.R CAL.16 1X2 M (1,52 MM) CORPACERO	M2	$	3,601.50
31	LAMINA C.R CAL.20 1X2 M (0,91 MM) CORPACERO	UN	$	63,859.55
547	LAMINA COLD ROLLED CAL.12 1X 2 M (2.66MM) CORPACERO	UN	$	192,248.46
548	LAMINA COLD ROLLED CAL.14 (1.90MM) 1X2 M	UN	$	107,881.25
30	LAMINA COLD ROLLED CAL.18 (1,20MM) 1X2 MTS	UN	$	75,326.80
2878	LAMINA HR A36 1.0X2. (2,5MM)	UN	$	131,618.40
2794	LAMINA HR 1/8" 1.0 X 2.(3 MM)	UN	$	295,082.00
2799	LAMINA HR 3/16" X 1,2 X 2,4 MTS (4 MM)	UN	$	299,327.33
2273	LAMINA HR ALFAJOR 1.00 X3.00 X3MM, (1/8")	M2	$	96,741.16
4015	LAMINA GALV. CAL. 16 1 X2M.	M2	$	189,939.00
1730	LAMINA GALV. CAL. 16 1 X2M.	UN	$	189,939.00
188	LAMINA GALV. CAL. 18 1 X2M	UN	$	153,400.90
3706	LAMINA GALV. CAL. 20 X 1.5M	ML	$	215,274.58
4017	LAMINA GALV. CAL. 20 1 X 2 M	M2	$	56,843.99

	INSUMOS MATERIALES		SIM 2021	
ND34	ESCALERA TIPO GATO ACCESO A CAJA DE LAVADO Y REBOSE (PARALES ANG.2+1/2"X1/4", PASO C/0.30M TUB3/4", PLATIN.ARC.2"X1/4", 6PLATIN.1+1/4"X3/16", PINTURA EPOXICA) ACERO INOXIDABLE	UND	$	1,487,500.00
ND19	ESCALERA TIPO GATO ACCESO A TANQUE DE ALMACENAMIENTO (PARALES ANG.2+1/2"X1/4", PASO C/0.30M TUB3/4", PLATIN.ARC.2"X1/4", 6PLATIN.1+1/4"X3/16", PINTURA EPOXICA) ACERO INOXIDABLE	UND	$	1,368,500.00
3132	PERFIL PROTECTOR ESCALERA ALUMINIO	ML	$	3,813.44
3096	PERFIL PROTECTOR ESCALERA BRONCE	ML	$	48,868.00
3648	PERFIL RECTAN 150X50 4MM	ML	$	82,110.00
3957	PERFIL RECTANGULAR CL 14 PHR	ML	$	29,330.00
3135	PERFIL U 3"X11/2"X 1/4"	ML	$	16,823.40
3200	PERSIANA DE VENTILACION 0,6 X 0,25 ESP POLICIA N	UN	$	497,091.16
519	PLATINA 11/4" X 3/16"	ML	$	20,437.50
521	PLATINA 2" X 3/16" GEN	UN	$	32,700.00
529A	PLATINA 3" X 1/4" GEN	ML	$	15,688.80
3476	PLATINA E=4MM ANCHO 12 CM	ML	$	2,820.28
3651	PLATINA40X30 DE 1/25 SEPA PUNTA MET PVC D=1 Y	ML	$	110,712.64
45A-N	**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITAR**			
N08	SELLANTE PARA BORDES RECORTADOS	UN	$	1,827.00
N3400N	CHAZO CONCRETO EXPANSIVO 5/16X1-1/2	UN	$	650.00
ND35	CODO REVENTILADO 4"X2" EN PVC SANITARIO	UND	$	32,154.00
ND36	TRAGANTE O REJILLA CUPULA 5"X3" INCLUYE TORNILLOS DE FIJACION	UND	$	24,900.00
N3165T	REJILLA CÚPULA 8 PULG X 6 PULG ALUMINIO TUBERÍA 4 PULG	UN	$	99,000.00
N3166T	REJILLA CÚPULA 5 PULG X 4 PULG ALUMINIO TUBERÍA 4 PULG	UN	$	24,900.00
39A-N	**MADERAS**			
2412	CUARTON ABARCO 50X100X300 MM	UN	$	25,382.49
891	DURMIENTE ORDINARIO 3MX4CMX4CM	ML	$	5,077.67
11	DURMIENTES EN ORDINARIO 5 X.5 X3	ML	$	1,374.89
2184	LISTON .05X.05X3.00 ORDINARIO	ML	$	2,230.70
1713	LISTON 5*5 ABARCO (INMUNIZADO)	ML	$	2,230.70
2349	LISTON 5*5 ABARCO FLORMORADO	ML	$	12,973.28
1717	LISTON M.H. PINO	M2	$	11,986.18
N-084	LISTON DE MADERA3X0,03X0,02MT	ML	$	4,760.00

	INSUMOS MATERIALES		SIM 2021	
	3008 PISO MADERA LAMINADO 10MM T.AC432 COLOR ROBLE PARÍ	M2	$	61,384.01
	284 PATERNIT 1/8 GALON PROVICOL	GAL	$	19,741.94
	940 REPISA 3X.08X.04 ORDINARIO	ML	$	3,680.18
	15 REPISA 5 X.10X3 ORDINARIO DURO	UN	$	11,328.11
	1715 REPISA 5*10 ABARCO/FLOR MORADO (INMUNIZADO)	ML	$	11,894.53
	1784 TABLA BURRA 0.07X.025X3 ORDINARIO	ML	$	922.61
	1785 TABLA BURRA 0.08X.025X3 ORDINARIO	ML	$	9,902.63
	1787 TABLA BURRA 0.10X.025X3 ORDINARIO	ML	$	2,523.47
	28 TABLA BURRA 0.15X.025X3 ORDINARIO	ML	$	3,043.21
	26 TABLA BURRA 0.20X.025X3 ORDINARIO	ML	$	6,823.73
	941 TABLA BURRA 0.25X.025X3 ORDINARO	ML	$	9,098.76
	1983 TABLA BURRA 0.30X0.03X3 ORDINARO	ML	$	10,727.80
	942 TABLA BURRA 0.30X0.03X3 ORDINARO	ML	$	10,727.80
	933 PLANCHON ORDINARIO 3X.20X.04	ML	$	9,859.58
	2822 PLANCHON ABARCO 50X.250X300 MM	ML	$	21,314.25
J005	TABLA BURRA 30X2.2.5cm X 2.9m (ORDINARIO)	UN	$	22,912.35
10-N	**MAMPOSTERIA LADRILLOS Y BLOQUES**			
	481 BLOQUE #4 30X20X10	UN	$	1,410.14
	873 BLOQUE #5 30X20X12	UN	$	1,427.06
	2456 BLOQUE ABUJARDADO (14*19*39) T. PIEDRA	UN	$	3,257.42
	3302 LADRILLO PRENSADO STA/FE 24.5X12X5.5 FAB.	UN	$	1,097.08
	2416 LADRILLO REJILLA (5 HUECOS)	UN	$	831.99
	2215 LADRILLO REJILLA GRESS .25M2T06	UN	$	1,198.62
	2438 LADRILLO TOLETE RECOCIDO 20X10X6	UN	$	805.00
	661 MANTO MORTEPLAS 3 MM. AL-300	M2	$	20,023.96
	2250 LADRILLO PRENSADO LIVIANO ESTRUCTURAL	UN	$	900.00
	417 ESTOPA X 1 KILO	KG	$	7,077.55
	680 LIMPIADOR 1/8 SOLDATUBOS	GAL	$	23,502.31
	2996 HULE BLANCO	M2	$	4,920.56
	655 IGAS GRIS (SELLANTE) 5 KILOS	KG	$	16,244.00
	360 INMUNIZANTE MERULEX I.A. TRANSPA . 3.5 KLOS	KG	$	22,255.14

Villavicencio

INSUMOS MATERIALES			SIM 2021	
	3514 BOYA METALICA 1/8 MARCA NSP(LNCL KIT INSTALACIÓN)	UN	$	94,613.79
	3515 BOYA PLASTICA 1/8 MARCA NSP(LNCL KIT INSTALACIÓN)	UN	$	32,624.56
	2912 BRAZO SOPORTE LUMIN HORIZ. 11/4"X1.5 M.UN DOBLEZ	UN	$	36,112.99
	2910 BRAZO SOPORTE LUMIN TUBO GALV. 11/2"X1.2 M	UN	$	51,975.00
	3636 BREACKER INDUSTRIAL WEG 100 AMP	UN	$	498,507.05
	3905 BREAKER CAJA MOLD TRIPOLAR 3X200-250A RUP 85KA	UN	$	539,801.63
	2920 BREAKER DE RIEL MONOPOLAR ABB 1 X 40A - 10KA	UN	$	20,000.00
	2729 BREAKER GRADUABLE 3*(87-125)A 25KA	UN	$	1.44
	3093 BREAKER INDUSTRIAL ABB FORMULA A1B 100A-25KA	UN	$	148,400.00
	2002 BUSHING 1 1/4"	UN	$	2,350.23
	3084 CABLE ACERO EXTRARESISTENTE 1/4"	ML	$	1,121.00
	1229 CABLE ACERO GALV. EXTRARESISTENTE 3/8"	ML	$	7,125.00
	3999 CABLE ACOMETIDA ANTIFRAUDE 2X6+6	ML	$	5,834.56
	1209 CABLE ACSR NO. 1/0	ML	$	2,518.10
	1212 CABLE ACSR NO. 2	ML	$	1,665.30
	1213 CABLE ACSR NO. 2/0	ML	$	3,263.47
	834 CABLE ALUM. AISL. 2 THW	ML	$	3,196.32
	3615 CABLE ALUMINIO SERIE 8000 N°2 AWG	ML	$	3,150.00
	3614 CABLE ALUMINIO SERIE 8000 N°2/0 AWG	ML	$	6,800.00
2841E	CABLE COBRE AISL. 10 THW - 90 C 600V	ML	$	2,681.00
2840E	CABLE COBRE AISL. 12 THW - 90 C 600V	ML	$	1,353.15
2844E	CABLE COBRE AISL. 6 THW - 90 C 600V	ML	$	5,398.81
	2842 CABLE COBRE AISL. 8 THW - 90 C 600V	ML	$	4,674.53
	3087 CABLE COBRE AISL. NEUTRO CONCÉNTRICO 600V,2X14 AWG	ML	$	10,975.00
	3086 CABLE COBRE AISL. THHN NO 1/0 AWG	ML	$	17,277.32
	3070 CABLE COBRE AISL. THHN NO. 4 AWG	ML	$	7,319.29
	3073 CABLE COBRE AISL. THHN NO. 6 AWG	ML	$	5,501.00
	3075 CABLE COBRE AISL. THHN NO.10 AWG	ML	$	2,650.00
	3072 CABLE COBRE AISL. THHN NO.2/0 AWG	ML	$	26,085.00
	3069 CABLE COBRE AISL. THHN NO.3/0 AWG	ML	$	40,100.00
	3074 CABLE COBRE AISL. THHN NO.8 AWG	ML	$	4,100.00

	INSUMOS MATERIALES		SIM 2021	
	2972 DUCTOS METALICOS FLEXIBLES	ML	$	10,120.50
	2311 DURANTA H=0.3 MT	UN	$	2,900.00
	4095 ELECTROBOM 2HP 110/220V	UN	$	3,757,560.00
	3556 EMPALME DE DERIVACION EN GEL GHFC-1	UN	$	38,275.19
	3613 EMPALME DERIVACION GEL GHFC-MW CABLE PRIN D8	UN	$	70,457.53
	4020 EMPALME HERMETICO 10 A 100 PARES	UN	$	37,493.45
	4021 EMPALME HERMETICO 150 A 200 PARES	UN	$	81,181.89
	4076 EMPAQUE SISTEMA 50-20 EC-316 4MM	ML	$	1,463.87
	4068 ENGANCHE VENTANA SISTEMA 744	ML	$	9,665.21
	3589 EQUIP BOMBEO ALTA P 6HP TRIFAS2"X2" 62MCA	UN	$	2,812,550.13
	3927 EQUIPO DE COMUNICACION CENTRAL	UN	$	3,365,049.27
	3652 ESPARRAGO 5/8X14"	UN	$	6,300.00
	3033 ESPARRAGO ROSCADO DE 4 TUERCAS 5/8X10 "	UN	$	3,465.00
	1189 ESPARRAGO ROSCADO DE 4 TUERCAS 5/8X12 "	UN	$	5,870.00
	3038 ESPARRAGO ROSCADO DE 4 TUERCAS 5/8X18"	UN	$	7,395.00
	4112 ESPIGO PIN 35 KV	UN	$	39,364.50
1182E	ESPIGO PIN CRUCETA METAL 5/8"X8 13.2 KV	UN	$	6,438.00
	3091 ESTRIBO HORIZONTAL AMPAC 2/0-1/0	UN	$	25,620.00
	2952 ESTRIBO HORIZONTALAMPAC 2/0 - 2	UN	$	24,404.00
	3608 FOTOCELDA	UN	$	35,320.62
	1243 FOTOCELDA PARA LUMINARIA GRIS	UN	$	35,320.62
	3875 FUENTE DE PODER 6VDC 1,2A EN CAJA	UN	$	161,025.39
	3567 FUENTE DE TENSION PARA	UN	$	4,301,720.06
	2234 GRAPA DE RETENCION PARA CABLE TENS DE B.T.	UN	$	12,757.00
	3832 GRAPA DOBLE ALA 1 1/2"	UN	$	731.93
	3863 GRAPA DOBLE ALA 3/4" METALICA	UN	$	286.62
	3851 GRAPA METALICA 1/2" DOBLE OJO	UN	$	246.03
3711E	GRAPA P/OPERAR EN CALIENTE	UN	$	18,372.10
	1192 GRAPA RETEN ALUMINIO T. RECTO 6-2/0 AWG	UN	$	29,087.00
	3653 GRAPA RETENCION PISTOLA ALUMINIO 3 UES	UN	$	35,590.42
	2227 GRAPA SUSPENSION RED TRENSADA BT (3)	UN	$	14,700.00

	INSUMOS MATERIALES		SIM 2021	
3528M	SEÑAL VERT SR(38-39) SI26 LAM 1,5+-0,15MM CINTA RF	UN	$	233,550.00
2949	SEÑALIZACION %	%MDEO	$	3,694.11
31A-N	**SERVICIOS PUBLICOS**			
636	AGUA	LT	$	18.68
26A-N	**SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO**			
3337	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24.000 BTU	UN	$	2,027,110.20
3337	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24.000 BTU	UN	$	2,027,110.20
90-N	**SOPORTES**			
3747	PLATINA DE COBRE DE 200X50X2MM	UN	$	78,359.95
N121E	SECADOR DE MANOS	UN	$	866,213.00
N124E	Dispensador De Papel Toalla Z Metálico Triple Clean	UN	$	59,000.00
N122E	DISPENSADOR JABON 1.2 LT	UN	$	124,407.36
N123E	DISPENSADOR PAPEL HIJIENICO	UN	$	153,972.00
SOCODA 217601	DISPENSADOR DE JABON	UN	$	170,444.00
425	CONJUNTO GRIFERIA TANQUE ATLANTIS (CORONA)	UN	$	43,850.00
21-N	**TANQUES PLASTICOS**			
1949	TANQUE LAVADERO PREFABRICADO 80X60X50 GRANITO	UN	$	295,988.13
3015	TANQUE 2000 LT IMHOF TIPO AJOVER	UN	$	1,742,278.85
2136	TANQUE PLASTICO 1000 LT AJOVER	UN	$	389,250.00
2100	TANQUE PLASTICO 500 LT AJOVER	UN	$	259,500.00
4034	TRAMPA DE CABELLOS 2 X 2"	UN	$	344,439.33
4093	TRAMPA DE GRASAS 250 LT C-T	UN	$	436,671.58
2265	TRAMPA DE GRASAS 250 LTS PVC	UN	$	114,180.00
3014	TRAMPA GRASAS 500 LTS AJOVER	UN	$	311,400.00
4094	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO 1650 LTS	UN	$	3,472,292.92
2673	TANQUE 100 LBS	UN	$	281,702.17
3012	TANQUE 1000 LT IMHOF TIPO AJOVER	UN	$	922,605.36
3013	TANQUE AEROBICO 1000 ITS AJOVER	UN	$	804,511.87
3016	TANQUE AEROBICO 2000 ITS AJOVER	UN	$	1,194,466.40
2589	TANQUE PARA POZO SEPTICO 500LT	UN	$	808,813.67
N3015	TANQUE 2000 LT TIPO AJOVER	UN	$	1,236,000.00

Villavicencio

	INSUMOS MATERIALES		SIM 2021	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN MATERIALES	UNIDAD	PRECIO	
114-N	**TUBERIA AC SCH 10 ASTM-A795**			
664-N	TUBERIA AC SCH 10 1 1/2"	ML	$	16,008.38
N3162	TUBO HG 1 1/2" SCH40``	ML	$	33,015.83
667-N	TUBERIA AC SCH 10 2 1/2"	ML	$	27,109.61
669-N	TUBERIA AC SCH 10 3"	ML	$	33,260.12
AIM 608-2	TUBERIA AC SCH 10 4"	ML	$	4,727.33
AIM 608-3	TUBERIA AC SCH 10 6"	ML	$	78,231.17
N3163	UNION IMC GALVANIZADA 1 1/2"	UN	$	6,783.00
76-N	**TUBERIA AC SCH 40 ASTM-A53**			
100-N	**TUBERIA AG**			
1934	TUBO GALVANIZADO 2" (LIVIANO) E=0,075" (1,90MM)	ML	$	23,147.00
2323	TUBO GALVANIZADO 2"	UN	$	39,788.44
3735	TUBO GALVANIZADO DE 1"	UN	$	18,341.28
3913	TUBO GALVANIZADO HG 1 1/4"	ML	$	24,806.29
3914	TUBO GALVANIZADO HG 1"	ML	$	18,341.28
3162	TUBO HG 1 1/2"	ML	$	29,641.81
3950	TUBO IMC 2"	ML	$	38,817.00
3998	TUBO IMC 3"	ML	$	89,600.00
3071	TUBO GALVANIZADO IMC 4"	ML	$	73,250.00
101-N	**TUBERIA AG SCH 40 GAS ASTM-A53**			
AIM 688	TUBERIA AG 2"	ML	$	39,788.44
AIM 133	CODO 45° AG 2"	UN	$	12,475.72
AIM 190	CODO 90° AG 2"	UN	$	11,549.83
AIM 585	TEE AG 1 1/2"	UN	$	8,646.54
AIM590	TEE AG 2"	UN	$	15,687.29
AIM 810	UNION AG 2"	UN	$	8,275.97
3916	VALVULA DE 1" REGULADOR	UN	$	244,411.69
2669	VALVULA TIPO BOLA 1/2" GAS	UN	$	15,352.02
3915	VALVULA DE 1 1/2" REGULADOR 1800000 BTU/H	UN	$	562,398.08
3597A	SUM E INS ESTUFA INDUSTRIAL A GAS6 QUEMA ACERC	UN	$	5,763,882.25
2671	CODO 1/2" GAS	UN	$	1,222.76

Villavicencio

	INSUMOS MATERIALES		SIM 2021	
CODIGO	DESCRIPCION Y ESPECIFICACIONES	UNIDAD		
N-071	CERAMICA PISO PARED T. ALFA REF, STONE 20,3X30,5	M2	$	21,000.00
N-074	REGISTRO DE INCORPORACIÓN COBRE 1"	UN	$	10,667.00
N-083	HILO ALBAÑIL 100MTS, 18MM POLIPROPILENO	ML	$	65.00
1-N	SUB ANALISIS			
	CONCRETOS			
SUB-740	CONCRETO (12.6 MPA,1800 PSI)	M3	$	306,881.00
SUB-741	CONCRETO (13,8 MPA, 2000 PS)	M3	$	324,258.00
SUB-742	CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI)	M3	$	371,041.00
3510	CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI)	M3	$	371,041.00
SUB-1694	CONCRETO 24,13MPA,(3500 PSI)	M3	$	417,909.00
SUB-743	CONCRETO (27.6 MPA, 4000 PSI)	M3	$	438,052.00
SUB-744	CONCRETO (34.5MPA,5000 PSI)	M3	$	489,467.00
SUB-745	CONCRETO. 25,5MPA (3700 PSI) MR=3.8 (MEZCLA)	M3	$	431,574.00
SUB-746	CONCRETO 27.6 MPA (4000 PSI) MR=4.0. MEZCLA PAVIM.	M3	$	438,052.00
SUB-747	CONCRETO 31 MPA (4500 PSI) MR=4.2 (MEZCLA PAVIME)	M3	$	473,971.00
SUB-748	CONCRETO 34.47MPA (5000 PSI) MR=4.5(MEZCLA PAVIME)	M3	$	489,467.00
5A-N	CONCRETOS Y MORTEROS			
2930	CONCRETO MR=45,PREMEZCLADO.	M3	$	562,899.75
2820	CONCRETO 3000 PSI IMPERM. PREMEZCLADO	M3	$	379,500.00
2686	CONCRETO 20.7MPA, 3000 PSI COMUN C/PREM	M3	$	490,258.82
2876	CONCRETO 3000 PSI FLUIDO C/PREM	M3	$	383,500.00
2293	CONCRETO 27,6 MPA, 4000 PSI 3/4" PREMEZCLADO	M3	$	529,909.38
2289	CONCRETO 4000 PSI 3/4" PREMEZC. ACELERA	M3	$	586,265.40
5369-A	CONCRETO TREMIE 28 MPa - 4000 PSI AS 8" PREMEZCLADO ACELERADO 3 DÍAS	M3		570,399.68
2282	CONCRETO 5000 PSI PREMEZCLADO INC BOMBA	M3	$	621,654.97
3597	CONCRETO 2000 PSI (140N)	M3	$	324,258.00
2653	CONCRETO 2500 PSI (175N)	M3	$	369,726.10
3599	CONCRETO 3000 PSI (210N)	M3	$	371,041.00
2656	CONCRETO 4000 PSI (280N)	M3	$	438,052.00
2654	CONCRETO 3000 PSI (210N). PLÁSTICO PREMEZCLADO	M3	$	379,500.00
	MORTEROS			

Villavicencio

	INSUMOS MATERIALES		SIM 2021	
	3625 MORTERO 1:3 ARENA LAV.PEÑA(M3)	M3	$	409,555.00
	3568 MORTERO 1:4 ARENA DE PENA	M3	$	387,076.00
SUB-751	MORTER01 :5 ARENA PEÑA (M3)	M3	$	344,414.00
	109 MORTERO 2000 PSI CTE.	M3	$	300,436.00
46A-N	**REFUERZO ACEROS - HIERROS - ALAMBRE**			
	835 ACERO REFUERZO 412MPA,(4200KG/CM2, GRADO 60)	KG	$	4,991.67
	2806 ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-36	KG	$	6,921.84
	9 ALAMBRE NEGRO CAL. 18	KG	$	7,300.00
	3526 ALAMBRE NEGRO CAL. 18	KG	$	7,300.00
	3475 PERFIL ASTM A-500 100 X 40 E=2.0MM H=3.0M	UN	$	48,975.58
	3967 PERFIL ASTM A-500 100 X 40 E=2.0MM H=6.0M	UN	$	111,678.30
	2305 PERFIL ASTMA-500 GRADO INC.ANC CON FIJA POLI O SIM	KG	$	8,330.00
	2644 PERFIL RECTAN. NEGRO 120*60*2.5 MM C12 ASTM A-500	ML	$	47,180.00
	2927 MALLA ELECTROSOLDAD FY= 500 MPA (PROMEDIO)	KG	$	6,049.21
N-106	POSTE RECTO LONGITUD = 4,5M	UN	$	2,800,000.00
	577 MALLA ELECTRO DIACO 203 15X15, 4MM M-084	UND	$	300,040.82
	2407 MALLA ELECTROSOL. 6 MM15*15 CM, REF. M188	M2	$	18,104.73
	2431 MALLA E/SOLD 7MM 15*15,(M262/ Q6.1)	M2	$	24,625.00
	2563 MALLA E/SOLD 4MM 15*15 (M084/D84/ Q2) 6X2.35MT	M2	$	8,065.61
	2298 MALLA E/SOLD 5MM, 15*15 (M131/D-205/ Q3.1) 6X2.35M	M2	$	12,570.34
30A	VARA DE CLAVO 6 METROS.	ML	$	4,244.52
	1234 VIGUETA DE CONCRETO PARA ANCLAJE	UN	$	10,000.00
	2039 HIERRO A-37 CHIPA LISA 1/4"	KG	$	4,991.67
	1992 HIERRO A-37 CHIPA LISA 3/8"	KG	$	4,991.67
	2753 HIERRO A-37 LISO/RECTO	KG	$	4,991.67
	3140 HIERRO A-37 LISO/RECTO 1"	KG	$	4,991.67
	2885 HIERRO A-37 LISO/RECTO 3/4"	KG	$	4,991.67
	488 HIERRO CHIPA 3/8" CORRUGADA	KG	$	4,991.67
	2919 HIERRO PR-60 CORRU/FIG 3/4"	KG	$	4,991.67

	INSUMOS MATERIALES		SIM 2021	
	144 HIERRO PR-60 CORRU/FIG 3/8"	KG	$	4,991.67
	21 HIERRO PR-60 CORRU/REC 1/2"	ML	$	4,991.67
	4106 HIERRO PR-60 CORRU/REC 1/2"	KG	$	4,991.67
	2786 HIERRO PR-60 CORRU/REC 3/4"	KG	$	4,991.67
26A	HIERRO PR-60 CORRU/REC 5/8"	ML	$	7,826.50
	2929 BARRA AMARRE/ANCLAJE (ACERO CORRUGADO<15MM)	KG	$	5,398.53
	2751 HERRO (411 MPA, 4200KG/C2, G60) CORRU/RECTO 5/8	KG	$	4,991.67
	2750 HIERRO (411 MPA, 4200 KG/CM2, G60) CORRU/RECTO 3/8"	KG	$	4,991.67
	2749 HIERRO 60.000 CORRU/RECTO 1/2"	KG	$	4,991.67
	2917 HIERRO 60.000 CORRU/RECTO 1/2"	KG	$	4,991.67
	3315 HIERRO 60000 1/2"	KG	$	4,991.67
	ACERO DE REFUERZO FIGURADO			
	3621 ACERO FIGURADO 1/4" A 1" F" Y=60000 PSI	KG	$	7,217.00
	3619 ACERO FIGURADO NO.3 (3/8") F" Y=60000 PSI	KG	$	7,217.00
	4104 ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPA, (4200	KG	$	7,217.00
	3620 ACERO FIGURADO NO.4 (1/2") F" Y=60000 PSI	KG	$	7,217.00
12A-N	MORTEROS LISTOS			
	1373 PEGACOR GRIS CORONA O ADHEBAL BA BASF	KG	$	2,448.00
	2792 PEGACOR MAX 25 KG CORONA	KG	$	2,679.25
7A-N	**PAVIMENTOS ASFALTICOS**			
	3524 RESALTO PLASTICO MARCA NSP(INC KIT INSTALACION	UN	$	145,320.00
	3513 RESINA TERMOPLASTICA	UN	$	12,321.06
	2899 TACHA BIDIRECCIONAL DE UN SOLO COLOR NSP	UN	$	6,539.40
	3518 TACHONES MARCA NSP(INC KIT INSTALACION)	UN	$	6,293.39
	2196 LIGA	GAL	$	12,562.00
	2022 ADITIVO RCA-10	GL	$	774,988.50
	1631 CRUDO DE CASTILLA	GAL	$	7,359.42
	3094 EMULSION ASFALTICA CRL II	KG	$	1,377.00
	373 EMULSION ASFALTICA SIKA 3.5 KILO	KG	$	27,900.00
	2166 MICROESFERAS	KG	$	13,891.53

	INSUMOS MATERIALES		SIM 2021	
E-11015	TUBERÍA PVC U.M. NORMA NTC 382 -PRESIÓN TRAB. 160PSI - RDE 26 - 2 1/2" L=6.00m	UN	$	75,226.00
N-112	BUJE PRESION SOLD. 1-1/2" X 3/4" PAVCO	UN	$	3,805.00
SDE	SECRETARIA DE EDUCACION			
SDE-1	Granito marmol blanco No.2 x 35kg	Bt	$	46,900.00
SDE-2	Piso ceramica generico 45.8x45.8cm	M2	$	30,900.00
SDE-3	Baldosa de terrazo alfa p2 30 x 30	M2	$	49,900.00
SDE-4	Lavaplatos meson 100x52cm acero inox.	Un	$	134,900.00
SDE-5	Poceta sencilla acero inoxidable 55x43 cms.	Un	$	181,500.00
SDE-6	Bordillo prefabricado a-80	Un	$	21,800.00
SDE-7	Loseta prefabricada a-40	M2	$	21,460.34
SDE-8	Sardinel prefabricado .80x.50x.20 a-10	Un	$	23,600.00
SDE-9	Sumidero prefabricado a-70	Un	$	925,000.00
SDE-10	Gargola pref. concreto	Un	$	29,700.00
SDE-11	Gramoquin 40x40x08 cm ecologico	M2	$	21,460.00
SDE-12	Puerta l. c.rolled cal. 18, Segun diseño, incl. vidrio	M2	$	246,000.00
SDE-13	Puerta-reja tubo 1 1/4", peinazo 4", segun diseño	M2	$	238,000.00
SDE-14	Puerta l. c.rolled cal. 18, Entamborada baño	M2	$	195,400.00
SDE-15	Puerta fortec l/ bas. 0.71 a 0.80	Un	$	325,000.00
SDE-16	Silicona antihongos 305M	Un	$	11,900.00
SDE-17	Limpiador pvc y cpvc (¼")	Un	$	45,950.00
SDE-18	Soldadura electrica E-6011 x 1/8"	Kg	$	9,165.90
SDE-19	Soldadura estaño para cobre	Un	$	31,088.50
SDE-20	Soldadura pvc ntc 576 (1/8gl)	Un	$	63,950.00
SDE-21	Soldadura 6013 3/16"	Kg	$	9,700.00
SDE-22	Puntilla con cabeza 2"	Lb	$	4,900.00
SDE-23	Espigo aluminio-tuerca 250mm	Un	$	1,200.00
SDE-24	Tornillo p/lamina autoperf. 1/4"x7/8"	Un	$	710.00
SDE-25	Arandela neopreno	Un	$	590.00
SDE-26	Tubo estruct. redondo negro 2"x4mm	Ml	$	42,200.00
SDE-27	Agua	Lt	$	18.80
SDE-28	Tierra negra	M3	$	18,100.00

	INSUMOS MATERIALES		SIM 2021	
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD		
SDE-29	Acido fosforico	Kg	$	12,740.00
SDE-30	Sistema plexiflor, incl. alistado de superf.	M2	$	43,700.00
SDE-31	Cinta de enmascarar 24mm x 40mt	Un	$	7,750.00
SDE-32	Brocha multiproposito 2"	Un	$	5,230.00
SDE-33	Piola gruesa	Un	$	2,700.00
SDE-34	Cordon elastomerico 3/8"	Ml	$	610.00
SDE-35	Canastilla pasajuntas	Kg	$	3,870.00
SDE-36	Grama trenza	M2	$	6,902.00
SDE-37	Ventana alum. corrediza - celosia fija, Segun diseño, incl. vidrio	M2	$	232,402.70
SDE-38	Espejo cristal claro 4mm	M2	$	63,000.00
SDE-39	Baranda tubo redondo 3"X2.5mm y Plat. 2" x 1/4"	Ml	$	165,000.00
SDE-40	Cemento blanco	Kg	$	1,125.00
SDE-41	Cemento gris	Kg	$	600.00
SDE-42	Distanciador cm-20 c.m. 6.5mm 5/8"	Un	$	285.00
SDE-43	Distanciador cp-30 c.m. pinza 1/4"	Un	$	335.00
SDE-44	Distanciador cm-30 mortero 6.5mm 5/8"	Un	$	335.00
SDE-45	Distanciador ppn-100 1/4"	Un	$	307.00
SDE-46	Teja aluminio-poliuretano-aluminio e= 1cm	M2	$	124,800.00
SDE-47	Caballete aluminio-poliuretano	Un	$	68,000.00
SDE-48	Amarre fijación est. Met. Techoline	Un	$	97.80
SDE-49	Clavos de fijación esimet. Techoline	Un	$	95.20
SDE-50	Teja termoacustica ecoroof asa 37 upvc 2.5mm color	M2	$	60,380.00
SDE-51	Porteria multi funcional mc/balonc	Un	$	3,965,000.00
SDE-52	Angulo l= 2.44 x0.02x.025 cal. 26" lámina galv.	Un	$	2,900.00
SDE-53	Canal base 9 x 2.44 cal. 26	Un	$	5,046.08
SDE-54	Masilla readymas cuñete (28Kg) kanauf	Un	$	37,600.00
SDE-55	Paral base 9 (2.44m) cal. 26	Un	$	4,527.00
SDE-56	Placa superboard 2440 x 1220 x 11 mm	Un	$	76,400.00
SDE-57	Placa superboard 2440x1220x20 mm	Un	$	152,000.00
SDE-58	Tornillo 7 x 7/16"	Un	$	25.00
SDE-59	Tornillo 1" punta fina	Un	$	14.00

	INSUMOS MATERIALES		SIM 2021	
SDE-91	Tabla chapa 10x1.8-2cmx2.9m	Un	$	23,400.00
SDE-92	Tabla chapa 30x1.8-2cmx2.9m	Un	$	22,906.00
SDE-93	Cerco 8x8cm x 2.9m-ordinario	Un	$	22,900.00
SDE-94	Cerramiento malla eslabonada cal. 10	M2	$	24,600.00
SDE-95	Manto asfaltico 3.2mm foil al.	M2	$	20,135.00
SDE-96	Membrana curadora curaseal (20kg)	Kg	$	5,074.00
SDE-97	Polietileno negro cal. 7	M2	$	3,750.00
SDE-98	Pasta verde Roga	Kg	$	15,400.00
SDE-99	Pasta blanca Roga	Kg	$	15,900.00
SDE-100	Cera liquida abrillantadora	Kg	$	9,550.00
SDE-101	Desenconfrante emulsionado (16kg)	Un	$	273,700.00
SDE-102	Líquido cristalizador, de color blanco, con pH de 2,5	Lt	$	48,232.00
SDE-103	Dilatación en bronce pc09	Ml	$	17,450.00
SDE-104	Angulo hierro 2 ½" x 3/16" 12m A572/G50	Ml	$	31,700.00
SDE-105	Platina hierro ½" x 1/8" x 6m	Un	$	12,700.00
SDE-106	Esmalte domestico	Gl	$	48,920.00
SDE-107	Esmalte sintetico pintulux	Gl	$	59,000.00
SDE-108	Intervinil pro 200 caneca (5gl)	Un	$	153,600.00
SDE-109	Pintura trafico y demarcacion blanco	Gl	$	75,300.00
SDE-110	Vinilo grecotex	Gl	$	56,700.00
SDE-111	Estuco estucor interior bolsa (25kg)	Gl	$	24,900.00
SDE-112	Estuco estucor plastico ext. caneca (30kg)	Bt	$	86,900.00
SDE-113	Koraza pintuco blanco	Gl	$	69,980.00
SDE-114	Anticorrosivo rojo claro	Gl	$	33,915.00
SDE-115	Disolvente thinner	Gl	$	19,122.00
SDE-116	Lija de agua profinal 315 grano	Un	$	1,200.00
SDE-117	Marmolina 5kg	Kg	$	1,240.00
SDE-118	Lija de pintura grano 180	Un	$	1,700.00
SDE-119	Lija de agua grano 150 super	Un	$	1,700.00
SDE-120	Mineral blanco zinc	Lb	$	5,900.00
SDE-121	Acero laminado ASTM A-500 grado C	Kg	$	8,650.00

	INSUMOS MATERIALES		SIM 2021	
SDE-122	Acero laminado ASTM A-36 grado C	Kg	$	7,150.00
SDE-123	Acero corr. fig. 1/4" - 1" 60.000 PSI	Kg	$	6,195.00
SDE-124	Curador para concreto y mortero antisol rojo (16kg)	Un	$	284,900.00
SDE-125	Sika-1 (20Kg)	Kg	$	10,151.00
SDE-126	Alambre negro recocido C-17 (rollo 30kg)	Kg	$	11,400.00
SDE-127	Arena de peña	M3	$	19,932.00
SDE-128	Arena lavada de peña	M3	$	63,800.00
SDE-129	Arena lavada de rio	M3	$	77,800.00
SDE-130	Gravilla de rio 1/2"	M3	$	75,892.00
SDE-131	Subase granular norma Invias	M3	$	54,000.00
SDE-132	Triturado fino de rio max. 2"	M3	$	36,980.00
SDE-133	Carga fulminante fuerte 5/16x1"	Un	$	360.00
SDE-134	Carga tiro a tiro ramset amarillo	Un	$	240.00
SDE-135	Chazo 5/16" + tornillo 1-1/2"	Un	$	518.00
SDE-136	Boquilla junta estrecha concolor (2kg)	Kg	$	5,450.00
SDE-137	Lechada coloreada para piso de terrazo	Kg	$	2,723.00
SDE-138	Pegacor interiores blanco	Kg	$	1,567.00
SDE-139	Endurecedor Sika Floor-3Quartz Top 30kg	Kg	$	1,397.00
SDE-140	Barra seguridad baño acero inox. 30 cm.	Un	$	79,900.00
SDE-141	Sanitario tao blanco	Un	$	169,900.00
SDE-142	Sanitario infantil	Un	$	396,900.00
SDE-143	Orinal mediano con griferia pusc antivandalica	Un	$	381,900.00
SDE-144	Lavamanos cascada sobreponer blanco	Un	$	147,900.00
SDE-145	Sanitario discapacitados	Un	$	248,900.00
SDE-146	Barra corrugada G-60 3/8"x6m	Un	$	25,300.00
SDE-147	Cielopared pvc liso 300x25cm e=10mm	M2	$	39,995.00
SDE-148	Screen panel Hunter Douglas modulo 682mm	M2	$	450,000.00
SDE-149	Griferia lavaplatos meson tedesca	Un	$	75,900.00
SDE-150	Ducha roble cuadrada 8"	Un	$	92,000.00
SDE-151	Griferia pares instit. de push cierre autom.	Un	$	144,900.00
SDE-152	Malla electrosoldada xx-159 6x2.35m	Kg	$	7,300.00

CODIGO	NOMBRE	U.M.	PRECIO	FUENTE DE COTIZACION
30401009	FORMALETA MADERA SARDINEL ML	ML	$ 2.964,31	Registro por defecto
30401010	FORMALETA METÁLICA CUNETA	ML	$ 2.693,79	Registro por defecto
30401011	FORMALETA METÁLICA PARA COLUMNAS	M3	$ 197.620,67	Registro por defecto
30401012	FORMALETA METÁLICA PARA CONCRETO	GLB	$ 120.768,19	Registro por defecto
30401013	FORMALETA METÁLICA SARDINEL	GLB	$ 10.978,93	Registro por defecto
30401014	FORMALETA METÁLICA SARDINEL	ML	$ 2.599,92	Registro por defecto
30401015	FORMALETA METALICA SARDINEL (ML)	DIA	$ 1.481,55	ALQUILER TITAN
30401016	FORMALETA METALICA TIPO CAISSON	GLB	$ 109.789,26	Registro por defecto
30401017	FORMALETA METALICA VIGA PUENTE	MES	$ 30.192.046,50	Registro por defecto
30401018	MOLDE TIPO TAPETE PARA CONCRETO ESTAMPADO	DIA	$ 15.199,14	GRAVICON
30402	MADERAS			
30402001	TABLA BURRA 10 CMS X 2.90 MTS ORDINARIO	ML	$ 2.668,07	HOMECENTER - SODIMAC CORONA
30402002	TABLA BURRA 15 CMS X 2.90 MTS ORDINARIO	ML	$ 3.216,80	HOMECENTER - SODIMAC CORONA
30402003	TABLA BURRA 20 CMS X 2.90 MTS ORDINARIO	ML	$ 7.217,46	HOMECENTER - SODIMAC CORONA
30402004	TABLA BURRA 25 CMS X 2.90 MTS ORDINARIO	ML	$ 9.623,76	HOMECENTER - SODIMAC CORONA
30402005	TABLA BURRA 30 CMS X 2.90 MTS ORDINARIO	ML	$ 11.346,79	MADERAS EL VERGEL
30403	FORMALETA METÁLICA			
30403001	FORMALETA METALICA PARA CILINDRO	M3	$ 109.789,26	Registro por defecto
305	Generador			
30501	PLANTAS ELÉCTRICAS			
30501001	PLANTA ELECTRICA 4KW	HR	$ 8.262,54	Registro por defecto
30501002	PLANTA ELECTRICA MOD. 4 T 2600	DIA	$ 95.321,58	ALQUILER TITAN
306	Compresor			
30601	COMPRESORES			
30601001	COMPRESOR 2 MARTILLOS 185 PCM	HR	$ 33.542,02	Registro por defecto
30601002	COMPRESOR CON MARTILLO ROMPEPAVIMENTOS 185 PCM	HR	$ 24.443,58	Registro por defecto
30601003	COMPRESOR CON PISTOLA PINTURA 1 HP 80 LBS	HR	$ 7.876,26	Registro por defecto
30601004	COMPRESOR CON PISTOLA PINTURA 1 HP 80 LBS	DIA	$ 52.639,20	FERRETERIA CASANARE
30601005	COMPRESOR PARA BARRIDO Y SOPLADO	HR	$ 24.443,58	Registro por defecto
30601006	EQUIPO AUTOPROPULSADO PARA PINTURA TERMOPLASTICA	DIA	$ 461.152,52	Registro por defecto
30601007	EQUIPO DE DEMARCACIÓN	HR	$ 30.071,03	Registro por defecto
30601008	EQUIPO DE PINTURA COMPRESOR INDUSTRIAL	HR	$ 5.399,31	Registro por defecto
307	Equipo de soldado u oxicorte			
30701	EQUIPOS DE SOLDADO			
30701001	EQUIPO DE OXICORTE	HR	$ 9.990,27	Registro por defecto
30701002	EQUIPO DE SOLDADURA 250 AMP	HR	$ 10.001,02	Registro por defecto
30701003	EQUIPO DE SOLDADURA 400	HR	$ 19.882,83	Registro por defecto
30701004	EQUIPO DE SOLDADURA 600	HR	$ 13.001,32	Registro por defecto
30701005	EQUIPO OXICORTE	DIA	$ 59.546,80	ALQUILER TITAN
30701006	EQUIPO SOLDADURA ELECTRICA AC/DC 110/220	DIA	$ 89.324,69	ALQUILER TITAN
30701007	EQUIPO SOLDADURA ELECTRICA AC/DC 110/220 V	HR	$ 10.850,57	Registro por defecto
30701008	SOPLETE	DIA	$ 32.209,77	ALQUILER TITAN
308	Equipos para concreto			
30801	EQUIPOS PARA CONCRETO			
30801001	BOMBA DE INYECCION DE LECHADA TIPO DIAFRAGMA	HR	$ 32.320,68	Registro por defecto
30801002	BOMBEO DE CONCRETO CON BOMBA ESTACIONARIA	M3	$ 45.815,73	GRAVICON
30801003	MEZCLADORA DE CONCRETO	DIA	$ 70.811,47	ALQUILER TITAN
30801004	MEZCLADORA DE CONCRETO A GASOLINA 2 BULTOS	DIA	$ 64.383,82	Registro por defecto
30801005	VIBRADOR DE CONCRETO DIESEL 5.5 HP	DIA	$ 40.883,72	ALQUILER TITAN
30801006	VIBRADOR DE CONCRETO MOTOR 3HP 18.000 RPM	HR	$ 5.800,55	ALQUILER TITAN
309	Equipo especial hidráulico			
30901	EQUIPOS DE BOMBEO			
30901001	ELECTROBOMBA 1515HHE-5 HP BARNES	UN	$ 4.083.553,10	HOMECENTER - SODIMAC CORONA
30901002	HIDROJET 1700 PSI (BOQUILLA O TATIVA)	DIA	$ 92.398,64	ALQUILER TITAN
30901003	MOTOBOMBA 3" AUTOCEBANTE A GASOLINA. ALQUILER DÍA INCLUYE COMBUSTIBLE	DIA	$ 105.224,47	Registro por defecto
30901004	MOTOBOMBA 4" DE ENTRADA Y SALIDA 11 HP AUTOCEBANTE A GASOLINA. ALQUILER DÍA INCLUYE COMBUSTIBLE Y MANGUERA DE 6 M	DIA	$ 152.450,38	Registro por defecto
30901005	MOTOBOMBA 6" DE ENTRADA Y SALIDA AUTOCEBANTE DIESEL. ALQUILER DÍA INCLUYE COMBUSTIBLE Y MANGUERA DE 6 M	DIA	$ 241.529,02	Registro por defecto
30901006	MOTOBOMBA BARNES MOD 2020HCE 7,5 HP TRIFASICA	UN	$ 3.940.251,34	HOMECENTER - SODIMAC CORONA
310	Equipo de medición			
31001	EQUIPOS DE MEDICIÓN			
31001001	CAMARA TERMOGRAFICA	DIA	$ 987.575,93	Registro por defecto
31001002	CP TD1	DIA	$ 1.131.943,86	Registro por defecto
31001003	CPC 100	DIA	$ 1.844.929,19	Registro por defecto

Calle 15 No. 40 – 01 Lobby 1 Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

NIT: 901.892.095-4

ESTUDIOS DE MERCADO INSUMOS DE OBJETO DE COTIZACIÓN

CR 24 A 8 125 CONJ CERRADO LA CABAÑA CA 1 IN 9. VILLAVICECNIO-META
SHARKYING10@GMAIL.COM-3222169909

ESTUDIO DE MERCADO

OBJETO: REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	CANT	COTIZACION 1 (GRUPO DEPA SAS)				COTIZACION 2 (DUMALUX SAS)				COTIZACION 3 (OFC SUMINISTROS ELECTRICOS)				PROMEDIO			
				V/R UNITARIO	I.V.A.	V/R UNITA + I.V.A.	V/R TOTAL	V/R UNITARIO	I.V.A.	V/R UNITA + I.V.A.	V/R TOTAL	V/R UNITARIO	I.V.A.	V/R UNITA + I.V.A.	V/R TOTAL	V/R UNITARIO	I.V.A.	V/R UNITA + I.V.A.	V/R TOTAL
1	Luminaria de Alumbrado publico 36-60W, 4000k chip led 36, 100,000 > horas, IRC >70	UN	1	996,459.00	189,707.21	1,186,166.21	1,186,166.21	1,001,425.00	190,270.75	1,191,695.75	1,191,695.75	1,093,493.31	205,863.73	1,299,357.04	1,299,357.04	1,027,792.44	195,280.56	1,223,073.00	1,223,073.00
2	MASTIL METALICO 4MX DIAM 3"	UN	1	729,400.00	138,588.00	867,988.00	867,988.00	697,840.00	132,589.60	830,429.60	830,429.60	736,622.50	139,958.28	876,580.78	876,580.78	721,287.50	137,044.63	858,332.13	858,332.13
3	CANASTA MET PARA ANCLAJE ST	UN	1	68,900.00	13,091.00	81,991.00	81,991.00	71,490.00	13,583.10	85,073.10	85,073.10	79,727.50	15,148.23	94,875.73	94,875.73	73,372.50	13,940.78	87,313.28	87,313.28
	TOTAL			1,795,759	341,384	2,136,143	2,136,143	1,770,755	336,443	2,107,198	2,107,198	1,909,843	360,970	2,270,814	2,270,814	1,822,452	346,266	2,168,718	2,168,718

DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS MCTE

ESTUDIO DE MERCADO

OBJETO: REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UD	CANT	COTIZACION 1 (CONCRETCOL)				COTIZACION 2 (SUMINISTRO DE MATERIALES LH SAS)				COTIZACION 3 (ROJAS HERMANOS S.A.S)				PROMEDIO			
				V/R UNITARIO	I.V.A.	V/R UNITA + I.V.A.	V/R TOTAL	V/R UNITARIO	I.V.A.	V/R UNITA + I.V.A.	V/R TOTAL	V/R UNITARIO	I.V.A.	V/R UNITA + I.V.A.	V/R TOTAL	V/R UNITARIO	I.V.A.	V/R UNITA + I.V.A.	V/R TOTAL
1	TONO COLORANTE OCRE	KG	1	3,176.66	603.67	3,780.23	3,780.23	2,812.24	534.33	3,346.57	3,346.57	2,700.29	513.06	3,213.35	3,213.35	2,896.40	550.32	3,446.72	3,446.72
2	TONO COLORANTE AZUL	KG	1	18,282.44	3,473.66	21,756.10	21,756.10	19,370.37	3,680.37	23,050.74	23,050.74	18,600.79	3,534.15	22,134.94	22,134.94	18,751.20	3,562.73	22,313.93	22,313.93
3	DESMOLDANTE	KG	1	14,658.91	2,786.19	17,325.10	17,325.10	12,310.62	2,339.00	14,649.62	14,649.62	13,944.05	2,649.37	16,593.45	16,593.45	13,604.50	2,584.66	16,189.36	16,189.36
4	SELLADOR	LT	1	1,998.22	379.26	2,376.50	2,376.50	1,406.43	267.22	1,673.65	1,673.65	1,679.09	319.03	1,998.12	1,998.12	1,693.91	321.84	2,015.76	2,015.76
5	MOLDE	DD	1	2,394.96	455.04	2,850.00	2,850.00	2,699.08	510.92	3,200.00	3,200.00	2,478.99	471.01	2,950.00	2,950.00	2,521.01	478.99	3,000.00	3,000.00
	TOTAL			40,409	7,678	48,087	48,087	38,599	7,332	45,920	45,920	39,403	7,487	46,890	46,890	39,467	7,499	46,966	46,966

LOS PRECIOS INCLUYE IVA Y DESCUENTOS DE LEY QUE EL MUNICIPIO APLIQUE PARA EL ACEPTACIÓN DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO HACEN PARTE DEL PRESENTE ESTUDIO LAS COTIZACIONES SOLICITADAS.

JOHN DANI NAGLES PACHON
REPRESENTANTE CONSORCIO ALCIPA

DIEGO ORLANDO BARROSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR

NIT: 901.892.095-4

COTIZACIONES Y DOCUMENTOS DE EMPRESA

CR 24 A 8 125 CONJ CERRADO LA CABAÑA CA 1 IN 9. VILLAVICECNIO-META
SHARKYING10@GMAIL.COM-3222169909

GRUPO DEFA SAS

GRUPO DEFA SAS
Dir: Clle 36 No 27 - 75 Brr San Isidro
Tel: 661 07 05 Villavicencio

ALMACEN 3
Cotización Nro: 28459
Fecha : 28/02/2025

Nombre : JOHN DANI NAGLES PACHON N.I.T. : 901892095-4
Razon Soc :CONSORCIO ALSIPA Telefono : 3222169909 Vend : YARITZA RAMIREZ
Direccion : CR 25 A # 8-125 CONJ LA CABAÑA CA 1 IN 9

CODIGO	DESCRIPCION	P/KG	CANTIDAD	VR.UNIT	VR-IVA	SUBTOTAL
P29781-60	LUMINARIA LED SYL STREET 36-60W NW 7P	0.00	01.00	1,188,166	998,459.00	998,459
R45967-42	POSTE METALICO DE 4 METROS DM 3 PULG	0.00	01.00	867,986	729,400.00	729,400
R41975-74	CANASTILLA DE ANCLAJE POSTE DE 4 MTR	0.00	01.00	81,991	68,900.00	68,900

CONDICIONES DE PAGO : CONTAD **VALIDEZ DE LA COTIZACION:** 1 DIA

OBS:

Peso Total	0.00
SUBTOTAL	1,796,759
DESCUENTO	0
IVA	341,384
NETO	2,138,143

SON: DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

LOS PRECIOS DE LA PRESENTE COTIZACION PERTENECEN A PRECIO LISTA NO PRECIO PUBLICO

Somos Autorretenedores Segun Res. DIAN No 002724 - Somos autorretenedores de ICA en Villavicencio Segun Res. 768 del 26 de junio 2024

*SI NOS TRAE UNA COTIZACION MAS ECONOMICA; ¡ LE MEJORAMOS LA NUESTRA !

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: GRUPO DEFA SAS
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 900795612-3
ADMINISTRACIÓN DIAN : VILLAVICENCIO
DOMICILIO : VILLAVICENCIO

MATRICULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 272546
FECHA DE MATRÍCULA : NOVIEMBRE 27 DE 2014
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2024
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 27 DE 2024
ACTIVO TOTAL : 98,398,031,000.00
GRUPO NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : PARCELACION SANTA ANA LOTE 4 VEREDA ZURIA CARRETERA DEL AMOR
BARRIO : JUAN PABLO II
MUNICIPIO / DOMICILIO: 50001 - VILLAVICENCIO
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 3123156860
TELÉFONO COMERCIAL 2 : 3118666886
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : contabilidad@grupodefa.co

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CL 36 N 27 - 75
MUNICIPIO : 50001 - VILLAVICENCIO
BARRIO : SAN ISIDRO
CORREO ELECTRÓNICO : contabilidad@grupodefa.co

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : contabilidad@grupodefa.co

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : G4663 - COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERIA Y CALEFACCION
ACTIVIDAD SECUNDARIA : H5210 - ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO
OTRAS ACTIVIDADES : H4923 - TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO 1 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 50669 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2014, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA DISTRIBUCIONES LIBARDO QUINTERO DS S.A.S.

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO 1 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2014 DE LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 50669 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2014, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA DISTRIBUCIONES LIBARDO QUINTERO DS S.A.S.

CERTIFICA - RELACION DE NOMBRES QUE HA TENIDO

QUE LA PERSONA JURÍDICA HA TENIDO LOS SIGUIENTES NOMBRES O RAZONES SOCIALES

1) DISTRIBUCIONES LIBARDO QUINTERO DS S.A.S
2) DISTRIBUCIONES DS S.A.S
Actual.) GRUPO DEFA SAS

CERTIFICA - CAMBIOS DE NOMBRE O RAZON SOCIAL

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE MAYO DE 2017 SUSCRITO POR ACCIONISTA UNICO REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 64746 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 15 DE MAYO DE 2017, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE DISTRIBUCIONES LIBARDO QUINTERO DS S.A.S POR DISTRIBUCIONES DS S.A.S

POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 01 DE JUNIO DE 2019 SUSCRITO POR ASAMBLEA DE ACCIONISTAS REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 74395 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 22 DE JUNIO DE 2019, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE DISTRIBUCIONES DS S.A.S POR GRUPO DEFA SAS

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA DOCUMENTO	INSCRIPCION	FECHA
DOC.PRIV.	20170509	ACCIONISTA UNICO	VILLAVICENCIO RM09-64746	20170515
DOC.PRIV.	20170509	ACCIONISTA UNICO	VILLAVICENCIO RM09-64746	20170515
DOC.PRIV.	20190601	ASAMBLEA DE ACCIONISTAS	VILLAVICENCIO RM09-74395	20190622
AC-11	20201130	ASAMBLEA EXTRAORDINARIA UNICO ACCIONISTA	VILLAVICENCIO RM09-81976	20201215
CE-	20201203	CERTIFICADO DE CONTADOR PUBLICO	VILLAVICENCIO RM09-81977	20201215
AC-15	20230724	ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS	VILLAVICENCIO RM09-99832	20230907
CE-	20231027	REVISOR FISCAL	VILLAVICENCIO RM09-100722	20231101

CERTIFICA - VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ES INDEFINIDO.

CERTIFICA - SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE CARGA

NO HA INSCRITO EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE LO HABILITA PARA PRESTAR EL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESITRE AUTOMOTOR EN LA MODALIDAD DE CARGA

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL LA COMERCIALIZACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y PRODUCTOS DE FERRETERÍA. ASIMISMO, PODRÁ REALIZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA LÍCITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO. LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASÍ COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	2.000.000.000,00	2.000,00	1.000.000,00
CAPITAL SUSCRITO	1.210.000.000,00	1.210,00	1.000.000,00
CAPITAL PAGADO	1.210.000.000,00	1.210,00	1.000.000,00

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 15 DEL 24 DE JULIO DE 2023 DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 99833 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE GENERAL	SANTOS BUITRAGO DAVID	CC 80,733,569

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES

POR ACTA NÚMERO 15 DEL 24 DE JULIO DE 2023 DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 99833 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL PRIMER SUPLENTE	URREGO BETANCOURT YUBY ALEXANDRA	CC 52,842,424

POR ACTA NÚMERO 15 DEL 24 DE JULIO DE 2023 DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 99833 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL SEGUNDO SUPLENTE	GAVIRIA JIMENEZ DUBER ALBERTO	CC 79,998,699

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL, SON FUNCIONES Y FACULTADES DEL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD LAS SIGUIENTES: 1) HACER USO DE LA DENOMINACIÓN SOCIAL ANTE LOS SOCIOS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO; 2) EJECUTAR O HACER QUE SE EJECUTEN Y CUMPLAN TODAS LAS DECISIONES QUE SE ADOPTEN POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 3) VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY Y DE LOS ESTATUTOS; 4) DESIGNAR Y REMOVER LIBREMENTE LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYO NOMBRAMIENTO NO ESTÉ ATRIBUIDO A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y ESCOGER, TAMBIÉN LIBREMENTE, AL PERSONAL DE TRABAJADORES, DETERMINAR SU NÚMERO, FIJAR EL GÉNERO DE LABORES, REMUNERACIONES, ETC., Y HACER LOS DESPIDOS DEL CASO; 5) CONSTITUIR APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE JUZGUE NECESARIOS PARA LA ADECUADA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD; 6) AUTORIZAR CON SU FIRMA TODOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O DE INTERÉS DE LA SOCIEDAD, DENTRO DE LOS LÍMITES ESTIPULADOS EN ESTOS ESTATUTOS; 7) TOMAR TODAS LAS MEDIDAS QUE RECLAME LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES SOCIALES Y VIGILAR LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD; 8) CELEBRAR Y EJECUTAR TODOS LOS ACTOS, NEGOCIOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL, CON LÍMITE DE CUANTÍA ASÍ: (I) REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL, (I) REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL, PODRÁ EJECUTAR CUALQUIER ACTO O NEGOCIOS SIN LIMITACIÓN DE CUANTÍA. (II) EL (LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) SUPLENTE(S) PODRÁN CELEBRAR NEGOCIOS SIN AUTORIZACIÓN SIEMPRE QUE NO SUPEREN LA SUMA DE CIEN SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (100 SMMLV). CUANDO POR LA CUANTÍA DEL CONTRATO O ACTO REQUIERA AUTORIZACIÓN LA MISMA LA HARÁ LA JUNTA DIRECTIVA Y EN AUSENCIA DE ÉSTA LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. NO PODRÁ ENAJENAR BIENES SIN LA RESPECTIVA AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA O DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, SI LA PRIMERA NO ESTUVIERE OPERANDO; 9)TENDRÁ LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD, CON FACULTAD DE ARRENDARLOS Y PERCIBIRLOS SIN LA RESPECTIVA AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA O DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTA, SI LA PRIMERA NO ESTUVIERE OPERANDO 1 O) ASÍ MISMO, REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL PODRÁ ABRIR CUENTAS BANCARIAS Y SOLICITAR PRÉSTAMOS SIN LIMITACIÓN ALGUNA EN LA CUANTÍA Y EL (LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) SUPLENTE(S) PODRÁN ABRIR CUENTAS BANCARIAS Y SOLICITAR PRÉSTAMOS SIN AUTORIZACIÓN SIEMPRE QUE NO SUPEREN LA SUMA DE CIEN SALARIOS RRURUMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (100 SMMLV). 11)REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL O EXTRAJUDICIALMENTE COMO PERSONA JURÍDICA, CON FACULTADES PARA TRANSIGIR, COMPROMETER Y DESISTIR; 12) CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS, CADA VEZ QUE LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO O CUANDO SE LO SOLICITE UN NÚMERO PLURAL DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTE, POR LO MENOS, EL VEINTICINCO POR CIENTO (25%) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS O LA MITAD MÁS UNO DE LAS ACCIONES DE FAMILIA CLASE A EN CIRCULACIÓN; 13) PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN SUS SESIONES ORDINARIAS, UN INVENTARIO Y EL BALANCE DE CADA EJERCICIO, ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO GENERAL INDIVIDUALES Y CONSOLIDADOS CUANDO SEA DEL CASO CON SUS NOTAS, CORTADOS AL FIN DEL RESPECTIVO EJERCICIO JUNTO CON UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS Y LOS DOCUMENTOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 446 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y UN INFORME ESCRITO SOBRE LA FORMA COMO HUBIERE LLEVADO A CABO SU

GESTIÓN, DE LA SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD Y LAS MEDIDAS CUYA ADOPCIÓN RECOMIENDE A LA ASAMBLEA ADEMÁS DE AQUELLOS INFORMES QUE SEAN SOLICITADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 14) PRESENTAR OPORTUNAMENTE A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EL PRESUPUESTO DE INVERSIONES, INGRESOS Y GASTOS QUE REQUIERA LA SOCIEDAD; 15) VELAR PORQUE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUMPLAN ESTRICTAMENTE SUS DEBERES Y PONER EN CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS LAS IRREGULARIDADES O FALTAS GRAVES QUE OCURRAN SOBRE ESTE PARTICULAR; 16) CUIDAR LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE LA SOCIEDAD; 17) RENDIR CUENTAS COMPROBADAS DE SU GESTIÓN AL FINAL DE CADA EJERCICIO Y DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA FECHA EN LA CUAL SE RETIRE DE SU CARGO Y CUANDO SE LAS EXIJA EL ÓRGANO QUE SEA COMPETENTE PARA ELLO. PARA TAL EFECTO, SE PRESENTARÁN LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE FUEREN PERTINENTES, JUNTO CON UN INFORME DE GESTIÓN Y; 18) EJERCER TODAS LAS FACULTADES QUE DIRECTAMENTE DELEGUE EN ÉL LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 7 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019 DE ASAMBLEA GENERAL, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 75825 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL	AMAYA PIÑEROS ALEXANDER	CC 86,059,252	88603-T

CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

*** **NOMBRE ESTABLECIMIENTO** : ELECTRICOS LA 36 VILLAVICENCIO
MATRICULA : 145776
FECHA DE MATRICULA : 20060817
FECHA DE RENOVACION : 20240327
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2024
DIRECCION : CALLE 36 N. 27-12
BARRIO : SAN ISIDRO
MUNICIPIO : 50001 - VILLAVICENCIO
TELEFONO 1 : 6629324
TELEFONO 2 : 3118666886
CORREO ELECTRONICO : admon@grupodefa.co
ACTIVIDAD PRINCIPAL : G4663 - COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERIA Y CALEFACCION
ACTIVIDAD SECUNDARIA : G4752 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 15,000,000

*** **NOMBRE ESTABLECIMIENTO** : ELECTRICOS LA 36 NO 2
MATRICULA : 180994
FECHA DE MATRICULA : 20090324
FECHA DE RENOVACION : 20240327
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2024
DIRECCION : CALLE 36 NRO. 27-75
BARRIO : SAN ISIDRO
MUNICIPIO : 50001 - VILLAVICENCIO
TELEFONO 1 : 3214576144
TELEFONO 2 : 3118666886
CORREO ELECTRONICO : admon@grupodefa.co
ACTIVIDAD PRINCIPAL : G4663 - COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERIA Y CALEFACCION
ACTIVIDAD SECUNDARIA : G4752 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 15,000,000

*** **NOMBRE ESTABLECIMIENTO** : DISTRIBUCIONES D.S. SUCURSAL
MATRICULA : 309233
FECHA DE MATRICULA : 20170222

FECHA DE RENOVACION : 20240327
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2024
DIRECCION : CALLE 36 NO. 28 - 08
BARRIO : SAN ISIDRO
MUNICIPIO : 50001 - VILLAVICENCIO
TELEFONO 1 : 6086628520
TELEFONO 2 : 3118666886
CORREO ELECTRONICO : admon@grupodefa.co
ACTIVIDAD PRINCIPAL : G4663 - COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERIA Y CALEFACCION
VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 10,000,000

*** **NOMBRE ESTABLECIMIENTO** : DISTRIBUCIONES D.S
MATRICULA : 309244
FECHA DE MATRICULA : 20170222
FECHA DE RENOVACION : 20240327
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2024
DIRECCION : PARCELACION SANTA ANA LOTE 4 VEREDA ZURIA CARRETERA DEL AMOR
BARRIO : JUAN PABLO II
MUNICIPIO : 50001 - VILLAVICENCIO
TELEFONO 1 : 3123156860
TELEFONO 2 : 3118666886
CORREO ELECTRONICO : admon@grupodefa.co
ACTIVIDAD PRINCIPAL : G4663 - COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERIA Y CALEFACCION
VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 10,000,000

*** **NOMBRE ESTABLECIMIENTO** : DEFA CONSTRURAMA
MATRICULA : 353721
FECHA DE MATRICULA : 20190620
FECHA DE RENOVACION : 20240327
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2024
DIRECCION : CL 36 NRO. 28-08 BRR SAN ISIDRO
BARRIO : SAN ISIDRO
MUNICIPIO : 50001 - VILLAVICENCIO
TELEFONO 1 : 6086628520
TELEFONO 2 : 3118666886
CORREO ELECTRONICO : admon@grupodefa.co
ACTIVIDAD PRINCIPAL : G4663 - COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERIA Y CALEFACCION
ACTIVIDAD SECUNDARIA : H5210 - ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO
VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 10,000,000

*** **NOMBRE ESTABLECIMIENTO** : DEFA INNOVA
MATRICULA : 353722
FECHA DE MATRICULA : 20190620
FECHA DE RENOVACION : 20240327
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2024
DIRECCION : CL 26 C NRO. 36 - 18 BRR SIETE DE AGOSTO
BARRIO : SIETE DE AGOSTO
MUNICIPIO : 50001 - VILLAVICENCIO
TELEFONO 1 : 6086605527
TELEFONO 2 : 3118666886
CORREO ELECTRONICO : admon@grupodefa.co
ACTIVIDAD PRINCIPAL : G4663 - COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERIA Y CALEFACCION
ACTIVIDAD SECUNDARIA : H5210 - ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO
VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 10,000,000

*** **NOMBRE ESTABLECIMIENTO** : DEFA PUNTO VENTA
MATRICULA : 353723
FECHA DE MATRICULA : 20190620
FECHA DE RENOVACION : 20240327

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2024
DIRECCION : CALLE 36 NRO. 27 - 105 ESQUINA
BARRIO : SAN ISIDRO
MUNICIPIO : 50001 - VILLAVICENCIO
TELEFONO 1 : 6086740052
TELEFONO 2 : 3118666886
CORREO ELECTRONICO : admon@grupodefa.co
ACTIVIDAD PRINCIPAL : G4663 - COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERIA Y CALEFACCION
ACTIVIDAD SECUNDARIA : H5210 - ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO
VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 10,000,000

*** **NOMBRE ESTABLECIMIENTO** : DEFA PUERTO LOPEZ
MATRICULA : 363163
FECHA DE MATRICULA : 20200108
FECHA DE RENOVACION : 20240327
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2024
DIRECCION : KR 13 NO 4-42
BARRIO : LA UNION
MUNICIPIO : 50573 - PUERTO LOPEZ
TELEFONO 1 : 3214576144
TELEFONO 2 : 3118666886
CORREO ELECTRONICO : admon@grupodefa.co
ACTIVIDAD PRINCIPAL : G4663 - COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERIA Y CALEFACCION
ACTIVIDAD SECUNDARIA : H5210 - ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO
VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 10,000,000

*** **NOMBRE ESTABLECIMIENTO** : EL CAPO STORE
MATRICULA : 379573
FECHA DE MATRICULA : 20201013
FECHA DE RENOVACION : 20240327
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2024
DIRECCION : CA 48 NRO. 12 -06 LOCAL 5 BRR ESPERANZA
BARRIO : ESPERANZA
MUNICIPIO : 50001 - VILLAVICENCIO
TELEFONO 1 : 3214576144
TELEFONO 2 : 3118666886
CORREO ELECTRONICO : admon@grupodefa.co
ACTIVIDAD PRINCIPAL : G4771 - COMERCIO AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR Y SUS ACCESORIOS (INCLUYE ARTICULOS DE PIEL) EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
ACTIVIDAD SECUNDARIA : S9529 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS
OTRAS ACTIVIDADES : G4762 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS DEPORTIVOS, EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 10,000,000

*** **NOMBRE ESTABLECIMIENTO** : GRUPO DEFA SAS CENTRO
MATRICULA : 384822
FECHA DE MATRICULA : 20210115
FECHA DE RENOVACION : 20240327
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2024
DIRECCION : CALLE 36 NRO. 24 A 40 BRR SAN ISIDRO
BARRIO : SAN ISIDRO
MUNICIPIO : 50001 - VILLAVICENCIO
TELEFONO 1 : 6086610705
TELEFONO 2 : 3118666886
CORREO ELECTRONICO : admon@grupodefa.co
ACTIVIDAD PRINCIPAL : G4663 - COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERIA Y CALEFACCION
ACTIVIDAD SECUNDARIA : H5210 - ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO
OTRAS ACTIVIDADES : H4923 - TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 10,000,000

*** **NOMBRE ESTABLECIMIENTO** : GRUPO DEFA PUERTO LOPEZ

MATRICULA : 457667
FECHA DE MATRICULA : 20240423
FECHA DE RENOVACION : 20240423
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2024
DIRECCION : AV 14 19 27
BARRIO : LA UNION
MUNICIPIO : 50573 - PUERTO LOPEZ
TELEFONO 1 : 3123156860
TELEFONO 2 : 3118666886
CORREO ELECTRONICO : admon@grupodefa.co
ACTIVIDAD PRINCIPAL : G4663 - COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERIA Y CALEFACCION
ACTIVIDAD SECUNDARIA : H5210 - ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO
OTRAS ACTIVIDADES : H4923 - TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 10,000,000

*** **NOMBRE ESTABLECIMIENTO** : PINTUCO RESTREPO
MATRICULA : 469672
FECHA DE MATRICULA : 20241216
FECHA DE RENOVACION : 20241216
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2024
DIRECCION : CALLE 9 Nro. 6 - 19
BARRIO : CENTRO RESTREPO META
MUNICIPIO : 50606 - RESTREPO
TELEFONO 1 : 3123156860
CORREO ELECTRONICO : admon@grupodefa.co
ACTIVIDAD PRINCIPAL : G4663 - COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS DE FERRETERIA, PINTURAS, PRODUCTOS DE VIDRIO, EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERIA Y CALEFACCION
ACTIVIDAD SECUNDARIA : H5210 - ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO
OTRAS ACTIVIDADES : H4923 - TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 10,000,000

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es GRAN EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $171,464,018,000
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : G4663

INFORMA - REPORTE A ENTIDADES

Se realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT).

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $11,600

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)


IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar hasta po 60 dias y cuantas veces lo requiera, el contenido del mismo, ingresando al enlace https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40 seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación tZVESVsGSH

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.



***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL

Fecha expedición: 27/01/2025 - 09:43:09
Recibo No. S002061860, Valor 5800

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pnbrcQKXe8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2025.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : GRUPO DEFA SAS
Nit : 900795612-3
Domicilio: Villavicencio, Meta

MATRÍCULA

Matrícula No: 272546
Fecha de matrícula: 27 de noviembre de 2014
Ultimo año renovado: 2024
Fecha de renovación: 27 de marzo de 2024
Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : PARCELACION SANTA ANA LOTE 4 VEREDA ZURIA CARRETERA DEL AMOR - Juan pablo ii
Municipio : Villavicencio, Meta
Correo electrónico : contabilidad@grupodefa.co
Teléfono comercial 1 : 3123156860
Teléfono comercial 2 : 3118666886
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CL 36 N 27 - 75 - San isidro
Municipio : Villavicencio, Meta
Correo electrónico de notificación : contabilidad@grupodefa.co

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado No. 1 del 26 de noviembre de 2014 de la Asamblea Constitutiva de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 27 de noviembre de 2014, con el No. 50669 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada DISTRIBUCIONES LIBARDO QUINTERO DS S.A.S.

Por documento privado No. 1 del 26 de noviembre de 2014 de la Asamblea Constitutiva de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 27 de noviembre de 2014, con el No. 50669 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada DISTRIBUCIONES LIBARDO QUINTERO DS S.A.S.

REFORMAS ESPECIALES

Por documento privado del 09 de mayo de 2017 del Accionista Único de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 15 de mayo de 2017, con el No. 64746 del Libro IX, se decretó POR DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA 9 DE MAYO DE 2017, EXPEDIDO POR EL ACCIONISTA UNICO, CONSTA REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. (ART. 1 RAZON SOCIAL Y ART. 29 FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL).

Por documento privado del 09 de mayo de 2017 del Accionista Único de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 15 de mayo de 2017, con el No. 64746 del Libro IX, se decretó POR DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA 9 DE MAYO DE 2017, EXPEDIDO POR EL ACCIONISTA UNICO, CONSTA REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. (ART. 1 RAZON SOCIAL Y ART. 29 FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL).

Por documento privado del 01 de junio de 2019 de la Asamblea De Accionistas de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 22 de junio de 2019, con el No. 74395 del Libro IX, se decretó POR DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2019, EXPEDIDO POR ÚNICO ACCIONISTA, CONSTA REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS (ARTICULO 1 - RAZÓN SOCIAL).

Por Acta No. 11 del 30 de noviembre de 2020 de la Asamblea Extraordinaria Unico Accionista de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 15 de diciembre de 2020, con el No. 81976 del Libro IX, se decretó POR ACTA NUMERO 11 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020, EN ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE UNICO ACCIONISTA, CONSTA REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS, ARTICULO 5.

Por Certificación del 03 de diciembre de 2020 de la Certificado De Contador Publico de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 15 de diciembre de 2020, con el No. 81977 del Libro IX, se decretó POR CERTIFICACION SUSCRITA POR CONTADOR PUBLICO, DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DE 2020, CONSTA AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.

Por Acta No. 15 del 24 de julio de 2023 de la Asamblea General De Accionistas de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 07 de septiembre de 2023, con el No. 99832 del Libro IX, se decretó REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS

Por Certificación del 27 de octubre de 2023 de el Revisor Fiscal de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 01 de noviembre de 2023, con el No. 100722 del Libro IX, se decretó AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 15 del 24 de julio de 2023 de la Asamblea General De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 07 de septiembre de 2023 con el No. 99833 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE GENERAL	DAVID SANTOS BUITRAGO	C.C. No. 80.733.569
REPRESENTANTE LEGAL PRIMER SUPLENTE	YUBY ALEXANDRA URREGO BETANCOURT	C.C. No. 52.842.424
REPRESENTANTE LEGAL SEGUNDO SUPLENTE	DUBER ALBERTO GAVIRIA JIMENEZ	C.C. No. 79.998.699

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: G4663
Actividad secundaria Código CIIU: H5210
Otras actividades Código CIIU: H4923

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para

estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: ELECTRICOS LA 36 VILLAVICENCIO
Matrícula No.: 145776
Fecha de Matrícula: 17 de agosto de 2006
Último año renovado: 2024
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : CALLE 36 N. 27-12 - San Isidro
Municipio: Villavicencio, Meta

Nombre: ELECTRICOS LA 36 NO 2
Matrícula No.: 180994
Fecha de Matrícula: 24 de marzo de 2009
Último año renovado: 2024
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : CALLE 36 NRO. 27-75 - San Isidro
Municipio: Villavicencio, Meta

Nombre: DISTRIBUCIONES D.S. SUCURSAL
Matrícula No.: 309233
Fecha de Matrícula: 22 de febrero de 2017
Último año renovado: 2024
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : CALLE 36 NO. 28 - 08 - San Isidro
Municipio: Villavicencio, Meta

Nombre: DISTRIBUCIONES D.S
Matrícula No.: 309244
Fecha de Matrícula: 22 de febrero de 2017
Último año renovado: 2024
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : PARCELACION SANTA ANA LOTE 4 VEREDA ZURIA CARRETERA DEL AMOR - Juan Pablo Ii
Municipio: Villavicencio, Meta

Nombre: DEFA CONSTRURAMA
Matrícula No.: 353721
Fecha de Matrícula: 20 de junio de 2019
Último año renovado: 2024
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : CL 36 NRO. 28-08 BRR SAN ISIDRO - San Isidro
Municipio: Villavicencio, Meta

Nombre: DEFA INNOVA
Matrícula No.: 353722
Fecha de Matrícula: 20 de junio de 2019
Último año renovado: 2024
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : CL 26 C NRO. 36 - 18 BRR SIETE DE AGOSTO - Siete De Agosto
Municipio: Villavicencio, Meta

Nombre: DEFA PUNTO VENTA
Matrícula No.: 353723
Fecha de Matrícula: 20 de junio de 2019
Último año renovado: 2024
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : CALLE 36 NRO. 27 - 105 ESQUINA - San Isidro
Municipio: Villavicencio, Meta

Nombre: DEFA PUERTO LOPEZ
Matrícula No.: 363163
Fecha de Matrícula: 08 de enero de 2020
Último año renovado: 2024
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : KR 13 NO 4-42 - La Union
Municipio: Puerto López, Meta

Nombre: EL CAPO STORE
Matrícula No.: 379573
Fecha de Matrícula: 13 de octubre de 2020
Último año renovado: 2024
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : CA 48 NRO. 12 -06 LOCAL 5 BRR ESPERANZA - Esperanza
Municipio: Villavicencio, Meta

Nombre: GRUPO DEFA SAS CENTRO
Matrícula No.: 384822
Fecha de Matrícula: 15 de enero de 2021
Último año renovado: 2024
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : CALLE 36 NRO. 24 A 40 BRR SAN ISIDRO - San Isidro
Municipio: Villavicencio, Meta

Nombre: GRUPO DEFA PUERTO LOPEZ
Matrícula No.: 457667
Fecha de Matrícula: 23 de abril de 2024
Último año renovado: 2024
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : AV 14 19 27 - La Union
Municipio: Puerto López, Meta

Nombre: PINTUCO RESTREPO
Matrícula No.: 469672
Fecha de Matrícula: 16 de diciembre de 2024
Último año renovado: 2024
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : CALLE 9 Nro. 6 - 19 - Centro Restrepo Meta
Municipio: Restrepo, Meta

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL

Fecha expedición: 27/01/2025 - 09:43:09
Recibo No. S002061860, Valor 5800

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN pnbrcQKXe8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2025.

MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

HABILITACIÓN(ES) ESPECIAL(ES)

La persona jurídica no ha inscrito el acto administrativo que lo habilita para prestar el servicio público de transporte automotor en la modalidad de carga.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es GRAN EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $171.464.018.000,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : G4663.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA - REPORTE A ENTIDADES

Se realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT).

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

Débora Murillo R

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

Dumalux®

DUMALUX S.A.S.
NIT : 900518730- 8
km 16, Autopista Nte., Vda. El Noral, BODEGA #1
4449976 -
COPACABANA-ANTIOQUIA

Copacabana-Antioquia,

Señores
NOMBRE CLIENTE: CONSORCIO ALSIPA

DIRECCION
TELEFONO :

Copacabana-Antioquia . Colombia

Ref : Cotización V - 001 - 14698

Es grato para nosotros poner a su consideración la siguiente propuesta

ITEM	DESCRIPCION	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Luminaria de Alumbrado público 60W, 4000k/5000k chip led LUMILEDS, 36 LEDS, 100,000 >, horas de luz.	1	1.001.425,00	1.001.425,00
2	Mástil 4m altura 3"diámetro metálico	1	697.840,00	697.840,00
3	Parrilla de postes de alumbrado publico	1	71.490,00	71.490,00
			Total Bruto	1.770.755,00
			rtfuente	
			DCTO	
			IVA	336.443,00
			Total a Pagar	**2.107.198,00**

ENTREGA

Anticipo para alistamiento del 30%

Contado

Valido: Hasta el 30 de marzo de 2025 Cordialmente;

Los precios relacionados son precio lista



Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha de expedición: 21/01/2025 - 9:52:45 AM

CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA

Recibo No.: 0027590844 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: bkDphildchkdiiai

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social:	DUMALUX S.A.S
Sigla:	No reportó
Nit:	900518730-8
Domicilio principal:	COPACABANA, ANTIOQUIA, COLOMBIA

MATRÍCULA

Matrícula No.:	21-466904-12
Fecha de matrícula:	18 de Abril de 2012
Último año renovado:	2024
Fecha de renovación:	12 de Marzo de 2024
Grupo NIIF:	GRUPO II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	KM 16 sobre la vereda el Noral la Bodega 1
Municipio:	COPACABANA, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico:	info@dumalux.com
Teléfono comercial 1:	4449976
Teléfono comercial 2:	3044449602
Teléfono comercial 3:	No reportó
Página web:	No reportó

Dirección para notificación judicial:	Vereda el Noral KM 16 Bodega 1 Copacabana
Municipio:	COPACABANA, ANTIOQUIA, COLOMBIA
Correo electrónico de notificación:	info@dumalux.com
Teléfono para notificación 1:	4449976
Teléfono para notificación 2:	No reportó
Teléfono para notificación 3:	No reportó

La persona jurídica DUMALUX S.A.S SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad

---

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

CONSTITUCIÓN

CONSTITUCION: Que por documento privado de abril 18 de 2012, de los Accionistas, registrado en esta Entidad en abril 18 de 2012, en el libro 9, bajo el número 7324, se constituyó una Sociedad Comercial por Acciones Simplificada denominada:

MALUMA GROUP SAS

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 2, del 15 de octubre de 2013, de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, registrada en esta entidad el 28 de octubre de 2013, con el No. 19606 del Libro IX, mediante la cual se aprobó el cambio de denominación quedando así:

DUMALUX S.A.S.

Por Acta No. 9 del 20 de julio de 2023, de la Asamblea, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 18 de agosto de 2023, con el No. 30478 del libro IX, la sociedad cambia su domicilio de Medellín al municipio de Copacabana.

TERMINO DE DURACIÓN

VIGENCIA: Que la sociedad no se halla disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá como objeto principal la comercialización al por menor de productos especializados en tecnología para el mejoramiento de espacios. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero.

La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

CAPITAL

		CAPITAL AUTORIZADO
Valor	:	$1.000.000.000,00
No. de acciones	:	1.000.000,00
Valor Nominal	:	$1.000,00
		CAPITAL SUSCRITO
Valor	:	$504.250.000,00
No. de acciones	:	504.250,00
Valor Nominal	:	$1.000,00
		CAPITAL PAGADO
Valor	:	$504.250.000,00
No. de acciones	:	504.250,00
Valor Nominal	:	$1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad recaerá en 2 (DOS) órganos separados, el REPRESENTANTE LEGAL GENERAL y EL REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS CONTRACTUALES, quienes podrán ser personas naturales o jurídicas, accionistas o no. EL REPRESENTANTE LEGAL GENERAL tendrá dos (2) suplentes, designados para un término de un año por la asamblea general de accionistas, mientras que el REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS CONTRACTUALES no requerirá tener suplente y será designado por el REPRESENTANTE LEGAL GENERAL.

Las funciones de cualquiera de los órganos de representación legal terminarán en caso de dimisión o revocación por parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural y en caso de liquidación privada o judicial, cuando el representante legal sea una persona jurídica.

La cesación de las funciones de cualquiera de los órganos de representación legal, por cualquier causa, no da lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le

---

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso.

La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo.

En aquellos casos en que cualquiera de los órganos de representación legal sea una persona jurídica, las funciones quedarán a cargo del representante legal de ésta.

Toda remuneración a que tuviere derecho cualquiera de los órganos de representación legal de la sociedad, deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas.

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por ambos órganos de representación legal, pero sus facultades serán diferentes. EL REPRESENTANTE LEGAL GENERAL no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que EL REPRESENTANTE LEGAL GENERAL podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad.

EL REPRESENTANTE LEGAL GENERAL se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas.

En cuanto al REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS CONTRACTUALES, tendrá las mismas facultades que el REPRESENTANTE LEGAL GENERAL, pero deberá obtener autorización de este, o en su defecto de la Asamblea General de Accionistas, para celebrar o ejecutar los siguientes actos o contratos:

1. Actos o contratos con cuantía superior a SEISCIENTOS (600) salarios mínimos mensuales vigentes. Para el cálculo de la cuantía se tomarán en cuenta todas las obligaciones en dinero o equivalentes en dinero, ciertas o eventuales (inciertas), así como posibles sanciones, retractos, indemnizaciones, terminaciones, o cualquiera sea su denominación que implique obligaciones en dinero o equivalentes.

2. Actos o contratos sobre bienes inmuebles.

3. Celebrar cualquier acto o contrato principal o accesorio que implique

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

una financiación, crédito o deuda, o en sentido general endeudar a la sociedad ante instituciones financiera o particulares, privados o públicos.

4. Dar garantías reales, personales, mobiliarias, o de cualquiera otra índole de obligaciones de terceros. Así mismo suscribir títulos valores que obliguen a la sociedad ante terceros.

En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por cualquiera de los órganos de representación legal.

Le está prohibido a cualquiera de los órganos de representación legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales. Para los actos descritos en el presente inciso se deberá obtener autorización de la Asamblea General de Accionistas.

NOMBRAMIENTOS

NOMBRAMIENTOS:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	MATEO DUQUE CASTRO DESIGNACION	1.152.435.492

Por documento privado de abril 18 de 2012, de los Accionistas, registrado en esta Entidad en abril 18 de 2012, en el libro 9, bajo el número 7324.

PRIMER REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	MAICOL MUÑOZ VILLEGAS DESIGNACION	1.037.601.902

Por documento privado de abril 18 de 2012, de los Accionistas, registrado en esta Entidad en abril 18 de 2012, en el libro 9, bajo el número 7324.

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRAMIENTOS

Por Acta No. 6 del 16 de noviembre de 2021, de la Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 22 de febrero de 2022, con el No. 5184 del libro IX, el representante legal designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS CONTRACTUALES	GABRIEL JAIME GOMEZ	C.C. 1.035.859.380

REVISORES FISCALES

Por Acta No.7 del 14 de febrero de 2022, de la Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 17 de febrero de 2022, con el No.4705 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REVISOR FISCAL	ELKIN DARIO GIRALDO SALAZAR	C.C. 71.594.307 T.P. 193807-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la Sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCION
Acta No. 1 del 13/09/2012 de Asamblea	17415 del 25/09/2012 del L. IX
Acta No. 2 del 15/10/2013 de Asamblea	19606 del 28/10/2013 del L. IX
Acta No. 6 del 02/11/2021 de Asamblea	35273 del 11/11/2021 del L. IX
Acta No. 6 del 16/11/2021 de Asamblea	5183 del 22/02/2022 del L. IX
Acta No. 9 del 20/07/2023 de Asamblea	30478 del 18/08/2023 del L. IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que

---

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal código CIIU: 4669
Actividad secundaria código CIIU: 4754
Otras actividades código CIIU: 4321, 4752

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura matriculado en esta Cámara de Comercio el siguiente establecimiento de comercio/sucursal o agencia:

Nombre:	LEDLITE
Matrícula No.:	21-545932-02
Fecha de Matrícula:	19 de Marzo de 2013
Ultimo año renovado:	2024
Categoría:	Establecimiento-Principal
Dirección:	Vereda el Noral Km 16 Bodega 1 Copacabana
Municipio:	COPACABANA, ANTIOQUIA, COLOMBIA

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

Recibo No.: 0027590844 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: bkDphildchkdiiai

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SE RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL WWW.GARANTIASMOBILIARIAS.COM.CO DONDE PUEDEN OBRAR INSCRIPCIONES ADICIONALES RELATIVAS A GARANTIAS MOBILIARIAS, CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O LIMITACIONES DE LA PROPIEDAD.

TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la presa es pequeña.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $12,489,198,741.00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU: 4754

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado cuenta con plena validez jurídica según lo dispuesto en la ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto la firma mecánica que es una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, como la firma digital y la respectiva estampa cronológica, las cuales podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos PDF.

Si usted expidió el certificado a través de la plataforma virtual, puede imprimirlo con la certeza de que fue expedido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado puede verificar su contenido de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir del momento de su expedición, ingresando a www.certificadoscamara.com y digitando el código de verificación que se encuentra en el encabezado del presente

Recibo No.: 0027590844 Valor: $00

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: bkDphildchkdiiai

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.certificadoscamara.com y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

---

documento. El certificado a validar corresponde a la imagen y contenido del certificado creado en el momento en que se generó en las taquillas o a través de la plataforma virtual de la Cámara.

SANDRA MILENA MONTES PALACIO
Vicepresidente de Registros

D.F.C
SUMINISTROS ELECTRICOS

DIEGO ANDRES ROA
Nit: 93438924 - 1 Regimen Comun
Tel: 683 3944 - Cel : 312 460 7921
Cl 35a 28 22 San Isidro

COTIZACION
Nº: 49349

FECHA :28/02/2025

Cliente : CONSORCIO ALSIPA **Nit.** : 901892095-4
Dirección : CR 25A#8-125 CONJ LA CABAÑA CA1 IN 9 **Ciudad** : VILLAVICENCIO
Teléfono : 3222169909

799746	LUMINARIA SYLVANIA LED 60W 7 PINES	1.00	UNIDAD	1,083,493.31	0.00	1,083,493.31
487348	MASTIL 4MX3" PARA LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO	1.00	UNIDAD	736,622.50	0.00	736,622.50
487349	CANASTA DE ANCLAJE PARA POSTE METALICO	1.00	UNIDAD	79,727.50	0.00	79,727.50

Observaciones: El precio indicado es precio lista no publico

Entrega : 0
Validez : 30

SUBTOTAL	1,899,843
DESCUENTO	0
IVA	360,970
TOTAL	2,260,814

CONDICIONES DE PAGO CONTADO

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 27/01/2025 - 13:24:08
Recibo No. S002062290, Valor 5800

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 17fDyQwuX8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2025.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Nombres y apellidos : DIEGO ANDRES ROA
Identificación : CC. - 93438924
Nit : 93438924-1
Domicilio: Villavicencio, Meta

MATRÍCULA

Matrícula No: 223457
Fecha de matrícula: 25 de noviembre de 2011
Ultimo año renovado: 2024
Fecha de renovación: 11 de marzo de 2024
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CL 35 A 28 22 BRR SAN ISIDRO - San isidro
Municipio : Villavicencio, Meta
Correo electrónico : dfcsuministroselectricos@hotmail.com
Teléfono comercial 1 : 6833944
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : 3124607921

Dirección para notificación judicial : CL 35 A 28 22 BRR SAN ISIDRO - San isidro
Municipio : Villavicencio, Meta
Correo electrónico de notificación : dfcsuministroselectricos@hotmail.com

La persona natural **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: G4663
Actividad secundaria Código CIIU: H4923
Otras actividades Código CIIU: G4752 F4321

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social -RUES- : Suministro de materiales electricos

INFORMACION FINANCIERA

El comerciante matriculado reportó la siguiente información financiera, la cual corresponde a la última información reportada en la matrícula mercantil, así:

Estado de la situación financiera:
Activo corriente: $76.061.000,00
Activo no corriente: $120.339.000,00
Activo total: $196.400.000,00
Pasivo corriente: $0,00
Pasivo no corriente: $0,00
Pasivo total: $0,00
Patrimonio neto: $196.400.000,00

Pasivo más patrimonio: $196.400.000,00

Estado de resultados:
Ingresos actividad ordinaria: $21.125.717.000,00
Otros ingresos: $0,00
Costo de ventas: $18.408.435.000,00
Gastos operacionalee: $1.532.046.000,00
Otros gastos: $0,00
Gastos por impuestos: $0,00
Utilidad operacional: $1.185.236.000,00
Resultado del periodo: $1.185.236.000,00

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona natural, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: DFC SUMINISTROS ELECTRICOS
Matrícula No.: 223458
Fecha de Matrícula: 25 de noviembre de 2011
Último año renovado: 2024
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : CL 35 A 28 22 BRR SAN ISIDRO - San Isidro
Municipio: Villavicencio, Meta

Nombre: DFC SUMINISTROS ELECTRICOS # 3
Matrícula No.: 328389
Fecha de Matrícula: 28 de febrero de 2018
Último año renovado: 2024
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : CL 36 NRO. 28-50 - San Isidro
Municipio: Villavicencio, Meta

Nombre: DFC SUMINISTROS ELECTRICOS # 2
Matrícula No.: 464145
Fecha de Matrícula: 26 de agosto de 2024
Último año renovado: 2024

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 27/01/2025 - 13:24:08
Recibo No. S002062290, Valor 5800

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 17fDyQwuX8

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2025.

Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : CL 36 28 49 - San Isidro
Municipio: Villavicencio, Meta

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA NATURAL TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

HABILITACIÓN(ES) ESPECIAL(ES)

La persona natural no ha inscrito el acto administrativo que lo habilita para prestar el servicio público de transporte automotor en la modalidad de carga.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MEDIANA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $21.125.717.000,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : G4663.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA - REPORTE A ENTIDADES

Se realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT).

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la persona natural, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

Débora Murillo R

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****



Cotizacion
No. C-24-44578

CONCRETO ESTAMPADO DE COLOMBIA S.A.S
NIT 900.440.077-9
KM 1 7 AUT MEDELLIN ENTRADA PARQUE LA FLORIDA 1 1
KM PAR INDUSTRIAL TERRAPUERTO BG 34
Tel: (8766121)
Cota - Colombia

Para	CONSORCIO ALSIPA
Nit	901.892.095-4
Fecha	2024-12-27

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Cordial saludo,

A continuación encontrará el detalle de los productos requeridos para su obra. Si tiene consultas, preguntas o inquietudes no dude en contactarnos a las líneas celulares disponibles (Cel. 3142190393 - 3123758389) o al PBX 8766121.

Esperamos que esta oferta sea de su agrado y nos permita hacer parte de su obra.

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Fotos	Videos	Vr. Bruto
1	CONCRETE COLOR (Color endurecedor de cuarzo) COLOR AZUL - PRESENTACIÓN BULTO DE 25KG	1.00	BULTO	457,060.92	Ver	Ver	457,060.92
2	CONCRETE COLOR (Color endurecedor de cuarzo) COLOR OCRE- PRESENTACIÓN BULTO DE 25KG	1.00	BULTO	79,416.60	Ver	Ver	79,416.60
3	DESMOL CONCRETE - NEUTRO (Desmoldante en polvo) - PREST. CUÑETE DE 20KG	1.00	CUÑETE	291,178.15	Ver	Ver	291,178.15
4	ALQUILER MOLDE MT-10 ADOQUIN ESPINA DE PESCADO 90CM X 66,5CM - MOLDE EN POLIURETANO PARA ESTAMPAR CONCRETO – EN CASO DE PERDIDA O ENTREGA EN MAL ESTADO DEBERA ASUMIR EL COSTO DEL MOLDE	1.00	DIA	2394.96	Ver	Ver	2394.96
5	SELLA CONCRETE - (SELLADOR ACRILICO TRANSPARENTE) SEMI MATE - PREST. CUÑETE 20LT – PARA PROTEGER Y EMBELLECER PISOS O PIEZAS EN CONCRETO Y PIEDRA NATURALES.	1.00	CUÑETE	39,924.37	Ver	Ver	39,924.37

Total Bruto	869,975.00
Subtotal	869,975.00
IVA 19%	165,295.25
Total a Pagar	1,035,270.25

APRECIADO CLIENTE: IMPORTANTE TENER EN CUENTA:

De acuerdo con nuestra conversación adjuntamos cotización para el listado de materiales solicitado

CONDICIONES DE DESPACHO Y TRASNPORTE DE LOS MATERIALES:

1. **Tiempo estimado en fabricación: 24 a 48hrs hábiles**

EL PAGO ES DE CONTADO:

NOTA: El comprobante de pago de esta cotización agradecemos enviarlo al correo comercial@concretoestampadocolombia.com o vía WhatsApp al asesor que le brindó la atención.

Los pagos los puede realizar en los siguientes bancos:

BANCOLOMBIA /CUENTA DE AHORROS No 67311758311 A NOMBRE DE: CONCRETO ESTAMPADO DE S.A.S
BANCO DE BOGOTA / CUENTA DE AHORROS No 016139560 A NOMBRE DE: CONCRETO ESTA COLOMBIA S.A.S
BANCO DAVIVIENDA / CUENTA DE AHORROS No 463500026810 A NOMBRE DE: CONCRETO EST COLOMBIA S.A.S
BANCO BBVA / CUENTA DE AHORROS No 021108469 A NOMBRE DE: CONCRETO ESTAMPADO DE COLOMBIA S.A.S

OTRAS CONDICIONES:

1. Esta oferta tiene validez de 15 días hábiles.

2. Los precios aquí relacionados son precio lista no precio público.

3. Si es Retenedor, aplicar retención del 2.5% por compras, cuando el valor del subtotal sea igual o superior a $1.271.000. NO SOMOS AUTORRETENEDORES: Por favor SOLO APLIQUE RETEICA si su empresa está ubicada en el municipio de Cota. Si su empresa no se encuentra ubicada en el municipio de Cota, no nos debe practicar Retención de ICA o RETEICA.

4. Lo invitamos a revisar muy bien las cantidades y materiales descritos en la presente cotización, ya que una vez despachados éstos no tienen cambio.

5. Así mismo es IMPORTANTE que se revise con mucho detalle la ficha técnica de cada productos; las cuales están siempre disponibles nuestro portal web:

https://concretoestampadocolombia.com/ - Sección: Materiales

CONCRETOL SAS no tiene responsabilidad en el manejo que se le dé a la aplicación y como se lleve a cabo la instalación de los materiales. La aplicación e instalación de estos es responsabilidad del personal en obra que realice el proceso.

Link de nuestro canal en YouTube:https://www.youtube.com/user/concretoestampadocol

DPTO. COMERCIAL
comercial@concretoestampadocolombia.com

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de febrero de 2025 Hora: 14:21:23
Recibo No. AA25199216
Valor: $ 11,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25199216FC218

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificacion se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedicion.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: CONCRETO ESTAMPADO DE COLOMBIA S.A.S
Sigla: CONCRETCOL S.A.S
Nit: 900.440.077-9 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota
Domicilio principal: Cota (Cundinamarca)

MATRÍCULA

Matrícula No. 02104444
Fecha de matrícula: 1 de junio de 2011
Último año renovado: 2024
Fecha de renovación: 21 de marzo de 2024
Grupo NIIF: Grupo II.

El empresario se acogio al beneficio que establece el artículo 7 de la Ley 1429 del 29 de diciembre de 2010, y que al realizar la renovación de la matricula mercantil informó bajo gravedad de juramento los siguientes datos:
El empresario CONCRETO ESTAMPADO DE COLOMBIA S.A.S realizó la renovación en la fecha: 21 de marzo de 2024.
El número de trabajadores ocupados reportado por el empresario en su última renovación es de: 29.

Que el matriculado tiene la condición de pequeña empresa de acuerdo con lo establecido en el numeral 1 del artículo 2° de la Ley 1429 de 2010.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Km 1.7 Autopista Medellin Estado Sur Entrada Parque Florida 1.1 K
Municipio: Cota (Cundinamarca)
Correo electrónico: concretoestampadocolombia@hotmail.com

Constanza del Pilar Pinzón Trujillo

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedicion: 13 de febrero de 2025 Hora: 14:21:23
Recibo No. AA25199216
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25199216FC218

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificacion se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 dias calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Teléfono comercial 1: 8766114
Teléfono comercial 2: 8766121
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Km 1.7 Autopista Medellin Estado

Sur Bodega Parq

Municipio: Cota (Cundinamarca)
Correo electrónico de notificación: concretoestampadocolombia@hotmail.com
Teléfono para notificación 1: 8766114
Teléfono para notificación 2: 8766121
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Constitución: Que por Documento Privado de Asamblea de Accionistas del 18 de mayo de 2011, inscrita el 1 de junio de 2011 bajo el número 01484133 del libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada CONCRETO ESTAMPADO DE COLOMBIA S A S.

Certifica:

Que por Acta no. 003 de Asamblea de Accionistas del 28 de diciembre de 2017, inscrita el 16 de febrero de 2018 bajo el número 02303532 del libro IX, la sociedad cambió su nombre de: CONCRETO ESTAMPADO DE COLOMBIA S A S por el de: CONCRETO ESTAMPADO DE COLOMBIA S.A.S.

REFORMAS ESPECIALES

Que por Acta No. 003 de la Asamblea de Accionistas del 28 de diciembre de 2017, inscrito el 16 de febrero de 2018 bajo el número 02303532 del libro IX, la sociedad de la referencia tendrá como sigla: CONCRETCOL S.A.S.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 12 de febrero de 2025 Hora: 14:21:23
Recibo No. AA25199216
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACION A25199216FC218

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Que por Acta No. 5 de la Asamblea de Accionistas, del 28 de febrero de 2015, inscrito el 24 de marzo de 2015 bajo el número 01923070 del libro IX, la sociedad de la referencia trasladó su domicilio de la ciudad de: Bogotá D.C., a la ciudad de: Cota (Cundinamarca).

TÉRMINO DE DURACIÓN

Vigencia: Que la sociedad no se halla disuelta, y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

Objeto Social: La sociedad tendrá como objeto principal la construcción, interventoría y consultoría de obras de ingeniería civil y alquiler de maquinaria y equipo de construcción y de ingeniería civil. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

CAPITAL

Capital:

** Capital Autorizado **

Valor	: $150,000,000.00
No. de acciones	: 1,500.00
Valor nominal	: $100,000.00

** Capital Suscrito **

Valor	: $150,000,000.00
No. de acciones	: 1,500.00
Valor nominal	: $100,000.00

** Capital Pagado **

Valor	: $150,000,000.00

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de febrero de 2025 Hora: 14:21:23
Recibo No. AA25199216
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25199216FC218

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedicion. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedicion.

No. de acciones : 1,500.00
Valor nominal : $100,000.00

REPRESENTACIÓN LEGAL

Representacion Legal: La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien no tendrá suplentes.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del Representante Legal: La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le esta prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

** Nombramientos **

Que por Documento Privado no. de Asamblea de Accionistas del 18 de mayo de 2011, inscrita el 1 de junio de 2011 bajo el número 01484133 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de febrero de 2025 Hora: 14:21:23
Recibo No. AA25199216
Valor: $ 11,600

CODIGO DE VERIFICACION A25199216FC218

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre	Identificación
REPRESENTANTE LEGAL	
Dumez Gama Anyul Amparo	C.C. 000000047440565

REVISORES FISCALES

** Revisor Fiscal **
Que por Acta no. 15 de Asamblea de Accionistas del 23 de octubre de 2019, inscrita el 25 de noviembre de 2019 bajo el número 02526963 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	
Avila Dara Gerson Mario	C.C. 000000091246605

Que por Acta no. 8 de Asamblea de Accionistas del 4 de enero de 2016, inscrita el 11 de febrero de 2016 bajo el número 02061029 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):

Nombre	Identificación
REVISOR FISCAL SUPLENTE	
Alarcon Ruiz Luz Dary	C.C. 000000052302351

REFORMAS DE ESTATUTOS

Reformas:

Documento No.	Fecha	Origen	Fecha	No.Insc.
5	2015/02/26	Asamblea de Accionist	2015/03/24	01923070
003	2017/12/28	Asamblea de Accionist	2018/02/16	02303532
14	2019/08/26	Asamblea de Accionist	2019/08/30	02501458

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos

recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4663
Actividad secundaria Código CIIU: 2219
Otras actividades Código CIIU: 2011, 4290

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 8.305.752.000
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4663

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre Planeación son informativos: Fecha de envío de información a Planeación : 26 de diciembre de 2014. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 13 de febrero de 2025 Hora: 14:21:23
Recibo No. A25199216
Valor: $ 11,600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A25199216FC218

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

Cotización N° 2024-5784
Fecha de cot. 27/12/2024
Fecha de Vencimiento

L&H
SUMINISTROS DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN

EMISOR	CLIENTE
SUMINISTRO DE MATERIALES LH SAS Transversal 24A #39C - 46 Villavicencio - Meta NIT 901478450-1	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901892095-4

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
SELLADOR SUPERFICIES EN CONCRETO X GAL	**1**	**GAL**	**5323.90**	**5323.90**
DIA ALQUILER MOLDE FIGURA ESTAPADO	**1**	**DIA**	**2689.08**	**2689.08**
DESENC/ POLVO DESMOLDAENTE CONCRETO X 20KG	**1**	**BULTO**	**246210.34**	**246210.34**
TINTE EN POLVO ENDURECEDOR COLOR AZUL X 50KG	**1**	**BULTO**	**968518.49**	**968518.49**
TINTE EN POLVO ENDURECEDOR COLOR OCRE X 50KG	**1**	**BULTO**	**140612.18**	**140612.18**

MATERIAL PARA ENTREGAR EN BODEGA	SUBTOTAL SIN IVA	1363353.99
VALIDEZ DE LA OFERTA: 1 DIA	IVA 19%	259037.26
FORMA DE PAGO: DE CONTADO	TOTAL COP	1622391.24
PRECIOS LISTA		

Favor consignar
Banco de Bogotá N°351193396 Cuenta Corriente
Bancolombia N° 364-000013-50 Cuenta Corriente
a nombre de SUMINISTRO DE MATERIALES LH SAS NIT 901.478.450-1

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL

Fecha expedición: 27/01/2025 - 13:09:49
Recibo No. S002062271, Valor 5800

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN D6bzDKJ1wn

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2025.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : SUMINISTROS DE MATERIALES LH SAS
Nit : 901478450-1
Domicilio: Villavicencio, Meta

MATRÍCULA

Matrícula No: 392962
Fecha de matrícula: 21 de abril de 2021
Ultimo año renovado: 2024
Fecha de renovación: 25 de abril de 2024
Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : TV 24A 39C 46 BRR EMPORIO - Emporio
Municipio : Villavicencio, Meta
Correo electrónico : suministrodemateriales1h@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3203018998
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : TV 24A 39C 46 BRR EMPORIO - Emporio
Municipio : Villavicencio, Meta
Correo electrónico de notificación : suministrodemateriales1h@gmail.com

La persona jurídica **NO** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 08 de abril de 2021 de la Asamblea Constitutiva de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 21 de abril de 2021, con el No. 84072 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada SUMINISTROS DE MATERIALES LH SAS.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por documento privado del 08 de abril de 2021 de la Asamblea Constitutiva, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 21 de abril de 2021 con el No. 84072 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	HERNAN AUGUSTO BUITRAGO ARDILA	C.C. No. 79.536.219
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	MARTHA ROCIO VEGA ROZO	C.C. No. 39.727.177

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: G4663
Actividad secundaria Código CIIU: H4923
Otras actividades Código CIIU: C2410

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES L&H
Matrícula No.: 397430
Fecha de Matrícula: 06 de julio de 2021
Último año renovado: 2024
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : TV 24 A 39 C 46 - Emporio
Municipio: Villavicencio, Meta

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

HABILITACIÓN(ES) ESPECIAL(ES)

La persona jurídica no ha inscrito el acto administrativo que lo habilita para prestar el servicio público de transporte automotor en la modalidad de carga.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL

Fecha expedición: 27/01/2025 - 13:09:49
Recibo No. S002062271, Valor 5800

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN D6bzDKJ1wn

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2025.

Ingresos por actividad ordinaria : $5.434.518.621,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : G4663.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA - REPORTE A ENTIDADES

Se realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT).


Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.



***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 27/01/2025 - 13:09:51
Recibo No. S002062271, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN r6CpPUuvEz

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2025.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : SUMINISTROS DE MATERIALES LH SAS
Nit : 901478450-1
Domicilio: Villavicencio, Meta

MATRÍCULA

Matrícula No: 392962
Fecha de matrícula: 21 de abril de 2021
Ultimo año renovado: 2024
Fecha de renovación: 25 de abril de 2024
Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : TV 24A 39C 46 BRR EMPORIO - Emporio
Municipio : Villavicencio, Meta
Correo electrónico : suministrodemateriales1h@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3203018998
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : TV 24A 39C 46 BRR EMPORIO - Emporio
Municipio : Villavicencio, Meta
Correo electrónico de notificación : suministrodemateriales1h@gmail.com

La persona jurídica **NO** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 08 de abril de 2021 de la Asamblea Constitutiva de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 21 de abril de 2021, con el No. 84072 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada SUMINISTROS DE MATERIALES LH SAS.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

HABILITACIÓN(ES) ESPECIAL(ES)

La persona jurídica no ha inscrito el acto administrativo que lo habilita para prestar el servicio público de transporte automotor en la modalidad de carga.

OBJETO SOCIAL

Objeto Social: La Sociedad tendrá por objeto la realización de cualquier actividad comercial o civil lícita, entre ellas las siguientes: a. La Compra, venta, distribución, comercialización, importación y explotación de artículos o materiales de construcción, cualquiera que fuera su naturaleza o uso, comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales

de fontanería y calefacción, industrias básicas de hierro y de acero. b. La exploración y explotación de minerales. C. Compra, venta, distribución, comercialización, importación o explotación de equipos, vehículos 0 maquinaria para la construcción. d. La prestación de servicios de consultoría, asesorías, interventorías y análisis en todas las áreas de la ingeniería y las finanzas, emitir concepto y servir de consultor, perito, interventor o director de obras y trabajos de ingeniería. e. La gerencia, gestoría, elaboración, administración u operación, explotación de proyectos cualquiera que sea su clase. f. La inversión o participación como socio en cualquier forma de asociación o en sociedades comerciales cuyo objeto social sea compatible complementarios con el de la sociedad, así como también en entidades financieras, cualquiera que sea la categoría de ellas. g. La adquisición de acciones, cuotas, partes de interés social, participaciones, bonos, títulos negociables o cualquier otro título valor y la realización de cualquier operación sobre ellos O la tenencia de ellos a. Cualquier títuloh. La aceptación y el ejercicio de representaciones y distribuciones que se realicen con el objeto social de la compañía. i. La explotación industrial con fines comerciales de canteras y playas de ríos. j. La producción y comercialización de triturados, arenas, derivados y afines. k. La producción de concretos asfalticos y concretos en cemento. I. La producción y comercialización de prefabricados de concreto, postes, bloques, tubos, · viguetas, etc. m. La explotación y comercialización de calizas y yesos. n. La explotación y trabajos de minería en general.o. La prestación de servicio de alquiler de maquinaria y equipo destinado a— a construcción de obras de ingeniería civil y similares, compra y venta de artículos de ferretería y similares, compra y venta de materiales para construcción y similares y la compra y venta de bienes muebles e inmuebles utilizados o utilizables en el giro ordinario de sus actividades. p. El Servicio de transporte de carga por carretera. q. Actividades de arquitectura e ingeniería en general, obras civiles, construcción y actividades conexas de asesoramiento. r. La ejecución de trabajos de topografía, localización y trazado de carreteras 0 vías, afinados, pavimentaciones, puentes, obras de arte o cualquier otra obra dentro del campo de la ingeniería civil. s. La construcción de edificios, parqueaderos, casas, conjuntos habitacionales, centros comerciales 0 de otras construcciones, cualquiera que sea su uso 0 utilización, así como la ejecución de obras para construir vías, acueductos, alcantarillados, instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias o sistemas de telefonía y comunicación para la utilización de los bienes construidos t. La construcción o adecuación de bienes inmuebles y el desarrollo de cualquier actividad de construcción sobre ellos, para enajenarlos a cualquier título, para arrendados u operarios o explotarlos ecónomamente. u. La adquisición de bienes inmuebles rurales o urbanos para desarrollar parcelaciones o urbanizaciones sobre ellos y la enajenación de los lotes y construcciones producto de estas. v. ASÍ mismo, podrá realizar cualquier otra actividad economia lícita tanto en Colombia como en el extranjero. Para el desarrollo del objeto social, la Sociedad podrá celebrar contratos o convenios de cualquier naturaleza, bien Sea con personas naturales, entidades públicas, privadas o mixtas, ya sean del orden local, departamental, nacional o extranjero, La Sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar O desarrollar el comercio o la industria de la Sociedad y todos aquellos que tengan como finalidad ejercer los derechos y cumplirlas obligaciones legales o convencionales, las operaciones puede ser ejecutadas tanto en Colombia como en el Exterior ya de manera directa en su propio nombre y/o por Cuenta de terceros y/o a través de cualquier modalidad de contratación ya sean públicas, privadas y/o mixtas y/O a través de acuerdos de participación con terceros de cualquier naturaleza.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	$ 50.000.000,00
No. Acciones	1.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 50.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	$ 50.000.000,00
No. Acciones	1.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 50.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	$ 50.000.000,00
No. Acciones	1.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 50.000,00

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Funciones y facultades del Representante Legal. La Sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el Representante Legal, quien podrá celebrar O ejecutar Sin límite de cuantía todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social O que Se relacionen directamente con la existencia y funcionamiento de la Sociedad. Los suplentes del Representante Legal tendrán las mismas funciones y facultades del Representante Legal, en caso de ausencia temporal o definitiva de éste. Entre otras las siguientes serán funciones del Representante Legal: a) Ejercer la representación legal, tanto judicial como extrajudicial, de la Sociedad. b) Convocar y presidir con los límites que señalan los presentes estatutos, todas las Asambleas Generales y actos Sociales de la Sociedad. C) Administrar los negocios de la Sociedad, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos O contratos. d) Velar por los intereses de la Sociedad debiendo firmar las actas, contratos, convenios, correspondencia especial, memorias y todos los documentos necesarios. e) Entablar las acciones legales frente a quienes malversen, destruyan o dañen los fondos o bienes de la Sociedad. f) Ordenar los gastos y los pagos, dentro de sus limitaciones. g) Aprobar los actos y contratos que comprometan a la Sociedad y los que señalen los estatutos, reglamentos, acuerdos de la Asamblea General de Accionistas, resoluciones o demás documentos. h) Presentar a la Asamblea General de Accionistas informe de gestión sobre la marcha de la Sociedad y en las reuniones extraordinarias explicaciones sobre los motivos de la convocatoria. i) Hacer cumplir la Ley, los estatutos, los reglamentos internos y los acuerdos de la Asamblea General de Accionistas. j) Someter a consideración y aprobación de la Asamblea General de Accionistas, los planes, programas y proyectos de la Sociedad. k) Las demás que correspondan a la naturaleza de su cargo. El Representante Legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las Circunstancias en nombre de la Sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los Accionistas. En las relaciones frente a terceros, la Sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el Representante Legal.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por documento privado del 08 de abril de 2021 de la Asamblea Constitutiva, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 21 de abril de 2021 con el No. 84072 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL	HERNAN AUGUSTO BUITRAGO ARDILA	C.C. No. 79.536.219
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	MARTHA ROCIO VEGA ROZO	C.C. No. 39.727.177

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: G4663
Actividad secundaria Código CIIU: H4923
Otras actividades Código CIIU: C2410

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES L&H
Matrícula No.: 397430
Fecha de Matrícula: 06 de julio de 2021
Último año renovado: 2024
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : TV 24 A 39 C 46 - Emporio
Municipio: Villavicencio, Meta

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $5.434.518.621,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : G4663.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA - REPORTE A ENTIDADES

Se realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT).

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 27/01/2025 - 13:09:51
Recibo No. S002062271, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN r6CpPUuvEz


Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2025.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.



***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

ROJAS HERMANOS

ROJAS HERMANOS S.A.S
NIT: 892000217-8
Calle 26C No. 36-58 Barrio 7 de Agosto
PBX: 670 50 20
VILLAVICENCIO

FECHA: 27/12/2024

SEÑORES: CONSORCIO ALSIPA
NIT: 901892095-4

COTIZACIÓN DE VENTA No: 345789

Apreciados Señores:

Atendiendo su amable solicitud, tenemos el gusto de presentarle nuestra oferta:

#	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	Vr UNITARIO	VALOR TOTAL
1	COLOR ENDURECEDOR TONOS NEUTROS OCRE BULTO X 50KG	BUL	1	$ 135,014.62	$ 135,014.62
2	COLOR ENDURECEDOR TONOS VIVOS AZUL BULTO X 25KG	BUL	1	$ 465,019.83	$ 465,019.83
3	SELLANTE PROTECTOR	GAL	1	$ 6,356.05	$ 6,356.05
4	DESMOLDANTE COLOR NEUTRO BULTO X 25KG	BUL	1	$ 348,601.89	$ 348,601.89
8	SUMINISTRO ALQUILER TAPETE ESTAMPADO	DIA	1	$ 2,478.99	$ 2,478.99

SUBTOTAL	**$957,471.39**
IVA 19%	**$ 181,919.56**
TOTAL	**$ 1.139,390.95**

CONDICIONES COMERCIALES

FORMA DE PAGO: **Contado Ventas**
FORMA DE ENTREGA: **ENTREGA EN BODEGA**
VALIDEZ DE LA OFERTA: **27 Diciembre de2024**

NOTA: LOS PRECIOS DE LA PRESENTE OFERTA SON PRECIO LISTA

JENIFER MARTINEZ RODRIGEZ

VENDEDOR

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE ROJAS HERMANOS S.A.S O CONSIGNAR EN EFECTIVO A CUENTAS CORRIENTES,BANCO DE BOGOTA Nº 198-02631-2 O BANCOLOMBIA CUENTA Nº364-5101768-1 CONVENIO 45859 A NOMBRE DE ROJAS HERMANOS S.A.S NIT- 892.000.217-8, CONFIRMAR CONSIGNACIÓN CON EL ASESOR COMERCIAL. SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 27/01/2025 - 13:15:08
Recibo No. S002062277, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN jB8HVj2Jdq

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2025.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : ROJAS HERMANOS SAS
Nit : 892000217-8
Domicilio: Villavicencio, Meta

MATRÍCULA

Matrícula No: 524
Fecha de matrícula: 29 de enero de 1969
Ultimo año renovado: 2024
Fecha de renovación: 11 de marzo de 2024
Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CLLE. 26C NO. 36-58 - Siete de agosto
Municipio : Villavicencio, Meta
Correo electrónico : contabilidad@rojashnos.com
Teléfono comercial 1 : 6705020
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CLLE. 26C NO. 36-58 - Siete de agosto
Municipio : Villavicencio, Meta
Correo electrónico de notificación : contabilidad@rojashnos.com

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 87 del 25 de enero de 1969 de la Notaria 1a. De V/cio. de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 29 de enero de 1969, con el No. 567 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada ROJAS HERMANOS LIMITADA.

Por Escritura Pública No. 87 del 25 de enero de 1969 de la Notaria 1a. De V/cio. de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 29 de enero de 1969, con el No. 567 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada ROJAS HERMANOS LIMITADA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Escritura Pública No. 202 del 11 de febrero de 1974 de la Notaria 1a. De V/cio. de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 14 de febrero de 1974, con el No. 296 del Libro IX, se decretó REFORMA DE ESTATUTOS

Por Escritura Pública No. 202 del 11 de febrero de 1974 de la Notaria 1a. De V/cio. de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 14 de febrero de 1974, con el No. 296 del Libro IX, se decretó REFORMA DE ESTATUTOS

Por Escritura Pública No. 2578 del 31 de diciembre de 1975 de la Notaria 1a. De V/cio. de Villavicencio,

inscrito en esta Cámara de Comercio el 26 de enero de 1976, con el No. 662 del Libro IX, se decretó REFORMA DE ESTATUTOS

Por Escritura Pública No. 2578 del 31 de diciembre de 1975 de la Notaria 1a. De V/cio. de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 26 de enero de 1976, con el No. 662 del Libro IX, se decretó REFORMA DE ESTATUTOS

Por Escritura Pública No. 1447 del 21 de junio de 1979 de la Notaria 1a. De V/cio. de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 24 de julio de 1979, con el No. 1512 del Libro IX, se decretó REFORMA DE ESTATUTOS

Por Escritura Pública No. 1447 del 21 de junio de 1979 de la Notaria 1a. De V/cio. de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 24 de julio de 1979, con el No. 1512 del Libro IX, se decretó REFORMA DE ESTATUTOS

Por Escritura Pública No. 3906 del 17 de octubre de 1986 de la Notaria 1a. De V/cio. de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 22 de octubre de 1986, con el No. 4671 del Libro IX, se decretó CAMBIO SU RAZON SOCIAL A ROJAS HERMANOS SUCESORES LTDA.

Por Escritura Pública No. 3906 del 17 de octubre de 1986 de la Notaria 1a. De V/cio. , inscrito en esta Cámara de Comercio el 22 de octubre de 1986, con el No. 4671 del Libro IX, se decretó REFORMA - GENERALES

Por Escritura Pública No. 3906 del 17 de octubre de 1986 de la Notaria 1a. De V/cio. , inscrito en esta Cámara de Comercio el 22 de octubre de 1986, con el No. 4671 del Libro IX, se decretó REFORMA - GENERALES

Por Escritura Pública No. 3906 del 17 de octubre de 1986 de la Notaria 1a. De V/cio. de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 22 de octubre de 1986, con el No. 4671 del Libro IX, se decretó CAMBIO SU RAZON SOCIAL A ROJAS HERMANOS SUCESORES LTDA.

Por Escritura Pública No. 7107 del 30 de septiembre de 1994 de la Notaria 1a. De V/cio. de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 11 de octubre de 1994, con el No. 10525 del Libro IX, se decretó REFORMA DE ESTATUTOS

Por Escritura Pública No. 7107 del 30 de septiembre de 1994 de la Notaria 1a. De V/cio. de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 11 de octubre de 1994, con el No. 10525 del Libro IX, se decretó REFORMA DE ESTATUTOS

Por Escritura Pública No. 568 del 02 de febrero de 1995 de la Notaria 1a. De Villavicencio de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 15 de febrero de 1995, con el No. 10820 del Libro IX, se decretó REFORMA

Por Escritura Pública No. 568 del 02 de febrero de 1995 de la Notaria 1a. De Villavicencio de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 15 de febrero de 1995, con el No. 10820 del Libro IX, se decretó REFORMA

Por Escritura Pública No. 3972 del 17 de junio de 1997 de la Notaria 1a. De Villavicencio de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 01 de julio de 1997, con el No. 13836 del Libro IX, se decretó $40000000 .oo

Por Escritura Pública No. 3972 del 17 de junio de 1997 de la Notaria 1a. De Villavicencio de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 01 de julio de 1997, con el No. 13836 del Libro IX, se decretó $40000000 .oo

Por Escritura Pública No. 4684 del 19 de agosto de 1998 de la Notaria 1a. De Villavicencio de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 07 de septiembre de 1998, con el No. 15677 del Libro IX, se decretó

CESION DE CUOTAS.

Por Escritura Pública No. 4684 del 19 de agosto de 1998 de la Notaria 1a. De Villavicencio de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 07 de septiembre de 1998, con el No. 15677 del Libro IX, se decretó CESION DE CUOTAS.

Por Escritura Pública No. 7275 del 28 de diciembre de 1998 de la Notaria 1a. De Villavicencio de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 12 de enero de 1999, con el No. 16201 del Libro IX, se decretó ROJAS HERMANOS SUCESORES LTDA CONSTRUCEN CAMBIO DE RAZON SOCIAL, POR L A DENOMINACION ROJAS HERMANOS SUCESORES LTDA CONSTRUCENTRO DEL LLANO. ----------

Por Escritura Pública No. 7275 del 28 de diciembre de 1998 de la Notaria 1a. De Villavicencio de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 12 de enero de 1999, con el No. 16202 del Libro IX, se decretó REFORMA ATRIBUCIONES.

Por Escritura Pública No. 7275 del 28 de diciembre de 1998 de la Notaria 1a. De Villavicencio de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 12 de enero de 1999, con el No. 16201 del Libro IX, se decretó ROJAS HERMANOS SUCESORES LTDA CONSTRUCEN CAMBIO DE RAZON SOCIAL, POR L A DENOMINACION ROJAS HERMANOS SUCESORES LTDA CONSTRUCENTRO DEL LLANO. ----------

Por Escritura Pública No. 7275 del 28 de diciembre de 1998 de la Notaria 1a. De Villavicencio de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 12 de enero de 1999, con el No. 16202 del Libro IX, se decretó REFORMA ATRIBUCIONES.

Por Escritura Pública No. 599 del 12 de febrero de 1999 de la Notaria 1a. De Villavicencio de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 24 de febrero de 1999, con el No. 16415 del Libro IX, se decretó $120000000 .oo AUMENTO DE CAPITAL A LA SUMA DE $120.000.000.oo

Por Escritura Pública No. 599 del 12 de febrero de 1999 de la Notaria 1a. De Villavicencio de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 24 de febrero de 1999, con el No. 16416 del Libro IX, se decretó REFORMA DE ATRIBUCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Por Escritura Pública No. 599 del 12 de febrero de 1999 de la Notaria 1a. De Villavicencio de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 24 de febrero de 1999, con el No. 16416 del Libro IX, se decretó REFORMA DE ATRIBUCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Por Escritura Pública No. 599 del 12 de febrero de 1999 de la Notaria 1a. De Villavicencio de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 24 de febrero de 1999, con el No. 16415 del Libro IX, se decretó $120000000 .oo AUMENTO DE CAPITAL A LA SUMA DE $120.000.000.oo

Por Escritura Pública No. 4674 del 01 de septiembre de 2003 de la Notaria Primera de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 03 de septiembre de 2003, con el No. 23257 del Libro IX, se decretó POR ESCRITURA PUBLICA 4674 DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2003 DE LA NOTARIA PRIMERA DE VILLAVICENCIO SE REFORMARON ESTATUTOS (LIMITACIONES DEL GERENTE)

Por Escritura Pública No. 4674 del 01 de septiembre de 2003 de la Notaria Primera de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 03 de septiembre de 2003, con el No. 23257 del Libro IX, se decretó POR ESCRITURA PUBLICA 4674 DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2003 DE LA NOTARIA PRIMERA DE VILLAVICENCIO SE REFORMARON ESTATUTOS (LIMITACIONES DEL GERENTE)

Por Escritura Pública No. 4715 del 01 de diciembre de 2004 de la Notaria Tercera de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 23 de diciembre de 2004, con el No. 24864 del Libro IX, se decretó POR E.P. NO. 4715 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2004, SE REFORMA EL ART? CULO 5 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES (CESION DE CUOTAS, EN LA CUAL LA CEDE NTE CONSERVA EL USUFRUCTO Y CEDE A LOS CESIONARIOS LA MERA O NUDA PROP IEDAD) CERTIFICA ESPECIAL PARA EL USUFRUARIO.

Por Escritura Pública No. 4715 del 01 de diciembre de 2004 de la Notaria Tercera de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 23 de diciembre de 2004, con el No. 24864 del Libro IX, se decretó POR E.P. NO. 4715 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2004, SE REFORMA EL ART? CULO 5 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES (CESION DE CUOTAS, EN LA CUAL LA CEDE NTE CONSERVA EL USUFRUCTO Y CEDE A LOS CESIONARIOS LA MERA O NUDA PROP IEDAD) CERTIFICA ESPECIAL PARA EL USUFRUARIO.

Por Escritura Pública No. 3106 del 10 de junio de 2005 de la Notaria Primera de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 22 de julio de 2005, con el No. 25755 del Libro IX, se decretó POR E.P. NO. 3106 DEL 10 DE JUNIO DE 2005, DE LA NOTARIA 1 DE V/CIO, C ONSTA LA REFORMA DE LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL (ARTICULO 2 3 PARAGRAFO).

Por Escritura Pública No. 3106 del 10 de junio de 2005 de la Notaria Primera de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 22 de julio de 2005, con el No. 25755 del Libro IX, se decretó POR E.P. NO. 3106 DEL 10 DE JUNIO DE 2005, DE LA NOTARIA 1 DE V/CIO, C ONSTA LA REFORMA DE LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL (ARTICULO 2 3 PARAGRAFO).

Por Escritura Pública No. 4735 del 31 de agosto de 2005 de la Notaria Primera de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 08 de septiembre de 2005, con el No. 26026 del Libro IX, se decretó POR E.P. NO. 4735 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2005, DE LA NOTARIA PRIMERA DE V/CIO; SE REFORMAN LOS ESTATUTOS SOCIALES AS?: AUMENTO DE CAPITAL EN LA SUMA DE $80.000.000 PARA UN CAPITAL TOTAL DE $200.000.000

Por Escritura Pública No. 4735 del 31 de agosto de 2005 de la Notaria Primera de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 08 de septiembre de 2005, con el No. 26026 del Libro IX, se decretó POR E.P. NO. 4735 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2005, DE LA NOTARIA PRIMERA DE V/CIO; SE REFORMAN LOS ESTATUTOS SOCIALES AS?: AUMENTO DE CAPITAL EN LA SUMA DE $80.000.000 PARA UN CAPITAL TOTAL DE $200.000.000

Por Escritura Pública No. 2034 del 26 de mayo de 2006 de la Notaria Tercera de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 31 de mayo de 2006, con el No. 27228 del Libro IX, se decretó MEDIANTE E.P 2034 DEL 26 DE MAYO DE 2006, DE LA NOT. 3 DE V/CIO CONSTA LA VENTA DEL DERECHO DE USUFRUCTO QUE SOBRE LAS CUOTAS SOCIALES POSEIA LA SE?ORA LILIA SALAZAR DE ROJAS, QUEDANO LOS CESIONARIOS CON EL PLENO DERECHOS SOBRE LAS CUOTAS SOCIALES.

Por Escritura Pública No. 2034 del 26 de mayo de 2006 de la Notaria Tercera de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 31 de mayo de 2006, con el No. 27228 del Libro IX, se decretó MEDIANTE E.P 2034 DEL 26 DE MAYO DE 2006, DE LA NOT. 3 DE V/CIO CONSTA LA VENTA DEL DERECHO DE USUFRUCTO QUE SOBRE LAS CUOTAS SOCIALES POSEIA LA SE?ORA LILIA SALAZAR DE ROJAS, QUEDANO LOS CESIONARIOS CON EL PLENO DERECHOS SOBRE LAS CUOTAS SOCIALES.

Por Escritura Pública No. 2537 del 28 de mayo de 2007 de la Notaria Primera de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 04 de junio de 2007, con el No. 28890 del Libro IX, se decretó POR E.P. NO. 2357 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2007 DE LA NOTARIA PRIMER ADE V/CIO. CONSTA LA REFORMA DE ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD AS?: AUMENTO DE CAPITAL EN LA SUMA DE $200.000.000 PARA UN TOTAL DE $400.000.000

Por Escritura Pública No. 2537 del 28 de mayo de 2007 de la Notaria Primera de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 04 de junio de 2007, con el No. 28890 del Libro IX, se decretó POR E.P. NO. 2357 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2007 DE LA NOTARIA PRIMER ADE V/CIO. CONSTA LA REFORMA DE ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD AS?: AUMENTO DE CAPITAL EN LA SUMA DE $200.000.000 PARA UN TOTAL DE $400.000.000

Por Escritura Pública No. 1823 del 28 de abril de 2009 de la Notaria Primera de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 15 de mayo de 2009, con el No. 32500 del Libro IX, se decretó POR E.P. NO. 1823 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2009 DE LA NOTARIA PRIMERA D E VILLAVICENCIO CONSTA REFORMA DE ESTATUTOS AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.

Por Escritura Pública No. 1823 del 28 de abril de 2009 de la Notaria Primera de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 15 de mayo de 2009, con el No. 32500 del Libro IX, se decretó POR E.P. NO. 1823 DE

FECHA 28 DE ABRIL DE 2009 DE LA NOTARIA PRIMERA D E VILLAVICENCIO CONSTA REFORMA DE ESTATUTOS AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.

Por Escritura Pública No. 3466 del 22 de julio de 2010 de la Notaria Primera de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 23 de septiembre de 2010, con el No. 35237 del Libro IX, se decretó POR ESCRITURA PUBLICA 3466 DE JULIO 22 DE 2010 ACLARADA MEDIANTE ESCRI TURA PUBLICA 4371 DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 2010 DE LA NOTARIA PRIMERA DE V/CIO CONSTA AUMENTO DE CAPITAL.

Por Escritura Pública No. 3466 del 22 de julio de 2010 de la Notaria Primera de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 23 de septiembre de 2010, con el No. 35237 del Libro IX, se decretó POR ESCRITURA PUBLICA 3466 DE JULIO 22 DE 2010 ACLARADA MEDIANTE ESCRI TURA PUBLICA 4371 DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 2010 DE LA NOTARIA PRIMERA DE V/CIO CONSTA AUMENTO DE CAPITAL.

Por Acta No. 129 del 24 de mayo de 2011 de la Asamblea General De Socios de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 10 de junio de 2011, con el No. 37574 del Libro IX, se inscribió DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS.

Por Acta No. 129 del 24 de mayo de 2011 de la Asamblea General De Socios de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 10 de junio de 2011, con el No. 37574 del Libro IX, se inscribió DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS.

Por Acta No. 133 del 20 de septiembre de 2013 de la Asamblea De Accionistas de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 25 de septiembre de 2013, con el No. 46432 del Libro IX, se decretó POR ACTA N? 133 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013, CONSTA REFORMA PARC IAL DE ESTATUTOS (ART. 2 - OBJETO SOCIAL).

Por Acta No. 133 del 20 de septiembre de 2013 de la Asamblea De Accionistas de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 25 de septiembre de 2013, con el No. 46432 del Libro IX, se decretó POR ACTA N? 133 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013, CONSTA REFORMA PARC IAL DE ESTATUTOS (ART. 2 - OBJETO SOCIAL).

Por Acta No. 13 del 21 de julio de 2023 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 15 de septiembre de 2023, con el No. 99988 del Libro IX, se decretó REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS ARTICULO 26 (JUNTA DIRECTIVA) Y 48 (UTILIDAD)

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

Objeto social: La sociedad tendrá como objeto principal la compr a, venta, importación, distribución y comercialización de artículos, productos y materiales para construcción y ferretería; la representación de empresas comerciales nacionales o extranjeras que produzcan o comercialicen productos relacionados con el objeto social y la construcción o comercialización de bienes inmuebles en general. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita, tanto en colombia como en el extranjero.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	$ 1.000.000.000,00
No. Acciones	200.000,00
Valor Nominal Acciones	$ 5.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	$ 864.000.000,00
No. Acciones	172.800,00

Valor Nominal Acciones	$ 5.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	$ 864.000.000,00
No. Acciones	172.800,00
Valor Nominal Acciones	$ 5.000,00

Que por escritura pública no. 2034 Del 26 de mayo de 2006, de la notaria tercera de villavicencio, inscrita el 31 de mayo de 2006 bajo el no. 27228, Se transfiere a titulo de cesion y venta el derecho de usufructo que sobre las cuotas sociales poseia lilia Salazar de Rojas identificada con la c.C. 20.140.002 De Bogotá, quedando los cesionarios con el dominio pleno sobre las cuotas sociales.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Representación legal: La representacion legal de la sociedad estara a cargo de un gerente, accionista o no, quien tendra un suplente, designado por la asamblea general de accionistas. **Facultades del representante legal: La sociedad sera gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal. Se entendera que el representante legal podra celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad, con las restricciones establecidas en el articulo 29 de estos estatutos. El represenante legal se entendera investido de los mas amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepcion de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas o las limitaciones en cuanto al monto de los actos que son competencia de la junta directiva. Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias y por que se permita el cumplimiento de las funciones del revisor fiscal. Guardara y protegera la reserva comercial e industrial de la sociedad y se abstendra de utilizar indebidamente la informacion privilegiada. Dara un trato equitativo a todos los accionistas y respetara su derecho de inspeccion. Se abstendra de participar en actos que impliquen conflicto de interes o competencia con la sociedad. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedara obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal de conformidad con la ley y los estatutos. Parágrafo: Le está prohibido al representante legal por si o por interpuesta persona, obtener préstamos de la sociedad bajo cualquier modalidad u obtener de parte de la sociedad, aval, fianza o cualquier otra garantía de sus obligaciones personales, sin autorización previa de la asamblea general de accionistas. Igualmente le está prohibido constituir en garante a la sociedad, de obligaciones de terceros.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 20 del 22 de noviembre de 2024 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 24 de diciembre de 2024 con el No. 108972 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL	VICTOR RODRIGO ZAPATA CASTAÑO	C.C. No. 98.771.974
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	LUIS FERNANDO ROJAS GALLEGO	C.C. No. 79.453.418

JUNTA DIRECTIVA

Por Acta No. 13 del 21 de julio de 2023 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 15 de septiembre de 2023 con el No. 99988 del libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION

MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA	CARLOS ALBERTO PISCIOTTI LABRADOR	C.C. No. 79.630.459
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA	CARLOS ENRIQUE CORREA PINEDO	C.C. No. 79.245.575
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA	CLAUDIA PATRICIA ROJAS GALLEGO	C.C. No. 40.394.441
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA	LUIS FERNANDO ROJAS GALLEGO	C.C. No. 79.453.418
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA	RODRIGO AUGUSTO ROJAS SALAZAR	C.C. No. 80.421.907

SUPLENTES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA	MARTHA LUCIA ROJAS SALAZAR	C.C. 41.715.881
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA	IVAN ARTURO ROJAS SALAZAR	C.C. 79.268.684
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA	LILIANA ROJAS SALAZAR	C.C. 35.496.922
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA	OSCAR GERARDO ROJAS SALAZAR	C.C. 79.238.618
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA	DANIELA VEGA ROJAS	C.C. 1.121.949.370

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 9 del 22 de septiembre de 2021 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 27 de septiembre de 2021 con el No. 87151 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL	FABIAN ANDRES BARON SIERRA	C.C. No. 1.023.909.482	214025-T

Por Acta No. 06 del 24 de julio de 2020 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 19 de agosto de 2020 con el No. 80183 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL SUPLENTE	HILDA YARLES LESMES PARRA	C.C. No. 1.121.865.028	222045-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
*) E.P. No. 202 del 11 de febrero de 1974 de la Notaria 1a. De V/cio. Villavicencio	296 del 14 de febrero de 1974 del libro IX
*) E.P. No. 202 del 11 de febrero de 1974 de la Notaria 1a. De V/cio. Villavicencio	296 del 14 de febrero de 1974 del libro IX
*) Acta No. 41 del 15 de febrero de 1975 de la Junta De Socios	485 del 15 de febrero de 1975 del libro IX
*) Acta No. 41 del 15 de febrero de 1975 de la Junta De Socios	485 del 15 de febrero de 1975 del libro IX
*) Acta No. 50 del 01 de diciembre de 1975 de la Junta De	644 del 19 de diciembre de 1975 del libro IX

Socios		
*) Acta No. 50 del 01 de diciembre de 1975 de la Junta De Socios	644 del 19 de diciembre de 1975 del libro IX	
*) E.P. No. 2578 del 31 de diciembre de 1975 de la Notaria 1a. De V/cio. Villavicencio	662 del 26 de enero de 1976 del libro IX	
*) E.P. No. 2578 del 31 de diciembre de 1975 de la Notaria 1a. De V/cio. Villavicencio	662 del 26 de enero de 1976 del libro IX	
*) E.P. No. 1447 del 21 de junio de 1979 de la Notaria 1a. De V/cio. Villavicencio	1512 del 24 de julio de 1979 del libro IX	
*) E.P. No. 1447 del 21 de junio de 1979 de la Notaria 1a. De V/cio. Villavicencio	1512 del 24 de julio de 1979 del libro IX	
*) P.J. del 02 de diciembre de 1985 de la Juzgado 1 Civil Del Circuito	4670 del 22 de octubre de 1986 del libro IX	
*) E.P. No. 3906 del 17 de octubre de 1986 de la Notaria 1a. De V/cio. Villavicencio	4671 del 22 de octubre de 1986 del libro IX	
*) E.P. No. 3906 del 17 de octubre de 1986 de la Notaria 1a. De V/cio.	4671 del 22 de octubre de 1986 del libro IX	
*) E.P. No. 3906 del 17 de octubre de 1986 de la Notaria 1a. De V/cio.	4671 del 22 de octubre de 1986 del libro IX	
*) E.P. No. 3906 del 17 de octubre de 1986 de la Notaria 1a. De V/cio. Villavicencio	4671 del 22 de octubre de 1986 del libro IX	
*) P.J. del 02 de diciembre de 1985 de la Juzgado 1 Civil Del Circuito	4670 del 22 de octubre de 1986 del libro IX	
*) E.P. No. 7107 del 30 de septiembre de 1994 de la Notaria 1a. De V/cio. Villavicencio	10525 del 11 de octubre de 1994 del libro IX	
*) E.P. No. 7107 del 30 de septiembre de 1994 de la Notaria 1a. De V/cio. Villavicencio	10525 del 11 de octubre de 1994 del libro IX	
*) E.P. No. 568 del 02 de febrero de 1995 de la Notaria 1a. De Villavicencio Villavicencio	10820 del 15 de febrero de 1995 del libro IX	
*) E.P. No. 568 del 02 de febrero de 1995 de la Notaria 1a. De Villavicencio Villavicencio	10820 del 15 de febrero de 1995 del libro IX	
*) E.P. No. 3972 del 17 de junio de 1997 de la Notaria 1a. De Villavicencio Villavicencio	13836 del 01 de julio de 1997 del libro IX	
*) E.P. No. 3972 del 17 de junio de 1997 de la Notaria 1a. De Villavicencio Villavicencio	13836 del 01 de julio de 1997 del libro IX	
*) E.P. No. 4684 del 19 de agosto de 1998 de la Notaria 1a. De Villavicencio Villavicencio	15677 del 07 de septiembre de 1998 del libro IX	
*) E.P. No. 4684 del 19 de agosto de 1998 de la Notaria 1a. De Villavicencio Villavicencio	15677 del 07 de septiembre de 1998 del libro IX	
*) E.P. No. 7275 del 28 de diciembre de 1998 de la Notaria 1a. De Villavicencio Villavicencio	16201 del 12 de enero de 1999 del libro IX	
*) E.P. No. 7275 del 28 de diciembre de 1998 de la Notaria 1a. De Villavicencio Villavicencio	16202 del 12 de enero de 1999 del libro IX	
*) E.P. No. 7275 del 28 de diciembre de 1998 de la Notaria 1a. De Villavicencio Villavicencio	16201 del 12 de enero de 1999 del libro IX	
*) E.P. No. 7275 del 28 de diciembre de 1998 de la Notaria 1a. De Villavicencio Villavicencio	16202 del 12 de enero de 1999 del libro IX	
*) E.P. No. 599 del 12 de febrero de 1999 de la Notaria 1a. De Villavicencio Villavicencio	16415 del 24 de febrero de 1999 del libro IX	
*) E.P. No. 599 del 12 de febrero de 1999 de la Notaria 1a. De Villavicencio Villavicencio	16416 del 24 de febrero de 1999 del libro IX	
*) E.P. No. 599 del 12 de febrero de 1999 de la Notaria 1a. De Villavicencio Villavicencio	16416 del 24 de febrero de 1999 del libro IX	
*) E.P. No. 599 del 12 de febrero de 1999 de la Notaria 1a. De Villavicencio Villavicencio	16415 del 24 de febrero de 1999 del libro IX	

*) E.P. No. 4674 del 01 de septiembre de 2003 de la Notaria 23257 del 03 de septiembre de 2003 del libro IX
Primera Villavicencio
*) E.P. No. 4674 del 01 de septiembre de 2003 de la Notaria 23257 del 03 de septiembre de 2003 del libro IX
Primera Villavicencio
*) E.P. No. 4715 del 01 de diciembre de 2004 de la Notaria 24864 del 23 de diciembre de 2004 del libro IX
Tercera Villavicencio
*) E.P. No. 4715 del 01 de diciembre de 2004 de la Notaria 24864 del 23 de diciembre de 2004 del libro IX
Tercera Villavicencio
*) E.P. No. 3106 del 10 de junio de 2005 de la Notaria 25755 del 22 de julio de 2005 del libro IX
Primera Villavicencio
*) E.P. No. 3106 del 10 de junio de 2005 de la Notaria 25755 del 22 de julio de 2005 del libro IX
Primera Villavicencio
*) E.P. No. 4735 del 31 de agosto de 2005 de la Notaria 26026 del 08 de septiembre de 2005 del libro IX
Primera Villavicencio
*) E.P. No. 4735 del 31 de agosto de 2005 de la Notaria 26026 del 08 de septiembre de 2005 del libro IX
Primera Villavicencio
*) E.P. No. 2034 del 26 de mayo de 2006 de la Notaria 27228 del 31 de mayo de 2006 del libro IX
Tercera Villavicencio
*) E.P. No. 2034 del 26 de mayo de 2006 de la Notaria 27228 del 31 de mayo de 2006 del libro IX
Tercera Villavicencio
*) E.P. No. 2537 del 28 de mayo de 2007 de la Notaria 28890 del 04 de junio de 2007 del libro IX
Primera Villavicencio
*) E.P. No. 2537 del 28 de mayo de 2007 de la Notaria 28890 del 04 de junio de 2007 del libro IX
Primera Villavicencio
*) E.P. No. 1823 del 28 de abril de 2009 de la Notaria 32500 del 15 de mayo de 2009 del libro IX
Primera Villavicencio
*) E.P. No. 1823 del 28 de abril de 2009 de la Notaria 32500 del 15 de mayo de 2009 del libro IX
Primera Villavicencio
*) E.P. No. 3466 del 22 de julio de 2010 de la Notaria 35237 del 23 de septiembre de 2010 del libro IX
Primera Villavicencio
*) E.P. No. 3466 del 22 de julio de 2010 de la Notaria 35237 del 23 de septiembre de 2010 del libro IX
Primera Villavicencio
*) Acta No. 129 del 24 de mayo de 2011 de la Asamblea 37574 del 10 de junio de 2011 del libro IX
General De Socios
*) Acta No. 129 del 24 de mayo de 2011 de la Asamblea 37574 del 10 de junio de 2011 del libro IX
General De Socios
*) Acta No. 133 del 20 de septiembre de 2013 de la Asamblea 46432 del 25 de septiembre de 2013 del libro IX
De Accionistas
*) Acta No. 133 del 20 de septiembre de 2013 de la Asamblea 46432 del 25 de septiembre de 2013 del libro IX
De Accionistas
*) Acta No. 13 del 21 de julio de 2023 de la Asamblea 99988 del 15 de septiembre de 2023 del libro IX
Extraordinaria De Accionistas

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: G4663
Actividad secundaria Código CIIU: L6810
Otras actividades Código CIIU: No reportó

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: ROJAS HERMANOS VILLAVICENCIO
Matrícula No.: 525
Fecha de Matrícula: 23 de mayo de 1972
Último año renovado: 2024
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : CLLE. 26C NO. 36-58 - Siete De Agosto
Municipio: Villavicencio, Meta

SUCURSALES Y AGENCIAS

Nombre: ROJAS HERMANOS SAS ACACIAS
Matrícula No.: 191367
Fecha de Matrícula: 22 de octubre de 2009
Último año renovado: 2024
Categoría: Agencia
Dirección : CARRERA 23 NO. 12-21 DORADO - Dorado Bajo
Municipio: Acacías, Meta

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MEDIANA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $42.147.471.114,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : G4663.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 27/01/2025 - 13:15:08
Recibo No. S002062277, Valor 11600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN jBSHVj2Jdq

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.


La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2025.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.



***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL

Fecha expedición: 27/01/2025 - 13:15:06
Recibo No. S002062277, Valor 5800

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN mcEgjgFTn2

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2025.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : ROJAS HERMANOS SAS
Nit : 892000217-8
Domicilio: Villavicencio, Meta

MATRÍCULA

Matrícula No: 524
Fecha de matrícula: 29 de enero de 1969
Ultimo año renovado: 2024
Fecha de renovación: 11 de marzo de 2024
Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CLLE. 26C NO. 36-58 - Siete de agosto
Municipio : Villavicencio, Meta
Correo electrónico : contabilidad@rojashnos.com
Teléfono comercial 1 : 6705020
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CLLE. 26C NO. 36-58 - Siete de agosto
Municipio : Villavicencio, Meta
Correo electrónico de notificación : contabilidad@rojashnos.com

La persona jurídica **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 87 del 25 de enero de 1969 de la Notaria 1a. De V/cio. de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 29 de enero de 1969, con el No. 567 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada ROJAS HERMANOS LIMITADA.

Por Escritura Pública No. 87 del 25 de enero de 1969 de la Notaria 1a. De V/cio. de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 29 de enero de 1969, con el No. 567 del Libro IX, se constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada ROJAS HERMANOS LIMITADA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Escritura Pública No. 202 del 11 de febrero de 1974 de la Notaria 1a. De V/cio. de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 14 de febrero de 1974, con el No. 296 del Libro IX, se decretó REFORMA DE ESTATUTOS

Por Escritura Pública No. 202 del 11 de febrero de 1974 de la Notaria 1a. De V/cio. de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 14 de febrero de 1974, con el No. 296 del Libro IX, se decretó REFORMA DE ESTATUTOS

Por Escritura Pública No. 2578 del 31 de diciembre de 1975 de la Notaria 1a. De V/cio. de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 26 de enero de 1976, con el No. 662 del Libro IX, se decretó REFORMA DE ESTATUTOS

Por Escritura Pública No. 2578 del 31 de diciembre de 1975 de la Notaria 1a. De V/cio. de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 26 de enero de 1976, con el No. 662 del Libro IX, se decretó REFORMA DE ESTATUTOS

Por Escritura Pública No. 1447 del 21 de junio de 1979 de la Notaria 1a. De V/cio. de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 24 de julio de 1979, con el No. 1512 del Libro IX, se decretó REFORMA DE ESTATUTOS

Por Escritura Pública No. 1447 del 21 de junio de 1979 de la Notaria 1a. De V/cio. de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 24 de julio de 1979, con el No. 1512 del Libro IX, se decretó REFORMA DE ESTATUTOS

Por Escritura Pública No. 3906 del 17 de octubre de 1986 de la Notaria 1a. De V/cio. de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 22 de octubre de 1986, con el No. 4671 del Libro IX, se decretó CAMBIO SU RAZON SOCIAL A ROJAS HERMANOS SUCESORES LTDA.

Por Escritura Pública No. 3906 del 17 de octubre de 1986 de la Notaria 1a. De V/cio. , inscrito en esta Cámara de Comercio el 22 de octubre de 1986, con el No. 4671 del Libro IX, se decretó REFORMA - GENERALES

Por Escritura Pública No. 3906 del 17 de octubre de 1986 de la Notaria 1a. De V/cio. , inscrito en esta Cámara de Comercio el 22 de octubre de 1986, con el No. 4671 del Libro IX, se decretó REFORMA - GENERALES

Por Escritura Pública No. 3906 del 17 de octubre de 1986 de la Notaria 1a. De V/cio. de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 22 de octubre de 1986, con el No. 4671 del Libro IX, se decretó CAMBIO SU RAZON SOCIAL A ROJAS HERMANOS SUCESORES LTDA.

Por Escritura Pública No. 7107 del 30 de septiembre de 1994 de la Notaria 1a. De V/cio. de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 11 de octubre de 1994, con el No. 10525 del Libro IX, se decretó REFORMA DE ESTATUTOS

Por Escritura Pública No. 7107 del 30 de septiembre de 1994 de la Notaria 1a. De V/cio. de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 11 de octubre de 1994, con el No. 10525 del Libro IX, se decretó REFORMA DE ESTATUTOS

Por Escritura Pública No. 568 del 02 de febrero de 1995 de la Notaria 1a. De Villavicencio de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 15 de febrero de 1995, con el No. 10820 del Libro IX, se decretó REFORMA

Por Escritura Pública No. 568 del 02 de febrero de 1995 de la Notaria 1a. De Villavicencio de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 15 de febrero de 1995, con el No. 10820 del Libro IX, se decretó REFORMA

Por Escritura Pública No. 3972 del 17 de junio de 1997 de la Notaria 1a. De Villavicencio de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 01 de julio de 1997, con el No. 13836 del Libro IX, se decretó $40000000 .oo

Por Escritura Pública No. 3972 del 17 de junio de 1997 de la Notaria 1a. De Villavicencio de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 01 de julio de 1997, con el No. 13836 del Libro IX, se decretó $40000000 .oo

Por Escritura Pública No. 4684 del 19 de agosto de 1998 de la Notaria 1a. De Villavicencio de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 07 de septiembre de 1998, con el No. 15677 del Libro IX, se decretó CESION DE CUOTAS.

Por Escritura Pública No. 4684 del 19 de agosto de 1998 de la Notaria 1a. De Villavicencio de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 07 de septiembre de 1998, con el No. 15677 del Libro IX, se decretó CESION DE CUOTAS.

Por Escritura Pública No. 7275 del 28 de diciembre de 1998 de la Notaria 1a. De Villavicencio de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 12 de enero de 1999, con el No. 16201 del Libro IX, se decretó ROJAS HERMANOS SUCESORES LTDA CONSTRUCEN CAMBIO DE RAZON SOCIAL, POR L A DENOMINACION ROJAS HERMANOS SUCESORES LTDA CONSTRUCENTRO DEL LLANO. ----------

Por Escritura Pública No. 7275 del 28 de diciembre de 1998 de la Notaria 1a. De Villavicencio de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 12 de enero de 1999, con el No. 16202 del Libro IX, se decretó REFORMA ATRIBUCIONES.

Por Escritura Pública No. 7275 del 28 de diciembre de 1998 de la Notaria 1a. De Villavicencio de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 12 de enero de 1999, con el No. 16201 del Libro IX, se decretó ROJAS HERMANOS SUCESORES LTDA CONSTRUCEN CAMBIO DE RAZON SOCIAL, POR L A DENOMINACION ROJAS HERMANOS SUCESORES LTDA CONSTRUCENTRO DEL LLANO. ----------

Por Escritura Pública No. 7275 del 28 de diciembre de 1998 de la Notaria 1a. De Villavicencio de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 12 de enero de 1999, con el No. 16202 del Libro IX, se decretó REFORMA ATRIBUCIONES.

Por Escritura Pública No. 599 del 12 de febrero de 1999 de la Notaria 1a. De Villavicencio de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 24 de febrero de 1999, con el No. 16415 del Libro IX, se decretó $120000000 .oo AUMENTO DE CAPITAL A LA SUMA DE $120.000.000.oo

Por Escritura Pública No. 599 del 12 de febrero de 1999 de la Notaria 1a. De Villavicencio de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 24 de febrero de 1999, con el No. 16416 del Libro IX, se decretó REFORMA DE ATRIBUCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Por Escritura Pública No. 599 del 12 de febrero de 1999 de la Notaria 1a. De Villavicencio de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 24 de febrero de 1999, con el No. 16416 del Libro IX, se decretó REFORMA DE ATRIBUCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Por Escritura Pública No. 599 del 12 de febrero de 1999 de la Notaria 1a. De Villavicencio de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 24 de febrero de 1999, con el No. 16415 del Libro IX, se decretó $120000000 .oo AUMENTO DE CAPITAL A LA SUMA DE $120.000.000.oo

Por Escritura Pública No. 4674 del 01 de septiembre de 2003 de la Notaria Primera de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 03 de septiembre de 2003, con el No. 23257 del Libro IX, se decretó POR ESCRITURA PUBLICA 4674 DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2003 DE LA NOTARIA PRIMERA DE VILLAVICENCIO SE REFORMARON ESTATUTOS (LIMITACIONES DEL GERENTE)

Por Escritura Pública No. 4674 del 01 de septiembre de 2003 de la Notaria Primera de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 03 de septiembre de 2003, con el No. 23257 del Libro IX, se decretó POR ESCRITURA PUBLICA 4674 DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2003 DE LA NOTARIA PRIMERA DE VILLAVICENCIO SE REFORMARON ESTATUTOS (LIMITACIONES DEL GERENTE)

Por Escritura Pública No. 4715 del 01 de diciembre de 2004 de la Notaria Tercera de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 23 de diciembre de 2004, con el No. 24864 del Libro IX, se decretó POR E.P. NO. 4715 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2004, SE REFORMA EL ART? CULO 5 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES (CESION DE CUOTAS, EN LA CUAL LA CEDE NTE CONSERVA EL USUFRUCTO Y CEDE A LOS CESIONARIOS LA MERA O NUDA PROP IEDAD) CERTIFICA ESPECIAL PARA EL USUFRUARIO.

Por Escritura Pública No. 4715 del 01 de diciembre de 2004 de la Notaria Tercera de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 23 de diciembre de 2004, con el No. 24864 del Libro IX, se decretó POR E.P. NO. 4715 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2004, SE REFORMA EL ART? CULO 5 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES (CESION DE CUOTAS, EN LA CUAL LA CEDE NTE CONSERVA EL USUFRUCTO Y CEDE A LOS CESIONARIOS LA MERA O NUDA PROP IEDAD) CERTIFICA ESPECIAL PARA EL USUFRUARIO.

Por Escritura Pública No. 3106 del 10 de junio de 2005 de la Notaria Primera de Villavicencio, inscrito en

esta Cámara de Comercio el 22 de julio de 2005, con el No. 25755 del Libro IX, se decretó POR E.P. NO. 3106 DEL 10 DE JUNIO DE 2005, DE LA NOTARIA 1 DE V/CIO, C ONSTA LA REFORMA DE LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL (ARTICULO 2 3 PARAGRAFO).

Por Escritura Pública No. 3106 del 10 de junio de 2005 de la Notaria Primera de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 22 de julio de 2005, con el No. 25755 del Libro IX, se decretó POR E.P. NO. 3106 DEL 10 DE JUNIO DE 2005, DE LA NOTARIA 1 DE V/CIO, C ONSTA LA REFORMA DE LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL (ARTICULO 2 3 PARAGRAFO).

Por Escritura Pública No. 4735 del 31 de agosto de 2005 de la Notaria Primera de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 08 de septiembre de 2005, con el No. 26026 del Libro IX, se decretó POR E.P. NO. 4735 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2005, DE LA NOTARIA PRIMERA DE V/CIO; SE REFORMAN LOS ESTATUTOS SOCIALES AS?: AUMENTO DE CAPITAL EN LA SUMA DE $80.000.000 PARA UN CAPITAL TOTAL DE $200.000.000

Por Escritura Pública No. 4735 del 31 de agosto de 2005 de la Notaria Primera de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 08 de septiembre de 2005, con el No. 26026 del Libro IX, se decretó POR E.P. NO. 4735 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2005, DE LA NOTARIA PRIMERA DE V/CIO; SE REFORMAN LOS ESTATUTOS SOCIALES AS?: AUMENTO DE CAPITAL EN LA SUMA DE $80.000.000 PARA UN CAPITAL TOTAL DE $200.000.000

Por Escritura Pública No. 2034 del 26 de mayo de 2006 de la Notaria Tercera de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 31 de mayo de 2006, con el No. 27228 del Libro IX, se decretó MEDIANTE E.P 2034 DEL 26 DE MAYO DE 2006, DE LA NOT. 3 DE V/CIO CONSTA LA VENTA DEL DERECHO DE USUFRUCTO QUE SOBRE LAS CUOTAS SOCIALES POSEIA LA SE?ORA LILIA SALAZAR DE ROJAS, QUEDANO LOS CESIONARIOS CON EL PLENO DERECHOS SOBRE LAS CUOTAS SOCIALES.

Por Escritura Pública No. 2034 del 26 de mayo de 2006 de la Notaria Tercera de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 31 de mayo de 2006, con el No. 27228 del Libro IX, se decretó MEDIANTE E.P 2034 DEL 26 DE MAYO DE 2006, DE LA NOT. 3 DE V/CIO CONSTA LA VENTA DEL DERECHO DE USUFRUCTO QUE SOBRE LAS CUOTAS SOCIALES POSEIA LA SE?ORA LILIA SALAZAR DE ROJAS, QUEDANO LOS CESIONARIOS CON EL PLENO DERECHOS SOBRE LAS CUOTAS SOCIALES.

Por Escritura Pública No. 2537 del 28 de mayo de 2007 de la Notaria Primera de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 04 de junio de 2007, con el No. 28890 del Libro IX, se decretó POR E.P. NO. 2357 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2007 DE LA NOTARIA PRIMER ADE V/CIO. CONSTA LA REFORMA DE ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD AS?: AUMENTO DE CAPITAL EN LA SUMA DE $200.000.000 PARA UN TOTAL DE $400.000.000

Por Escritura Pública No. 2537 del 28 de mayo de 2007 de la Notaria Primera de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 04 de junio de 2007, con el No. 28890 del Libro IX, se decretó POR E.P. NO. 2357 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2007 DE LA NOTARIA PRIMER ADE V/CIO. CONSTA LA REFORMA DE ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD AS?: AUMENTO DE CAPITAL EN LA SUMA DE $200.000.000 PARA UN TOTAL DE $400.000.000

Por Escritura Pública No. 1823 del 28 de abril de 2009 de la Notaria Primera de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 15 de mayo de 2009, con el No. 32500 del Libro IX, se decretó POR E.P. NO. 1823 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2009 DE LA NOTARIA PRIMERA D E VILLAVICENCIO CONSTA REFORMA DE ESTATUTOS AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.

Por Escritura Pública No. 1823 del 28 de abril de 2009 de la Notaria Primera de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 15 de mayo de 2009, con el No. 32500 del Libro IX, se decretó POR E.P. NO. 1823 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2009 DE LA NOTARIA PRIMERA D E VILLAVICENCIO CONSTA REFORMA DE ESTATUTOS AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.

Por Escritura Pública No. 3466 del 22 de julio de 2010 de la Notaria Primera de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 23 de septiembre de 2010, con el No. 35237 del Libro IX, se decretó POR ESCRITURA PUBLICA 3466 DE JULIO 22 DE 2010 ACLARADA MEDIANTE ESCRI TURA PUBLICA 4371 DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 2010 DE LA NOTARIA PRIMERA DE V/CIO CONSTA AUMENTO DE CAPITAL.

Por Escritura Pública No. 3466 del 22 de julio de 2010 de la Notaria Primera de Villavicencio, inscrito en

esta Cámara de Comercio el 23 de septiembre de 2010, con el No. 35237 del Libro IX, se decretó POR ESCRITURA PUBLICA 3466 DE JULIO 22 DE 2010 ACLARADA MEDIANTE ESCRI IURA PUBLICA 4371 DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 2010 DE LA NOTARIA PRIMERA DE V/CIO CONSTA AUMENTO DE CAPITAL.

Por Acta No. 129 del 24 de mayo de 2011 de la Asamblea General De Socios de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 10 de junio de 2011, con el No. 37574 del Libro IX, se inscribió DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS.

Por Acta No. 129 del 24 de mayo de 2011 de la Asamblea General De Socios de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 10 de junio de 2011, con el No. 37574 del Libro IX, se inscribió DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS.

Por Acta No. 133 del 20 de septiembre de 2013 de la Asamblea De Accionistas de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 25 de septiembre de 2013, con el No. 46432 del Libro IX, se decretó POR ACTA N? 133 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013, CONSTA REFORMA PARC IAL DE ESTATUTOS (ART. 2 - OBJETO SOCIAL).

Por Acta No. 133 del 20 de septiembre de 2013 de la Asamblea De Accionistas de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 25 de septiembre de 2013, con el No. 46432 del Libro IX, se decretó POR ACTA N? 133 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2013, CONSTA REFORMA PARC IAL DE ESTATUTOS (ART. 2 - OBJETO SOCIAL).

Por Acta No. 13 del 21 de julio de 2023 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas de Villavicencio, inscrito en esta Cámara de Comercio el 15 de septiembre de 2023, con el No. 99988 del Libro IX, se decretó REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS ARTICULO 26 (JUNTA DIRECTIVA) Y 48 (UTILIDAD)

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 20 del 22 de noviembre de 2024 de la Asamblea Extraordinaria De Accionistas, inscrita/o en esta Cámara de Comercio el 24 de diciembre de 2024 con el No. 108972 del libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL	VICTOR RODRIGO ZAPATA CASTAÑO	C.C. No. 98.771.974
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	LUIS FERNANDO ROJAS GALLEGO	C.C. No. 79.453.418

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: G4663
Actividad secundaria Código CIIU: L6810
Otras actividades Código CIIU: No reportó

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta

tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona jurídica, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: ROJAS HERMANOS VILLAVICENCIO
Matrícula No.: 525
Fecha de Matrícula: 23 de mayo de 1972
Último año renovado: 2024
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : CLLE. 26C NO. 36-58 - Siete De Agosto
Municipio: Villavicencio, Meta

SUCURSALES Y AGENCIAS

Nombre: ROJAS HERMANOS SAS ACACIAS
Matrícula No.: 191367
Fecha de Matrícula: 22 de octubre de 2009
Último año renovado: 2024
Categoría: Agencia
Dirección : CARRERA 23 NO. 12-21 DORADO - Dorado Bajo
Municipio: Acacías, Meta

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MEDIANA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $42.147.471.114,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : G4663.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL

Fecha expedición: 27/01/2025 - 13:15:06
Recibo No. S002062277, Valor 5800

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN mcEgjgFTn2


Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La matrícula mercantil proporciona seguridad y confianza en los negocios,renueve su matrícula a más tardar el 31 de marzo de 2025.

documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.



***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

NIT: 901.892.095-4

MEMORIAS DE CALCULO

CR 24 A 8 125 CONJ CERRADO LA CABAÑA CA 1 IN 9. VILLAVICECNIO-META
SHARKYING10@GMAIL.COM-3222169909

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTION A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	2820 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L. JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	PRELIMINARES		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE AZOTEA	DIMENSIONES				
	AREA	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
AREA Y LOCALIZACION DEL PARQUE AZOTEA	572.54			1.00	572.54
PASAN:				SUBTOTAL	572.54
				TOTAL	572.54

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA O ESQUEMA

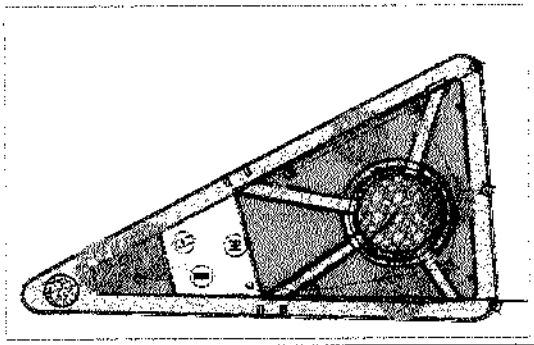

ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	Codigo: 1010-F-GCT-76 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	2828 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO:	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901 892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**PRELIMINARES**		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTONICA INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE VIRREY	DIMENSIONES				
	AREA	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
AREA DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EXITENTE Y REPLANTEO DE OBRA NUEVA ARQUITECTONICA VIRREY	871.42			1.00	871.42
PASAN: 572.54				SUBTOTAL	871.42
				TOTAL	1443.96

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

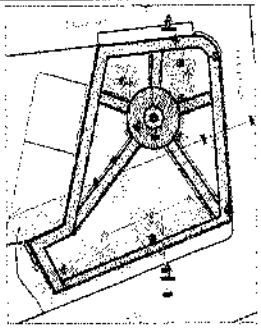

ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.065-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A

CAPITULO:	PRELIMINARES	
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE RETIRO	DIMENSIONES				
	ANCHO	LARGO	AREA	CANT	TOTAL
AREA DE LOCALIZACION PARQUE EL RETIRO			3997.46	1.00	3997.46
DESCUENTO DE AREA POLIDEPORTIVO	25.56	40.03	1023.10	-1.00	-1023.10
				SUBTOTAL	2974.35
PASAN: 1443.96				TOTAL	4418.31

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA O ESQUEMA

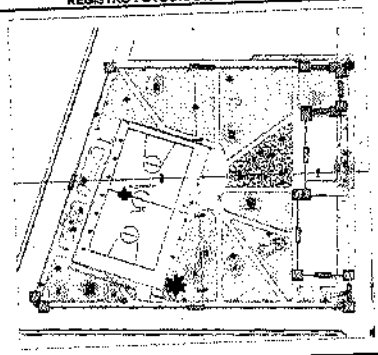

ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		


ACTA:	**ACTA MODIFICATORIA No 01**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**PRELIMINARES**		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE MACARENA	DIMENSIONES				
	ANCHO	LARGO	AREA	CANT	TOTAL
AREA BIOSALUDABLES MACARENA	6.61	12.53	82.75	1.00	82.75
AREA JUEGOS INFANTILES MACARENA	9.41	11.35	106.84	1.00	106.84
AREA MEJORAMIENTO ZONA VERDE JUNTO A JUEGOS INFANTILES MACARENA	4.82	9.46	45.62	1.00	45.62
PASAN: 4418.31				SUBTOTAL	235.22
				TOTAL	4653.53

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

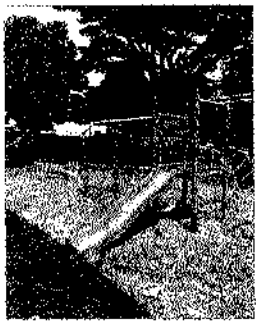

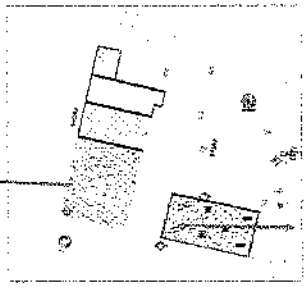



ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/05/2024 Pagina 1


CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	0/01/1900
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	PRELIMINARES		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.2	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE AZOTEA	DIMENSIONES				
	AREA	LONGITUD	H PROM	CANTIDAD	TOTAL
CUADROS DE CONCRETO	21.00		0.20	2.00	8.40
AREA CAD SENDEROS	182.00		0.15	1.00	27.30
BASES SILLAS	0.75		0.20	11.00	1.65
PASAN:				SUBTOTAL	37.35
				TOTAL	37.35

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA O ESQUEMA

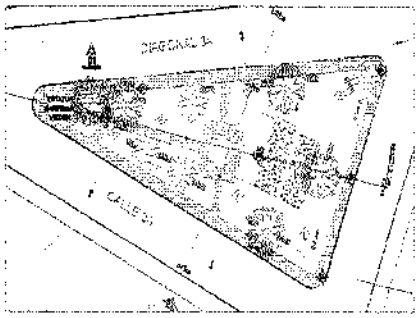

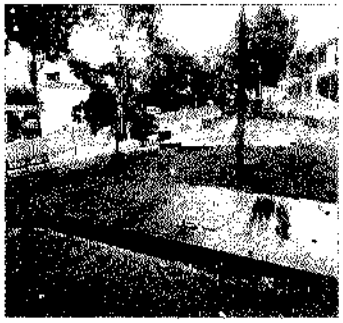

ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	PREUMINARES		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.2	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE VIRREY	DIMENSIONES				
	ANCHO	LONGITUD	AREA	H	TOTAL
ANDEN EXTERIOR JUNTO A CLL 44	1.39	35.46	49.19	0.15	7.38
ANDEN INTERIOR PARALELO A CLL 44	1.17	32.80	38.37	0.15	5.76
ANDEN CONEXION VIVIENDA A ROTONDA	1.17	8.89	10.40	0.11	1.14
ANDEN CONEXION ROTONDA A CR 52	1.15	8.34	9.59	0.11	1.05
ANDEN PARALELO A CLL 45A	1.02	18.33	18.63	0.15	2.79
ANDEN JUNTO A VIVIENDA	1.23	27.72	33.96	0.11	3.74
ANDEN CONEXION CLL 45A A ROTONDA	1.26	7.97	10.01	0.11	1.10
ANDEN CONEXION ROTONDA A ANDEN INTERNO PARALELO A VIA BOGOTA	1.18	7.25	8.53	0.11	0.94
ANEDEN PARALELO A CR 52	1.07	17.48	16.62	0.15	2.79
ANDEN ROTONDA	1.17	14.22	16.63	0.11	1.83
SARDINEL JUNTO A CLL 44	0.20	35.66	7.13	0.30	2.14
SARDINEL JUNTO A CARRERA 52	0.20	28.22	5.64	0.40	2.26
SARDINEL JUNTO A CLL 45 A	0.20	19.45	3.89	0.30	1.17
PASAN: 37.35				SUBTOTAL	34.09
				TOTAL	71.44

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

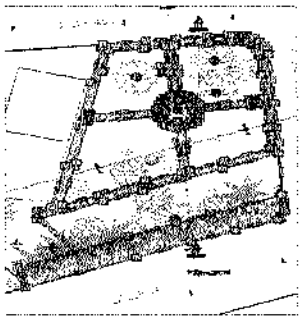



ELABORO

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBO

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	Codigo: 1610-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/08/2024 Página 1


CONTRATO N°	2928 DE 2024	**PROCESO N°**	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	**ACTA MODIFICATORIA No 01**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**PRELIMINARES**		

N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
1.2	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE RETIRO	**DIMENSIONES**				
	AREA	**H PROM**	**LONGITUD**	**ANCHO**	**TOTAL**
BORDILLO PERIMETRAL EXISTENTE CR 24A		0.30	67.95	0.15	3.06
BORDILLO PERIMETRAL EXISTENTE CLL 24		0.30	79.61	0.15	3.58
ASTA BANDERA	4.22	0.20			0.84
ANDEN PERIMETRAL CR 24A		0.11	67.95	1.85	13.83
ANDEN PERIMETRAL EXISTENTE CLL 24		0.11	79.61	1.85	16.20
ESQUINA ANDEN PERIMETRAL EXISTENTE CR 24		0.11	5.46	3.79	2.27
SENDERO INTERNO 1 ACCESO DE CR 24A - MURO CONTRAIMPACTO		0.11	19.76	1.97	4.28
SENDERO INTERNO 2 JUNTO A ASTA BANDERA		0.11	11.75	1.92	2.48
SENDERO INTERNO 3 JUNTO A SALON COMUNAL		0.11	22.18	4.08	9.95
SENDERO INTERNO 4 JUNTO A ALMACEN JAC COMUNAL		0.11	24.35	3.03	8.12
SENDERO INTERNO 5 CONEXION CR 24 - POLIDEPORTIVO		0.11	20.35	2.00	4.58
SENDERO INTERNO 6 CONEXIÓN SALON COMUN - POLIDEPORTIVO		0.11	16.99	2.04	3.81
SENDERO INTERNO 7 CONEXIÓN ALMAC COMUN - POLIDEPORTIVO		0.11	16.81	1.95	3.61
PASAN: 71.44				**SUBTOTAL**	76.61
				TOTAL	148.05

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

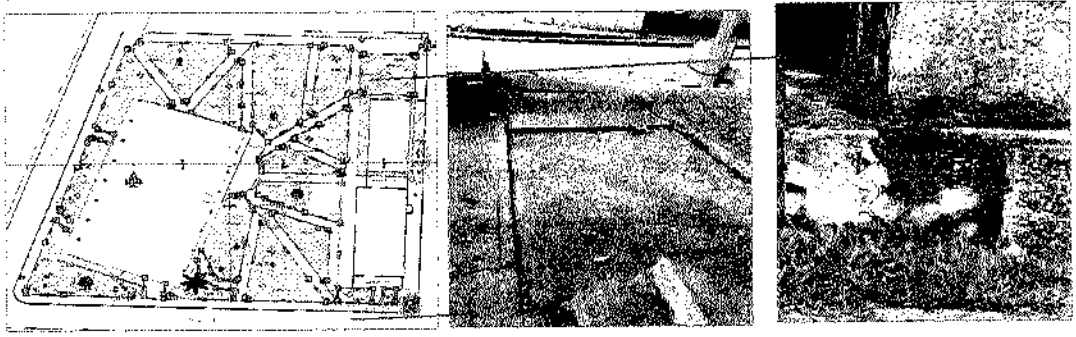

ELABORO

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBO

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma segun la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	PRELIMINARES		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.2	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE RETIRO	DIMENSIONES				
	AREA	H PROM	LONGITUD	ANCHO	TOTAL
SENDERO INTERNO 8 CONEXIÓN 1 CLL 24 - POLIDEPORTIVO		0.11	31.73	1.94	6.79
SENDERO INTERNO 9 CONEXIÓN 2 CLL 24 - POLIDEPORTIVO		0.11	21.09	1.97	4.56
AREA CAD IRREGULAR BAHIA INTERNA	62.81	0.11			6.91
SENDERO EXTERNO CONEXION 1 CR 24A - POLIDEPORTIVO		0.11	4.85	1.72	0.92
SENDERO EXTERNO CONEXIÓN 2 CR 24A - POLIDEPORTIVO		0.11	4.57	1.95	0.98
SENDERO EXTERNO JUNTO A ALMACEN COSTADO CLL 24		0.11	9.73	2.97	3.18
SENDERO EXTERNO CONEXION CLL 24 - ALMACEN		0.11	3.64	1.69	0.68
SENDERO EXTERNO CONEXIÓN CR 24 CLL 24 A		0.11	11.02	1.94	2.36
BORDILLO INTERNO ZONA 1		0.30	41.18	0.15	1.85
BORDILLO INTERNO ZONA 2		0.30	52.35	0.15	2.36
BORDILLO INTERNO ZONA 3		0.30	32.89	0.15	1.48
BORDILLO INTERNO ZONA 4		0.30	62.39	0.15	2.81
BORDILLO INTERNO ZONA 5		0.30	42.81	0.15	1.93
PASAN: 148.05				SUBTOTAL	36.81
				TOTAL	184.86

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

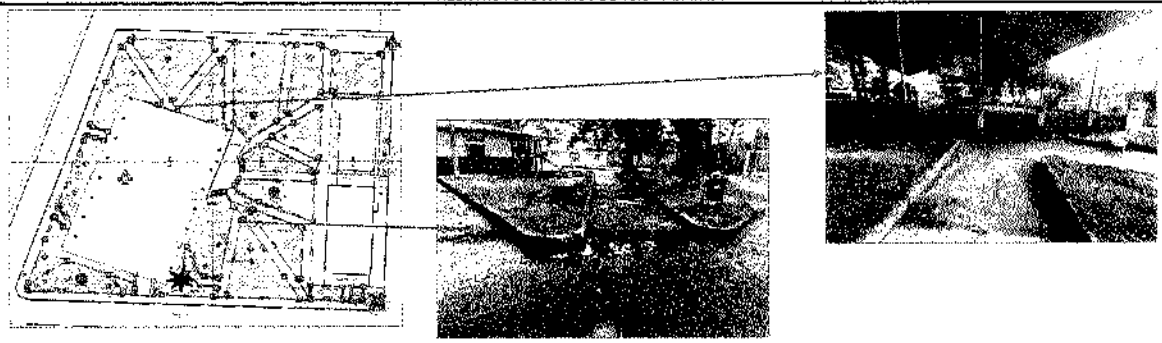

ELABORO

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISO

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBO

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Pagina 1

CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.852.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORIA:	N/A		
ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	PRELIMINARES		


N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.2	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE RETIRO	DIMENSIONES				
	AREA	H PROM	LONGITUD	ANCHO	TOTAL
BORDILLO INTERNO ZONA 6		0.30	40.43	0.15	1.82
BORDILLO INTERNO ZONA 7		0.30	37.69	0.15	1.70
BORDILLO INTERNO ZONA 8		0,30	39.06	0.15	1.76
BORDILLO INTERNO ZONA 9		0,30	47.50	0.15	2.14
BORDILLO INTERNO ZONA 10		0.30	35.70	0.15	1.61
BORDILLO INTERNO ZONA 11		0 30	44.71	0.15	2.01
BORDILLO INTERNO ZONA 12		0.30	27.13	0.15	1.22
BORDILLO INTERNO ZONA 13		0.30	58.20	0.15	2.62
BORDILLO INTERNO ZONA 14		0.30	20.64	0.15	0.94
BORDILLO INTERNO ZONA 15		0.30	11.91	0.15	0.54
BORDILLO INTERNO ZONA 16		0.30	48.43	0.15	2.18
BORDILLO INTERNO ZONA 17		0.30	25.86	0.15	1.16
PASAN: 184.86				SUBTOTAL	19.69
				TOTAL	204.55

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

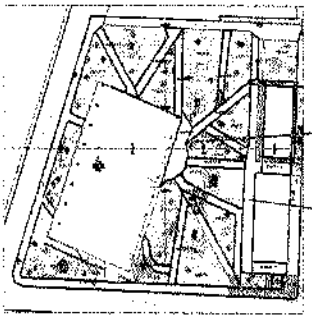



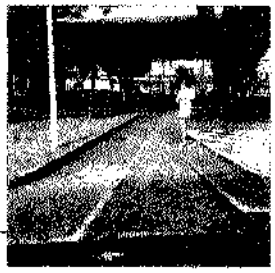

ELABORO

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/08/2024 Página 1

CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		


ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	PRELIMINARES		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
1.2	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE MACARENA	DIMENSIONES				
	AREA	H PROM	LONGITUD	ANCHO	TOTAL
PLACA BIOSALUDABLES EN MAL ESTADO		0.12	12.53	6.61	9.93
PLACA COSTADO POLIDEPORTIVO		0.12	9.84	3.50	4.14
PASAN: 204.55				SUBTOTAL	14.07
				TOTAL	218.62

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA O ESQUEMA



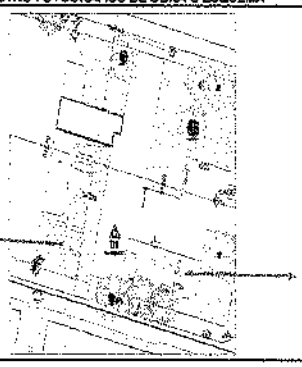



ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.096-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	EXCAVACIÓN		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE AZOTEA	DIMENSIONES				
	AREA	ESPESOR	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
EXPLANACION DE TERRAZAS	572.54	0.24		1.00	136.84
PASAN:				SUBTOTAL	136.84
				TOTAL	136.84

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOTA: De acuerdo a la topografia propia del parque la cual se obtuvo mediante levantamiento topografico de lo existente, se evidencia la necesidad de nivelar o explanar el terreno natural o terrazas para la correcta implentacion del diseño arquitectonico.

ELABORO	REVISO	APROBO
NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO	NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON	NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:2 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	EXCAVACION		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE VIRREY	DIMENSIONES				
	ANCHO	LONGITUD	AREA	N PROM	TOTAL
EXPLANACION DE TERRENO PARA ZONA VERDE NUEVA JUNTO A CALLE 44			273.45	0.18	49.22
EXPLANACION DE TERRENO PARA ANDEN NUEVO ACCESO 1			24.08	0.15	3.61
EXPLANACION DE TERRENO PARA ANDEN NUEVO ACCESO 2			20.46	0.15	3.07
SENDERO PERIMETRAL			176.81	0.12	21.22
SENDERO ACCESO 3 (CR 52 - ROTONDA)			8.88	0.12	1.07
SENDERO ACCESO 4 (CLL 45A - ROTONDA)			7.81	0.12	0.94
SENDERO ACCESO 5 (VIVIENDA - ROTONDA)			7.80	0.12	0.94
ROTONDA			54.00	0.12	6.48
PASAN: 136.84				SUBTOTAL	86.53
				TOTAL	223.37

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





NOTA: De acuerdo a la topografia del terreno natural se hace necesaria la explanacion de las areas verdes para ajustar niveles para paisajismo y así mismo garantizar que los accesos nuevos que conectan la zona central queden en un solo nivel, es por ello que las H alturas o profundidades de excavacion varian segun la condicion topografica

ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISO

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	2928 DE 2024	**PROCESO N°**	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.592.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	EXCAVACION		

N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE RETIRO	**DIMENSIONES**				
	AREA	**ANCHO**	**LONGITUD**	**H**	**TOTAL**
EXCAVACION SENDERO NUEVO RESPALDO CONTRAIMPACTO		1.45	10.52	0.30	4.56
EXCAVACION TRASLADO DE SENDERO CONEX CLL 24A - POLIDEPOR		1.31	20.37	0.30	7.99
EXCAVACION AJUSTE ZONA VERDE ASTA BANDERA		0.29	10.00	0.30	0.87
EXCAVACION AJUSTE ZONA BIOSALUDABLES	6.94			0.20	1.39
EXCAVACION AJUSTE ZONA VERDE JUNTO A POLIDEPORTIVO	22.39			0.20	4.48
EXCAVACION AJUSTE ZONA VERDE ESQUINA CLL 24 CR 24	4.24			0.20	0.85
EXCAVACION ACCESO 1 NUEVO A POLIDEPORTIVO CRA 24A		2.00	4.21	0.30	2.52
EXCAVACION ACCESO 2 NUEVO A POLIDEPORTIVO CRA 24A		2.00	4.42	0.30	2.65
EXCAVACION ACCESO 3 NUEVO A POLIDEPORTIVO CRA 24A		2.00	4.72	0.30	2.83
EXCAVACION ACCESO 1 A AREA DE JUEGO		0.85	3.26	0.30	0.84
EXCAVACION ACCESO 2A AREA DE JUEGO		0.60	2.01	0.30	0.36
EXCAVACION ADECUACION ZONA JUEGO		3.25	7.71	0.30	7.52
PASAN: 223.37				SUBTOTAL	36.87
				TOTAL	260.24

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA







NOTA: según la topografía del parque se cuantifican alturas variables de excavacion dependiendo de la zona, para accesos nuevos (senderos) a nivel de los demas, ajuste de zonas verdes en las cuales se retira material para abrir paso a circulares.

ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1810-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	2029 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.592.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	EXCAVACION		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE MACARENA	DIMENSIONES				
	ANCHO	LARGO	H PTOM	CANT	TOTAL
EXCAVACION RETIRO CAPA VEGETAL JUEGOS INFANTILES	9.46	15.30	0.12	1.00	17.38
TERRAZA AREA BIOSALUDABLES	6.62	12.54	0.20	1.00	16.61
PASAN: 260.24				SUBTOTAL	33.99
				TOTAL	294.23

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA







NOTA: las alturas de excavacion manual en areas de biosaludables contempla el nivel de la misma placa interna unificando las areas internas

ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISO

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Código: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	2028 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	BASES Y RELLENOS		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3.1	RELLENO CON MATERIAL MIXTODERÍO SINPROCESAR TAMAÑO MAX.3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE AZOTEA	DIMENSIONES				
	AREA	LONGITUD	H PROM	CANTIDAD	TOTAL
AREA CAD ANDEN PERIMETRAL	160.90		0.14	1.00	22.53
AREA CAD ANDEN INTERNO DE ACCESO 1	11.03		0.14	1.00	1.54
AREA CAD ANDEN INTERNO DE ACCESO 2	11.40		0.14	1.00	1.60
AREA CAD ANDEN INTERNO DE ACCESO 3	9.95		0.14	1.00	1.39
AREA CAD ANDEN INTERNO DE ACCESO 4	6.64		0.14	1.00	0.93
AREA CAD GLORIETA INTERNA	38.49		0.14	1.00	5.39
ZONA VERDE 2 RELLENO PARA REPLANTEO Y NIVELACIÓN INTERNA DE SUPERFICIE	49.84		0.29	1.00	14.40
PASAN:				SUBTOTAL	47.78
				TOTAL	47.78

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

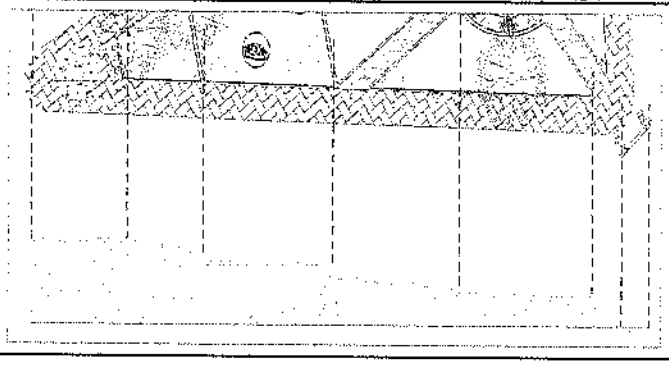

ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1013-F-GCT-79 Version:3 Fecha: 17/08/2024 Página 1


CONTRATO N°	2929 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.392.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	BASES Y RELLENOS		

N° ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
3.1	RELLENO CON MATERIAL MIXTODERÍO SINPROCESAR TAMAÑO MAX.3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE VIRREY	DIMENSIONES				
	ANCHO	LONGITUD	AREA	H	TOTAL
ANDEN PERIMETRAL			176.81	0.12	21.22
ANDEN CONEXIÓN 1 CLL 44 A ROTONDA			24.06	0.12	2.88
ANDEN CONEXIÓN 2 CALLE 44 A ROTONDA			20.45	0.12	2.45
ANDEN CONEXIÓN ROTONDA A CR 52			8.88	0.12	1.07
ANDEN CONEXIÓN ROTONDA A CLL 45A			7.81	0.12	0.94
ANDEN CONEXIÓN ROTONDA A VIVIENDA			7.80	0.12	0.94
ANDEN ROTONDA			54.00	0.12	6.48
PASAN: 47.78				SUBTOTAL	35.93
				TOTAL	83.76

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

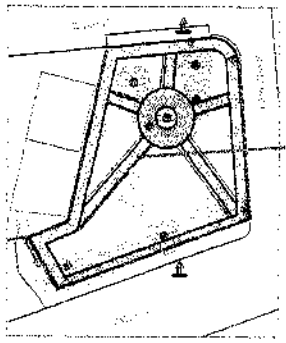



ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/05/2024 Página 1

CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		


ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	BASES Y RELLENOS		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3.1	RELLENO CON MATERIAL MIXTODERÍO SINPROCESAR TAMAÑO MAX.3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE RETIRO	DIMENSIONES				
	AREA	H	ANCHO	LONGITUD	TOTAL
ANDEN CONEXIÓN CR 24A - MURO CONTRIMAPCTO	27.14	0.15	1.30	20.87	4.07
ANDEN RESPALDO MURO CONTRAIMPACTO	16.97	0.15	1.30	13.05	2.54
ANDEN CONEXIÓN CLL 24A - POLIDEPORTIVO	26.28	0.15	1.30	20.21	3.94
ANDEN JUNTO A ZONA VERDE ASTA BANDERA	15.32	0.15	1.30	11.78	2.30
ANDEN CONEXIÓN CR 24 - POLIDEPORTIVO	26.68	0.15	1.30	20.53	4.00
ANDEN INTERNO JUNTO A SALON COMUNAL	72.55	0.15	3.27	22.19	10.88
ANDEN CONEXIÓN SALON COMUNAL POLIDEPORTIVO	22.66	0.15	1.30	17.43	3.40
ANDEN JUNTO A ALMACEN JAC	37.05	0.15	1.30	28.50	5.56
ANDEN CONEXIÓN ALMACEN - POLIDEPORTIVO	23.72	0.15	1.30	15.25	3.56
ANDEN CONXION 1 CLL 24 - POLIDEPORTIVO	41.49	0.15	1.30	31.92	6.22
ANDEN CONXION 2 CLL 24 - POLIDEPORTIVO	30.45	0.15	1.30	23.42	4.57
ANDEN JUNTO A ALMACEN CLL 24	36.06	0.15	2.82	12.60	5.41
CONEXIÓN CLL 24 - ALMACEN	6.54	0.15	1.58	4.13	0.98
PASAN: 93.76				SUBTOTAL	57.44
				TOTAL	141.20

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



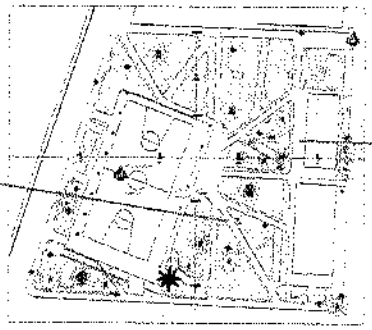



ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISO

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		


ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		N/A	
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	BASES Y RELLENOS		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3.1	RELLENO CON MATERIAL MIXTODERÍO SINPROCESAR TAMAÑO MAX.3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE RETIRO	DIMENSIONES				
	AREA	H PROM	ANCHO	LONGITUD	TOTAL
ANDEN JUNTO A ARBOL ESQUINA CR 24	10.08	0.15	2.41	4.18	1.51
ANDEN JUNTO A ARBOL ESQUINA CLL 24	2.91	0.15	1.84	1.58	0.44
ANDEN PERIMETRAL CLL 24	99.79	0.15	1.30	76.77	14.97
ANDEN PERIMETRAL CR 24A	85.20	0.15	1.30	65.54	12.76
ANDEN BAHIA CENTRAL	82.33	0.15			12.35
RELLENO ANDEN ANTIGUO PARA UNIFICACION ZONA 2 CON ZONA 3	75.50	0.30			22.65
RELLENO ANDEN ANTIGUO PARA UNIFICACION ZONA 4 CON ZONA 5	51.61	0.30			15.48
RELLENO PARA AMPLIACION ZONA 6	19.61	0.30			5.88
RELLENO ANDEN ANTIGUO 10, AMPLIACION Y UNION DE ZONA 7 Y 8	52.57	0.12			6.31
RELLENO PARA AMPLIACION ZONA VERDE 9	30.26	0.30			9.08
RELLENO PARA AMPLIACION ZONA VERDE 11	60.39	0.12			7.25
RELLENO PARA AMPLIACION Y UNION ZONA 10 Y 12	48.75	0.15			7.31
RELLENO PARA AMPLIACION ZONA 13	21.95	0.12			2.63
PASAN: 141.20				SUBTOTAL	118.64
				TOTAL	259.84

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



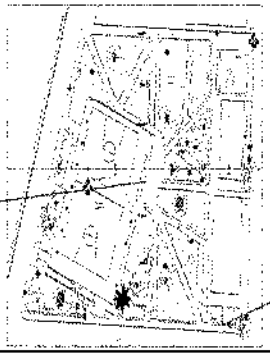



ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO	NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON	NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	Codigo: 1010-F-GCT-79 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.692.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	BASES Y RELLENOS		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3.1	RELLENO CON MATERIAL MIXTODERÍO SINPROCESAR TAMAÑO MAX.3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE RETIRO	DIMENSIONES				
	AREA	H PROM	ANCHO	LONGITUD	TOTAL
RELLENO PARA AMPLIACION ZONA 16	16.90	0.12			2.03
RELLENO PARA AMPLIACION ZONA 17	24.08	0.12			2.89
RELLENO PARA AMPLIACION ZONA 1	22.75	0.12			2.73
PASAN: 259.94				SUBTOTAL	7.65
				TOTAL	267.49

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



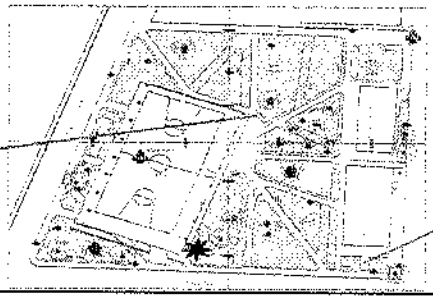



ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	BASES Y RELLENOS		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3.1	RELLENO CON MATERIAL MIXTODERÍO SINPROCESAR TAMAÑO MAX.3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE MACARENA	DIMENSIONES				
	ANCHO	LARGO	H	CANT	TOTAL
AREA DE JUEGOS INFANTILES	9,46	15,30	0,08	1,00	11,56
PASAN: 267.49				SUBTOTAL	11.56
				TOTAL	279.07

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA





ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISO

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Código: 1010-F-GCT-79 Versión:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	BASES Y RELLENOS		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA NEGRA	M3

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE AZOTEA	DIMENSIONES				
	AREA	ESPESOR	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
AREA CAD ZONA VERDE N°1	24.672	0.07		1.00	1.73
AREA CAD ZONA VERDE N°2	49.842	0.07		1.00	3.49
AREA CAD ZONA VERDE N°3	46.942	0.07		1.00	3.29
AREA CAD ZONA VERDE N°4	43.33	0.07		1.00	3.03
AREA CAD ZONA VERDE N°5	32.121	0.07		1.00	2.25
AREA CAD MATERA N°1	4.4444	0.3		1.00	1.33
AREA CAD MATERA N°2	6.452	0.3		1.00	1.94
AREA CAD MATERA N°3	3.858	0.3		1.00	1.16
AREA CAD MATERA N°4	1.457	0.3		1.00	0.44
PASAN:				SUBTOTAL	18.66
				TOTAL	18.66

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

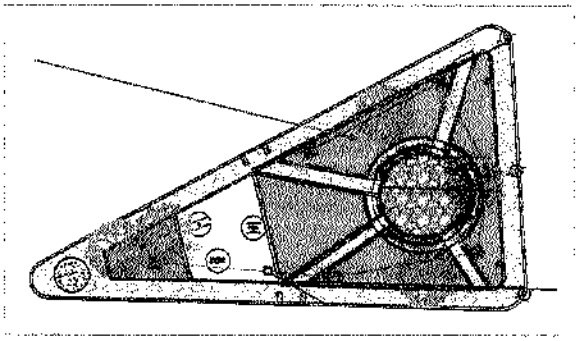

ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISO

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBO

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/08/2024 Página 1

CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L. JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	BASES Y RELLENOS		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA NEGRA	M3

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE VIRREY	DIMENSIONES				
	AREA	ESPESOR	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
AREA CAD ZONA VERDE N°1	47.82	0.07		1.00	3.35
AREA CAD ZONA VERDE N°2	57.8971	0.07		1.00	4.05
AREA CAD ZONA VERDE N°3	60.9238	0.07		1.00	4.26
AREA CAD ZONA VERDE N°4	273.4452	0.07		1.00	19.14
AREA CAD ZONA VERDE N°5	62.6841	0.07		1.00	4.39
AREA CAD INTERIOR ROTONDA	8.0425	0.07		1.00	0.56
DESCUENTO AREA TRONCO ARBOL CENTRAL	1.37	0.07		-1.00	-0.10
DESCUENTO AREA TRONCO ARBOL ZONA VERDE 1	1.364	0.07		-1.00	-0.10
DESCUENTO AREA TRONCO ARBOLES ZONA VERDE 2	1.364	0.07		-2.00	-0.19
PASAN: 18.65				SUBTOTAL	35.37
				TOTAL	54.02

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA O ESQUEMA

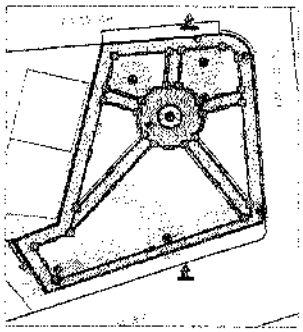

ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBO

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	Código: 1010-F-GCT-70 Versión:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	2828 DE 2024	**PROCESO N°**	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.692.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	**ACTA MODIFICATORIA No 01**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**BASES Y RELLENOS**		

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA NEGRA	M3

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE RETIRO	**DIMENSIONES**				
	AREA	**LONGITUD**	**H**	**ANCHO**	**TOTAL**
AMPLIACION ZONA 1 COSTADO CR 24A		18.53	0.07	0.48	0.63
AMPLIACION ZONA 1 HACIA ZONA 2		19.05	0.07	0.67	0.90
UNIFICACION ZONA 2 CON ZONA 3		17.27	0.07	2.45	2.96
AMPLIACION DE UNIFICACION ZONA 2 CON ZONA 3 HACIA ZONA 4		19.33	0.07	2.05	2.77
UNIFICACION ZONA 4 CON ZONA 5		18.18	0.07	2.17	2.76
AMPLIACION DE UNIFICACION ZONA 4 CON ZONA 5 HACIA ZONA 6		11.02	0.07	0.80	0.62
AMPLIACION DE UNIFICACION ZONA 4 CON ZONA 5 HACIA ZONAS 7 Y 8		20.23	0.07	0.75	1.06
AMPLIACION ZONA 6 HACIA CALLE 24A		10.45	0.07	1.81	1.32
UNIFICACION ZONA 7 CON ZONA 8		13.42	0.07	2.29	2.15
AMPLIACION DE UNIFICACION ZONA 7 CON ZONA 8 HACIA SAL. COMU		16.46	0.07	0.80	0.92
AMPLIACION DE UNIFICACION ZONA 7 CON ZONA 8 HACIA ZONA 9		16.28	0.07	0.72	0.82
AMPLIACION ZONA 9 HACIA ALMACEN		10.04	0.07	1.72	1.21
AMPLIACION ZONA 9 HACIA ZONA 11		18.22	0.07	0.50	0.63
PASAN: 54.02				**SUBTOTAL**	18.76
				TOTAL	72.78

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

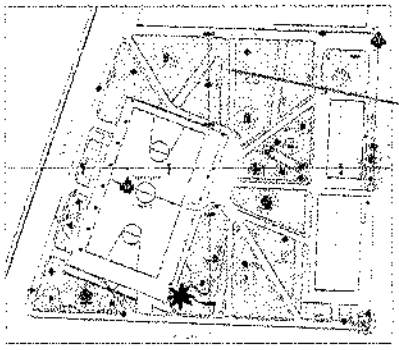



ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	292B DE 2024	**PROCESO N°**	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JONN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	**ACTA MODIFICATORIA No 01**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**BASES Y RELLENOS**		

N° ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA NEGRA	M3

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE RETIRO	**DIMENSIONES**				
	AREA	**LONGITUD**	**H**	**ANCHO**	**TOTAL**
AMPLIACION ZONA 11 HACIA ALMACEN		15.37	0.07	3.76	4.04
AMPLIACION ZONA 14 HACIA CLL 24		4.09	0.07	0.51	0.15
AMPLIACION ZONA 13 HACIA CLL 24		13.51	0.07	0.49	0.48
AMPLIACION ZONA 13 HACIA ZONA 11		25.41	0.07	0.45	0.79
AMPLIACION ZONA 13 HACIA ZONA 10		5.62	0.07	0.73	0.29
UNIFICACION ZONA 10 CON ZONA 12		11.40	0.07	2.23	1.78
AMPLIACION DE UNIFICACION ZONA 10 CON ZONA 12 HACIA ZONA 13		17.29	0.07	1.13	1.37
AMPLIACION ZONA 12 HACIA CLL 24		7.44	0.07	0.47	0.25
AMPLIACION ZONA 16 HACIA CLL 24		21.20	0.07	0.49	0.73
AMPLIACION ZONA 16 HACIA CR 24		23.00	0.07	0.51	0.82
AMPLIACION ZONA 17 HACIA ZONA 16		3.32	0.07	2.03	0.47
AMPLIACION ZONA 17 HACIA ZONA 1		3.55	0.07	2.25	0.56
AMPLIACION ZONA 17 HACIA CR 24A		11.73	0.07	0.52	0.42
PASAN: 72.78				**SUBTOTAL**	12.13
				TOTAL	84.91

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA O ESQUEMA

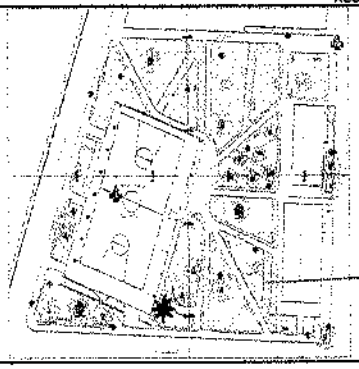



ELABORO

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-76 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		N/A	
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	BASES Y RELLENOS		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA NEGRA	M3

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE MACARENA	DIMENSIONES				
	ANCHO	LONGITUD	H	CANT	TOTAL
ZONA VERDE JUNTO A JUEGOS INFANTILES	4.82	9.46	0.12	1.00	5.47
PASAN: 84.91				SUBTOTAL	5.47
				TOTAL	90.38

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

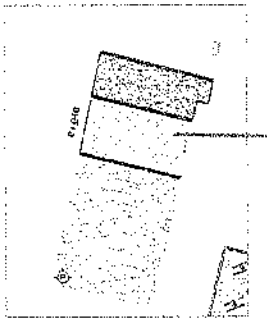



ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO:	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	BASES Y RELLENOS		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA TRENZA	M2

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE AZOTEA	DIMENSIONES				
	AREA	LONGITUD	ESPESOR	CANTIDAD	TOTAL
AREA CAD ZONA VERDE N°1	24.672			1.00	24.67
AREA CAD ZONA VERDE N°2	49.842			1.00	49.84
AREA CAD ZONA VERDE N°3	46.942			1.00	46.94
AREA CAD ZONA VERDE N°4	43.33			1.00	43.33
AREA CAD ZONA VERDE N°5	32.121			1.00	32.12
DESCUENTO AREA TRONCO JUNTO A DIVINO JNIÑO	0.278			-1.00	-0.28
DESCUENTO AREA TRONCO ARBOL ZONA VERDE 3	0.272			-1.00	-0.27
DESCUENTO AREA TRONCO ARBOL ZONA VERDE 5	0.305			-1.00	-0.31
PASAN:				SUBTOTAL	196.05
				TOTAL	196.05

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA O ESQUEMA

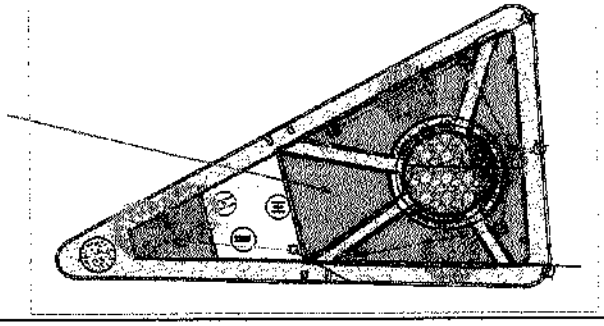

ELABORO

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO

RESIDENTE DE OBRA

REVISO

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON

DIRECTOR DE OBRA

APROBO

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE

SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	BASES Y RELLENOS		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA TRENZA	M2

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE VIRREY	DIMENSIONES				
	AREA	LONGITUD	ESPESOR	CANTIDAD	TOTAL
AREA CAD ZONA VERDE N°1	47.82			1.00	47.82
AREA CAD ZONA VERDE N°2	57.8971			1.00	57.90
AREA CAD ZONA VERDE N°3	60.9239			1.00	60.92
AREA CAD ZONA VERDE N°4	273.4452			1.00	273.45
AREA CAD ZONA VERDE N°5	62.6841			1.00	62.68
AREA CAD INTERIOR	8.0425			1.00	8.04
DESCUENTO AREA TRONCO ARBOL CENTRAL	1.37			-1.00	-1.37
DESCUENTO AREA TRONCO ARBOL ZONA VERDE 1	1.364			-1.00	-1.36
DESCUENTO AREA TRONCO ARBOLES ZONA VERDE 2	1.364			-1.00	-1.36
PASAN: 196.05				SUBTOTAL	506.71
				TOTAL	702.76

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

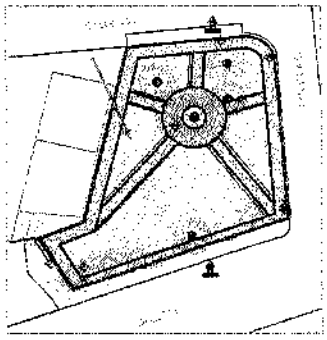

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO	NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON	NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	2828 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	BASES Y RELLENOS		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA TRENZA	M2

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE RETIRO	DIMENSIONES				
	ANCHO	LONGITUD	AREA	CANTIDAD	TOTAL
AMPLIACION ZONA 1 COSTADO CR 24A	0.48	18.53	8.98	1.00	8.98
AMPLIACION ZONA 1 HACIA ZONA 2	0.67	19.05	12.85	1.00	12.85
UNIFICACION ZONA 2 CON ZONA 3	2.45	17.27	42.35	1.00	42.35
AMPLIACION DE UNIFICACION ZONA 2 CON ZONA 3 HACIA ZONA 4	2.06	19.33	39.62	1.00	39.62
UNIFICACION ZONA 4 CON ZONA 5	2.17	18.16	39.49	1.00	39.49
AMPLIACION DE UNIFICACION ZONA 4 CON ZONA 5 HACIA ZONA 6	0.80	11.02	8.84	1.00	8.84
AMPLIACION DE UNIFICACION ZONA 4 CON ZONA 5 HACIA ZONAS 7 Y 8	0.75	20.23	15.18	1.00	15.18
AMPLIACION ZONA 6 HACIA CALLE 24A	1.81	10.45	18.88	1.00	18.88
UNIFICACION ZONA 7 CON ZONA 8	2.29	13.42	30.66	1.00	30.66
AMPLIACION DE UNIFICACION ZONA 7 CON ZONA 8 HACIA SAL. COMU	0.80	16.46	13.15	1.00	13.15
AMPLIACION DE UNIFICACION ZONA 7 CON ZONA 8 HACIA ZONA 9	0.72	16.28	11.73	1.00	11.73
AMPLIACION ZONA 9 HACIA ALMACEN	1.72	10.04	17.24	1.00	17.24
AMPLIACION ZONA 9 HACIA ZONA 11	0.60	15.22	9.03	1.00	9.03
PASAN: 702.78				SUBTOTAL	268.01
				TOTAL	970.77

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA O ESQUEMA

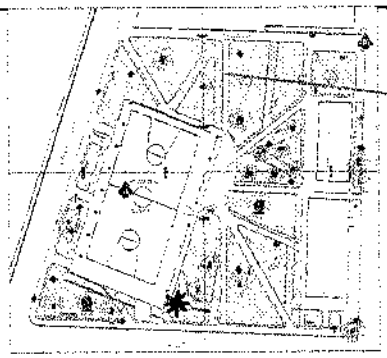



ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISO

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBO

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Código: 1010-F-GCT-70 Versión:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	BASES Y RELLENOS		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA TRENZA	M2

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE RETIRO	DIMENSIONES				
	ANCHO	LONGITUD	AREA	CANTIDAD	TOTAL
AMPLIACION ZONA 11 HACIA ALMACEN	3.76	15.37	57.78	1.00	57.78
AMPLIACION ZONA 14 HACIA CLL 24	0.51	4.09	2.07	1.00	2.07
AMPLIACION ZONA 13 HACIA CLL 24	0.49	13.51	6.56	1.00	6.56
AMPLIACION ZONA 13 HACIA ZONA 11	0.45	25.41	11.32	1.00	11.32
AMPLIACION ZONA 13 HACIA ZONA 10	0.72	5.62	4.09	1.00	4.09
UNIFICACION ZONA 10 CON ZONA 12	2.23	11.40	25.37	1.00	25.37
AMPLIACION DE UNIFICACION ZONA 10 CON ZONA 12 HACIA ZONA 13	1.13	17.29	19.58	1.00	19.58
AMPLIACION ZONA 12 HACIA CLL 24	0.47	7.44	3.51	1.00	3.51
AMPLIACION ZONA 15 HACIA CLL 24	0.49	21.20	10.46	1.00	10.46
AMPLIACION ZONA 16 HACIA CR 24 Y RECUPERACION ZONA EXISTENTE	2.11	20.49	43.27	1.00	43.27
AMPLIACION ZONA 17 HACIA ZONA 16	2.03	3.32	6.73	1.00	6.73
AMPLIACION ZONA 17 HACIA ZONA 1	2.25	3.55	7.98	1.00	7.98
AMPLIACION ZONA 17 HACIA CR 24A	0.62	11.73	6.05	1.00	6.05
PASAN: 970.77				SUBTOTAL	204.77
				TOTAL	1175.54

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

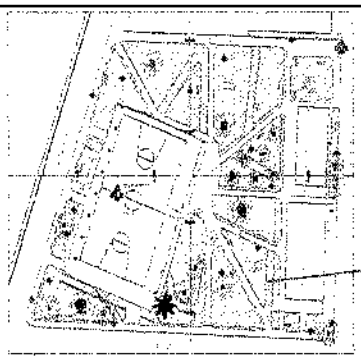



ELABORO

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISO

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBO

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	2926 DE 2024	**PROCESO N°**	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.692.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	**ACTA MODIFICATORIA No 01**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**BASES Y RELLENOS**		

N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA TRENZA	M2

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE MACARENA	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**LONGITUD**	**AREA**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
ZONA VERDE JUNTO A JUEGOS INFANTILES	4.82	9.46	45.62	1.00	45.62
PASAN: 1175.54				**SUBTOTAL**	45.62
				TOTAL	1221.16

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

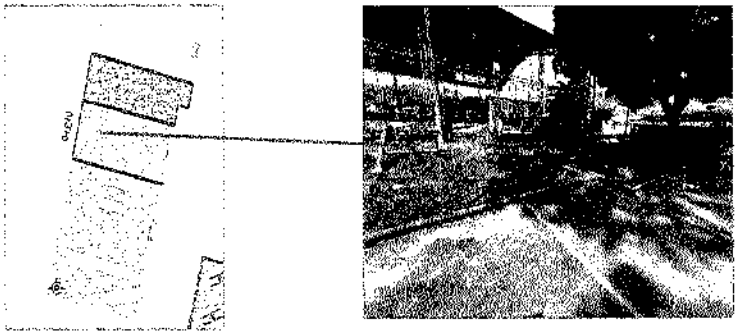

ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISO

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/09/2024 Página 1


CONTRATO N°	2928 DE 2024	**PROCESO N°**	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.692.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		


ACTA:	**ACTA MODIFICATORIA No 01**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**ANDENES, SARDINELES, BORDILLLOS, ADOQUINES**		

N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
4.1	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-8080X35X20CM. NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE AZOTEA	**DIMENSIONES**				
	AREA	**ESPESOR**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
LONGITUD BORDILLO PERIMETRAL			110.67	1.00	110.67
PASAN:				**SUBTOTAL**	110.67
				TOTAL	110.67

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

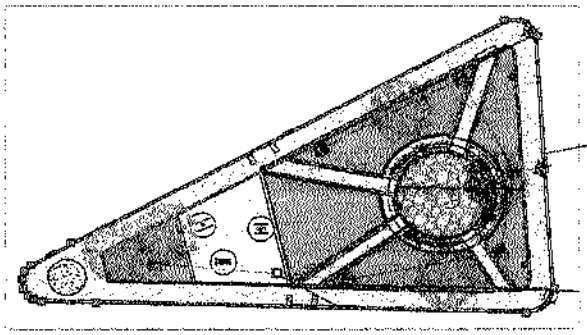



ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISO

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/08/2024 Página 1


CONTRATO N°	2928 DE 2024	**PROCESO N°**	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		


ACTA:	**ACTA MODIFICATORIA No 01**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		N/A	
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**ANDENES, SARDINELES, BORDILLLOS, ADOQUINES**		

N° ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
4.1	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-8080X35X20CM. NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE VIRREY	DIMENSIONES				
	AREA	ESPESOR	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
BORDILLO PERIMETRAL PARALELO A CLL 44			30.81	1.00	30.81
BORDILLO PERIMETRAL PARALELO A CR 52			24.77	1.00	24.77
BORDILLO PERIMETRAL PARALELO A CLL 45A			16.67	1.00	16.67
BORDILLO PERIMETRAL JUNTO A VIVIENDA			35.88	1.00	35.88
PASAN: 110.67				SUBTOTAL	108.13
				TOTAL	218.80

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

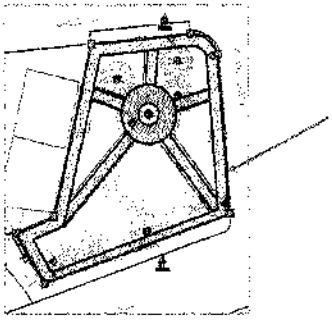



ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Alcaldía de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Código: 1010-F-GCT-70 Versión:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	2028 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.085-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		


ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	ANDENES, SARDINELES, BORDILLOS, ADOQUINES		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
4.1	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-6080X35X20CM. NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE RETIRO	DIMENSIONES				
	AREA	LONGITUD	H	CANTIDAD	TOTAL
AREA CAD ZONA VERDE N°1		67.95		1.00	67.95
AREA CAD ZONA VERDE N°2		79.61		1.00	79.61
PASAN: 218.80				SUBTOTAL	147.57
				TOTAL	366.37

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

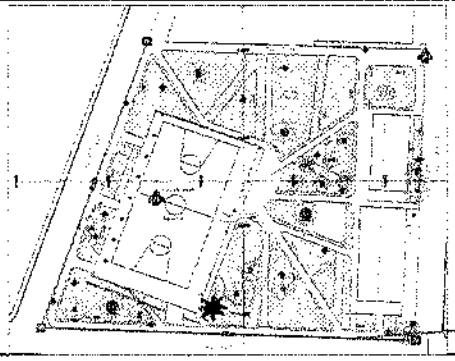



ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO	NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON	NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	2928 DE 2024	**PROCESO N°**	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	**FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:**	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		


ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	**CANTIDAD ACUMULADA**	N/A
CAPITULO:	ANDENES, SARDINELES, BORDILLOS, ADOQUINES		

N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
4.2	MALLA ELECTROSOLDADA fy= 5000 kg/cm2,500 Mpa	KG

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE AZOTEA	**DIMENSIONES**				
	AREA	**W (kg/m2)**	**W(Kg)**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
MALLA PARA SENDERO PERIMETRAL	160.90	2.07	333.07	1.00	333.07
MALLA PARA SENDERO ACCESO N°1	11.03	2.07	22.82	1.00	22.82
MALLA PARA SENDERO ACCESO N°2	11.40	2.07	23.60	1.00	23.60
MALLA PARA SENDERO ACCESO N°3	9.95	2.07	20.59	1.00	20.59
MALLA PARA SENDERO ACCESO N°4	6.64	2.07	13.73	1.00	13.73
MALLA PARA GLORIETA INTERNA	38.49	2.07	79.66	1.00	79.66
PASAN:				**SUBTOTAL**	493.48
				TOTAL	493.48

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA O ESQUEMA

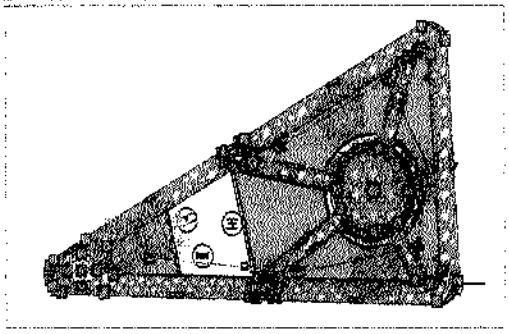

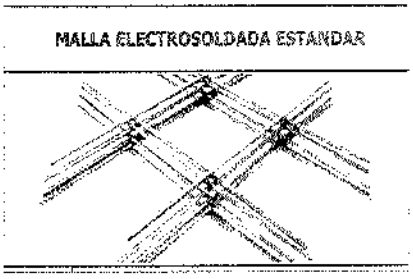

ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISO

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	2928 DE 2024	**PROCESO N°**	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		


ACTA:	**ACTA MODIFICATORIA No 01**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**ANDENES, SARDINELES, BORDILLOS, ADOQUINES**		

N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
4.2	MALLA ELECTROSOLDADA fy= 5000 kg/cm2,500 Mpa	KG

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE VIRREY	**DIMENSIONES**				
	AREA	**W (kg/m2)**	**W(Kg)**	**CANTIDAD**	**W TOTAL**
ANDEN PERIMETRAL COLOR OCRE	181.73	2.07	376.19	1.00	376.19
ANDEN ACCESO 1 OCRE	34.24	2.07	70.88	8.00	567.05
ANDEN ACCESO 2 OCRE	19.68	2.07	40.74	1.00	40.74
ANDEN ACCESO 3 OCRE	8.88	2.07	18.38	1.00	18.38
ANDEN ACCESO 4 OCRE	7.81	2.07	16.17	1.00	16.17
ANDEN ACCESO 5 OCRE	7.80	2.07	16.15	1.00	16.15
ANDEN ROTONDA	54.00	2.07	111.77	1.00	111.77
PASAN: 493.46				**SUBTOTAL**	1146.44
				TOTAL	1639.92

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

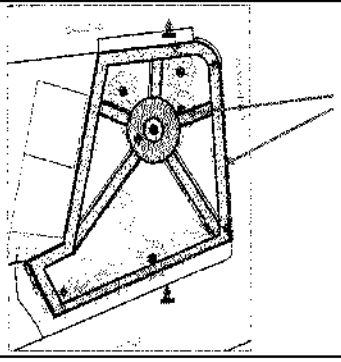

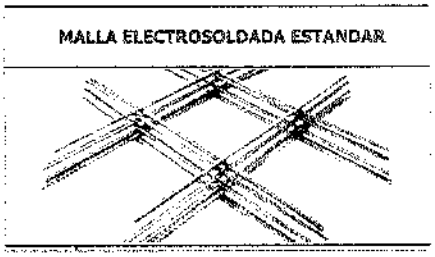

ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma segun la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.692.095-4 R/L. JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		


ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	ANDENES, SARDINELES, BORDILLLOS, ADOQUINES		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
4.2	MALLA ELECTROSOLDADA fy= 5000 kg/cm2,500 Mpa	KG

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE RETIRO	DIMENSIONES				
	AREA	W KG/M	CANTIDAD	W TOTAL	TOTAL
AMPLIACION ZONA 1 COSTADO CR 24A	27.14	2.07	1.00	56.17	56.17
AMPLIACION ZONA 1 HACIA ZONA 2	16.97	2.07	1.00	35.12	35.12
UNIFICACION ZONA 2 CON ZONA 3	26.28	2.07	1.00	54.39	54.39
AMPLIACION DE UNIFICACION ZONA 2 CON ZONA 3 HACIA ZONA 4	15.32	2.07	1.00	31.71	31.71
UNIFICACION ZONA 4 CON ZONA 5	26.68	2.07	1.00	55.24	55.24
AMPLIACION DE UNIFICACION ZONA 4 CON ZONA 5 HACIA ZONA 6	72.55	2.07	1.00	150.18	150.18
AMPLIACION DE UNIFICACION ZONA 4 CON ZONA 5 HACIA ZONAS 7 Y 8	22.66	2.07	1.00	46.90	46.90
AMPLIACION ZONA 6 HACIA CALLE 24A	37.05	2.07	1.00	76.69	76.69
UNIFICACION ZONA 7 CON ZONA 8	23.72	2.07	1.00	49.11	49.11
AMPLIACION DE UNIFICACION ZONA 7 CON ZONA 8 HACIA SAL. COMU	41.49	2.07	1.00	85.89	85.89
AMPLIACION DE UNIFICACION ZONA 7 CON ZONA 8 HACIA ZONA 9	30.45	2.07	1.00	63.03	63.03
AMPLIACION ZONA 9 HACIA ALMACEN	36.06	2.07	1.00	74.65	74.65
AMPLIACION ZONA 9 HACIA ZONA 11	6.54	2.07	1.00	13.54	13.54
PASAN: 1639.62				SUBTOTAL	792.63
				TOTAL	2432.55

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



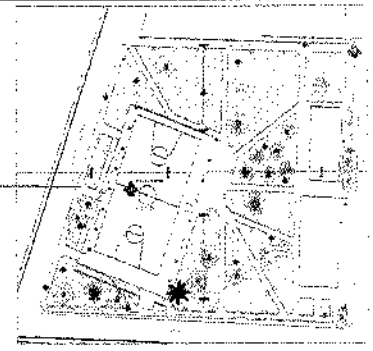

ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-79 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.692.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		


ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		N/A	
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	ANDENES, SARDINELES, BORDILLLOS, ADOQUINES		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
4.2	MALLA ELECTROSOLDADA fy= 5000 kg/cm2,500 Mpa	KG

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE RETIRO	DIMENSIONES				
	AREA	W KG/M	CANTIDAD	W TOTAL	TOTAL
AMPLIACION ZONA 11 HACIA ALMACEN	10.08	2.07	1.00	20.87	20.87
AMPLIACION ZONA 14 HACIA CLL 24	2.91	2.07	1.00	6.02	6.02
AMPLIACION ZONA 13 HACIA CLL 24	99.79	2.07	1.00	206.57	206.57
AMPLIACION ZONA 13 HACIA ZONA 11	85.20	2.07	1.00	176.36	176.36
AMPLIACION ZONA 13 HACIA ZONA 10	82.33	2.07	1.00	170.41	170.41
PASAN: 2432.55				SUBTOTAL	580.24
				TOTAL	3012.79

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

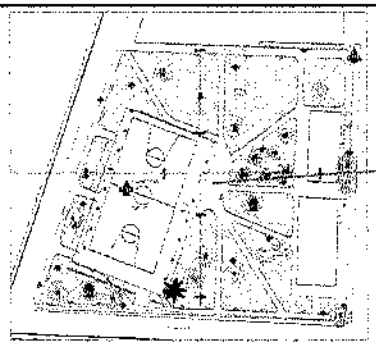



ELABORO	REVISO	APROBO
NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO	NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON	NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CALCULO**	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:2 Fecha: 17/06/2024 Pagina 1


CONTRATO N°	2928 DE 2024	**PROCESO N°**	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.692.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	**ACTA MODIFICATORIA No 01**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**INSTALACIONES ELECTRICAS**		

N° ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**
5.3	ESTRUCTURA LA321	UND

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE AZOTEA	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
CIRCUITO				1.00	1.00
PASAN:				SUBTOTAL	1.00
				TOTAL	1.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

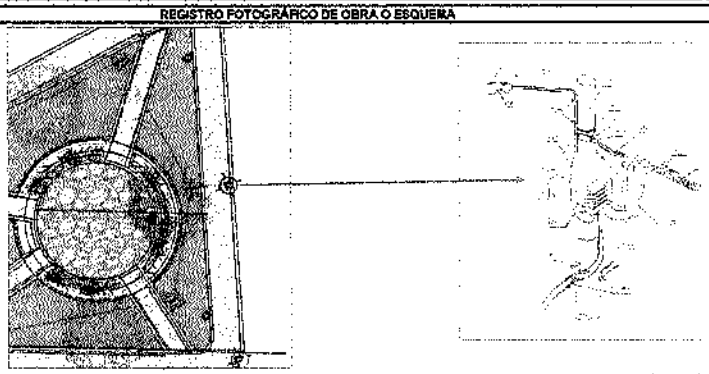

ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISO

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Pagina 1


CONTRATO N°	2928 DE 2024	**PROCESO N°**	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.092.095-4 R/L. JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		


ACTA:	**ACTA MODIFICATORIA No 01**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**INSTALACIONES ELECTRICAS**		

N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
5.3	ESTRUCTURA LA321	UND

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE VIRREY	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**ALTO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
FINALIZACIÓN CIRCUITO AEREO EN POSTE CENTRAL				1.00	1.00
PASAN: 1.00				**SUBTOTAL**	1.00
				TOTAL	2.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

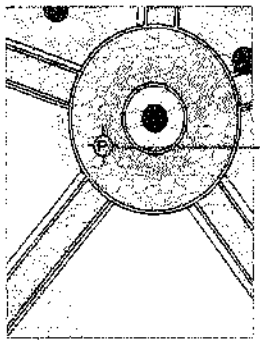

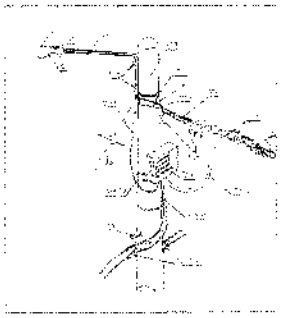

ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L. JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		


ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	INSTALACIONES ELECTRICAS		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
5.4	ESTRUCTURA CS400	UND

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE AZOTEA	DIMENSIONES				
	AREA	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
CIRCUITO AEREO A SUBTERRANEO POSTE CENTRAL				1,00	1,00
PASAN:				SUBTOTAL	1,00
				TOTAL	1,00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA O ESQUEMA

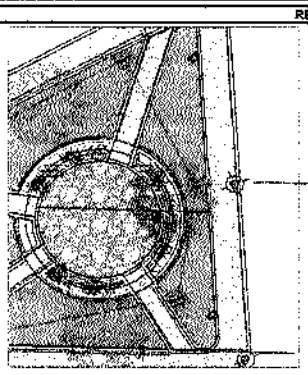



ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO	NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON	NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	2928 DE 2024	**PROCESO N°**	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		


ACTA:	**ACTA MODIFICATORIA No 01**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**INSTALACIONES ELECTRICAS**		

N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
5.4	ESTRUCTURA CS400	UND

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE VIRREY	**DIMENSIONES**				
	AREA	**ALTO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
DERIVACION CIRCUITO AEREO A SUBTERRANEO PORTE CENTRAL				1.00	1.00
PASAN: 1.00				**SUBTOTAL**	1.00
				TOTAL	2.00

REGISTRO FOTOGRÁRCO DE OBRA O ESQUEMA

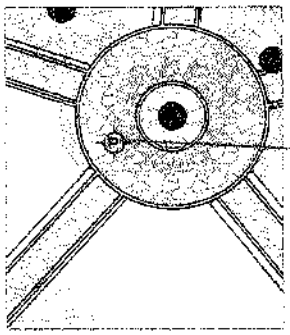

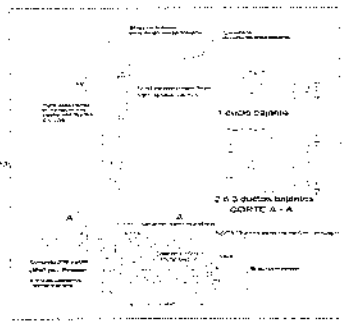

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO	NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON	NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 RL JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		N/A	
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	INSTALACIONES ELECTRICAS		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
5.5	ACOMETIDA PARCIAL 2 No6+1No.6 AL	ML

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE AZOTEA	DIMENSIONES				
	AREA	LONGITUD	ESPESOR	CANTIDAD	TOTAL
DISTRIBUCION CABLEADO ENERGIZACION		54.69		1.00	54.69
PASAN:				SUBTOTAL	54.69
				TOTAL	54.69

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

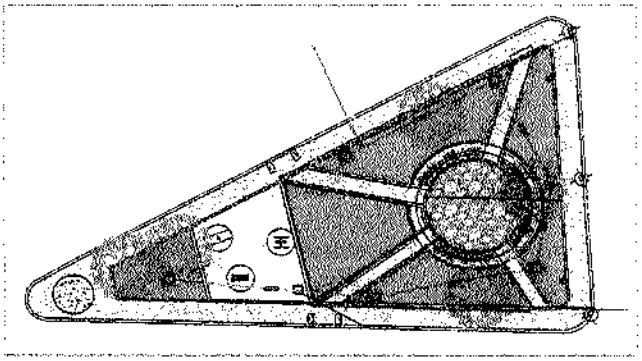

ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Municipio de Villavicencio	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Código: 1010-F-GCT-70 Versión:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	INSTALACIONES ELECTRICAS		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
5.5	ACOMETIDA PARCIAL 2 No6+1No.6 AL	ML

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE VIRREY	DIMENSIONES				
	AREA	LONGITUD	ESPESOR	CANTIDAD	TOTAL
DISTRIBUCION CABLEADO ENERGIZACION		64.42		1.00	64.42
PASAN: 54.69				SUBTOTAL	64.42
				TOTAL	139.11

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

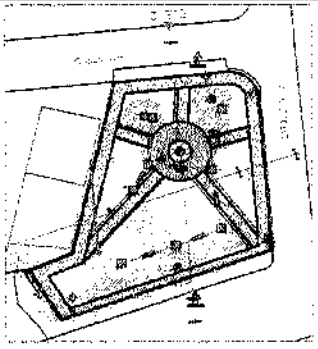

ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	Codigo: 1010-F-GCT-79 Version:3 Fecha: 17/08/2024 Página 1


CONTRATO N°	2928 DE 2024	**PROCESO N°**	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 RAL JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	**ACTA MODIFICATORIA No 01**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**INSTALACIONES ELECTRICAS**		

N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
5.6	ACOMETIDA PARCIAL 2 No8+1No.8 CU THHN	ML

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE AZOTEA	**DIMENSIONES**				
	AREA	**ESPESOR**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
DISTRIBUCIO CABLEADO ENERGIZACION			54.69	1.00	54.69
PASAN:				**SUBTOTAL**	54.69
				TOTAL	54.69

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

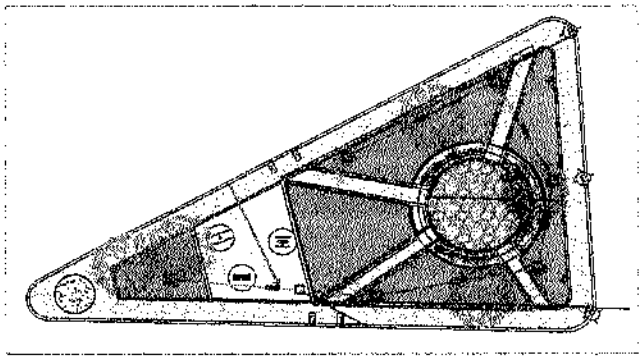

ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISO

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Código: 1010-F-GCT-70 Versión:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	17/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		N/A	
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	INSTALACIONES ELECTRICAS		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
5.6	ACOMETIDA PARCIAL 2 No8+1No.8 CU THHN	ML

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE VIRREY	DIMENSIONES				
	AREA	ESPESOR	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
DISTRIBUCIO CABLEADO ENERGIZACION			84.42	1.00	84.42
PASAN: 54.69				SUBTOTAL	84.42
				TOTAL	139.11

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

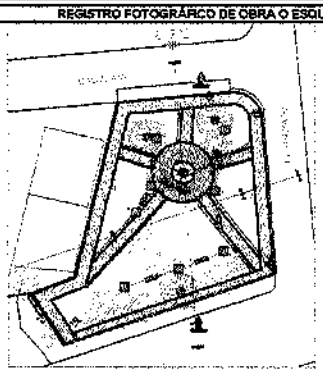

ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Municipio de Villavicencio	**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/08/2024 Página 1


CONTRATO N°	2928 DE 2024	**PROCESO N°**	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/06/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.592.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		


ACTA:	**ACTA MODIFICATORIA No 01**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**INSTALACIONES ELECTRICAS**		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
5.9	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 – AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UND

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE AZOTEA	DIMENSIONES				
	AREA	LONGITUD	ESPESOR	CANTIDAD	TOTAL
CAJA DE INSPECCION				6.00	6.00
PASAN:				SUBTOTAL	6.00
				TOTAL	6.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA O ESQUEMA

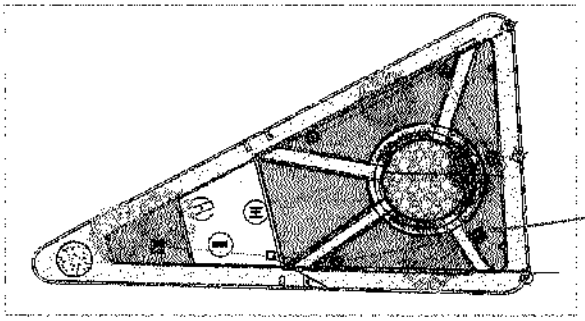

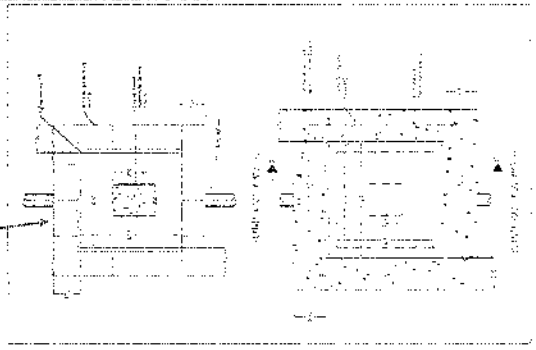

ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTALBARE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/08/2024 Página 1


CONTRATO N°	2928 DE 2024	**PROCESO N°**	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		


ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**INSTALACIONES ELECTRICAS**		


N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
5.9	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UND

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE VIRREY	**DIMENSIONES**				
	AREA	**LONGITUD**	**ESPESOR**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
CAJA DE INSPECCION				8.00	8.00
PASAN: 6.00				**SUBTOTAL**	8.00
				TOTAL	14.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

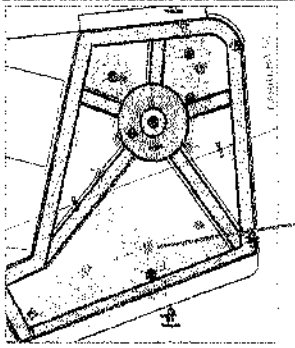

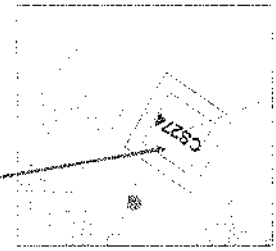

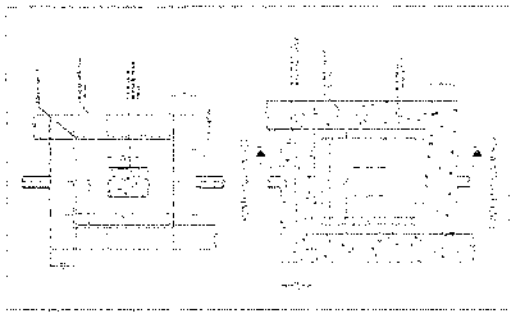

ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-79 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORIA:	N/A		

ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	MOBILIARIO URBANO		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
6.1	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO ELIPTICA (ESQUÍ DE FONDO), SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE AZOTEA	DIMENSIONES				
	AREA	ESPESOR	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
JUEGO BIOSALUDABLE TIPO ELIPTICA				1,00	1,00
PASAN:				SUBTOTAL	1,00
				TOTAL	1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

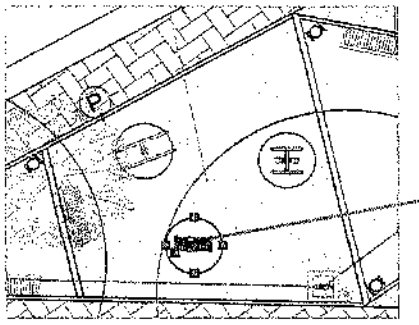



ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Pagina 1


CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/13/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 RA. JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		


ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	MOBILIARIO URBANO		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
8.2	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO SURF. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE AZOTEA	DIMENSIONES				
	AREA	LONGITUD	PESO	CANTIDAD	TOTAL
MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO SURF				1.00	1.00
PASAN:				SUBTOTAL	1.00
				TOTAL	1.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

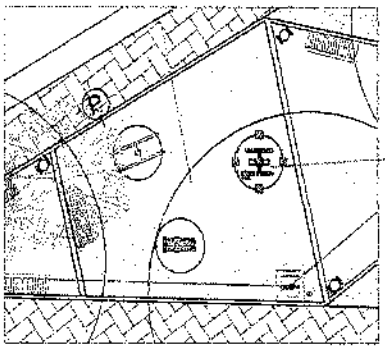

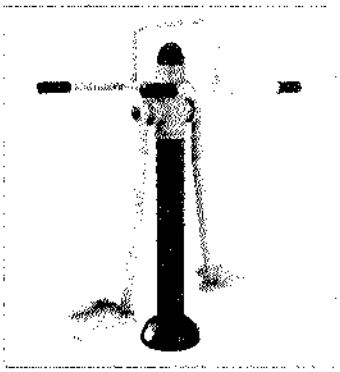

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO	NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON	NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	SUPERVISOR DE OBRA

Nota. se debe disponer de los profesionales responsables de firma según le etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA		N/A	
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	MOBILIARIO URBANO		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
6.3	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO BARRAS PARALELAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE AZOTEA	DIMENSIONES				
	AREA	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO BARRA				1.00	1.00
PASAN:				SUBTOTAL	1.00
				TOTAL	1.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

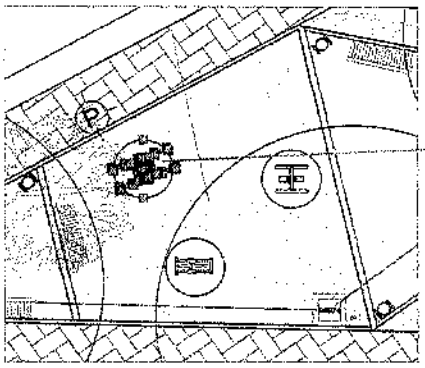



ELABORÓ	REVISO	APROBO
NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO	NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON	NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma segun la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:0 Fecha: 17/06/2024 Pagina 1

CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.086-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	MOBILIARIO URBANO		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
6.4	MANTE Y REPA JUEGO BIOSALUDABLES EXIST	UN

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE RETIRO	DIMENSIONES				
	AREA	LONGITUD	ESPESOR	CANTIDAD	TOTAL
MANTENIMIENTO DE JUEGOS EXISTENTES BIOSALUDABLES				6.00	6.00
PASAN:				SUBTOTAL	6.00
				TOTAL	6.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

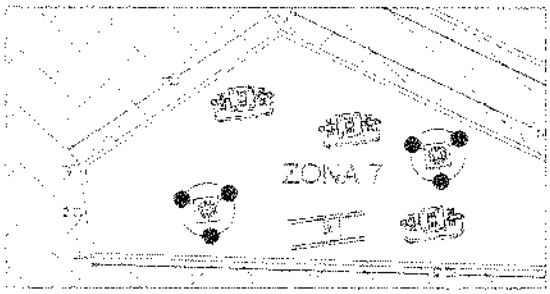





ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.065-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	MOBILIARIO URBANO		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
6.4	MANTE Y REPA JUEGO BIOSALUDABLES EXIST	UN

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE MACARENA	DIMENSIONES				
	AREA	LONGITUD	ESPESOR	CANTIDAD	TOTAL
MANTENIMIENTO DE JUEGOS EXISTENTES BIOSALUDABLES				7.00	7.00
PASAN: 0.00				SUBTOTAL	7.00
				TOTAL	13.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

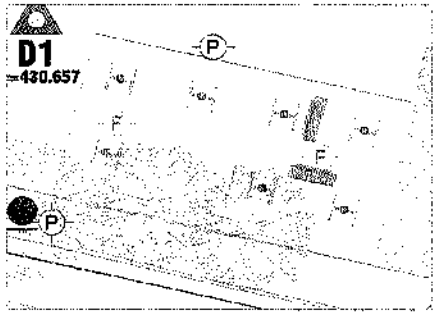



ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	2928 DE 2024	**PROCESO N°**	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L. JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	**ACTA MODIFICATORIA No 01**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**ITEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA**		

N° ÍTEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**
NP 1	DESMONTE DE MASTILES EXISTENTES (INC. DEMOLICION BASE Y CARGUE DE MATERIALES. Y SUSP RED CABLEADO EXIS)	UN

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE AZOTEA	**DIMENSIONES**				
	AREA	**ESPESOR**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
MASTILES DE FAROLES YA EXISTENTES				6.00	6.00
PASAN:				**SUBTOTAL**	6.00
				TOTAL	6.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



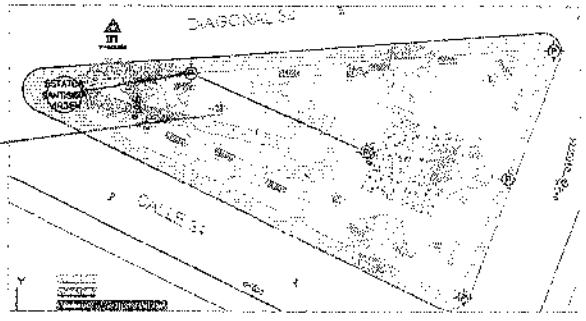

ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-79 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-012-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 1	DESMONTE DE MASTILES EXISTENTES (INC. DEMOLICION BASE Y CARGUE DE MATERIALES, Y SUSP RED CABLEADO EXIS)	UN

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE VIRREY	DIMENSIONES				
	AREA	LONGITUD	ESPESOR	CANTIDAD	TOTAL
MASTILES DE FAROLES YA EXISTENTES				5.00	5.00
PASAN: 6.00				SUBTOTAL	5.00
				TOTAL	11.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

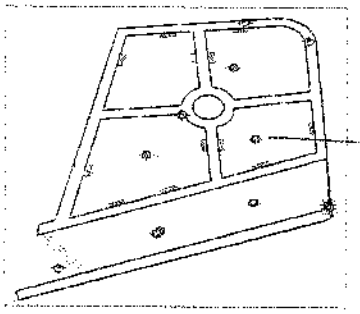



ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.692.065-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	**ACTA MODIFICATORIA No 01**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**ITEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA**		

N° ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**
NP 1	DESMONTE DE MASTILES EXISTENTES (INC. DEMOLICION BASE Y CARGUE DE MATERIALES, Y SUSP RED CABLEADO EXIS)	UN

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE RETIRO	**DIMENSIONES**				
	ANCHO	**ALTO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
MASTILES EXISTENTES DE ILUMINACION ANTIGUA EN NO USO				19.00	19.00
PASAN: 11.00					
				SUBTOTAL	19.00
				TOTAL	30.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

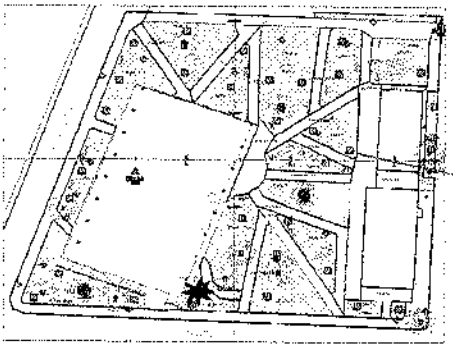



ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO

RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON

DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE

SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/09/2024 Página 1

CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 RA, JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 2	BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR TIPO M31, SUMINISTRO E INSTALACION.	UN

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE AZOTEA	DIMENSIONES				
	AREA	LONGITUD	ESPESOR	CANTIDAD	TOTAL
BANCAS				12.00	12.00
PASAN:				SUBTOTAL	12.00
				TOTAL	12.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

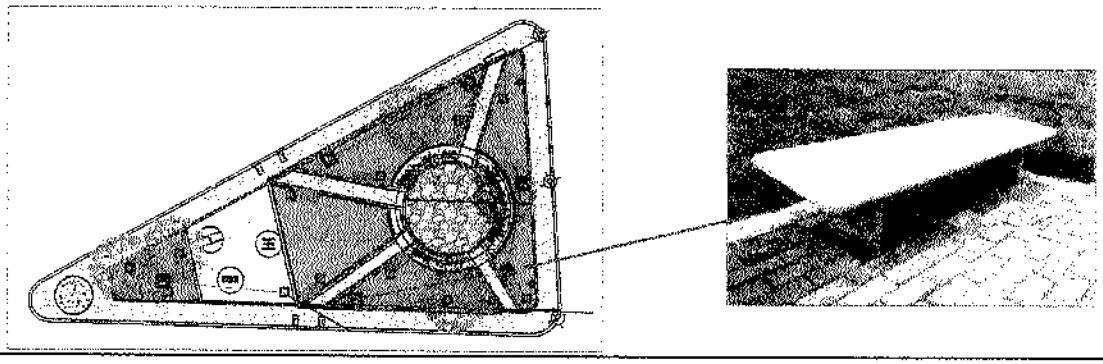

ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/08/2024 Pagina 1


CONTRATO N°	2028 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		


ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 2	BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR TIPO M31, SUMINISTRO E INSTALACION.	UN

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE VIRREY	DIMENSIONES				
	AREA	LONGITUD	ESPESOR	CANTIDAD	TOTAL
BANCAS				12.00	12.00
PASAN: 12.00				SUBTOTAL	12.00
				TOTAL	24.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

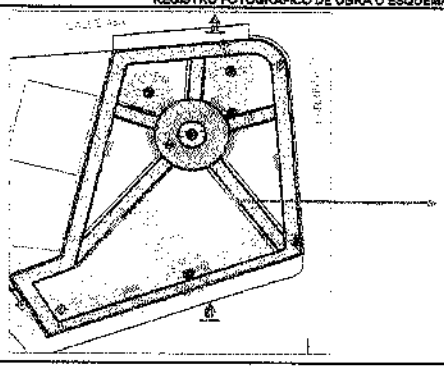



ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		


ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 2	BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR TIPO M31. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE RETIRO	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
MOBILIARIO BANCAS NUEVAS EN CONCRETO				25.00	25.00
PASAN: 24.00				SUBTOTAL	25.00
				TOTAL	49.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

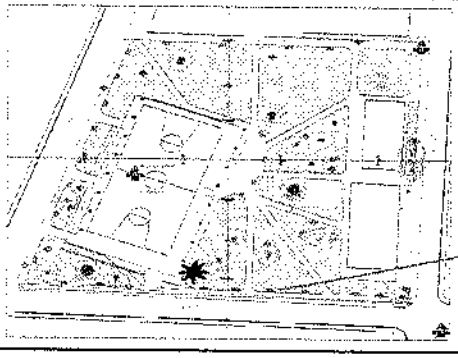



ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISO

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBO

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma segun la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado de maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		


ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 2	BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR TIPO M31, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE MACARENA	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
MOBILIARIO BANCAS NUEVAS EN CONCRETO				1.00	1.00
PASAN: 49.00				SUBTOTAL	1.00
				TOTAL	50.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

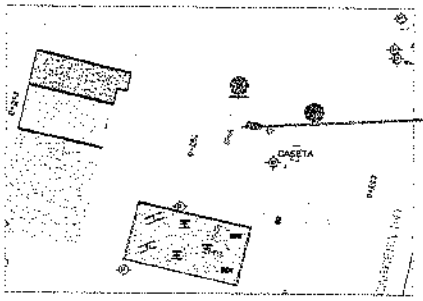



ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISO

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Pagina 1


CONTRATO N°	2828 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO:	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L. JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 3	DESMONTE DE BANCA incl retiro	UN

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE AZOTEA	DIMENSIONES				
	AREA	ESPESOR	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
BANCAS EXISTENTES				11.00	11.00
PASAN:					
				SUBTOTAL	11.00
				TOTAL	11.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA O ESQUEMA

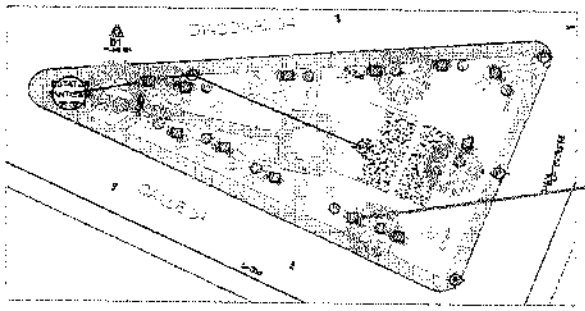



ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISO

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	Codigo: 1018-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/08/2024 Página 1

CONTRATO N°	2928 DE 2024	**PROCESO N°**	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSPA NIT: 901.892.085-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	**ACTA MODIFICATORIA No 01**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**ITEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA**		

N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
NP 3	DESMONTE DE BANCA incl retiro	UN

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE VIRREY	**DIMENSIONES**				
	AREA	**LONGITUD**	**ESPESOR**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
BANCAS EXISTENTES				11.00	11.00
PASAN: 11.00				**SUBTOTAL**	11.00
				TOTAL	22.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

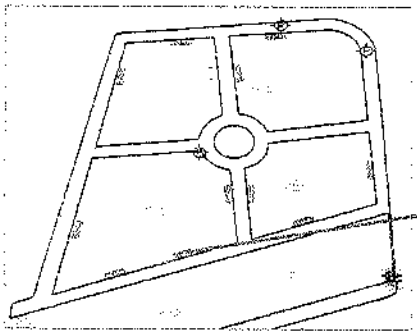



ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CALCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.692.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 3	DESMONTE DE BANCA incl retiro	UN

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE RETIRO	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
MOBILIARIO BANCAS EXTSITENES SIN ESPALDAR				18.00	18.00
PASAN: 22.00				SUBTOTAL	18.00
				TOTAL	40.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA O ESQUEMA

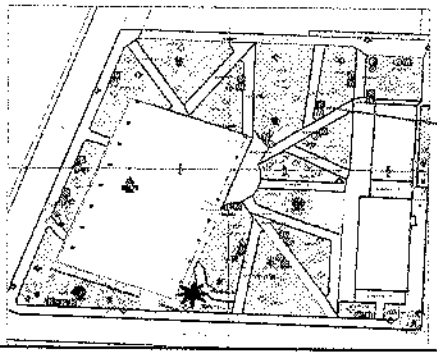



ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/08/2024 Página 1


CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 3	DESMONTE DE BANCA incl retiro	UN

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE MACARENA	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
MOBILIARIO BANCAS EXTSITENES EN MAL ESTADO				1.00	1.00
PASAN: 40.00					
				SUBTOTAL	1.00
				TOTAL	41.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

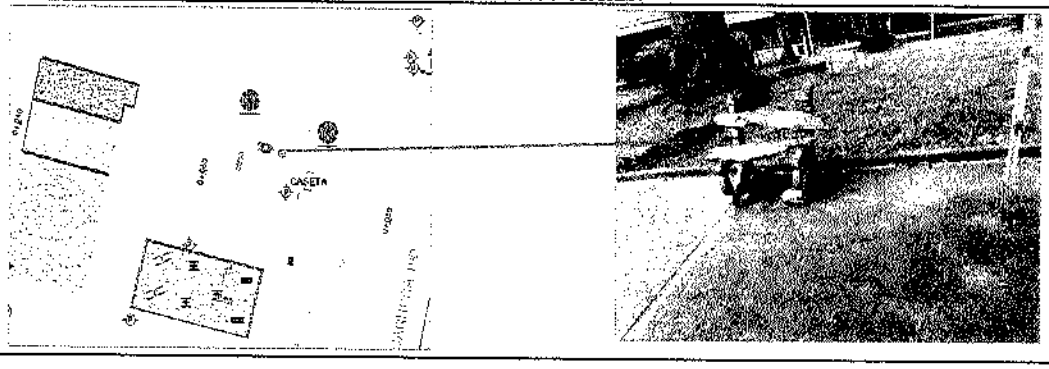

ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISO

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 RA. JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 4	DESMONTE DE CANECAS EXISTENTES (INC. DEMOLICION DE BASE EXISTENTE Y CARGUE DE MATERIALES)	UN

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE AZOTEA	DIMENSIONES				
	AREA	LONGITUD	ESPESOR	CANTIDAD	TOTAL
CANTIDAD GLOBAL				2.00	2.00
PASAN:				SUBTOTAL	2.00
				TOTAL	2.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA O ESQUEMA

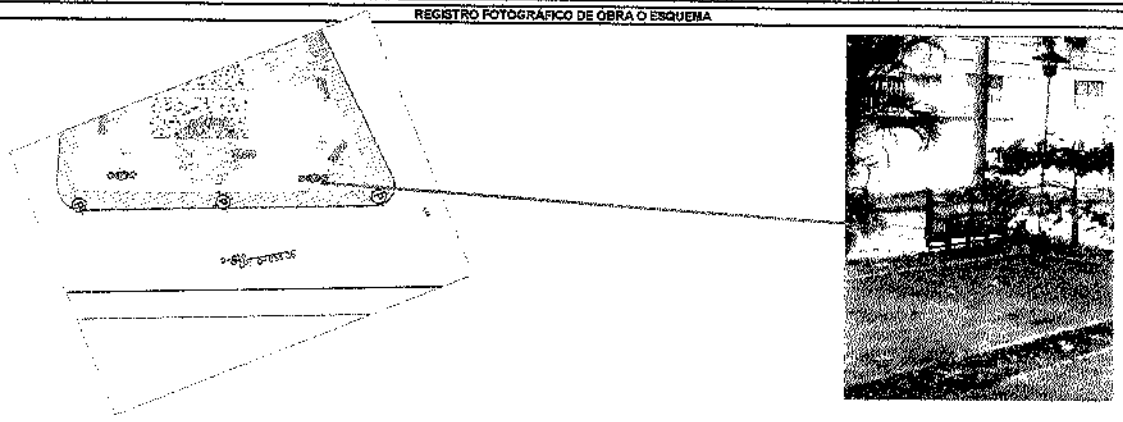

ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO

RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON

DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTALCORE

SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:5 Fecha: 17/08/2024 Página 1

CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		


ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 5	LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	M2

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE MACARENA	DIMENSIONES				
	ANCHO	LONG	AREA	CANTIDAD	TOTAL
LAVADO PLACA CENTRAL CONTINUA A RAMPA DE CR19D	7.53	10.75	80.88	1.00	80.88
LAVADO PLACA CENTRAL JUNTO A JUEGOS BIOSALUDABLES	3.87	12.51	48.40	1.00	48.40
LAVADO PLACA JUNTO A ZONA VERDE INTERNA	2.33	6.37	14.85	1.00	14.85
LAVADO PLACA JUNTO A JUEGOS INFANTILES	5.04	28.41	143.23	1.00	143.23
PASAN:				SUBTOTAL	287.36
				TOTAL	287.36

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



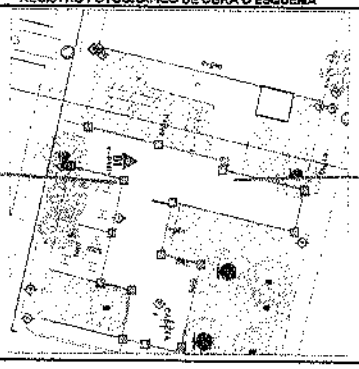



ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO

RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON

DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE

SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L. JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 6	MURO CONFINAMIENTO ACABADO LISO 0.60>H>0.45 A=0.20 EN CONCRETO REF 3000 PSI	ML

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE AZOTEA	DIMENSIONES				
	AREA	LONGITUD	ESPESOR	CANTIDAD	TOTAL
MURO PARA CONFINAMIENTO DE ZONA VERDE 1		5.66		1.00	5.66
MURO PARA CONFINAMIENTO DE ZONA BIOSALUDABLES HACIA SENDERO PERIMETRAL		7.61		1.00	7.61
MURO PARA CONFINAMIENTO DE ZONA BIOSALUDABLES HACIA ZONA VERDE 2		9.47		1.00	9.47
MURO SEMICIRCULAR MATERA 1 GLORIETA		6.08		1.00	6.08
MURO SEMICIRCULAR MATERA 2 GLORIETA		13.55		1.00	13.55
MURO SEMICIRCULAR MATERA 3 GLORIETA		18.57		1.00	18.57
MURO SEMICIRCULAR MATERA 4 GLORIETA		12.06		1.00	12.06
PASAN:				SUBTOTAL	73.00
				TOTAL	73.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

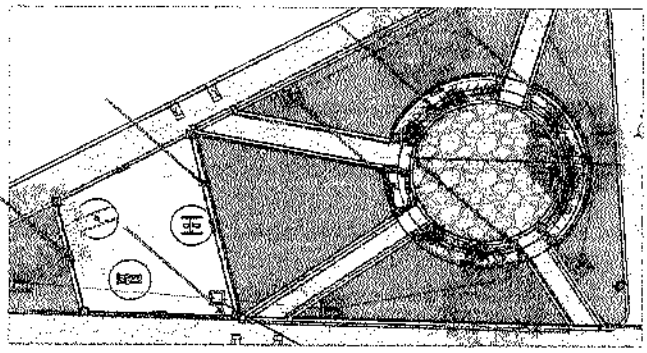

ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO

RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON

DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE

SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 7	CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR OCRE ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)	M2

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE AZOTEA	DIMENSIONES				
	AREA	LONGITUD	PESO	CANTIDAD	TOTAL
SENDERO PERIMETRAL	160.90			1.00	160.90
SENDERO ACCESO 1	11.03			1.00	11.03
SENDERO ACCESO 2	11.40			1.00	11.40
SENDERO ACCESO 3	9.95			1.00	9.95
SENDERO ACCESO 4	6.64			1.00	6.64
PASAN:				SUBTOTAL	199.91
				TOTAL	199.91

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA O ESQUEMA

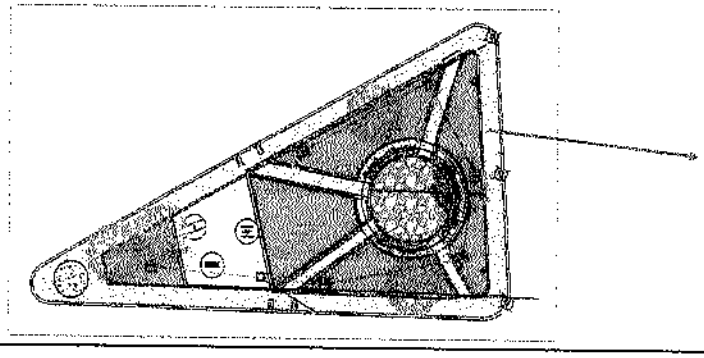

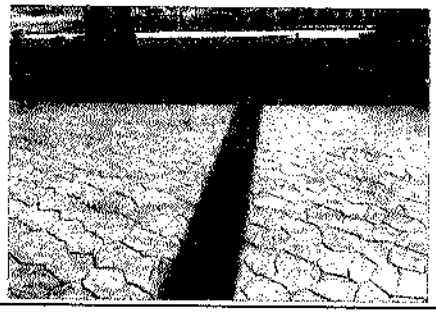

ELABORO

NOMBRE: CIARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISO

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBO

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	10/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIFA NIT: 901.892.065-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		


ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 7	CIRCULARES É=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR OCRE ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)	M2

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE VIRREY	DIMENSIONES				
	ANCHO	LONGITUD	AREA	CANTIDAD	TOTAL
ANDEN PERIMETRAL COLOR OCRE	1.66	108.17	181.73	1.00	181.73
ANDEN ACCESO 1 OCRE	1.50	22.83	34.24	1.00	34.24
ANDEN ACCESO 2 OCRE	1.50	13.12	19.68	1.00	19.68
ANDEN ACCESO 3 OCRE	1.50	5.92	8.88	1.00	8.88
ANDEN ACCESO 4 OCRE	1.50	5.21	7.81	1.00	7.81
ANDEN ACCESO 5 OCRE	1.50	5.20	7.80	1.00	7.80
ANDEN ROTONDA POLIGONOS DE COLOR OCRE			2.29	8.00	18.33
PASAN: 199.91				SUBTOTAL	278.48
				TOTAL	478.39

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

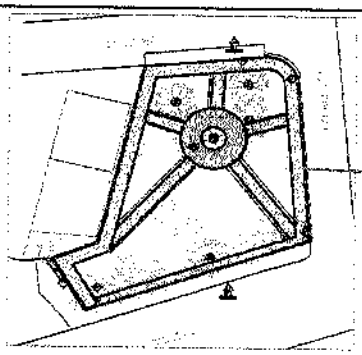

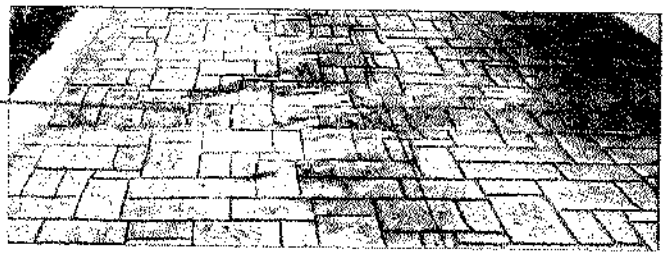

ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	Código: 1010-F-GCT-70 Versión:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	**2828 DE 2024**	**PROCESO N°**	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	ÍTEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA		

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
NP 7	CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR OCRE ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)	M2

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE RETIRO	**DIMENSIONES**				
	LONGITUD	**ANCHO**	**AREA**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
ANDEN CONEXIÓN CR 24A - MURO CONTRIMAPCTO	27.14	1.30	35.28	1.00	35.28
ANDEN RESPALDO MURO CONTRAIMPACTO	16.97	1.30	22.05	1.00	22.05
ANDEN CONEXIÓN CLL 24A - POLIDEPORTIVO	26.28	1.30	34.16	1.00	34.16
ANDEN JUNTO A ZONA VERDE ASTA BANDERA	15.32	1.30	19.92	1.00	19.92
ANDEN CONEXION CR 24 - POLIDEPORTIVO	26.68	1.30	34.69	1.00	34.69
ANDEN INTERNO JUNTO A SALON COMUNAL	72.55	3.27	237.29	1.00	237.29
ANDEN CONEXIÓN SALON COMUNAL POLIDEPORTIVO	22.66	1.30	29.45	1.00	29.45
ANDEN JUNTO A ALMACEN JAC	37.05	1.30	48.16	1.00	48.16
ANDEN CONEXIÓN ALMACEN - POLIDEPORTIVO	23.72	1.30	30.84	1.00	30.84
ANDEN CONXION 1 CLL 24 - POLIDEPORTIVO	41.49	1.30	53.94	1.00	53.94
ANDEN CONXION 2 CLL 24 - POLIDEPORTIVO	30.45	1.30	39.59	1.00	39.59
ANDEN JUNTO A ALMACEN CLL 24	35.06	2.82	101.58	1.00	101.58
CONEXIÓN CLL 24 - ALMACEN	6.54	1.58	10.35	1.00	10.35
PASAN: 478.39				**SUBTOTAL**	697.30
				TOTAL	1175.69

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

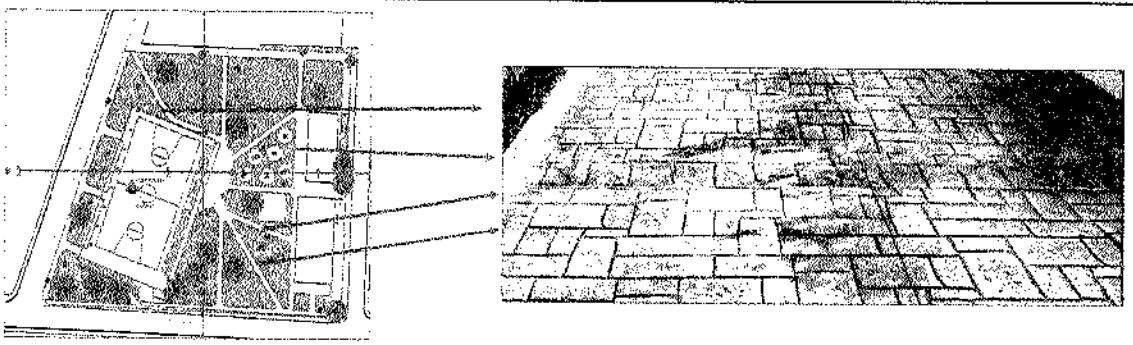

ELABORO

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISO

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBO

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Código: 1016-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		


ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 7	CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR OCRE ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)	M2

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE RETIRO	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
ANDEN JUNTO A ARBOL ESQUINA CR 24	10.06	2.41	24.35	1.00	24.35
ANDEN JUNTO A ARBOL ESQUINA CLL 24	2.91	1.84	5.34	1.00	5.34
ANDEN PERIMETRAL CLL 24	99.79	1.30	129.73	1.00	129.73
ANDEN PERIMETRAL CR 24A	85.20	1.30	110.76	1.00	110.76
PASAN: 1175.69				SUBTOTAL	270.18
				TOTAL	1445.87

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

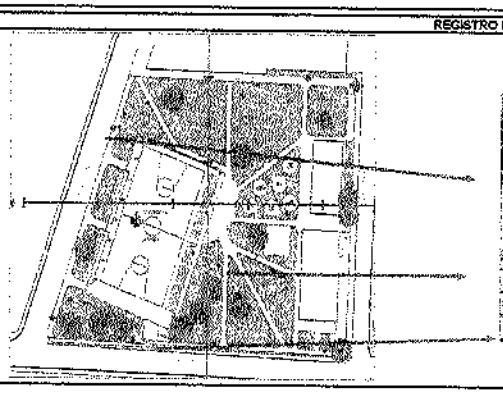

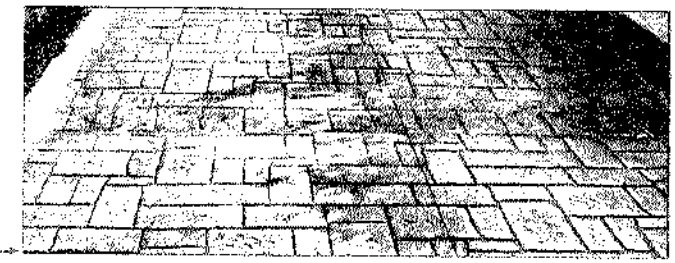

ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profecionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	2926 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA		

N° ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
NP 8	CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR AZUL ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)	M2

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE AZOTEA	DIMENSIONES				
	AREA	ESPESOR	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
GLORIETA INTERNA	38.49			1.00	38.49
PASAN:				SUBTOTAL	38.49
				TOTAL	38.49

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

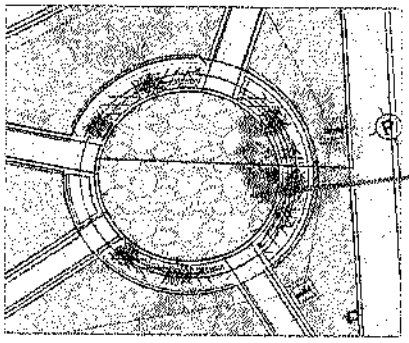

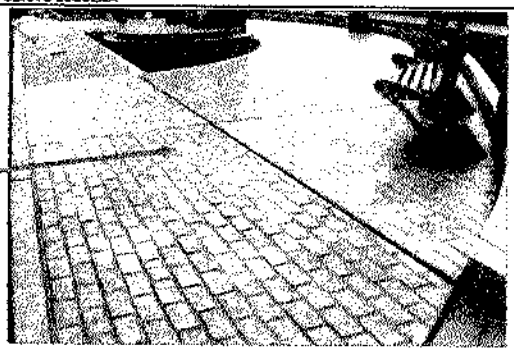

ELABORÓ	REVISO	APROBO
NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO	NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON	NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-79 Version:3 Fecha: 17/05/2024 Página 1


CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.065-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		


ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 8	CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR AZUL ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)	M2

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE VIRREY	DIMENSIONES				
	AREA	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
ANDÉN ROTONDA COLOR AZUL	54.00			1.00	54.00
DESCUENTO POLIGONOS COLOR OCRE	18.33			-1.00	-18.33
PASAN: 38.49					
				SUBTOTAL	35.67
				TOTAL	74.16

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

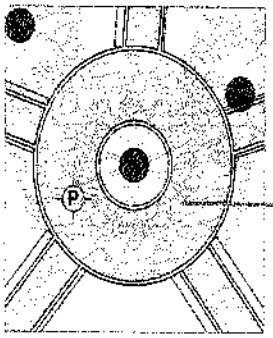

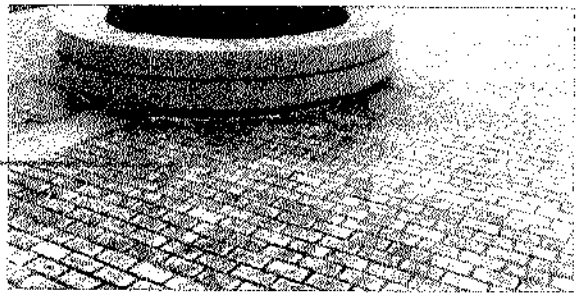

ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO

RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON

DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE

SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma segun la etapa del proceso contractual.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 8	CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR AZUL ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)	M2

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE RETIRO	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
ANDEN BAHIA CENTRAL			82.33	1.00	82.33
PASAN: 74.16				SUBTOTAL	82.33
				TOTAL	156.49

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

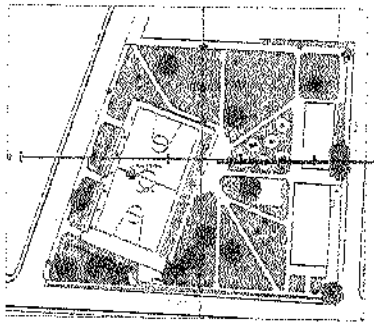

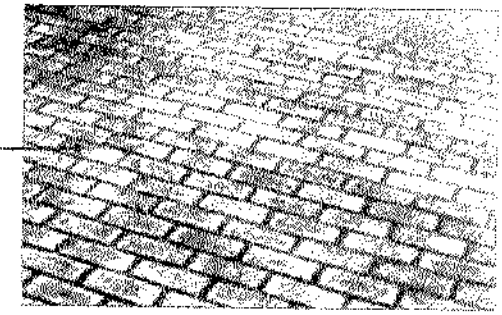

ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISO

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBO

NOMBRE: DIEGO FERNANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	2928 OE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.085-4 RA. JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 9	CAJA EN CONCRETO REF CON REJILLA .60*.30 P=.30 (MARCO < 11/2" 3/16")	UN

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE AZOTEA	DIMENSIONES				
	AREA	ESPESOR	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
REJILLA ZONA JUEGOS				1.00	1.00
REJILLA ZONA CENTRAL				1.00	1.00
PASAN:				SUBTOTAL	2.00
				TOTAL	2.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA O ESQUEMA

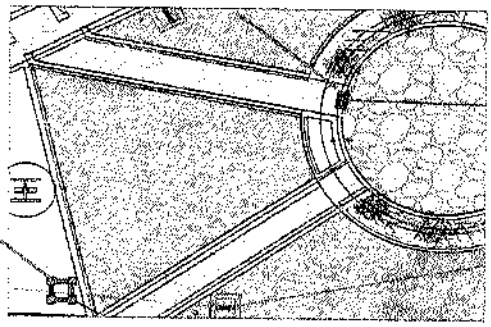



ELABORÓ	REVISÓ	APROBO
NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO	NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON	NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CALCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.692.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 9	CAJA EN CONCRETO REF CON REJILLA .60*.30 P=.30 (MARCO < 1 1/2" 3/16")	UN

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE MACARENA	DIMENSIONES				
	ANCHO	LONG	AREA	CANTIDAD	TOTAL
REJILLA ZONA JUEGOS				1.00	1.00
PASAN: 2.00					
				SUBTOTAL	1.00
				TOTAL	3.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

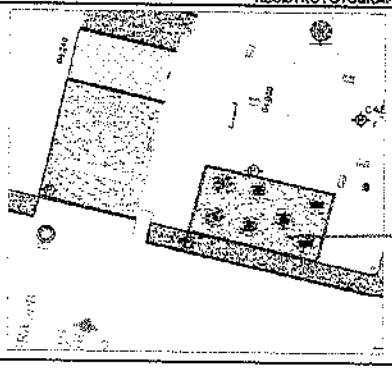



ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISO

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBO

NOMBRE: GREGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/08/2024 Página 1


CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 RA. JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		


ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 10	BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4" PVC	ML

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE AZOTEA	DIMENSIONES				
	AREA	LONGITUD	ESPESOR	CANTIDAD	TOTAL
DRENAJE ZONA JUEGOS		5.50		1.00	5.50
DRENAJE ROTONDA		9.97		1.00	9.97
PASAN:				SUBTOTAL	15.47
				TOTAL	15.47

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

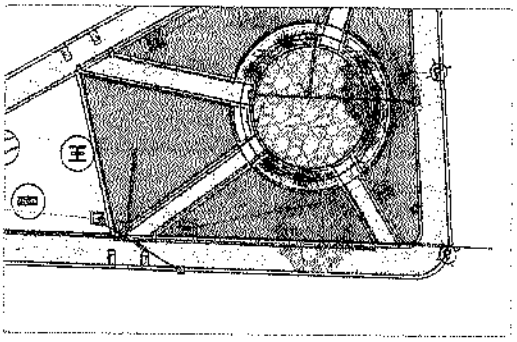

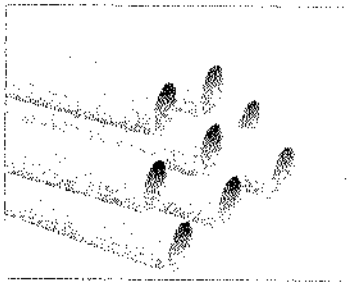

ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO

RESIDENTE DE OBRA

REVISO

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON

DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE

SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 11	RELLENO EN GRAVA 1 1/2"<D<2" EP 15 CM (INC ALISTAMIENTO DE TERRENO HACIA DRENAJE)	M2

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE AZOTEA	DIMENSIONES				
	AREA	ESPESOR	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
GRAVILLA PARA ZONA DE JUEGOS	52.21			1.00	52.21
DESCUENTOS BASE JUEGOS	3.14			-3.00	-9.42
DESCUENTO AREA CAJA REJILLA	0.49			-1.00	-0.49
PASAN:					
				SUBTOTAL	42.29
				TOTAL	42.29

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

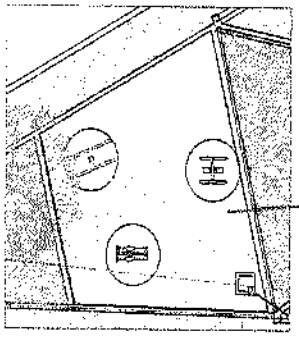



ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO

RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON

DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE

SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/05/2024 Página 1

CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA		
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
NP 11	RELLENO EN GRAVA 1 1/2"<D<2" EP 15 CM (INC ALISTAMIENTO DE TERRENO HACIA DRENAJE)		M2

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE RETIRO	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
GRAVILLA ZONA JUEGO EN ZONA 9	7,92	3,25	25,76	1,00	25,76
GRAVILLA ZONA BIOSALUDABLES EN ZONA 5	9,25	15,97	131,76	1,00	131,76
GRAVILLA ZONA 11	3,64	2,51	9,66	1,00	9,66
DESCUENTOS	3,14			-6,00	-18,85
PASAN: 42,29				SUBTOTAL	148,33
				TOTAL	190,62

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

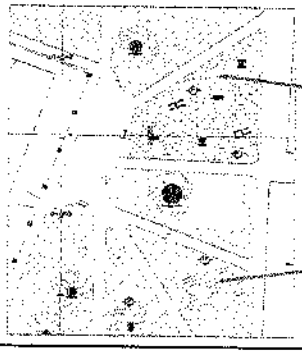



ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO

RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON

DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE

SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	2928 DE 2024	**PROCESO N°**	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		


ACTA:	**ACTA MODIFICATORIA No 01**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**ITEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA**		

N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
NP 11	RELLENO EN GRAVA 1 1/2"<D<2" EP 15 CM (INC ALISTAMIENTO DE TERRENO HACIA DRENAJE)	M2

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE MACARENA	**DIMENSIONES**				
	LONGITUD	**ANCHO**	**AREA**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
GRAVA PARA ZONA DE BIOSALUABLES	12.30	6.38	78.47	1.00	78.47
GRAVA ZONA JUEGOS INFANTILES	11.35	9.43	107.04	1.00	107.04
DESCUENTOS BASES CIRCULARES JUEGOS			3.14	-7.00	-21.99
			0.00		0.00
PASAN: 190.62				**SUBTOTAL**	163.52
				TOTAL	354.14

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESCUELA

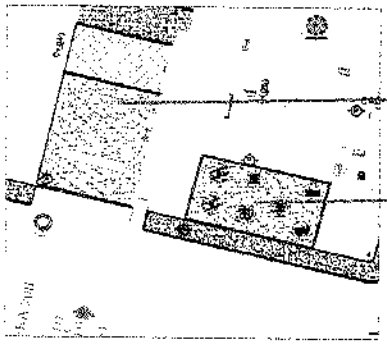

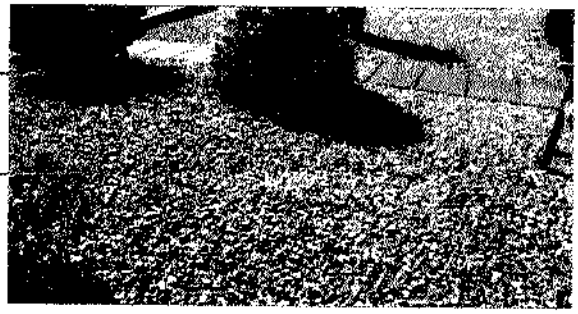

ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 12	LUMINARIA PARA PARQUE ENTRE 33-40 (W) 100000 H (SUMINISTRO E INSTALACION INC FOTOCELDA Y BRAZO)	UN

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE AZOTEA	DIMENSIONES				
	AREA	LONGITUD	PESO	CANTIDAD	TOTAL
LUMINARIA LED DE ALUMBRADO PUBLICO				5.00	5.00
PASAN:				SUBTOTAL	5.00
				TOTAL	5.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

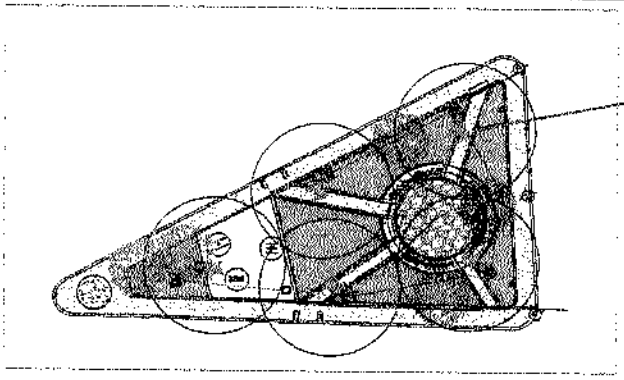



ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO

RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON

DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE

SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/08/2024 Página 1

CONTRATO N°	2826 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.882.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 12	LUMINARIA PARA PARQUE ENTRE 33-40 (W) 100000 H (SUMINISTRO E INSTALACION INC FOTOCELDA Y BRAZO)	UN

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE VIRREY	DIMENSIONES				
	AREA	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
LUMINARIA LED DE ALUMBRADO PUBLICO				7.00	7.00
PASAN: 5.00				SUBTOTAL	7.00
				TOTAL	12.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

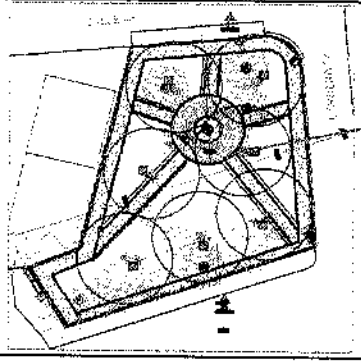



ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L. JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 13	POSTE 4 M METALCIO DIAM 3" CON CANSITILLAS Y ACABADO EN PINURA	UN

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE AZOTEA	DIMENSIONES				
	AREA	ESPESOR	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
POSTES DE LUMINARIA				5.00	5.00
PASAN:				SUBTOTAL	5.00
				TOTAL	5.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA O ESQUEMA

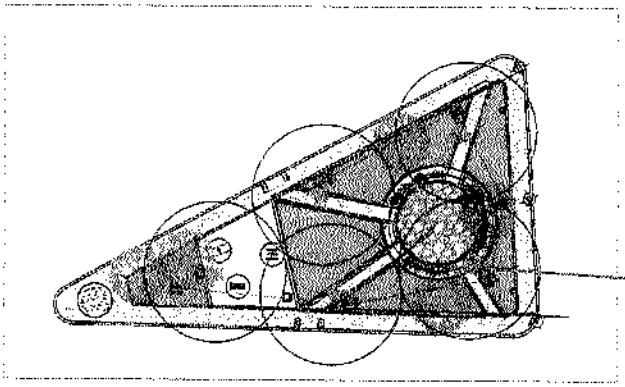



ELABORO

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISO

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBO

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONDEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA


Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Código: 1010-F-GCT-70 Versión:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA		
N° ITEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
NP 13	POSTE 4 M METALCIO DIAM 3" CON CANSITILLAS Y ACABADO EN PINURA		UN

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE VIRREY	DIMENSIONES				
	AREA	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
POSTES DE LUMINARIA				7.00	7.00
PASAN: 5.00					
				SUBTOTAL	7.00
				TOTAL	12.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

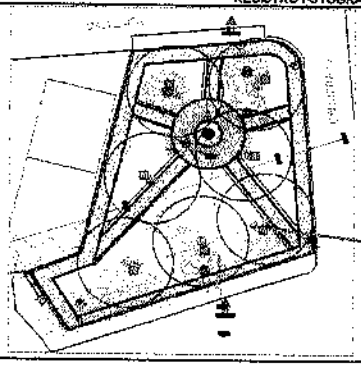



ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISO

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBO

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO **PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACION** **FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO**	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/09/2024 Página 1


CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	**ACTA MODIFICATORIA No 01**		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	**ITEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA**		

N° ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
NP 14	BASECIRCULAR PARA JUEGOS D:2.00 INC REFUERZO DOS DIRECIONES	UN

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE AZOTEA	**DIMENSIONES**				
	AREA	**ESPESOR**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
BASE DE REFUERZOS PARA JUEGOS				3.00	3.00
PASAN:				**SUBTOTAL**	3.00
				TOTAL	3.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA O ESQUEMA

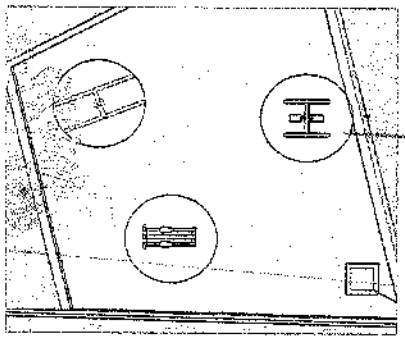

ELABORO

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	2929 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		


ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 14	BASECIRCULAR PARA JUEGOS D:2.00 INC REFUERZO DOS DIRECIONES	UN

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE RETIRO	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
BASE PARA JUEGO EXIS. BIOSALUDABLE BARRAS PARALELAS				1.00	1.00
BASE PARA JUEGO EXIS. BIOSALUDABLE SURF				1.00	1.00
BASE PARA JUEGO EXIS. BIOSALUDABLE ELIPTICA				1.00	1.00
BASE PARA JUEGO EXIS. BIOSALUDABLE PONY				1.00	1.00
BASE PARA JUEGO EXIS. BIOSALUDABLE VOLANTES				1.00	1.00
BASE PARA JUEGO EXIS. BIOSALUDABLE TWISTER				1.00	1.00
PASAN: 3.00				SUBTOTAL:	6.00
				TOTAL:	9.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

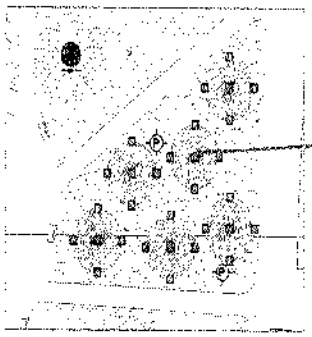

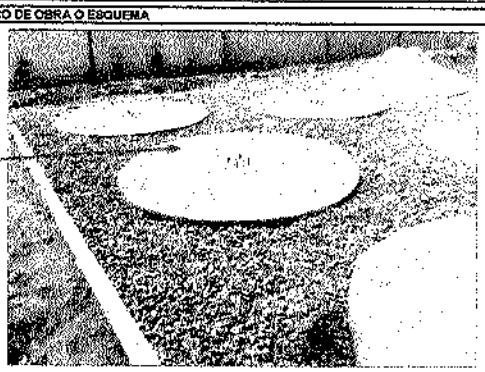

ELABORO

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Código: 1010-F-GCT-70 Versión:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	2020 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.065-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		


ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 14	BASECIRCULAR PARA JUEGOS D:2.00 INC REFUERZO DOS DIRECIONES	UN

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE MACARENA	DIMENSIONES				
	LONGITUD	ANCHO	AREA	CANTIDAD	TOTAL
BASE PARA JUEGO EXIS. BIOSALUDABLE BARRAS PARALELAS			0.00	1.00	1.00
BASE PARA JUEGO EXIS. BIOSALUDABLE SURF			0.00	1.00	1.00
BASE PARA JUEGO EXIS. BIOSALUDABLE ELIPTICA			0.00	1.00	1.00
BASE PARA JUEGO EXIS. BIOSALUDABLE PONY			0.00	1.00	1.00
BASE PARA JUEGO EXIS. BIOSALUDABLE VOLANTES				1.00	1.00
BASE PARA JUEGO EXIS. BIOSALUDABLE TWISTER				1.00	1.00
BASE PARA JUEGO EXIS. BIOSALUDABLE BRAZOS				1.00	1.00
PASAN: 9.00				SUBTOTAL	7.00
				TOTAL	16.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

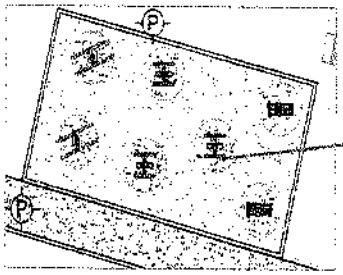

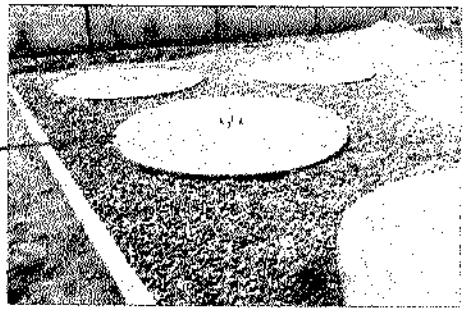

ELABORO

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CALCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	2926 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 15	SARDINEL 3000PSI B=0.2,b=0.15,H=0.40INC. EXC/RET	ML

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE AZOTEA	DIMENSIONES				
	AREA	LONGITUD	ESPESOR	CANTIDAD	TOTAL
BORDILLO INTERNO PERIMETRAL A ANDENES		90.25		1.00	90.25
BORD DERECHO ACCESO 1		7.51		1.00	7.51
BORD IZQUIERDO ACCESO 1		9.00		1.00	9.00
BORD DERECHO ACCESO 2		9.19		1.00	9.19
BORD IZQUIERDO ACCESO 2		7.86		1.00	7.86
BORD DERECHO ACCESO 3		8.43		1.00	8.43
BORD IZQUIERDO ACCESO 3		8.07		1.00	8.07
BORD DERECHO ACCESO 4		5.07		1.00	5.07
BORD IZQUIERDO ACCESO 4		5.39		1.00	5.39
PASAN:				SUBTOTAL	150.77
				TOTAL	150.77

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

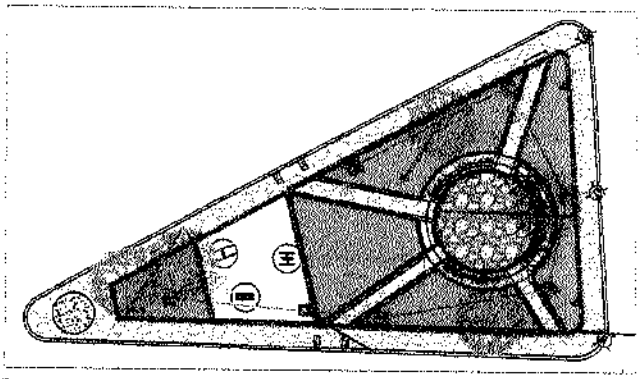

ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBO

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 15	SARDINEL 3000PSI B=0.2,b=0.15,H=0.40INC. EXC/RET	ML

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE VIRREY	DIMENSIONES				
	AREA	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
BORDILLO INTERNO PERIMETRAL			110.69	1.00	110.69
BORDILLO ZONA VERDE 1			10.47	1.00	10.47
BORDILLO ZONA VERDE 2			11.62	1.00	11.62
BORDILLO ZONA VERDE 3			16.44	1.00	16.44
BORDILLO ZONA VERDE 4			31.66	1.00	31.66
BORDILLO ZONA VERDE 6			19.63	1.00	19.63
BORDILLO EXTERIOR ROTONDA			28.27	1.00	28.27
BORDILLO INTERIOR ROTONDA			8.04	1.00	8.04
PASAN: 150.77					
				SUBTOTAL	238.92
				TOTAL	389.59

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

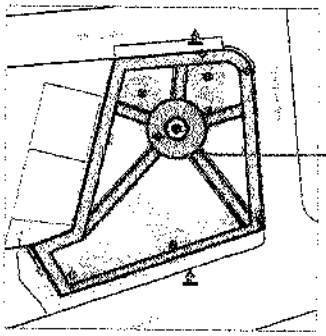



ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISO

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA		

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 15	SARDINEL 3000PSI B=0.2,b=0.15,H=0.40INC. EXC/RET	ML

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE RETIRO	DIMENSIONES				
	AREA	ESPESOR	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
BORDILLO INTERNO ZONA 1			59.95	1.00	59.95
BORDILLO INTERNO ZONA 2			73.38	1.00	73.38
BORDILLO INTERNO ZONA 3			74.59	1.00	74.59
BORDILLO INTERNO ZONA 4			41.76	1.00	41.76
BORDILLO INTERNO ZONA 5			58.45	1.00	58.45
BORDILLO INTERNO ZONA 6			50.15	1.00	50.15
BORDILLO INTERNO ZONA 7			63.93	1.00	63.93
BORDILLO INTERNO ZONA 8			60.86	1.00	60.86
BORDILLO INTERNO ZONA 9			28.49	1.00	28.49
BORDILLO INTERNO ZONA 10			15.88	1.00	15.88
BORDILLO INTERNO ZONA 11			12.71	1.00	12.71
BORDELLO INTERNO ZONA 12			79.86	1.00	79.86
BORDILLO INTERNO ZONA 13			31.06	1.00	31.06
BORDILLO INTERNO ZONA 14			31.59	1.00	31.59
PASAN: 389.59				SUBTOTAL	682.66
				TOTAL	1072.25

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

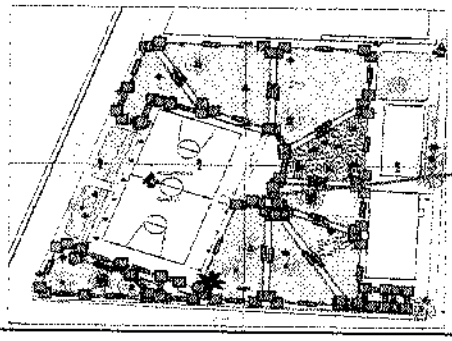



ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	2828 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACION ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.055-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 15	SARDINEL 3000PSI B=0.2,b=0.15,H=0.40INC. EXC/RET	ML

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE MACARENA	DIMENSIONES				
	AREA	ESPESOR	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
BORDILLO ZONA DE BIOSALUDABLES			37.36	1.00	37.36
BORDILLO DELIMITANTE ZONA DE JEUGOS Y ZONA VERDE POLID.			9.44	1.00	9.44
BORDILLO DELIMITANTE ZONA VERDE Y SENDERO DE ACC. A POLIDEP.			9.47	1.00	9.47
PASAN: 1072.25				SUBTOTAL	56.27
				TOTAL	1128.52

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

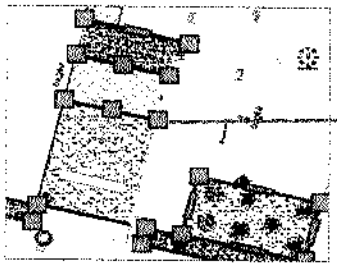



ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.692.095-4 R/L. JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 16	PLACA CONTRAPISO e = 12 cm (24.13Mpa, 3500psi)	M2

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE RETIRO	DIMENSIONES				
	ANCHO	LONGITUD	AREA	CANTIDAD	TOTAL
ANDEN ACCESO CLL 24 A POLIDEPORTIVO	1.30	3.87	5.03	1.00	5.03
CONEXIÓN ANDEN RESPALDO GRADAS CON NUEVO ACCESO	1.17	2.06	2.42	1.00	2.42
PASAN:				SUBTOTAL	7.45
				TOTAL	7.45

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

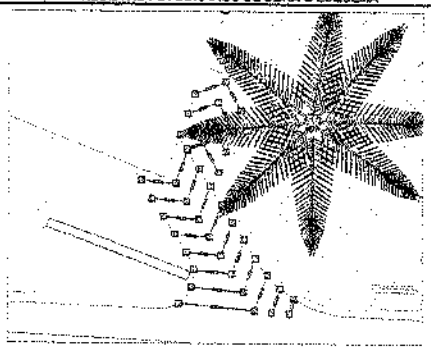

ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Pagina 1


CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORIA:	N/A		
ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 17	SUMINISTRO E INSTALACION CANECA M-121	UN

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE AZOTEA	DIMENSIONES				
	AREA	ESPESOR	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
CANECAS DE ACERO INOXIDABLE				2.00	2.00
PASAN:				SUBTOTAL	2.00
				TOTAL	2.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

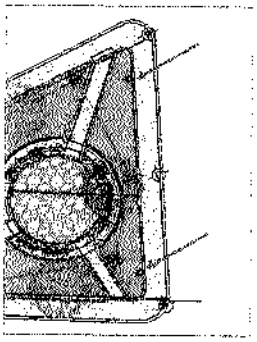

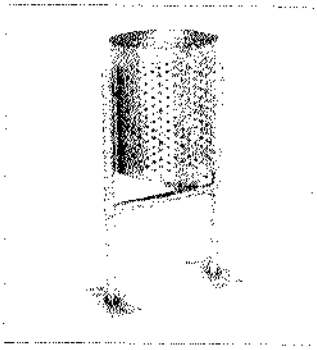

ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/05/2024 Página 1


CONTRATO N°	2929 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN OANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 17	SUMINISTRO E INSTALACION CANECA M-121	UN

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE VIRREY	DIMENSIONES				
	AREA	ESPESOR	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
CANECAS DE ACERO INOXIDABLE				1.00	1.00
PASAN: 2.00				SUBTOTAL	1.00
				TOTAL	3.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA O ESQUEMA

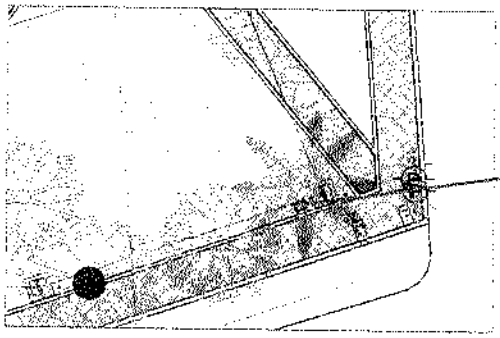



ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISO

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZÓN
DIRECTOR DE OBRA

APROBO

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA


Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-P-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1

CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA		
N° ITEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD
NP 18	PUESTA A TIERRA MASTIL LUMINARIA		UN

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE AZOTEA	DIMENSIONES				
	AREA	ESPESOR	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
PUESTA A TIERRA LUMINARIA (CENTRAL)				1.00	1.00
PUESTA A TIERRA LUMINARIAS DE TERMINACION RED (FIN)				2.00	2.00
PASAN:				SUBTOTAL	3.00
				TOTAL	3.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

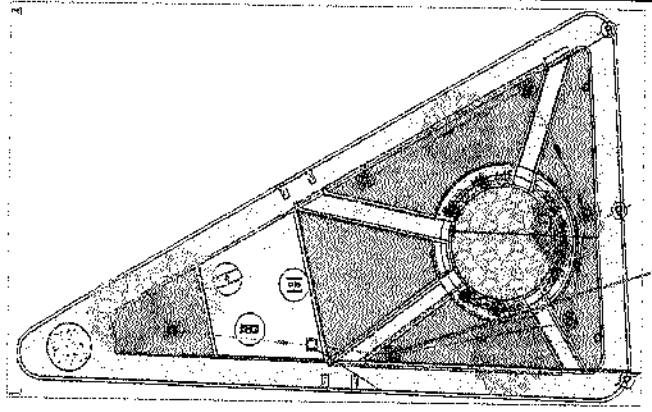

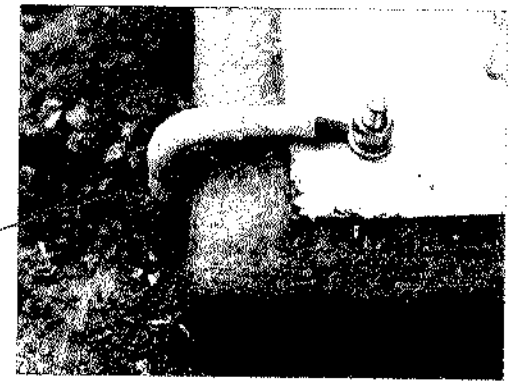

ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Pagina 1


CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA		
N° ITEM	DESCRIPCION		UNIDAD
NP 16	PUESTA A TIERRA MASTIL LUMINARIA		UN

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE VIRREY	DIMENSIONES				
	AREA	ESPESOR	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
PUESTA A TIERRA LUMINARIA CONECTADA A DERIVACION (INICIO)				1.00	1.00
PUESTA A TIERRA LUMIARIA EN MEDIO DE LA RED (MITAD)				1.00	1.00
PUESTA A TIERRA LUMINARIA FINALIZACION DE LA RED (FIN)				1.00	1.00
PASAN: 3.00					
				SUBTOTAL	3.00
				TOTAL	6.00

REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA O ESQUEMA

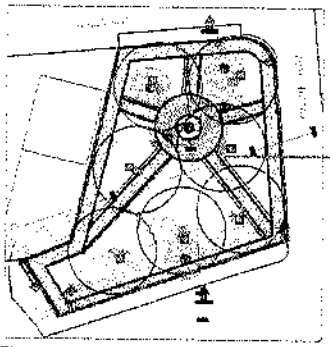

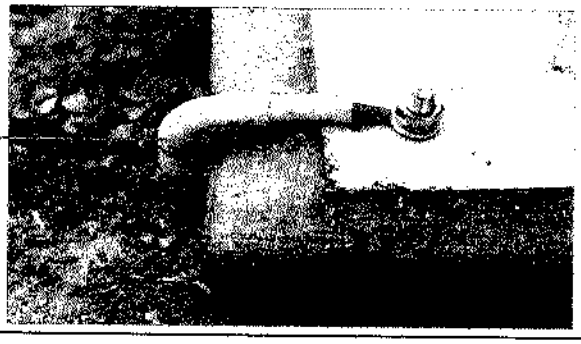

ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Código: 1010-F-GCT-70 Versión:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACION DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 19	DESMONTE Y MONTAJE DE JUEGO DE NIÑOS EXISTENTE (INC. ADECUACION TUB MET. DADOS EN CONCRETO PARA CIMENTACION, SOLDADURAS, ANTICORROSIVO Y PINTURAS)	UN

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE RETIRO	DIMENSIONES				
	ANCHO	LONGITUD	AREA	CANTIDAD	TOTAL
JUEGO RESBALADOR EXISTENTE ADECUACION				1.00	1.00
PASAN:				SUBTOTAL	1.00
				TOTAL	1.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA

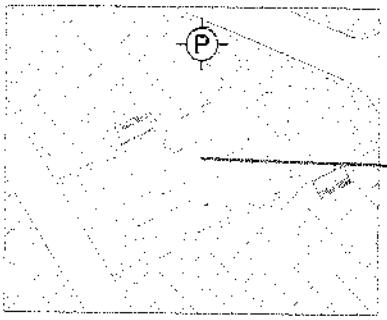



ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO	NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON	NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.


	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO	Codigo: 1010-F-GCT-70 Version:3 Fecha: 17/06/2024 Página 1


CONTRATO N°	2928 DE 2024	PROCESO N°	SAMC-013-2024
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	15/04/2025
OBJETO :	REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
CONTRATISTA :	CONSORCIO ALSIPA NIT: 901.892.095-4 R/L JOHN DANI NAGLES PACHON		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		
ACTA:	ACTA MODIFICATORIA No 01		
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	N/A		
CANTIDAD EJECUTADA	N/A	CANTIDAD ACUMULADA	N/A
CAPITULO:	ITEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA		

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 19	DESMONTE Y MONTAJE DE JUEGO DE NIÑOS EXISTENTE (INC. ADECUACION TUB MET, DADOS EN COCNRETO PARA CIMENTACION, SOLDADURAS, ANTICORROSIVO Y PINTURAS)	UN

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EN PARQUE MACARENA	DIMENSIONES				
	ANCHO	LONGITUD	AREA	CANTIDAD	TOTAL
JUEGO INFANTIL DE RESBALADORES Y COLUMPIO				2.00	2.00
PASAN: 1.00				SUBTOTAL	2.00
				TOTAL	3.00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA O ESQUEMA



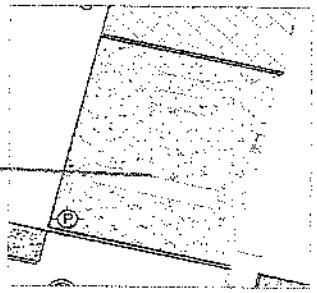



ELABORÓ

NOMBRE: CLARA ALICIA RODRIGUEZ GUERRERO
RESIDENTE DE OBRA

REVISÓ

NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
DIRECTOR DE OBRA

APROBÓ

NOMBRE: DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR DE OBRA

Nota: se debe disponer de los profesionales responsables de firma según la etapa del proceso contractual.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

NIT: 901.892.095-4

REPROGRAMACIÓN DE OBRA AJUSTADA

CR 24 A 8 125 CONJ CERRADO LA CABAÑA CA 1 IN 9. VILLAVICECNIO-META
SHARKYING10@GMAIL.COM-3222169909

CRONOGRAMA DE TRABAJO OBRAS FALTANTES (AJUS. . PRORROGA SOLICITADA)

CONTRATO No :	**2928 DE 2024**
OBJETO:	**REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO ALSIPA R/L JOHN DANI NAGLES PACHON**
SUPERVISOR:	**ARQ. DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE**

ACTIVIDADES CONTRACTUALES Y PENDIENTES DE TRAMITE DE LEGALIZACION			CANT TOTALES	CANT EJEC.	CANT POR EJEC	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS SEGIN PRORROGA EN SOLICITUD							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND				15-abr	22-abr	29-abr	6-may	13-may	20-may	27-may	30-may
1	PRELIMINARES												
1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2	4,693.53	4,693.53	-								
1.2	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	218.62	218.62	-								
1.3	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS,SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	-	-	-								
2	EXCAVACIÓN												
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	284.23	284.23	-								
3	BASES Y RELLENOS												
3.1	RELLENO CON MATERIAL MIXTODERIO SINPROCESAR TAMAÑO MAX 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	279.07	209.30	69.77								
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA NEGRA	M3	90.38	22.60	67.78								
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA TRENZA	M2	1,221.16	305.29	915.87								
4	ANDENES, SARDINELES, BORDILLOS, ADOQUINES												
4.1	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-8060X35X20CM. NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	366.37	366.37	-								
4.2	MALLA ELECTROSOLDADA fy= 5000 kg/cm2 500 Mpa	KG	3,012.79	1,657.03	1,355.76								
4.3	PLACA CONTRAPISO e=10 cm f'20.7 Mpa, 3000 psi) concreto estampado - color	M2	-	-	-								
5	INSTALACIONES ELECTRICAS												
5.1	LUMINARIA: MECANO V TEMPERTATURA DE COLOR: 4000 K POTENCIA: 33W CON BASE PARA FOTOCELDA IRC 70 ÓPTICA: R07	UNID	-	-	-								
5.2	MASTIL METÁLICO GALVANIZADO DE 6M, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UNID	-	-	-								
5.3	ESTRUCTURA LA321	UNID	2.00	1.00	1.00								
5.4	ESTRUCTURA CS400	UNID	2.00	1.00	1.00								
5.5	ACOMETIDA PARCIAL 2 No8+ 1No.8 AL	ML	139.11	34.78	104.33								
5.6	ACOMETIDA PARCIAL 2 No8+ 1No.8 CU THHN	ML	139.11	34.78	104.33								
5.7	CANALIZACION PVC 2X1" PARA AP	ML	-	-	-								
5.8	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	-	-	-								
5.9	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UNID	14.00	3.50	10.50								
6	MOBILIARIO URBANO												
6.1	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO ELIPTICA (ESQUI DE FONDO). SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	1.00	-								
6.2	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO SURF, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	1.00	-								
6.3	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO BARRAS PARALELAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	1.00	-								
6.4	MANTE Y REPA JUEGO BIOSALUDABLES EXIST	UN	13.00	13.00	-								
6.5	CANECA EN MALLA METÁLICA TIPO M120 SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	UN	-	-	-								
6.6	SUM E INST. COLUM SW THREE, INCL. LOCALIZ Y EXC.	UN	-	-	-								
6.7	PISO DUROPISO BLANCO 33.9X33.9 E.T. COMERCIAL	M2	-	-	-								
	ITEMS NO PREVISTOS PRESENTE ACTA				-								
NP 1	DESMONTE DE MASTILES EXISTENTES (INC. DEMOLICION BASE Y CARGUE DE MATERIALES, Y SUSP RED CABLEADO EXIS)	UN	30.00	30.00	-								
NP 2	BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR TIPO M31, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	50.00	32.50	17.50								
NP 3	DESMONTE DE BANCA incl retiro	UN	41.00	41.00	-								
NP 4	DESMONTE DE CANECAS EXISTENTES (INC. DEMOLICION DE BASE EXISTENTE Y CARGUE DE MATERIALES)	UN	2.00	2.00	-								
NP 5	LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	M2	297.36	-	297.36								
NP 6	MURO CONFINAMIENTO ACABADO LISO 0.60<H<0.45 A=0.20 EN CONCRETO REF 3000 PSI	ML	73.00	73.00	-								
NP 7	CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR OCRE ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)	M2	1,445.87	606.05	839.82								
NP 8	CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR AZUL ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)	M2	156.49	101.72	54.77								
NP 9	CAJA EN CONCRETO REF CON REJILLA .60*.30 P= 30 (MARCO < 1 1/2" 3/16")	UN	3.00	3.00	-								
NP 10	BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4" Pvc	ML	15.47	15.47	-								
NP 11	RELLENO EN GRAVA 1 1/2"<D<2" EP 15 CM (INC ALISTAMIENTO DE TERRENO HACIA ORIENTE)	M2	354.14	177.07	177.07								
NP 12	LUMINARIA PARA PARQUE ESTRIE 36-60 (W) 100/90 H (SUMINISTRO E INSTALACION INC FOTOCELDA Y BRAZO)	UN	12.00	6.00	6.00								
NP 13	POSTE 4 M METALCO DIAM 3" CON CANSITILLAS Y ACABADO EN PINURA	UN	12.00	6.00	6.00								
NP 14	BASECIRCULAR PARA JUEGOS Ø 2.00 INC REFUERZO DOS DIRECCIONES	UN	16.00	5.60	10.40								
NP 15	SARDINEL 3000PSI E=0.25+0.15 H=0.40INC. EXCIRET	ML	1,128.00	733.64	394.36								
NP 16	PLACA CONTRAPISO e = 12 cm (24.13Mpa, 3500psi)	M2	7.45	-	7.45								
NP 17	SUMINISTRO E INSTALACION CANECA M-121	UN	3.00	2.00	1.00								
NP 18	PUESTA A TIERRA MASTIL LUMINARIA	UN	6.00	3.00	3.00								
NP 19	DESMONTE Y MONTAJE DE JUEGO DE TUBOS EXISTENTE (INC. ADECUACIÓN TUB MET, DADOS EN CONCRETO PARA CIMENTACIÓN, SOLDADURAS, ANTICORROSIVO Y PINTURAS)	UN	3.00	3.00	-								
	PORCENTAJES		100%	61.48%	38.52%								

JOHN DANI NAGLES PACHON
CONSORCIO ALSIPA

FRANCISCO CONTRERAS GARZON - D.O.

Director obras civiles

NIT: 901.892.095-4

LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS – PLANIMETRÍA

CR 24 A 8 125 CONJ CERRADO LA CABAÑA CA 1 IN 9. VILLAVICECNIO-META
SHARKYING10@GMAIL.COM-3222169909
