REPÚBLICA DE COLOMBIA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 5.

Consorcio Inter Eco

INFORME MENSUAL N° 7

PERÍODO:

01 AL 29 DE ABRIL DE 2025

Contrato de Interventoría N°: 3697 de 2024.

CONVENIO 2139 DE 2024
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE LA TROJA DEL MUNICIPIO DE BARAYA, DEL DEPARTAMENTO DE HUILA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Contenido

INTRODUCCIÓN ***3***

INFORMACION CONVENIOS ***5***

1. CONVENIO SOLIDARIO NO. 2139 DE 2024, JAC VEREDA LA TROJA **5**

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5

1.1.1 Localización 5

1.1.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de laejecución del proyecto 6

1.1.3 Inventario y estado inicial de la vía 6

1.1.4 Características técnicas del proyecto 6

1.2 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 7

1.2.1 Información general del contrato 7

1.2.2 Descripción de las actividades 8

Etapa obras de mejoramiento 8

1.2.3 Seguimiento Ítems no previstos 8

1.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de laInterventoría 8

1.3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 9

1.3.1 Informe semanal 9

1.3.2 Maquinaria y equipo contrato de obra 9

1.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contratode obra 9

1.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra 9

1.3.5 Estado general del tiempo 9

1.3.6 Resumen ensayos de laboratorio 9

1.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra 10

1.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra 10

1.3.9 Otros documentos seguimiento mensual 11

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA **11**

2.1 Información general del contrato 11

2.1.1 Descripción de las actividades realizadas por el interventor 12

2.1.2 Informes Especialistas y Profesionales 12

2.1.3 Componente ambiental 13

Zona Norte 13

Zona Sur 13

2.1.4 Componente Social 16

Zona Norte 17

Zona Sur 17

2.1.5 Componente SST 19

2.2 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 22

2.2.1 Equipo y vehículos contrato de Interventoría 22

2.2.2 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de Interventoría 22

2.2.3 Información financiera y presupuestal contrato de Interventoría 23

2.2.4 Seguimiento garantías contrato de Interventoría 23

2.2.5 Otros documentos seguimiento mensual 24

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES **24**

4. ANEXOS **28**

4.1 Relación de correspondencia 28

4.2 Registro Fotográfico 44

4.3 Bitácora 44

4.4 Formatos Interventorías Convenios Solidarios 44

INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Vías -INVIAS- es una entidad del orden nacional, adscrita al Ministerio de Transporte, encargada de ejecutar políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de infraestructura no concesionada de la red vial nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial, marítima y sus infraestructuras conexas o relacionadas, de acuerdo con los lineamientos dados por el Gobierno Nacional, para solucionar necesidades de conectividad, transitabilidad y movilidad de los usuarios, con tecnología sostenible y un talento humano calificado, íntegro, visionario y comprometido, contribuyendo a la competitividad y modernización de la infraestructura del país.

El propósito del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 “Colombia, Potencia Mundial de la Vida”, se profundiza en la comprensión desde el territorio sobre las dinámicas económicas, sociales y culturales, donde se pone en primer plano la interacción entre el campo y la ciudad. Gracias a los diálogos regionales, los objetivos del PND se han definido de manera colectiva, respetando las diversidades territoriales, étnicas y culturales.

Que en el documento bases del Plan Nacional de Desarrollo, numeral 5. Convergencia Regional: se destaca como objetivo la construcción y mejoramiento de vías regionales que generen interconexión para el intercambio de productos agrícolas.

Que con el fin de atender las necesidades de servicio y cumplir con la eficiencia los objetivos del Gobierno Nacional, el Instituto Nacional de Vías – INVIAS - estructuró el programa denominado *“**CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL**”* a través del cual se atenderá la red vial regional a cargo de la Nación, departamentos y municipios. A través de este programa, se pretender intervenir 33.102 km con la finalidad de mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución en el que las obras de baja complejidad sean construidas por los Organismos de Acción Comunal a través de la celebración de convenios solidarios.

Por tal razón, el Instituto Nacional de Vías suscribió los siguientes Convenios Solidarios con los Organismos de Acción Comunal del Departamento del Huila:

MUNICIPIO	NOMBRE ORGANIZACIÓN- VEREDA	N° CONVENIO
COLOMBIA	JUNTA DE ACCION COMUNAL VERSALLES	2708-2024
	JUNTA DE ACCION COMUNAL HORIZONTE	2190-2024
	JUNTA DE ACCION COMUNAL SANTANA	2752-2024
	JUNTA DE ACCION COMUNAL PARAISO	2269-2024
	JUNTA DE ACCION COMUNAL ESPERANZA	2433-2024
	JUNTA DE ACCION COMUNAL LA UNION	2138-2024

MUNICIPIO	NOMBRE ORGANIZACIÓN- VEREDA	N° CONVENIO
	JUNTA DE ACCION COMUNAL ANTILLAS	2151-2024
BARAYA	JUNTA DE ACCION COMUNAL LA TROJA	2139-2024
	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL HOTEL	2150-2024
	JUNTA DE ACCION COMUNAL LA SIRIA	2110-2024
	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL PROGRESO	2423-2024
	JUNTA DE ACCION COMUNAL LA PARADA	2105-2024
AIPE	JUNTA DE ACCION COMUNAL CALLE REAL	3609-2024
	JUNTA DE ACCION COMUNAL PRAGA	3768-2024
HOBO	JUNTA DE ACCION COMUNAL AGUA FRIA	2060-2024
	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL BATAN	2108-2024
TELLO	JUNTA DE ACCION COMUNAL PUERTA DEL SOL	2318-2024
ALGECIRAS	JUNTA DE ACCION COMUNAL PARAISO PUEBLO VIEJO	2234-2024
	JUNTA DE ACCION COMUNAL COLON	2692-2024
	JUNTA DE ACCION COMUNAL NARANJOS BAJOS	2130-2024
ISNOS	JUNTA DE ACCION COMUNAL SALTOS DE BORDONES	2087-2024
	JUNTA DE ACCION COMUNAL SINAI	2170-2024
	JUNTA DE ACCION COMUNAL LA MURALLLA	2084-2024
ACEVEDO	JUNTA DE ACCION COMUNAL LA PRIMAVERA	2788-2024
	JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN JOSE DE RIECITO	2639-2024
	JUNTA DE ACCION COMUNAL VERSALLES	2338-2024
SALADOBLANCO	JUNTA DE ACCION COMUNAL MORELIA	2109-2024
	JUNTA DE ACCION COMUNAL LA CABAÑA	2280-2024
GARZÓN	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL MESÓN	2063-2024
AGRADO	JUNTA DE ACCION COMUNAL LA GALDA	3776-2024
	JUNTA DE ACCION COMUNAL LA CAÑADA	4020-2024
LA PLATA	JUNTA DE ACCION COMUNAL GALLEGO	2799-2024

MUNICIPIO	NOMBRE ORGANIZACIÓN- VEREDA	N° CONVENIO
NÁTAGA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL YARUMAL	2064-2024
	JUNTA DE ACCIÓN COMUNA CASCAJOSA	2111-2024

Dado lo anterior, el INVIAS mediante proceso CMA-DEO-SVR-CCPT-047-2024 efectuó el contrato No. 3697 de 2023 con orden de inicio 2024S-VBOG-071700 para realizar la interventoría a los convenios solidarios anteriormente mencionados, con el objeto "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 5.

Para lo anterior, el INVIAS designó como Supervisor del contrato de interventoría al ing. José Miguel Ortega Ortiz.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenidode la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con laconstrucción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

El presente informe parcial contempla las actividades realizadas en cada uno de los convenios en el periodo entre el 01 de abril de 2025 hasta el 29 de abril de 2025.

INFORMACION CONVENIOS

1. CONVENIO SOLIDARIO NO. 2139 DE 2024, JAC VEREDA LA TROJA

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1.1 Localización

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Baraya del departamento de Huila en la vereda La Troja, en el corredor vial denominado Hotel – La Troja con una longitud de atención de 200 Mts, tiene punto de inicio en el PR 00+000 Segundo cruce a mano derecha desde la vía que de Baraya conduce a la vereda Tutumito y como punto de referencia final el PR 00+200 a partir del punto de inicio de referencia y en dirección a la vereda la Troja, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la dirección territorial Huila del Instituto Nacional de Vías.

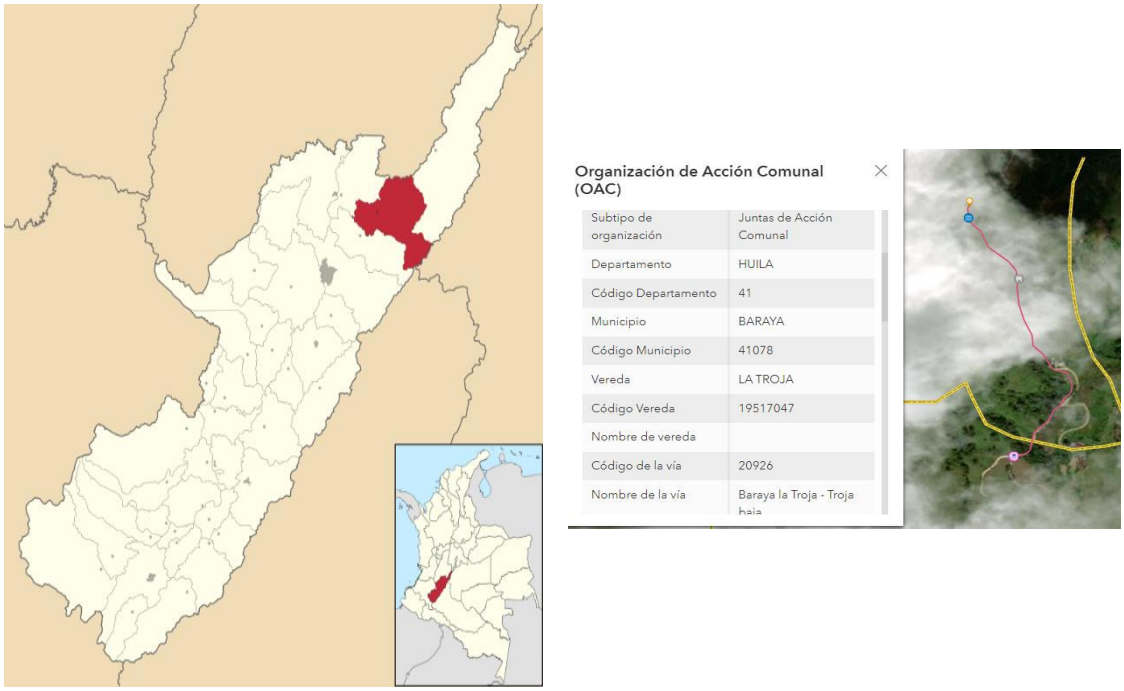


Ilustración 8. Localización General Municipio de Baraya – Vereda La Troja Sitio de obra del Convenio 2139 de 2024

1.1.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de laejecución del proyecto

Con la ejecución del proyecto, la población de las Veredas ubicadas en la zona de influencia y que se verán beneficiadas por el mejoramiento del corredor vial son Begonia, Totumito, San Pablo, Manzanares, Miaramar, Montellano y San Juan, Veredas productoras y comercializadoras de café, productos agrícolas, lo cual permite mejorar las condiciones de conectividad en materia de transporte, principalmente al Municipio de Baraya.

1.1.3 Inventario y estado inicial de la vía

El tramo por intervenir corresponde a 138 m de material de afirmado en regular estado, puesto que no tiene una adecuada conformación de cunetas y la falta de material que permita tener una superficie homogénea, ya que a lo largo del corredor existe presencia de baches.

	
Foto 7. Estado inicial de la vía Vereda La Troja	**Foto 8. Estado inicial de la vía Vereda La Troja**

1.1.4 Características técnicas del proyecto

Las actividades u obras a ejecutar consisten en el mejoramiento vial mediante la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o pavimento convencional y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

Para la focalización o selección de actividades a ejecutar, se tuvo en cuenta el levantamiento de la información realizada por los profesionales de la Dirección Territorial Huila, permitiendo priorizar las necesidades básicas de la comunidad para mejorar las condiciones la transitabilidad en el tramo de área de influencia del Organismo de Acción Comunal de la vereda La Troja las cuales se relacionan a continuación:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SECTOR DE INTERVENCIÓN	UBICACIÓN	OBRA PREVISTA DE MEJORAMIENTO	
				PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLAS (UND)
Huila	Baraya	Hotel – La Troja	PR 00+000 PR 00+138	138	-
Huila	Baraya	Hotel – La Troja	PR 00+200	-	1
TOTAL DE INTERVENCIÓN				**138**	**1**

El proyecto contempla las siguientes características técnicas:

LOCALIZACIÓN EN EL PROYECTO	ESTRUCTURA / COMPONENTE	CARACTERISTICAS
VEREDA LA TROJA – MUNICIPIO DE BARAYA	Construcción de Placa Huella	• Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) – Placa, VR, Cuneta y Bordillos • Concreto Ciclópeo (Concreto Clase D f'c = 21 Mpa 60% concreto – 40% agregado ciclópeo) • Subbase Granular Clase C • Espesor de Subbase Granular = 0,15 m • Longitud de Placa Huella = 138 m • Longitud Huella = 3,0 m • Ancho de Placa Huella = 5,0 m • Espesor de Placa Huella = 0,15 m • Longitud Viga Riostra = 5,0 m • Ancho de Viga Riostra = 0,20 m • Alto de Viga Riostra = 0,25 m • Sobreancho Promedio Ciclopeo = 0,90 m • Longitud de Cuneta = 276 m • Ancho de Cuneta = 0,55 m • Espesor de Cuneta = 0,15 m • Longitud de Bordillo = 276 m • Ancho de Bordillo = 0,15 m • Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa
	Construcción de alcantarillas	• Cantidad de Alcantarillas = 1 Und • Longitud de Alcantarilla = 5,0 m • Concreto reforzado de resistencia 21 Mpa – Mezcla in situ • Concreto reforzado de resistencia 14 Mpa – Mezcla in situ • Tubería de concreto Ø = 36"= 5 Und • Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa

1.2 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

1.2.1 Información general del contrato

CONVENIO SOLIDARIO	2139 DE 2024
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE LA TROJA DEL MUNICIPIO DE BARAYA, DEL DEPARTAMENTO DE HUILA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TROJA DEL MUNICIPIO DE BARAYA, DEL DEPARTAMENTO DE HUILA
RUT	891.102.335-3
VALOR INICIAL	$201.320.555
VALOR ADICIONAL	$ 0.00
VALOR TOTAL	$201.320.555
ORDEN DE INICIO	02/09/2024
PLAZO INICIAL	31/12/2024
PRÓRROGA N°1	31/03/2025

1.2.2 Descripción de las actividades

Etapa obras de mejoramiento

- Mediante oficio 211-1-915 de fecha 21 de abril de 2025, la Interventoría remite al Ing. JOSÉ MIGUEL ORTEGA ORTIZ – Supervisor Contrato de Interventoría INVIAS, soporte de los traslados vía sebra de los rendimientos financieros generados en la cuenta corriente del Banco Agrario de Colombia donde se manejan los recursos del convenio 2139-2024 con la JAC de la Vereda La Troja, correspondiente al mes de febrero de 2025.
- En total se construyeron 103.9 metros de pavimento rígido y 1 alcantarilla.
- El convenio se encuentra en proceso de liquidación
- El porcentaje total de avance ejecutado del proyecto fue de 100%.

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO MES	VALOR ACUMULADO	SALDO
BASICO DE OBRA	$ 155,911,165.00	N/A	$ 116,850,936.83	$ 155,911,165.63	$ 0.00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4,548,682.00	N/A	$ 3,884,148.00	$ 3,884,148.00	$ 664,534.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 39,860,707.00	N/A	$ 11,912,243.00	$ 20,956,069.00	$ 18,904,638.00

1.2.3 Seguimiento Ítems no previstos

A la fecha no se ha requerido la creación de ítems no previstos al presupuesto.

1.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de laInterventoría

Mediante oficio 211-1-915 de fecha 21 de abril de 2025, la Interventoría remite al Ing. JOSÉ MIGUEL ORTEGA ORTIZ – Supervisor Contrato de Interventoría INVIAS, soporte de los traslados vía sebra de los rendimientos financieros generados en la cuenta corriente del Banco Agrario de Colombia donde se manejan los recursos del convenio 2139-2024 con la JAC de la Vereda La Troja, correspondiente al mes de febrero de 2025.

Se presenta la relación del presupuesto y valores ejecutados finales de la obra, obteniendo un porcentaje de avance total ejecutado del proyecto del 100.0%.

La interventoría realiza el proceso de liquidación del convenio.

1.3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

1.3.1 Informe semanal

El convenio ya se encuentra en proceso de liquidación.

No se anexan los formatos “INFORMES SEMANALES”.

1.3.2 Maquinaria y equipo contrato de obra

El convenio ya se encuentra en proceso de liquidación.

No se anexa el formato “MAQUINARIA Y EQUIPO”.

1.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contratode obra

El convenio ya se encuentra en proceso de liquidación.

No se anexa el formato “PERSONAL, CONTROL APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL”.

1.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra

De acuerdo con el convenio solidario No. 2139 de 2024, CLAÚSULA SÉPTIMA: “EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2024”, por lo cual, el contratista no recibe anticipo ni se realiza seguimiento de este.

Con base en el CDP No. 86124 de fecha 2024-05-07 para el contrato principal; discriminado en C-2402-0600-14-51102ª-2402041-02 por valor $ 200,320,555.00.

El convenio ya se encuentra en proceso de liquidación.

1.3.5 Estado general del tiempo

El convenio ya se encuentra en proceso de liquidación.

No se anexa el formato “ESTADO GENERAL DEL TIEMPO”.

1.3.6 Resumen ensayos de laboratorio

El convenio ya se encuentra en proceso de liquidación.

No se anexa el formato “RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO”.

1.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes para el Convenio inicial y prórroga No.1:

- Convenio inicial: Póliza de cumplimiento No. NB-100330951 – Anexo 0 de fecha 05/07/2024 y Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083419 – Anexo 0 de fecha 05/07/2024.

AMPARO	%AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10%	$ 20,182,056.00	2/7/2024	31/12/2025
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	20%	$ 40,264,111.00	31/12/2024	31/12/2029
PAGOS DE SALARIOS Y PRESTACIONES	5%	$ 10,066,028.00	2/7/2024	31/12/2027
TOTAL		$ 70,512,195.00	-	-
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 260,000,000	2/7/2024	31/12/2024

- Convenio inicial: Póliza de cumplimiento No. NB-100330951 – Anexo 1 de fecha 27/09/2024 y Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083419 – Anexo 1 de fecha 27/09/2024.

AMPARO	%AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10%	$ 20,182,056.00	2/9/2024	31/12/2025
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	20%	$ 40,264,111.00	31/12/2024	31/12/2029
PAGOS DE SALARIOS Y PRESTACIONES	5%	$ 10,066,028.00	2/9/2024	31/12/2027
TOTAL		$ 70,512,195.00	-	-
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 260,000,000	2/7/2024	31/12/2024

- Convenio inicial: Póliza de cumplimiento No. NB-100330951 – Anexo 2 de fecha 02/01/2025 y Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100083419 – Anexo 2 de fecha 02/01/2025.

AMPARO	%AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10%	$ 20,182,056.00	2/7/2024	31/3/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	20%	$ 40,264,111.00	31/3/2025	31/3/2030
PAGOS DE SALARIOS Y PRESTACIONES	5%	$ 10,066,028.00	2/7/2024	31/3/2028
TOTAL		$ 70,512,195.00	-	-
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 260,000,000	2/7/2024	31/3/2025

Se anexa el formato “SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS”.

1.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para

Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías – Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

1.3.9 Otros documentos seguimiento mensual

- Seguimiento a programación y ejecución de obra: El convenio ya se encuentra en proceso de liquidación.

- Actas de reunión y comités de obra: El convenio ya se encuentra en proceso de liquidación.

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1 Información general del contrato

PROCESO DE SELECCIÓN	CMA-DEO-SVR-CCPT-047-2024
FECHA DE PUBLICACIÓN	7/06/2024
ID DEL CONTRATO EN SECOP II	CO1.PCCNTR.6698942
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	3697 DE 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16/09/2024
OBJETO	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 5.
CONTRATISTA	CONSORCIO INTER ECO
NIT	901.865.515-1
VALOR INICIAL	$ 1.546.789.418,00
VALOR ADICIONAL	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 1.546.789.418,00
ORDEN DE INICIO	02/10/2024
PLAZO INICIAL	Hasta el 31/12/2024
SUSPENSIÓN No. 1	29/04/2025
REANUDACIÓN No. 1	-
PRÓRROGA No. 1	Hasta el 31/03/2025
PRÓRROGA No. 2	Hasta el 30/04/2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	Hasta el 30/04/2025
DIRECCIÓN	Calle 17 # 7a-37, Neiva – Huila
NÚMERO DE TELÉFONO	3108827068
SUPERVISOR	JOSÉ MIGUEL ORTEGA ORTIZ

2.1.1 Descripción de las actividades realizadas por el interventor

A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas en campo, como en oficina, por el personal profesional y técnico de la Interventoría, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales:

- Verificación del cumplimiento de las obligaciones de la JAC de cada convenio.
- Revisión de cotizaciones
- Realización de comités operativos para la aprobación de cotizaciones de materiales, maquinaria, transporte, plan de compras.
- Revisión de los diferentes documentos presentados por la JAC de cada convenio
- Realización y entrega para su debido trámite del acta de costo del mes de marzo de 2025.
- Elaboración y trámites de suspensión No.1 para la interventoría y los convenios que se encuentran en ejecución.
- Control del pago de parafiscales del personal que labora para el contrato.
- Archivo actualizado de la Interventoría
- Comunicados dirigidos al contratista
- Comunicados dirigidos al INVIAS
- Reuniones con las JAC
- Asistir a las reuniones y comités de seguimiento programados por el INVIAS.
- Visitas técnicas a los sitios de ejecución de las obras.
- Elaboración de informes semanales.
- Elaboración de informes mensuales.
- Apoyo y acompañamiento técnico en la construcción de obras.

Lo anterior, mediante la realización de comités operativos para aprobación de cotización de materiales, suministros, transporte y maquinaria, plan de compras con el fin de evaluar costo/beneficio y trámite de transferencia de recursos que permite la compra y adquisición de los bienes y servicios requeridos por los proyectos.

En cuanto al suministro de materiales se solicitan los certificados de calidad y cumplimiento de especificaciones técnicas. Para la maquinaria y equipo se requieren los documentos del vehículo tales como SOAT y tarjeta de propiedad, y que el operario esté debidamente afiliado a seguridad social.

Por otra parte, se realizó la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas y diseños de las obras ejecutadas en los convenios solidarios en ejecución.

2.1.2 Informes Especialistas y Profesionales

Durante el mes de abril de 2025, las labores del Director y Residentes de interventoría, consistieron en requerir a los presidentes de las JAC que no han iniciado obras, las cotizaciones de materiales, maquinaria, equipos, transporte de material, revisarlas y realizar los comités técnicos para su respectiva aprobación, solicitar los estudios y diseños al Invias para entregarlos a las JAC que están iniciando el desarrollo y ejecución de los convenios como son Calle Real y Praga en el municipio de Aipe y La Galda en el municipio de El Agrado y el apoyo y acompañamiento técnico y administrativo en la construcción de las obras, finalización y liquidación de convenios y entrega de informes.

Igualmente, se acompañaron las labores administrativas que permitieron la revisión y aprobación de proveedores de suministros y servicios requeridos.

Se informa al INVIAS el reintegro de los rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias de los recursos que fueron girados en desarrollo de los convenios y a la fecha no se han allegado copia y soporte de los traslados vía sebra de los meses en mora.

Se realizan la suspensión No.1 para los Convenios No.2138, 2151, 2190, 2433, 2752, 3609, 3768, 2338, 2639, 2788 y 3776 de 2024 y la del contrato de interventoría, a partir del 29 de abril de 2025.

2.1.3 Componente ambiental

Zona Norte

- **Apoyo y seguimiento en la ejecución obra**
  Durante este periodo, se realiza apoyo y seguimiento en la liquidación de los siguientes convenios:
  - Vereda EL HOTEL
  - Vereda LA TROJA
  - Vereda EL PROGRESO

- **Solicitud NO PROCESOS EN CURSO – CAM**
  Durante el presente periodo se envió solicitud y reiteración de la solicitud a la CAM para obtención certificado NO PROCESOS EN CURSO de los siguientes convenios:
  - 2138 de 2024
  - 2190 de 2024

- Durante el presente periodo, se obtuvo los siguientes certificados de NO PROCESOS EN CURSO por parte de la CAM
  - 2105 de 2024
  - 2060 de 2024

- **ENTREGA DOCUMENTACIÓN INICIAL**
  Durante el presente periodo, se entregó la documentación inicial del siguiente convenio:
  - 3609 de 2024 radicado recepción INVIAS 2025E-VUVRAZ-041311.

- Envío informe ambiental final de los siguientes convenios:
  - 2105 de 2024 radicado recepción INVIAS 2025E-VUVRAZ-042873
  - 2060 de 2024 radicado recepción INVIAS 2025E-VUVRAZ-035443
  - 2269 de 2024, radicado recepción INVIAS 2025E-VUVRAZ-044345
  - 2708 de 2024 radicado recepción INVIAS 2025E-VUVRAZ-038955

Zona Sur

- **Municipio Algeciras:**

Convenio 2234 – 2024: Paraíso Pueblo Viejo

Se realizó la entrega de la documentación de cierre ambiental a sostenibilidad del INVIAS para su respectiva NO OBJECIÓN.

Convenio 2692 – 2024: Colon

Se envió solicitud a la CAM para la certificación de No Procesos en curso del convenio.

Se realizó la entrega de la documentación de cierre ambiental a sostenibilidad del INVIAS para su respectiva NO OBJECIÓN.

Convenio 2130 – 2024: Naranjos Bajos

Se realizó la entrega de la documentación de cierre ambiental a sostenibilidad del INVIAS para su respectiva NO OBJECIÓN.

- **Municipio de Isnos:**

Convenio 2087-2024: Salto de Bordones

Se realizó la entrega de la documentación de cierre ambiental a sostenibilidad del INVIAS para su respectiva NO OBJECIÓN.

- **Convenio 2170-2024: Sinaí**

Se realizó la entrega de la documentación de cierre ambiental a sostenibilidad del INVIAS para su respectiva NO OBJECIÓN.

- **Convenio 2084-2024: La Muralla**

Se realizó la entrega de la documentación de cierre ambiental a sostenibilidad del INVIAS para su respectiva NO OBJECIÓN.

- **Municipio de Acevedo:**

Convenio 2788-2024: La Primavera

Apoyé la realización del comité operativo N° 9, en el cual se hizo la aprobación de pagos de proveedores, se aprobaron cantidades adicionales requeridas para la ejecución de la obra, pagos de nómina, de seguridad social.

Apoyé la realización del comité operativo N° 10, en el cual se hizo la aprobación de pagos de proveedores, se aprobaron cantidades adicionales requeridas para la ejecución de la obra, pagos de nómina, de seguridad social.

- **Convenio 2639-2024: San José de Riecito**

Participé en el comité operativo N° 6, en el cual solicité que se implementen las medidas ambientales en obra, por ello es importante dejar como evidencia de la implementación el registro fotográfico. Así mismo, se recuerda que se debe realizar charlas con el personal de obra, para lo cual se debe dejar registro de asistencia a la misma.

Se les informa que todos esos registros se van a requerir para el cierre final del área ambiental. Por ello, se solicita además que, se soliciten los respectivos paz y salvos a los proveedores una vez se efectúe el 100% de las compras Vs pagos, ya que estos también se requieren para el cierre final.

- **Convenio 2338-2024: Versalles**

Apoyé la realización del comité operativo N° 4, en el cual se hizo la aprobación del plan de compras y plan de obra social. Se solicitó hacer la entrega de la documentación ambiental inicial.

Apoyé la realización del comité operativo N° 5, en el cual se hizo la aprobación para el cambio del punto de inicio de obra, así mismo se aprobó la construcción de las alcantarillas en los puntos indicados por el residente de obra. Se solicitó presentar la primera cuenta de cobro para pago de proveedores. Y que se notifique fecha de inicio de obra, teniendo en cuenta que ya se cuanta con la aprobación del plan de compras. Se solicita la entrega de la documentación ambiental inicial.

Apoyé la realización del oficio de cambio de firma por apoderado de interventoria ante el banco, para el tema de transferencias, teniendo en cuenta que la firma no estaba actualizada conforme al nuevo Director de Interventoría.

Apoyé la realización del comité operativo N° 6, en el cual se hizo la aprobación de pagos de nómina, de seguridad social. Se solicitó hacer la entrega de los epp a los trabajadores.

Se hizo entrega de la documentación ambiental inicial a sostenibilidad del INVIAS para la No Objeción.

- **Municipio de Saladoblanco:**

- **Convenio 2109-2024: Morelia**

Se solicitó a la CAM el certificado de No Procesos en curso del convenio.

Se realizó la entrega de la documentación de cierre ambiental a sostenibilidad del INVIAS para su respectiva NO OBJECIÓN.

- **Convenio 2280-2024: La Cabaña**

Se solicitó a la CAM el certificado de No Procesos en curso del convenio.

Se realizó la entrega de la documentación de cierre ambiental a sostenibilidad del INVIAS para su respectiva NO OBJECIÓN.

- **Municipio de Garzón:**

- **Convenio 2063-2024: El Mesón**

Se realizó la entrega de la documentación de cierre ambiental a sostenibilidad del INVIAS para su respectiva NO OBJECIÓN.

- **Municipio La Plata:**

- **Convenio 2799-2024: Gallego**

Se realizó visita a campo para verificar estado de la obra, por ello se solicitó realizar la jornada de orden y aseo en la misma retirando todos los materiales y residuos dejados en obra, lo cual es indispensable para cuando se vaya a recibir formalmente.

Participé en el comité operativo donde se solicitó hacer la entrega de la documentación ambiental de cierre, con los respectivos formatos, registro fotográfico, paz y salvos de proveedores.

- **Municipio Nátaga:**

- **Convenio 2064-2024: Yarumal**

Apoyé la realización del comité operativo N° 11, en el cual se hizo aprobación de pago de seguridad social de los trabajadores, nómina y liquidaciones del personal. Se solicitó hacer entrega de la documentación ambiental final, para hacer el respectivo cierre ambiental.

Apoyé la realización del comité operativo N° 12, en el cual se hizo la aprobación de pago del impuesto de la retención, el pago de proveedores pendientes, pago de nómina de los profesionales.

Se realizó la entrega de la documentación de cierre ambiental a sostenibilidad del INVIAS para su respectiva NO OBJECIÓN.

- **Convenio 2111-2024: Cascajosa**

Se realizó visita a campo para verificar estado de la obra, por ello se solicitó realizar la jornada de orden y aseo en la misma retirando todos los materiales y residuos dejados en obra, lo cual es indispensable para cuando se vaya a recibir formalmente.

Se remitió oficio a la JAC solicitando la entrega de la documentación ambiental de cierre para el proceso de liquidación.

2.1.4 Componente Social

Zona Norte

- Se realizó cargue de información de convenios faltantes en el drive del INVIAS
- Se realizó oficio dirigido a la junta de acción comunal siria, para solicitar entrega de las facturas de compra correspondientes al rubro social.
- Se realizó oficio dirigido a la junta de acción comunal progreso, para solicitar entrega de las facturas de compra correspondientes al rubro social.
- Se realizó radicación documentación de cierre del plena de gestión social de la vereda Versalles Colombia.
- Se realizó radicación documentación de cierre del plena de gestión social de la vereda Paraiso Colombia.
- Se establece comunicación con la junta de acción comunal de la vereda calle real para solicitar entrega de la documentación inicial del plan de gestión social.
- Se realizó reunión de cierre y entrega de las obras social y técnicas a los directivos de la junta de acción comunal de la vereda Versalles Colombia.
- Se realizó seguimiento a la ejecución de la obra social en la vereda el progreso de Baraya.
- Se realizó seguimiento a la ejecución de la obra social en la vereda la parada de Baraya.

Zona Sur

- **Asistencia a Comités Operativos de Seguimiento.**

Durante este periodo, se asistió a los comités operativos desarrollados para los siguientes convenios:

2109 – 2024 Morelia – Saladoblanco (01/04/2025): Se realiza acompañamiento en comité operativo, teniendo en cuenta que ya la JAC culminó con la obra civil y social, se debe llevar a cabo la socialización de cierre en la cual se hará entrega a la comunidad de dichas obras. Esta reunión se hará el día 07 de abril del 2025, fecha acordada entre la JAC y la interventoría.

2280 – 2024 La Cabaña – Saladoblanco (01/04/2025): Se realiza acompañamiento en comité operativo, teniendo en cuenta que ya la JAC culminó con la obra civil y social, se debe llevar a cabo la socialización de cierre en la cual se hará entrega a la comunidad de dichas obras. Esta reunión se hará el día 07 de abril del 2025, fecha acordada entre la JAC y la interventoría.

2064 – 2024 Yarumal – Nátaga (01/04/2025): Se realiza acompañamiento en comité operativo, teniendo en cuenta que ya la JAC culminó con la obra civil y social, se debe llevar a cabo la socialización de cierre en la cual se hará entrega a la comunidad de dichas obras. Esta reunión se hará el día 09 de abril del 2025, fecha acordada entre la JAC y la interventoría.

2799 – 2024 Gallego – La Plata (02/04/2025): Se realiza acompañamiento en comité operativo,

en el cual se hace seguimiento a la obra de participación comunitaria, la JAC refiere que durante esta semana instalarían las tejas que hacen falta para ya culminar con la OPC.

2639 - 2024 San José de Riecito – Acevedo (05/04/2025): Se realiza comité operativo para la aprobación del Plan de Inversión Social para que la JAC inicie con las gestiones pertinentes de compra de materiales para realizar la Obra de Participación Comunitaria: "Cambio de cubierta de la cocina y mejoramiento en acabados en la Institución San José de Riecito - Acevedo Huila".

2338 – 2024 Versalles – Acevedo (07/04/2025): Se realiza acompañamiento en comité operativo, desde la parte social se realiza la aprobación da la aprobación del Plan de Inversión Social para que la JAC inicie con las gestiones pertinentes de compra de materiales para realizar la Obra de Participación Comunitaria: " Instalación de tubería de 36" para la adecuación de la Caseta Comunal propiedad de la Junta de Acción Comunal de Versalles".

2788 – 2024 La Primavera – Acevedo (08/04/2025): Se realiza acompañamiento en comité operativo, en cuanto a la parte social se indica a la JAC que puede adelantar las gestiones para la producción de la placa conmemorativa para la OPC.

2639 - 2024 San José de Riecito – Acevedo (23/04/2025): Se realiza acompañamiento en comité operativo, y desde la parte social se indaga sobre las gestiones que han hecho para el inicio de la OPC; la JAC indica que enviaron a la interventoría la orden de pago para su revisión y aprobación. Desde la interventoría se comunica que se revisarán los documentos para que puedan radicarlos en el banco y así proceder con el pago. Adicional se solicita que una vez radiquen los documentos en el banco envíen el soporte.

- **Recepción y evaluación de Plan de Inversión Social:**

Durante el presente periodo se realiza la respectiva recepción y evaluación de la documentación del Plan de Inversión Social:

  - 2338 – 2024 Versalles – Acevedo

- **Remisión documentación social inicial enviada a la SS del INVIAS:**

Una vez se revisó y se realizaron los ajustes correspondientes a los documentos entregados por parte de los contratistas de obra, se realizaron los respectivos oficios de radicación para la entrega de la documentación social inicial a la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS:

- Oficio 211-1-847 Entrega Plan Gestión Social Convenio 2639 de 2024 San José de Riecito – Acevedo, cuyo radicado INVIAS es 2025E-VUVRAZ-035047.
- - Oficio 211-1-879 Entrega Plan Gestión Social Convenio 2338 de 2024 Versalles – Acevedo, cuyo radicado INVIAS es Radicado: 2025E-VUVRAZ-038609.

- **Remisión documentación social final enviada a la SS del INVIAS:**

Una vez diligenciada la documentación final se realizaron los respectivos oficios de radicación para la entrega de la documentación social final a la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS:

- Oficio 211-1-840 Entrega Documentación de Cierre PGS 2170 de 2024 Sinaí – Isnos, cuyo radicado INVIAS es 2025E-VUVRAZ-034376.

- Oficio 211-1-860 Entrega Documentación de Cierre PGS 2063 de 2024 El Mesón – Garzón, cuyo radicado INVIAS es 2025E-VUVRAZ-035673.
- Oficio 211-1-923 Entrega Documentación de Cierre PGS 2130 de 2024 Los Naranjos Bajos Algeciras, cuyo radicado INVIAS es 2025E-VUVRAZ-041578.
- Oficio 211-1-927 Entrega Documentación de Cierre PGS 2109 de 2024 Morelia – Saladoblanco, cuyo radicado INVIAS es 2025E-VUVRAZ-042169.
- Oficio 211-1-954 Entrega Documentación de Cierre PGS 2064 de 2024 Yarumal – Nátaga, cuyo radicado es 2025E-VUVRAZ-043425.
- Oficio 211-1-958 Entrega Documentación de Cierre PGS 2234 de 2024 Sector Pueblo Viejo Algeciras, cuyo radicado INVIAS es 2025E-VUVRAZ-044111.
- Oficio 211-1-964 Entrega Documentación de Cierre PGS 2692 de 2024 Colon – Algeciras, cuyo radicado INVIAS es 2025E-VUVRAZ-044238.
- Oficio 211-1-986 Entrega Documentación de Cierre PGS 2280 de 2024 La Cabaña – Saladoblanco, cuyo radicado INVIAS es 2025E-VUVRAZ-045071.

- **Otras actividades:**

Durante el presente periodo realicé las siguientes actividades:

- 2130 – 2024 Los Naranjos Bajos – Algeciras: Se lleva a cabo socialización de cierre, en la cual se realiza la entrega a la comunidad de la obra civil y la Obra de Participación Comunitaria.

- 2788 – 2024 La Primavera – Acevedo: La JAC finaliza la Obra de Participación, la cual realizó: “Mejoramiento de la caseta deportiva, cancha deportiva y sus alrededores”.

- - 2109- 2024 Morelia – Saladoblanco: Se lleva a cabo socialización de cierre, en la cual se realiza la entrega a la comunidad de la obra civil y la Obra de Participación Comunitaria.

- 2280 – 2024 La Cabaña – Saladoblanco: Se lleva a cabo socialización de cierre, en la cual se realiza la entrega a la comunidad de la obra civil y la Obra de Participación Comunitaria.

- 2064 – 2024 Yarumal – Nátaga: Se lleva a cabo socialización de cierre, en la cual se realiza la entrega a la comunidad de la obra civil y la Obra de Participación Comunitaria.

- 2234 – 2024 Paraíso Pueblo Viejo – Algeciras: Se lleva a cabo socialización de cierre, en la cual se realiza la entrega a la comunidad de la obra civil y la Obra de Participación Comunitaria.

- 2692 – 2024 Colon – Algeciras: Se lleva a cabo socialización de cierre, en la cual se realiza la entrega a la comunidad de la obra civil y la Obra de Participación Comunitaria.

2.1.5 Componente SST

ACTIVIDADES SST DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA VERSALLES – COLOMBIA – CONVENIO 2708-2024

Durante el período comprendido desde 01 de abril al 29 de abril de 2025, la Junta de Acción Comunal de la vereda VERSALLES, convenio número 2708 realizó las siguientes actividades:

- Paz y salvo personal
- Desestimiento exámenes de egreso

ACTIVIDADES SST DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PUERTA DEL SOL – TELLO – CONVENIO 2318-2024

Durante el período comprendido desde 01 de abril al 29 de abril de 2025, la Junta de Acción Comunal realizo las siguientes actividades:

- Desestimiento de exámenes de egreso – Paz y salvos.

ACTIVIDADES SST DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GALLEGO – LA PLATA – CONVENIO 2799-2024

Durante el período comprendido desde 01 de abril al 29 de abril de 2025, la Junta de Acción Comunal realizo las siguientes actividades:

- Afiliaciones a seguridad social al personal que ingreso en el período, Pagos a la seguridad social del personal que labora en el convenio.
- Listado de maquinaria y equipos de obra
- Listado de personal, se anexa el formato de personal de obra
- Desestimiento de exámenes de egreso y paz y salvos.

ACTIVIDADES SST DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PRIMAVERA – ACEVEDO – CONVENIO 2788-2024

Durante el período comprendido desde 01 de abril al 29 de abril de 2025, la Junta de Acción Comunal realizo las siguientes actividades:

- Afiliaciones a seguridad social al personal que ingreso en el período, Pagos a la seguridad social del personal que labora en el convenio.
- Inducción – notificación del riesgo y peligros en obra
- Soporte de entrega de dotación y EPP.
- Listado de equipos y vehículos de interventoría
- Listado de personal, se anexa el formato de personal de interventoría

ACTIVIDADES SST DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA HORIZONTE – COLOMBIA – CONVENIO 2190-2024

Durante el período comprendido desde 01 de abril al 29 de abril de 2025, la Junta de Acción Comunal realizo las siguientes actividades:

- Afiliaciones a seguridad social al personal que ingreso en el período, Pagos a la seguridad social del personal que labora en el convenio.
- Inducción – notificación del riesgo y peligros en obra.
- Soporte de entrega de dotación y EPP.
- Listado de equipos y vehículos de interventoría.
- Listado de personal, se anexa el formato de personal de interventoría.

ACTIVIDADES SST DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JOSÉ DE

RIECITO – ACEVEDO – CONVENIO 2639-2024

Durante el período comprendido desde 01 de abril al 29 de abril de 2025, la Junta de Acción Comunal realizo las siguientes actividades:

- Afiliaciones a seguridad social al personal que ingreso en el período, Pagos a la seguridad social del personal que labora en el convenio.
- Inducción – notificación del riesgo y peligros en obra
- Soporte de entrega de dotación y EPP.
- Listado de equipos y vehículos de interventoría
- Listado de personal, se anexa el formato de personal de interventoría

ACTIVIDADES SST DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SANTANA – COLOMBIA – CONVENIO 2752-2024

Durante el período comprendido desde 01 de abril al 29 de abril de 2025, la Junta de Acción Comunal realizó las siguientes actividades:

- Afiliaciones a seguridad social al personal que ingreso en el período, Pagos a la seguridad social del personal que labora en el convenio.
- Inducción – notificación del riesgo y peligros en obra
- Soporte de entrega de dotación y EPP.
- Listado de equipos y vehículos de interventoría
- Listado de personal, se anexa el formato de personal de interventoría

ACTIVIDADES SST DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ANTILLAS – COLOMBIA – CONVENIO 2151-2024

Durante el período comprendido desde 01 de abril al 29 de abril de 2025, la Junta de Acción Comunal realizó las siguientes actividades:

- Afiliaciones a seguridad social al personal que ingreso en el período, Pagos a la seguridad social del personal que labora en el convenio.
- Inducción – notificación del riesgo y peligros en obra
- Soporte de entrega de dotación y EPP.
- Listado de equipos y vehículos de interventoría
- Listado de personal, se anexa el formato de personal de interventoría

ACTIVIDADES SST DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNIÓN – COLOMBIA – CONVENIO 2138-2024

Durante el período comprendido desde 01 de abril al 29 de abril de 2025, la Junta de Acción Comunal realizó las siguientes actividades:

- Afiliaciones a seguridad social al personal que ingreso en el período, Pagos a la seguridad social del personal que labora en el convenio.
- Inducción – notificación del riesgo y peligros en obra
- Soporte de entrega de dotación y EPP.
- Listado de equipos y vehículos de interventoría
- Listado de personal, se anexa el formato de personal de interventoría

ACTIVIDADES SST DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA VERSALLES – ACEVEDO – CONVENIO 2338-2024

Durante el período comprendido desde 01 de abril al 29 de abril de 2025, la Junta de Acción Comunal realizó las siguientes actividades:

- Afiliaciones a seguridad social al personal que ingreso en el período, Pagos a la seguridad social del personal que labora en el convenio.
- Inducción – notificación del riesgo y peligros en obra
- Soporte de entrega de dotación y EPP.
- Listado de equipos y vehículos de interventoría
- Listado de personal, se anexa el formato de personal de interventoría

2.2 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.2.1 Equipo y vehículos contrato de Interventoría

Durante el periodo reportado se contó con dos (2) camionetas para el Director de interventoría, residentes de interventoría, profesionales ambientales, sociales, SST y financieros, permitiendo realizar las visitas técnicas; también, con equipos de cómputo y dotación de oficina, que son requeridos para la efectuar las actividades de interventoría.

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5.

2.2.2 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de Interventoría

Durante el mes de abril de 2025 se generó pago de aportes de seguridad social del personal que se relaciona a continuación:

N°	NOMBRE	CARGO	INICIO	VINCULACIÓN
1	GULLERMO ALBERTO ROJAS	ING AMBIENTAL	10/10/2024	OBRA O LABOR
2	WENDY TATIANA IBAÑEZ ALFONZO	ING AMBIENTAL	10/10/2024	OBRA O LABOR
3	NATALIA ANDREA MELENDEZ MONTENEGRO	PROFESIONAL SOCIAL	3/10/2024	OBRA O LABOR
4	DANER FERNEY MALES GOLONDRINO	INSPECTOR DE OBRA	30/10/2024	OBRA O LABOR
5	KELLY JOHANA HENAO	INSPECTOR DE OBRA	31/10/2024	OBRA O LABOR
6	PAULA XIMENA RAMIREZ MONJE	PROFESIONAL SOCIAL NORTE	3/10/2024	OBRA O LABOR
7	JULIAN DAVID ORTIZ HENAO	ING RESIDENTE	9/10/2024	OBRA O LABOR
8	MARIA CAROLINA SALAZAR PARRA	INGENIERA AUXILIAR	16/10/2024	OBRA O LABOR
9	ANDRES FELIPE BENAVIDEZ POLANIA	TECNICO ADMINISTRATIVO	7/10/2024	OBRA O LABOR
10	DIEGO ANDRES PLAZAS CABRERA	FINANCIERO	7/11/2024	OBRA O LABOR

N°	NOMBRE	CARGO	INICIO	VINCULACIÓN
11	CARLOS EDUARDO FALLA VILLEGAS	DIRECTOR INTERVENTORIA	16/10/2024	OBRA O LABOR
12	DIANA MARCELA RAMIREZ DIAZ	INSPECTOR SST	13/11/2024	OBRA O LABOR
13	MAGALY YULIETH LASSO CERON	INSPECTOR	19/11/2024	OBRA O LABOR
14	MARIA JOSE PEÑA BUYUCUE	INSPECTORA	19/11/2024	OBRA O LABOR
15	EDWIN FERNEY IQUIRA RAMOS	INSPECTOR	6/12/2024	OBRA O LABOR
16	LAURA VALENTINA PERDOMO FIERRO	INSPECTORA	11/12/2024	OBRA O LABOR
17	JOSE MANUEL GASCA CUELLAR	INSPECTOR	11/12/2024	OBRA O LABOR
18	DARWIN ANDRES MORALES	INSPECTOR	11/12/2024	OBRA O LABOR
19	JHON ALEX TAMAYO MONTEALEGRE	INSPECTOR	17/12/2024	OBRA O LABOR
20	CRISTIAN CAMILO CHALA	FINANCIERO	9/1/2025	OBRA O LABOR
21	MARIO FERNANDO CASTILLO	ING RESIDENTE	9/1/2025	OBRA O LABOR
21	FREDY MEDINA RAMÍREZ	CONDUCTOR	22/1/2025	OBRA O LABOR
23	HAMINCE ORTIZ	CONDUCTOR	10/2/2025	OBRA O LABOR

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7.

2.2.3 Información financiera y presupuestal contrato de Interventoría

Con base en el CDP No. 125424 de fecha 2024-05-22. Se hizo el registro presupuestal No. 956924 con vigencia fiscal 2024 por valor 1.546.789.418,00 para el contrato principal. Lo anterior, sin adiciones a la fecha.

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9.

2.2.4 Seguimiento garantías contrato de Interventoría

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes para el convenio inicial:

• Contrato inicial: PÓLIZA Nº 21-44-101451460 ANEXO 0

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	10%	$ 154.678.941,80	16/9/2024	30/6/2025
MANEJO ANTICIPO	20%	$ 309.357.883,60	16/9/2024	30/6/2025
PRESTACIONES SOCIALES	20%	$ 309.357.883,60	16/9/2024	31/12/2027
CALIDAD DEL SERVICIO	30%	$ 464.036.825,40	31/12/2024	31/12/2029

Contrato inicial: PÓLIZA Nº 21-44-101451460 ANEXO 1

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	10%	$ 154.678.941,80	16/9/2024	30/6/2025
MANEJO ANTICIPO	20%	$ 309.357.883,60	16/9/2024	30/6/2025
PRESTACIONES SOCIALES	20%	$ 309.357.883,60	16/9/2024	31/12/2027
CALIDAD DEL SERVICIO	30%	$ 464.036.825,40	31/12/2024	31/12/2029

Contrato inicial: PÓLIZA Nº 21-44-101451460 ANEXO 2

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	10%	$ 154.678.941,80	16/9/2024	30/6/2025
MANEJO ANTICIPO	20%	$ 309.357.883,60	16/9/2024	30/6/2025
PRESTACIONES SOCIALES	20%	$ 309.357.883,60	16/9/2024	31/12/2027
CALIDAD DEL SERVICIO	30%	$ 464.036.825,40	31/12/2024	31/12/2029

Contrato inicial: PÓLIZA Nº 21-44-101451460 ANEXO 3

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	10%	$ 154.678.941,80	16/9/2024	30/6/2025
MANEJO ANTICIPO	20%	$ 309.357.883,60	16/9/2024	30/6/2025
PRESTACIONES SOCIALES	20%	$ 309.357.883,60	16/9/2024	31/12/2027
CALIDAD DEL SERVICIO	30%	$ 464.036.825,40	31/12/2024	31/12/2029

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13.

2.2.5 Otros documentos seguimiento mensual

- El seguimiento a la inversión del anticipo no aplica formato ya que hasta el momento no se ha realizado desembolso del mismo por parte de INVIAS.
- Plan de Cargas o Reprogramación al Plan de cargas: De acuerdo a la prórroga otorgada al contrato de interventoría para el mes de marzo con plazo de vencimiento actual a 30 de abril de 2025, el plan de cargas fue aprobado hasta el 30 de abril de 2025.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ESTADO DE TRÁMITE DE ACTAS DE COSTOS

Entendiendo que, para el mes de abril se entraba en la finalización del plazo del contrato de interventoría, se presentaron diferentes inconvenientes e imprevistos durante la ejecución de los convenios, por lo cual se alertó a la entidad en diferentes oportunidades sobre la necesidad de ampliar el plazo de los convenios y realizar adición y prórroga del contrato de interventoría. En las presentes condiciones, se requieren recursos para adición del plazo de interventoría, sería de DOS MESES y un valor de $179.195.578,00 para cubrir personal básico según el plan de cargas.
A continuación, se presenta un informe resumen donde se describe el estado de los convenios que se encuentran vigentes o no han finalizado su etapa de ejecución, informe del que fue objeto el oficio 211-0-068 del 11 abril radicado 2025E-VUVRAZ-038937, cuyo contenido también es justificación para la ampliación del plazo tanto de los convenios como de la interventoría que requerirá disponer de personal para cubrir el plazo necesario con recursos adicionales.

ESTADO GENERAL DE LOS CONVENIOS

Convenios terminados

Con respecto a la terminación de las obras físicas, a la fecha se tienen terminadas las obras de los siguientes convenios los cuales se detallan así:

Terminados en marzo de 2025 (15)

Convenio 2139 de 2024 Vereda La Troja Baraya
Convenio 2318 de 2024 Vereda Puertas del Sol Tello.
Convenio 2708 de 2024 Vereda Versalles Colombia.
Convenio 2269 de 2024 Vereda Paraíso Colombia
Convenio 2109 de 2024 Vereda Morelia Saladoblanco.
Convenio 2280 de 2024 Vereda La Cabaña Saladoblanco
Convenio 2234 de 2024 Vereda Pueblo Viejo Algeciras
Convenio 2692 de 2024 Vereda Colon Algeciras
Convenio 2130 de 2024 Vereda Naranjos Bajos Algeciras.
Convenio 2150 de 2024 Vereda El Hotel Baraya
Convenio 2060 de 2024 Vereda Agua Fría Hobo
Convenio 2105 de 2024 Vereda La Parada Baraya
Convenio 2423 de 2024 Vereda El Progreso Baraya
Convenio 2110 de 2024 Vereda La Siria Baraya
Convenio 2064 de 2024 Vereda Yarumal Nátaga

Convenios finalizados anteriormente y que se encuentran en revisión, proceso de evaluación de documentos para liquidación (5):

Convenio 2087 de 2024 Vereda Salto de Bordones de Isnos.
Convenio 2170 de 2024 Vereda Sinaí De Isnos.
Convenio 2054 de 2024 Vereda La Muralla Isnos.
Convenio 2063 de 2024 Vereda el Mesón de Garzón.
Convenio 2108 de 2024 Vereda Batan de Hobo.

Convenios que fueron prorrogados y terminaron en el mes de abril de 2025(2):
Convenio 2111 de 2024 Vereda Cascajosa Nátaga
Convenio 2799 de 2024 Vereda Gallego La Plata.

Convenios prorrogados que no terminaron en abril y requerirán prórroga hasta el mes de mayo de 2025 (1):

Convenio 2138 de 2024 Vereda La Unión Colombia

Es necesario aclarar que las condiciones climáticas del departamento han variado drásticamente después de semana santa que también ha sido reportado por los residentes de las JAC, al respecto de ocurrencia de lluvias intensas en la zona de los proyectos que han impedido el avance de las actividades y ocurrencia de imprevistos, cierre de vías, etc., afectando los siguientes convenios que consideraríamos requerir una prórroga hasta el mes de junio de 2025 (6):

Convenio 2788 de 2024 Vereda Primavera Acevedo.
Convenio 2151 de 2024 Vereda Antillas Colombia
Convenio 2190 de 2024 Vereda Horizonte Colombia.
Convenio 2433 de 2024 Vereda La Esperanza Colombia.
Convenio 2752 de 2024 Vereda Santa Ana Colombia.
Convenio 2639 de 2024 Vereda Riecito Acevedo.

Un convenio que estaba suspendido, fue reanudado el 11 de abril e inmediatamente prorrogado hasta el 30 de abril de 2025, que también requiere prórroga hasta el mes de junio (1):

Convenio 2338 de 2024 Vereda Versalles Acevedo.

Convenio que no ha recibido recursos hasta la fecha (1):

Convenio 4020-2024 de JAC Vereda La Cañada – Agrado

Convenios a los cuales se les giraron recursos recientemente y no alcanzan a ejecutarse en el mes de abril de 2025 y requieren prórroga al menos hasta el mes de junio (3):

Convenio 3609 de 2024 Vereda Calle Real Aipe.
Convenio 3776-2024 de JAC Vereda La Galda – Agrado
Convenio 3768-2024 de JAC Vereda Praga – Aipe

Al respecto de estos últimos, ante la solicitud realizada por la interventoría a la Territorial Huila, fueron remitidos los estudios topográficos y de suelos el día 21 de abril (fecha en que fueron recibidos por la interventoría) para dar inicio a la etapa de alistamiento. Se informa que, de estos convenios, solamente se han presentado profesionales y ha sido aceptado por la interventoría, los de la JAC CALLE REAL convenio 3609-2024. Los otros, no presentan aún información. Con los antecedentes de ejecución de los demás convenios, el plazo hasta el mes de junio para estos, sería bastante ajustado.

En resumen, se ha tenido inconvenientes con los convenios que están en ejecución y se presenta como justificación lo siguiente:

Falta de disponibilidad de los dignatarios de las JAC para el agendamiento de los comités. Si bien la interventoría estuvo presta para convocar comités en horarios no convencionales (nocturnos o en días no hábiles), debido a imprevistas complicaciones no se pudo tener quórum para decidir en muchos comités operativos o no se pudieron planificar en los tiempos establecidos superando en mucho la etapa de alistamiento.

Falta de gestión o determinación administrativa de la JAC para la consecución de los profesionales. Hojas de vida que no cumplían con los requerimientos del anexo técnico de los proyectos.

Renuncia de profesionales. Por múltiples causas, pero principalmente asociadas a las condiciones de la zona en cuanto a los problemas de orden público y las dificultades en disponibilidad logística de equipos y suministro de materiales, generó bajo interés en el proyecto para ingenieros de la zona.

Dilación en la entrega de cotizaciones que en muchos casos no fue coordinada por los profesionales y los miembros de la JAC, como por la falta de materiales en la zona, proveedores distantes, actualización de precios por cambio de año, cierre de establecimientos comerciales por finalización del año 2024 y comienzo de las actividades comerciales en 2025. Planes de compra parciales o incompletos. Modificaciones a los diseños o cambio de las obras originalmente planteadas por la entidad como, por ejemplo, cambio de pavimento rígido a placa huella o viceversa. Esto en argumentación de la necesidad presentada por la JAC ya que no consideraron inicialmente su adecuada conveniencia.

Entrega de información ambiental, social y técnica como los diseños de las obras, documentos que requerían aprobación de la interventoría, fueron recibidos parcialmente y hasta tuvieron que ser complementados e incluso realizados por la interventoría dejando únicamente para la firma de los profesionales de la JAC o sus dignatarios.

Problemas de consecución del personal no calificado. Falta de disponibilidad de personal para trabajar. Principalmente los convenios del municipio de Colombia y Acevedo han mostrado problemas en la consecución de obreros y oficiales debido a lo distante de las zonas y el salario ofrecido, dado las condiciones de la región para el de pago de personal no calificado que en otras actividades económicas pueden devengar salarios mayores.

Zonas con problemas de orden público.

Dificultades en la consecución de maquinaria que no se encuentra en la zona. Igualmente, grandes distancias de acarreo de materiales por estar muy alejados a centros de producción de agregados, con vías terciarias de difícil acceso por presencia de deslizamientos y con características de altas pendientes y en mal estado. La situación de alejamiento, también genera escasez en la oferta de transporte, los transportadores y volqueteros deben ser de la zona.

Una de las dificultades o demoras que puede tener el proceso de recibo definitivo y liquidación de los convenios está sujeto a la entrega de información financiera por parte de los profesionales de las OAC. Esta situación además de las gestiones de traslado de rendimientos financieros, devolución de recursos no ejecutados al tesoro nacional y cierre de cuentas, es parte de la problemática para la liquidación. Al momento se tienen cinco convenios con cuentas cerradas en espera de certificación.

Para la liquidación de los convenios, se ha realizado el trámite o radicación ambiental y social de los proyectos ante la Subdirección de Sostenibilidad. En ese sentido tenemos el siguiente resumen:

PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL

No objeción inicial emitida por INVIAS a convenios:	22
En espera de no objeción inicial INVIAS convenios:	8
Convenios no presentados a INVIAS:	4
Entrega final social:	11
En espera de no objeción final:	11

DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL

No objeción emitida por INVIAS a convenios:	16
En espera de aprob. INVIAS convenios:	14
Convenios no presentados a INVIAS:	2
Convenios radicados Ambiental final:	7
Respuesta de no objeción final ambiental:	0

Como es de conocimiento, para la liquidación de los convenios se requiere el concepto favorable emitido por la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS mediante Memorando sobre el Balance Social, Predial y Ambiental a la terminación del convenio, así como, así como los certificados de cierre social, predial y ambiental de los permisos otorgados para el proyecto. Considera la interventoría que ha habido retraso en la entrega de información por las JAC.

Sin embargo, también es necesario indicar que, debido a la falta de personal en la planta del Instituto u otros factores ajenos a la interventoría y a cargo de la entidad, no se ha podido obtener respuesta de la documentación radicada a la Subdirección de Sostenibilidad para dichos cierres. Por ejemplo, el primer radicado de la documentación social final es del 13 de marzo y en la documentación para cierre ambiental es del 6 de marzo, situación en que se encuentra el convenio No. 2108 de 2024 Vereda Batan de Hobo.

Luego de los diferentes comunicados informando el estado de los convenios que todavía se encuentran en su fase de ejecución, por las dificultades que han debido sortear y que han originado atraso en la entrega de las obras y recientemente por afectación de las persistentes e impredecibles condiciones climáticas de la actual temporada de lluvias, además que algunos convenios presentan dificultades en la consecución del personal requerido para la ejecución del proyecto, en el cumplimiento de los perfiles técnicos y operativos exigidos por el convenio y que son del área de influencia del OAC; se ha requerido su suspensión avalada por la interventoría. En consecuencia y ante la circunstancia de suspensión de los convenios, el Consorcio Inter Eco presentó una solicitud formal de suspensión temporal del contrato de interventoría efectiva desde el 29 de abril hasta el 20 de mayo, confiando que, en este lapso, puedan superarse dichas condiciones adversas y pueda reiniciarse en la medida que también se reinicien los convenios.

4. ANEXOS

4.1 Relación de correspondencia

Durante el mes de abril de 2025 se tuvo la siguiente trazabilidad de correspondencia de las Juntas de Acción Comunal, Interventoría y Supervisión:

- Interventoría – correspondencia enviada

CÓDIGO CONSECUTIVO DE ENVIADO	FECHA DEL DOCUMENTO	ENTIDAD DESTINATARIA	PERSONA DESTINATARIA	CARGO DE PERSONA DESTINATARIA	ASUNTO TRATADO
211-1-833	1-abr-25	JAC VEREDA CALLE REAL AIPE-HUILA	Oliver Rada	Presidente de la JAC vereda Calle Real Aipe-Huila	Aprobación Residente de obra, contador y maestro de obra CONVENIO SOLIDARIO No. 3609 de 2024.
211-1-834	1-abr-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Solicitud información estudios y diseños JAC CALLE REAL del municipio de Aipe convenio No. 3609 de 2024
211-1-835	1-abr-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Solicitud información estudios y diseños JAC VEREDA PRAGA del municipio de Aipe convenio No. 3768 de 2024
211-1-836	1-abr-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Solicitud información estudios y diseños JAC VEREDA LA GALDA del municipio de Agrado convenio No. 3776 de 2024
211-1-837	1-abr-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Estado de los convenios.
211-1-838	1-abr-25	INVIAS	Ing. Jose Miguel Ortega Ortiz	Supervisor contrato de interventoría 3697 de 2024	SOLICITUD DE AMORTIZACIÓN CONVENIO 2108-2024 JAC BATAN.
211-1-839	1-abr-25	JAC VEREDA LA UNIÓN COLOMBIA-HUILA	Alirio Lozano	Presidente de la JAC vereda La Unión Colombia-Huila	Estado de aprobación del personal para participar en el proyecto CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2138 DE 2024
211-1-840	2-abr-25	INVIAS	Ing. Angie Juliet Mila Días	Subdirectora de Sostenibilidad	Entrega Documentación de cierre del Plan de Gestión Social del Convenio Solidario N°2170 de 2024 JAC Sinaí – Isnos.
211-1-841	2-abr-25	JAC VEREDA SINAI ISNOS-HUILA	Franxo Muñoz	Presidente de la JAC vereda Sinai Isnos-Huila	CERTIFICADO DE REUTILIZACIÓN MATERIAL RCD EN OBRA
211-1-842	2-abr-25	JAC VEREDA LA SIRIA BARAYA-HUILA	Yaneth Heredia Jimenez	Presidente de la JAC vereda La Siria Baraya-Huila	CERTIFICADO DE REUTILIZACIÓN MATERIAL RCD EN OBRA
211-1-843	2-abr-25	INVIAS	Ing. Angie Juliet Mila Días	Subdirectora de Sostenibilidad	CERTIFICADO DE GENERACIÓN DE NO PASIVOS AMBIENTALES
211-1-844	2-abr-25	INVIAS	Ing. Angie Juliet Mila Días	Subdirectora de Sostenibilidad	CERTIFICADO DE GENERACIÓN DE NO PASIVOS AMBIENTALES
211-1-845	2-abr-25	JAC VEREDA EL PROGRESO BARAYA-HUILA	Blanca Aurora Calderon Fierro	Presidente de la JAC vereda El Progreso Baraya-Huila	CERTIFICADO DE REUTILIZACIÓN MATERIAL RCD EN OBRA
211-1-846	2-abr-25	INVIAS	Ing. Angie Juliet Mila Días	Subdirectora de Sostenibilidad	ENTREGA DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL FINAL CONVENIO 2170 DE 2024

CÓDIGO CONSECUTIVO DE ENVIADO	FECHA DEL DOCUMENTO	ENTIDAD DESTINATARIA	PERSONA DESTINATARIA	CARGO DE PERSONA DESTINATARIA	ASUNTO TRATADO
211-1-847	2-abr-25	INVIAS	Ing. Angie Juliet Mila Días	Subdirectora de Sostenibilidad	Entrega del Plan de Gestión Social Inicial del Convenio Solidario N°2639 de 2024 JAC Pro-Mejoras Públicas de la Vereda de San José de Riecito - Acevedo.
211-1-848	3-abr-25	JAC VEREDA AGUA FRIA HOBO-HUILA	Luis Alberto Ortiz	Presidente de la JAC vereda Agua Fria Hobo-Huila	CERTIFICADO DE REUTILIZACIÓN MATERIAL RCD EN OBRA
211-1-849	3-abr-25	INVIAS	Ing. Angie Juliet Mila Días	Subdirectora de Sostenibilidad	CERTIFICADO DE GENERACIÓN DE NO PASIVOS AMBIENTALES
211-1-850	3-abr-25	INVIAS	Ing. Jose Miguel Ortega Ortiz	Supervisor contrato de interventoría 3697 de 2024	Traslado vía sebra rendimientos financieros convenio No. 2269 de 2024 Periodo JULIO DE 2024.
211-1-851	3-abr-25	INVIAS	Ing. Jose Miguel Ortega Ortiz	Supervisor contrato de interventoría 3697 de 2024	Traslado vía sebra rendimientos financieros convenio No. 2269 de 2024 Periodo AGOSTO DE 2024.
211-1-852	3-abr-25	INVIAS	Ing. Jose Miguel Ortega Ortiz	Supervisor contrato de interventoría 3697 de 2024	Traslado vía sebra rendimientos financieros convenio No. 2269 de 2024 Periodo NOVIEMBRE DE 2024.
211-1-853	3-abr-25	INVIAS	Ing. Jose Miguel Ortega Ortiz	Supervisor contrato de interventoría 3697 de 2024	Traslado vía sebra rendimientos financieros convenio No. 2269 de 2024 Periodo DICIEMBRE DE 2024.
211-1-854	3-abr-25	INVIAS	Ing. Jose Miguel Ortega Ortiz	Supervisor contrato de interventoría 3697 de 2024	Traslado vía sebra rendimientos financieros convenio No. 2269 de 2024 Periodo ENERO DE 2025.
211-1-855	3-abr-25	INVIAS	Ing. Jose Miguel Ortega Ortiz	Supervisor contrato de interventoría 3697 de 2024	Traslado vía sebra rendimientos financieros convenio No. 2269 de 2024 Periodo FEBRERO DE 2025.
211-1-856	27-mar-25	INVIAS	Ing. Oscar Rodolfo Acevedo Castro - Ing. Tatiana Alvarado	Subdirector Vías Regionales - Subdirección Vías regionales	Aclaración sobre información consignada en el MEPI de solicitud de adición y/o modificación y/o prórroga del Convenio N° 2639-2024
211-1-857	3-abr-25	JAC VERERDA GALLEGO LA PLATA-HUILA	Maria Aleida Arias Sanchez	Presidente de la JAC vereda Gallego La Plata-Huila	Estado de aprobación del personal para participar en el proyecto CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2799 DE 2024
211-1-858	3-abr-25	INVIAS	Ing. Angie Juliet Mila Días	Subdirectora de Sostenibilidad	ENTREGA DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL FINAL CONVENIO 2060 DE 2024
211-1-859	3-abr-25	PERSONERIA MUNICIAL DE COLOMBIA-HUILA	Andrea Achiíz Díaz	Personera Municipal	Respuesta a oficio PMCH 069 seguimiento de compromisos adquiridos

CÓDIGO CONSECUTIVO DE ENVIADO	FECHA DEL DOCUMENTO	ENTIDAD DESTINATARIA	PERSONA DESTINATARIA	CARGO DE PERSONA DESTINATARIA	ASUNTO TRATADO
211-1-860	4-abr-25	INVIAS	Ing. Angie Juliet Mila Días	Subdirectora de Sostenibilidad	Entrega Documentación de cierre del Plan de Gestión Social del Convenio Solidario N°2063 de 2024 JAC El Mesón – Garzón.
211-1-861	4-abr-25	INVIAS	Ing. Angie Juliet Mila Días	Subdirectora de Sostenibilidad	Entrega documentación de cierre del plan de gestión social del convenio solidario N°2318 de 2024 JAC Puerta del sol – Tello
211-1-862	4-abr-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Informe Avance Semanal Convenios 2024 MEPI-MN1-IN-15-FR-3 N°25
211-1-863	7-abr-25	JAC VEREDA AGUA FRIA HOBO-HUILA	Luis Alberto Ortiz	Presidente de la JAC vereda Agua Fria Hobo-Huila	Solicitud convocatoria de la comunidad para cierre del convenio 2060 -2024 de la vereda Agua Fría - Hobo
211-1-864	8-abr-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Matriz de seguimiento técnico CCPT_INTERECO N° 26
211-1-865	9-abr-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Entrega acta de costos No 6 de interventoría mes de marzo de 2025.
211-1-866	9-abr-25	INVIAS	Ing. Angie Juliet Mila Días	Subdirectora de Sostenibilidad	Entrega documentación de cierre del plan de gestión social del convenio solidario N°2150 de 2024 JAC El Hotel – Baraya
211-1-867	9-abr-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Matriz de seguimiento técnico CCPT_INTERECO N° 26_CORREGIDA
211-1-868	9-abr-25	PERSONERIA MUNICIAL DE COLOMBIA-HUILA	Andrea Achiíz Díaz	Personera Municipal	Respuesta a oficio PMCH 070 informe de avance convenio 2708 de 2024
211-1-869	11-abr-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Solicitud prórroga del convenio solidario 3609 de 2024 Programa caminos comunitarios de la paz total JAC
211-1-870	11-abr-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Solicitud prórroga del convenio solidario 3768 de 2024 Programa caminos comunitarios de la paz total JAC
211-1-871	11-abr-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Solicitud prórroga del convenio solidario 2338 de 2024 Programa caminos comunitarios de la paz total JAC
211-1-872	11-abr-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Solicitud prórroga del convenio solidario 3776 de 2024 Programa caminos comunitarios de la paz total JAC

CÓDIGO CONSECUTIVO DE ENVIADO	FECHA DEL DOCUMENTO	ENTIDAD DESTINATARIA	PERSONA DESTINATARIA	CARGO DE PERSONA DESTINATARIA	ASUNTO TRATADO
211-1-873	11-abr-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Solicitud ampliación suspensión del convenio solidario 4020 de 2024 programa caminos comunitarios de la paz total JAC La Cañada - Agrado.
211-1-874	10-abr-25	INVIAS	Ing. Jose Miguel Ortega Ortiz	Supervisor contrato de interventoría 3697 de 2024	Traslado vía sebra rendimientos financieros convenio No. 2105 de 2024 Periodo FEBRERO DE 2025.
211-1-875	10-abr-25	JAC VEREDA LA SIRIA BARAYA-HUILA	Yaneth Heredia Jimenez	Presidente de la JAC vereda La Siria Baraya-Huila	Solicitud de información financiera para iniciar proceso de liquidación convenio 2110-2024 JAC LA SIRIA
211-1-876	10-abr-25	JAC VEREDA EL PROGRESO BARAYA-HUILA	Blanca Aurora Calderon Fierro	Presidente de la JAC vereda El Progreso Baraya-Huila	Solicitud de información financiera para iniciar proceso de liquidación convenio 2423-2024 JAC EL PROGRESO
211-1-877	11-abr-25	JAC VERSALLES COLOMBIA - HUILA	Victor Henry Camero Vargas	Presidente de la JAC vereda Versalles Colombia-Huila	CERTIFICADO DE REUTILIZACIÓN MATERIAL RCD EN OBRA
211-1-878	11-abr-25	INVIAS	Ing. Angie Juliet Mila Días	Subdirectora de Sostenibilidad	CERTIFICADO DE GENERACIÓN DE NO PASIVOS AMBIENTALES
211-1-879	11-abr-25	INVIAS	Ing. Angie Juliet Mila Días	Subdirectora de Sostenibilidad	Entrega del Plan de Gestión Social Inicial del Convenio Solidario N°2338 de 2024 JAC Versalles - Acevedo.
211-1-880	11-abr-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Reiteración de comprobante de pago de pólizas convenios prorrogados y suspendidos 2024
211-1-881	11-abr-25	INVIAS	Ing. Angie Juliet Mila Días	Subdirectora de Sostenibilidad	ENTREGA DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL FINAL CONVENIO 2708 DE 2024
211-1-882	11-abr-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Informe Avance Semanal Convenios 2024 MEPI-MN1-IN-15-FR-3 N°26
211-1-883	14-abr-25	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	Compañía Mundial de Seguros S.A	Compañía Mundial de Seguros S.A	Solicitud de expedición de paz y salvo por pago de póliza convenio 2111 de 2024
211-1-884	14-abr-25	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	Compañía Mundial de Seguros S.A	Compañía Mundial de Seguros S.A	Solicitud de expedición de paz y salvo por pago de póliza convenio 3609 de 2024
211-1-885	14-abr-25	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	Compañía Mundial de Seguros S.A	Compañía Mundial de Seguros S.A	Solicitud de expedición de paz y salvo por pago de póliza convenio 2151 de 2024

CÓDIGO CONSECUTIVO DE ENVIADO	FECHA DEL DOCUMENTO	ENTIDAD DESTINATARIA	PERSONA DESTINATARIA	CARGO DE PERSONA DESTINATARIA	ASUNTO TRATADO
211-1-886	14-abr-25	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	Compañía Mundial de Seguros S.A	Compañía Mundial de Seguros S.A	Solicitud de expedición de paz y salvo por pago de póliza convenio 2190 de 2024
211-1-887	14-abr-25	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	Compañía Mundial de Seguros S.A	Compañía Mundial de Seguros S.A	Solicitud de expedición de paz y salvo por pago de póliza convenio 2799 de 2024
211-1-888	14-abr-25	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	Compañía Mundial de Seguros S.A	Compañía Mundial de Seguros S.A	Solicitud de expedición de paz y salvo por pago de póliza convenio 2788 de 2024
211-1-889	14-abr-25	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	Compañía Mundial de Seguros S.A	Compañía Mundial de Seguros S.A	Solicitud de expedición de paz y salvo por pago de póliza convenio 2433 de 2024
211-1-890	14-abr-25	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	Compañía Mundial de Seguros S.A	Compañía Mundial de Seguros S.A	Solicitud de expedición de paz y salvo por pago de póliza convenio 2060 de 2024
211-1-891	14-abr-25	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	Compañía Mundial de Seguros S.A	Compañía Mundial de Seguros S.A	Solicitud de expedición de paz y salvo por pago de póliza convenio 2269 de 2024
211-1-892	14-abr-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Matriz de seguimiento técnico CCPT_INTERECO N° 27
211-1-893	15-abr-25	INVIAS	Ing. Jose Miguel Ortega Ortiz	Supervisor contrato de interventoría 3697 de 2024	Traslado vía sebra rendimientos financieros convenio No. 2318 de 2024 Periodo FEBRERO Y MARZO DE 2025.
211-1-894	15-abr-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Informe mensual de actividades de contrato 3697 de 2024_MARZO
211-1-895	15-abr-25	INVIAS	Ing. Jose Miguel Ortega Ortiz	Supervisor contrato de interventoría 3697 de 2024	Traslado vía sebra rendimientos financieros convenio No. 2060 de 2024 Periodo MARZO DE 2025.
211-1-896	16-abr-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Entrega factura No. 4 consorcio inter eco del acta de costos No 4 del mes de enero de 2025.
211-1-897	16-abr-25	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM	Ing. Camilo Augusto Agudelo Perdomo	Director	Solicitud certificado NO PROCESOS EN CURSO del convenio solidario N°2692 de 2024 JAC El Colon – Algeciras.
211-1-898	16-abr-25	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM	Ing. Camilo Augusto Agudelo Perdomo	Director	Solicitud certificado NO PROCESOS EN CURSO del convenio solidario N°2109 de 2024 JAC Morelia – Saladoblanco.
211-1-899	16-abr-25	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM	Ing. Camilo Augusto Agudelo Perdomo	Director	Solicitud certificado NO PROCESOS EN CURSO del convenio solidario N°2280 de 2024 JAC La Cabaña – Saladoblanco.

CÓDIGO CONSECUTIVO DE ENVIADO	FECHA DEL DOCUMENTO	ENTIDAD DESTINATARIA	PERSONA DESTINATARIA	CARGO DE PERSONA DESTINATARIA	ASUNTO TRATADO
211-1-900	16-abr-25	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM	Ing. Camilo Augusto Agudelo Perdomo	Director	Solicitud certificado NO PROCESOS EN CURSO del convenio solidario N°2799 de 2024 JAC Gallego – La Plata.
211-1-901	16-abr-25	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM	Ing. Camilo Augusto Agudelo Perdomo	Director	Solicitud certificado NO PROCESOS EN CURSO del convenio solidario N°2064 de 2024 JAC Yarumal – Nataga.
211-1-902	16-abr-25	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM	Ing. Camilo Augusto Agudelo Perdomo	Director	Solicitud certificado NO PROCESOS EN CURSO del convenio solidario N°2111 de 2024 JAC La Cascajosa – Nátaga.
211-1-903	16-abr-25	JAC VEREDA INSPECCIÓN DEPARTAMENTAL DE POLICÍA DE LA CABAÑA SALADOBLANCO-HUILA	Fabio Bolaños Urbano	Presidente de la JAC vereda Inspeccion Departamental de Policia de la Cabaña Saladoblanco-Huila	CERTIFICADO DE REUTILIZACIÓN MATERIAL RCD EN OBRA
211-1-904	16-abr-25	INVIAS	Ing. Angie Juliet Mila Días	Subdirectora de Sostenibilidad	CERTIFICADO DE GENERACIÓN DE NO PASIVOS AMBIENTALES
211-1-905	19-abr-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Informe Avance Semanal Convenios 2024 MEPI-MN1-IN-15-FR-3 N°27
211-1-906	21-abr-25	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM	Ing. Camilo Augusto Agudelo Perdomo	Director	Solicitud certificado NO PROCESOS EN CURSO del convenio solidario N°2138 de 2024 JAC La Unión– Colombia.
211-1-907	21-abr-25	INVIAS	Ing. Angie Juliet Mila Días	Subdirectora de Sostenibilidad	Certificación de complejidad baja convenio No. 3609 de 2024 – NO PAGA.
211-1-908	21-abr-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Solicitud visita previa para entrega y recibo de los convenios.
211-1-909	21-abr-25	JAC VEREDA CALLE REAL AIPE-HUILA	Oliver Rada	Presidente de la JAC vereda Calle Real Aipe-Huila	Aprobación reutilización de material de excavación convenio 3609 de 2024
211-1-910	21-abr-25	JAC VEREDA CALLE REAL AIPE-HUILA	Oliver Rada	Presidente de la JAC vereda Calle Real Aipe-Huila	Entrega de Diseños Iniciales CALLE REAL 3609-2024
211-1-911	21-abr-25	JAC VEREDA PRAGA AIPE-HUILA	Henry Polania	Presidente de la JAC vereda Praga Aipe-Huila	Entrega de Diseños Iniciales PRAGA 3768-2024
211-1-912	21-abr-25	JAC VEREDA LA GALDA AGRADO-HUILA	Maria Lucila Granada Gutierrez	Presidente de la JAC vereda La Galda Agrado-Huila	Entrega de Diseños Iniciales LA GALDA 3776-2024
211-1-913	21-abr-25	JAC VEREDA LA CAÑADA AGRADO-HUILA	Martha Isabel Ortiz Mendez	Presidente de la JAC vereda La Cañada Agrado-Huila	Entrega de Diseños Iniciales LA CAÑADA 4020-2024

CÓDIGO CONSECUTIVO DE ENVIADO	FECHA DEL DOCUMENTO	ENTIDAD DESTINATARIA	PERSONA DESTINATARIA	CARGO DE PERSONA DESTINATARIA	ASUNTO TRATADO
211-1-914	21-abr-25	INVIAS	Ing. Jose Miguel Ortega Ortiz	Supervisor contrato de interventoría 3697 de 2024	Traslado vía sebra rendimientos financieros convenio No. 2150 de 2024 Periodo FEBRERO DE 2025.
211-1-915	21-abr-25	INVIAS	Ing. Jose Miguel Ortega Ortiz	Supervisor contrato de interventoría 3697 de 2024	Traslado vía sebra rendimientos financieros convenio No. 2139 de 2024 Periodo FEBRERO DE 2025.
211-1-916	21-abr-25	INVIAS	Ing. Jose Miguel Ortega Ortiz	Supervisor contrato de interventoría 3697 de 2024	Traslado vía sebra rendimientos financieros convenio No. 2423 de 2024 Periodo FEBRERO DE 2025.
211-1-917	21-abr-25	INVIAS	Ing. Jose Miguel Ortega Ortiz	Supervisor contrato de interventoría 3697 de 2024	Traslado vía sebra rendimientos financieros convenio No. 2110 de 2024 Periodo FEBRERO DE 2025.
211-1-918	22-abr-25	JAC VEREDA CALLE REAL AIPE-HUILA	Oliver Rada	Presidente de la JAC vereda Calle Real Aipe-Huila	Aprobación documento PGA - Convenio 3609 de 2024.
211-1-919	22-abr-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Matriz de seguimiento técnico CCPT_INTERECO N° 28
211-1-920	22-abr-25	INVIAS	Ing. Angie Juliet Mila Días	Subdirectora de Sostenibilidad	Entrega documentación ambiental inicial convenio No. 3609 de 2024.
211-1-921	22-abr-25	JAC VEREDA CALLE REAL AIPE-HUILA	Oliver Rada	Presidente de la JAC vereda Calle Real Aipe-Huila	Solicitud entrega formatos iniciales de gestión social
211-1-922	22-abr-25	INVIAS	Ing. Angie Juliet Mila Días	Subdirectora de Sostenibilidad	CERTIFICADO DE GENERACIÓN DE NO PASIVOS AMBIENTALES
211-1-923	22-abr-25	INVIAS	Ing. Angie Juliet Mila Días	Subdirectora de Sostenibilidad	Entrega Documentación de cierre del Plan de Gestión Social del Convenio Solidario N°2130 de 2024 JAC Los Naranjos Bajos – Algeciras.
211-1-924	22-abr-25	JAC VEREDA LA PARADA BARAYA-HUILA	Oliver Trujillo Esquiivel	Presidenete de la JAC vereda La Parada Baraya-Huila	CERTIFICADO DE REUTILIZACIÓN MATERIAL RCD EN OBRA
211-1-925	23-abr-25	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM	Ing. Camilo Augusto Agudelo Perdomo	Director	Solicitud certificado NO PROCESOS EN CURSO del convenio solidario N°2190 de 2024 JAC Horizonte – Colombia.
211-1-926	23-abr-25	BANCO AV VILLAS	Lida Patricia Lopez Gutierrez	Gerente Banco Av Villas Sede Pitalito	Cambio de firma apoderado del interventor Vereda Versalles del municipio de Acevedo - Huila
211-1-927	23-abr-25	INVIAS	Ing. Angie Juliet Mila Días	Subdirectora de Sostenibilidad	Entrega Documentación de cierre del Plan de Gestión Social del Convenio Solidario N°2109 de 2024 JAC Morelia - Saladoblanco
211-1-928	23-abr-25	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	Compañía Mundial de Seguros S.A	Compañía Mundial de Seguros S.A	Solicitud de expedición de paz y salvo por pago de póliza convenio 2799 de 2024

CÓDIGO CONSECUTIVO DE ENVIADO	FECHA DEL DOCUMENTO	ENTIDAD DESTINATARIA	PERSONA DESTINATARIA	CARGO DE PERSONA DESTINATARIA	ASUNTO TRATADO
211-1-929	23-abr-25	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	Compañía Mundial de Seguros S.A	Compañía Mundial de Seguros S.A	Solicitud de expedición de paz y salvo por pago de póliza convenio 2788 de 2024
211-1-930	24-abr-25	JAC VEREDA CALLE REAL AIPE-HUILA	Oliver Rada	Presidente de la JAC vereda Calle Real Aipe-Huila	Requerimientos para el inicio y desarrollo de las obras.
211-1-931	24-abr-25	JAC VEREDA CALLE REAL AIPE-HUILA	Oliver Rada	Presidente de la JAC vereda Calle Real Aipe-Huila	Solicitud de modelo del DISEÑO PAVIMENTO EN PLACA HUELLA vereda Calle Real convenio 3609 - 2024
211-1-932	24-abr-25	INVIAS	Ing. Angie Juliet Mila Días	Subdirectora de Sostenibilidad	Entrega documentación de cierre del plan de gestión social del convenio solidario N°2060 de 2024 JAC Agua Fría – Hobo
211-1-933	24-abr-25	JAC VEREDA LA SIRIA BARAYA-HUILA	Yaneth Heredia Jimenez	Presidente de la JAC vereda La Siria Baraya-Huila	Reiteración entrega facturas de compra del Plan de Inversión Social aprobado al convenio solidario N°2110 de 2024 JAC Siria – Baraya.
211-1-934	24-abr-25	JAC VEREDA EL PROGRESO BARAYA-HUILA	Blanca Aurora Calderon Fierro	Presidente de la JAC vereda El Progreso Baraya-Huila	Reiteración entrega facturas de compra del Plan de Inversión Social aprobado al convenio solidario N°2423 de 2024 JAC Progreso– Baraya
211-1-935	25-abr-25	INVIAS	Ing. Angie Juliet Mila Días	Subdirectora de Sostenibilidad	ENTREGA DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL FINAL CONVENIO 2318 DE 2024
211-1-936	25-abr-25	JAC VEREDA VERSALLES ACEVEEDO-HUILA	Jhon Jairo Moreno Gaviria	Presidente de la JAC vereda Versalles Acevedo-Huila	Aprobación reutilización de material de excavación convenio 2338 de 2024
211-1-937	25-abr-25	INVIAS	Ing. Angie Juliet Mila Días	Subdirectora de Sostenibilidad	Certificación de complejidad baja convenio No. 2338 de 2024 – NO PAGA.
211-1-938	25-abr-25	JAC VEREDA VERSALLES ACEVEEDO-HUILA	Jhon Jairo Moreno Gaviria	Presidente de la JAC vereda Versalles Acevedo-Huila	Aprobación documento PGA - Convenio 2338 de 2024.
211-1-939	25-abr-25	INVIAS	Ing. Angie Juliet Mila Días	Subdirectora de Sostenibilidad	Entrega documentación ambiental inicial convenio No. 2338 de 2024.
211-1-940	25-abr-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Solicitud suspensión del convenio solidario 3609 de 2024 programa Caminos comunitarios de la paz total JAC Calle Real – Aipe.
211-1-941	25-abr-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Solicitud suspensión del convenio solidario 3768 de 2024 programa Caminos comunitarios de la paz total JAC Praga – Aipe.

CÓDIGO CONSECUTIVO DE ENVIADO	FECHA DEL DOCUMENTO	ENTIDAD DESTINATARIA	PERSONA DESTINATARIA	CARGO DE PERSONA DESTINATARIA	ASUNTO TRATADO
211-1-942	25-abr-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Solicitud suspensión del convenio solidario 2190 de 2024 programa Caminos comunitarios de la paz total JAC Horizonte – Colombia.
211-1-943	25-abr-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Solicitud suspensión del convenio solidario 2138 de 2024 programa Caminos comunitarios de la paz total JAC La Unión – Colombia.
211-1-944	25-abr-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Solicitud suspensión del convenio solidario 2433 de 2024 programa Caminos comunitarios de la paz total JAC La Esperanza – Colombia.
211-1-945	25-abr-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Solicitud suspensión del convenio solidario 2752 de 2024 programa Caminos comunitarios de la paz total JAC Santana – Colombia.
211-1-946	25-abr-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Solicitud suspensión del convenio solidario 2151 de 2024 programa Caminos comunitarios de la paz total JAC Antillas– Colombia.
211-1-947	25-abr-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Solicitud suspensión del convenio solidario 2788 de 2024 programa Caminos comunitarios de la paz total JAC Primavera – Acevedo.
211-1-948	25-abr-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Solicitud suspensión del convenio solidario 2639 de 2024 programa Caminos comunitarios de la paz total JAC San Jose de Riecito – Acevedo.
211-1-949	25-abr-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Solicitud suspensión del convenio solidario 2338 de 2024 programa Caminos comunitarios de la paz total JAC Versalles – Acevedo.
211-1-950	25-abr-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Solicitud suspensión del convenio solidario 3776 de 2024 programa Caminos comunitarios de la paz total JAC La Galda – Agrado.
211-1-951	26-abr-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Informe Avance Semanal Convenios 2024 MEPI-MN1-IN-15-FR-3 N°28
211-1-952	26-abr-25	INVIAS	Ing. Angie Juliet Mila Días	Subdirectora de Sostenibilidad	ENTREGA DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL FINAL CONVENIO 2105 DE 2024

CÓDIGO CONSECUTIVO DE ENVIADO	FECHA DEL DOCUMENTO	ENTIDAD DESTINATARIA	PERSONA DESTINATARIA	CARGO DE PERSONA DESTINATARIA	ASUNTO TRATADO
211-1-953	28-abr-25	INVIAS	Ing. Angie Juliet Mila Días	Subdirectora de Sostenibilidad	Entrega documentación de cierre del plan de gestión social del convenio solidario N°2708 de 2024 JAC Versalles – Colombia.
211-1-954	28-abr-25	INVIAS	Ing. Angie Juliet Mila Días	Subdirectora de Sostenibilidad	Entrega Documentación de cierre del Plan de Gestión Social del Convenio Solidario N°2064 de 2024 JAC Yarumal – Nátaga.
211-1-955	28-abr-25	JAC VEREDA YARUMAL NATAGA-HUILA	John Helbert Gonzalez Gonzalez	Presidente de la JAC vereda Yarumal Nataga-Huila	CERTIFICADO DE REUTILIZACIÓN MATERIAL RCD EN OBRA
211-1-956	28-abr-25	INVIAS	Ing. Angie Juliet Mila Días	Subdirectora de Sostenibilidad	CERTIFICADO DE GENERACIÓN DE NO PASIVOS AMBIENTALES
211-1-957	28-abr-25	INVIAS	Ing. Angie Juliet Mila Días	Subdirectora de Sostenibilidad	ENTREGA DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL FINAL CONVENIO 2064 DE 2024
211-1-958	28-abr-25	INVIAS	Ing. Angie Juliet Mila Días	Subdirectora de Sostenibilidad	Entrega Documentación de cierre del Plan de Gestión Social del Convenio Solidario N°2234 de 2024 JAC del Sector de Pueblo Viejo Inspección de Policía de Paraíso – Algeciras
211-1-959	28-abr-25	INVIAS	Ing. Angie Juliet Mila Días	Subdirectora de Sostenibilidad	Entrega documentación de cierre del plan de gestión social del convenio solidario N°2269 de 2024 JAC Paraiso – Colombia.
211-1-960	29-abr-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Matriz de seguimiento técnico CCPT_INTERECO N° 29
211-1-961	29-abr-25	JAC VEREDA EL PARAISO COLOMBIA-HUILA	Marisol Galindo Lozada	Presidente de la JAC vereda El Paraiso Colombia-Huila	CERTIFICADO DE REUTILIZACIÓN MATERIAL RCD EN OBRA
211-1-962	29-abr-25	INVIAS	Ing. Angie Juliet Mila Días	Subdirectora de Sostenibilidad	CERTIFICADO DE GENERACIÓN DE NO PASIVOS AMBIENTALES
211-1-963	29-abr-25	INVIAS	Ing. Angie Juliet Mila Días	Subdirectora de Sostenibilidad	ENTREGA DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL FINAL CONVENIO 2269 DE 2024
211-1-964	29-abr-25	INVIAS	Ing. Angie Juliet Mila Días	Subdirectora de Sostenibilidad	Entrega Documentación de cierre del Plan de Gestión Social del Convenio Solidario N°2692 de 2024 JAC Colon – Algeciras
211-1-965	29-abr-25	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	Compañía Mundial de Seguros S.A	Compañía Mundial de Seguros S.A	Solicitud inclusiones de actuaciones del convenio 3609 de 2024
211-1-966	29-abr-25	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	Compañía Mundial de Seguros S.A	Compañía Mundial de Seguros S.A	Solicitud inclusiones de actuaciones del convenio 2433 de 2024

CÓDIGO CONSECUTIVO DE ENVIADO	FECHA DEL DOCUMENTO	ENTIDAD DESTINATARIA	PERSONA DESTINATARIA	CARGO DE PERSONA DESTINATARIA	ASUNTO TRATADO
211-1-967	29-abr-25	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	Compañía Mundial de Seguros S.A	Compañía Mundial de Seguros S.A	Solicitud inclusiones de actuaciones del convenio 2060-2024
211-1-968	29-abr-25	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	Compañía Mundial de Seguros S.A	Compañía Mundial de Seguros S.A	Solicitud inclusiones de actuaciones del convenio 2138 de 2024
211-1-969	29-abr-25	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	Compañía Mundial de Seguros S.A	Compañía Mundial de Seguros S.A	Solicitud inclusiones de actuaciones del convenio 2639-2024
211-1-970	29-abr-25	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	Compañía Mundial de Seguros S.A	Compañía Mundial de Seguros S.A	Solicitud inclusiones de actuaciones del convenio 3776-2024
211-1-971	29-abr-25	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	Compañía Mundial de Seguros S.A	Compañía Mundial de Seguros S.A	Solicitud inclusiones de actuaciones del convenio 3768-2024
211-1-972	29-abr-25	JAC VEREDA NARANJOS BAJOS ALGECIRAS-HUILA	Maria Deyi Zamora Ramirez	Presidente de la JAC vereda Naranjos Bajos Algeciras-Huila	CERTIFICADO DE REUTILIZACIÓN MATERIAL RCD EN OBRA
211-1-973	29-abr-25	INVIAS	Ing. Angie Juliet Mila Días	Subdirectora de Sostenibilidad	CERTIFICADO DE GENERACIÓN DE NO PASIVOS AMBIENTALES
211-1-974	29-abr-25	INVIAS	Ing. Angie Juliet Mila Días	Subdirectora de Sostenibilidad	ENTREGA DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL FINAL CONVENIO 2130 DE 2024
211-1-975	30-abr-25	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM	Ing. Camilo Augusto Agudelo Perdomo	Director	Solicitud certificado NO PROCESOS EN CURSO del convenio solidario N° 2752 de 2024 JAC Santana – Colombia.
211-1-976	30-abr-25	JAC VEREDA SECTOR PUEBLO VIEJO ALGECIRAS-HUILA	Wuldarico Hoyos Chavarro	Presidente de la JAC vereda Sector Pueblo Viejo Algeciras-Huila	CERTIFICADO DE REUTILIZACIÓN MATERIAL RCD EN OBRA
211-1-977	30-abr-25	INVIAS	Ing. Angie Juliet Mila Días	Subdirectora de Sostenibilidad	CERTIFICADO DE GENERACIÓN DE NO PASIVOS AMBIENTALES
211-1-978	30-abr-25	INVIAS	Ing. Angie Juliet Mila Días	Subdirectora de Sostenibilidad	ENTREGA DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL FINAL CONVENIO 2234 DE 2024
211-1-979	30-abr-25	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM	Ing. Camilo Augusto Agudelo Perdomo	Director	Reiteración Solicitud certificado NO PROCESOS EN CURSO del convenio solidario N°2280 de 2024 JAC La Cabaña – Saladoblanco.
211-1-980	30-abr-25	INVIAS	Ing. Angie Juliet Mila Días	Subdirectora de Sostenibilidad	ENTREGA DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL FINAL CONVENIO 2234 DE 2024
211-1-981	30-abr-25	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM	Ing. Camilo Augusto Agudelo Perdomo	Director	Reiteración Solicitud certificado NO PROCESOS EN CURSO del convenio solidario N°2109 de 2024 JAC Morelia – Saladoblanco.
211-1-982	30-abr-25	JAC MORELIA SALADOBLANCO -HUILA	Orlando Hiles Hoyos	Presidente de la JAC vereda Morelia Saladoblanco-Huila	CERTIFICADO DE REUTILIZACIÓN MATERIAL RCD EN OBRA

CÓDIGO CONSECUTIVO DE ENVIADO	FECHA DEL DOCUMENTO	ENTIDAD DESTINATARIA	PERSONA DESTINATARIA	CARGO DE PERSONA DESTINATARIA	ASUNTO TRATADO
211-1-983	30-abr-25	INVIAS	Ing. Martha Helena Romero Moreno	Subdirectora de Sostenibilidad	CERTIFICADO DE GENERACIÓN DE NO PASIVOS AMBIENTALES
211-1-984	30-abr-25	INVIAS	Ing. Jesus Eduardo Rincon Silva	Director Territorial Huila	Revisión y Entrega acta de costos No 6 de interventoría mes de marzo de 2025.
211-1-985	30-abr-25	INVIAS	Ing. Martha Helena Romero Moreno	Subdirectora de Sostenibilidad	ENTREGA DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL FINAL CONVENIO 2109 DE 2024
211-1-986	30-abr-25	INVIAS	Ing. Martha Helena Romero Moreno	Subdirectora de Sostenibilidad	Entrega Documentación de cierre del Plan de Gestión Social del Convenio Solidario N°2280 de 2024 JAC de la Inspección departamental de Policía de La Cabaña - Saladoblanco

- Interventoría – correspondencia recibida

CÓDIGO CONSECUTIVO DE RECIBIDO	FECHA DE DOCUMENTO	FECHA DE RECIBO	ENTIDAD DE ORIGEN	DIRIGIDO A	ASUNTO TRATADO	REFERENCIA O CÓDIGO EXTERNO
211-3-212	31-mar-25	1-abr-25	CAM	Consorcio Inter Eco	Respuesta a solicitud con radicado CAM No. 2025-E 5168 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PARADA,	8527 2025-S
211-3-213	1-abr-25	1-abr-25	PERSONERIA MUNICIPAL DE COLOMBIA - HUILA	Consorcio Inter Eco	Seguimiento de compromisos adquiridos	PMCH 069
211-3-214	1-abr-25	1-abr-25	PERSONERIA MUNICIPAL DE COLOMBIA - HUILA	Consorcio Inter Eco	Solicitud informe de avance en la ejecución del convenio No. 2708-2024	PMCH 070
211-3-215	1-abr-25	1-abr-25	JAC VEREDA GALLEGO LA PLATA	Consorcio Inter Eco	Renuncia irrevocable contrato prestación de servicios contador publico convenio 2799-2024	N/A
211-3-216	2-abr-25	2-abr-25	CAM	Consorcio Inter Eco	Respuesta a solicitud con radicado CAM No. 2025-E 5854 de 2025 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL AGUA FRIA HOBO	9068 2025-S
211-3-217	5-abr-25	6-abr-25	JAC VEREDA LA PRIMAVERA ACEVEDO-HUILA	Consorcio Inter Eco	Solicitud para permitir el ágo de nomina a una cuenta distinta	N/A

CÓDIGO CONSECUTIVO DE RECIBIDO	FECHA DE DOCUMENTO	FECHA DE RECIBO	ENTIDAD DE ORIGEN	DIRIGIDO A	ASUNTO TRATADO	REFERENCIA O CÓDIGO EXTERNO
211-3-218	7-abr-25	7-abr-25	JAC VEREDA GALLEGO LA PLATA	Consorcio Inter Eco	Solicitud entrega y empalme contable y administrativo a la fecha y de acuerdo al porcentaje de ejecución que ya lleva la obra.	N/A
211-3-219	10-mar-25	12-abr-25	JAC VEREDA AGUA FRIA HOBO-HUILA	INVIAS	solicitud aclaración pago de pólizas iniciales convenio 2060 de 2024	N/A
211-3-220	16-abr-25	17-abr-25	JAC VEREDA VERSALLES ACEVEDO-HUILA	Consorcio Inter Eco	Solicitud de modificación de punto de inicio de pavimento rigido y autotización para construcción de alcantarilla - Convenio 2338-2024	N/A
211-3-221	21-abr-25	21-abr-25	JAC VEREDA CALLE REAL AIPE-HUILA	Consorcio Inter Eco	SOLICITA la APROBACIÓN por parte de la interventoría para que se pueda reutilizar elmaterial de excavación sobrante de las actividades en los diferentes rellenos ynivelaciones presentados en el mismo.	N/A
211-3-222	21-abr-25	21-abr-25	INVIAS	Consorcio Inter Eco	Productos Entregables de Ensayos de laboratorio de suelos y Estudios de Topografía-Convenios Agrado	2025S-VHUI-023943
211-3-223	21-abr-25	21-abr-25	INVIAS	Consorcio Inter Eco	Productos Entregables de Ensayos de laboratorio de suelos y Estudios de Topografía-Convenios Aipe	2025S-VHUI-023944
211-3-224	21-abr-25	21-abr-25	INVIAS	Consorcio Inter Eco	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-011729 Remisión documentación de inicio del convenio solidario No. 2433 de 2024 y contrato de interventoría No. 3697 de 2024.	2025S-VBOG-024003

CÓDIGO CONSECUTIVO DE RECIBIDO	FECHA DE DOCUMENTO	FECHA DE RECIBO	ENTIDAD DE ORIGEN	DIRIGIDO A	ASUNTO TRATADO	REFERENCIA O CÓDIGO EXTERNO
211-3-225	21-abr-25	21-abr-25	INVIAS	Consorcio Inter Eco	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-013381 Remisión documentación de inicio del convenio solidario No. 2109 de 2024 y contrato de interventoría No. 3697 de 2024.	2025S-VBOG-024016
211-3-226	21-abr-25	21-abr-25	JAC VEREDA CALLE REAL AIPE-HUILA	Consorcio Inter Eco	Envio de documentación ambiental inicial del convenio 3609 de 2024	OFICIO 001-25-JACCR
211-3-227	22-abr-25	22-abr-25	INVIAS	Consorcio Inter Eco	Solicitud de Información para el recibo de los Convenios Vigencia 2024 y del Contrato de Interventoría 3697-2024	2025S-VHUI-024272
211-3-228	22-abr-25	22-abr-25	INVIAS	Consorcio Inter Eco	Solicitud Balance de actualización de Pólizas	2025S-VHUI-024274
211-3-229	22-abr-25	22-abr-25	JAC VEREDA SAN JOSE DE RIECITO ACEVEDO-HUILA	Consorcio Inter Eco	Solicitud de reubicación de alcantarillas.	N/A
211-3-230	23-abr-25	24-abr-25	CAM	Consorcio Inter Eco	Respuesta a la solicitud con radicado CAM No. 2025-E9981 de abril 20 del 2025. Convenio 2064-2024	10808 2025-S
211-3-231	23-abr-25	25-abr-25	CAM	Consorcio Inter Eco	Respuesta a la solicitud con radicado CAM No. 2025-E9982 de abril 20 del 2025. Convenio 2111-2024	10809 2025-S
211-3-232	25-abr-25	25-abr-25	JAC VEREDA CALLE REAL AIPE-HUILA	Consorcio Inter Eco	Solicitud suspención convenio solidario No., 3609 de 2024	N/A
211-3-233	25-abr-25	25-abr-25	JAC VEREDA ANTILLAS COLOMBIA-HUILA	Consorcio Inter Eco	Solicitud Suspensión Convenio Solidario No. 2151 de 2024	N/A
211-3-234	25-abr-25	25-abr-25	JAC VEREDA HORIZONTE COLOMBIA-HUILA	Consorcio Inter Eco	Solicitud Suspensión Convenio Solidario No. 2190 de 2024	N/A

CÓDIGO CONSECUTIVO DE RECIBIDO	FECHA DE DOCUMENTO	FECHA DE RECIBO	ENTIDAD DE ORIGEN	DIRIGIDO A	ASUNTO TRATADO	REFERENCIA O CÓDIGO EXTERNO
211-3-235	25-abr-25	25-abr-25	JAC VEREDA LA ESPERANZA COLOMBIA-HUILA	Consorcio Inter Eco	Solicitud Suspensión Convenio Solidario No. 2433 de 2024	N/A
211-3-236	25-abr-25	25-abr-25	JAC VEREDA SANTANA COLOMBIA-HUILA	Consorcio Inter Eco	Solicitud Suspensión Convenio Solidario No. 2752 de 2024	N/A
211-3-237	25-abr-25	25-abr-25	JAC VEREDA LAUNION COLOMBIA-HUILA	Consorcio Inter Eco	Solicitud Suspensión Convenio Solidario No. 2138 de 2024	N/A
211-3-238	25-abr-25	25-abr-25	JAC VEREDA PRAGA AIPE-HUILA	Consorcio Inter Eco	Solicitud Suspensión Convenio Solidario No. 3768 de 2024	N/A
211-3-239	25-abr-25	25-abr-25	JAC VEREDA LA PRIMAVERA ACEVEDO-HUILA	Consorcio Inter Eco	Solicitud Suspensión Convenio Solidario No. 2788 de 2024	N/A
211-3-240	25-abr-25	25-abr-25	JAC VEREDA SAN JOSE DE RIECITOACEVEDO-HUILA	Consorcio Inter Eco	Solicitud Suspensión Convenio Solidario No. 2639 de 2024	N/A
211-3-241	25-abr-25	25-abr-25	JAC VEREDA VERSALLES ACEVEDO-HUILA	Consorcio Inter Eco	Solicitud Suspensión Convenio Solidario No. 2338 de 2024	N/A
211-3-242	25-abr-25	25-abr-25	JAC VEREDA LA GALDA AGRADO-HUILA	Consorcio Inter Eco	Solicitud Suspensión Convenio Solidario No. 3776 de 2024	N/A
211-3-243	25-abr-25	25-abr-25	JAC VEREDA EL PARAISO COLOMBIA-HUILA	Consorcio Inter Eco	Solicitud pago parcial del convenio 2269-2024 JAC Paraiso	N/A
211-3-244	28-abr-25	28-abr-25	INVIAS	Consorcio Inter Eco	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-016035 Remisión Plan de Inversión Social versión 3 del convenio solidario No. 2170 de 2024 y contrato de interventoría No. 3697 de 2024.	N/A
211-3-245	13-feb-25	29-abr-25	JAC VEREDA MORELIA SALADOBLAMCO-HUILA	Consorcio Inter Eco	Solicitud cambio de meta fisica	N/A
211-3-246	13-feb-25	29-abr-25	JAC VEREDA LA CABAÑA SALADOBLANCO-HUILA	Consorcio Inter Eco	Solicitud cambio de meta fisica	N/A

CÓDIGO CONSECUTIVO DE RECIBIDO	FECHA DE DOCUMENTO	FECHA DE RECIBO	ENTIDAD DE ORIGEN	DIRIGIDO A	ASUNTO TRATADO	REFERENCIA O CÓDIGO EXTERNO
211-3-247	25-feb-25	29-abr-25	JAC VEREDA MORELIA SALADOBLAMCO-HUILA	Consorcio Inter Eco	Aporte para ejecución del convenio 2109-2024	N/A
211-3-248	25-feb-25	29-abr-25	JAC VEREDA LA CABAÑA SALADOBLANCO-HUILA	Consorcio Inter Eco	Aporte para ejecución del convenio 2280-2024	N/A

4.2 Registro Fotográfico

El convenio se encuentra en proceso de liquidación.

4.3 Bitácora

El convenio se encuentra en proceso de liquidación.

4.4 Formatos Interventorías Convenios Solidarios

En el desarrollo de los convenios se entregan formatos de maquinaria y equipos, estado general del tiempo, garantías del convenio, resumen mensual estado general del convenio, personal control aportes legales y seguridad social, información financiera y presupuestal, garantías y seguro de obra, acta mensual de pagos convenio, informe inversión buen manejo de desembolso, plan inversión desembolso mensual.

Cordialmente;



CARLOS EDUARDO FALLA VILLEGAS
Director de Interventoría
CONSORCIO INTER ECO

ANEXOS INTERVENTORÍA

- Informes especialistas y profesionales
- Planillas pago seguridad social mes abril de 2025
- Seguimiento Garantías Contrato de interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-13

Neiva, 6 de mayo de 2025

INFORME ACTIVIDADES DIRECTOR INTERVENTORÍA
PERIODO: ABRIL DE 2025

El presente informe tiene como propósito documentar las actividades realizadas durante el mes de abril de 2025 del Ing. CARLOS EDUARDO FALLA VILLEGAS –Director de Interventoría en el marco del CONTRATO NÚMERO 3697 DE 2024 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 5.

ESTADO GENERAL DE LOS CONVENIOS

- Convenios terminados

Con respecto a la terminación de las obras físicas, a la fecha se tienen terminadas las obras de los siguientes convenios los cuales se detallan así:

Terminados en marzo de 2025 (15)
- Convenio 2139 de 2024 Vereda La Troja Baraya
- Convenio 2318 de 2024 Vereda Puertas del Sol Tello.
- Convenio 2708 de 2024 Vereda Versalles Colombia.
- Convenio 2269 de 2024 Vereda Paraíso Colombia
- Convenio 2109 de 2024 Vereda Morelia Saladoblanco.
- Convenio 2280 de 2024 Vereda La Cabaña Saladoblanco
- Convenio 2234 de 2024 Vereda Pueblo Viejo Algeciras
- Convenio 2692 de 2024 Vereda Colon Algeciras
- Convenio 2130 de 2024 Vereda Naranjos Bajos Algeciras.
- Convenio 2150 de 2024 Vereda El Hotel Baraya
- Convenio 2060 de 2024 Vereda Agua Fría Hobo
- Convenio 2105 de 2024 Vereda La Parada Baraya
- Convenio 2423 de 2024 Vereda El Progreso Baraya
- Convenio 2110 de 2024 Vereda La Siria Baraya
- Convenio 2064 de 2024 Vereda Yarumal Nátaga

Convenios finalizados anteriormente y que se encuentran en revisión en proceso de evaluación de documentos para liquidación (5):
- Convenio 2087 de 2024 Vereda Salto de Bordones de Isnos.
- Convenio 2170 de 2024 Vereda Sinaí De Isnos.
- Convenio 2054 de 2024 Vereda La Muralla Isnos.
- Convenio 2063 de 2024 Vereda el Mesón de Garzón.
- Convenio 2108 de 2024 Vereda Batan de Hobo.

Oficina administrativa Calle 79b 42e – 239 Apto 703 Ciudad Jardín
Teléfonos (5) 3576115 – (5) 3853776
e-mail: c.intereco@gmail.com
Barranquilla – Colombia.

Convenios que fueron prorrogados y terminan en el mes de abril de 2025(2):
- Convenio 2111 de 2024 Vereda Cascajosa Nátaga
- Convenio 2799 de 2024 Vereda Gallego La Plata.

Convenios prorrogados que no terminan en abril y requerirán prórroga hasta el mes de mayo de 2025 (1):
- Convenio 2138 de 2024 Vereda La Unión Colombia

Es necesario aclarar que las condiciones climáticas del departamento han variado drásticamente después de semana santa que también ha sido reportado por los residentes de las JAC, al respecto de ocurrencia de lluvias intensas en la zona de los proyectos que han impedido el avance de las actividades y ocurrencia de imprevistos, cierre de vías, etc., afectando los siguientes convenios que consideraríamos requerir una prórroga hasta el mes de junio de 2025 (6):

- Convenio 2788 de 2024 Vereda Primavera Acevedo.
- Convenio 2151 de 2024 Vereda Antillas Colombia
- Convenio 2190 de 2024 Vereda Horizonte Colombia.
- Convenio 2433 de 2024 Vereda La Esperanza Colombia.
- Convenio 2752 de 2024 Vereda Santa Ana Colombia.
- Convenio 2639 de 2024 Vereda Riecito Acevedo.

Un convenio que estaba suspendido, fue reanudado el 11 de abril e inmediatamente prorrogado hasta el 30 de abril de 2025, que también requiere prórroga hasta el mes de junio (1):
- Convenio 2338 de 2024 Vereda Versalles Acevedo.

Convenio que no ha recibido recursos hasta la fecha (1):
- Convenio 4020-2024 de JAC Vereda La Cañada – Agrado

Convenios a los cuales se les giraron recursos recientemente y no alcanzan a ejecutarse en el mes de abril de 2025 y requieren prórroga al menos hasta el mes de junio (3):

- Convenio 3609 de 2024 Vereda Calle Real Aipe.
- Convenio 3776-2024 de JAC Vereda La Galda – Agrado
- Convenio 3768-2024 de JAC Vereda Praga – Aipe

TRÁMITE DE ACTAS Y SOLICITUDES

Realización y entrega para su debido trámite del acta de costos del mes de marzo de 2025.

En el entendido que los convenios solidarios que se encuentran en su fase de ejecución de obra han tenido que suspenderse a partir del 29 de abril con nueva fecha de vencimiento el 21 de mayo, por la afectación de las persistentes e impredecibles condiciones climáticas asociadas a la actual temporada de lluvias, además que algunos

Oficina administrativa Calle 79b 42e – 239 Apto 703 Ciudad Jardín
Teléfonos (5) 3576115 – (5) 3853776
e-mail: c.intereco@gmail.com
Barranquilla – Colombia.

convenios presentan dificultades para la consecución del personal requerido para la ejecución del proyecto, especialmente en lo relacionado con los perfiles técnicos y operativos que son del área de influencia del OAC exigidos por el convenio solidario. Estas dificultades han impedido conformar el equipo mínimo necesario para dar inicio a las actividades de obra, lo cual compromete el cumplimiento del cronograma previsto y afecta la calidad y oportunidad en la ejecución de las labores programadas. Ante la suspensión de los convenios la interventoría debe suspender también sus actividades para los siguientes convenios:

- Convenio 2788 de 2024 Vereda Primavera Acevedo.
- Convenio 2151 de 2024 Vereda Antillas Colombia
- Convenio 2190 de 2024 Vereda Horizonte Colombia.
- Convenio 2433 de 2024 Vereda La Esperanza Colombia.
- Convenio 2752 de 2024 Vereda Santa Ana Colombia.
- Convenio 2639 de 2024 Vereda Riecito Acevedo.
- Convenio 2338 de 2024 Vereda Versalles Acevedo.
- Convenio 3609 de 2024 Vereda Calle Real Aipe.
- Convenio 3776-2024 de JAC Vereda La Galda – Agrado
- Convenio 3768-2024 de JAC Vereda Praga – Aipe
- Convenio 2138 de 2024 Vereda La Unión Colombia

CONVENIOS EN VERIFICACIÓN DE PAGO DE PÓLIZAS

Se indica nuevamente que debido a la falta de actualización de la garantía única de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual conforme a las prórrogas No. 1 y 2 de algunos convenios; los siguientes no podrán ser recibidos ni liquidados hasta tanto no sea resuelta su situación:

Convenio 2111 de 2024 Vereda Cascajosa Nátaga
Convenio 2151 de 2024 Vereda Antillas Colombia
Convenio 2269 de 2024 Vereda Paraíso Colombia

ESTADO DE DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL

Para la liquidación de los convenios, se ha realizado el trámite o radicación ambiental y social de los proyectos ante la Subdirección de Sostenibilidad. En ese sentido tenemos el siguiente resumen:

- PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL
- No objeción inicial emitida por INVIAS a convenios: 22
- En espera de no objeción inicial INVIAS convenios: 8
- Convenios no presentados a INVIAS: 4
- Entrega final social 11
- En espera de no objeción final 11

Oficina administrativa Calle 79b 42e – 239 Apto 703 Ciudad Jardín
Teléfonos (5) 3576115 – (5) 3853776
e-mail: c.intereco@gmail.com
Barranquilla – Colombia.

- DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL
- No objeción emitida por INVIAS a convenios: 16
- En espera de aprob. INVIAS convenios: 14
- Convenios no presentados a INVIAS: 2
- Convenios radicados Ambiental final 7
- Respuesta de no objeción final ambiental 0

VISITAS, REUNIONES Y RECORRIDOS

En cuanto a los recorridos o visitas a los sitios de las obras de los convenios se presenta el siguiente informe:

En compromiso para la gestión de los pagos del convenio 2799 de 2024 JAC Gallego, se realizó la reclamación de la chequera en el banco Agrario sede La Plata.

11 de abril se hizo reconocimiento de las obras finalizadas del municipio de Isnos correspondientes a los convenios 2087 de 2024 Vereda Salto de Bordones, 2170 de 2024 Vereda Sinaí y 2054 de 2024 Vereda La Muralla, acompañando en ese recorrido al supervisor de la Territorial Huila. Al mismo tiempo, se efectuó trámite presencial en el banco Agrario del mismo municipio para el cierre de las cuentas bancarias en compañía de los presidentes de las JAC y de las contadoras.

15 de abril se realizó visita igualmente acompañando al supervisor de Invias en seguimiento de las obras de los convenios 2064 de 2024 Vereda Yarumal Nátaga, 2111 de 2024 Vereda Cascajosa Nátaga y 2799 de 2024 Vereda Gallego La Plata.

OTROS

Asistencia a comités de seguimiento convocados por el INVIAS.

Igualmente; se hace acompañamiento a los comités operativos que se realizan conjuntamente con los miembros de las JAC, ingenieros residentes de obra y contadores; programados por cada uno de los ingenieros residentes, personal social y ambiental de la interventoría.

CARLOS EDUARDO FALLA VILLEGAS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTER ECO

Oficina administrativa Calle 79b 42e – 239 Apto 703 Ciudad Jardín
Teléfonos (5) 3576115 – (5) 3853776
e-mail: c.intereco@gmail.com
Barranquilla – Colombia.

Neiva, 3 de Mayo de 2025

Informe del Ingeniero Residente de Interventoría – Zona Norte (Mes de Abril)

Contrato N. º 3697 de 2024 – Consorcio Inter Eco

Programa: Caminos Comunitarios para la Paz Total en el Departamento del Huila

INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como propósito detallar las actividades de supervisión e interventoría realizadas en el marco del Programa **Caminos Comunitarios para la Paz Total** en el departamento del Huila, correspondientes a la zona norte, durante el mes de Abril de 2025. Estas acciones hacen parte del proceso de interventoría técnica, administrativa y financiera que se ejerce sobre las obras en ejecución, velando por el cumplimiento de los compromisos contractuales, normativos y técnicos establecidos.

CUERPO DEL DOCUMENTO

Visitas Técnicas de Inspección de Obra

2.1 Visita técnica a la obra de Versalles – Municipio de Colombia (Convenio 2708 de 2024)

El día 2 de abril de 2025 se llevó a cabo una visita técnica de seguimiento a la obra ubicada en la vereda Versalles del municipio de Colombia, como continuación de la visita del 21 de marzo del presente año, en la que se habían

formulado una serie de recomendaciones necesarias para el recibo final por parte de la interventoría.

Durante esta nueva inspección se evidenció que las recomendaciones anteriores fueron atendidas en su mayoría, sin embargo, persisten pendientes como la limpieza de cabezales y la correcta disposición del relleno en una de las alcantarillas. La Junta de Acción Comunal (JAC) se comprometió a resolver estas observaciones en el menor tiempo posible, al igual que a instalar la valla de obra correspondiente.

2.2 Visita técnica a la obra de La Siria – Municipio de Baraya (Convenio 2110)

El 22 de abril se realizó visita técnica a la obra en la vereda La Siria. Se inspeccionaron las alcantarillas construidas y se verificó la atención a las observaciones previamente formuladas. Se constató que fueron corregidas las observaciones sobre limpieza y organización del anillado de los tubos de concreto de 36 pulg.

Quedaron pendientes por atender aspectos relacionados con:

- Reparación de la batea existente (actividad no contractual).
- Sellado de juntas del pavimento rígido.
- Instalación de la valla de obra.

Adicionalmente, se verificó que la obra social asociada se encuentra ejecutada en un 100%.

2.3 Visita técnica a la obra El Progreso – Municipio de Baraya

También el 22 de abril se inspeccionó la obra en la vereda El Progreso. Durante la visita se formularon observaciones relacionadas con:

- Limpieza general de la obra.
- Tratamiento adecuado de las dilataciones en el pavimento.
- Sellado de juntas.
- Instalación de la valla de obra.

Respecto a la obra social, se confirmó la construcción de la caseta comunal con mano de obra aportada por el proyecto. No obstante, se observó que algunas tejas aportadas por la comunidad presentan perforaciones que deben ser selladas para garantizar su funcionalidad.

2.4 Visita técnica a la obra La Parada – Municipio de Baraya (Convenio 2105)

En esta visita, también efectuada el 22 de abril, se verificó que la mayoría de observaciones para el recibo de la obra fueron subsanadas. Los pendientes identificados fueron:

- Limpieza en ciertas zonas específicas de la obra.
- Instalación de la valla de obra.

No se encontraron fisuras ni condiciones que comprometieran la estabilidad estructural de la obra. La obra social fue ejecutada correctamente y sin reparos.

2.5 Comités operativos

Convenio 2060 – Vereda Agua Fría El Batán: El comité se llevó a cabo el 7 de abril de 2025. Se discutieron temas generales para la liquidación del convenio, y se realizaron solicitudes para la entrega de documentos faltantes.

Vereda Horizonte – Municipio de Colombia: El comité se realizó el 14 de abril con la participación de la JAC. Se aprobaron compras y pagos al personal de obra, además de abordar aspectos logísticos y generales del proyecto.

2.6 Reunión en la Personería del Municipio de Colombia

El 30 de abril se asistió a reunión convocada por la Personería para hacer seguimiento a compromisos adquiridos por la JAC del convenio 2708 (Vereda Versalles), los cuales fueron:

Cumplidos: Relleno de alcantarillas y pago a proveedores.

Pendiente: Reunión con la comunidad, aplazada por condiciones climáticas adversas (fuertes lluvias).

2.7 Atención a requerimientos de la Personería

Se dio respuesta a los oficios No. 069 y 070, emitidos por la Personería del municipio de Colombia, los días 3 y 9 de abril, respectivamente. En dichas respuestas se entregó información detallada sobre la contabilidad y la ejecución del convenio 2708 de JAC de la Vereda Versalles.

REGISTRO FOTOGRAFICO

COLOMBIA - VERSALLES









BARAYA – LA SIRIA







BARAYA – EL PROGRESO





BARAYA – LA PARADA











COMITES OPERATIVOS

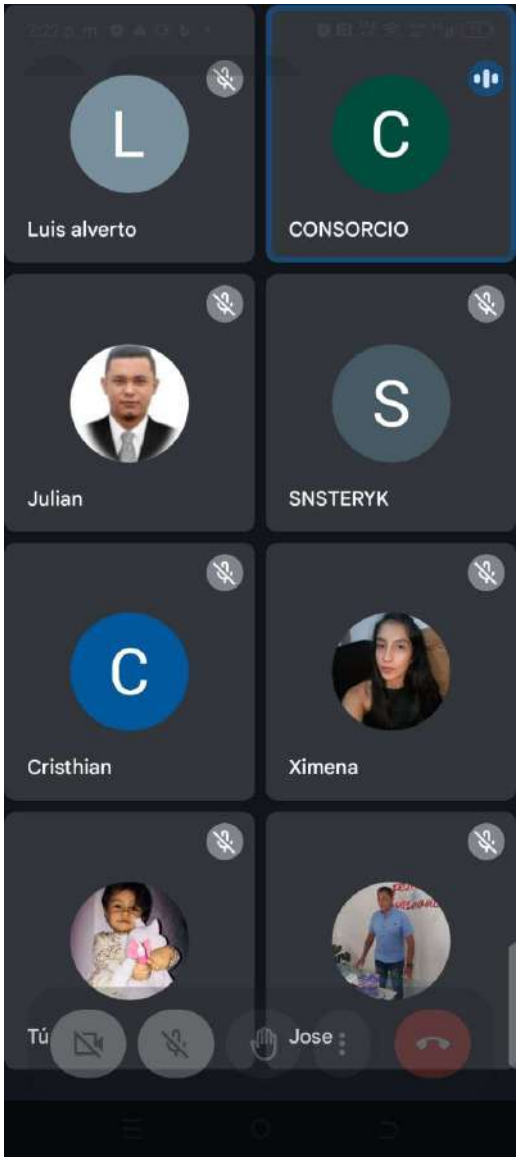

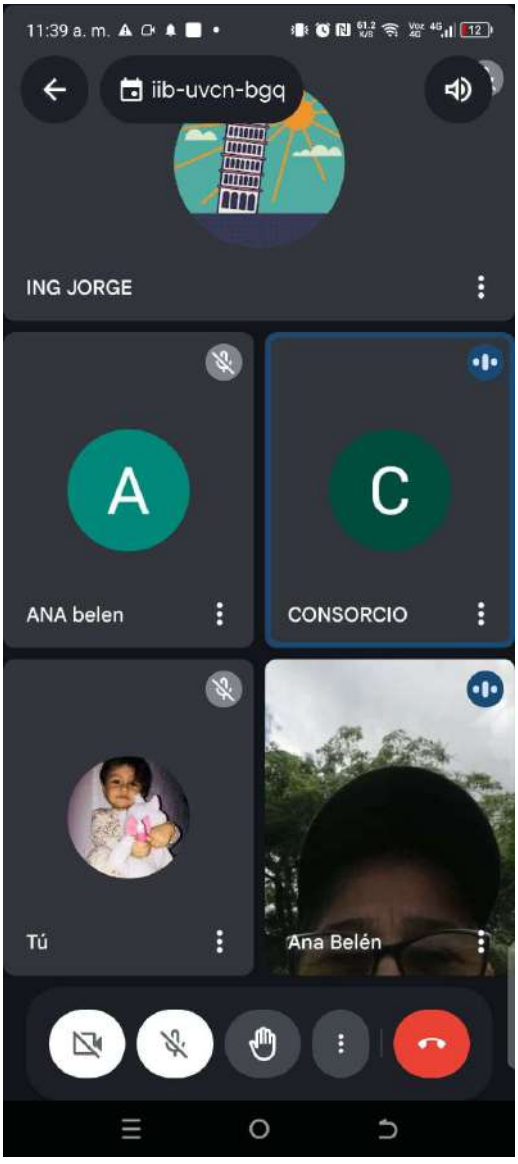

Neiva, 02 de mayo de 2025

INFORME ACTIVIDADES RESIDENTE DE INTERVENTORÍA ZONA SUR

PERIODO: ABRIL DE 2025

El presente informe tiene como propósito documentar las actividades realizadas durante el mes de abril de 2025 del Ing. Mario Fernando Castillo Rojas Residente de Interventoría de la zona sur en el marco del CONTRATO NÚMERO 3697 DE 2024 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 5.

Durante el presente periodo se realizó comité operativo con las siguientes juntas de acción comunal:

Comité operativo Vereda Morelia salado blanco 01/04/2025

Comité operativo Vereda Cabaña Salado blanco 01/04/2025

Comité operativo Vereda Yarumal Nataga 1/04/2025

Comité operativo Vereda San José de Reicito Acevedo 5/04/2025

Comité operativo Vereda Versalles Acevedo 07/04/2025

Comité operativo Vereda Gallego La Plata 10/04/2025

Comité operativo Vereda cascajosa Nataga 15/04/2025

Comité operativo Vereda Gallego La Plata 28/04/2025

Comité operativo Vereda San José de Reicito Acevedo 23/04/2025

Comité operativo Vereda San José de Reicito Acevedo 25/04/2025

Comité operativo Vereda Primavera Acevedo 25/04/2025

Comité operativo Vereda Versalles Acevedo 25/04/2025

Oficina administrativa Calle 79b 42e – 239 Apto 703 Ciudad Jardín
Teléfonos (5) 3576115 – (5) 3853776
e-mail: c.intereco@gmail.com
Barranquilla – Colombia.

VISITAS, REUNIONES Y RECORRIDOS

En cuanto a los recorridos o visitas a los sitios de las obras de los convenios se presenta el siguiente informe:

El 04 de abril se realiza visita a la vereda Naranjos Bajos para hacer entrega de la obra social y la obra civil la cual consistió en la construcción 162 ml de placa huella.

El 07 de abril se realiza visita a la vereda Morelia del municipio de Saladoblanco, para hacer entrega de la obra social y la obra civil la cual consistió en la construcción 100 ml de pavimento rígido.

El 07 de abril se realiza visita a la vereda La Cabaña del municipio de Saladoblanco, para hacer entrega de la obra social y la obra civil la cual consistió en la construcción 100 ml de pavimento rígido.

El 09 de abril se realiza visita a la vereda Yarumal del municipio de Nátaga, para hacer entrega de la obra social y la obra civil la cual consistió en la construcción un box culvert, 2 alcantarillas y un muro en gavión, adicionalmente se logró la construcción de un muro de 2.9 largo por 1.5 de alto.

El 23 de abril se realiza visita de obra a la vereda gallego del municipio de la plata, evidenciando la construcción de 160 ml de placa huella terminado, se estaba realizando la instalación de formaleta para la construcción de 30 ml adicionales de placa huella, se esta realizando el acopio de material.

El 23 de abril se realiza visita de obra a la vereda Cascajosa del municipio de Nátaga, evidenciando la construcción de 180 ml de placa huella terminado, se estaba realizando la fundida de cunetas, se encuentra pendiente la construcción de 150 ml de bordillo, se informó a la presidenta de la JAC la necesidad de apoyar con personal de acuerdo con el compromiso adquirido a inicios del mes de abril.

El 24 de abril se realiza visita de obra a la vereda pueblo viejo del municipio de Algeciras para hacer entrega de la obra social y la obra civil la cual consistió en la construcción 117 ml de pavimento rígido.

Oficina administrativa Calle 79b 42e – 239 Apto 703 Ciudad Jardín
Teléfonos (5) 3576115 – (5) 3853776
e-mail: c.intereco@gmail.com
Barranquilla – Colombia.

El 24 de abril se realiza visita de obra a la vereda Colon del municipio de Algeciras para hacer entrega de la obra social y la obra civil la cual consistió en la construcción 90 ml de pavimento rígido.

Atentamente,

MARIO FERNANDO CASTILLO ROJAS
Residente De Interventoría Zona Sur
CONSORCIO INTER ECO

Registro fotográfico





Visita entrega obra civil y social vereda Naranjos Bajos – Algeciras





Visita entrega obra civil y social vereda Naranjos Bajos – Algeciras

Oficina administrativa Calle 79b 42e – 239 Apto 703 Ciudad Jardín
Teléfonos (5) 3576115 – (5) 3853776
e-mail: c.intereco@gmail.com
Barranquilla – Colombia.





Visita entrega obra civil y social vereda Morelia – Salado Blanco





Visita entrega obra civil y social vereda Morelia – Salado Blanco





Visita entrega obra civil y social vereda Cabaña – Salado Blanco

Oficina administrativa Calle 79b 42e – 239 Apto 703 Ciudad Jardín
Teléfonos (5) 3576115 – (5) 3853776
e-mail: c.intereco@gmail.com
Barranquilla – Colombia.





Visita entrega obra civil y social vereda Cabaña – Salado Blanco





Visita entrega obra civil y social vereda Yarumal – Nátaga





Visita entrega obra civil y social vereda Yarumal – Nátaga

Oficina administrativa Calle 79b 42e – 239 Apto 703 Ciudad Jardín
Teléfonos (5) 3576115 – (5) 3853776
e-mail: c.intereco@gmail.com
Barranquilla – Colombia.





Visita de obra Vereda Gallego – La Plata





Visita de obra vereda Cascajosa – Nátaga





Visita entrega obra civil y social vereda Yarumal – Nátaga

Oficina administrativa Calle 79b 42e – 239 Apto 703 Ciudad Jardín
Teléfonos (5) 3576115 – (5) 3853776
e-mail: c.intereco@gmail.com
Barranquilla – Colombia.

INFORME DE ACTIVIDADES AMBIENTALES ZONA NORTE

Fecha: 1 al 30 de abril de 2025
Entidad: Instituto Nacional de Vías (INVIAS), Territorial Huila.
Convenios: Zona Norte

- **Apoyo y seguimiento en la ejecución obra.**

Durante este periodo, se realiza apoyo y seguimiento en la liquidación de los siguientes convenios:

- Vereda EL HOTEL
- Vereda LA TROJA
- Vereda EL PROGRESO

- **Solicitud NO PROCESOS EN CURSO – CAM**

Durante el presente periodo se envió solicitud y reiteración de la solicitud a la CAM para obtención certificado NO PROCESOS EN CURSO de los siguientes convenios:

- 2138 de 2024
- 2190 de 2024

- **OBTENCIÓN CERTIFICADO NO PROCESOS EN CURSO CAM**

Durante el presente periodo, se obtuvo los siguientes certificados de NO PROCESOS EN CURSO por parte de la CAM

- 2105 de 2024
- 2060 de 2024

- ENTREGA DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL INICIAL DEL SIGUIENTE CONVENIO:

- 3609 de 2024, radicado recepción INVIAS 2025E-VUVRAZ-041311.

- Envío informe ambiental final de los siguientes convenios:

- 2105 de 2024 radicado recepción INVIAS 2025E-VUVRAZ-042873
- 2060 de 2024 radicado recepción INVIAS 2025E-VUVRAZ-035443
- 2269 de 2024, radicado recepción INVIAS 2025E-VUVRAZ-044345
- 2708 de 2024 radicado recepción INVIAS 2025E-VUVRAZ-038955



GUILLERMO ALBERTO ROJAS SANCHEZ
CC. 1.075.216.697
PROFESIONAL AMBIENTAL ZONA NORTE
CONSORCIO INTER ECO
CEL. 3104421539

INFORME DE ACTIVIDADES AMBIENTALES ZONA SUR

Fecha: 1 al 30 de abril de 2025
Entidad: Instituto Nacional de Vías (Invias), Territorial Huila.
Convenios: Zona Sur

- **Municipio Algeciras**:

- ✓ **Convenio 2234 – 2024: Paraíso Pueblo Viejo**

(30/04/2025): Se realizó la entrega de la documentación de cierre ambiental a sostenibilidad del INVIAS para su respectiva NO OBJECIÓN. (**Anexo 1**. Oficio 211-1-978).

- ✓ **Convenio 2692 – 2024: Colon**

(16-04-2025): Se envió solicitud a la CAM para la certificación de No Procesos en curso del convenio. (**Anexo 2**. Oficio 211-1-897).

(03-05-2025): Se realizó la entrega de la documentación de cierre ambiental a sostenibilidad del INVIAS para su respectiva NO OBJECIÓN. (**Anexo 3**. Oficio 211-1-995).

- ✓ **Convenio 2130 – 2024: Naranjos Bajos**

(29/04/2025): Se realizó la entrega de la documentación de cierre ambiental a sostenibilidad del INVIAS para su respectiva NO OBJECIÓN. (**Anexo 4**. Oficio 211-1-974).

- **Municipio de Isnos:**

- ✓ **Convenio 2087-2024: Salto de Bordones**

(2/05/2025): Se realizó la entrega de la documentación de cierre ambiental a sostenibilidad del INVIAS para su respectiva NO OBJECIÓN. (**Anexo 5**. Oficio 211-1-992).

- ✓ Convenio 2170-2024: Sinaí

(2/04/2025): Se realizó la entrega de la documentación de cierre ambiental a sostenibilidad del INVIAS para su respectiva NO OBJECIÓN. (**Anexo 6**. Oficio 211-1-846).


- ✓ Convenio 2084-2024: La Muralla

(2/05/2025): Se realizó la entrega de la documentación de cierre ambiental a sostenibilidad del INVIAS para su respectiva NO OBJECIÓN. (**Anexo 7**. Oficio 211-1-989).


- ❖ **Municipio de Acevedo:**

- ✓ Convenio 2788-2024: La Primavera

(8-04-2025): Apoyé la realización del comité operativo N° 9, en el cual se hizo la aprobación de pagos de proveedores, se aprobaron cantidades adicionales requeridas para la ejecución de la obra, pagos de nómina, de seguridad social. (**Anexo 8**. Comité operativo 9 Primavera)

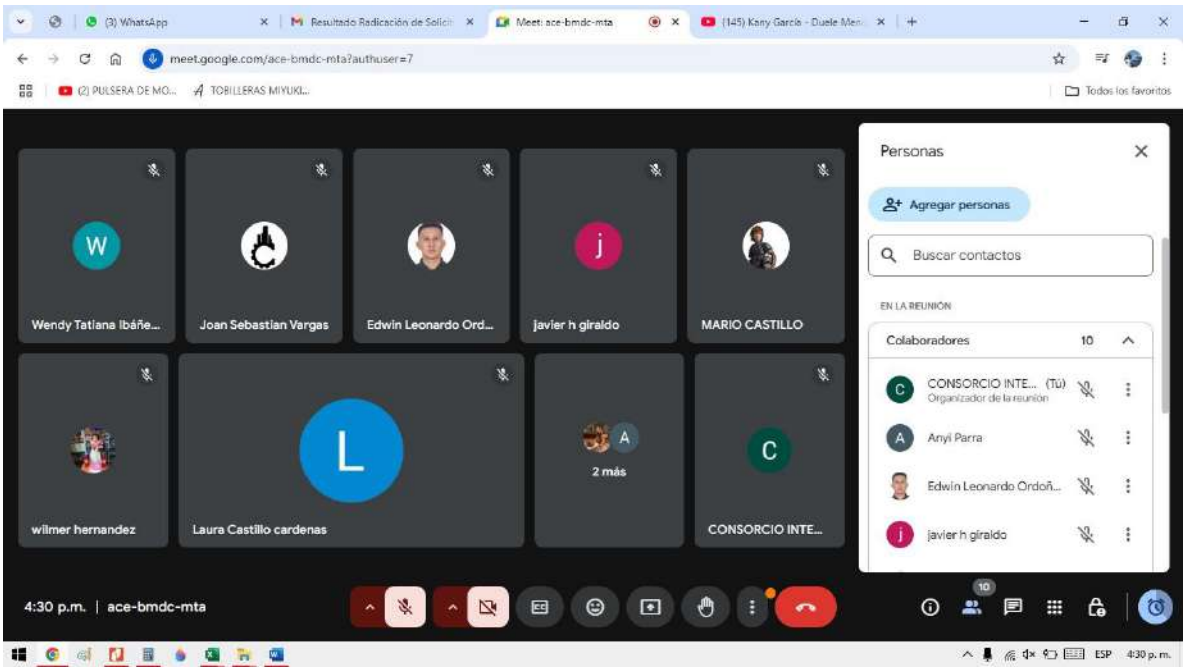

(25-04-2025): Apoyé la realización del comité operativo N° 10, en el cual se hizo la aprobación de pagos de proveedores, se aprobaron cantidades adicionales requeridas para la ejecución de la obra, pagos de nómina, de seguridad social. (**Anexo 9**. Comité operativo 10 Primavera)

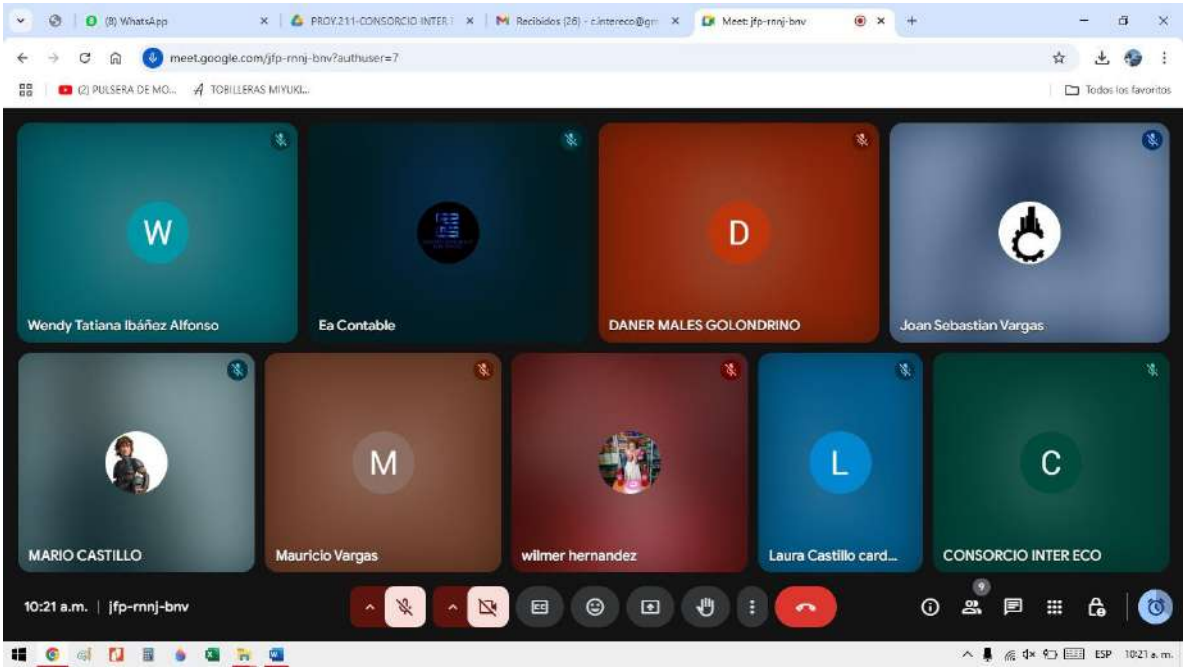

- ✓ Convenio 2639-2024: San José de Riecito


(25-04-2025): Participé en el comité operativo N° 6, en el cual solicité que se implementen las medidas ambientales en obra, por ello es importante dejar como evidencia de la implementación el registro fotográfico. Así mismo, se recuerda que se debe realizar charlas con el personal de obra, para lo cual se debe dejar registro de asistencia a la misma.


Se les informa que todos esos registros se van a requerir para el cierre final del área ambiental. Por ello, se solicita además que, se soliciten los respectivos paz y salvos a los proveedores una vez se efectúe el 100% de las compras Vs pagos, ya que estos también se requieren para el cierre final. (**Anexo 10**. Comité operativo 6 Riecito)




- ✓ Convenio 2338-2024: Versalles

(7-04-2025): Apoyé la realización del comité operativo N° 4, en el cual se hizo la aprobación del plan de compras y plan de obra social. Se solicitó hacer la entrega de la documentación ambiental inicial. (**Anexo 11**. Comité operativo 4 Versalles)

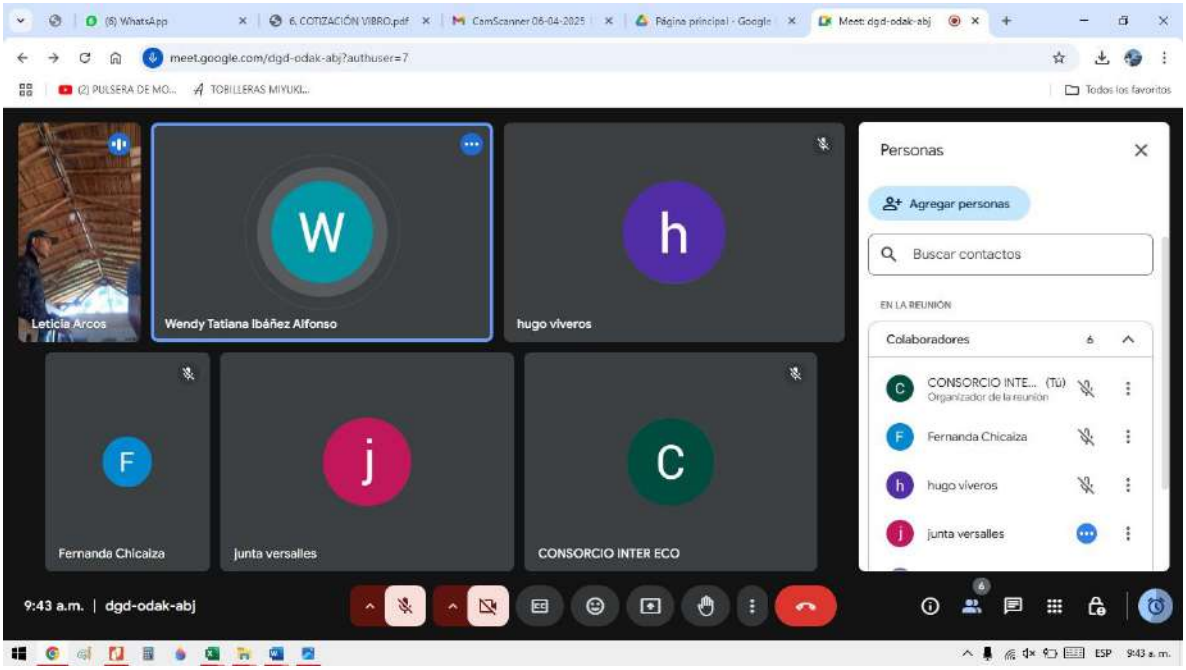

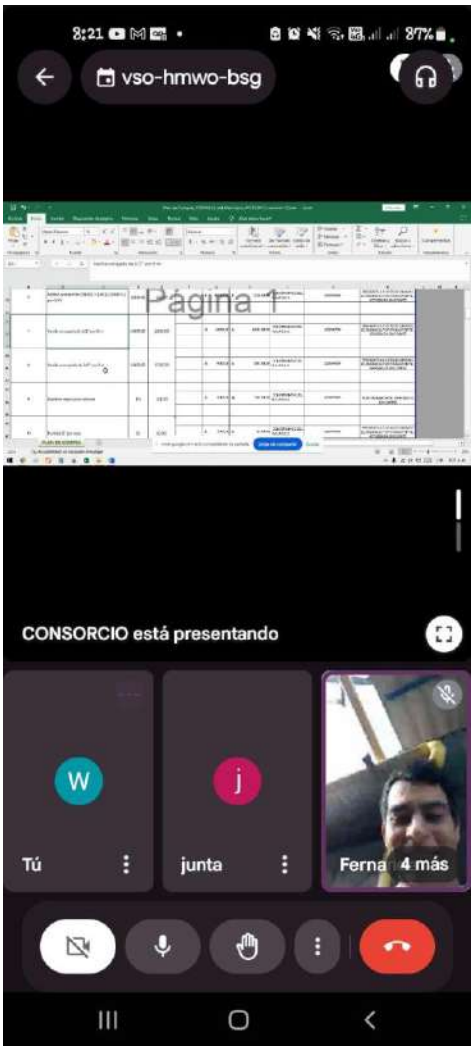


(21-04-2025): Apoyé la realización del comité operativo N° 5, en el cual se hizo la aprobación para el cambio del punto de inicio de obra, así mismo se aprobó la construcción de las alcantarillas en los puntos indicados por el residente de obra. Se solicitó presentar la primera cuenta de cobro para pago de proveedores. Y que se notifique fecha de inicio de obra, teniendo en cuenta que ya se cuanta con la aprobación del plan de compras. Se solicita la entrega de la documentación ambiental inicial. (**Anexo 12**. Comité operativo 5 Versalles)

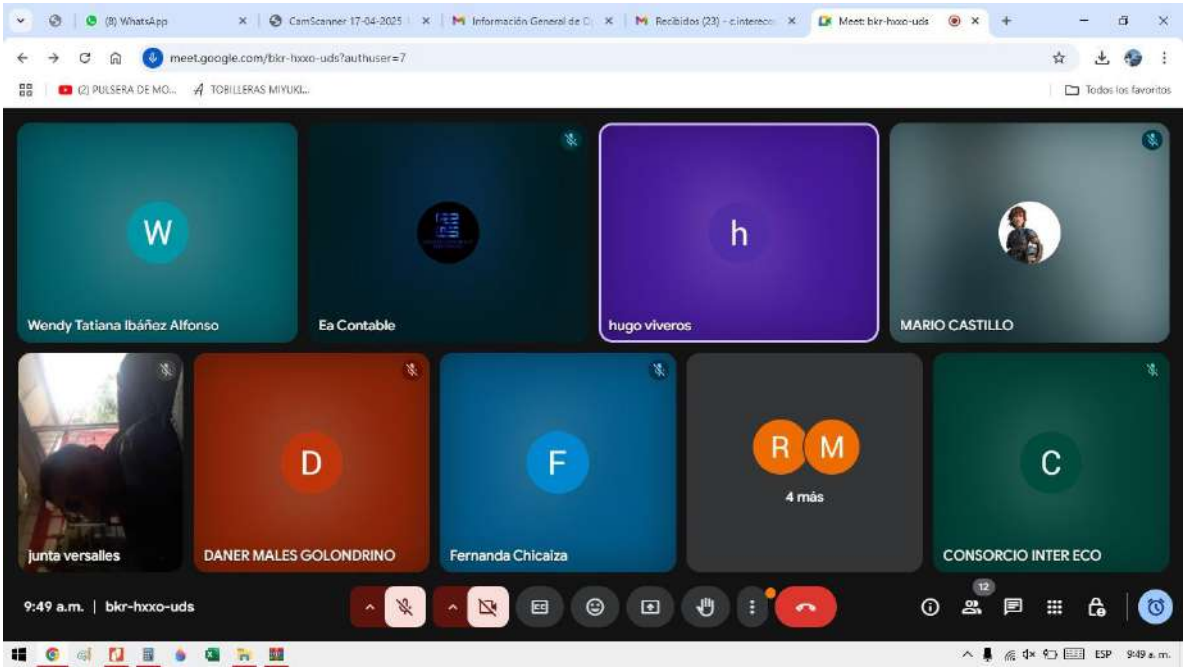

(23-04-2025): Apoyé la realización del oficio de cambio de firma por apoderado de interventoria ante el banco, para el tema de transferencias, teniendo en cuenta que la firma no estaba actualizada conforme al nuevo Director de Interventoría. (**Anexo 13**. Oficio 211-1-926)

(25-04-2025): Apoyé la realización del comité operativo N° 6, en el cual se hizo la aprobación de pagos de nómina, de seguridad social. Se solicitó hacer la entrega de los epp a los trabajadores. (**Anexo 14**. Comité operativo 6 Versalles)

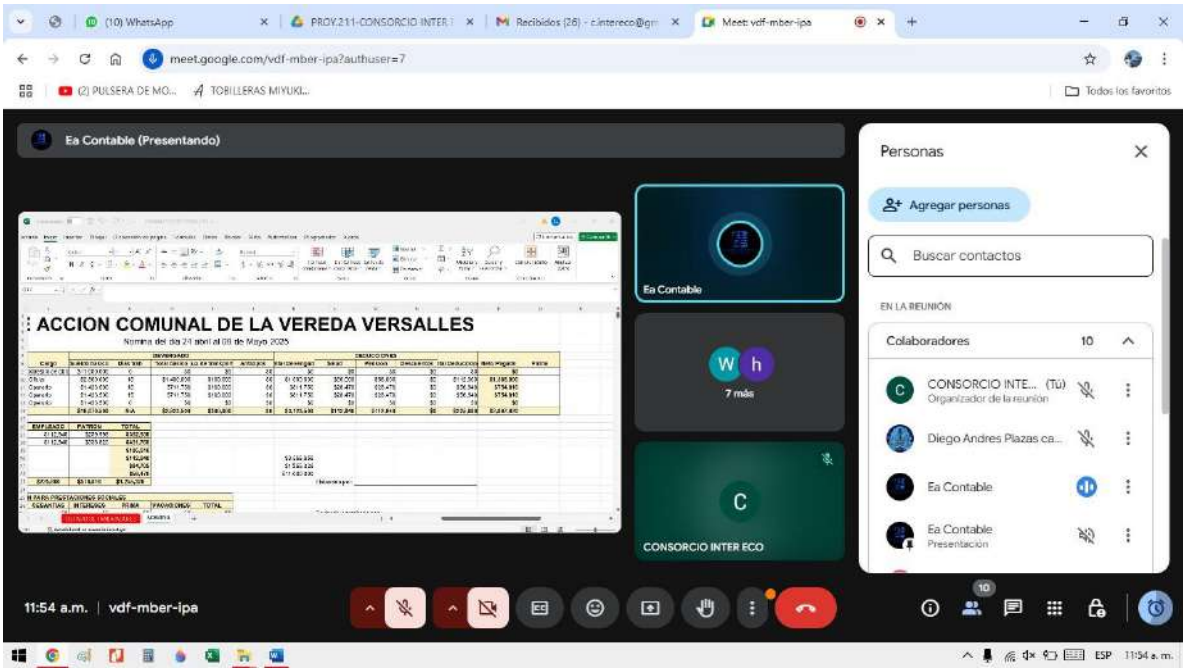

(25-04-2025): Se hizo entrega de la documentación ambiental inicial a sostenibilidad del INVIAS para la No Objeción. (**Anexo 15**. Oficio 211-1-939)

- **Municipio de Saladoblanco:**

- ✓ Convenio 2109-2024: Morelia

(16/04/2025): Se solicito a la CAM el certificado de No Procesos en curso del convenio. (**Anexo 16**. Oficio 211-1-898).

(30/04/2025): Se realizó la entrega de la documentación de cierre ambiental a sostenibilidad del INVIAS para su respectiva NO OBJECIÓN. (**Anexo 17**. Oficio 211-1-985).

- ✓ Convenio 2280-2024: La Cabaña

(16/04/2025): Se solicito a la CAM el certificado de No Procesos en curso del convenio. (**Anexo 18**. Oficio 211-1-899).

(30/04/2025): Se realizó la entrega de la documentación de cierre ambiental a sostenibilidad del INVIAS para su respectiva NO OBJECIÓN. (**Anexo 19**. Oficio 211-1-980).

- **Municipio de Garzón:**

- ✓ Convenio 2063-2024: El Mesón

(14/03/2025): Se realizó la entrega de la documentación de cierre ambiental a sostenibilidad del INVIAS para su respectiva NO OBJECIÓN. (**Anexo 20**. Oficio 211-1-777).

- **Municipio La Plata:**

(23/04/2025): Se realizó visita a campo para verificar estado de la obra, por ello se solicito realizar la jornada de orden y aseo en la misma retirando todos los materiales y residuos dejados en obra, lo cual es indispensable para cuando se vaya a recibir formalmente.











(28/04/2025): Participé en el comité operativo donde se solicitó hacer la entrega de la documentación ambiental de cierre, con los respectivos formatos, registro fotográfico, paz y salvos de proveedores.

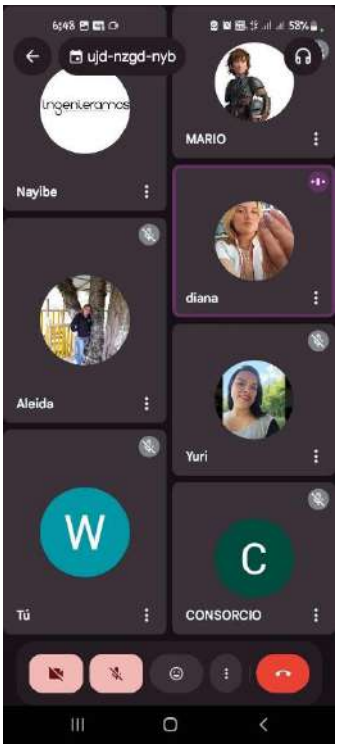

- **Municipio Nátaga:**

✓ Convenio 2064-2024: Yarumal

(1/04/2025): Apoyé la realización del comité operativo N° 11, en el cual se hizo aprobación de pago de seguridad social de los trabajadores, nomina y liquidaciones del personal. Se solicito hacer entrega de la documentación ambiental final, para hacer el respectivo cierre ambiental. (**Anexo 21**. Comité operativo 11 Yarumal).

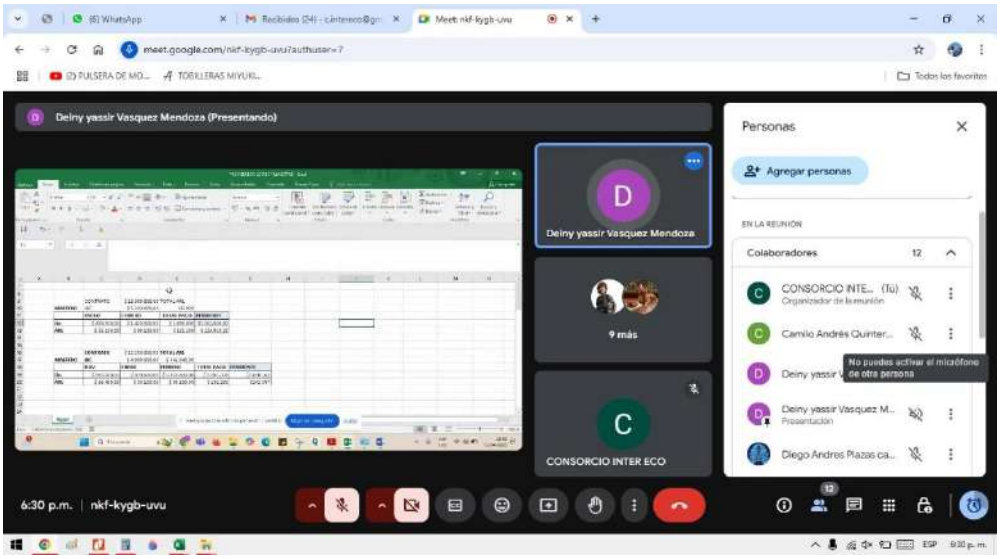

(25-04-2025): Apoyé la realización del comité operativo N° 12, en el cual se hizo la aprobación de pago del impuesto de la retención, el pago de proveedores pendientes, pago de nómina de los profesionales. (**Anexo 22**. Comité operativo 12 Yarumal)

(28/04/2025): Se realizó la entrega de la documentación de cierre ambiental a sostenibilidad del INVIAS para su respectiva NO OBJECIÓN. (**Anexo 23**. Oficio 211-1-957).

- ✓ Convenio 2111-2024: Cascajosa

(23/04/2025): Se realizó visita a campo para verificar estado de la obra, por ello se solicitó realizar la jornada de orden y aseo en la misma retirando todos los materiales y residuos dejados en obra, lo cual es indispensable para cuando se vaya a recibir formalmente.






WENDY TATIANA IBAÑEZ ALFONSO
CC.: 1.075.227.174 de Neiva
PROFESIONAL AMBIENTAL ZONA SUR
CONSORCIO INTERECO
CEL: 3162410580

Informe de Actividades Sociales Zona Norte

Fecha: 1 al 30 de Abril
Entidad: Instituto Nacional de Vías (Invías), Territorial Huila.
Convenios: Zona Norte

- Se realizó cargue de información de convenios faltantes en el drive del INVIAS

- Se realizó oficio dirigido a la junta de acción comunal siria, para solicitar entrega de las facturas de compra correspondientes al rubro social.

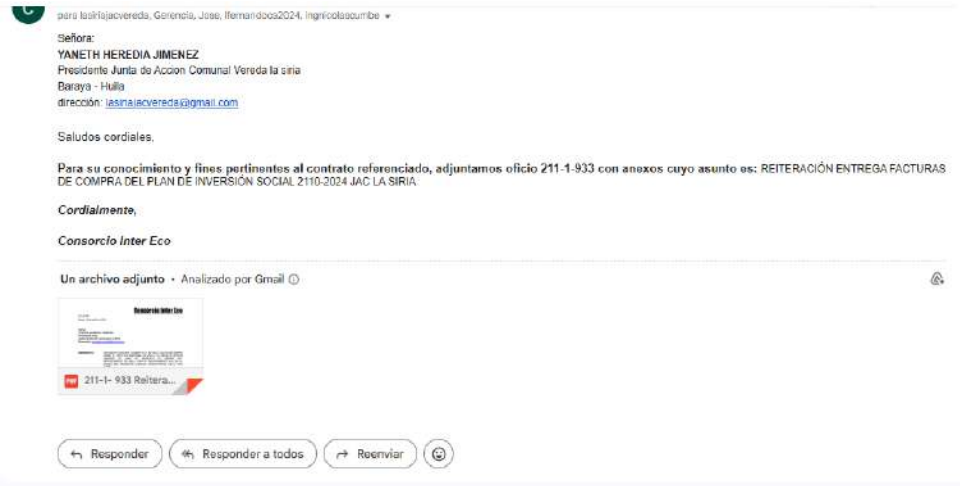
para lasiriajacvereda, Gerencia, Jose, lfernandezs2024, ingnicolascumbe

Señora:
YANETH HEREDIA JIMENEZ
Presidente Junta de Accion Comunal Vereda la siria
Baraya - Huila
dirección: lasiriajacvereda@gmail.com

Saludos cordiales,

Para su conocimiento y fines pertinentes al contrato referenciado, adjuntamos oficio 211-1-933 con anexos cuyo asunto es: REITERACIÓN ENTREGA FACTURAS DE COMPRA DEL PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL 2110-2024 JAC LA SIRIA

Cordialmente,


Consorcio Inter Eco

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail

211-1- 933 Reitera...

Responder | Responder a todos | Reenviar

- Se realizó oficio dirigido a la junta de acción comunal progreso, para solicitar entrega de las facturas de compra correspondientes al rubro social.

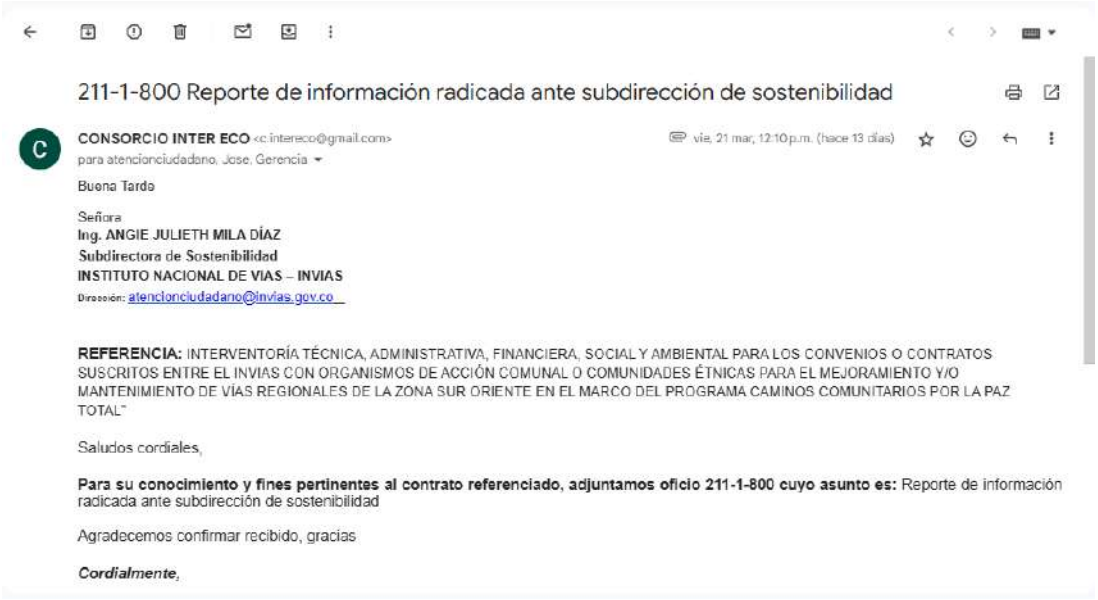
211-1-800 Reporte de información radicada ante subdirección de sostenibilidad

CONSORCIO INTER ECO <c.intereco@gmail.com>
para atencionciudadano, Jose, Gerencia
vie, 21 mar, 12:10 p.m. (hace 13 días)

Buena Tarde

Señora
Ing. ANGIE JULIETH MILA DÍAZ
Subdirectora de Sostenibilidad
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS
Dirección: atencionciudadano@invias.gov.co

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS POR LA PAZ TOTAL"


Saludos cordiales,

Para su conocimiento y fines pertinentes al contrato referenciado, adjuntamos oficio 211-1-800 cuyo asunto es: Reporte de información radicada ante subdirección de sostenibilidad

Agradecemos confirmar recibido, gracias

Cordialmente,

- Se realizó radicación documentación de cierre del plena de gestión social de la vereda Versalles Colombia.

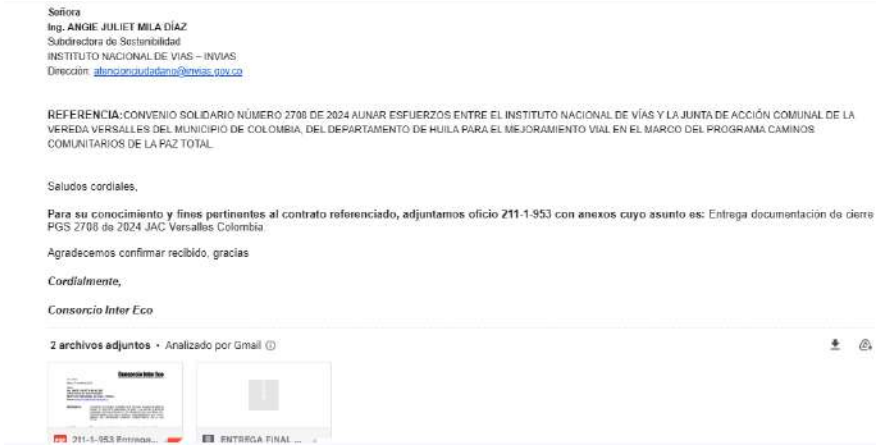

Señora
Ing. ANGIE JULIET MILA DÍAZ
Subdirectora de Sostenibilidad
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS
Dirección: atencionciudadano@invias.gov.co

REFERENCIA: CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2708 DE 2024 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA VERSALLES DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA, DEL DEPARTAMENTO DE HUILA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

Saludos cordiales,

Para su conocimiento y fines pertinentes al contrato referenciado, adjuntamos oficio 211-1-953 con anexos cuyo asunto es: Entrega documentación de cierre PGS 2708 de 2024 JAC Versalles Colombia.

Agradecemos confirmar recibido, gracias

Cordialmente,

Consorcio Inter Eco

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail

211-1-953 Entrega... ENTREGA FINAL ...

- Se realizó radicación documentación de cierre del plena de gestión social de la vereda Paraiso Colombia.



Señora
Ing. ANGIE JULIET MILA DÍAZ
Subdirectora de Sostenibilidad
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS
Dirección: atencionciudadano@invias.gov.co

REFERENCIA: CONVENIO SOLIDARIO NÚMERO 2269 DE 2024 AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PARAÍSO DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA, DEL DEPARTAMENTO DE HUILA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Saludos cordiales,

Para su conocimiento y fines pertinentes al contrato referenciado, adjuntamos oficio 211-1-959 con anexos cuyo asunto es: Entrega documentación de cierre PGS 2269 de 2024 JAC Paraiso Colombia.

Agradecemos confirmar recibido, gracias

Cordialmente,

Consorcio Inter Eco

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail

211-1-959 Entrega... ENTREGA FINAL ...

- Se establece comunicación con la junta de acción comunal de la vereda calle real para solicitar entrega de la documentación inicial del plan de gestión social.



CONSORCIO INTER ECO <c.intereco@gmail.com> mar, 22 abr, 11:58 a.m. (hace 10 días)
para jacsectorruralcallereal, Gerencia, Jose

LUZ MERY FLOREZ GARZON
Presidente JAC Junta de Acción Comunal Calle Real
Dirección: jacsectorruralcallereal@gmail.com

Saludos cordiales,

Para su conocimiento y fines pertinentes al contrato referenciado, **adjuntamos oficio 211-1-921 con anexos** cuyo asunto es: Solicitud diligenciamiento formatos sociales JAC convenio solidario N°2060 de 2024 Calle Real – Aipe.

Agradecemos confirmar recibido, gracias

Cordialmente,

Consorcio Inter Eco

5 archivos adjuntos • Analizado por Gmail

211-1-921 Solicitu... INFORME SOCIAL... MASPS-MN1-IN-3... ACTA DE VEEDUR... REGLAMENTO DE...

- Se realizó reunión de cierre y entrega de las obras social y técnicas a los directivos de la junta de acción comunal de la vereda Versalles Colombia.



- Se realizó seguimiento a la ejecución de la obra social en la vereda el progreso de Baraya.



- Se realizó seguimiento a la ejecución de la obra social en la vereda la parada de Baraya.



Paula Ximena Ramirez Monje

PAULA XIMENA RAMIREZ MONJE
Profesional Social
T.P. 212367


Informe de Actividades Sociales Zona Sur:

Fecha: 1 al 30 de abril de 2025
Entidad: Instituto Nacional de Vías (Invias), Territorial Huila.
Convenios: Zona Sur


- ## Asistencia a Comités Operativos de Seguimiento.

Durante este periodo, se asistió a los comités operativos desarrollados para los siguientes convenios:


✓ 2109 – 2024 Morelia – Saladoblanco (01/04/2025): Se realiza acompañamiento en comité operativo, teniendo en cuenta que ya la JAC culminó con la obra civil y social, se debe llevar a cabo la socialización de cierre en la cual se hará entrega a la comunidad de dichas obras. Esta reunión se hará el día 07 de abril del 2025, fecha acordada entre la JAC y la interventoría.

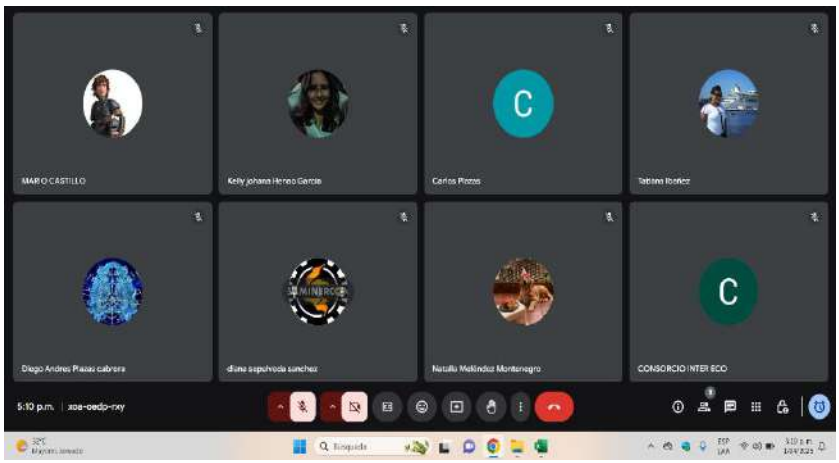


✓ 2280 – 2024 La Cabaña – Saladoblanco (01/04/2025): Se realiza acompañamiento en comité operativo, teniendo en cuenta que ya la JAC culminó con la obra civil y social, se debe llevar a cabo la socialización de cierre en la cual se hará entrega a la comunidad de dichas obras. Esta reunión se hará el día 07 de abril del 2025, fecha acordada entre la JAC y la interventoría.

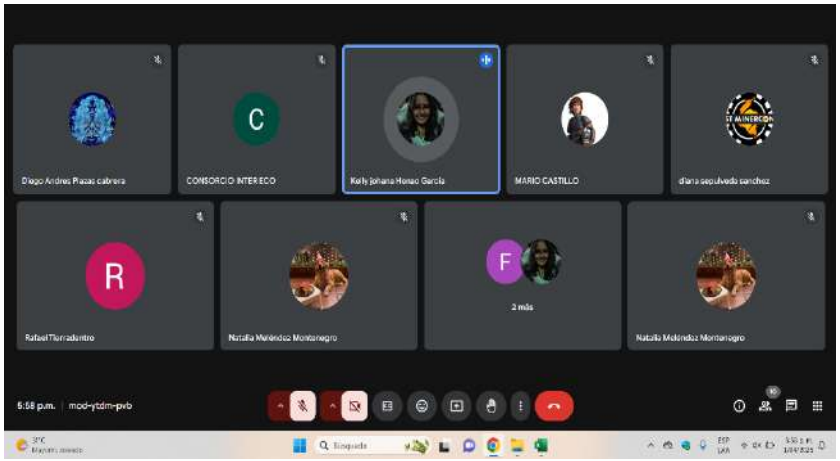


- ✓ 2064 – 2024 Yarumal – Nátaga (01/04/2025): Se realiza acompañamiento en comité operativo, teniendo en cuenta que ya la JAC culminó con la obra civil y social, se debe llevar a cabo la socialización de cierre en la cual se hará entrega a la comunidad de dichas obras. Esta reunión se hará el día 09 de abril del 2025, fecha acordada entre la JAC y la interventoría.

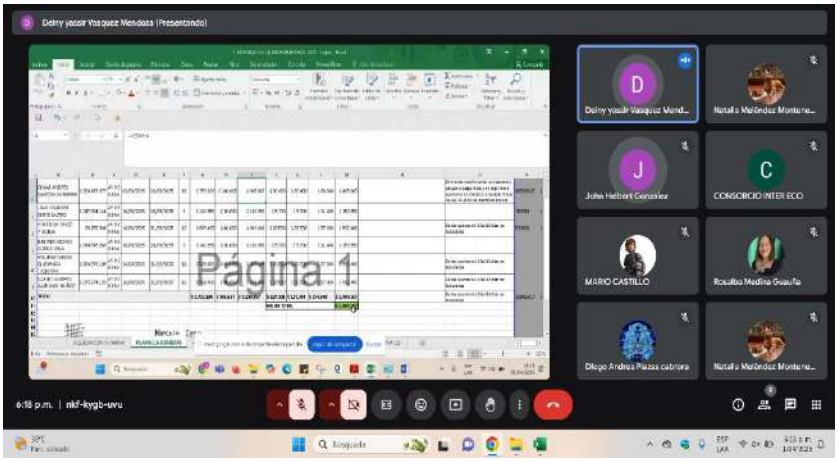


- ✓ 2799 – 2024 Gallego – La Plata (02/04/2025): Se realiza acompañamiento en comité operativo, en el cual se hace seguimiento a la obra de participación comunitaria, la JAC refiere que durante esta semana instalarían las tejas que hacen falta para ya culminar con la OPC.

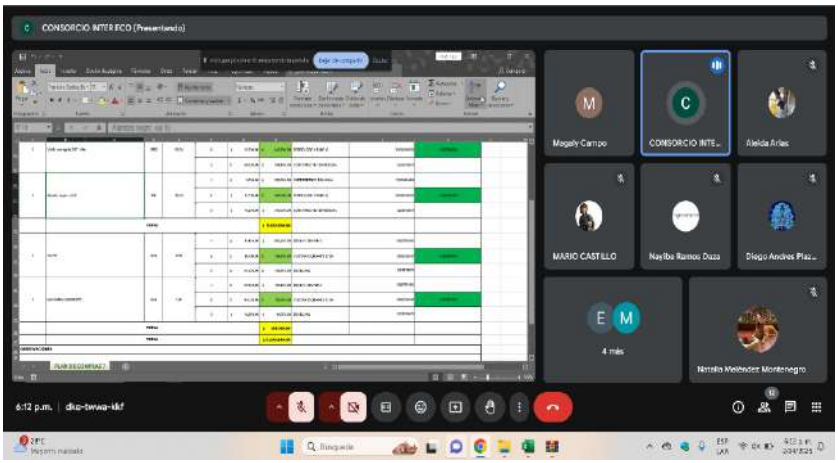


- ✓ 2639 - 2024 San José de Riecito – Acevedo (05/04/2025): Se realiza comité operativo para la aprobación del Plan de Inversión Social para que la JAC inicie con las gestiones pertinentes de compra de materiales para realizar la Obra de Participación Comunitaria: "Cambio de cubierta de la cocina y mejoramiento en acabados en la Institución San José de Riecito - Acevedo Huila”

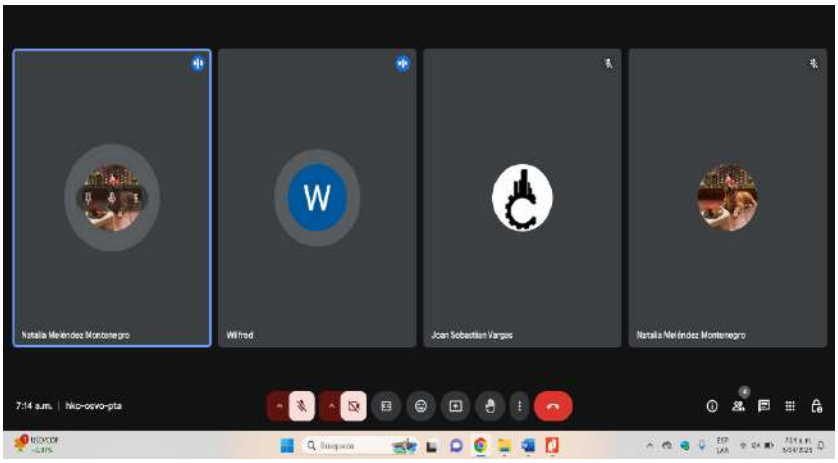


- ✓ 2338 – 2024 Versalles – Acevedo (07/04/2025): Se realiza acompañamiento en comité operativo, desde la parte social se realiza la aprobación da la aprobación del Plan de Inversión Social para que la JAC inicie con las gestiones pertinentes de compra de materiales para realizar la Obra de Participación Comunitaria: " Instalación de tubería de 36” para la adecuación de la Caseta Comunal propiedad de la Junta de Acción Comunal de Versalles".

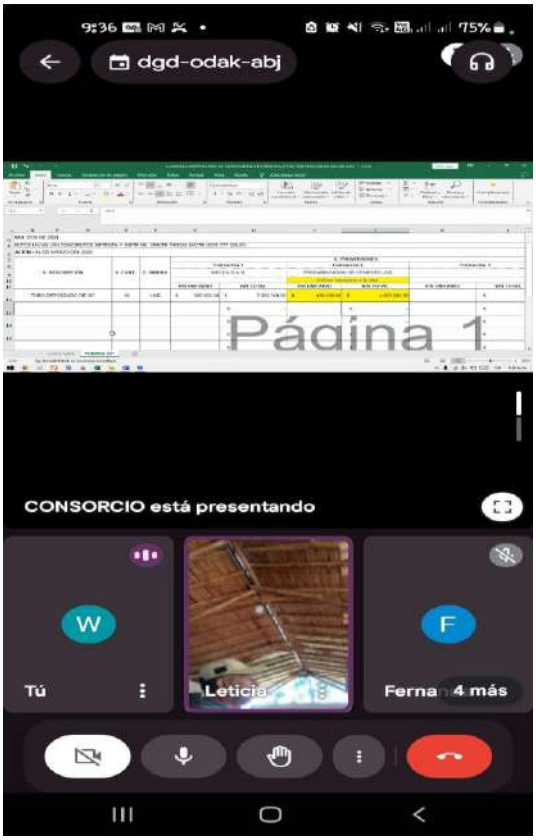

- ✓ 2788 – 2024 La Primavera – Acevedo (08/04/2025): Se realiza acompañamiento en comité operativo, en cuanto a la parte social se indica a la JAC que puede adelantar las gestiones para la producción de la placa conmemorativa para la OPC.

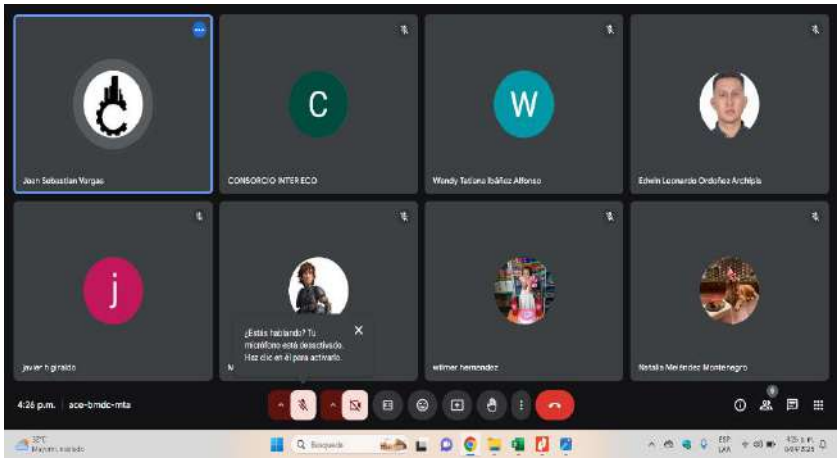

- ✓ 2639 - 2024 San José de Riecito – Acevedo (23/04/2025): Se realiza acompañamiento en comité operativo, y desde la parte social se indaga sobre las gestiones que han hecho para el inicio de la OPC; la JAC indica que enviaron a la interventoría la orden de pago para su revisión y aprobación. Desde la interventoría se comunica que se revisarán los documentos para que puedan radicarlos en el banco y así proceder con el pago. Adicional se solicita que una vez radiquen los documentos en el banco envíen el soporte.

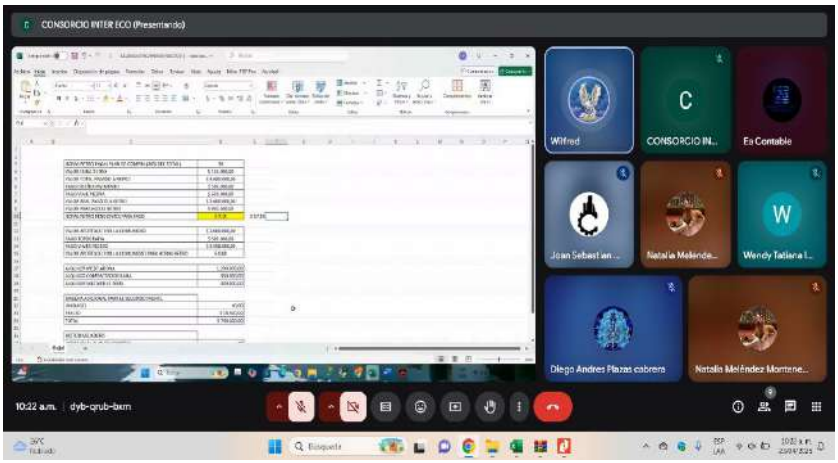

- **Recepción y evaluación de Plan de Inversión Social:**

Durante el presente periodo se realiza la respectiva recepción y evaluación de la documentación del Plan de Inversión Social:

- 2338 – 2024 Versalles – Acevedo.

- **Remisión documentación social inicial enviada a la SS del INVIAS:**

Una vez se revisó y se realizaron los ajustes correspondientes a los documentos entregados por parte de los contratistas de obra, se realizaron los respectivos oficios de radicación para la entrega de la documentación social inicial a la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS:

- Oficio 211-1-847 Entrega Plan Gestión Social Convenio 2639 de 2024 San José de Riecito – Acevedo, cuyo radicado INVIAS es 2025E-VUVRAZ-035047.
- Oficio 211-1-879 Entrega Plan Gestión Social Convenio 2338 de 2024 Versalles – Acevedo, cuyo radicado INVIAS es Radicado: 2025E-VUVRAZ-038609.

- **Remisión documentación social final enviada a la SS del INVIAS:**

Una vez diligenciada la documentación final se realizaron los respectivos oficios de radicación para la entrega de la documentación social final a la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS:

- Oficio 211-1-840 Entrega Documentación de Cierre PGS 2170 de 2024 Sinaí – Isnos, cuyo radicado INVIAS es 2025E-VUVRAZ-034376.
- Oficio 211-1-860 Entrega Documentación de Cierre PGS 2063 de 2024 El Mesón – Garzón, cuyo radicado INVIAS es 2025E-VUVRAZ-035673.
- Oficio 211-1-923 Entrega Documentación de Cierre PGS 2130 de 2024 Los Naranjos Bajos – Algeciras, cuyo radicado INVIAS es 2025E-VUVRAZ-041578.
- Oficio 211-1-927 Entrega Documentación de Cierre PGS 2109 de 2024 Morelia – Saladoblanco, cuyo radicado INVIAS es 2025E-VUVRAZ-042169.
- Oficio 211-1-954 Entrega Documentación de Cierre PGS 2064 de 2024 Yarumal – Nátaga, cuyo radicado es 2025E-VUVRAZ-043425.
- Oficio 211-1-958 Entrega Documentación de Cierre PGS 2234 de 2024 Sector Pueblo Viejo – Algeciras, cuyo radicado INVIAS es 2025E-VUVRAZ-044111.
- Oficio 211-1-964 Entrega Documentación de Cierre PGS 2692 de 2024 Colon – Algeciras, cuyo radicado INVIAS es 2025E-VUVRAZ-044238.
- Oficio 211-1-986 Entrega Documentación de Cierre PGS 2280 de 2024 La Cabaña – Saladoblanco, cuyo radicado INVIAS es 2025E-VUVRAZ-045071.

- **Otras actividades:**

Durante el presente periodo realicé las siguientes actividades:

- 2130 – 2024 Los Naranjos Bajos – Algeciras (04/04/2025): Se lleva a cabo socialización de cierre, en la cual se realiza la entrega a la comunidad de la obra civil y la Obra de Participación Comunitaria.





- 2788 – 2024 La Primavera – Acevedo (06/04/2025): La JAC finaliza la Obra de Participación, la cual realizó: “Mejoramiento de la caseta deportiva, cancha deportiva y sus alrededores”.





- 2109- 2024 Morelia – Saladoblanco (07/04/2025): Se lleva a cabo socialización de cierre, en la cual se realiza la entrega a la comunidad de la obra civil y la Obra de Participación Comunitaria.





- 2280 – 2024 La Cabaña – Saladoblanco (07/04/2025): Se lleva a cabo socialización de cierre, en la cual se realiza la entrega a la comunidad de la obra civil y la Obra de Participación Comunitaria.





- 2064 – 2024 Yarumal – Nátaga (09/04/2025): Se lleva a cabo socialización de cierre, en la cual se realiza la entrega a la comunidad de la obra civil y la Obra de Participación Comunitaria.





- 2234 – 2024 Paraíso Pueblo Viejo – Algeciras (24/04/2025): Se lleva a cabo socialización de cierre, en la cual se realiza la entrega a la comunidad de la obra civil y la Obra de Participación Comunitaria.





- 2692 – 2024 Colon – Algeciras (24/04/2025): Se lleva a cabo socialización de cierre, en la cual se realiza la entrega a la comunidad de la obra civil y la Obra de Participación Comunitaria.





Natalia Andrea Meléndez Montenegro
Residente Social

INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ECO

CONTRATO No. 3697 DE 2024

CONVENIOS MUNICIPIOS DE COLOMBIA, BARAYA, AIPE, HOBO, TELLO, ALGECIRAS, ISNOS, ACEVEDO, SALADOBLANCO, GARZÓN, AGRADO, LA PLATA Y NÁTAGA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

INFORME NÚMERO 5 MARZO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

Versión 1

Neiva, (30 de abril del 2025)

CONTROL DE VERSIONES

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIÓN	FOLIOS
1	30 de abril de 2025	Elaboración del informe número 6 de SST	37

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

Elaborado	Revisado	Aprobado
		
Diana Marcela Ramírez	Ing. Julián David Ortiz	Ing. Carlos Fallas
Inspector de SST de interventoría	Residente de interventoría	Director Interventoría

ACTIVIDADES DE SST DE LAS JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VERSALLES CONVENIO NÚMERO 2708 -2024

Durante el período comprendido desde 01 de abril al 30 de abril de 2025, la Junta de Acción Comunal de la vereda VERSALLES, convenio número 2708 realizó las siguientes actividades:

- Paz y salvo personal
- Desistimiento de examen de egreso.

NOMBRE	CARGO	Fecha de afiliación a la ARL
ERNESTO CASTRO QUIZA	MAESTRO	16/12/2024
LUIS ERNESTO CASTRO AUDOR	AYUDANTE	16/12/2024
LUIS FERNANDO CRUZ VARGAS	AYUDANTE	16/12/2024
JUAN CASTRO QUIZA	AYUDANTE	16/12/2024
FERNANDO ARIAS CASTELLANO	AYUDANTE	16/12/2024
MARCO FIDEL VIDAL	AYUDANTE DE OBRA	16/12/2024
JHON FREDY CASTELLANOS GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA	16/12/2024
JHAN CARLOS RODRIGUEZ MILLAN	AYUDANTE DE OBRA	16/12/2024
FREDY YOBANY TRUJILLO DIAZ	OFICAL	16/12/2024
JUAN DIEGO HERRERA	RESIDENTE	16/12/2024
JHON MARCE CAMERO	CONTADOR	16/12/2024

Tabla 3. PERSONAL NUEVO JAC – VERSALLES

ACTIVIDADES DE SST DE LAS JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL PUERTA DEL SOL CONVENIO NÚMERO 2318-2024

Durante el período comprendido desde 01 de abril al 30 de abril de 2025, la Junta de Acción Comunal realizó las siguientes actividades:

- Desistimiento de exámenes de egreso – paz y salvos.

NOMBRE	CARGO	Fecha de afiliación a la ARL
ORLANDO OLIVEROS OTALORA	MAESTRO	13/01/2025
ARNOL DAVID OCAMPO	AYUDANTE DE OBRA	13/01/2025
BRAYAN ALEXCIS CRUZ SUNCE	AYUDANTE DE OBRA	13/01/2025
DUBERNEY CRUZ SUNCE	AYUDANTE DE OBRA	13/01/2025
JOSE YAMEL MUÑOZ	AYUDANTE DE OBRA	13/01/2025
DAVID ARNOL TRUJILLO	AYUDANTE DE OBRA	13/01/2025
CRISTIAN CABRERA	RESIDENTE OBRA	13/01/2025
YORYANI GARZON	CONTADOR	13/01/2025

Tabla 4. personal nuevo JAC - puertas del sol

ACTIVIDADES DE SST DE LAS JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL GALLEGO LA PLATA CONVENIO NÚMERO 2799 -2024

Durante el período comprendido desde 01 de abril al 30 de abril de 2025, la Junta de Acción Comunal realizo las siguientes actividades:

- Afiliaciones a seguridad social al personal que ingreso en el período, Pagos a la seguridad social del personal que labora en el convenio

- Listado de equipos y vehículos de interventoría, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5
- Listado de personal, se anexa el formato de personal de interventoría, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7
- Paz y salvos & desistimiento de examen de egreso.

NOMBRE	CARGO	Fecha de afiliación a la ARL
CARLOS MARIO GARCIA	AYUDANTE OBRA	24/12/24
CRISTIAN ANDRES ARIAS	AYUDANTE OBRA	24/12/2024
JAIDER AUDIVER PERDOMO	AYUDANTE OBRA	24/12/2024
JOSE DAVID VALENCIA	AYUDANTE OBRA	24/12/2024
JOSE YESID ARIAS	AYUDANTE DE OBRA	24/12/2024
NORBERTO LOPEZ RIASCOS	AYUDANTE DE OBRA	24/12/2024
ULTENGO ROJAS TOBIAS	AYUDANTE DE OBRA	24/12/2024
JESUS ARQUIMENEZ	AYUDANTE DE OBRA	24/12/2024
MONICA PATRICIA MONJE	CONTADORA	24/01/2024
NAYIBE RAMOS	RESIDENTE	24/12/2024

Tabla 5. Personal nuevo JAC- GALLEGO.

ACTIVIDADES DE SST DE LAS JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA PRIMAVERA CONVENIO NÚMERO 2788 -2024

Durante el período comprendido desde 01 de abril al 30 de abril de 2025, la Junta de Acción Comunal realizo las siguientes actividades:

- Afiliaciones a seguridad social al personal que ingreso en el período, Pagos a la seguridad social del personal que labora en el convenio
- Inducción – notificación del riesgo y peligros en obra
- Soporte de entrega de dotación y EPP.
- Listado de equipos y vehículos de interventoría, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5

- Listado de personal, se anexa el formato de personal de interventoría, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7

NOMBRE	CARGO	Fecha de afiliación a la ARL
YILMER MARTINEZ USECHE	AYUDANTE DE OBRA	17/03/2025
CAMILO ANDRES MORALES	AYUDANTE DE OBRA	17/03/2025
BLADIMIR MONTEALGRE GALINDO	AYUDANTE DE OBRA	17/03/2025
CRISTIAN MARTINEZ USECHE	AYUDANTE DE OBRA	17/03/2025
WILSON JAVIER USECHE	MAESTRO	17/03/2025
JAVIER HUMBERTO GIRALDO	RESIDENTE	17/03/2025
MAURICIO VARGAS	CONTADOR	17/03/2025

Tabla 6. Personal nuevo JAC – la primavera

ACTIVIDADES DE SST DE LAS JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL HORIZONTE CONVENIO NÚMERO 2190 -2024

Durante el período comprendido desde 01 de abril al 30 de abril de 2025, la Junta de Acción Comunal realizo las siguientes actividades:

- Afiliaciones a seguridad social al personal que ingreso en el período, Pagos a la seguridad social del personal que labora en el convenio
- Inducción – notificación del riesgo y peligros en obra
- Soporte de entrega de dotación y EPP.
- Listado de equipos y vehículos de interventoría, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5
- Listado de personal, se anexa el formato de personal de interventoría, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7

NOMBRE	CARGO	Fecha de afiliación a la ARL
JANIER ALBERTO CANTILLO	AYUDANTE DE OBRA	17/03/2025
LUIS ALFREDO SANCHES	AYUDANTE DE OBRA	17/03/2025
FERNEY HERNANDEZ GAMBOA	AYUDANTE DE OBRA	17/03/2025
ROBY SERRATO SERRATO	AYUDANTE DE OBRA	17/03/2025
JOSE DANIEL RAMIREZ	MAESTRO	17/03/2025
JORGE CONTA ESCOBAR	RESIDENTE	17/03/2025
MONICA SOFIA CASTAÑEDA	CONTADORA	17/03/2025

Tabla. 7. Personal nuevo JAC – Horizonte.

ACTIVIDADES DE SST DE LAS JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN JOSE DE RIOCITO CONVENIO NÚMERO 2639 -2024

Durante el período comprendido desde 01 de abril al 30 de abril de 2025, la Junta de Acción Comunal realizo las siguientes actividades:

- Afiliaciones a seguridad social al personal que ingreso en el período, Pagos a la seguridad social del personal que labora en el convenio
- Inducción – notificación del riesgo y peligros en obra
- Soporte de entrega de dotación y EPP.
- Listado de equipos y vehículos de interventoría, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5
- Listado de personal, se anexa el formato de personal de interventoría, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7

NOMBRE	CARGO	Fecha de afiliación a la ARL
DAGOBERTO PINZON GARCES	AYUDANTE DE OBRA	04/04/2025
DUBAN MEDINA OCAMPO	AYUDANTE DE OBRA	04/04/2025
JAIVER TIMOTE SALCEDO	AYUDANTE DE OBRA	04/04/2025
EDUSMILDO LEVAZA DIAZ	OFICIAL	04/04/2025
YOBANY CRUZ PALENCIA	AYUDANTE DE OBRA	04/04/2025
JOHAN SEBASTIAN VARGAS	RESIDENTE DE OBRA	04/04/2025
JORGE ENRIQUE CANO	MAESTRO DE OBRA	04/04/2025
MAURICIO VARGAS	CONTADOR	04/04/2025

Tabla. 8 Personal JAC – san José de Riocito

ACTIVIDADES DE SST DE LAS JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SANTANA CONVENIO NÚMERO 2752 -2024

Durante el período comprendido desde 01 de abril al 30 de abril de 2025, la Junta de Acción Comunal realizo las siguientes actividades:

- Afiliaciones a seguridad social al personal que ingreso en el período, Pagos a la seguridad social del personal que labora en el convenio
- Inducción – notificación del riesgo y peligros en obra
- Soporte de entrega de dotación y EPP.
- Listado de equipos y vehículos de interventoría, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5
- Listado de personal, se anexa el formato de personal de interventoría, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7

NOMBRE	CARGO	Fecha de afiliación a la ARL
CARLOS ANDRES GARZON	AYUDANTE DE OBRA	03/04/2025
LUIS EFREN ACOSTA	AYUDANTE DE OBRA	03/04/2025
JOSE ALEJANDRO CUBILLOS	AYUDANTE DE OBRA	03/04/2025
OMAR GARCIA BUSTO	MAESTRO DE OBRA	03/04/2025
ZULLY MILENA HOYOS	CONTADOR	03/04/2025
CRISTIAN CAMILO CABRERA	RESIDENTE DE OBRA	03/04/2025

Tabla 9. Personal nuevo_ JAC santana.

ACTIVIDADES DE SST DE LAS JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ANTILLAS CONVENIO NÚMERO 2151 -2024

Durante el período comprendido desde 01 de abril al 30 de abril de 2025, la Junta de Acción Comunal realizo las siguientes actividades:

- Afiliaciones a seguridad social al personal que ingreso en el período, Pagos a la seguridad social del personal que labora en el convenio
- Inducción – notificación del riesgo y peligros en obra
- Soporte de entrega de dotación y EPP.
- Listado de equipos y vehículos de interventoría, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5
- Listado de personal, se anexa el formato de personal de interventoría, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7

NOMBRE	CARGO	Fecha de afiliación a la ARL
CARLOS EDUARDO PERAZA	AYUDANTE DE OBRA	01/04/2025
JAIVER SOLORZANO VIELMA	AYUDANTE DE OBRA	01/04/2025
MILLER DE JESUS POLOCHE	AYUDANTE DE OBRA	01/04/2025
HELI PERDOMO AMAYA	AYUDANTE DE OBRA	01/04/2025
HUILMER TRUJILLO GRAJALES	AYUDANTE DE OBRA	01/04/2025
JOHN AMAYA GAVIRIA	MAESTRO	01/04/2025
LUIS MIGUEL CAQUIMBO	RESIDENTE DE OBRA	01/04/2025

Tabla 10. Personal nuevo – JAC Antillas

ACTIVIDADES DE SST DE LAS JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL UNION CONVENIO NÚMERO 2138 -2024

Durante el período comprendido desde 01 de abril al 30 de abril de 2025, la Junta de Acción Comunal realizo las siguientes actividades:

- Afiliaciones a seguridad social al personal que ingreso en el período, Pagos a la seguridad social del personal que labora en el convenio
- Inducción – notificación del riesgo y peligros en obra
- Soporte de entrega de dotación y EPP.
- Listado de equipos y vehículos de interventoría, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5
- Listado de personal, se anexa el formato de personal de interventoría, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7

NOMBRE	CARGO	Fecha de afiliación a la ARL
LUIS FELIPE LOAIZA	AYUDANTE DE OBRA	04/04/2025
JOSE MILLER DIAZ	AYUDANTE DE OBRA	04/04/2025
DORIAN RAMOS URIEGO	AYUDANTE DE OBRA	04/04/2025
JOSE ANDRES BERMEO	MAESTRO	04/04/2025
IBAN CAMILO TRIVIÑO	AYUDANTE DE OBRA	04/04/2025
WEIMER CLEVES	AYUDANTE DE OBRA	04/04/2025
CRISTIAN ANDRES PEDROZA	AYUDANTE DE OBRA	04/04/2025
GILDARDO BERMEO	AYUDANTE DE OBRA	04/04/2025
JUAN CARLOS SILVA	RESIDENTE DE OBRA	04/04/2025
HILDE GAITAN	CONTADOR	04/04/2025

Tabla 11. Personal nuevo –JAC UNION

ACTIVIDADES DE SST DE LAS JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VERSALLES CONVENIO NÚMERO 2338 -2024

Durante el período comprendido desde 01 de abril al 30 de abril de 2025, la Junta de Acción Comunal realizo las siguientes actividades:

- Afiliaciones a seguridad social al personal que ingreso en el período, Pagos a la seguridad social del personal que labora en el convenio
- Inducción – notificación del riesgo y peligros en obra
- Soporte de entrega de dotación y EPP.
- Listado de equipos y vehículos de interventoría, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5
- Listado de personal, se anexa el formato de personal de interventoría, se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7

NOMBRE	CARGO	Fecha de afiliación a la ARL
ALIRIO VALDERRAMA GUTIERREZ	AYUDANTE DE OBRA	24/04/2025
YOVANI MORALES VERGARA	AYUDANTE DE OBRA	24/04/2025
JULIO CESAR MAVAREZ	AYUDANTE DE OBRA	24/04/2025
EDWINZON RAMIREZ RESTREPO	AYUDANTE DE OBRA	24/04/2025
HUGO VICTOR VIVIEROS	RESIDENTE DE OBRA	24/04/2025
EDWIN ORDOÑEZ	CONTADOR	24/04/2025
ALIRIO VALDERRAMA	MESTRO DE OBRA	24/04/2025

Tabla 12. Personal nuevo – JAC VERSALLES.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES DE SST DE LA INTERVENTORIA CONSORCIO INTER ECO.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE INTERVENTORÍA	
	
Descripción de la foto	**Descripción de la foto**
Simulacro uso de la camilla de emergencias.	Simulacro uso de la camilla de emergencias.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL JAC – GALLEGO JAC - PRIMAVERA.	
	
Descripción de la foto: Señalización de obra.	**Descripción de la foto:** trabajadores con dotación y EPP.
REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL JAC – HORIZONTE Y JAC- SAN JOSE RIOCITO.	

	
Descripción de la foto: trabajos en obra horizonte.	**Descripción de la foto:** Personal con dotación y EPP –JAC san José riocito

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL JAC – SANTANA Y JAC - ANTILLAS.

	
Descripción de la foto: terminación de cunetas**.**	**Descripción de la foto:** Parada placa huella.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL JAC – UNION Y JAC – VERSALLES.

	
Descripción de la foto: señalización de obra JAC – UNION	**Descripción de la foto:** señalización de obra, JAC VERSALLES.

1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De acuerdo a las normas de seguridad y salud en el trabajo el CONSORCIO INTER ECO, da cumplimiento de las normas de seguridad en pro de prevenir los accidentes laborales y crear una cultura de prevención y autocuidado en los trabajadores, de igual manera se realiza acompañamiento control y seguimiento a las juntas de los convenios para dar mejora en los procesos de seguridad identificación de peligros y riesgos que atenten a los trabajadores y la comunidad, y poder solventar cualquier hallazgos y dar un avance significativo en la construcción de las frentes de obra.

Así mismo, reiteramos nuestro compromiso con el seguimiento diario al cumplimiento de las normas de seguridad y medio ambiente, para que se mantengan los índices y se dé cumplimiento al 100% durante la ejecución de las obras.

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	ECOVIAS SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-890104625
SUCURSAL	1
FECHA PAGO	2025-05-05
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1003808423
NOMBRE EMPLEADO	ANDRES FELIPE BENAVIDEZ POLANIA
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	PORVENIR
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	33326495
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2025-04
PERÍODO SALUD	2025-05
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	1711001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.423.500	0,1600000	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.423.500	0,0400000	$ 57.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.423.500	0,0052200	$ 7.500	1

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.423.500	0,0400000	$ 57.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 227.800	$ 57.000	$ 7.500	$ 57.000	$ 349.300

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	ECOVIAS SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-890104625
SUCURSAL	1
FECHA PAGO	2025-05-05
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1003815656
NOMBRE EMPLEADO	LAURA VALENTINA PERDOMO FIERRO
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	PORVENIR
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	33326495
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2025-04
PERÍODO SALUD	2025-05
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5711001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	2025-04-15

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
		X	15/04/25																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
15	1.000.000	0,1600000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
15	1.000.000	0,0400000	$ 40.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
15	1.000.000	0,0696000	$ 69.600	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
15	1.347.222	0,0400000	$ 53.900	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 160.000	$ 40.000	$ 69.600	$ 53.900	$ 323.500

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	ECOVIAS SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-890104625
SUCURSAL	1
FECHA PAGO	2025-05-05
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1004473633
NOMBRE EMPLEADO	EDWIN FERNEY IQUIRA RAMOS
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PORVENIR
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	33326495
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2025-04
PERÍODO SALUD	2025-05
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5711001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	2025-04-30

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
		X	30/04/25																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	2.000.000	0,1600000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	2.000.000	0,0400000	$ 80.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	2.000.000	0,0696000	$ 139.200	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	2.402.778	0,0400000	$ 96.200	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 320.000	$ 80.000	$ 139.200	$ 96.200	$ 635.400

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	ECOVIAS SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-890104625
SUCURSAL	1
FECHA PAGO	2025-05-05
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1006955712
NOMBRE EMPLEADO	DARWIN ANDRES MORALES PATIÑO
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. EPSS
AFP	PORVENIR
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	33326495
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2025-04
PERÍODO SALUD	2025-05
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5711001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	2025-04-13

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
		X	13/04/25																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
13	866.667	0,1600000	$ 138.700	$ 0	$ 0	$ 138.700	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
13	866.667	0,0400000	$ 34.700	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
13	866.667	0,0696000	$ 60.400	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
13	1.208.334	0,0400000	$ 48.400	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 138.700	$ 34.700	$ 60.400	$ 48.400	$ 282.200

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	ECOVIAS SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-890104625
SUCURSAL	1
FECHA PAGO	2025-05-05
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1018460313
NOMBRE EMPLEADO	NATALIA ANDREA MELENDEZ MONTENEGRO
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	PORVENIR
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	33326495
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2025-04
PERÍODO SALUD	2025-05
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5711001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	2025-04-30

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
		X	30/04/25																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	3.800.000	0,1600000	$ 608.000	$ 0	$ 0	$ 608.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	3.800.000	0,0400000	$ 152.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	3.800.000	0,0696000	$ 264.500	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	4.897.778	0,0400000	$ 196.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 608.000	$ 152.000	$ 264.500	$ 196.000	$ 1.220.500

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	ECOVIAS SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-890104625
SUCURSAL	1
FECHA PAGO	2025-05-05
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1075216697
NOMBRE EMPLEADO	GUILLERMO ALBERTO ROJAS SANCHEZ
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	COLFONDOS
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	33326495
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2025-04
PERÍODO SALUD	2025-05
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5711001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	2025-04-30

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
		X	30/04/25																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	3.800.000	0,1600000	$ 608.000	$ 0	$ 0	$ 608.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	3.800.000	0,0400000	$ 152.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	3.800.000	0,0696000	$ 264.500	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	4.860.833	0,0400000	$ 194.500	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 608.000	$ 152.000	$ 264.500	$ 194.500	$ 1.219.000

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	ECOVIAS SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-890104625
SUCURSAL	1
FECHA PAGO	2025-05-05
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1075227174
NOMBRE EMPLEADO	WENDY TATIANA IBAÑEZ ALFONSO
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	33326495
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2025-04
PERÍODO SALUD	2025-05
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5711001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	2025-04-30

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
		X	30/04/25																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	3.800.000	0,1600000	$ 608.000	$ 0	$ 0	$ 608.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	3.800.000	0,0400000	$ 152.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	3.800.000	0,0696000	$ 264.500	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	4.860.833	0,0400000	$ 194.500	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 608.000	$ 152.000	$ 264.500	$ 194.500	$ 1.219.000

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	ECOVIAS SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-890104625
SUCURSAL	1
FECHA PAGO	2025-05-05
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1075260559
NOMBRE EMPLEADO	DIANA MARCELA RAMIREZ DIAZ
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PORVENIR
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	33326495
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2025-04
PERÍODO SALUD	2025-05
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5711001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	2025-04-30

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
		X	30/04/25																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	2.300.000	0,1600000	$ 368.000	$ 0	$ 0	$ 368.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	2.300.000	0,0400000	$ 92.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	2.300.000	0,0696000	$ 160.100	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	2.836.667	0,0400000	$ 113.500	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 368.000	$ 92.000	$ 160.100	$ 113.500	$ 733.600

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	ECOVIAS SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-890104625
SUCURSAL	1
FECHA PAGO	2025-05-05
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1075313576
NOMBRE EMPLEADO	MAGALY YULIETH LASSO CERON
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PORVENIR
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	33326495
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2025-04
PERÍODO SALUD	2025-05
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5711001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	2.000.000	0,1600000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	2.000.000	0,0400000	$ 80.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	2.000.000	0,0696000	$ 139.200	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	2.000.000	0,0400000	$ 80.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 320.000	$ 80.000	$ 139.200	$ 80.000	$ 619.200

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	ECOVIAS SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-890104625
SUCURSAL	1
FECHA PAGO	2025-05-05
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1078246979
NOMBRE EMPLEADO	JOSE MANUEL GASCA CUELLAR
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PORVENIR
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	33326495
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2025-04
PERÍODO SALUD	2025-05
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5711001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	2025-04-30

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
		X	30/04/25																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	2.000.000	0,1600000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	2.000.000	0,0400000	$ 80.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	2.000.000	0,0696000	$ 139.200	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	2.388.889	0,0400000	$ 95.600	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 320.000	$ 80.000	$ 139.200	$ 95.600	$ 634.800

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	ECOVIAS SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-890104625
SUCURSAL	1
FECHA PAGO	2025-05-05
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1080264332
NOMBRE EMPLEADO	KELLY JOHANA HENAO GARCIA
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	PORVENIR
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	33326495
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2025-04
PERÍODO SALUD	2025-05
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5711001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	2025-04-09

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
		X	9/04/25																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
9	600.000	0,1600000	$ 96.000	$ 0	$ 0	$ 96.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
9	600.000	0,0400000	$ 24.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
9	600.000	0,0696000	$ 41.800	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
9	1.044.444	0,0400000	$ 41.800	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 96.000	$ 24.000	$ 41.800	$ 41.800	$ 203.600

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	ECOVIAS SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-890104625
SUCURSAL	1
FECHA PAGO	2025-05-05
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1080290198
NOMBRE EMPLEADO	DIEGO ANDRES PLAZAS CABRERA
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PORVENIR
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	33326495
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2025-04
PERÍODO SALUD	2025-05
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	1711001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	3.800.000	0,1600000	$ 608.000	$ 0	$ 0	$ 608.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	3.800.000	0,0400000	$ 152.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	3.800.000	0,0052200	$ 19.900	1

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	3.800.000	0,0400000	$ 152.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 608.000	$ 152.000	$ 19.900	$ 152.000	$ 931.900

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	ECOVIAS SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-890104625
SUCURSAL	1
FECHA PAGO	2025-05-05
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1081415710
NOMBRE EMPLEADO	PAULA XIMENA RAMIREZ MONJE
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PORVENIR
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	33326495
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2025-04
PERÍODO SALUD	2025-05
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5711001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	2025-04-30

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
		X	30/04/25																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	3.800.000	0,1600000	$ 608.000	$ 0	$ 0	$ 608.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	3.800.000	0,0400000	$ 152.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	3.800.000	0,0696000	$ 264.500	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	4.897.778	0,0400000	$ 196.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 608.000	$ 152.000	$ 264.500	$ 196.000	$ 1.220.500

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	ECOVIAS SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-890104625
SUCURSAL	1
FECHA PAGO	2025-05-05
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1082217044
NOMBRE EMPLEADO	JHON ALEX TAMAYO MONTEALEGRE
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM COLSUBSIDIO
AFP	PORVENIR
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	33326495
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2025-04
PERÍODO SALUD	2025-05
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5711001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	2025-04-30

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
		X	30/04/25																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	2.000.000	0,1600000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	2.000.000	0,0400000	$ 80.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	2.000.000	0,0696000	$ 139.200	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	2.372.222	0,0400000	$ 94.900	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 320.000	$ 80.000	$ 139.200	$ 94.900	$ 634.100

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	ECOVIAS SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-890104625
SUCURSAL	1
FECHA PAGO	2025-05-05
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1083870948
NOMBRE EMPLEADO	DANER FERNEY MALES GOLONDRINO
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. EPSS
AFP	PROTECCION (ING+PROTECCION)
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	33326495
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2025-04
PERÍODO SALUD	2025-05
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5711001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	2025-04-30

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
		X	30/04/25																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	2.000.000	0,1600000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	2.000.000	0,0400000	$ 80.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	2.000.000	0,0696000	$ 139.200	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	2.505.556	0,0400000	$ 100.300	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 320.000	$ 80.000	$ 139.200	$ 100.300	$ 639.500

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	ECOVIAS SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-890104625
SUCURSAL	1
FECHA PAGO	2025-05-05
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1084577334
NOMBRE EMPLEADO	CRISTHIAN CAMILO CHALA RIVERA
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	33326495
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2025-04
PERÍODO SALUD	2025-05
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	1711001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	2025-04-21

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
		X	21/04/25																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
21	2.660.000	0,1600000	$ 425.600	$ 0	$ 0	$ 425.600	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
21	2.660.000	0,0400000	$ 106.400	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
21	2.660.000	0,0052200	$ 13.900	1

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
21	3.203.611	0,0400000	$ 128.200	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 425.600	$ 106.400	$ 13.900	$ 128.200	$ 674.100

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	ECOVIAS SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-890104625
SUCURSAL	1
FECHA PAGO	2025-05-05
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1084869769
NOMBRE EMPLEADO	MARIA JOSE PEÑA BUYUCUE
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PROTECCION (ING+PROTECCION)
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	33326495
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2025-04
PERÍODO SALUD	2025-05
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5711001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	2.000.000	0,1600000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	2.000.000	0,0400000	$ 80.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	2.000.000	0,0696000	$ 139.200	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	2.000.000	0,0400000	$ 80.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 320.000	$ 80.000	$ 139.200	$ 80.000	$ 619.200

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	ECOVIAS SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-890104625
SUCURSAL	1
FECHA PAGO	2025-05-05
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1115184235
NOMBRE EMPLEADO	JULIAN DAVID ORTIZ HENAO
EPS	EPS SURA
AFP	COLFONDOS
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	33326495
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2025-04
PERÍODO SALUD	2025-05
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5711001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	5.100.000	0,1600000	$ 816.000	$ 0	$ 0	$ 816.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	5.100.000	0,0400000	$ 204.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	5.100.000	0,0696000	$ 355.000	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	5.100.000	0,0400000	$ 204.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 816.000	$ 204.000	$ 355.000	$ 204.000	$ 1.579.000

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	ECOVIAS SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-890104625
SUCURSAL	1
FECHA PAGO	2025-05-05
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-7697064
NOMBRE EMPLEADO	FREDY MEDINA RAMIREZ
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM COLSUBSIDIO
AFP	PORVENIR
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	33326495
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2025-04
PERÍODO SALUD	2025-05
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5711001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	2025-04-30

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
		X	30/04/25																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.423.500	0,1600000	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.423.500	0,0400000	$ 57.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.423.500	0,0696000	$ 99.100	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.619.231	0,0400000	$ 64.800	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 227.800	$ 57.000	$ 99.100	$ 64.800	$ 448.700

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	ECOVIAS SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-890104625
SUCURSAL	1
FECHA PAGO	2025-05-05
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-7714733
NOMBRE EMPLEADO	MARIO FERNANDO CASTILLO ROJAS
EPS	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES
AFP	PORVENIR
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	33326495
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2025-04
PERÍODO SALUD	2025-05
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5711001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	2025-04-30

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
		X	30/04/25																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	5.100.000	0,1600000	$ 816.000	$ 0	$ 0	$ 816.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	5.100.000	0,0400000	$ 204.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	5.100.000	0,0696000	$ 355.000	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	5.893.333	0,0400000	$ 235.800	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 816.000	$ 204.000	$ 355.000	$ 235.800	$ 1.610.800

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	ECOVIAS SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-890104625
SUCURSAL	1
FECHA PAGO	2025-05-05
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-36308886
NOMBRE EMPLEADO	MARIA CAROLINA SALAZAR PARRA
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	33326495
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2025-04
PERÍODO SALUD	2025-05
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5711001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	3.000.000	0,1600000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	3.000.000	0,0400000	$ 120.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	3.000.000	0,0696000	$ 208.800	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	3.000.000	0,0400000	$ 120.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 480.000	$ 120.000	$ 208.800	$ 120.000	$ 928.800

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	ECOVIAS SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-890104625
SUCURSAL	1
FECHA PAGO	2025-05-05
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-76317796
NOMBRE EMPLEADO	CARLOS EDUARDO FALLA VILLEGAS
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	33326495
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2025-04
PERÍODO SALUD	2025-05
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5711001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	6.900.000	0,1600000	$ 1.104.000	$ 0	$ 0	$ 1.104.000	$ 34.500	$ 34.500	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	6.900.000	0,0400000	$ 276.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	6.900.000	0,0696000	$ 480.300	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	6.900.000	0,0400000	$ 276.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 1.173.000	$ 276.000	$ 480.300	$ 276.000	$ 2.205.300

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	ECOVIAS SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-890104625
SUCURSAL	1
FECHA PAGO	2025-05-05
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-83220857
NOMBRE EMPLEADO	HAMINCE ORTIZ ROCHA
EPS	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.
AFP	PORVENIR
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR
ARL	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
NÚMERO PLANILLA	33326495
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERÍODO PENSIÓN	2025-04
PERÍODO SALUD	2025-05
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5711001
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	2025-04-30

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
		X	30/04/25																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.423.500	0,1600000	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.423.500	0,0400000	$ 57.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.423.500	0,0696000	$ 99.100	2


APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	1.583.644	0,0400000	$ 63.400	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 227.800	$ 57.000	$ 99.100	$ 63.400	$ 447.300

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

Título Documento	**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 PERIODO DICIEMBRE DE 2024 "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 5."**				
REVISIÓN		**0**	**1**	**2**	**3**
Responsable de Elaboración	Nombre	JULIAN DAVID ORTIZ HENAO			
	Firma				
	Fecha	09/05/2025			
	Nombre	MARIO FERNANDO CASTILLO ROJAS			
	Firma				
	Fecha	09/05/2025			
	Nombre	MARÍA CAROLINA SALAZAR PARRA			
	Firma				
	Fecha	09/05/2025			
Revisión Director de Interventoría	Nombre	CARLOS EDUARDO FALLA VILLEGAS			
	Firma				
	Fecha	10/05/2025			
Revisión Supervisor Contrato	Nombre		JOSÉ MIGUEL ORTEGA ORTIZ		
	Firma				
	Fecha		12/05/2025		

CONTROL DE MODIFICACIONES.

REVISIÓN No.	MODIFICACIÓN A CAP. SEG. PAG.	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1			
2			
3			

LISTA DE DISTRIBUCIÓN DEL INFORME

DESTINATARIO DEL INFORME	No. DE COPIAS
INVIAS. – 1 Volumen Original - Archivo – Digital	1 (557 Pág.)
