

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**CRONOGRAMA COP-709-2024**	**260 días**	**mié 22/01/25**	**mar 20/01/26**
2		**ETAPA PRELIMINAR**	**33 días**	**mié 22/01/25**	**vie 7/03/25**
3		**Area Tecnica**	**33 días**	**mié 22/01/25**	**vie 7/03/25**
4		Firma acta de inicio	1 día	mié 22/01/25	mié 22/01/25
5		Recorrido de reconocimiento de CIV's "Constratista, interventoria y suprevision"	1 día	mié 22/01/25	mié 22/01/25
6		Hojas de vida del personal profesional	33 días	mié 22/01/25	vie 7/03/25
7		Analisis de precios unitarios correspondiente a la propuesta economica y desgloce del AIU	33 días	mié 22/01/25	vie 7/03/25
8		Programa de obra	33 días	mié 22/01/25	vie 7/03/25
9		Cronograma general del proyecto	5 días	mié 22/01/25	mar 28/01/25
10		Presupuesto del proyecto	30 días	jue 23/01/25	mié 5/03/25
11		Plan anual de caja - (PAC)	10 días	jue 23/01/25	mié 5/02/25
12		Informe ejecutivo inspeccion visual y topografica de redes humedas por CIV	15 días	mié 22/01/25	mar 11/02/25
13		Fichas de reconocimiento por segmento vial	30 días	mié 22/01/25	mar 4/03/25
14		**Diagnosticos de segmentos viales**	**3 días**	**jue 23/01/25**	**lun 27/01/25**
15		Recorrido de obra No. 1 aistencia contratista, interventoria, fondo de desarrollo local de usaquen, directores de obra y especialistas. Malla vial CIV's del 1 al 20	1 día	jue 23/01/25	jue 23/01/25
16		Recorrido de obra No. 2 aistencia contratista, interventoria, fondo de desarrollo local de usaquen, directores de obra y especialistas. Malla vial CIV's del 21 al 34	1 día	vie 24/01/25	vie 24/01/25
17		Recorrido de obra No. 3 aistencia contratista, interventoria, fondo de desarrollo local de usaquen, directores de obra y especialistas. Espacio publico CIV's del 1 al 18 y cicloinfraestructura	1 día	lun 27/01/25	lun 27/01/25
18		Plan de manejo de trafico-PMT	33 días	mié 22/01/25	vie 7/03/25
19		Plan de calidad	33 días	mié 22/01/25	vie 7/03/25
20		Plan de inspeccion de ensayos	33 días	mié 22/01/25	vie 7/03/25
21		Planes de muestreos y ensayos	33 días	mié 22/01/25	vie 7/03/25
22		**Area social**	**20 días**	**mié 22/01/25**	**mar 18/02/25**
23		Informe de actividades previas	13 días	mié 22/01/25	vie 7/02/25
24		Plan de gestion social	20 días	mié 22/01/25	mar 18/02/25
25		**Area ambiental**	**20 días**	**mié 22/01/25**	**mar 18/02/25**
26		Manual ambiental de obra (MAO)	20 días	mié 22/01/25	mar 18/02/25
27		Plan de gestion integral de residuos de construccion y demolicion (Solucitud de PIN)	20 días	mié 22/01/25	mar 18/02/25
28		**Area SST**	**20 días**	**mié 22/01/25**	**mar 18/02/25**
29		Sistema de gestion y seguridad y salud en el trabajo	20 días	mié 22/01/25	mar 18/02/25
30		**ETAPA DE CONSTRUCCION**	**228 días**	**vie 7/03/25**	**mar 20/01/26**
31		**Malla Vial**	**226 días**	**vie 7/03/25**	**vie 16/01/26**
32		1. 1000996	90 días	vie 7/03/25	jue 10/07/25
33		2. 1001048	90 días	vie 7/03/25	jue 10/07/25
34		3. 1003749	90 días	vie 7/03/25	jue 10/07/25
35		4. 1004732	90 días	vie 7/03/25	jue 10/07/25
36		5. 1004684	90 días	vie 7/03/25	jue 10/07/25
37		6. 1004613	90 días	vie 7/03/25	jue 10/07/25

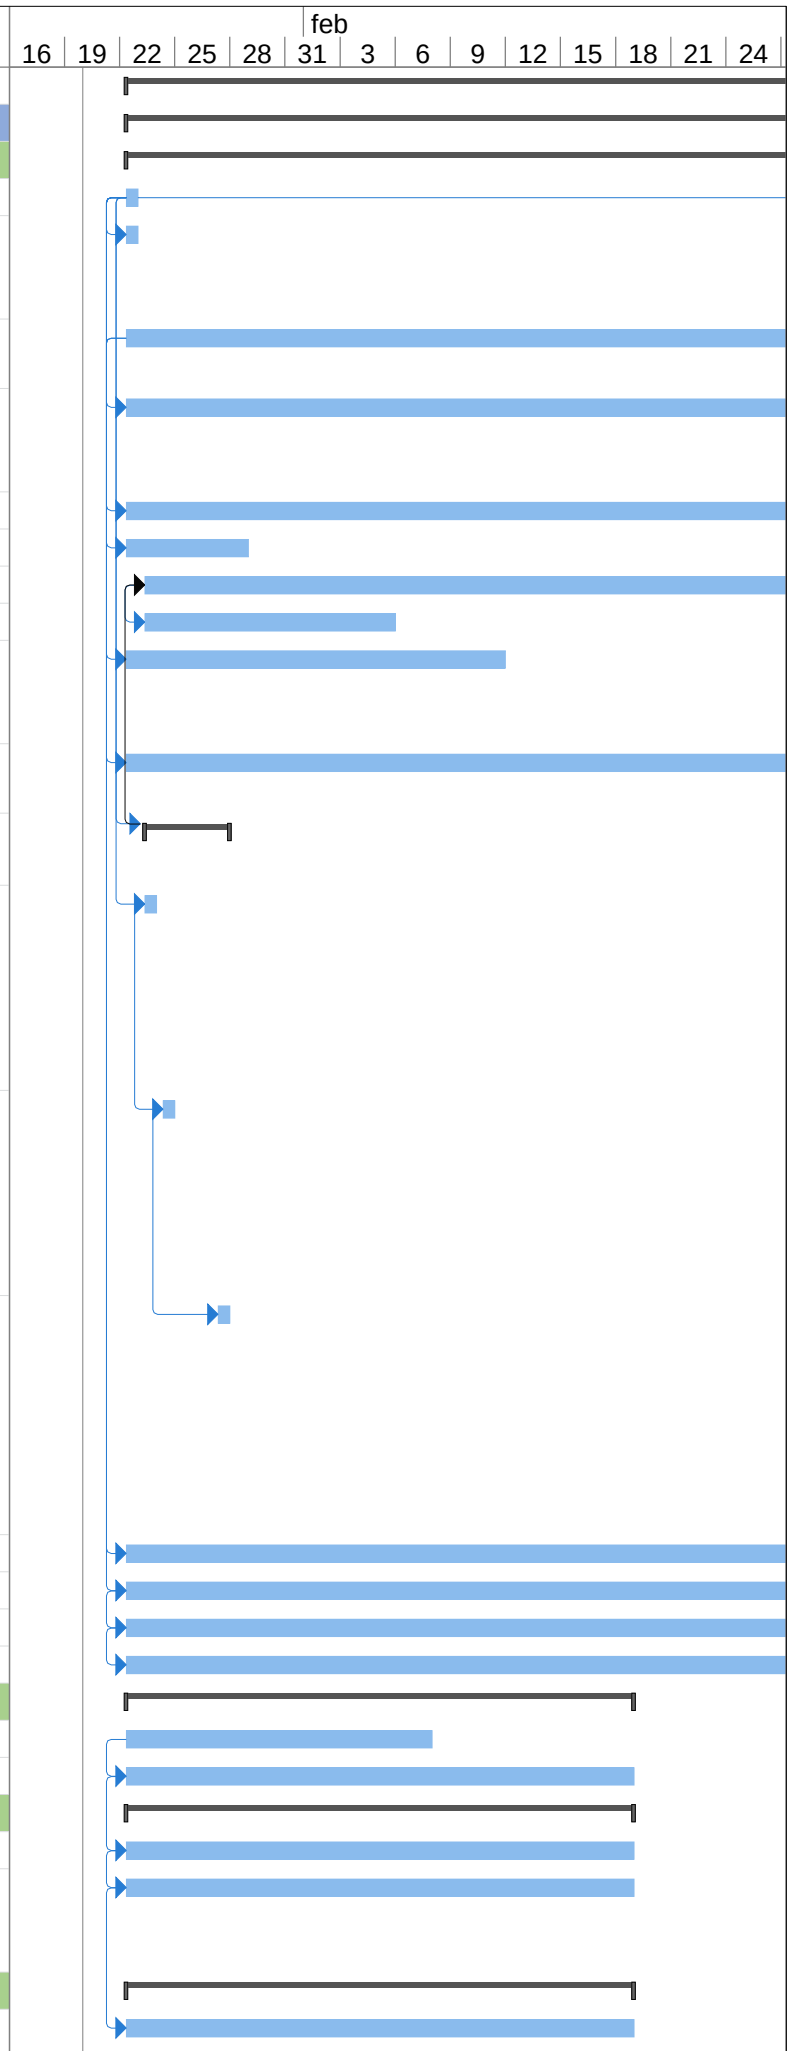

Proyecto: msproj11
Fecha: jue 29/05/25


Tarea		Informe de resumen manual	
División		Resumen manual	
Hito		Sólo el comienzo	
Resumen		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Fecha límite	
Tareas externas		Línea base	
Hito externo		Hito de línea base	
Tarea inactiva		Resumen de línea base	
Hito inactivo		Progreso	
Resumen inactivo		Progreso manual	
Tarea manual		Atraso	
Sólo duración			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
38		7. 1001754	90 días	vie 7/03/25	jue 10/07/25
39		8. 1006766	90 días	vie 7/03/25	jue 10/07/25
40		9. 1007251	90 días	vie 7/03/25	jue 10/07/25
41		10. 1006801	90 días	vie 7/03/25	jue 10/07/25
42		11. 1006800	90 días	mar 10/06/25	lun 13/10/25
43		12. 1001546	90 días	mar 10/06/25	lun 13/10/25
44		13. 1000423	90 días	mar 10/06/25	lun 13/10/25
45		14. 1006953	90 días	mar 10/06/25	lun 13/10/25
46		15. 1004176	90 días	mar 10/06/25	lun 13/10/25
47		16. 1008367	90 días	mar 10/06/25	lun 13/10/25
48		17. 1004128	90 días	mar 10/06/25	lun 13/10/25
49		18. 1008318	90 días	mar 10/06/25	lun 13/10/25
50		19. 1008317	90 días	mar 10/06/25	lun 13/10/25
51		20. 1002104	90 días	mar 10/06/25	lun 13/10/25
52		21. 1000628	90 días	mar 10/06/25	lun 13/10/25
53		22. 1000613	90 días	mar 10/06/25	lun 13/10/25
54		23. 1000608	90 días	lun 15/09/25	vie 16/01/26
55		24. 1000604	90 días	lun 15/09/25	vie 16/01/26
56		25. 1005794	90 días	lun 15/09/25	vie 16/01/26
57		26. 1008129	90 días	lun 15/09/25	vie 16/01/26
58		27. 1003589	90 días	lun 15/09/25	vie 16/01/26
59		28. 1003934	90 días	lun 15/09/25	vie 16/01/26
60		29. 1004519	90 días	lun 15/09/25	vie 16/01/26
61		30. 1002008	90 días	lun 15/09/25	vie 16/01/26
62		31. 1007078	90 días	lun 15/09/25	vie 16/01/26
63		32. 1005528	90 días	lun 15/09/25	vie 16/01/26
64		**Espacio publico**	**128 días**	**lun 12/05/25**	**mié 5/11/25**
65		1. 1005518	60 días	lun 12/05/25	vie 1/08/25
66		2. 1001668	60 días	lun 12/05/25	vie 1/08/25
67		3. 1001936	60 días	lun 12/05/25	vie 1/08/25
68		4. 1001863	60 días	lun 12/05/25	vie 1/08/25
69		5. 1004613	60 días	lun 12/05/25	vie 1/08/25
70		6. 1004176	60 días	lun 12/05/25	vie 1/08/25
71		7. 1004519	60 días	lun 12/05/25	vie 1/08/25
72		8. 1005254	60 días	lun 12/05/25	vie 1/08/25
73		9. 1007204	60 días	lun 12/05/25	vie 1/08/25
74		10. 1001344	60 días	jue 14/08/25	mié 5/11/25
75		11. 1001332	60 días	jue 14/08/25	mié 5/11/25
76		12. 1001322	60 días	jue 14/08/25	mié 5/11/25
77		13. 1008216	60 días	jue 14/08/25	mié 5/11/25
78		14. 1005619	60 días	jue 14/08/25	mié 5/11/25
79		15. 1005611	60 días	jue 14/08/25	mié 5/11/25
80		16. 1003722	60 días	jue 14/08/25	mié 5/11/25
81		17. 1003794	60 días	jue 14/08/25	mié 5/11/25
82		18. 1007982	60 días	jue 14/08/25	mié 5/11/25
83		**Cicloinfraestructura**	**70 días**	**mié 15/10/25**	**mar 20/01/26**
84		1. 1008129	70 días	mié 15/10/25	mar 20/01/26

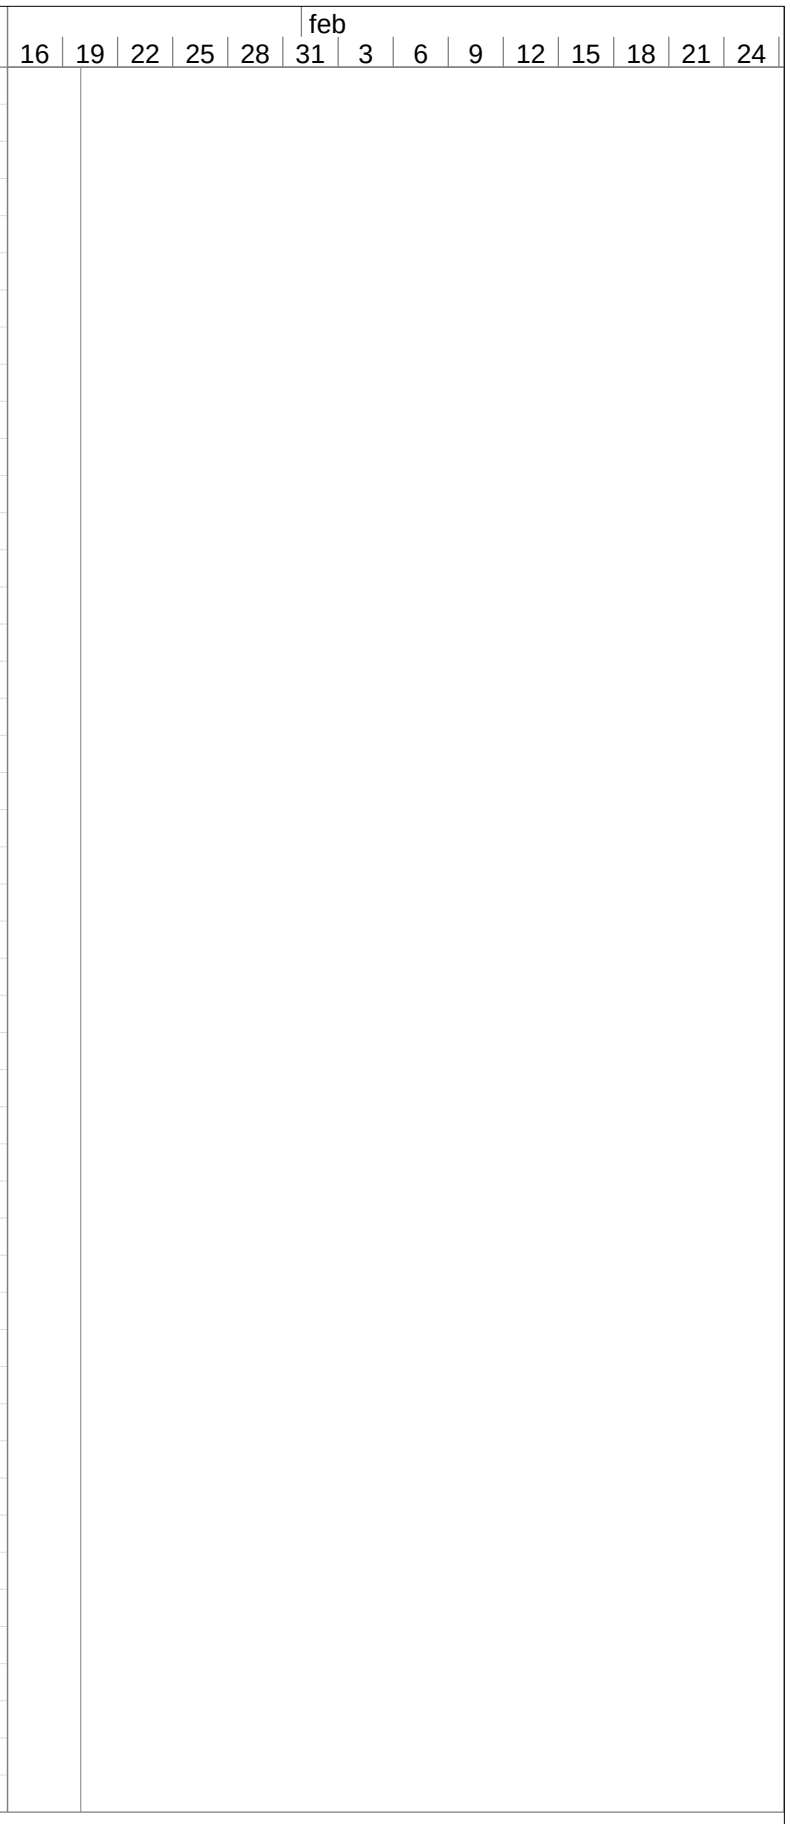


Proyecto: msproj11
Fecha: jue 29/05/25

Tarea		Informe de resumen manual	
División		Resumen manual	
Hito		Sólo el comienzo	
Resumen		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Fecha límite	
Tareas externas		Línea base	
Hito externo		Hito de línea base	
Tarea inactiva		Resumen de línea base	
Hito inactivo		Progreso	
Resumen inactivo		Progreso manual	
Tarea manual		Atraso	
Sólo duración			

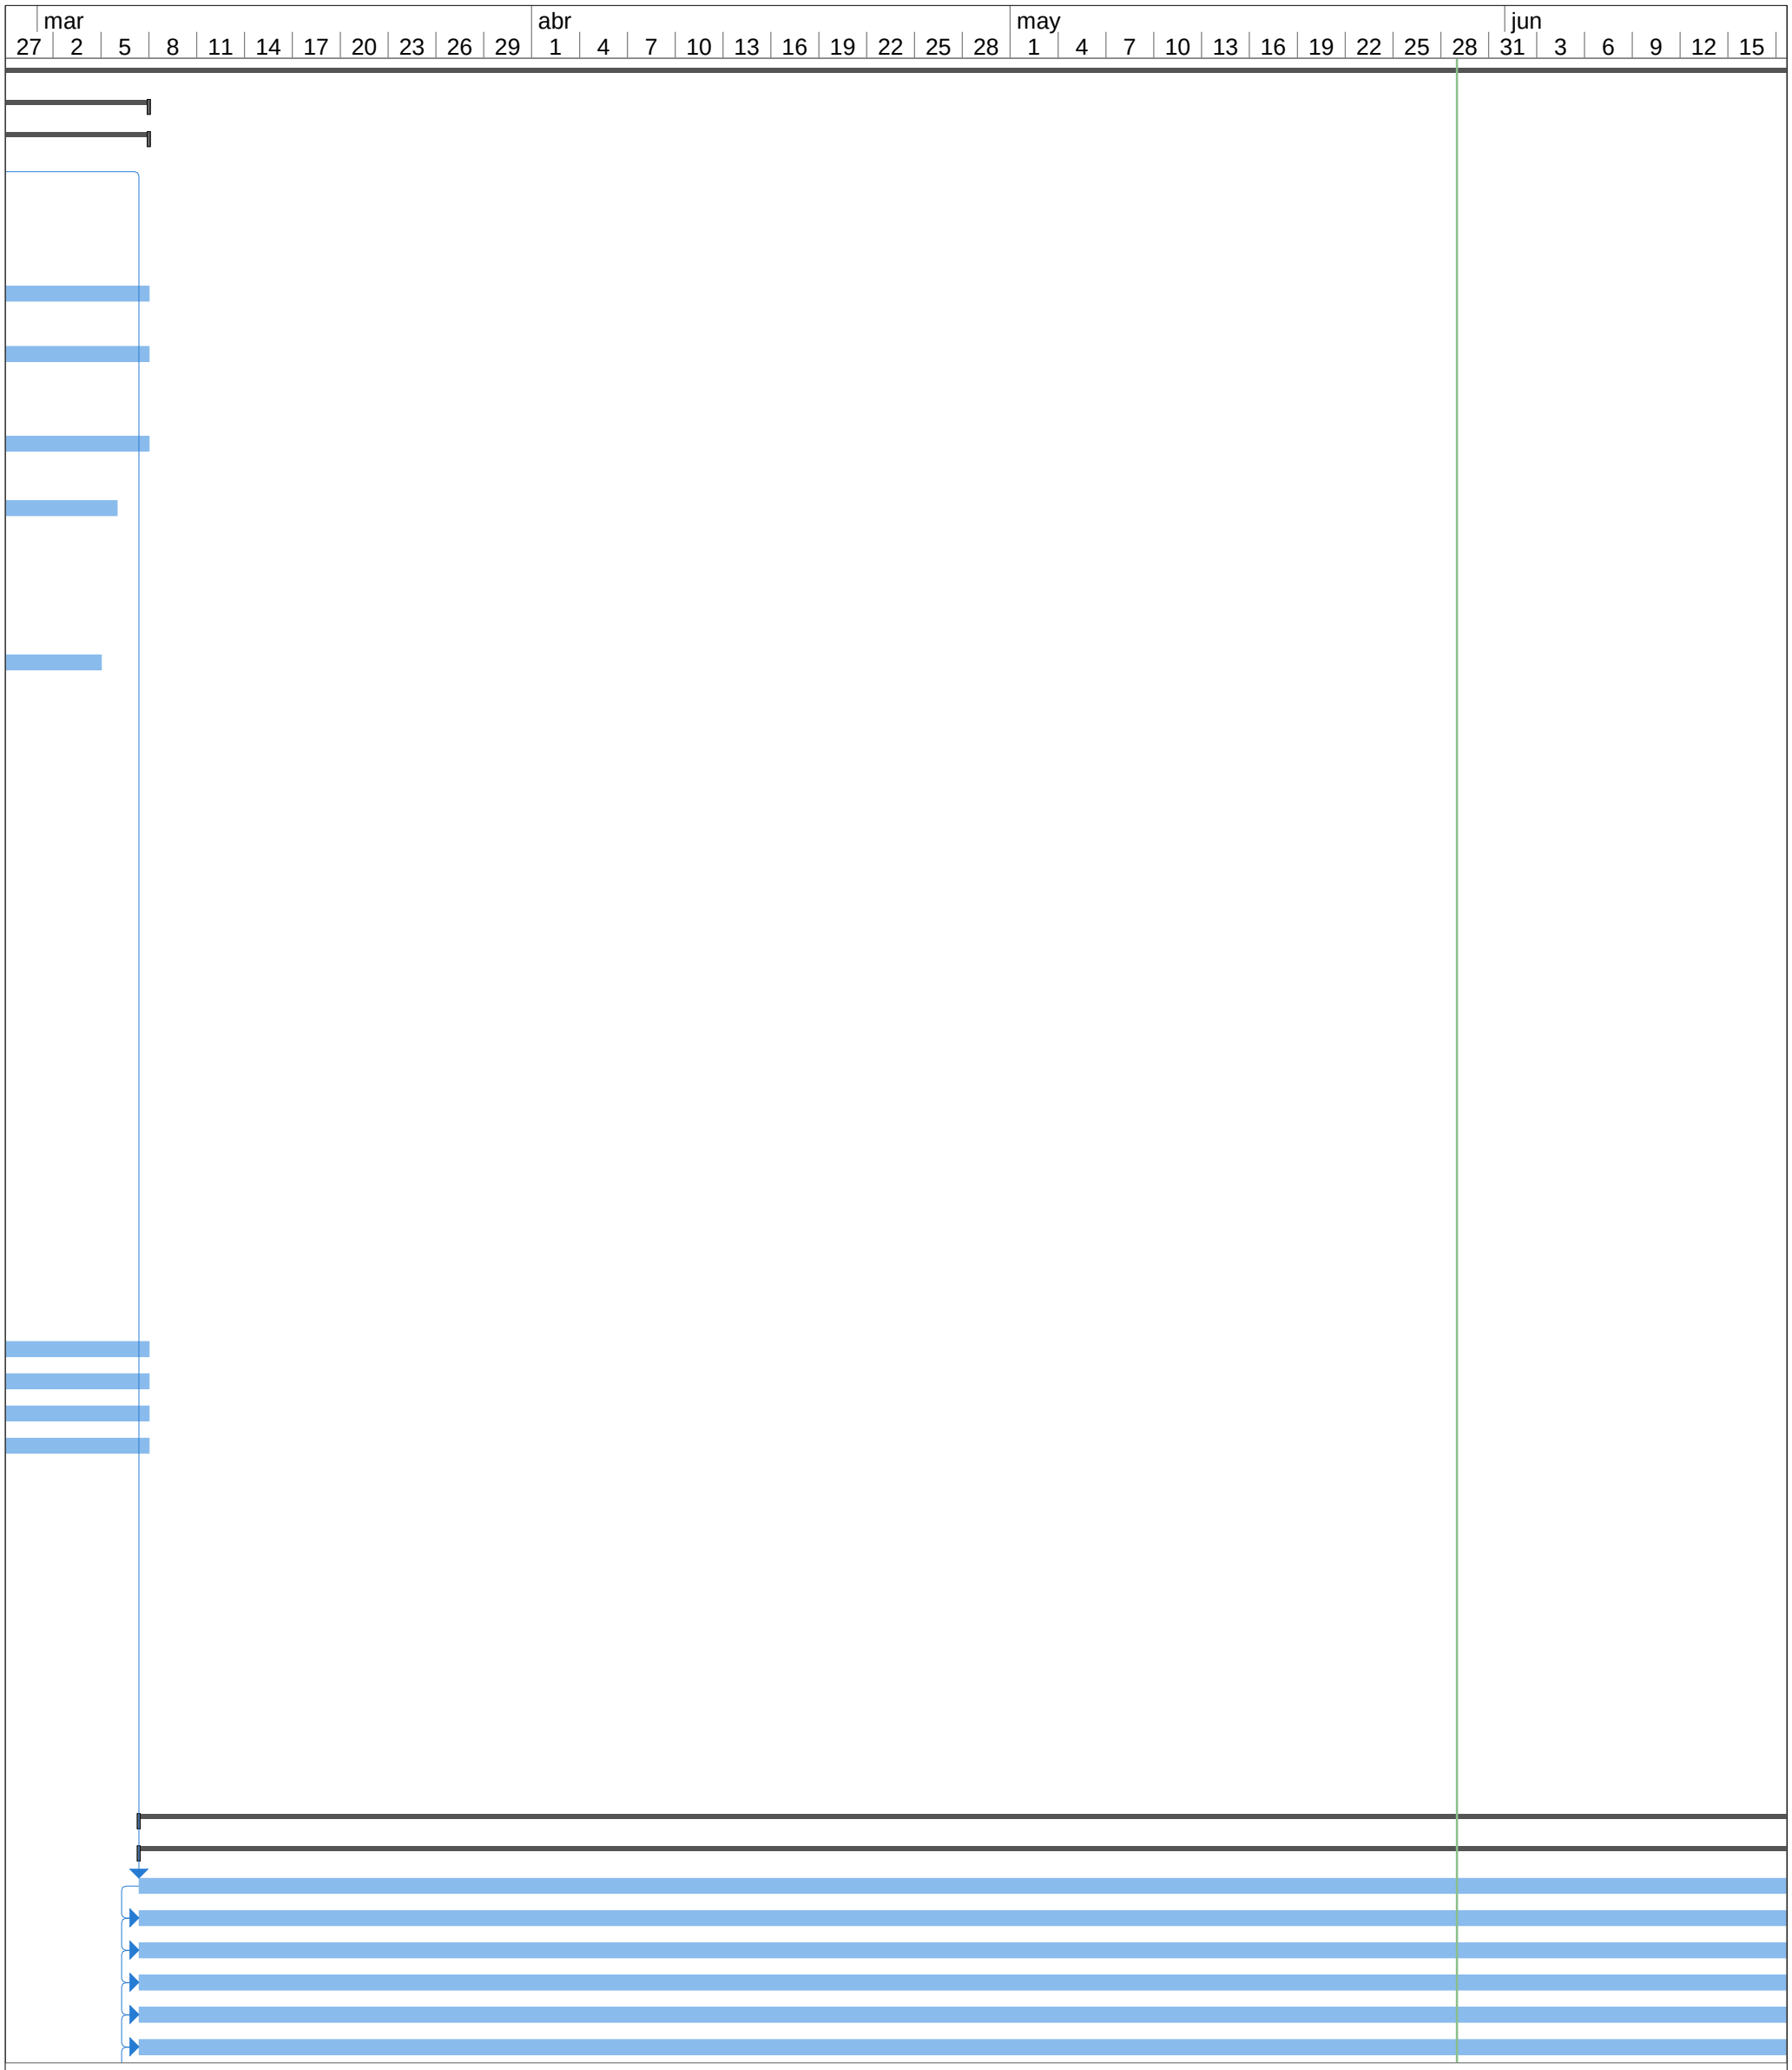

Proyecto: msproj11
Fecha: jue 29/05/25

Tarea		Informe de resumen manual	
División		Resumen manual	
Hito		Sólo el comienzo	
Resumen		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Fecha límite	
Tareas externas		Línea base	
Hito externo		Hito de línea base	
Tarea inactiva		Resumen de línea base	
Hito inactivo		Progreso	
Resumen inactivo		Progreso manual	
Tarea manual		Atraso	
Sólo duración			

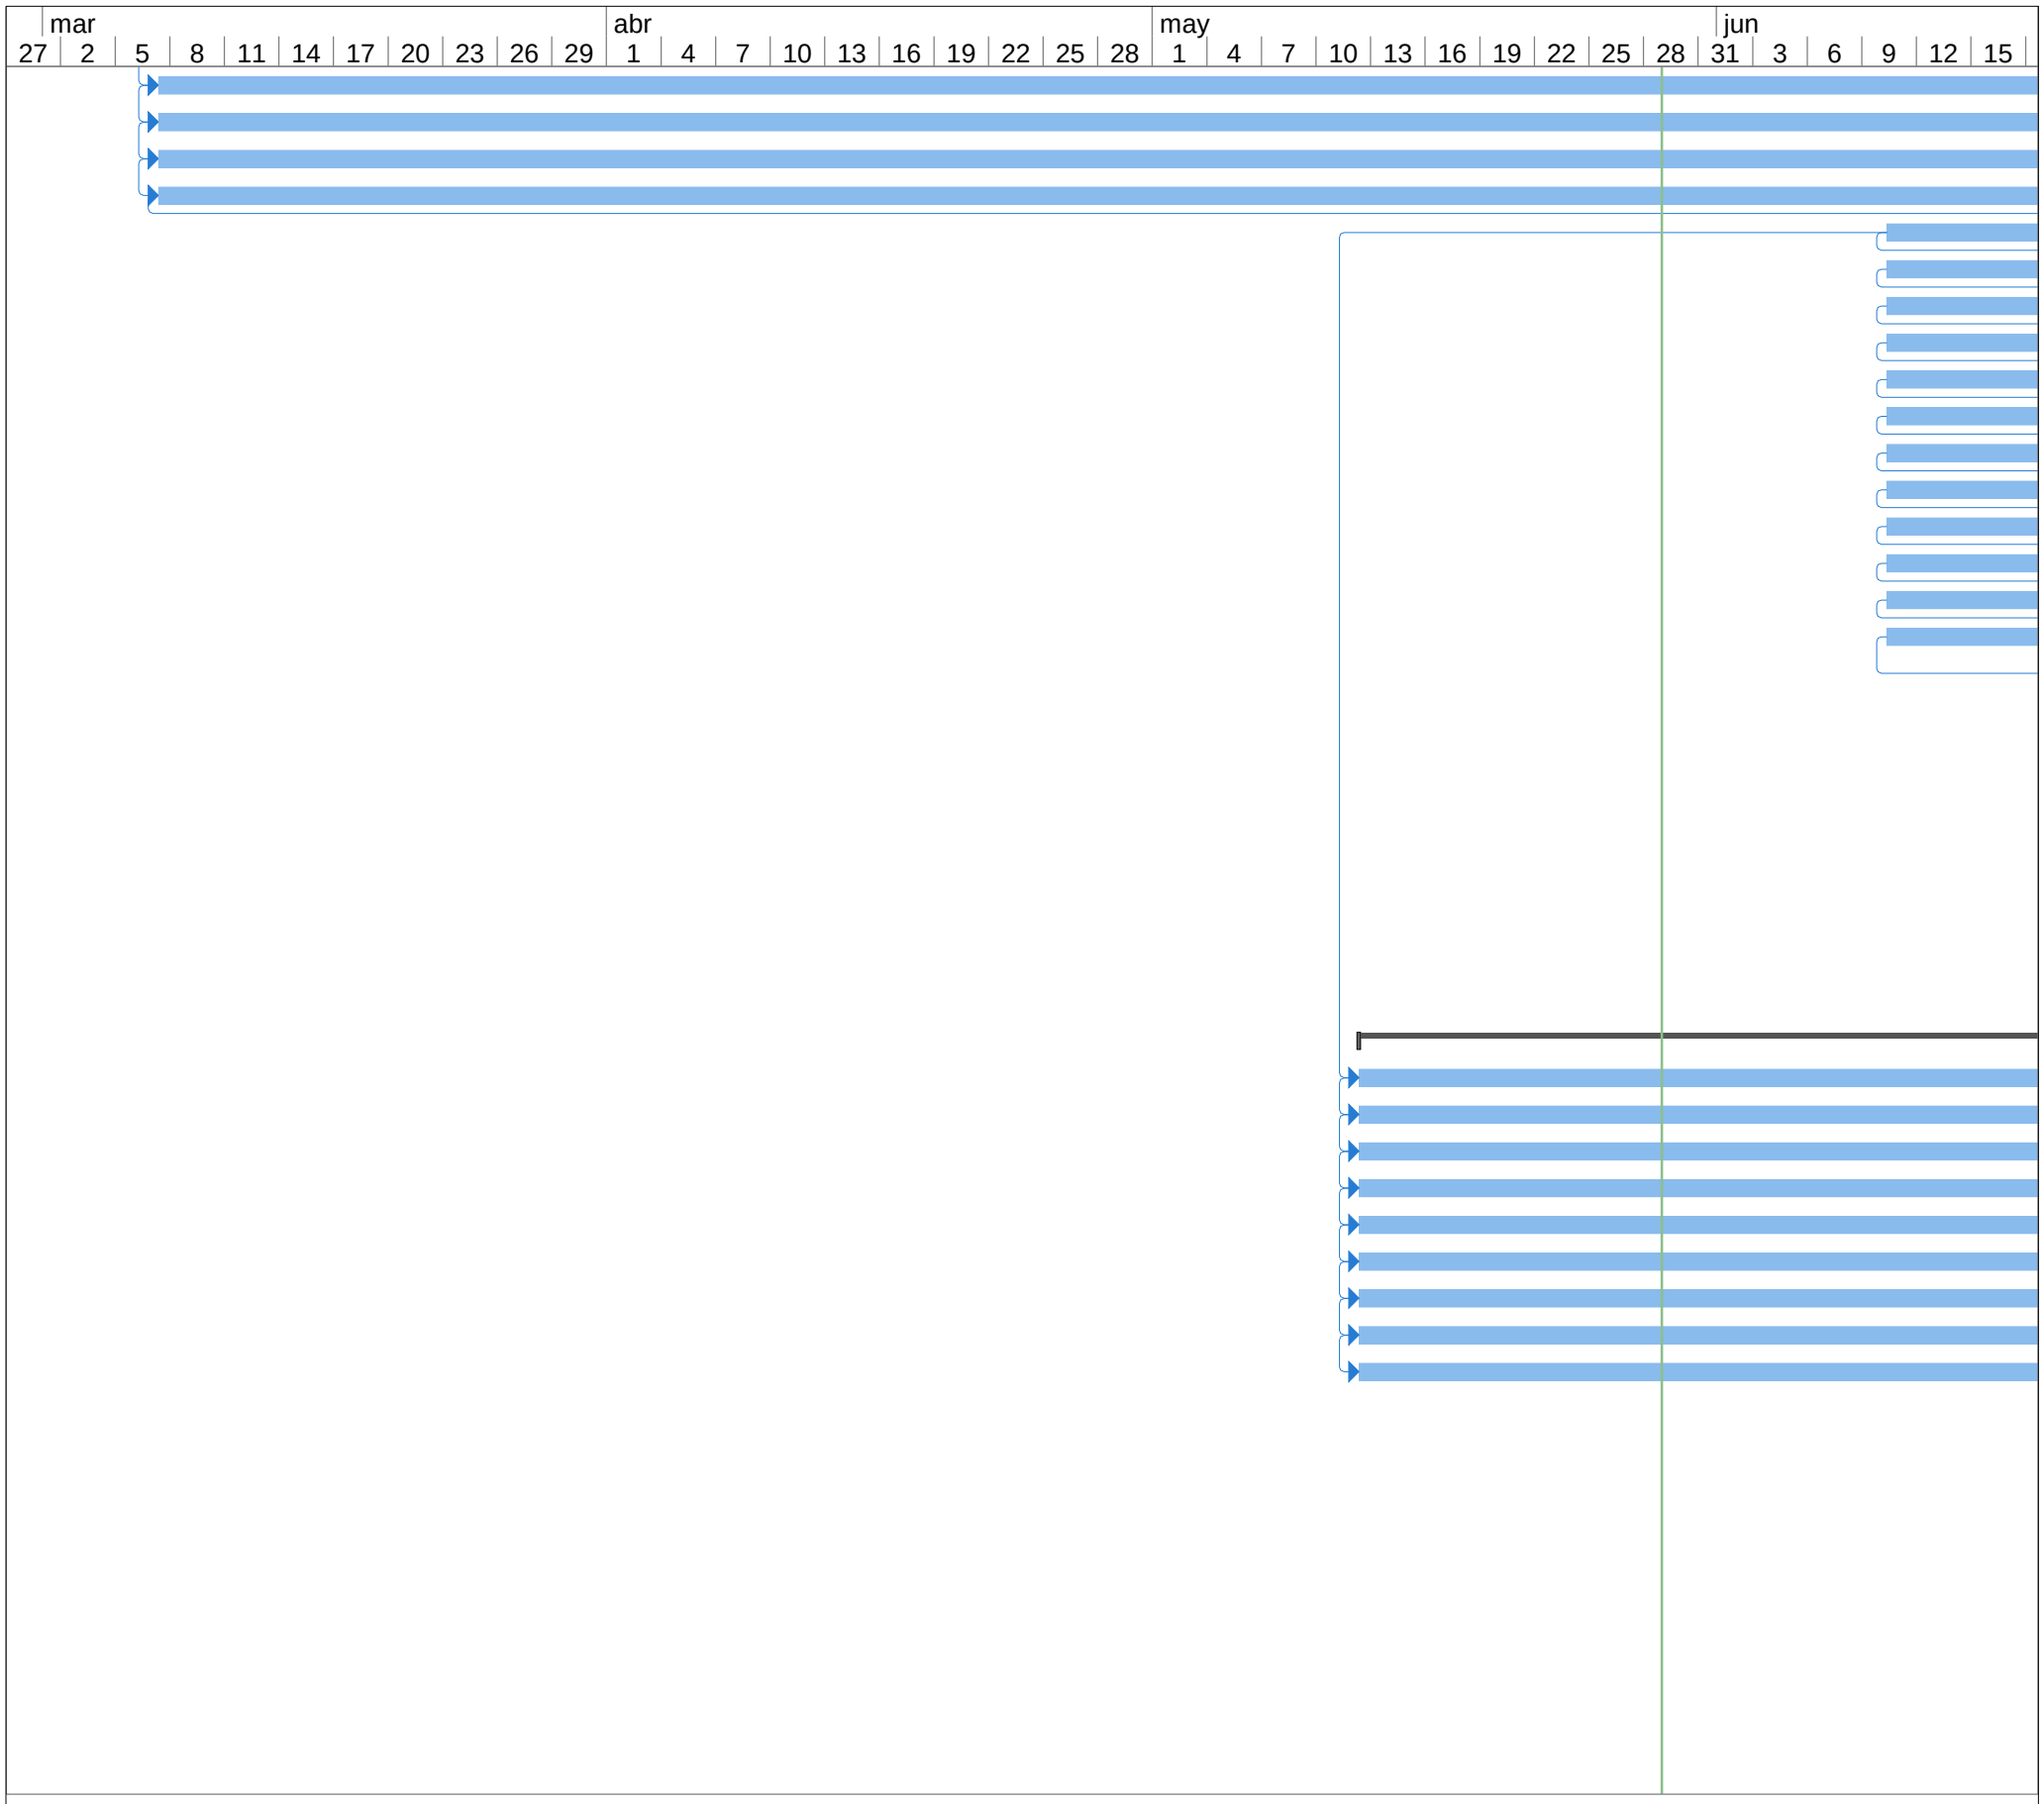


Proyecto: msproj11
Fecha: jue 29/05/25

Tarea		Informe de resumen manual	
División		Resumen manual	
Hito		Sólo el comienzo	
Resumen		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Fecha límite	
Tareas externas		Línea base	
Hito externo		Hito de línea base	
Tarea inactiva		Resumen de línea base	
Hito inactivo		Progreso	
Resumen inactivo		Progreso manual	
Tarea manual		Atraso	
Sólo duración			



Proyecto: msproj11
Fecha: jue 29/05/25

Tarea		Informe de resumen manual	
División		Resumen manual	
Hito		Sólo el comienzo	
Resumen		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Fecha límite	
Tareas externas		Línea base	
Hito externo		Hito de línea base	
Tarea inactiva		Resumen de línea base	
Hito inactivo		Progreso	
Resumen inactivo		Progreso manual	
Tarea manual		Atraso	
Sólo duración			

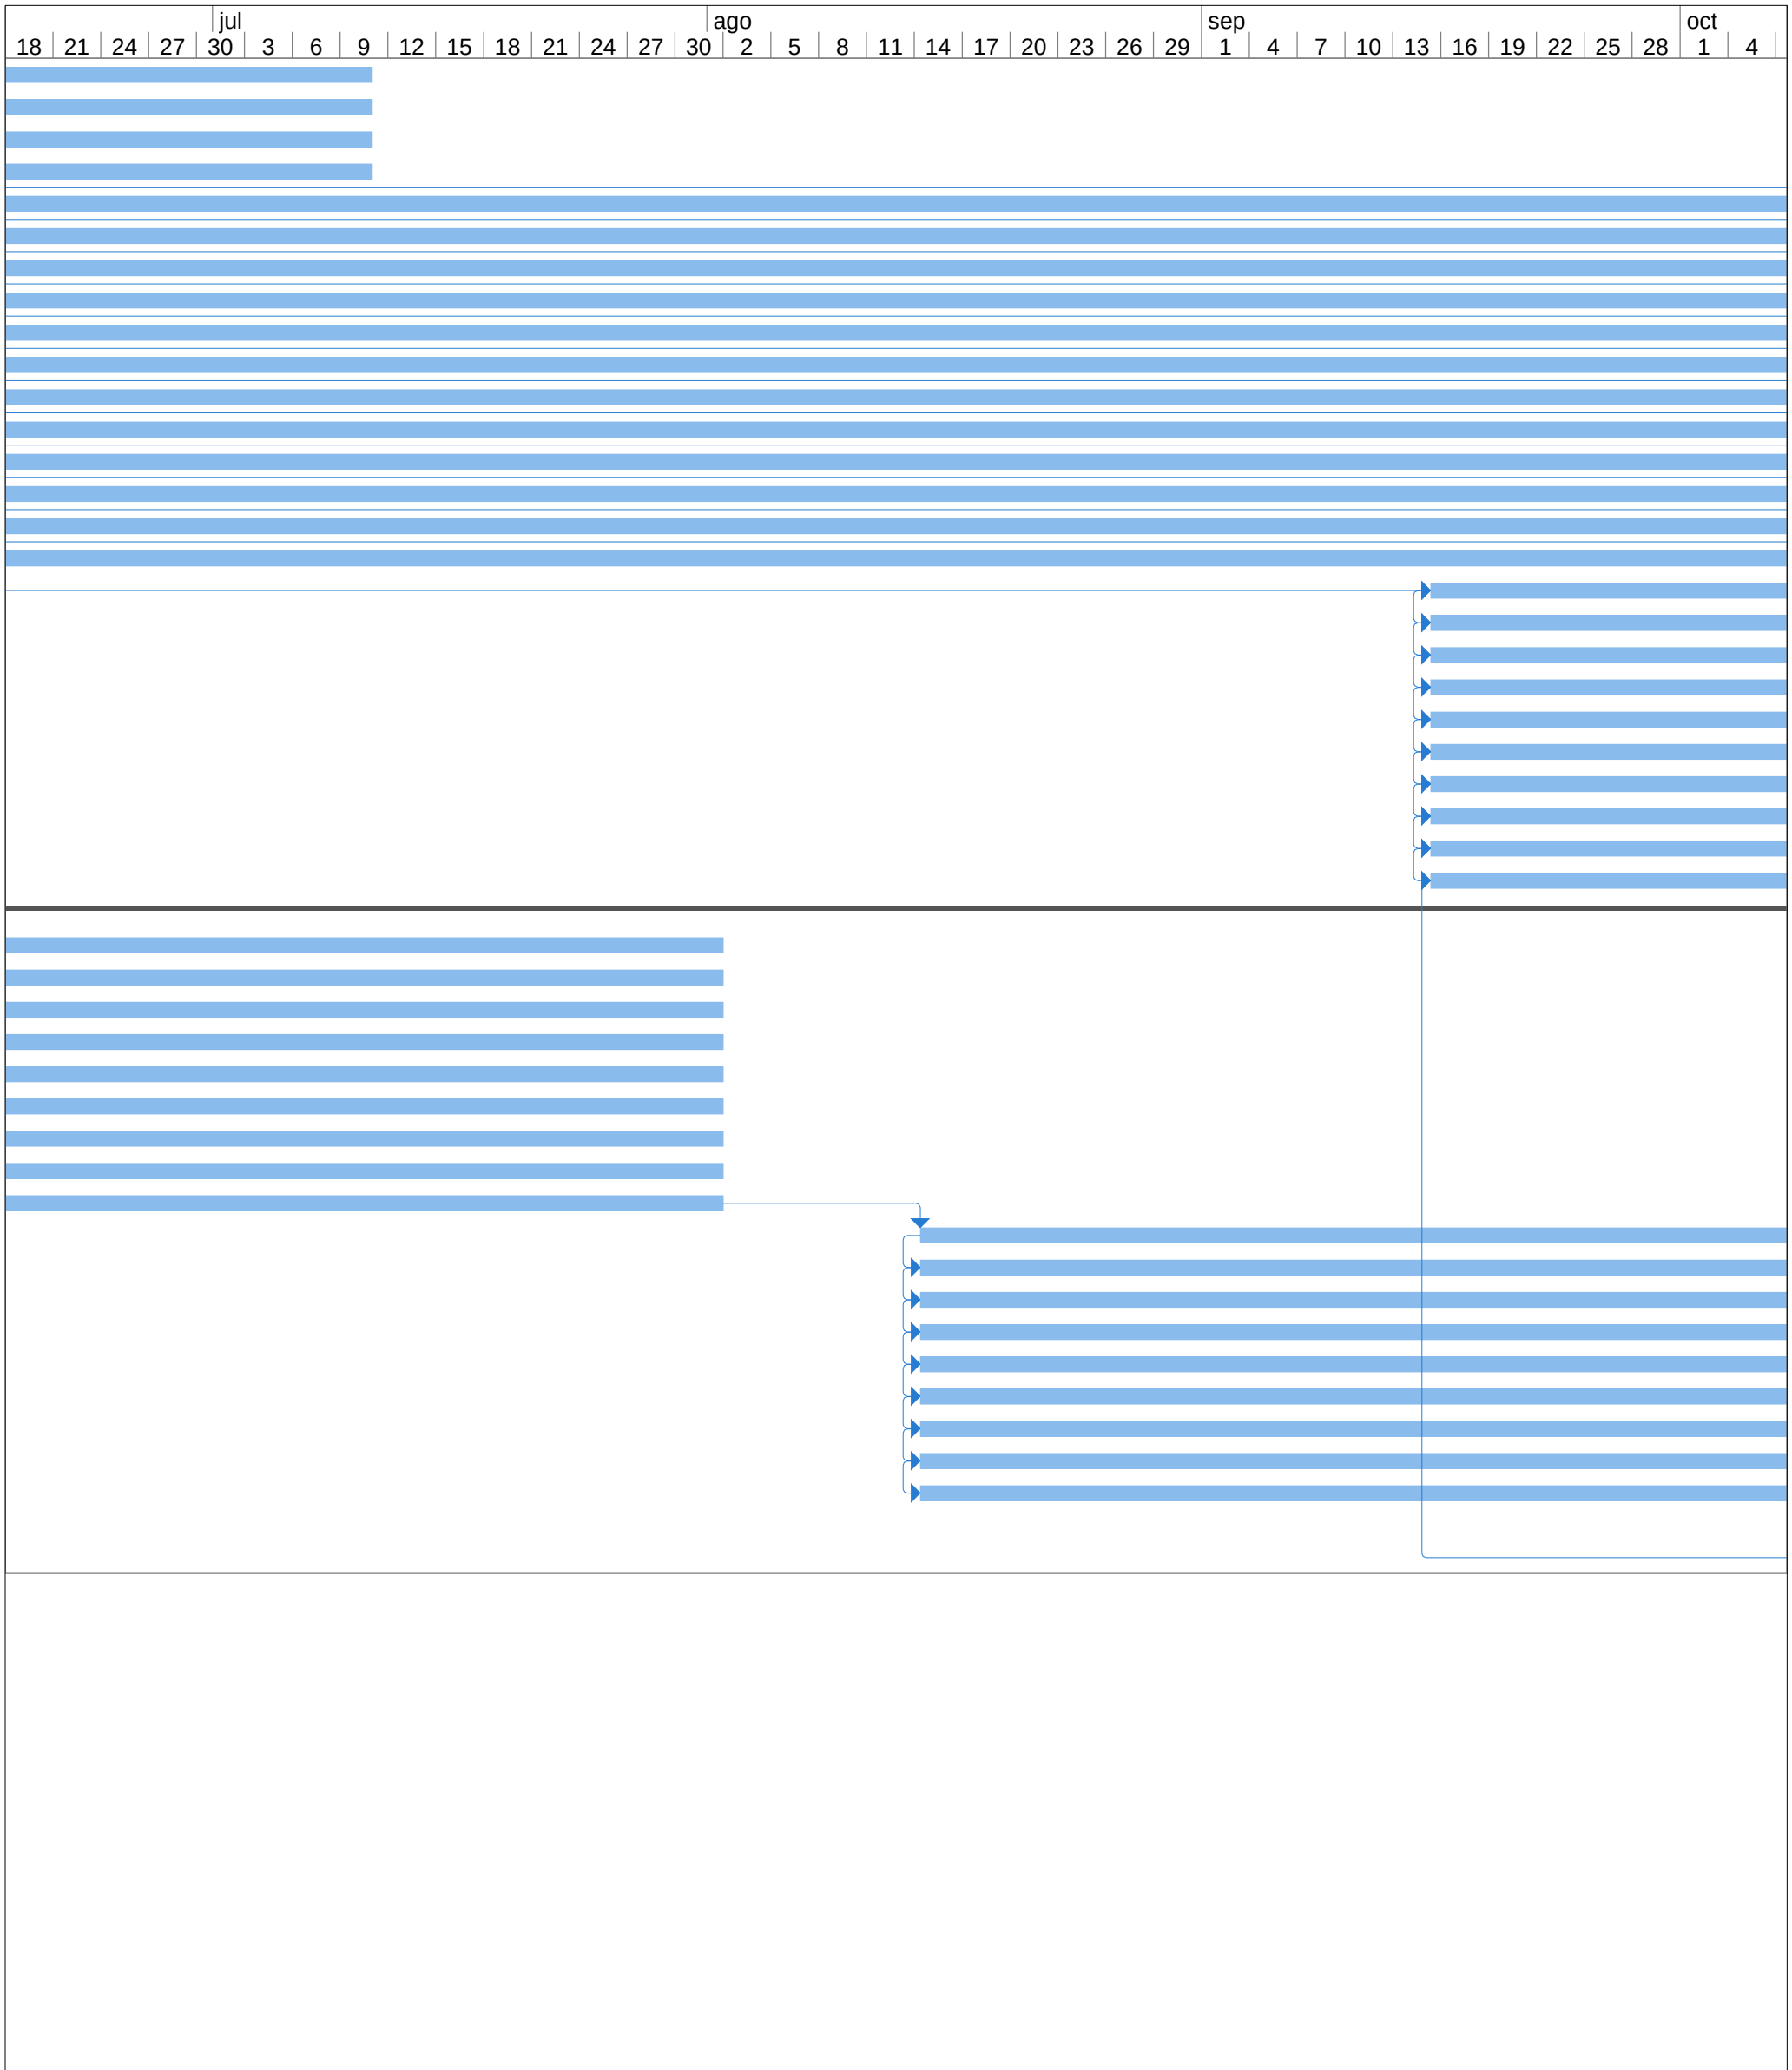


Proyecto: msproj11
Fecha: jue 29/05/25

Tarea		Informe de resumen manual	
División		Resumen manual	
Hito		Sólo el comienzo	
Resumen		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Fecha límite	
Tareas externas		Línea base	
Hito externo		Hito de línea base	
Tarea inactiva		Resumen de línea base	
Hito inactivo		Progreso	
Resumen inactivo		Progreso manual	
Tarea manual		Atraso	
Sólo duración			



Proyecto: msproj11
Fecha: jue 29/05/25

Tarea		Informe de resumen manual	
División		Resumen manual	
Hito		Sólo el comienzo	
Resumen		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Fecha límite	
Tareas externas		Línea base	
Hito externo		Hito de línea base	
Tarea inactiva		Resumen de línea base	
Hito inactivo		Progreso	
Resumen inactivo		Progreso manual	
Tarea manual		Atraso	
Sólo duración			

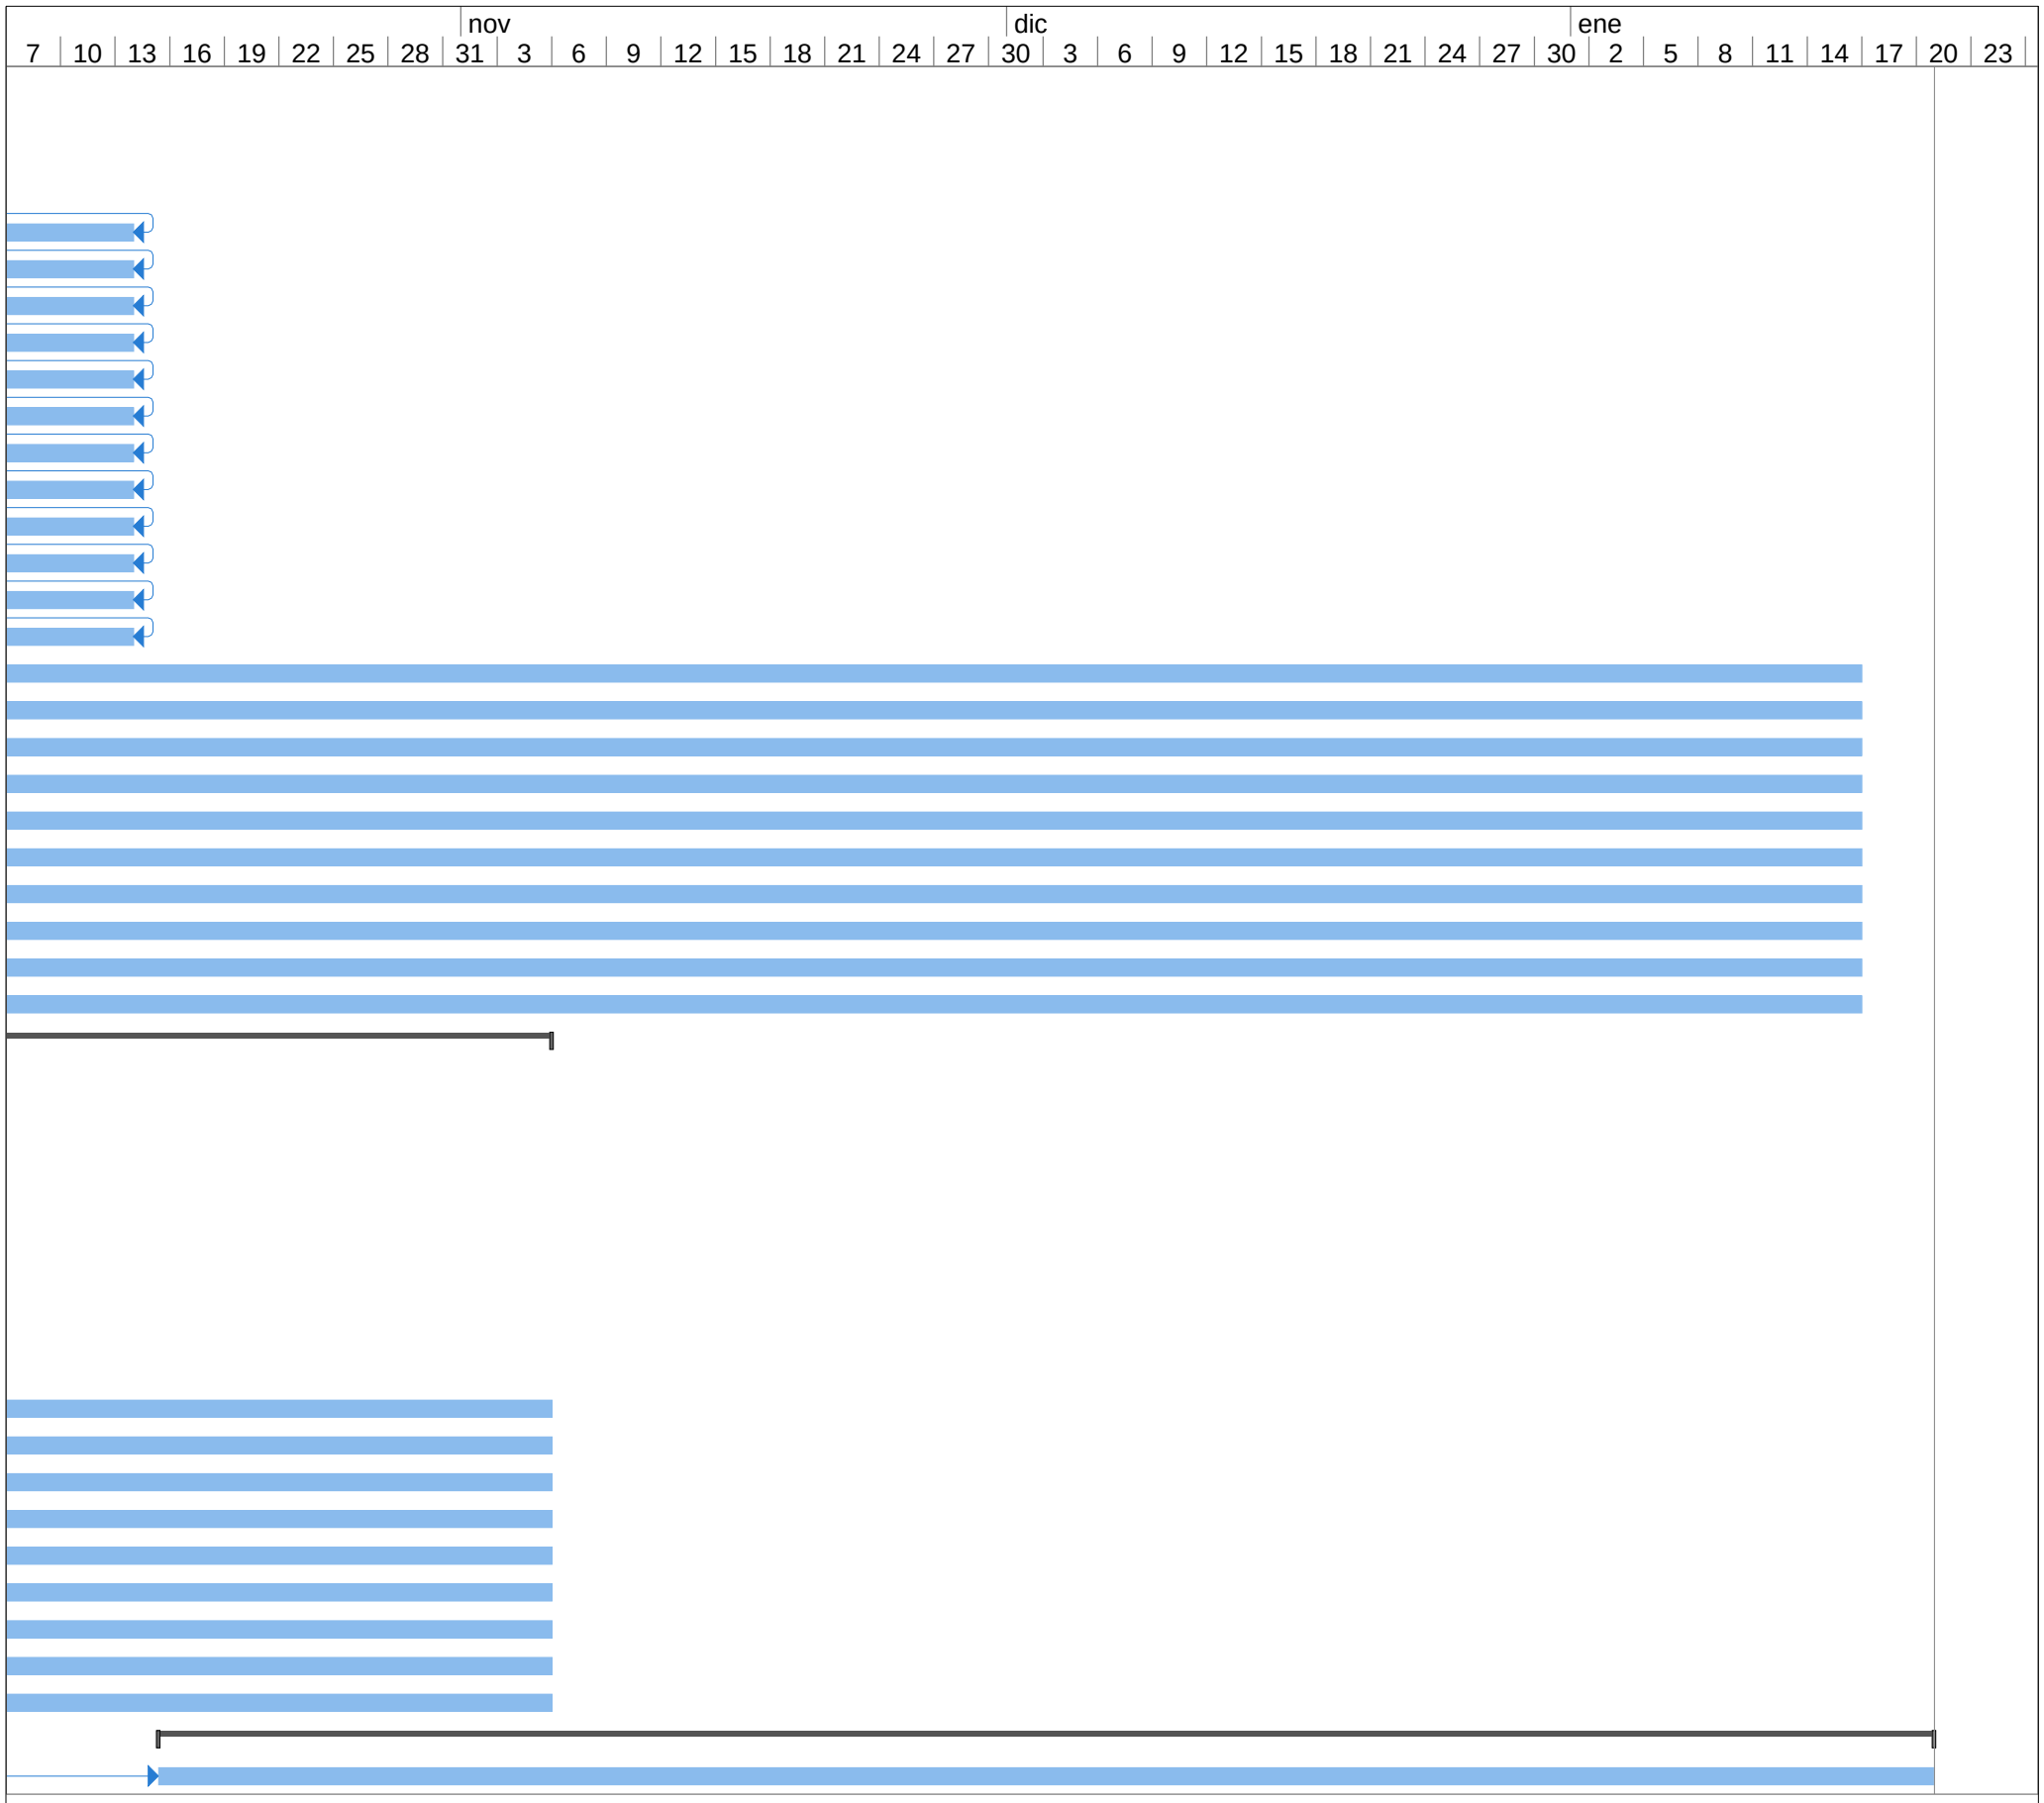

Proyecto: msproj11
Fecha: jue 29/05/25

Tarea		Informe de resumen manual	
División		Resumen manual	
Hito		Sólo el comienzo	
Resumen		Sólo fin	
Resumen del proyecto		Fecha límite	
Tareas externas		Línea base	
Hito externo		Hito de línea base	
Tarea inactiva		Resumen de línea base	
Hito inactivo		Progreso	
Resumen inactivo		Progreso manual	
Tarea manual		Atraso	
Sólo duración			
