
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Pred	Comienzo	Fin
1		**REHABILITACIÓN DE LA CALLE 22 SUR CON CARRERA 11**	**90 días**		**lun 23/06/25**	**vie 24/10/25**
2		CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE	9 días		lun 23/06/25	jue 3/07/25
3		PEDRAPLEN COMPACTO	2 días	2	vie 4/07/25	lun 7/07/25
4		EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	3 días	3	mar 8/07/25	jue 10/07/25
5		SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A-80	11 días	4	vie 11/07/25	vie 25/07/25
6		SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM)	6 días	5	lun 28/07/25	lun 4/08/25
7		PAVIMENTO EN ADOQUIN TOLETE COMUN INSTALADO EN	59 días	6	mar 5/08/25	vie 24/10/25

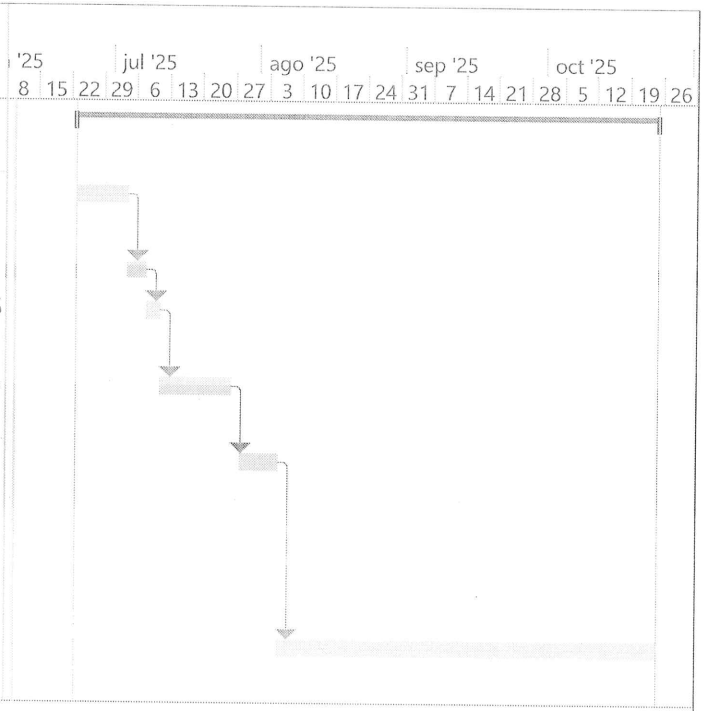

Proyecto: cronograma calle 22
Fecha: mar 10/06/25

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual
