BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 5
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Objeto de la reunión:** | SEGUIMIENTO CTO FDLUS 740-2024 Y CTO FDLUS-743-2024 | | |
| **Fecha:** | 16/05/2025 | **Hora de inicio:** 8:00 A.M | **Modalidad:** X Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta |
| **Lugar:** | EN OBRA | **Hora de finalización:** | |
| **Dependencia:** | | **Nombre del Responsable:** | |


| TIPO DE DOCUMENTO | NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal) | NOMBRE IDENTITARIO | ENTIDAD Y DEPENDENCIA | CARGO | | | | | TIPO DE VINCULACIÓN | | | | CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ASESOR | DIRECTIVO | PROFESIONAL | TÉCNICO/ TECNÓLOGO | AUXILIAR | CARRERA | PROVISIONAL | LIBRE NOMB. | CONTRATISTA | | |
| C.C | 51740684 | Margarita Gómez | Mujer | Interventora | | | | | | | | | X | | |
| C.C | 39.549.905 | Esperanza Acevedo. | Mujer | Interventoria | | | | | | | | | X | rymusaqueparques743@gmail.com | |
| C.C | 10.184.97703 | Nicolas Chavez Rosero | Hombre | Interventoría | | | | | | | | | X | rymusaqueparques743@gmail.com | |
| C.C | 80194.680 | DANIEL CHAVARRO C. | | Contratista Usaquen 005/2024 | | | X | | | | | | | contratousaquen005@gmail.com | |
| C.C | 52077.469 | Sandra Janeth Rodriguez | Mujer | Contratista | | | X | | | | | | | Socialusaquen740@gmail.com | |
| C.C | 1069726317 | Katherine Jimenez G | Mujer | Interventora | | | X | | | | | | X | rymusaqueparques743@gmail.com | |
| C.C | 1016058756 | FREDY SANCHEZ. | — — | FDLUSA. | | | X | | | | | | X | 3143646607 | |
| C.C | | | | | | | | | | | | | | | |
| C.C | | | | | | | | | | | | | | | |

**CONSENTIMIENTO:** Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

**DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:**

| |
|---|
| **SE DA INICIO AL COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.14 :** |
| **REVISION COMPROMISOS COMITÉ ANTERIOR** |
| **1.1 BALANCE GENERAL DEL CONTRATO .RESP.CONTRATISTA (P.COMITE):** SE ENVIA HOY EL BALANCE. |
| **1.2 SUBIR CUENTA DE OBRA - INTERVENTORIA No.2 EN EL ONE DRIVE DEL FDLUS RESP.INTERVENTORIA- CONTRATISTA (14-05-2025):** SE REALIZO EL CARGUE DE LA INFORMACION PARA REVISON POR PARTE DEL FDLUS EL (14-05-2025) OK. |
| **DESARROLLO COMITÉ** |
| **AVANCE: PROGRAMADO 37.99% - EJECUTADO 40.32%** |
| • ESTRELLA NORTE: CONTINUA ACTIVIDADES INSTALACION DE ADOQUIN - ACTIVIDAD EN LA BARANDA - SOLDADURA. |
| • JARDINES DEL ORIENTE: CONTINUA ACTIVIDAD INSTACACION DE ADOQUIN - ACTIVIDAD EN LA BARANDA - SOLDADURA. - SE ESTA INSTALANDO EL JUEGO INFANTIL. |
| • ALCAZARES DEL RIO: SE INSTALO JUEGO INFANTIL - INSTALACION DE BORDILLO - ADO SE EMPEZO A INSTALAR LOS PARALES CERRAMIENTO PERRITOS - E INSTALACION MODULOS BARANDA INFANTIL H-83. |
| • MOLINOS: SE ESTA INSTACANDO ADOQUIN ZONA RAMPA COSTADO SUR ORIENTAL - SE REUNIRA TEMA BOLARDOS. |
| • SAN PATRICIO: LIMPIAR ZONA ADOQUIN FRENTE A BANCAS EN MADERA. TOMAR FOTO PARA REUNIR MANCHAS DE CONCRETO. Y ENVIAR AL ARQ. FREDY SANCHEZ. |
| • SE INFORMA POR PARTE DEL ARQ. FREDY APOYO A LA SUPERVISION DEL FDLUS, QUE EL MARTES (20-05-2025) VISITA DE LA CONTRALORIA A LAS 2:00 P.M EN LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA DEL FDLUS, PARA HACER RECORRIDO. |

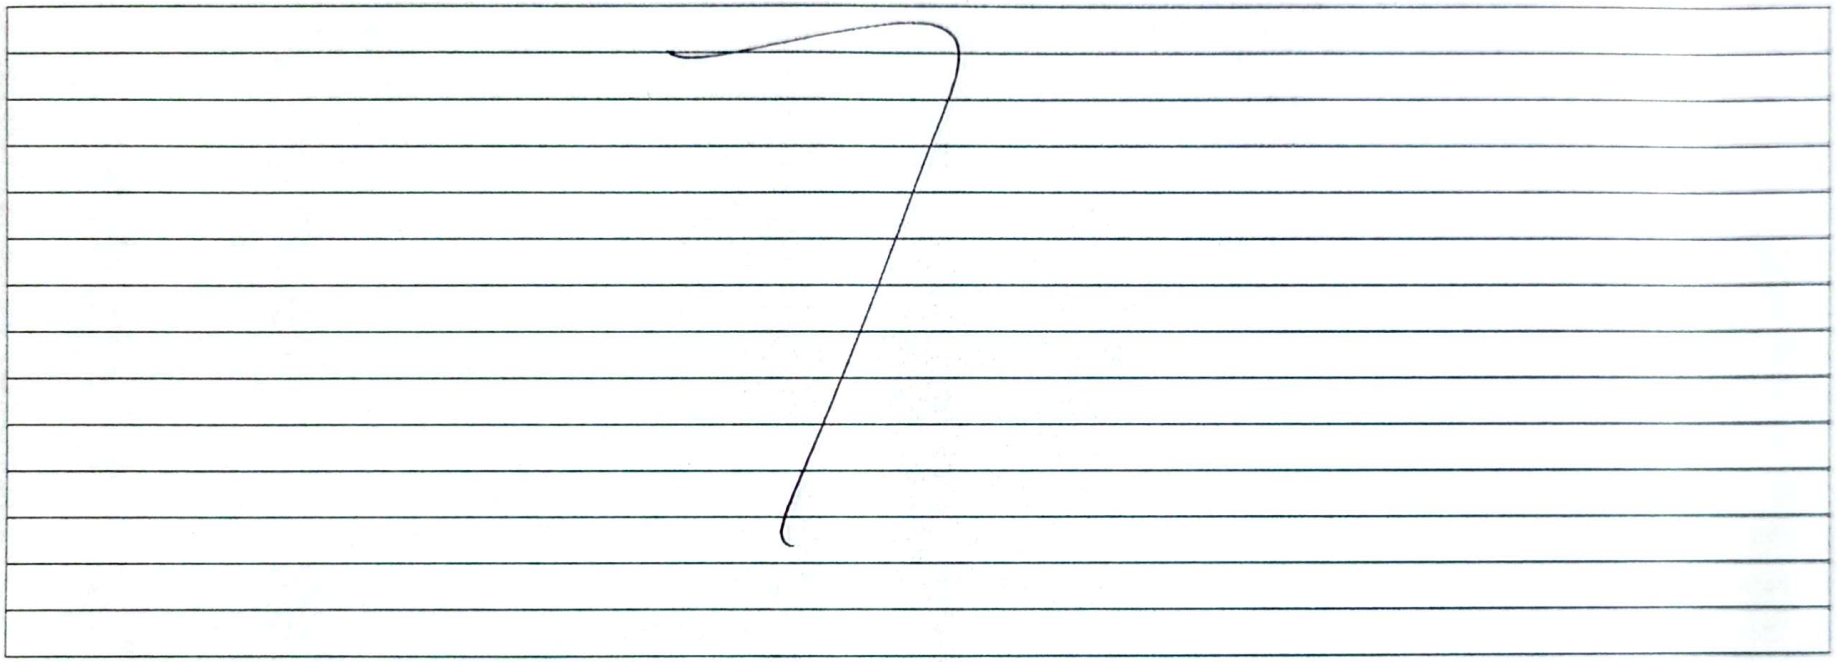

**COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:**

| No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|---|---|
| 1. | SE ENVIA BALANCE POR PARTE DEL CONTRATISTA HOY (16-05-2023) | CONTRATISTA | 16-05-2025 |
| 2. | ENVIAR REG. FOTOGRAFICO DE LAS MANCHAS DE CONCRETO EN EL ADOQUIN EN SAN PATRICIO POR LA INSTALACION DE LAS BANCAS - BADEN. | CONTRATISTA. | P. JENANA |
| 3 | REUNION OFICINA INFRAESTRUCTURA VISITA CONTRALORIA. | CONT-INTERFOLK | 22-05-2025 |
| | | | |
| | | | |

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.
