
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO EL "MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTNCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEFINIDOS Y PRIORIZADOS POR LA CDMB"

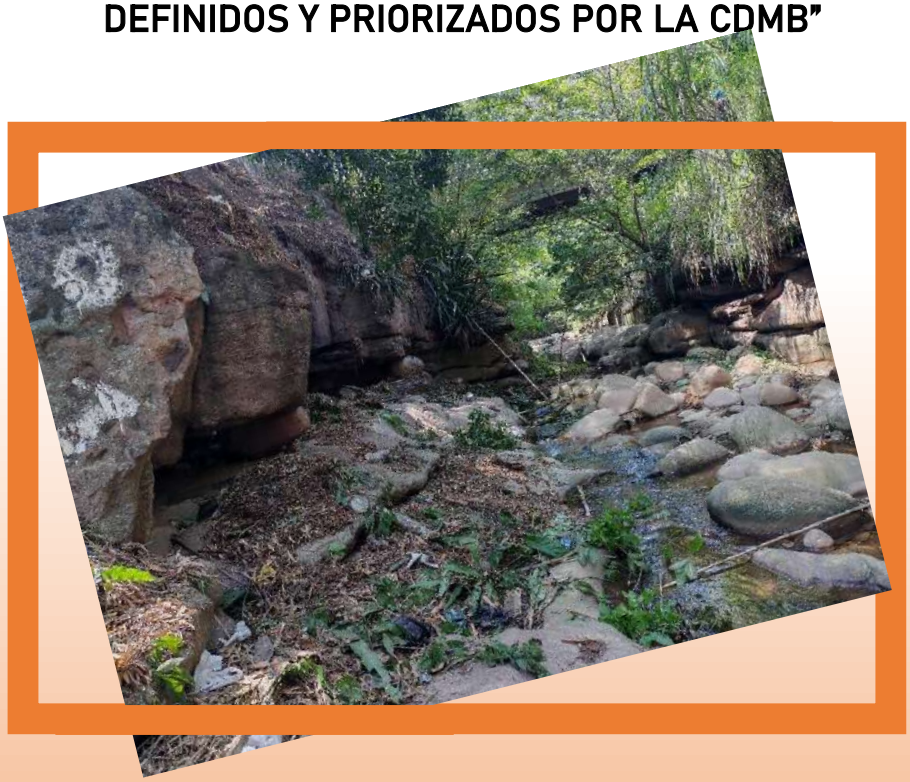

INFORME DE LIQUIDACIÓN

DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 210.15563.4 DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 210.15563.4 DE 2024



INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO EL "MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEFINIDOS Y PRIORIZADOS POR LA CDMB

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSERVACIÓN HIDRICA
CONTRATO DE OBRA No. 210.15562.5 DE 2024

ABRIL DE 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. LOCALIZACION DEL PROYECTO 8
2.1. QUEBRADA SURATOQUE – SECTOR BUCARICA 8
2.2. QUEBRADA SURATOQUE – SECTOR LAGOS 9
2.3. QUEBRADA LA CALAVERA – SECTOR MOLINOS 10
2.4. QUEBRADA ZAPAMANGA – SECTOR CAÑAVERAL 11
3. FICHA TECNICA CONTRATO DE OBRA No. 210.15562.5 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2024 12
3.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 12
3.2. VALOR EJECUTADO A LA FECHA POR EL CONTRATISTA DE OBRA 12
3.3. RELACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO DE OBRA 13
3.4. CONTROL DE PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA 13
3.4.1. PÓLIZAS SUSCRIPCIÓN CONTRATO DE OBRA – 25/10/2024 13
3.4.2. PÓLIZAS ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA – 25/11/2024 14
3.4.3. PÓLIZAS PRÓRROGA – 02/01/2025 14
3.4.4. PÓLIZAS ACTA DE RECIBO DEFINITIVO – 15/04/2025 14
3.5. RELACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA 14
3.5.1. PERSONAL CONTRACTUAL 15
3.5.2. PERSONAL OPERATIVO 15
3.5.3. PERSONAL OPERATIVO – LERMA CONSTRUCCIONES 15
3.5.4. PERSONAL OPERATIVO – CONSTRUCCIONES VERA SANGUINO 15
3.6. RELACION DEL EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA 16
3.7. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA 16
3.7.1. DURANTE EL PERIODO 16
3.7.2. PROGRAMA DE INVERSIONES 16
3.7.3. ANALISIS DEL PLAZO CONTRACTUAL 16
4. PRESUPUESTRO CONTRACTUAL – CONSORCIO CONSERVACIÓN HÍDRICA 18
5. PRESUPUESTRO ACTUALIZADO – CONSORCIO CONSERVACIÓN HÍDRICA – MODIFICACION No. 1 (27/03/2025) 19
6. PRESUPUESTRO ACTUALIZADO – CONSORCIO CONSERVACIÓN HÍDRICA – MODIFICACION No. 2 (29/03/2025) 20

7. AVANCE DE OBRA No. 1 21
8. AVANCE DE RECIBO DEFINITIVO DE OBRA 22
9. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA 24
9.1. ACTIVIDADES CONTRACTUALES 24
9.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 34
9.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA 35
9.4. BALANCE FINANCIERO 35
9.5. COBROS PARCIALES 35
9.6. VALOR EJECUTADO 36
9.7. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA 36
9.8. INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO 36
10. SEGUIMIENTO AL CONTROL FINANCIERO DE OBRA (CURVA S) 42
11. FICHA TECNICA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 210.15563.4 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2024 43
11.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 210.15563.4 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2024 43
11.2. VALOR EJECUTADO A LA FECHA POR EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA 43
11.3. RELACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 210.15563.4 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2024 44
11.4. CONTROL DE PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 210.15563.4 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2024 44
11.4.1. PÓLIZAS SUSCRIPCIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA – 24/10/2024 44
11.4.2. PÓLIZAS ACTA DE INICIO CONTRATO DE INTERVENTORÍA – 26/11/2024 44
11.4.3. PÓLIZAS PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA – 28/12/2024 44
11.4.4. PÓLIZAS ACTA DE RECIBO DEFINITIVO CONTRATO DE INTERVENTORÍA – 28/05/2025 45
11.5. RELACION DE PERSONAL INTERVENTORÍA 45
11.6. OTROS RECURSOS 45
11.7. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 210.15563.4 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2024 46
11.7.1. DURANTE EL PERIODO 46
12. PRESUPUESTO CONTRACTUAL DE INTERVENTORIA 47
13. AVANCE DE INTERVENTORÍA No. 1 48

14. AVANCE DE RECIBO DEFINITIVO INTERVENTORÍA 48
15. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA 50
15.1. ACTIVIDADES TECNICAS REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA: 50
15.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 51
15.3. ACTIVIDADES FINANCIERAS 51
15.4. COMPONENTE SOCIAL 51
15.5. COMPONENTE AMBIENTAL Y SST 52
16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 53
17. ANEXOS 55

1. INTRODUCCIÓN

La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) se encarga de los programas y proyectos en materia de ambiente, recursos naturales renovables y cambio climático aplicando las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento.

Sus principales funciones son concertar, adaptar, adoptar y ejecutar los diferentes instrumentos de planeación y planificación del Gobierno Nacional, ejercer el papel de autoridad ambiental en el marco de una acción ampliamente participativa, y de la mano de
las diferentes expresiones institucionales públicas y privadas de carácter territorial y sectorial, en su jurisdicción.

En su plan de acción denominado ¡EL AGUA NOS UNE, ES TIEMPO DE LA SEGURIDAD HÍDRICA! se estructuran componentes para cumplir a cabalidad las acciones operativas de la entidad enmarcando la complejidad de la Seguridad Hídrica involucra al territorio en sí mismo, de hecho, lo define, pues todos los componentes naturales y sociales, están relacionados con este elemento vital. En cada uno de los conceptos, la población, los ecosistemas, el suelo, la ciudad y el riesgo, se encuentran expresos, eso implica que la estructura del Estado debería asociarse de manera sistémica a el AGUA.

Colombia en su permanente evolución se ha adaptado a los nuevos escenarios de sostenibilidad global, ya que, al pasar de crisis en crisis, de querer tener el control del territorio, la economía, ahora finalmente se comprendió que existen dos grandes temas que mantienen en desbalance el equilibrio natural, la Pobreza y el Cambio Climático, y en el centro de ellos está el agua.

Es por esto que la CDMB en los últimos años ejerce en sus acciones operativas una gobernanza del agua apuntando hacia la seguridad hídrica; precisamente esta referida a lo natural, social, económico y global, por lo tanto, la Estructura Ecológica Principal con esa vocación territorial, serán los orientadores, en la consolidación de un territorio, que comprende y avanza en la generación de corredores hacia garantizar que la biodiversidad, la ciudad y la ruralidad convivan y encuentre ese punto de equilibrio en el respeto del uno por el otro, eso implica, las rondas hídricas de su área de jurisdicción apostándole a una regulación más eficiente de los fenómenos micro climáticos, estabilizando las geoestructuras

altamente frágiles, que además faciliten el desarrollo genético, biológico y ecosistémico del territorio, así como una cantidad y calidad justa de agua que permite que ella cumpla todas sus funciones ecosistémicas.

La administración municipal de Floridablanca y la CDMB realizaron el convenio interadministrativo denominado "Aunar esfuerzos entre la Corporación Autónoma Regional para la defensa de meseta de Bucaramanga "CDMB" y el municipio de Floridablanca para el mantenimiento de áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico en la jurisdicción del municipio de Floridablanca"; este proyecto de mantenimiento enfocado en el área estratégica de la microcuenca Rio Frío, se formuló con enfoque en adaptación al cambio climático así como de restauración, rehabilitación y recuperación ecológica, a partir de la ejecución de obras de intervención de zonas consideradas críticas dentro de la microcuenca o unidad hidrográfica identificada como estratégica, con el fin de mantener su integridad y con ello la regulación del ciclo del agua, manteniendo una estructura ecológica que logre cumplir su función ecosistémica.

De acuerdo a lo anterior la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), realizó la adjudicación del contrato N°210-15562-5 cuyo objeto corresponde al "MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA DEFINIDOS Y PRIORIZADOS POR LA CDMB" con el CONSORCIO CONSERVACIÓN HÍDRICA, el objetivo del presente informe es el de dar a conocer las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo comprendido entre el **20 de noviembre de 2024 y el 31 de marzo de 2025.**

La CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA (CDMB), en la búsqueda del mejor desempeño en la prestación de sus servicios, efectuó, como una de sus metas y en cumplimiento a sus políticas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales, la contratación de la interventoría para el proyecto de obra No. 210.15562.5 adjudicado al CONSORCIO CONSERVACIÓN HÍDRICA cuyo objeto es "MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEFINIDOS Y PRIORIZADOS POR LA CDMB." bajo el contrato No. 210.15562.5 suscrito el día 23 DE OCTUBRE DE 2024.

En este informe, se presentan las generalidades de las entidades que intervienen en el proyecto y se informa a través de un registro fotográfico, las actividades

ejecutadas en el período comprendido entre el **20 de noviembre de 2024 y el 31 de marzo de 2025** (informe de liquidación de interventoría).

La información contenida en este i**nforme de liquidación de interventoría**, describe detalladamente las actividades de ejecución del contrato de obra, dejando consignada la información tanto del contrato de obra como el contrato de interventoría, el estado en que se encuentran en la actualidad, el avance de ejecución a la fecha de corte de este informe, el personal y equipos requeridos para dar cumplimiento al objeto, evidencias fotográficas y el análisis de lo programado vs lo ejecutado teniendo en cuenta la programación que entregó el contratista de obra para la ejecución del proyecto.

2. LOCALIZACION DEL PROYECTO

2.1. QUEBRADA SURATOQUE – SECTOR BUCARICA






2.2. QUEBRADA SURATOQUE – SECTOR LAGOS





2.3. QUEBRADA LA CALAVERA – SECTOR MOLINOS

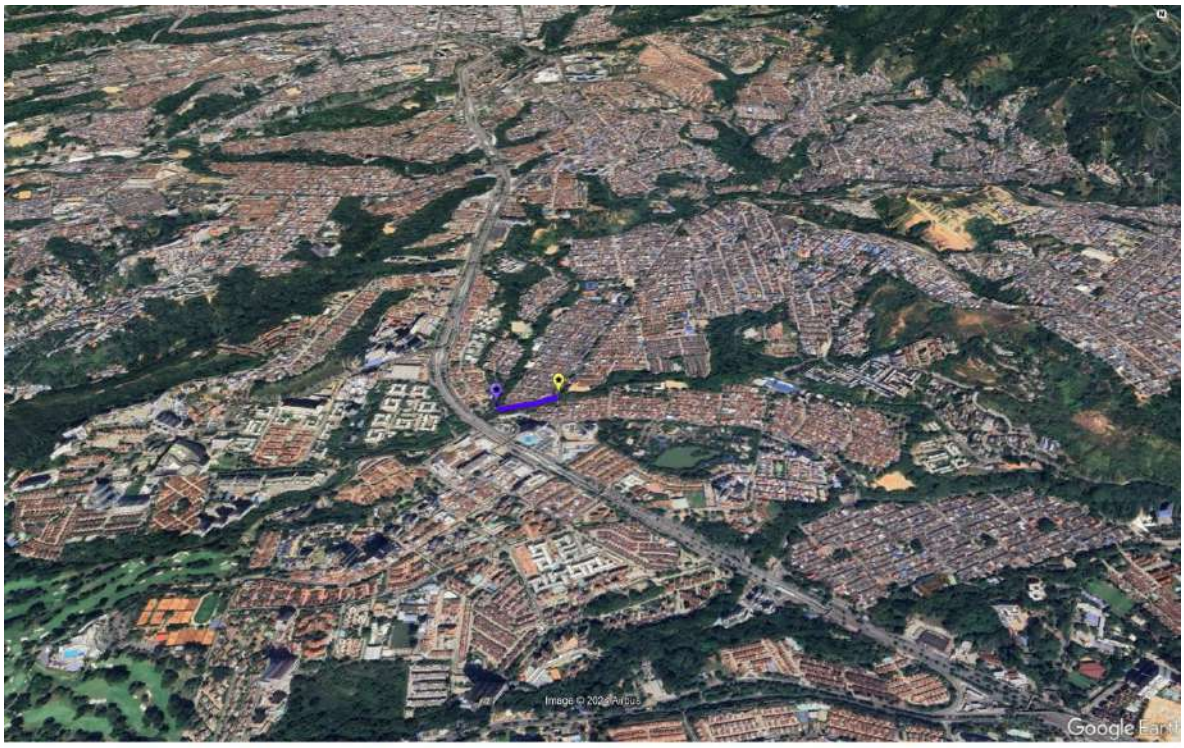



2.4. QUEBRADA ZAPAMANGA – SECTOR CAÑAVERAL





3. FICHA TECNICA CONTRATO DE OBRA No. 210.15562.5 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2024

3.1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No.:	210.15562.5 DEL 23 OCTUBRE
OBJETO:	"MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEFINIDOS Y PRIORIZADOS POR LA CDMB.
ENTIDAD CONTRATANTE:	CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA. CDMB
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CONSERVACIÓN HÍDRICA R.L. EDGAR LEONARDO GÓMEZ RONCANCIO NIT. 901.881.924-8
VALOR DEL CONTRATO:	CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($4.521.575.179,94)
ANTICIPO:	NO APLICA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	CARLOS ALBERTO DÍAZ BARRERA
PLAZO DE EJECUCION:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO ADICIONAL:	TRES (3) MESES – 30 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	31 DE MARZO DE 2025
% EJECUCIÓN A LA FECHA:	94.75%

3.2. VALOR EJECUTADO A LA FECHA POR EL CONTRATISTA DE OBRA

VALOR EJECUTANO AVANCE No. 1	:	$2.260.787.074,37
VALOR EJECUTADO AVANCE No. 2	:	$2.023.251.731,56
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	:	**$4.284.038.805.,93**

3.3. RELACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA	FECHA	OBSERVACION
SUSCRIPCIÓN CONTRATO	23/10/2024	CONTRATO DE OBRA
INICIO	20/11/2024	ACTA No. 1 DE INICIO DE OBRA
ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL No. 1	18/12/2024	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1 ($2.260.787.074,31)
OTROSÍ MODIFICATORIO No. 1	30/12/2024	PRORROGA DE 3 MESES AL CONTRATO DE OBRA
ACTA No. 3 – ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS No. 1	27/03/2025	SE MANTIENE EL EQULIBRIO DEL CONTRATO SALDO ADICIONAL DE LA ENTIDAD
OTROSÍ MODIFICATORIO No. 2	28/03/2025	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE ACUERDO AL ACTA No. 3
ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS No. 2	29/03/2025	SE MANTIENE EL EQUILIBRIO DEL CONTRATO SALDO ADICIONAL DE LA ENTIDAD
ACTA DE RECIBO Y PAGO PARCIAL No. 2	11/04/2025	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 2 ($1.594.847.850,97)
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	11/04/2025	CUMPLIMIENTO A CABALIDAD DEL OBJETO CONTRACTUAL

3.4. CONTROL DE PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DE LA ASEGURADORA: SURA

3.4.1. PÓLIZAS SUSCRIPCIÓN CONTRATO DE OBRA – 25/10/2024

POLIZA No.	AMPAROS	VIGENCIAS	
		FECHA INICIO	FECHA FINAL
16070382	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/10/2024	30/04/2025
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	31/12/2024	31/12/2029
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	23/10/2024	31/12/2027
14049765	RESPONZABILIDAD CIVIL	23/10/2024	31/12/2024

3.4.2. PÓLIZAS ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA – 25/11/2024

POLIZA No.	AMPAROS	VIGENCIAS	
		FECHA INICIO	FECHA FINAL
16252224	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/10/2024	30/04/2025
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	31/12/2024	31/12/2027
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	23/10/2024	31/12/2027
14060427	RESPONZABILIDAD CIVIL	23/10/2024	31/12/2024

3.4.3. PÓLIZAS PRÓRROGA – 02/01/2025

POLIZA No.	AMPAROS	VIGENCIAS	
		FECHA INICIO	FECHA FINAL
16336975	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/10/2024	31/07/2025
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	31/03/2024	31/03/2030
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	23/10/2024	31/03/2028
14074868	RESPONZABILIDAD CIVIL	23/10/2024	31/03/2025

3.4.4. PÓLIZAS ACTA DE RECIBO DEFINITIVO – 15/04/2025

POLIZA No.	AMPAROS	VIGENCIAS	
		FECHA INICIO	FECHA FINAL
16519586	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/10/2024	31/07/2025
	ESTABILIDAD DE LA OBRA	31/03/2025	31/03/2030
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	23/10/2024	31/03/2028
14111590	RESPONZABILIDAD CIVIL	23/10/2024	31/03/2025

3.5. RELACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA

A continuación, se relaciona el personal vinculado y el cual permanece hasta la fecha del presente informe, para la ejecución del contrato en referencia, se relaciona en los siguientes cuadros el personal calificado (contractual) y el personal operativo (mano de obra no calificada) respectivamente:

3.5.1. PERSONAL CONTRACTUAL

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA	EDGAR LEONARDO GÓMEZ RONCANCIO
RESIDENTE DE OBRA	JOHANA MARCELA PADIERNA CASTIBLANCO
RESIDENTE DE OBRA	ANDRÉS FELIPE SANDOVAL MANTILLA
ASESOR FORESTAL	OSCAR FABRICIO MEDINA REATIGA
ASESOR AMBIENTAL	LUISA FERNANDA SÁNCHEZ CASTRO
PROFESIONAL SISO	CLARA MELISSA DONADO ARIAS
PGP	JUAN CARLOS RINCÓN LOZANO

3.5.2. PERSONAL OPERATIVO

CARGO	NOMBRE
TOPÓGRAFA	DENNIS MELISSA TARAZONA MANTILLA
TOPÓGRAFO	JESSID RAMÓN PARRA OSMA
CADENERA	EVELYN DAYANA BARRETO CASTRILLO

3.5.3. PERSONAL OPERATIVO – LERMA CONSTRUCCIONES

CARGO	NOMBRE
OFICIAL	ENDER GIOVANNY RINCÓN
AYUDANTE	BRAYAN STIVEN GARCIA AMARIZ
AYUDANTE	EDWARD YESID ROJAS
AYUDANTE	FABIO MARIN RAMOS
AYUDANTE	HENRY MARIN RAMOS
OFICIAL	RAUL DIONISIO GARCIA AMARIZ

3.5.4. PERSONAL OPERATIVO – CONSTRUCCIONES VERA SANGUINO

CARGO	NOMBRE
OFICIAL	JOSE ANTONIO LUNA ACOSTA
SUPERVISOR	JORGE GIOVANNY
AYUDANTE	RICHARD JOSÉ ABRE MATE
AYUDANTE	LUIS ALBERTO PRADA RINCÓN
AYUDANTE	RONAL SÁNCHEZ REY
AYUDANTE	BAUDILLO RIVERA GÓMEZ
AYUDANTE	DANIEL MARTIN DUARTE ORDOÑEZ
AYUDANTE	JOHAN SEBASTIAN GRAJALES
AYUDANTE	ESTEBAN VARGAS ROMANO

3.6. RELACION DEL EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA

La relación de la maquinaria utilizado en el desarrollo del presente contrato se discrimina en el siguiente cuadro:

EQUIPO	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	1
VOLQUETA	1
MINIRETROCARGADOR	1
MINICARGADOR	1
ESTACION TOPOGRÁFICA	1

3.7. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

3.7.1. DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION	VALOR DE LA INVERSION INICIAL	VALOR EJECUTADO PRESENTE PERIODO	SALDO POR EJECUTAR
VALOR TOTAL:	$4.521.575.179,94	$2.023.251,731,96	**$237.536.374,01**
VALOR TOTAL ACUMULADO:		$4.284.038.805,93	

3.7.2. PROGRAMA DE INVERSIONES

El contratista de obra, para el presente informe que establece los tiempos de ejecución comprendidos entre el **20 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y EL 31 DE MARZO DE 2025**, registra un porcentaje de avance de obra ejecutada acumulada correspondiente al 94.75% comparado con el porcentaje de obra programada acumulada de 100,00%. A la fecha de entrega de este informe de liquidación, el contratista de obra dio cumplimiento al alcance del contrato quedando un saldo a favor de la entidad correspondiente a $237.536.374,01 equivalente a 5.25%

3.7.3. ANALISIS DEL PLAZO CONTRACTUAL

El plazo contractual del contrato de obra es **HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**, el acta de inicio se suscribió el día veinte (20) de noviembre de 2024, por lo cual se establece que la duración del contrato equivale a un plazo inicial correspondiente a 42 días.

Se realizó una prórroga de tres meses que sumado al tiempo contractual fue actualizado el tiempo de ejecución del contrato a 312 días-

A continuación, se observa el análisis del plazo correspondiente al periodo que comprende este **INFORME DE LIQUIDACIÓN**, teniendo en cuenta las fechas establecidas de inicio, prórroga de tres meses y terminación del contrato.

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	PORCENTAJE
PLAZO INICIAL	DIAS	42	100%
PLAZO ADICIONAL	DIAS	90	
PLAZO ACTUALIZADO	DIAS	132	
TIEMPO DE EJECUCIÓN	DIAS	132	100,00%
TIEMPO POR EJECUTAR	MES	0	0,00%

4. PRESUPUESTRO CONTRACTUAL – CONSORCIO CONSERVACIÓN HÍDRICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	**RESTAURACIÓN PASIVA DE LA RONDA HÍDRICA**				
1.1	RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD HIGRÁULICA DE LOS LECHOS DE LAS QUEBRADAS MEDIANTE ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS LOS CUALES DEBEN SER CLASIFICADOS Y DISPUESTOS DE MANERA ADECUADA ASEGURANDO LA RECUPERACIÓN Y EL NORMAL FLUJO DEL CAUCE DEL ÁREA Y SUS RONDAS HÍDRICAS	M^2	14541.00	$ 20,528.00	$ 298,497,648.00
1.2	AISLAMIENTO DE RONDAS HÍDRICAS PROMOVIENDO LA RESTAURACIÓN PASIVA EN LAS QUEBRADAS PROPENSAS A LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS O INTERVENCIÓN HUMANA (MALLA ESLABONADA Y POSTES EN CONCRETO PINTADOS)	M	2375.00	$ 329,540.00	$ 782,657,500.00
1.3	MANTENIMIENTO DEL AISLAMIENTO EXISTENTE EN RONDAS HÍDRICAS PROMOVIENDO LA RESTAURACIÓN PASIVA EN LAS QUEBRADAS PROPENSAS A LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS O INTERVENCIÓN ANTRÓPICA (INCLUYE DESMONTE DE MALLA EXISTENTE, INSTALACIÓN DE MALLA ESLABONADA Y MANTENIMIENTO DE POSTES)	M	292.50	$ 164,301.00	$ 48,058,042.50
1.4	AISLAMIENTO DE PROTECCIÓN DE RONDA HÍDRICA PROMOVIENDO LA RESTAURACIÓN PASIVA (EN TUBERÍA GALVANIZADA Y VIGA DE CONCRETO	M	78.00	$ 2,136,861.00	$ 166,675,158.00
SUBTOTAL RESTAURACIÓN PASIVA DE LA RONDA HÍDRICA					**$ 1,295,888,348.50**
2	**MEDIDAS DE ADAPTACIÓN A CAMBIO CLIMÁTICO**				
2.1	INTERVENCIÓN DE LOS CAUCES ANTE EVENTOS EXTREMOS EN LA MICROCUENCA DEL RIO FRIO (INCLUYE MOVIMIENTO Y RETIRO DE SEDIMENTOS DE FONDO, DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ROCAS DE ARRASTRE, DRAGADO LATERAL, RECONFORMACIÓN GEOMORFOLÓGICA Y RECUPERACIÓN DE LOS CUERPOS HÍDRICOS), COMO MEDIDAS DE CONTINGENCIA FRENTE A AVALANCHAS O AVENIDAS TORRENCIALES	M^3	29635.00	$ 66,316.00	$ 1,965,274,660.00
2.2	MANTENIMIENTO DE ESPECIES ARBÓREAS CON ALTURA SUPERIOR A 3.00 M COMO MEDIDAS DE CONTINGENCIA PARA EVENTOS EXTREMOS QUE GENEREN AMENAZA DE OBSTRUCCIÓN DE LA SECCIÓN HÍDRICA EN LA MICROCUENCA DEL RIO FRIO (INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL)	UND	63.00	$ 599,766.00	$ 37,785,258.00
2.3	MANTENIMIENTO PERIMETRALY EN ALTURA PARA GRUPOS DE GUADUAS QUE REPRESENTEN AMENAZA DE OBSTRUCCIÓN DE LA SECCIÓN HÍDRICA DURANTE EVENTOS EXTREMOS EN LA MICROCUENCA DEL RIO FRIO (INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL)	M^2	1979.20	$ 25,448.00	$ 50,366,681.60
SUBTOTAL MEDIDAS DE ADAPTACIÓN A CAMBIO CLIMÁTICO					**$ 2,053,426,599.60**
VALOR COSTOS DIRECTOS:					**$ 3,349,314,948.10**
ADMINISTRACIÓN:				28%	$ 939,482,842.94
IMPREVISTOS:				1%	$ 33,493,149.48
UTILIDAD:				5%	$ 167,465,747.41
A.I.U:				30%	$ 1,140,441,739.83
IVA de U:				19%	$ 31,818,492.01
VALOR TOTAL					**$ 4,521,575,179.94**

5. PRESUPUESTRO ACTUALIZADO – CONSORCIO CONSERVACIÓN HÍDRICA – MODIFICACION No. 1 (27/03/2025)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIÓN No. 1 27/03/25	
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	SUB TOTAL
1	**RESTAURACIÓN PASIVA DE LA RONDA HÍDRICA**						
1,1	RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD HIGRÁULICA DE LOS LECHOS DE LAS QUEBRADAS MEDIANTE ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS LOS CUALES DEBEN SER CLASIFICADOS Y DISPUESTOS DE MANERA ADECUADA ASEGURANDO LA RECUPERACIÓN Y EL NORMAL FLUJO DEL CAUCE DEL ÁREA Y SUS RONDAS HÍDRICAS	M^2	14541,00	$ 20.528,00	$ 298.497.648,00	47729,49	$ 979.790.970,72
1,2	AISLAMIENTO DE RONDAS HÍDRICAS PROMOVIENDO LA RESTAURACIÓN PASIVA EN LAS QUEBRADAS PROPENSAS A LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS O INTERVENCIÓN HUMANA (MALLA ESLABONADA Y POSTES EN CONCRETO PINTADOS)	M	2375,00	$ 329.540,00	$ 782.657.500,00	1878,63	$ 619.083.730,20
1,3	MANTENIMIENTO DEL AISLAMIENTO EXISTENTE EN RONDAS HÍDRICAS PROMOVIENDO LA RESTAURACIÓN PASIVA EN LAS QUEBRADAS PROPENSAS A LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS O INTERVENCIÓN ANTRÓPICA (INCLUYE DESMONTE DE MALLA EXISTENTE, INSTALACIÓN DE MALLA ESLABONADA Y MANTENIMIENTO DE POSTES)	M	292,50	$ 164.301,00	$ 48.058.042,50	613,21	$ 100.751.016,21
1,4	AISLAMIENTO DE PROTECCIÓN DE RONDA HÍDRICA PROMOVIENDO LA RESTAURACIÓN PASIVA (EN TUBERÍA GALVANIZADA Y VIGA DE CONCRETO	M	78,00	$ 2.136.861,00	$ 166.675.158,00	72,30	$ 154.495.050,30
	SUBTOTAL RESTAURACIÓN PASIVA DE LA RONDA HÍDRICA				**$ 1.295.888.348,50**		**$ 1.854.120.767,43**
2	**MEDIDAS DE ADAPTACIÓN A CAMBIO CLIMÁTICO**						
2,1	INTERVENCIÓN DE LOS CAUCES ANTE EVENTOS EXTREMOS EN LA MICROCUENCA DEL RIO FRIO (INCLUYE MOVIMIENTO Y RETIRO DE SEDIMENTOS DE FONDO, DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ROCAS DE ARRASTRE, DRAGADO LATERAL, RECONFORMACIÓN GEOMORFOLÓGICA Y RECUPERACIÓN DE LOS CUERPOS HÍDRICOS), COMO MEDIDAS DE CONTINGENCIA FRENTE A AVALANCHAS O AVENIDAS TORRENCIALES	M^3	29635,00	$ 66.316,00	$ 1.965.274.660,00	17958,84	$ 1.190.958.433,44
2,2	MANTENIMIENTO DE ESPECIES ARBÓREAS CON ALTURA SUPERIOR A 3.00 M COMO MEDIDAS DE CONTINGENCIA PARA EVENTOS EXTREMOS QUE GENEREN AMENAZA DE OBSTRUCCIÓN DE LA SECCIÓN HÍDRICA EN LA MICROCUENCA DEL RIO FRIO (INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL)	UND	63,00	$ 599.766,00	$ 37.785.258,00	0,00	$ -
2,3	MANTENIMIENTO PERIMETRALY EN ALTURA PARA GRUPOS DE GUADUAS QUE REPRESENTEN AMENAZA DE OBSTRUCCIÓN DE LA SECCIÓN HÍDRICA DURANTE EVENTOS EXTREMOS EN LA MICROCUENCA DEL RIO FRIO (INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL)	M^2	1979,20	$ 25.448,00	$ 50.366.681,60	5242,86	$ 133.420.301,28
	SUBTOTAL MEDIDAS DE ADAPTACIÓN A CAMBIO CLIMÁTICO				**$ 2.053.426.599,60**		**$ 1.324.378.734,72**
	VALOR COSTOS DIRECTOS:				**$ 3.349.314.948,10**		**$ 3.178.499.502,15**
	ADMINISTRACIÓN:		28%		$ 939.482.842,94		$ 891.569.110,35
	IMPREVISTOS:		1%		$ 33.493.149,48		$ 31.784.995,02
	UTILIDAD:		5%		$ 167.465.747,41		$ 158.924.975,11
	A.I.U:		30%		$ 1.140.441.739,83		$ 1.082.279.080,48
	IVA de U:		19%		$ 31.818.492,01		$ 30.195.745,27
	VALOR TOTAL				**$ 4.521.575.179,94**		**$ 4.290.974.327,90**
	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD						**$ 230.600.852,04**
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO						**$ 4.521.575.179,94**

6. PRESUPUESTRO ACTUALIZADO – CONSORCIO CONSERVACIÓN HÍDRICA – MODIFICACION No. 2 (29/03/2025)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIÓN No. 2 29/03/25	
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	SUB TOTAL
1	RESTAURACIÓN PASIVA DE LA RONDA HÍDRICA						
1,1	RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD HIGRÁULICA DE LOS LECHOS DE LAS QUEBRADAS MEDIANTE ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS LOS CUALES DEBEN SER CLASIFICADOS Y DISPUESTOS DE MANERA ADECUADA ASEGURANDO LA RECUPERACIÓN Y EL NORMAL FLUJO DEL CAUCE DEL ÁREA Y SUS RONDAS HÍDRICAS	M^2	14541,00	$ 20.528,00	$ 298.497.648,00	35958,51	$ 738.156.293,28
1,2	AISLAMIENTO DE RONDAS HÍDRICAS PROMOVIENDO LA RESTAURACIÓN PASIVA EN LAS QUEBRADAS PROPENSAS A LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS O INTERVENCIÓN HUMANA (MALLA ESLABONADA Y POSTES EN CONCRETO PINTADOS)	M	2375,00	$ 329.540,00	$ 782.657.500,00	1878,63	$ 619.083.730,20
1,3	MANTENIMIENTO DEL AISLAMIENTO EXISTENTE EN RONDAS HÍDRICAS PROMOVIENDO LA RESTAURACIÓN PASIVA EN LAS QUEBRADAS PROPENSAS A LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS O INTERVENCIÓN ANTRÓPICA (INCLUYE DESMONTE DE MALLA EXISTENTE, INSTALACIÓN DE MALLA ESLABONADA Y MANTENIMIENTO DE POSTES)	M	292,50	$ 164.301,00	$ 48.058.042,50	581,94	$ 95.613.323,94
1,4	AISLAMIENTO DE PROTECCIÓN DE RONDA HÍDRICA PROMOVIENDO LA RESTAURACIÓN PASIVA (EN TUBERÍA GALVANIZADA Y VIGA DE CONCRETO	M	78,00	$ 2.136.861,00	$ 166.675.158,00	72,30	$ 154.495.050,30
	SUBTOTAL RESTAURACIÓN PASIVA DE LA RONDA HÍDRICA				$ 1.295.888.348,50		$ 1.607.348.397,72
2	MEDIDAS DE ADAPTACIÓN A CAMBIO CLIMÁTICO						
2,1	INTERVENCIÓN DE LOS CAUCES ANTE EVENTOS EXTREMOS EN LA MICROCUENCA DEL RIO FRIO (INCLUYE MOVIMIENTO Y RETIRO DE SEDIMENTOS DE FONDO, DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ROCAS DE ARRASTRE, DRAGADO LATERAL, RECONFORMACIÓN GEOMORFOLÓGICA Y RECUPERACIÓN DE LOS CUERPOS HÍDRICOS), COMO MEDIDAS DE CONTINGENCIA FRENTE A AVALANCHAS O AVENIDAS TORRENCIALES	M^3	29635,00	$ 66.316,00	$ 1.965.274.660,00	21602,53	$ 1.432.593.379,48
2,2	MANTENIMIENTO DE ESPECIES ARBÓREAS CON ALTURA SUPERIOR A 3.00 M COMO MEDIDAS DE CONTINGENCIA PARA EVENTOS EXTREMOS QUE GENEREN AMENAZA DE OBSTRUCCIÓN DE LA SECCIÓN HÍDRICA EN LA MICROCUENCA DEL RIO FRIO (INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL)	UND	63,00	$ 599.766,00	$ 37.785.258,00	0,00	$ -
2,3	MANTENIMIENTO PERIMETRALY EN ALTURA PARA GRUPOS DE GUADUAS QUE REPRESENTEN AMENAZA DE OBSTRUCCIÓN DE LA SECCIÓN HÍDRICA DURANTE EVENTOS EXTREMOS EN LA MICROCUENCA DEL RIO FRIO (INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL)	M^2	1979,20	$ 25.448,00	$ 50.366.681,60	5242,86	$ 133.420.301,28
	SUBTOTAL MEDIDAS DE ADAPTACIÓN A CAMBIO CLIMÁTICO				$ 2.053.426.599,60		$ 1.566.013.680,76
	VALOR COSTOS DIRECTOS:				$ 3.349.314.948,10		$ 3.173.362.078,48
	ADMINISTRACIÓN:			28%	$ 939.482.842,94		$ 890.128.063,01
	IMPREVISTOS:			1%	$ 33.493.149,48		$ 31.733.620,78
	UTILIDAD:			5%	$ 167.465.747,41		$ 158.668.103,92
	A.I.U:			30%	$ 1.140.441.739,83		$ 1.080.529.787,71
	IVA de U:			19%	$ 31.818.492,01		$ 30.146.939,74
	VALOR TOTAL				$ 4.521.575.179,94		$ 4.284.038.805,93
	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD						$ 237.536.374,01
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO						$ 4.521.575.179,94

7. AVANCE DE OBRA No. 1

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				AVANCE No. 1 20/11/24 A 13/12/24		ACUMULADO	
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	SUB TOTAL	CANTIDAD	SUB TOTAL
1	**RESTAURACIÓN PASIVA DE LA RONDA HÍDRICA**								
1.1	RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD HIGRÁULICA DE LOS LECHOS DE LAS QUEBRADAS MEDIANTE ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS LOS CUALES DEBEN SER CLASIFICADOS Y DISPUESTOS DE MANERA ADECUADA ASEGURANDO LA RECUPERACIÓN Y EL NORMAL FLUJO DEL CAUCE DEL ÁREA Y SUS RONDAS HÍDRICAS	M^2	14541.00	$ 20,528.00	$ 298,497,648.00	11791.88	$ 242,063,712.64	11791.88	$ 242,063,712.64
1.2	AISLAMIENTO DE RONDAS HÍDRICAS PROMOVIENDO LA RESTAURACIÓN PASIVA EN LAS QUEBRADAS PROPENSAS A LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS O INTERVENCIÓN HUMANA (MALLA ESLABONADA Y POSTES EN CONCRETO PINTADOS)	M	2375.00	$ 329,540.00	$ 782,657,500.00		$ -		$ -
1.3	MANTENIMIENTO DEL AISLAMIENTO EXISTENTE EN RONDAS HÍDRICAS PROMOVIENDO LA RESTAURACIÓN PASIVA EN LAS QUEBRADAS PROPENSAS A LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS O INTERVENCIÓN ANTRÓPICA (INCLUYE DESMONTE DE MALLA EXISTENTE, INSTALACIÓN DE MALLA ESLABONADA Y MANTENIMIENTO DE POSTES)	M	292.50	$ 164,301.00	$ 48,058,042.50		$ -		$ -
1.4	AISLAMIENTO DE PROTECCIÓN DE RONDA HÍDRICA PROMOVIENDO LA RESTAURACIÓN PASIVA (EN TUBERÍA GALVANIZADA Y VIGA DE CONCRETO	M	78.00	$ 2,136,861.00	$ 166,675,158.00		$ -		$ -
	SUBTOTAL RESTAURACIÓN PASIVA DE LA RONDA HÍDRICA				**$ 1,295,888,348.50**		**$ 242,063,712.64**		**$ 242,063,712.64**
2	**MEDIDAS DE ADAPTACIÓN A CAMBIO CLIMÁTICO**								
2.1	INTERVENCIÓN DE LOS CAUCES ANTE EVENTOS EXTREMOS EN LA MICROCUENCA DEL RIO FRIO (INCLUYE MOVIMIENTO Y RETIRO DE SEDIMENTOS DE FONDO, DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ROCAS DE ARRASTRE, DRAGADO LATERAL, RECONFORMACIÓN GEOMORFOLÓGICA Y RECUPERACIÓN DE LOS CUERPOS HÍDRICOS), COMO MEDIDAS DE CONTINGENCIA FRENTE A AVALANCHAS O AVENIDAS TORRENCIALES	M^3	29635.00	$ 66,316.00	$ 1,965,274,660.00	21602.53	$ 1,432,593,379.48	21602.53	$ 1,432,593,379.48
2.2	MANTENIMIENTO DE ESPECIES ARBÓREAS CON ALTURA SUPERIOR A 3.00 M COMO MEDIDAS DE CONTINGENCIA PARA EVENTOS EXTREMOS QUE GENEREN AMENAZA DE OBSTRUCCIÓN DE LA SECCIÓN HÍDRICA EN LA MICROCUENCA DEL RIO FRIO (INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL)	UND	63.00	$ 599,766.00	$ 37,785,258.00		$ -		$ -
2.3	MANTENIMIENTO PERIMETRALY EN ALTURA PARA GRUPOS DE GUADUAS QUE REPRESENTEN AMENAZA DE OBSTRUCCIÓN DE LA SECCIÓN HÍDRICA DURANTE EVENTOS EXTREMOS EN LA MICROCUENCA DEL RIO FRIO (INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL)	M^2	1979.20	$ 25,448.00	$ 50,366,681.60		$ -		$ -
	SUBTOTAL MEDIDAS DE ADAPTACIÓN A CAMBIO CLIMÁTICO				**$ 2,053,426,599.60**		**$ 1,432,593,379.48**		**$ 1,432,593,379.48**
	VALOR COSTOS DIRECTOS:				**$ 3,349,314,948.10**		**$ 1,674,657,092.12**		**$ 1,674,657,092.12**
	ADMINISTRACIÓN:		28%		$ 939,482,842.94		$ 469,741,314.34		$ 469,741,314.34
	IMPREVISTOS:		1%		$ 33,493,149.48		$ 16,746,570.92		$ 16,746,570.92
	UTILIDAD:		5%		$ 167,465,747.41		$ 83,732,854.61		$ 83,732,854.61
	A.I.U:		30%		$ 1,140,441,739.83		$ 570,220,739.87		$ 570,220,739.87
	IVA de U:		19%		$ 31,818,492.01		$ 15,909,242.38		$ 15,909,242.38
	VALOR TOTAL				**$ 4,521,575,179.94**		**$ 2,260,787,074.37**		**$ 2,260,787,074.37**

8. AVANCE DE RECIBO DEFINITIVO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIÓN No. 2 29/03/25		RECIBO FINAL	
		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	SUB TOTAL	CANTIDAD	SUB TOTAL
1	**RESTAURACIÓN PASIVA DE LA RONDA HÍDRICA**								
1,1	RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD HIGRÁULICA DE LOS LECHOS DE LAS QUEBRADAS MEDIANTE ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS LOS CUALES DEBEN SER CLASIFICADOS Y DISPUESTOS DE MANERA ADECUADA ASEGURANDO LA RECUPERACIÓN Y EL NORMAL FLUJO DEL CAUCE DEL ÁREA Y SUS RONDAS HÍDRICAS	M^2	14541,00	$ 20.528,00	$ 298.497.648,00	35958,51	$ 738.156.293,28	35958,51	$ 738.156.293,28
1,2	AISLAMIENTO DE RONDAS HÍDRICAS PROMOVIENDO LA RESTAURACIÓN PASIVA EN LAS QUEBRADAS PROPENSAS A LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS O INTERVENCIÓN HUMANA (MALLA ESLABONADA Y POSTES EN CONCRETO PINTADOS)	M	2375,00	$ 329.540,00	$ 782.657.500,00	1878,63	$ 619.083.730,20	1878,63	$ 619.083.730,20
1,3	MANTENIMIENTO DEL AISLAMIENTO EXISTENTE EN RONDAS HÍDRICAS PROMOVIENDO LA RESTAURACIÓN PASIVA EN LAS QUEBRADAS PROPENSAS A LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS O INTERVENCIÓN ANTRÓPICA (INCLUYE DESMONTE DE MALLA EXISTENTE, INSTALACIÓN DE MALLA ESLABONADA Y MANTENIMIENTO DE POSTES)	M	292,50	$ 164.301,00	$ 48.058.042,50	581,94	$ 95.613.323,94	581,94	$ 95.613.323,94
1,4	AISLAMIENTO DE PROTECCIÓN DE RONDA HÍDRICA PROMOVIENDO LA RESTAURACIÓN PASIVA (EN TUBERÍA GALVANIZADA Y VIGA DE CONCRETO	M	78,00	$ 2.136.861,00	$ 166.675.158,00	72,30	$ 154.495.050,30	72,30	$ 154.495.050,30
	SUBTOTAL RESTAURACIÓN PASIVA DE LA RONDA HÍDRICA				**$ 1.295.888.348,50**		**$ 1.607.348.397,72**		**$ 1.607.348.397,72**

2	**MEDIDAS DE ADAPTACIÓN A CAMBIO CLIMÁTICO**									
2,1	INTERVENCIÓN DE LOS CAUCES ANTE EVENTOS EXTREMOS EN LA MICROCUENCA DEL RIO FRIO (INCLUYE MOVIMIENTO Y RETIRO DE SEDIMENTOS DE FONDO, DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ROCAS DE ARRASTRE, DRAGADO LATERAL, RECONFORMACIÓN GEOMORFOLÓGICA Y RECUPERACIÓN DE LOS CUERPOS HÍDRICOS), COMO MEDIDAS DE CONTINGENCIA FRENTE A AVALANCHAS O AVENIDAS TORRENCIALES	M^3	29635,00	$ 66.316,00	$ 1.965.274.660,00	21602,53	$ 1.432.593.379,48	21602,53	$ 1.432.593.379,48
2,2	MANTENIMIENTO DE ESPECIES ARBÓREAS CON ALTURA SUPERIOR A 3.00 M COMO MEDIDAS DE CONTINGENCIA PARA EVENTOS EXTREMOS QUE GENEREN AMENAZA DE OBSTRUCCIÓN DE LA SECCIÓN HÍDRICA EN LA MICROCUENCA DEL RIO FRIO (INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL)	UND	63,00	$ 599.766,00	$ 37.785.258,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2,3	MANTENIMIENTO PERIMETRALY EN ALTURA PARA GRUPOS DE GUADUAS QUE REPRESENTEN AMENAZA DE OBSTRUCCIÓN DE LA SECCIÓN HÍDRICA DURANTE EVENTOS EXTREMOS EN LA MICROCUENCA DEL RIO FRIO (INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL)	M^2	1979,20	$ 25.448,00	$ 50.366.681,60	5242,86	$ 133.420.301,28	5242,86	$ 133.420.301,28
	SUBTOTAL MEDIDAS DE ADAPTACIÓN A CAMBIO CLIMÁTICO				**$ 2.053.426.599,60**		**$ 1.566.013.680,76**		**$ 1.566.013.680,76**
	VALOR COSTOS DIRECTOS:				**$ 3.349.314.948,10**		**$ 3.173.362.078,48**		**$ 3.173.362.078,48**
	ADMINISTRACIÓN:	28%			$ 939.482.842,94		$ 890.128.063,01		$ 890.128.063,01
	IMPREVISTOS:	1%			$ 33.493.149,48		$ 31.733.620,78		$ 31.733.620,78
	UTILIDAD:	5%			$ 167.465.747,41		$ 158.668.103,92		$ 158.668.103,92
	A.I.U:	30%			$ 1.140.441.739,83		$ 1.080.529.787,71		$ 1.080.529.787,71
	IVA de U:	19%			$ 31.818.492,01		$ 30.146.939,74		$ 30.146.939,74
	VALOR TOTAL				**$ 4.521.575.179,94**		**$ 4.284.038.805,93**		**$ 4.284.038.805,93**
	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD						**$ 237.536.374,01**		**$ 237.536.374,01**
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO						**$ 4.521.575.179,94**		**$ 4.521.575.179,94**

9. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA

9.1. ACTIVIDADES CONTRACTUALES

A continuación, se describen las actividades ejecutadas por el CONSORCIO CONSERVACIÓN HÍDRICA en cada uno de los capítulos en el período comprendido entre el **20 DE NOVIEMBRE DE 2024 Y EL 31 DE MARZO DE 2025.**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA RECIBO FINAL	% DE EJECUCIÓN
1	RESTAURACIÓN PASIVA DE LA RONDA HÍDRICA				
1,1	RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD HIGRÁULICA DE LOS LECHOS DE LAS QUEBRADAS MEDIANTE ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS LOS CUALES DEBEN SER CLASIFICADOS Y DISPUESTOS DE MANERA ADECUADA ASEGURANDO LA RECUPERACIÓN Y EL NORMAL FLUJO DEL CAUCE DEL ÁREA Y SUS RONDAS HÍDRICAS	M^2	35958,51	35958,51	100,00%
1,2	AISLAMIENTO DE RONDAS HÍDRICAS PROMOVIENDO LA RESTAURACIÓN PASIVA EN LAS QUEBRADAS PROPENSAS A LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS O INTERVENCIÓN HUMANA (MALLA ESLABONADA Y POSTES EN CONCRETO PINTADOS)	M	1878,63	1878,63	100,00%
1,3	MANTENIMIENTO DEL AISLAMIENTO EXISTENTE EN RONDAS HÍDRICAS PROMOVIENDO LA RESTAURACIÓN PASIVA EN LAS QUEBRADAS PROPENSAS A LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS O INTERVENCIÓN ANTRÓPICA (INCLUYE DESMONTE DE MALLA EXISTENTE, INSTALACIÓN DE MALLA ESLABONADA Y MANTENIMIENTO DE POSTES)	M	581,94	581,94	100,00%
1,4	AISLAMIENTO DE PROTECCIÓN DE RONDA HÍDRICA PROMOVIENDO LA RESTAURACIÓN PASIVA (EN TUBERÍA GALVANIZADA Y VIGA DE CONCRETO	M	72,30	72,30	100,00%

En el periodo de tiempo referenciado en el presente informe, el contratista de obra ejecuto las siguientes labores:

- Recolección de basuras y material depositado de manera antrópica.
- Recogida de fragmentos y restos de materiales provenientes de desechos de construcciones.
- Limpieza de la vegetación existente en los ejes y laterales de los cuerpos hídricos.
- Retiro de cada uno de los residuos descritos anteriormente.
- Disposición de residuos en centro de acopio autorizado.

Estas actividades permiten aumentar la sección hidráulica de los cauces ya que se recupera su geomorfología natural y por ende se restituye su capacidad hidráulica por defecto.

ITEM	1.1	**DESCRIPCIÓN**	RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD HIGRÁULICA DE LOS LECHOS DE LAS QUEBRADAS MEDIANTE ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS LOS CUALES DEBEN SER CLASIFICADOS Y DISPUESTOS DE MANERA ADECUADA ASEGURANDO LA RECUPERACIÓN Y EL NORMAL FLUJO DEL CAUCE DEL ÁREA Y SUS RONDAS HÍDRICAS	**UND:** M2
				
				





ITEM	1.2	**DESCRIPCIÓN**	AISLAMIENTO DE RONDAS HÍDRICAS PROMOVIENDO LA RESTAURACIÓN PASIVA EN LAS QUEBRADAS PROPENSAS A LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS O INTERVENCIÓN HUMANA (MALLA ESLABONADA Y POSTES EN CONCRETO PINTADOS)	**UND:** M





















ITEM	1.3	**DESCRIPCIÓN**	MANTENIMIENTO DEL AISLAMIENTO EXISTENTE EN RONDAS HÍDRICAS PROMOVIENDO LA RESTAURACIÓN PASIVA EN LAS QUEBRADAS PROPENSAS A LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS O INTERVENCIÓN ANTRÓPICA (INCLUYE DESMONTE DE MALLA EXISTENTE, INSTALACIÓN DE MALLA ESLABONADA Y MANTENIMIENTO DE POSTES)	**UND:** M









ITEM	1.4	**DESCRIPCIÓN**	AISLAMIENTO DE PROTECCIÓN DE RONDA HÍDRICA PROMOVIENDO LA RESTAURACIÓN PASIVA (EN TUBERÍA GALVANIZADA Y VIGA DE CONCRETO	**UND:** M







ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA AVANCE No. 1	% DE EJECUCIÓN
2	MEDIDAS DE ADAPTACIÓN A CAMBIO CLIMÁTICO				
2,1	INTERVENCIÓN DE LOS CAUCES ANTE EVENTOS EXTREMOS EN LA MICROCUENCA DEL RIO FRIO (INCLUYE MOVIMIENTO Y RETIRO DE SEDIMENTOS DE FONDO, DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ROCAS DE ARRASTRE, DRAGADO LATERAL, RECONFORMACIÓN GEOMORFOLÓGICA Y RECUPERACIÓN DE LOS CUERPOS HÍDRICOS), COMO MEDIDAS DE CONTINGENCIA FRENTE A AVALANCHAS O AVENIDAS TORRENCIALES	M^3	21602,53	21602,53	100,00%
2,2	MANTENIMIENTO DE ESPECIES ARBÓREAS CON ALTURA SUPERIOR A 3.00 M COMO MEDIDAS DE CONTINGENCIA PARA EVENTOS EXTREMOS QUE GENEREN AMENAZA DE OBSTRUCCIÓN DE LA SECCIÓN HÍDRICA EN LA MICROCUENCA DEL RIO FRIO (INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL)	UND	0,00	0,00	
2,3	MANTENIMIENTO PERIMETRALY EN ALTURA PARA GRUPOS DE GUADUAS QUE REPRESENTEN AMENAZA DE OBSTRUCCIÓN DE LA SECCIÓN HÍDRICA DURANTE EVENTOS EXTREMOS EN LA MICROCUENCA DEL RIO FRIO (INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL)	M^2	5242,86	5242,86	100,00%

Para esta actividad el contratista realizó la operación que consiste en la limpieza y el ahondamiento de los cuerpos de agua a partir de la remoción de rocas y sedimentos; esto con el objetivo de incrementar la profundidad de las cañadas y así aumentar la capacidad de transporte de agua para cada una de ellas. De igual manera se retiró el material generado en esta actividad.

De esta actividad se garantiza de manera funcional el comportamiento hidráulico de las cañadas respecto a eventos naturales (avenidas torrenciales) que de no haberse intervenido podrían generar represamientos y afectaciones a los cuerpos hídricos.

Durante el periodo de tiempo que comprende este informe, el contratista de obra realizó el mantenimiento perimetral en guaduas que representaban una amenaza de obstrucción hídrica, mitigando de esta manera los impactos ambientales generados y resaltando la importancia hídrica, beneficiando a la comunidad del área de influencia y sensibilizando a cada persona mediante las estrategias adelantadas en los predios ubicados en la microcuenca para que aporten de manera positiva con el cuidado de sus alrededores y manteniendo espacios libres de desechos que puedan representar peligros e inseguridad en cada sector.

ITEM	2.1	**DESCRIPCIÓN**	INTERVENCIÓN DE LOS CAUCES ANTE EVENTOS EXTREMOS EN LA MICROCUENCA DEL RIO FRIO (INCLUYE MOVIMIENTO Y RETIRO DE SEDIMENTOS DE FONDO, DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ROCAS DE ARRASTRE, DRAGADO LATERAL, RECONFORMACIÓN GEOMORFOLÓGICA Y RECUPERACIÓN DE LOS CUERPOS HÍDRICOS), COMO MEDIDAS DE CONTINGENCIA FRENTE A AVALANCHAS O AVENIDAS TORRENCIALES	**UND:** M^3










ITEM	2.3	**DESCRIPCIÓN**	MANTENIMIENTO PERIMETRALY EN ALTURA PARA GRUPOS DE GUADUAS QUE REPRESENTEN AMENAZA DE OBSTRUCCIÓN DE LA SECCIÓN HÍDRICA DURANTE EVENTOS EXTREMOS EN LA MICROCUENCA DEL RIO FRIO (INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL)	**UND:** M^2















9.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Durante el tiempo de ejecución establecido en este **INFORME DE LIQUIDACIÓN**, El contratista de obra mantuvo permanente comunicación con la firma interventora CONSORCIO CONSERVACIÓN IM y la entidad, la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA CDMB; el CONSORCIO CONSERVACIÓN HÍDRICA, realizó los aportes al sistema de seguridad social del personal operativo y administrativo que tiene incidencia directa en el desarrollo del proyecto y que está vinculado al consorcio, en conjunto con la interventoría, se ha realizado la apertura del libro de seguimiento de obra (bitácora de obra), en el cual se han consignado las actividades realizadas y ejecutadas en las cuales se puede apreciar el avance y el estado en que se encuentra el proyecto en pro del desarrollo del objeto del contrato.

El contratista de obra, como medida importante de seguimiento a las actividades contratadas, de manera oportuna y permanente, ha venido capturando mediante registro fotográfico, cada una de las actividades establecidas en el presupuesto contratado, en dicho registro se puede apreciar la ejecución de la obra.

El contratista de obra atendió oportuna y respetuosamente, cada uno de los requerimientos, solicitudes e inquietudes que se han generado por parte de la entidad y la interventoría, ha realizado la entrega de la documentación solicitada por parte de la interventoría que sirve como insumo para de esta manera informar oportunamente a la entidad el desarrollo efectivo del proyecto.

El contratista de obra permitió la participación efectiva de la interventoría dentro de las actividades de capacitación a los trabajadores, de manera que se ha logrado

verificar el cumplimiento de este tipo de actividades en pro de proteger la integridad de los mismo.

El contratista de obra realizó la entrega del informe de avance de obra No. 1 con los respectivos soportes que acreditan su ejecución, ha planeado la ejecución de cada una de las actividades consignadas en el presupuesto contractual de manera organizada.

9.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

El contrato de obra No. 210.15562.5 del 23 de OCTUBRE DE 2024, para el periodo que comprende el **INFORME DE LIQUIDACIÓN,** no presentó ningún tipo de modificación de carácter financiero, ni se han generado cambios en el valor total del contrato.

9.4. BALANCE FINANCIERO

DETALLE	CONTRATADO	PAGOS REALIZADOS
CONTRATO INICIAL	$4.521.575.179,94	
ANTICIPO PAGADO		$0.00
SALDO A LA FECHA		
ACTA PARCIAL No. 1		$2.260.787.074,37
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO		$1.594.847.850,97
COBRO CON LA LIQUIDACIÓN		$428.403.880,59
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD		$237.536.374,01
SUMAS IGUALES	**$4.521.575.179,94**	**$4.521.575.179,94**

9.5. COBROS PARCIALES

A la fecha de corte del presente informe, el contratista de obra ha presentado el siguiente cobro parcial de obra aprobado por la interventoría.

	VALOR ACTA	VALOR ACUMULADO
ACTA PARCIAL No. 1	$2.260.787.074,37	**$2.260.787.074,37**
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO	$1.594.847.850,97	**$3.855.634.925,34**

9.6. VALOR EJECUTADO

DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2024	$2.260.787.074,37
DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2025	$2.023.251.731,56
VALOR TOTAL EJECUTADO	$4.284.38.805,93

9.7. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA

Durante el tiempo de ejecución comprendido en este **INFORME DE LIQUIDACIÓN,** el contratista obra realizó cumplidamente la vinculación del personal y los respectivos aportes al sistema de seguridad social y riesgos laborales, dichos soportes fueron entregados a la interventoría, la cual posteriormente y en el ejercicio de sus funciones verificó y validó la información entregada.
El contratista de obra, por solicitud de la interventoría, realizó la entrega, control y seguimiento de la dotación suministrada al personal y elementos de protección, informando, capacitando y estableciendo el obligatorio cumplimiento de los mismo en pro de su cuidado personal.

El contratista de obra implementó la prestación de los primeros auxilios y atención de emergencias, ubicando los respectivos elementos en sitios visibles y de fácil alcance en el evento en que sean requeridos por el personal de obra.

9.8. INFORME GENERAL DEL ESTADO DEL TIEMPO

El estado de tiempo que predominó en el **INFORME DE LIQUIDACIÓN** fue seco y soleado, sin embargo, se presentó tiempo nuboso y frio con algunas lluvias moderadas que no perduraron, el tiempo climático no incidió en el desarrollo de las actividades de obra ni fue necesario suspender de manera temporal las tareas que se adelantaron.


ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO	20 NOVIEMBRE A 13 DE DICIEMBRE	AÑO	2024

SECO	1	LLUVIA MODERADA	2	LLUVIA INTENSA	3	NUBOSIDAD	4

HORAS	FECHA																													
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
7:00 - 8:00																														
8:00 - 9:00																														
9:00 - 10:00																														
10:00 - 11:00																														
11:00 - 12:00																														
12:00 - 13:00																														
13:00 - 14:00																														
14:00 - 15:00																														
15:00 - 16:00																														
16:00 - 17:00																														

RESUMEN MES	
1	91.00%
2	2.00%
3	0.00%
4	8.00%

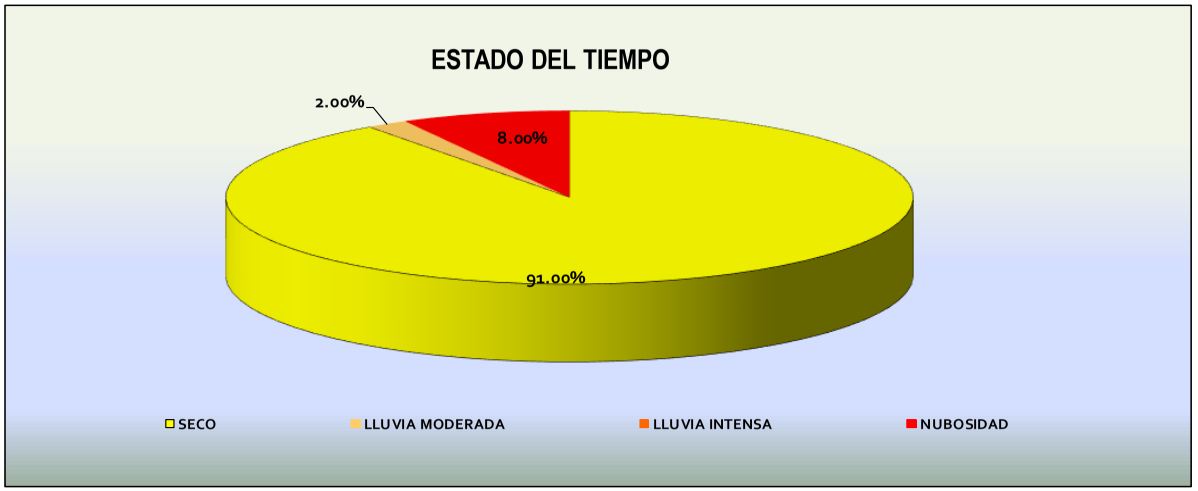


ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO	14 DICIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE	AÑO	2024

SECO	1	LLUVIA MODERADA	2	LLUVIA INTENSA	3	NUBOSIDAD	4

HORAS	FECHA																													
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31												
7:00 - 8:00	1		1	2	1	1	4	1		4	1		2	1	1		1	4												
8:00 - 9:00	1		1	4	1	1	2	1		4	1		2	1	1		1	4												
9:00 - 10:00	1		1	4	1	1	2	1		4	1		2	1	1		1	1												
10:00 - 11:00	1		1	4	1	1	2	1		1	1		2	4	1		1	1												
11:00 - 12:00	1		1	1	1	1	4	1		1	1		4	4	1		1	1												
12:00 - 13:00			1	1	1	1	4			1			4	4			1	1												
13:00 - 14:00			1	1	1	1	1			1			1	4			1	4												
14:00 - 15:00			1	1	1	1	1			1			1	3			1	4												
15:00 - 16:00			1	1	1	1	1			1			1	3			1	4												
16:00 - 17:00			1	1	1	1	1			1			1	3			1	1												

RESUMEN MES	
1	74.00%
2	7.00%
3	3.00%
4	17.00%

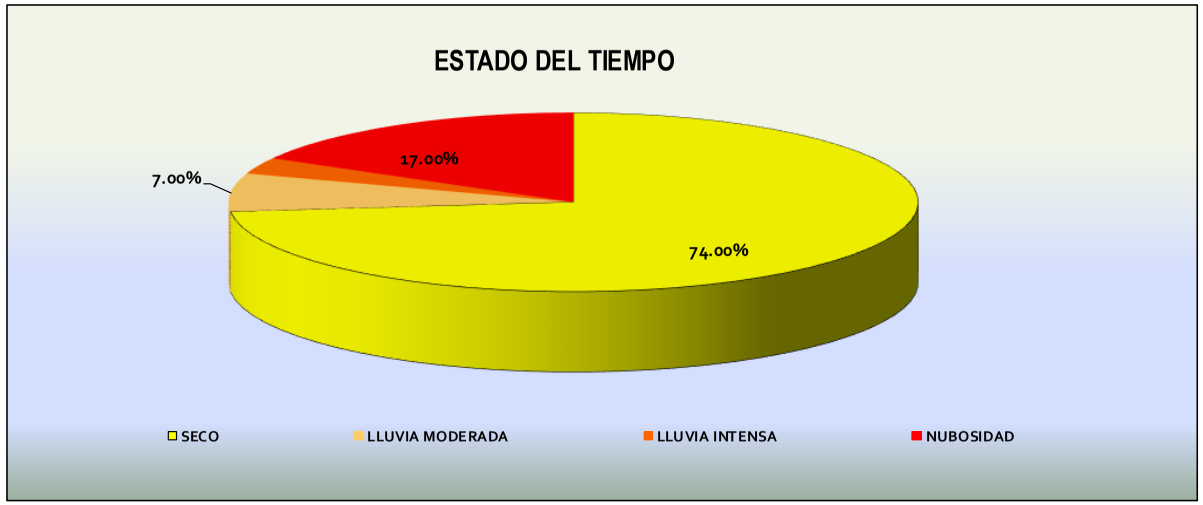


ESTADO DEL TIEMPO


PERIODO: ENERO — AÑO: 2025

SECO 1 | LLUVIA MODERADA 2 | LLUVIA INTENSA 3 | NUBOSIDAD 4

HORAS	FECHA 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
7:00 - 8:00		2	3	2			2	2	2	2	2			3	3	2	2	2		3	2	2	2	2	2		4	4	2	2	2
8:00 - 9:00		2	3	2			2	2	2	2	2			3	3	2	2	2		3	2	2	2	2	2		4	4	2	2	2
9:00 - 10:00			3	2			2	2	2	2	2			3	3	2	2	2		3	2	2	2	2	2		4	4	2	2	2
10:00 - 11:00			2	2			3	2	2	2	2			3	3	2	2	2		3	2	2	2	2	2		4	4	2	2	2
11:00 - 12:00			2	2			3	2	2	2	2			4	4	2	2	2		3	2	2	2	3	3		4	4	2	2	2
12:00 - 13:00			3	2			4	2	2	2	2			4	4	2	2	2		3	2	3	3	3	3		4	4	2	2	2
13:00 - 14:00			2	2			2	2	2	2	2			4	4	2	2	2		3	2	3	3	3	3		4	4	2	2	2
14:00 - 15:00			2	2			2	2	2	2	2			2	4	4	4	2		2	2	3	3	3	3		4	4	2	2	2
15:00 - 16:00			2	2			2	2	2	2	2			3	4	4	4	2		2	2	3	3	3	3		4	4	2	2	2
16:00 - 17:00			2	2			2	2	2	2	2			3	4	4	4	2		2	2	3	3	3	3		4	4	2	2	2

RESUMEN MES	
1	74.00%
2	2.00%
3	6.00%
4	17.00%

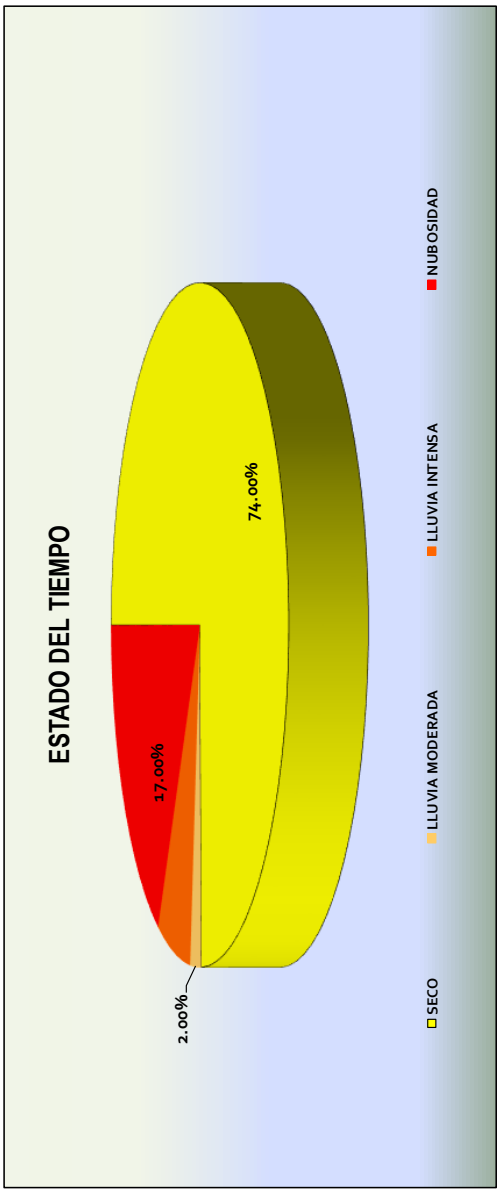

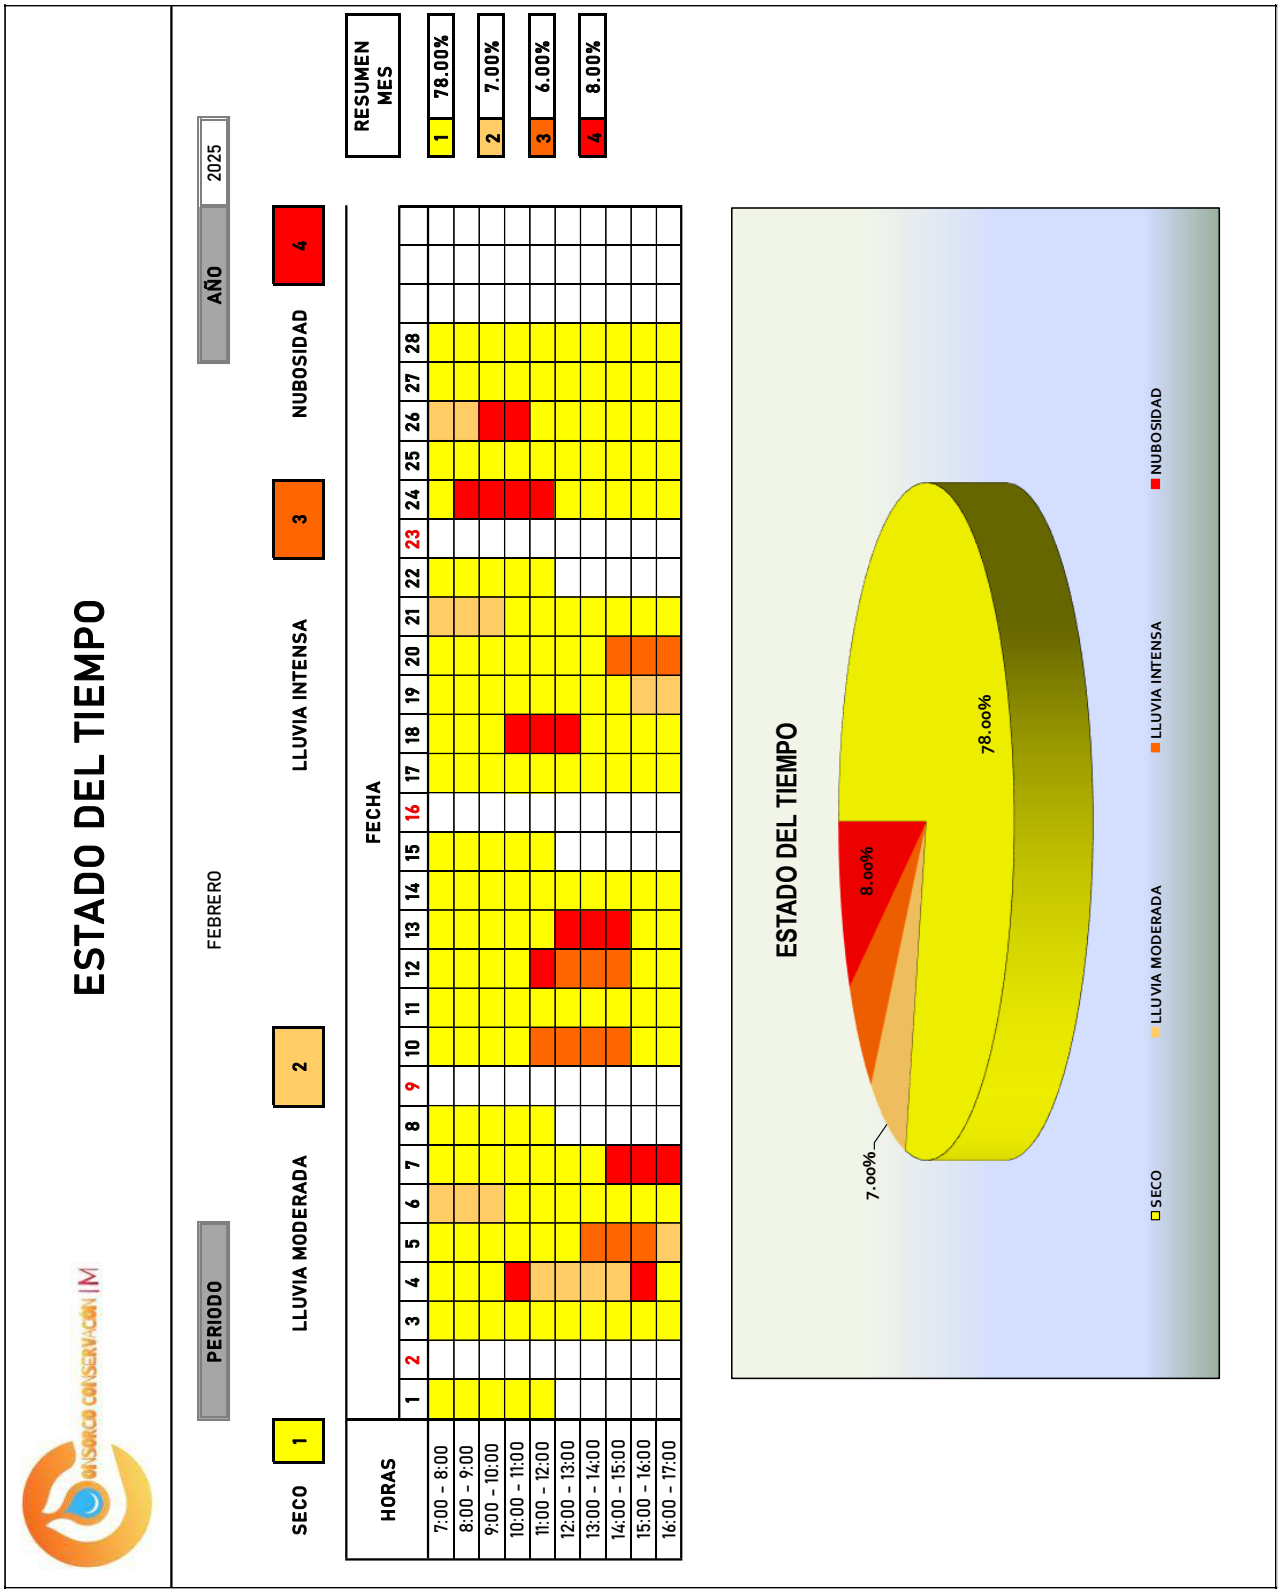
ESTADO DEL TIEMPO
PERIODO
FEBRERO
AÑO
2025
SECO 1
LLUVIA MODERADA 2
LLUVIA INTENSA 3
NUBOSIDAD 4
FECHA
HORAS
7:00 - 8:00
8:00 - 9:00
9:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
RESUMEN MES
1 78.00%
2 7.00%
3 6.00%
4 8.00%
ESTADO DEL TIEMPO
8.00%
7.00%
78.00%
SECO
LLUVIA MODERADA
LLUVIA INTENSA
NUBOSIDAD


ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO	MARZO	AÑO	2025

SECO	1	LLUVIA MODERADA	2	LLUVIA INTENSA	3	NUBOSIDAD	4


HORAS	FECHA																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
7:00 - 8:00	1		1	1	4	1	1	1		4	1	1	1	4	1		1	1	1	1	1	1			1	1	1	4	1		1
8:00 - 9:00	1		1	1	4	1	2	1		4	1	1	1	4	1		1	1	1	4	1	1			1	1	1	4	1		1
9:00 - 10:00	2		1	1	4	4	2	1		1	1	1	1	4	1		1	1	1	4	1	1			1	1	1	4	1		1
10:00 - 11:00	2		1	1	1	4	2	1		1	1	1	1	4	1		1	1	1	4	1	1			1	1	1	4	1		1
11:00 - 12:00	2		1	1	1	4	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	4	4	1			1	1	1	1	1		1
12:00 - 13:00			1	1	1	4	1			1	1	1	1	1			4	1	1	1	4				1	1	1	1			1
13:00 - 14:00			1	1	1	1	1			1	1	1	1	1			4	4	1	1	4				1	1	1	1			1
14:00 - 15:00			1	4	1	1	1			1	1	1	1	1			2	4	1	1	4				1	1	1	1			1
15:00 - 16:00			1	4	1	1	1			1	1	1	1	1			2	4	1	1	1				1	1	1	1			1
16:00 - 17:00			1	4	1	1	1			1	1	1	1	1			4	4	1	1	1				1	1	1	1			1

RESUMEN MES	
1	81.00%
2	4.00%
3	0.00%
4	15.00%

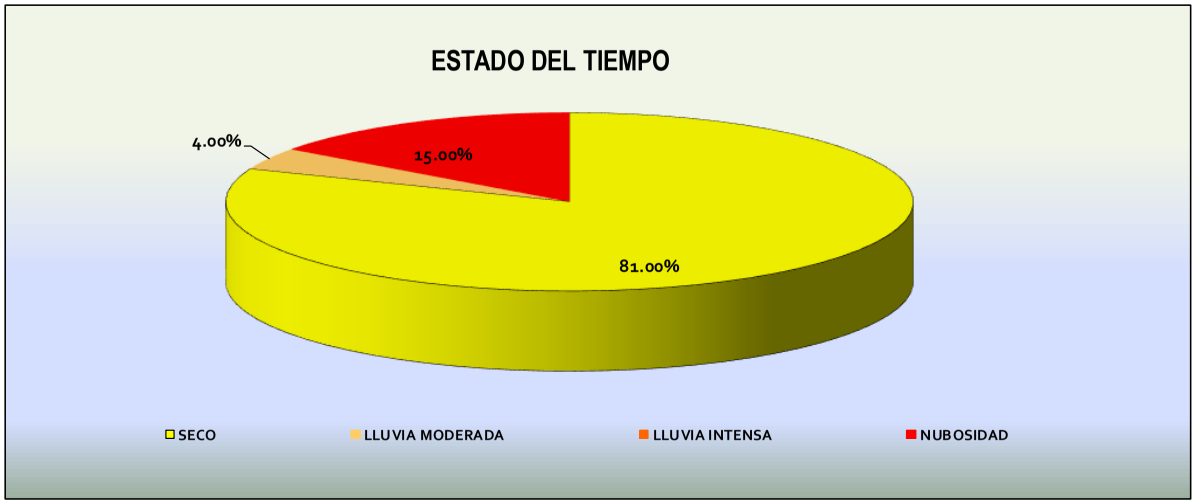

10. SEGUIMIENTO AL CONTROL FINANCIERO DE OBRA (CURVA S)

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO EL "MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTNCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEFINIDOS Y PRIORIZADOS POR LA CDMB"

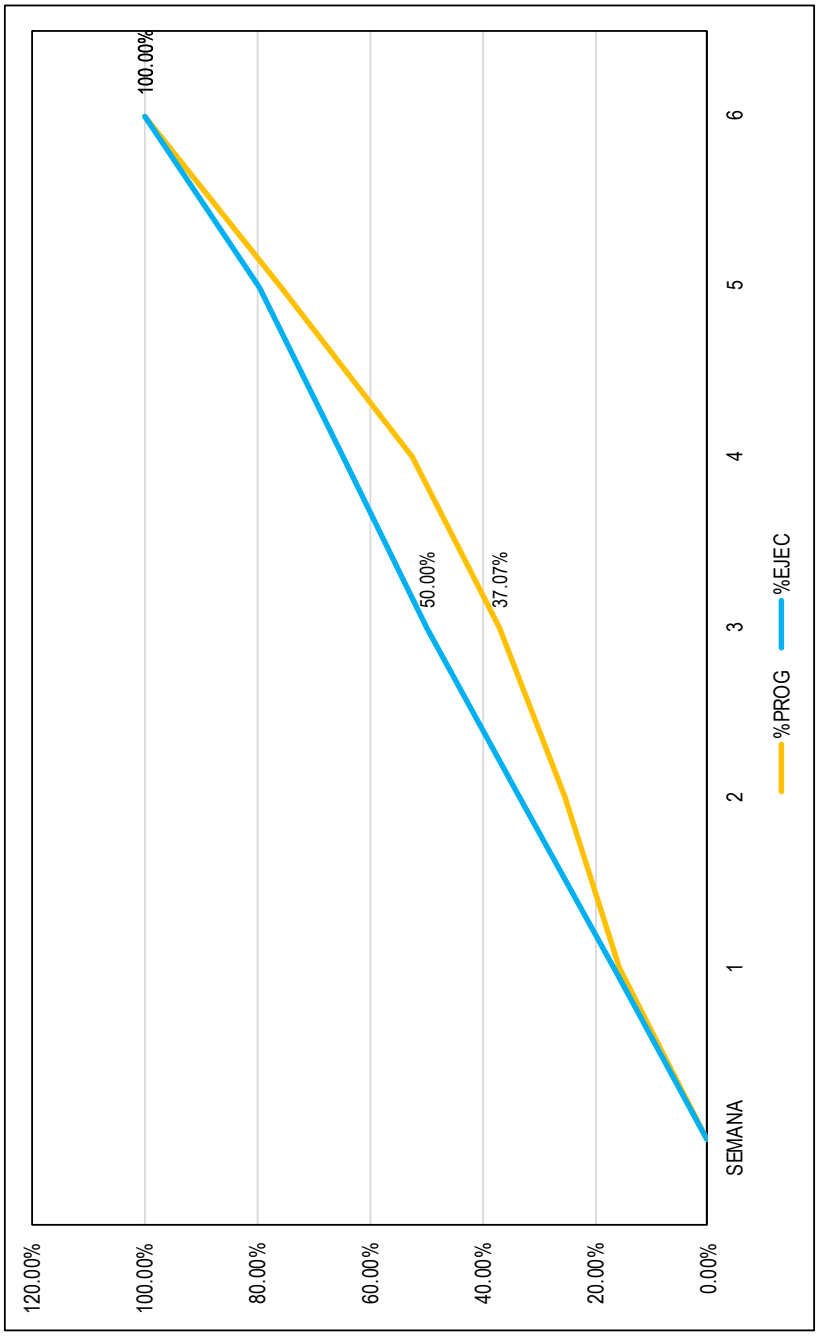

11. FICHA TECNICA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 210.15563.4 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2024

11.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 210.15563.4 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATO No.:	210.15563.4 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO EL "MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTNCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEFINIDOS Y PRIORIZADOS POR LA CDMB
ENTIDAD CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA. CDMB
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	CONSORCIO CONSERVACIÓN IM R.L. MIGUEL FERNANDO QUIRÓS GÓMEZ NIT. 901.881.356-4
VALOR DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($254.886.576,00).
DIRECCIÓN:	CARRERA 15 # 22-02 TORRE 6 OFICINA 422 – GIRÓN SANTANDER
TELÉFONO:	6960467
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	CARLOS ALBERTO DÍAZ BARRERA
PLAZO DE EJECUCION:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO ADICIONAL:	TRES (3) MESES – 27 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	31 DE MARZO DE 2025
% EJECUCIÓN A LA FECHA:	100.00%

11.2. VALOR EJECUTADO A LA FECHA POR EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

VALOR EJECUTANO AVANCE No. 1	:	$127.443.288,00
VALOR EJECUTANO AVANCE No. 2	:	$127.443.288,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	:	**$254.886.576,00**

11.3. RELACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 210.15563.4 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2024

ACTA	FECHA	OBSERVACION
SUSCRIPCIÓN CONTRATO	23/10/2024	CONTRATO DE INTERVENTORÍA
INICIO	20/11/2024	ACTA No. 1 DE INICIO DE INTERVENTORÍA
ACTA PARCIAL No. 1	18/12/2024	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORÍA No. 1 ($127.443.288,00)
OTROSÍ MODIFICATORIO No. 1	27/12/2024	PRÓRROGA DE 3 MESES AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
ACTA DE RECIBO DEFINITIVO Y ÚLTIMO PAGO	23/04/2025	ACTA DE RECIBO PARCIAL DEFINITIVO Y ÚLTIMO PAGO INTERVENTORÍA No. 2 ($127.443.288,00)

11.4. CONTROL DE PÓLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 210.15563.4 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2024

NOMBRE DE LA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

11.4.1. PÓLIZAS SUSCRIPCIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA – 24/10/2024

POLIZA No.	AMPAROS	VIGENCIAS	
		FECHA INICIO	FECHA FINAL
96-44-101192678	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/10/2024	30/04/2025
	CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2024	31/12/2029
	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	23/10/2024	31/12/2027

11.4.2. PÓLIZAS ACTA DE INICIO CONTRATO DE INTERVENTORÍA – 26/11/2024

POLIZA No.	AMPAROS	VIGENCIAS	
		FECHA INICIO	FECHA FINAL
96-44-101192678	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/11/2024	28/05/2025
	CALIDAD DEL SERVICIO	28/01/2025	28/01/2030
	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	20/11/2024	28/01/2028

11.4.3. PÓLIZAS PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA – 28/12/2024

POLIZA No.	AMPAROS	VIGENCIAS	
		FECHA INICIO	FECHA FINAL
96-44-101192678	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/11/2024	31/08/2025

	CALIDAD DEL SERVICIO	28/01/2025	28/01/2030
	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	20/11/2024	30/04/2028

11.4.4. PÓLIZAS ACTA DE RECIBO DEFINITIVO CONTRATO DE INTERVENTORÍA – 28/05/2025

POLIZA No.	AMPAROS	VIGENCIAS	
		FECHA INICIO	FECHA FINAL
96-44-101192678	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20/11/2024	31/08/2025
	CALIDAD DEL SERVICIO	31/032025	31/03/2030
	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	20/11/2024	30/04/2028

11.5. RELACION DE PERSONAL INTERVENTORÍA

A continuación, se relaciona el personal de interventoría que realiza el seguimiento y control del contrato de interventoría.

CARGO	NOMBRE	DEDICACION
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MIGUEL FERNANDO QUIRÓS GÓMEZ	40%
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	MARIA ALEXANDRA SÁNCHEZ RODRIGUEZ	100%
ESPECIALISTA EN RECURSOS HÍDRICOS O HIDRÁULICOS	DIANA EDITH CONTRERAS VARGAS	30%
INGENIERO AMBIENTAL	ANGIE DANIELA MERCHAN PÉREZ	30%
INGENIERO FORESTAL	LUIS ANGEL PINTO ROJAS	30%
PROFESIONAL SISO	PAULA EMILIA FAJARDO SILGADO	100%

11.6. OTROS RECURSOS

OTROS RECURSOS	CANTIDAD
INFORMES	1
VEHICULO	1
COMISIÓN TOPOGRÁFICA	1

11.7. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 210.15563.4 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2024

11.7.1. DURANTE EL PERIODO

Previo a la presentación de este informe, el contrato de interventoría contó con la suscripción del acta de cobro No. 1 relacionada a continuación:

CUENTA	FECHA	ACTA N°	CONCEPTO	VALOR PAGADO
No. 1	18/12/2024	No. 2	ACTA PARCIAL DE COBRO	$127.443.288
No. 2	23/04/2025	No. 3	ACTA DE RECIBO DEFINITIVO Y ÚLTIMO PAGO	$127.443.288
TOTAL				**$254.886.576**

El avance financiero proporcionado al presente periodo corresponde a:

DESCRIPCION	VALOR DE LA INVERSION INICIAL	VALOR EJECUTADO PRESENTE PERIODO	SALDO
VALOR TOTAL:	$254.886.576,00	$127.443.288,00	$0,00
VALOR TOTAL ACUMULADO:		$254.886.576,00	

12. PRESUPUESTO CONTRACTUAL DE INTERVENTORIA

	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 210.15563.4 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2024
	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO EL "MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTNCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEFINIDOS Y PRIORIZADOS POR LA CDMB

CANTIDAD	CARGO/OFICIO	SUELDO MENSUAL (2).	DEDICACIÓN H/MES (3).	PARTICIPACIÓN MES (4).	FACTOR MULTIPLICADOR C.L (5a)	FACTOR MULTIPLICADOR C.P.S (5b)	VALOR PARCIAL (1)*(2)*(3)*(4)*(5)=(6)
I	COSTOS DIRECTOS PERSONAL						
1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	$ 6,000,000.00	40.00%	4.0		1.4	$ 13,440,000.00
1	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	$ 3,500,000.00	100.00%	4.0	2.4		$ 33,600,000.00
1	ESPECIALISTA EN RECURSOS HÍDRICOS O HIDRÁULICOS	$ 5,000,000.00	30.00%	4.0		1.4	$ 8,400,000.00
1	INGENIERO AMBIENTAL	$ 3,500,000.00	30.00%	4.0		1.4	$ 5,880,000.00
1	INGENIERO FORESTAL	$ 3,500,000.00	30.00%	4.0		1.4	$ 5,880,000.00
1	PROFESIONAL SISO	$ 3,500,000.00	100.00%	4.0	2.4		$ 33,600,000.00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE I (6) = (A)							$ 100,800,000.00

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TIEMPO (MESES)	DEDICACIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
II	OTROS COSTOS DIRECTOS					
1	OFICINA, EQUIPOS DE OFICINA Y COMUNICACIONES (INCLUYE SERVICIOS PÚBLICOS)	UND	4	100.00%	$ 2,400,000.00	$ 9,600,000.00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS						$ 9,600,000.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS						$ 110,400,000.00

CANTIDAD (7).	CONCEPTO	UNIDAD	TIEMPO DE UTILIZACIÓN (8).	MES (9).	COSTO ($) (10).	FACTOR MULTIPLICADOR	VALOR PARCIAL ($) (7)*(8)*(9)*(10)*(11)=(12)
III	COSTOS INDIRECTOS						
1	COSTOS INFORMES MAS MEMORIAS FOTOGRÁFICAS MAS PLANOS MAS PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS	MES	100.00%	4	$ 1,894,000.00	1.4	$ 10,606,400.00
1	COMISIÓN TOPOGRÁFICA	MES	70.00%	4	$ 7,200,000.00	1.4	$ 28,224,000.00
1	VEHÍCULO (INCLUYE CONDUCTOR)	MES	100.00%	4	$ 11,600,000.00	1.4	$ 64,960,000.00
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS							$ 103,790,400.00
COSTOS BÁSICOS							$ 214,190,400.00
IVA 19%							$ 40,696,176.00
VALOR TOTAL							$ 254,886,576.00

13. AVANCE DE INTERVENTORÍA No. 1

CONSORCIO CONSERVACIÓN |M

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO EL "MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEFINIDOS Y PRIORIZADOS POR LA CDMB

CDMB

ACTA DE COBRO No.: 1 - CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 210.15563.4 DE 2024

| CONDICIONES CONTRACTUALES | | |

14. AVANCE DE RECIBO DEFINITIVO INTERVENTORÍA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO EL "MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTNCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEFINIDOS Y PRIORIZADOS POR LA CDMB

ACTA DE COBRO No. 2 - CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 210.15563.4 DE 2024

CONDICIONES CONTRACTUALES										1				2				ACUMULADOS			
										PERIODO: 20 DE NOVIEMBRE A 13 DE DICIEMBRE DE 2024				PERIODO: 14 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2025				OBRA		INTERVENTORIA	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 210.15563.4 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2024				CONTRATO DE OBRA No. 210.15562.5 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2024				EJECUTADO OBRA		EJECUTADO INTERVENTORIA		EJECUTADO OBRA		EJECUTADO INTERVENTORIA					
OBJETO	VR INICIAL	VR FINAL	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	OBJETO	VR INICIAL	VR FINAL	CONTRATISTA DE OBRA	VR EJECUTADO	% PONDERADO	VR COSTO	% EJECUTADO	VR EJECUTADO	% PONDERADO	VR COSTO	% EJECUTADO	VR ACUMULADO	% EJECUTADO	VR ACUMULADO	% EJECUTADO
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO EL "MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTNCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEFINIDOS Y PRIORIZADOS POR LA CDMB	$ 254,884,574.00	$ 254,884,574.00	CONSORCIO CONSERVACIÓN IM	MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTNCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEFINIDOS Y PRIORIZADOS POR LA CDMB	$ 4,521,575,179.94	$ 4,284,038,805.93	CONSORCIO CONSERVACIÓN HÍDRICA	$ 2,260,787,074.37	50.00%	$ 127,443,288.00	50.00%	$ 2,023,251,731.56	47.23%	$ 127,443,288.00	50.00%	$ 4,284,038,805.93	100.00%	$ 254,884,574.00	100.00%
TOTAL	$ 254,884,574.00	$ 254,884,574.00		TOTAL	$ 4,521,575,179.94	$ 4,284,038,805.93		$ 2,260,787,074.37		$ 127,443,288.00		$ 2,023,251,731.56		$ 127,443,288.00		$ 4,284,038,805.93		$ 254,884,574.00	

15. ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

La Interventoría, en cumplimiento de sus funciones se obliga a realizar para la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA CDMB, el seguimiento a las actividades de construcción objeto del contrato de acuerdo con los diseños, especificaciones, cantidades y calidades contraídas por el contratista del contrato de obra No. 210.15562.5 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2024 – CONSORCIO CONSERVACIÓN HÍDRICA.

15.1. ACTIVIDADES TECNICAS REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA:

Durante el periodo que comprende el presente informe, la interventoría ha realizado las siguientes actividades:

- Verificación del cumplimiento en la vinculación y el respectivo aporte al sistema de seguridad social, riesgos y pensiones, ante la solicitud de la documentación respectiva que acredite el proceso para el contratista de obra CONSORCIO CONSERVACIÓN HÍDRICA.
- La interventoría mantuvo acompañamiento permanente en la ejecución de las actividades de obra.
- La interventoría verificó que el contratista de obra mantenga la permanencia de los frentes de trabajo.
- La interventoría verificó el diligenciamiento del libro de registro de actividades ejecutadas (bitácora de obra) en la cual se ha consignado el desarrollo del proyecto de manera diaria y detallada.
- La interventoría verificó el cumplimiento por parte del contratista en el suministro y acopio de materiales, herramientas y equipos en condiciones idóneas para la ejecución de las actividades propias de obra y verificación y exigencia ante la eventualidad de que los mismos sean reemplazados.
- La interventoría ha revisado y tomado decisiones ante diferentes requerimientos de carácter técnico que no han implicado modificaciones o sobrecostos al contrato de obra.

De acuerdo al corte de las actividades realizadas por la Interventoría, para el presente período de ejecución y teniendo en cuenta el avance de obra, el avance acumulado de la interventoría es de **100.00%.**

15.2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS:

Durante el periodo que comprende este informe de interventoría, se han realizado las siguientes actividades de carácter administrativo:

- La interventoría realizó la vinculación al sistema de seguridad social, riesgos y pensiones del personal de interventoría CONSORCIO CONSERVACIÓN IM.
- La interventoría verificó el cumplimiento en los aportes de seguridad social, riesgos y pensiones para cada uno de las personas vinculadas al proyecto de obra e interventoría.
- La interventoría realizó el seguimiento y control permanente de la documentación e información que se requiere al contrato de obra y de interventoría, de la ejecución de las actividades y de los requerimientos de la entidad contratante.
- La interventoría realizó la verificación del cumplimiento a cabalidad de las normas técnicas de acuerdo con el objeto del contrato, dentro de las cuales se encuentran la protección del medio ambiente, la seguridad industrial y la salud ocupacional.
- La interventoría ha procurado la existencia de un expediente del contrato que esté completo, actualizado y que cumpla con las normas en materia de archivo.
- Exigencia al contratista en la entrega oportuna e implementación de los respectivos elementos de protección personal y que además se documente cada entrega.

15.3. ACTIVIDADES FINANCIERAS

- Revisión y control del balance presupuestal del contrato para efecto de cobros por parte del contratista de obra.

15.4. COMPONENTE SOCIAL

Durante el tiempo de ejecución comprendido en el presente informe, la interventoría realizó acompañamiento al contratista de obra en el proceso de ejecución de las actividades que conllevan el desarrollo del contrato, se da tramite

a las inquietudes mediante comités de obra realizados oportunamente en los cuales se cuenta con la participación efectiva de la entidad, contratista de obra y contratista de interventoría.

15.5. COMPONENTE AMBIENTAL Y SST

Durante el periodo del presente informe, la interventoría verificó que el contratista de obra realizara las siguientes actividades del componente ambiental y sst:

- Inducción a los trabajadores del proyecto
- Capacitación al personal por parte de le profesional en SST
- Entrega de elementos de protección personal
- Entrega de dotación

Así mismo, el personal de la interventoría verifica la entrega y uso permanente correcto de elementos de protección personal, realiza presencia en capacitaciones, revisión del correcto funcionamiento de los equipos y maquinaria, revisión de afiliaciones al sistema de seguridad social del personal, así mismo los permisos respectivos para la ejecución del proyecto.

16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Para la fecha de corte del presente informe, se reporta un avance financiero acumulado de obra equivalente a CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($4.284.038.805,93) que corresponde a un 100.00% del cumplimiento en las actividades contratadas.

- Para la fecha de corte del presente informe, se reporta un avance financiero acumulado de interventoría equivalente a DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($254.886.576,00) que corresponde a un 100.00% de ejecución, de acuerdo al avance de obra.

- El contratista dio cumplimiento de manera satisfactoria a las actividades contempladas en el alcance contractual garantizando calidad y seriedad en su ejecución aportando y mejorando notoriamente el entorno establecido para intervención, brindando seguridad territorial a los residentes de los barrios trabajados.

- Para efectos de pago del contrato de obra y teniendo en cuenta lo establecido en el contrato, en la cláusula séptima **Forma de pago** – "La CORPORACIÓN reconocerá y pagará el valor del contrato de obra mediante Tres (3) pagos parciales de la siguiente manera: Un pago parcial por el 50% del valor del contrato revisado por la interventoría y el supervisor designado por la CDMB cuando la obra presente un avance financiero de ejecución equivalente al 50%; un segundo pago parcial del 40% del valor del contrato al recibo definitivo de la obra; un tercer y último pago por el 10% restante a la suscripción del acta de liquidación del contrato". Por tal motivo y teniendo en cuenta que el valor total ejecutado corresponde a CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($4.284.038.805,93), del cual el 10% que será pagado con la suscripción de la liquidación equivale a CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($428.403.880,59), el contratista de obra realizará el segundo cobro parcial por valor de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($1.594.847.850,97).

- Teniendo en cuenta que la ejecución total del contrato de obra corresponde a CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($4.284.038.805,93), con el cual se da cumplimiento total al alcance del objeto quedando en un porcentaje de ejecución del 100.00%, se aclara que del contrato de obra se deja un saldo a favor de la entidad por valor de DOSCIENTOS TREINTA SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CERO UN CENTAVOS ($237.536.374,01), el contrato de interventoría se ejecutó en su totalidad.

MIGUEL FERNANDO QUIRÓS GÓMEZ
Representante legal
CONSORCIO CONSERVACIÓN IM

17. ANEXOS

- Soportes de pago seguridad social del contrato de obra
- Soportes de pago seguridad social del contrato de interventoría
- Soportes de nómina interventoría
- Bitácora de obra
- Informe área ambiental interventoría
- Informe seguridad y salud en el trabajo

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO EL "MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEFINIDOS Y PRIORIZADOS POR LA CDMB"



ANEXO No. 1

SEGURIDAD SOCIAL – CONTRATISTA DE OBRA

LIQUIDACIÓN

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-12-09, 04:49:57 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1068411593

Periodo Cotización 202411 **Periodo Servicio** 202412

PAGADA 2024-12-04 10:14:31.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS				
Documento	NI 901173035	**Dirección**	CR 39 #51 - 31 APT 1503		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6914305		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	7
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal	GOMEZ RONCANCIO EDGAR LEONARDO	**Identificación**	CC 72254372		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 72254372		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					GOMEZ RONCANCIO EDGAR LEONARDO	68001000 - 68		SANTANDER

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 6.300.000	231001		16 %	$ 6.300.000	$ 1.008.000	$ 31.500	$ 31.500	EPS010		4 %	$ 6.300.000	$ 252.000	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 6.300.000	$ 438.500	CCF40	4 %	$ 6.300.000	$ 252.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFENALCO SANTANDER	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 1.008.000	$ 31.500	$ 31.500	$ 252.000	$ 438.500	$ 252.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.013.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	**dv**	**Razon Social**	**Clase Aportante**	**Sucursal Principal**	**Direccion**	**Ciudad-Departamento**	**Teléfono**	**Exonerado SENA e ICBF**
NIT 900847742	7	INFRACORP SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 5 E 28# 109	BUCARAMANGA-SANTANDER	7920530	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		**Clave**		**Tipo**	**Fecha**		**Pago**		
Pensión	**Salud**	**Pago**	**Planilla**	**Planilla**	**Limite**	**Pago**	**Banco**	**Dias Mora**	**Valor**
2024-11	2024-12	1102732202	9478542183	E	2024/12/10	2024/12/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$10.052.200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				**NOVEDADES**																	**PENSION**				**SALUD**				**CCF**				**RIESGOS**					**PARAFISCALES**				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	tma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (12 Afiliados)																						**$34.985.646**	**$5.721.700**			**$36.285.646**	**$1.451.800**			**$32.975.779**	**$1.319.400**			**$36.285.646**		**$1.559.300**		**$0**	**$0**		**$10.052.200**
Centro de Trabajo: BAJO (5 Afiliados)																						**$10.016.802**	**$1.602.900**			**$11.316.802**	**$452.900**			**$11.316.802**	**$452.900**			**$11.316.802**		**$51.400**		**$0**	**$0**		**$2.560.100**
10	CC	1098682052	PADIERNA CASTIBLANCO JOHANNA MARCELA																	25-14	30	$5.355.000	$910.400	EPS005	30	$5.355.000	$214.200	CCF40	30	$5.355.000	$214.200	14-4	30	$5.355.000	6,960%	$372.800	30	$0	$0	Si	$1.711.600
Total	Afiliados(12)																					$34.985.646	$5.721.700			$36.285.646	$1.451.800			$32.975.779	$1.319.400			$36.285.646		$1.559.300		$0	$0		$10.052.200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901881924	8	CONSORCIO CONSERVACION HIDRICA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO CONSERVACION HIDRICA	CR 39 51 31 AP 1903	BUCARAMANGA-SANTANDER	3012765665	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1100360793	9478258443	E	2024/12/06	2024/12/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$653,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1102375757	PARRA OSMA JESSID RAMON	X																	230301	6	$400,000	$64,000	EPS037	6	$400,000	$16,000	CCF40	6	$400,000	$16,000	14-4	6	$400,000	$27,900	6	$0	$0	Si	$123,900
2	CC	1098715543	SANDOVAL MANTILLA ANDRES FELIPE	X																	230301	28	$1,633,334	$261,400	EPS005	28	$1,633,334	$65,400	CCF40	28	$1,633,334	$65,400	14-4	28	$1,633,334	$113,700	28	$0	$0	Si	$505,900
3	CC	1098715543	SANDOVAL MANTILLA ANDRES FELIPE											X							230301	2	$116,667	$18,700	EPS005	2	$116,667	$4,700	CCF40	0	$0	$0	14-4	2	$116,667	$0	0	$0	$0	Si	$23,400
Total	**Afiliados(2)**																						$2,150,001	$344,100			$2,150,001	$86,100			$2,033,334	$81,400			$2,150,001	$141,600		$0	$0		$653,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901881924	8	CONSORCIO CONSERVACION HIDRICA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO CONSERVACION HIDRICA	CR 39 51 31 AP 1903	BUCARAMANGA-SANTANDER	3012765665	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1100360793	9478258443	E	2024/12/06	2024/12/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$653,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$344,100	$0	$0	$344,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$344,100	$0	$0	$344,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$141,600	$0	$0	$141,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	$141,600	$0	$0	$141,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$81,400	$0	$0	$81,400
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	$81,400	$0	$0	$81,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$86,100	$0	$0	$86,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$16,000	$0	$0	$16,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$70,100	$0	$0	$70,100
TOTAL				**2**	**$653,200**	**$0**	**$0**	**$653,200**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901881924	8	CONSORCIO CONSERVACION HIDRICA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO CONSERVACION HIDRICA	CR 39 51 31 AP 1903	BUCARAMANGA-SANTANDER	3012765665	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1102652555	9478500257	Y	2024/12/06	2024/12/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$262,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1101597782	MEDINA REATIGA OSCAR FABRICIO	X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	29	$1,256,667	$87,500	0	$0	$0	No	$87,500
2	CC	80089079	RINCON LOZANO JUAN CARLOS	X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	29	$1,256,667	$87,500	0	$0	$0	No	$87,500
3	CC	1100958383	SANCHEZ CASTRO LUISA FERNANDA	X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	29	$1,256,667	$87,500	0	$0	$0	No	$87,500
Total	**Afiliados(3)**																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,770,001	$262,500		$0	$0		$262,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901881924	8	CONSORCIO CONSERVACION HIDRICA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO CONSERVACION HIDRICA	CR 39 51 31 AP 1903	BUCARAMANGA-SANTANDER	3012765665	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1102652555	9478500257	Y	2024/12/06	2024/12/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$262,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$262,500	$0	$0	$262,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	3	$262,500	$0	$0	$262,500
TOTAL				**3**	**$262,500**	**$0**	**$0**	**$262,500**

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-12-09, 05:05:31 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1068411593

Periodo Cotización 202411 **Periodo Servicio** 202412

PAGADA 2024-12-04 10:14:31.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS				
Documento	NI 901173035	**Dirección**	CR 39 #51 - 31 APT 1503		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6914305		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	7
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal	GOMEZ RONCANCIO EDGAR LEONARDO	**Identificación**	CC 72254372		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1098704436		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					DONADO ARIAS CLARA MELISSA	68001000 - 68		SANTANDER

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																							**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF						Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30					F	$ 1.300.000	230201		16 %	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 1.300.000	$ 90.500	CCF40	4 %	$ 1.300.000	$ 52.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFENALCO SANTANDER	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 90.500	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1100958383	LUISA FERNANDA SANCHEZ CASTRO	Carrera 29 No. 30-25	6975300	ing.luisafernanda10@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		SANTANDER	BUCARAMANGA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-11	I	21/11/2024	81944395	$644.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	260.500	0		0		0	0	0	0	260.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	333.500	0	0	0	0	0	0		333.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	50.800				50.800	0	0	50.800			508	50.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	260.500	260.500
Pensión	1	333.500	333.500
Riesgos Laborales	1	50.800	50.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	644.800	644.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1100958383	LUISA FERNANDA SANCHEZ CASTRO		Carrera 29 No. 30-25	6975300	ing.luisafernanda10@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
ÚNICA	I – Independiente			SANTANDER	BUCARAMANGA	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-11	I	21/11/2024	81944395	$644.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1100958383	SANCHEZ CASTRO LUISA FERNANDA	59	0			N																	230301	2.084.000	333.500	0	0	0	0	EPS010	2.084.000	260.500	14-23	2.084.000	3	50.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	80089079
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN CARLOS RINCON LOZANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CARRERA 19 B NO 64 - 24	TELÉFONO:	6223036
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7944297213**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/11/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1076495991

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 208.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 208.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 162.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 162.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 370.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 370.500**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	80089079
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN CARLOS RINCON LOZANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CARRERA 19 B NO 64 - 24	TELÉFONO:	6223036
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7944297213**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/11/26			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1076495991

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 0**	**$ 208.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 162.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																										PENSIÓN									SALUD							ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 80089079	RINCON LOZANO JUAN CARLOS	INDEPEND		$ 1.300.000				NO																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500			$ 0		$ 0	$ 0	$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 370.500**

Planilla Pagada

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-12-18, 09:24:43 a. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1068411593

Periodo Cotización 202411 **Periodo Servicio** 202412

PAGADA 2024-12-04 10:14:31.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS				
Documento	NI 901173035	**Dirección**	CR 39 #51 - 31 APT 1503		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6914305		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	7
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal	GOMEZ RONCANCIO EDGAR LEONARDO	**Identificación**	CC 72254372		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1098781831		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					TARAZONA MANTILLA DENNIS MELISSA	68001000 - 68		SANTANDER

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				**Código AFP**	**Código Tras. AFP**	**Tarifa AFP**	**IBC**	**Total Aporte AFP**	**Total Aporte FSP**	**Total Aporte FSPS**	**Código EPS**	**Código Tras. EPS**	**Tarifa EPS**	**IBC EPS**	**Aporte Salud**	**Aporte UPC**	**Código ARL**	**Clase Riesgo**	**Tarifa ARL**	**IBC ARL**	**Aporte Riesgos**	**Código CCF**	**Tarifa CCF**	**IBC CCF**	**Aporte Caja**	**Tarifa SENA**	**Aporte SENA**	**Tarifa ICBF**	**Aporte ICBF**
								X							0	30	30	30	30			F	$ 2.300.000	230301		16 %	$ 2.462.500	$ 394.000	$ 0	$ 0	EPS046		4 %	$ 2.462.500	$ 98.500	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 2.462.500	$ 171.400	CCF40	4 %	$ 2.462.500	$ 98.500	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD MIA EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFENALCO SANTANDER	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 394.000	$ 0	$ 0	$ 98.500	$ 171.400	$ 98.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 762.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Comfenalco SANTANDER
Se preocupa por ti.
N.I.T 890.201.578-7

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DEL TRABAJADOR DEPENDIENTE

Canal de recepción: PLATAFORMA WEB

Radicado No.
Fecha de creación : 02/12/2024 01:58:36 PM
Fecha de radicación : 02/12/2024 01:58:00 PM
ITD_202412021358_1064121767

1. DATOS DEL EMPLEADOR

Documento de identificación		Razón social
NIT 901881924	8 D.V	CONSORCIO CONSERVACION HIDRICA

Sucursal	Agencia
PRI - CONSORCIO CONSERVACION HIDRICA	PRINCIPAL

2. DATOS DEL TRABAJADOR

Documento de identificación	Fecha de expedición	Lugar de expedición		Fecha de nacimiento
CC 1.064.121.767	2017/01/03	CESAR	LA JAGUA DE IBIRICO	1998/12/21

Nombres y apellidos			
EVELYN	DAYANA	BARRETO	CASTRILLO

Sexo	Estado civil	Dirección y barrio de residencia	
FEMENINO	SOLTERO(A)	CL 35 25 23 APARTAMENTO 401 EDIFICIO VILLA ADRIANA	ANTONIA SANTOS

Municipio y departamento de residencia		Zona de residencia	Teléfono fijo	Teléfono celular
BUCARAMANGA	SANTANDER	URBANA		3209186062

Correo electrónico	Nivel de escolaridad
EDBC2121@GMAIL.COM	TÉCNICO/TÉCNOLÓGICO

3. INFORMACIÓN DE VINCULACIÓN LABORAL

Fecha de inicio	Cargo actual
2024/12/02	

¿Trabajador servicio doméstico?	Jornada laboral	Tipo de salario	Salario básico mes	Comisiones mes	Salario/ingreso total mes
NO	TIEMPO COMPLETO	FIJO	1,300,000		1,300,000

Municipio y departamento del lugar de trabajo		Zona del lugar de trabajo
BUCARAMANGA	SANTANDER	URBANA

4. DATOS DEL CÓNYUGE O COMPAÑERO(A) PERMANENTE

Documento de identificación	Fecha de expedición	Lugar de expedición		Fecha de nacimiento

Nombres y apellidos			

Sexo	Municipio y departamento de residencia		Zona de residencia	Ocupación

Razón social de la empresa o nombre del pagador de la pensión	Salario/ingreso total mes	¿Recibe subsidio en dinero?	¿En cúal Caja de Compensación Familiar?

5. DATOS DE PERSONAS A CARGO

Documento de identificación	Nombres y apellidos	Fecha de nacimiento	Municipio y departamento residencia	Zona de residencia	Sexo M, F o NB	Parentesco	Estudiante Solo si aplica	Nivel de escolaridad	Certificado de Discapacidad
							○		○
							○		○
							○		○
							○		○
							○		○
							○		○
							○		○
							○		○
							○		○
							○		○

Medio de pago		¿Cuenta con certificado bancario?		Tipo de cuenta		Número de cuenta	

DESCRIPCIÓN DE CAMPOS

1. TIPO DE DOCUMENTO
(N.I.T) Número de identificación tributaría
(T.I) Tarjeta de identidad
(C.C) Cédula de ciudadanía
(P.A) Pasaporte
(R.C) Registro civil
(C.E) Cédula de extranjería
(P.T) Permiso por protección temporal
(C.D) Carné diplomático

2. SEXO
(F) Femenino
(M) Masculino
(NB) No binario

3. PARENTESCO
1. Hijo(a)
2. Padre/Madre
3. Hermano(a)
4. Hijastro(a)
5. Dependiente por custodia legal o judicial

4. NIVEL DE ESCOLARIDAD
1. Preescolar
2. Básica (1° a 5°)
3. Secundaria (6° a 9°)
4. Media (10° a 11°)
5. Básica adultos (1° a 5°)
6. Secundaria adultos (6° a 9°)
7. Media adultos (10° a 11°)
8. Primera infancia
9. Técnico/Tecnológico
10. Profesional universitario
11. Posgrado/Maestría
12. Ninguno

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES (TDP)
Al diligenciar este formulario autorizo a la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Santander, ubicada en la Avenida González Valencia No. 52-69 de Bucaramanga y con teléfono de contacto 607 6577000, para que recolecte, almacene, use, circule y/o suprima mis datos personales y los de mis representados, consignados en este medio y en sus anexos, incluyendo el consentimiento para tratar datos sensibles y de menores de edad, aun conociendo que no estoy obligado a autorizar su tratamiento, con el fin de que sean consultados y reportados en centrales de riesgo, transmitidos y transferidos nacional e internacionalmente, usados para contactarme para adelantar gestiones de cobro y/o enviar mensajes publicitarios o comerciales, a través de los canales: correo electrónico, correspondencia, llamada telefónica, aplicaciones web y mensajes SMS; y en general para las demás finalidades incorporadas en la Política de Tratamiento de Información disponible en www.comfenalcosantander.com.co la cual declaro conocer y saber que en esta se especifican cuáles datos sensibles. Así mismo, conozco que como titular me asisten los derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mis datos y revocar la autorización. Igualmente declaro que poseo autorización de los otros titulares de datos que suministro (Beneficiarios, Grupo Familiar, Dependientes, entre otros), para que Comfenalco Santander les dé tratamiento conforme a las finalidades consignadas en la Política mencionada.

DECLARACIÓN DE VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN (DVI)
Bajo gravedad de juramento declaramos que los datos relacionados en este formulario son exactos, verídicos y corresponden a la conformación actual del grupo familiar del trabajador, aceptando que esta información es la que quedará registrada en la afiliación en Comfenalco Santander.

Señor trabajador:
Conserve esta copia como soporte del trámite de radicación de su inscripción.

CONSORCIO CONSERVACION HIDRICA
Firma del empleador
Número documento empleador 901881924

EVELYN DAYANA BARRETO CASTRILLO
Firma del trabajador
Número documento trabajador 1.064.121.767

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Nit. 860.002.183 – 9

CERTIFICA

Que el afiliado relacionado a continuación se encuentra vinculado con nuestra compañía bajo la afiliación No. 9026228 correspondiente a la empresa Consorcio Conservacion Hidrica.

Empresa en misión EMPLEADOS DE PLANTA sucursal PRINCIPAL

Nombre	T. I	Número de Identificacion	Fecha de inicio cobertura	Clase de Riesgo	Tasa de Riesgo Centro de trabajo	Centro de trabajo
EVELYN DAYANA BARRETO CASTRILLO	C.C.	1,064,121,767	02/12/2024	RIESGO V	6.960	6960

Cordialmente,



FREDY CEBALLOS MONTANA
LIDER DE OPERACIONES NO MONETARIOS
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

La presente se expide a través de la página de internet www.axacolpatria.co, el sábado 30 de noviembre de 2024 a las 01:59:30 p. m.

Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 018000-512620 ó en Bogotá 4235757.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

EVELYN DAYANA BARRETO CASTRILLO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.064.121.767**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir**.

La presente certificación se expide el 29 de Noviembre del 2024.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-02-10, 03:38:06 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1069009033

Periodo Cotización 202412 **Periodo Servicio** 202501

PAGADA 2025-01-08 11:14:31.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS				
Documento	NI 901173035	**Dirección**	CR 39 #51 - 31 APT 1503		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6914305		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	8
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal	GOMEZ RONCANCIO EDGAR LEONARDO	**Identificación**	CC 72254372		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 72254372		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					GOMEZ RONCANCIO EDGAR LEONARDO	68001000 - 68		SANTANDER

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 6.300.000	231001		16 %	$ 6.300.000	$ 1.008.000	$ 31.500	$ 31.500	EPS010		4 %	$ 6.300.000	$ 252.000	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 6.300.000	$ 438.500	CCF40	4 %	$ 6.300.000	$ 252.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFENALCO SANTANDER	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 1.008.000	$ 31.500	$ 31.500	$ 252.000	$ 438.500	$ 252.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.013.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	**dv**	**Razon Social**	**Clase Aportante**	**Sucursal Principal**	**Direccion**	**Ciudad-Departamento**	**Teléfono**	**Exonerado SENA e ICBF**
NIT 900847742	7	INFRACORP SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 74A 22 31	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7920530	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		**Clave**		**Tipo**	**Fecha**		**Pago**	
Pensión	**Salud**	**Pago**	**Planilla**	**Planilla**	**Limite**	**Pago**	**Banco**	**Dias Mora**	**Valor**
2024-12	2025-01	1180508502	9480059016	E	2025/01/13	2025/01/08	BANCO DE OCCIDENTE	0	$10.582.600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			**NOVEDADES**																		**PENSION**				**SALUD**				**CCF**				**RIESGOS**					**PARAFISCALES**				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (12 Afiliados)																						**$34.865.102**	**$5.702.500**			**$36.165.103**	**$1.447.200**			**$42.764.796**	**$1.711.300**			**$36.165.103**		**$1.721.600**		**$0**	**$0**		**$10.582.600**
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (5 Afiliados)																						**$10.016.802**	**$1.602.900**			**$11.316.803**	**$453.000**			**$11.631.403**	**$465.500**			**$11.316.803**		**$45.300**		**$0**	**$0**		**$2.566.700**
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (5 Afiliados)																						**$10.016.802**	**$1.602.900**			**$11.316.803**	**$453.000**			**$11.631.403**	**$465.500**			**$11.316.803**		**$45.300**		**$0**	**$0**		**$2.566.700**
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (7 Afiliados)																						**$24.848.300**	**$4.099.600**			**$24.848.300**	**$994.200**			**$31.133.393**	**$1.245.800**			**$24.848.300**		**$1.676.300**		**$0**	**$0**		**$8.015.900**
14	CC	1098682052	PADIERNA CASTIBLANCO		X															25-14	30	$5.355.000	$910.400	EPS005	30	$5.355.000	$214.200	CCF40	30	$7.668.062	$306.800	14-4	30	$5.355.000	6,960%	$372.800	30	$0	$0	Si	$1.804.200
Total Afiliados(12)																						$34.865.102	$5.702.500			$36.165.103	$1.447.200			$42.764.796	$1.711.300			$36.165.103		$1.721.600		$0	$0		$10.582.600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901881924	8	CONSORCIO CONSERVACION HIDRICA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO CONSERVACION HIDRICA	CR 39 51 31 AP 1903	BUCARAMANGA-SANTANDER	3012765665	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1180772488	9480069598	E	2025/01/09	2025/01/08	BANCO DE OCCIDENTE	0	$1,885,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1064121767	BARRETO CASTRILLO EVELYN DAYANA	X																	230301	29	$1,256,667	$201,100	EPS002	29	$1,256,667	$50,300	CCF40	29	$1,256,667	$50,300	14-4	29	$1,256,667	$87,500	29	$0	$0	Si	$389,200
2	CC	1101200012	GUERRERO SAAVEDRA GERALDINE ANDREA	X																	25-14	21	$910,000	$145,600	EPS037	21	$910,000	$36,400	CCF40	21	$910,000	$36,400	14-4	21	$910,000	$63,400	21	$0	$0	Si	$281,800
3	CC	1102375757	PARRA OSMA JESSID RAMON		X							X									230301	30	$2,139,131	$342,300	EPS037	30	$2,139,131	$85,600	CCF40	30	$2,244,928	$89,800	14-4	30	$2,139,131	$148,900	30	$0	$0	Si	$666,600
4	CC	1098715543	SANDOVAL MANTILLA ANDRES FELIPE		X																230301	30	$1,750,000	$280,000	EPS005	30	$1,750,000	$70,000	CCF40	30	$1,895,833	$75,900	14-4	30	$1,750,000	$121,800	30	$0	$0	Si	$547,700
Total	**Afiliados(4)**																					$6,055,798	$969,000			$6,055,798	$242,300			$6,307,428	$252,400			$6,055,798	$421,600		$0	$0		$1,885,300

2025/01/16 11:21 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901881924	8	CONSORCIO CONSERVACION HIDRICA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO CONSERVACION HIDRICA	CR 39 51 31 AP 1903	BUCARAMANGA-SANTANDER	3012765665	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1180787564	9479226821	Y	2025/01/09	2025/01/08	BANCO DE OCCIDENTE	0	$271,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1101597782	MEDINA REATIGA OSCAR FABRICIO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,300,000	$90,500	0	$0	$0	No	$90,500
2	CC	80089079	RINCON LOZANO JUAN CARLOS																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,300,000	$90,500	0	$0	$0	No	$90,500
3	CC	1100958383	SANCHEZ CASTRO LUISA FERNANDA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,300,000	$90,500	0	$0	$0	No	$90,500
Total	**Afiliados(3)**																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,900,000	$271,500		$0	$0		$271,500

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-02-10, 03:47:20 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1069009033

Periodo Cotización 202412 **Periodo Servicio** 202501

PAGADA 2025-01-08 11:14:31.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS				
Documento	NI 901173035	**Dirección**	CR 39 #51 - 31 APT 1503		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6914305		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	8
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal	GOMEZ RONCANCIO EDGAR LEONARDO	**Identificación**	CC 72254372		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1098704436		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					DONADO ARIAS CLARA MELISSA	68001000 - 68		SANTANDER

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 1.300.000	230201		16 %	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 1.300.000	$ 90.500	CCF40	4 %	$ 1.300.000	$ 52.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFENALCO SANTANDER	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 90.500	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1100958383	LUISA FERNANDA SANCHEZ CASTRO	Carrera 29 No. 30-25	6975300	ing.luisafernanda10@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		SANTANDER	BUCARAMANGA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-12	I	10/12/2024	82580139	$433.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	175.000	0		0		0	0	0	0	175.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	224.000	0	0	0	0	0	0		224.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	34.200				34.200	0	0	34.200			342	34.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	175.000	175.000
Pensión	1	224.000	224.000
Riesgos Laborales	1	34.200	34.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	433.200	433.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	80089079
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN CARLOS RINCON LOZANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CARRERA 19 B NO 64 - 24	TELÉFONO:	6223036
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7950546071**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/10			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1114646443

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 0**	**$ 208.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 162.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																													PENSIÓN								SALUD							ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 80089079	RINCON LOZANO JUAN CARLOS	INDEPEND		$ 1.300.000				NO																		231001-COLFONDOS	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 370.500**

Planilla Pagada

PLANILLA NRO. 32717707 Tipo I 2024 12

ASOPAGOS

DATOS GENERALES

TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR
CC	1101597782	OSCAR FABRICIO MEDINA REATIGA	SUCURSAL	sucursal	1	2024-12	2024-12	32717707		PRIVADA	I	14-23	86

DIRECCIÓN	CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO	ACTIVIDAD ECONÓMICA	VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
MANZA O CASA 11 BARRIO SANTELMO 1	BUCARAMANGA	1	SANTANDER	68	3108600613	0	OSMED93@GMAIL.COM	7490	0	1	2025-03-05	2025-01-22

TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT INC	VALOR INC	# AUT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
EPS037	900156264	162500	0	0	0	0	0	162500	42	4500	0	167000	0	0	0	0	167000	1

TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AF	COT VOL AP	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
231001	800227940	208000	0	0	0	42	5700	0	213700	1

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES

CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# AUT INC	VALOR INC	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
SINARL	0	0	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0	0

TOTAL APORTES A ESAP

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	42	0	0

TOTAL APORTES A MINISTERIO

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	42	0	0

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
SINCCF	0	0	42	0	0	1

TOTAL APORTES A ICBF Y SENA

ICBF

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	42	0	0	0

SENA

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	42	0	0	0

NÚMERO ADMINISTRADORAS	
PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	0
CAJAS COMPENSACIÓN	0

TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA	
PENSIONES	213700
SALUD	167000
RIESGOS LABORALES	0
CAJAS COMPENSACIÓN	0
SENA	0
ICBF	0
ESAP	0
MINISTERIO	0
GRAN TOTAL	380700

PAGADO

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-04-10, 02:13:48 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1069009033

Periodo Cotización 202412 **Periodo Servicio** 202501

PAGADA 2025-01-08 11:14:31.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS				
Documento	NI 901173035	**Dirección**	CR 39 #51 - 31 APT 1503		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6914305		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	8
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal	GOMEZ RONCANCIO EDGAR LEONARDO	**Identificación**	CC 72254372		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1098781831		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					TARAZONA MANTILLA DENNIS MELISSA	68001000 - 68		SANTANDER

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				**Código AFP**	**Código Tras. AFP**	**Tarifa AFP**	**IBC**	**Total Aporte AFP**	**Total Aporte FSP**	**Total Aporte FSPS**	**Código EPS**	**Código Tras. EPS**	**Tarifa EPS**	**IBC EPS**	**Aporte Salud**	**Aporte UPC**	**Código ARL**	**Clase Riesgo**	**Tarifa ARL**	**IBC ARL**	**Aporte Riesgos**	**Código CCF**	**Tarifa CCF**	**IBC CCF**	**Aporte Caja**	**Tarifa SENA**	**Aporte SENA**	**Tarifa ICBF**	**Aporte ICBF**
								X							0	30	30	30	30			F	$ 2.300.000	230301		16 %	$ 2.812.500	$ 450.000	$ 0	$ 0	EPS046		4 %	$ 2.812.500	$ 112.500	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 2.812.500	$ 195.800	CCF40	4 %	$ 2.812.500	$ 112.500	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD MIA EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFENALCO SANTANDER	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 450.000	$ 0	$ 0	$ 112.500	$ 195.800	$ 112.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 870.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901050177	7	LERMA CONSTRUCCIONES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	0001	CRA 5 No. 8-03 SANTA ANA	BUCARAMANGA-SANTANDER	6583112	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1211057501	9480562801	E	2025/01/21	2025/01/22	BANCOLOMBIA	1	$6,499,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: 0001 (21 Afiliados)						$21,320,001	$3,411,300			$21,926,668	$877,200			$20,886,668	$835,600			$21,926,668	$1,370,500		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	37555201	FLOREZ EDHIT	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: OBRAS CIVILES LERMA (20 Afiliados)						$20,020,001	$3,203,300			$20,626,668	$825,200			$19,586,668	$783,600			$20,626,668	$1,363,700		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (20 Afiliados)						$20,020,001	$3,203,300			$20,626,668	$825,200			$19,586,668	$783,600			$20,626,668	$1,363,700		$0	$0
2	CC	1007369791	AMARIZ FRANKLIN	230301	14	$606,667	$97,100	EPS037	14	$606,667	$24,300	CCF39	14	$606,667	$24,300	14-4	14	$606,667	$42,300	14	$0	$0
3	CC	91248488	BARRERA MANUEL	25-14	24	$1,040,000	$166,400	EPS002	24	$1,040,000	$41,600	CCF39	24	$1,040,000	$41,600	14-4	24	$1,040,000	$72,400	24	$0	$0
4	CC	1003091700	GARCIA BRAYAN	230301	24	$1,040,000	$166,400	EPS037	24	$1,040,000	$41,600	CCF39	24	$1,040,000	$41,600	14-4	24	$1,040,000	$72,400	24	$0	$0
5	CC	1095802356	GARCIA FLORENTINO	230301	24	$1,040,000	$166,400	EPS037	24	$1,040,000	$41,600	CCF39	24	$1,040,000	$41,600	14-4	24	$1,040,000	$72,400	24	$0	$0
6	CC	1007514004	GARCIA RAUL	230301	24	$1,040,000	$166,400	EPS037	24	$1,040,000	$41,600	CCF39	24	$1,040,000	$41,600	14-4	24	$1,040,000	$72,400	24	$0	$0
7	CC	91497697	JAIMES EDWING	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
8	CC	1003091037	MARIN FABIO	230201	24	$1,040,000	$166,400	ESSC62	24	$1,040,000	$41,600	CCF39	24	$1,040,000	$41,600	14-4	24	$1,040,000	$72,400	24	$0	$0
9	CC	1003091035	MARIN HENRY	230301	24	$1,040,000	$166,400	EPS037	24	$1,040,000	$41,600	CCF39	24	$1,040,000	$41,600	14-4	24	$1,040,000	$72,400	24	$0	$0
10	CC	1003091639	MARTINEZ LUIS	230301	22	$953,334	$152,600	EPS005	22	$953,334	$38,200	CCF39	22	$953,334	$38,200	14-4	22	$953,334	$66,400	22	$0	$0
11	CC	1007570335	OSPINO DIEGO	230301	24	$1,040,000	$166,400	EPS002	24	$1,040,000	$41,600	CCF39	24	$1,040,000	$41,600	14-4	24	$1,040,000	$72,400	24	$0	$0
12	CC	12502397	QUINTERO URIEL	230201	24	$1,040,000	$166,400	EPS037	24	$1,040,000	$41,600	CCF39	24	$1,040,000	$41,600	14-4	24	$1,040,000	$72,400	24	$0	$0
13	CC	85202937	RAMIREZ NERIS	230301	24	$1,040,000	$166,400	EPS037	24	$1,040,000	$41,600	CCF39	24	$1,040,000	$41,600	14-4	24	$1,040,000	$72,400	24	$0	$0
14	CC	91298926	REY LUIS	230201	24	$1,040,000	$166,400	EPS002	24	$1,040,000	$41,600	CCF39	24	$1,040,000	$41,600	14-4	24	$1,040,000	$72,400	24	$0	$0
15	CC	1095828352	RINCON ENDER	230301	24	$1,040,000	$166,400	EPS002	24	$1,040,000	$41,600	CCF39	24	$1,040,000	$41,600	14-4	24	$1,040,000	$72,400	24	$0	$0
16	CC	91495988	RINCON LUIS	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF39	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
17	CC	1234338042	RINCON MAYRA	230301	24	$1,040,000	$166,400	EPS010	24	$1,040,000	$41,600	CCF39	24	$1,040,000	$41,600	14-4	24	$1,040,000	$72,400	24	$0	$0
18	CC	1097910397	ROJAS EDWARD	25-14	24	$1,040,000	$166,400	EPS037	24	$1,040,000	$41,600	CCF39	24	$1,040,000	$41,600	14-4	24	$1,040,000	$72,400	24	$0	$0
19	CC	5725284	TRUJILLO CARLOS		0	$0	$0	EPS046	14	$606,667	$24,300	CCF39	14	$606,667	$24,300	14-4	14	$606,667	$42,300	14	$0	$0
20	CC	1095839551	VALENCIA CARLOS	230301	6	$260,000	$41,600	EPS037	6	$260,000	$10,400	CCF39	6	$260,000	$10,400	14-4	6	$260,000	$18,100	6	$0	$0
21	CC	1095839551	VALENCIA CARLOS	230301	24	$1,040,000	$166,400	EPS037	24	$1,040,000	$41,600	CCF39	0	$0	$0	14-4	24	$1,040,000	$0	0	$0	$0
22	CC	1005149383	VALENCIA JHON	230301	24	$1,040,000	$166,400	EPS002	24	$1,040,000	$41,600	CCF39	24	$1,040,000	$41,600	14-4	24	$1,040,000	$72,400	24	$0	$0
Total			**Afiliados(21)**			$21,320,001	$3,411,300			$21,926,668	$877,200			$20,886,668	$835,600			$21,926,668	$1,370,500		$0	$0

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901768348	2	CONSTRUCCIONES VERA SANGUINO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 202 21 A 33	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6759660	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1185930657	9480183628	E	2025/01/14	2025/01/10	BANCO CAJA SOCIAL	0	$7,200,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (19 Afiliados)																							$23,320,006	$3,731,800			$23,320,006	$933,400			$26,963,614	$1,079,300			$23,320,006		$1,455,700		$0	$0		$7,200,200
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$318,800
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$318,800
1	CC	1095804910	SIERRA SANTOS YURLEY																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS046	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (18 Afiliados)																							$22,020,006	$3,523,800			$22,020,006	$881,400			$25,663,614	$1,027,300			$22,020,006		$1,448,900		$0	$0		$6,881,400
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (18 Afiliados)																							$22,020,006	$3,523,800			$22,020,006	$881,400			$25,663,614	$1,027,300			$22,020,006		$1,448,900		$0	$0		$6,881,400
2	PT	6406812	ABREU MATA RICHARD JOSE																		25-14	5	$216,667	$34,700	EPS037	5	$216,667	$8,700	CCF40	5	$216,667	$8,700	14-4	5	$216,667	6.960%	$15,100	5	$0	$0	Si	$67,200
3	PT	6406812	ABREU MATA RICHARD JOSE																	X	25-14	25	$1,083,334	$173,400	EPS037	25	$1,083,334	$43,400	CCF40	0	$0	$0	14-4	25	$1,083,334	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$216,800
4	CC	91274086	CAMACHO SANTOS JOSE MANUEL		X															X	23030 1	29	$1,256,667	$201,100	EPS002	29	$1,256,667	$50,300	CCF40	29	$1,327,084	$53,100	14-4	29	$1,256,667	6.960%	$87,500	29	$0	$0	Si	$392,000
5	CC	91350570	CHACON MANTILLA FABIO	X	X															X	23030 1	27	$1,170,000	$187,200	EPS041	27	$1,170,000	$46,800	CCF40	27	$1,218,750	$48,800	14-4	27	$1,170,000	6.960%	$81,500	27	$0	$0	Si	$364,300
6	CC	1102387490	CHACON GALVIS OMAR ALEJANDRO	X	X															X	23030 1	27	$1,170,000	$187,200	EPS002	27	$1,170,000	$46,800	CCF40	27	$1,218,750	$48,800	14-4	27	$1,170,000	6.960%	$81,500	27	$0	$0	Si	$364,300
7	CC	1095808698	GUALDRON SEHUANES MARCO ANTONIO		X															X	23100 1	29	$1,256,667	$201,100	EPS017	29	$1,256,667	$50,300	CCF40	29	$1,328,889	$53,200	14-4	29	$1,256,667	6.960%	$87,500	29	$0	$0	Si	$392,100
8	CC	1005370753	INFANTE ARDILA LAUREN ANDREA ZULEY		X															X	23030 1	29	$1,256,667	$201,100	EPS037	29	$1,256,667	$50,300	CCF40	29	$1,722,500	$68,900	14-4	29	$1,256,667	6.960%	$87,500	29	$0	$0	Si	$407,800
9	CC	88258470	JACOME JACOME EZEQUIEL		X															X	23030 1	29	$1,256,667	$201,100	EPS017	29	$1,256,667	$50,300	CCF40	29	$1,888,611	$75,600	14-4	29	$1,256,667	6.960%	$87,500	29	$0	$0	Si	$414,500
10	CC	91156019	LUNA ACOSTA JOSE ANTONIO		X															X	23030 1	29	$1,256,667	$201,100	EPS002	29	$1,256,667	$50,300	CCF40	29	$1,888,611	$75,600	14-4	29	$1,256,667	6.960%	$87,500	29	$0	$0	Si	$414,500
11	CC	91133913	NIEVES NELSON		X															X	25-14	29	$1,256,667	$201,100	EPS037	29	$1,256,667	$50,300	CCF40	29	$1,606,945	$64,300	14-4	29	$1,256,667	6.960%	$87,500	29	$0	$0	Si	$403,200
12	CC	5747939	PARRA RIOS JUAN ANTONIO		X															X	23030 1	27	$1,170,000	$187,200	EPS046	27	$1,170,000	$46,800	CCF40	27	$1,740,556	$69,700	14-4	27	$1,170,000	6.960%	$81,500	27	$0	$0	Si	$385,200
13	CC	91346298	PEDRAZA FIGUEROA LUIS ALVARO											X							25-14	2	$86,667	$13,900	EPS005	2	$86,667	$3,500	CCF40	0	$0	$0	14-4	2	$86,667	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$17,400
14	CC	91346298	PEDRAZA FIGUEROA LUIS ALVARO		X															X	25-14	27	$1,170,000	$187,200	EPS005	27	$1,170,000	$46,800	CCF40	27	$1,702,639	$68,200	14-4	27	$1,170,000	6.960%	$81,500	27	$0	$0	Si	$383,700
15	CC	91350653	PEÑA VEGA CARLOS VICENTE		X															X	23030 1	29	$1,256,667	$201,100	EPS010	29	$1,256,667	$50,300	CCF40	29	$1,742,361	$69,700	14-4	29	$1,256,667	6.960%	$87,500	29	$0	$0	Si	$408,600
16	CC	5691822	PRADA RINCON LUIS ALBERTO												X						23030 1	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF40	1	$43,333	$1,800	14-4	1	$43,334	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$10,600
17	CC	5691822	PRADA RINCON LUIS ALBERTO																		23030 1	29	$1,256,667	$201,100	EPS037	29	$1,256,667	$50,300	CCF40	29	$1,256,667	$50,300	14-4	29	$1,256,667	6.960%	$87,500	29	$0	$0	Si	$389,200
18	CC	1005309669	RAMIREZ ALVAREZ YEISON ALFONSO	X	X															X	23020 1	1	$43,334	$7,000	EPS041	1	$43,334	$1,800	CCF40	1	$45,140	$1,900	14-4	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	Si	$13,800
19	CC	1093738325	RIVERA GOMEZ BAUDILLO		X															X	25-14	29	$1,256,667	$201,100	EPS002	29	$1,256,667	$50,300	CCF40	29	$1,527,500	$61,100	14-4	29	$1,256,667	6.960%	$87,500	29	$0	$0	Si	$400,000
20	CC	91184098	SANCHEZ REY RONAL		X															X	23020 1	29	$1,256,667	$201,100	EPS041	29	$1,256,667	$50,300	CCF40	29	$1,888,611	$75,600	14-4	29	$1,256,667	6.960%	$87,500	29	$0	$0	Si	$414,500
21	CC	1096064931	VERA SIERRA JORGE GIOVANNY																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS046	30	$1,300,000	$52,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
22	CC	1098608113	VERA SANGUINO JORGE ALBERTO																		23020 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS046	30	$2,000,000	$80,000	CCF40	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
Total			**Afiliados(19)**																				$23,320,006	$3,731,800			$23,320,006	$933,400			$26,963,614	$1,079,300			$23,320,006		$1,455,700		$0	$0		$7,200,200

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	80089079
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN CARLOS RINCON LOZANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CARRERA 19 B NO 64 - 24	TELÉFONO:	6223036
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7954871309**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/01/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1190469305

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD							ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 80089079	RINCON LOZANO JUAN CARLOS	INDEPEND		$ 1.423.500				NO																		231001-COLFONDOS	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 405.800**

Planilla Pagada
achSOI Pagos de Seguridad Social

RESUMEN PLANILLA GENERADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1101597782	0	OSCAR FABRICIO MEDINA REATIGA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-276	MANZA O CASA 11 BARRIO SANTELMO 1		3108600613			OSMED93@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-01	2025-01	32329591	I		TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	405.800	0	
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	32329591	2025-02-20	Sin pagar							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 1101597782	MEDINA REATIGA OSCAR FABRICIO	1.423.500		X	X														0			30	30	0	0	COLFONDOS-231001	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	178.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	0	0	0,00000	0	0	0	0	0	03	0	405.800	N	0

RESUMEN PLANILLA GENERADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1101597782	0	OSCAR FABRICIO MEDINA REATIGA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-276	MANZA O CASA 11 BARRIO SANTELMO 1		3108600613			OSMED93@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-01	2025-01	32329591	I		TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	405.800	0	
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	32329591	2025-02-20	Sin pagar							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.423.500	1.423.500	0	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800	0	0	0	227.800
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	227.800	0	0	0	227.800
EPS(Administradoras: 1)				1	178.000	0	0	0	178.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	178.000	0	0	0	178.000
Gran Total					405.800	0	0	0	405.800

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1100958383	LUISA FERNANDA SANCHEZ CASTRO	Carrera 29 No. 30-25	6975300	ing.luisafernanda10@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		SANTANDER	BUCARAMANGA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2025-01	I	24/02/2025	84411287	$414.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	178.000	0		0		0	4	500	0	178.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	4	700	0	228.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	7.500				7.500	4	100	7.600			75	7.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	4	0	0	0
ICBF				
0	4	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.500
Pensión	1	227.800	228.500
Riesgos Laborales	1	7.500	7.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	413.300	414.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901881924	8	CONSORCIO CONSERVACION HIDRICA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO CONSERVACION HIDRICA	CR 39 51 31 AP 1903	BUCARAMANGA-SANTANDER	3012765665	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1248757488	9480648957	Y	2025/02/07	2025/02/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	$297,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1101597782	MEDINA REATIGA OSCAR FABRICIO							X												0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
2	CC	80089079	RINCON LOZANO JUAN CARLOS							X												0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
3	CC	1100958383	SANCHEZ CASTRO LUISA FERNANDA							X												0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
Total	**Afiliados(3)**																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,270,500	$297,300		$0	$0		$297,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901881924	8	CONSORCIO CONSERVACION HIDRICA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO CONSERVACION HIDRICA	CR 39 51 31 AP 1903	BUCARAMANGA-SANTANDER	3012765665	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1248778203	9481442561	E	2025/02/07	2025/02/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	$975,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1064121767	BARRETO CASTRILLO EVELYN DAYANA							X		X									230301	30	$1,500,864	$240,200	EPS002	30	$1,500,864	$60,100	CCF40	30	$1,500,864	$60,100	14-4	30	$1,500,864	$104,500	30	$0	$0	Si	$464,900
2	CC	1101200012	GUERRERO SAAVEDRA GERALDINE ANDREA							X		X									25-14	30	$1,647,856	$263,700	EPS037	30	$1,647,856	$66,000	CCF40	30	$1,647,856	$66,000	14-4	30	$1,647,856	$114,700	30	$0	$0	Si	$510,400
Total	**Afiliados(2)**																						$3,148,720	$503,900			$3,148,720	$126,100			$3,148,720	$126,100			$3,148,720	$219,200		$0	$0		$975,300

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-02-10, 03:38:49 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1070061799

Periodo Cotización 202501 **Periodo Servicio** 202502

PAGADA 2025-02-06 14:11:44.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS				
Documento	NI 901173035	**Dirección**	CR 39 #51 - 31 APT 1503		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6914305		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	8
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal	GOMEZ RONCANCIO EDGAR LEONARDO	**Identificación**	CC 72254372		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 72254372		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					GOMEZ RONCANCIO EDGAR LEONARDO	68001000 - 68		SANTANDER

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 6.300.000	231001		16 %	$ 6.300.000	$ 1.008.000	$ 31.500	$ 31.500	EPS010		4 %	$ 6.300.000	$ 252.000	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 6.300.000	$ 438.500	CCF40	4 %	$ 6.300.000	$ 252.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFENALCO SANTANDER	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 1.008.000	$ 31.500	$ 31.500	$ 252.000	$ 438.500	$ 252.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.013.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-02-10, 03:46:37 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1070061799

Periodo Cotización 202501 **Periodo Servicio** 202502

PAGADA 2025-02-06 14:11:44.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS				
Documento	NI 901173035	**Dirección**	CR 39 #51 - 31 APT 1503		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6914305		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	8
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal	GOMEZ RONCANCIO EDGAR LEONARDO	**Identificación**	CC 72254372		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1098704436		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					DONADO ARIAS CLARA MELISSA	68001000 - 68		SANTANDER

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
						X									0	11	11	11	11			F	$ 1.423.500	230201		16 %	$ 521.950	$ 83.600	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 521.950	$ 20.900	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 521.950	$ 36.400	CCF40	4 %	$ 521.950	$ 20.900	0 %	$ 0	0 %	$ 0
												X			0	19	19	19	19			F	$ 1.423.500	230201		16 %	$ 901.550	$ 144.300	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 901.550	$ 36.100	$ 0	14-4		0,000 %	$ 901.550	$ 0	CCF40	4 %	$ 901.550	$ 36.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFENALCO SANTANDER	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.900	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 36.400	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 378.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-04-10, 02:14:35 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1070061799

Periodo Cotización 202501 **Periodo Servicio** 202502

PAGADA 2025-02-06 14:11:44.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS				
Documento	NI 901173035	**Dirección**	CR 39 #51 - 31 APT 1503		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6914305		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	8
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal	GOMEZ RONCANCIO EDGAR LEONARDO	**Identificación**	CC 72254372		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1098781831		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					TARAZONA MANTILLA DENNIS MELISSA	68001000 - 68		SANTANDER

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	15	15	15	15			F	$ 2.300.000	230301		16 %	$ 1.150.000	$ 184.000	$ 0	$ 0	EPS046		4 %	$ 1.150.000	$ 46.000	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 1.150.000	$ 80.100	CCF40	4 %	$ 1.150.000	$ 46.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0
												X			0	15	15	15	15			F	$ 2.300.000	230301		16 %	$ 1.406.250	$ 225.000	$ 0	$ 0	EPS046		4 %	$ 1.406.250	$ 56.300	$ 0	14-4		0,000 %	$ 1.406.250	$ 0	CCF40	4 %	$ 1.155.197	$ 46.300	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD MIA EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFENALCO SANTANDER	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 409.000	$ 0	$ 0	$ 102.300	$ 80.100	$ 92.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 683.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900847742	7	INFRACORP SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 74A 22 31	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7920530	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1259059076	9481583402	E	2025/02/11	2025/02/11	BANCO DE OCCIDENTE	0	$11.202.900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (26 Afiliados)																						**$37.611.738**	**$6.018.900**			**$39.035.238**	**$1.562.400**			**$39.035.238**	**$1.562.400**			**$39.035.238**		**$2.059.200**		**$0**	**$0**		**$11.202.900**
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (5 Afiliados)																						**$8.033.440**	**$1.285.400**			**$9.456.940**	**$378.400**			**$9.456.940**	**$378.400**			**$9.456.940**		**$47.500**		**$0**	**$0**		**$2.089.700**
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (5 Afiliados)																						**$8.033.440**	**$1.285.400**			**$9.456.940**	**$378.400**			**$9.456.940**	**$378.400**			**$9.456.940**		**$47.500**		**$0**	**$0**		**$2.089.700**
19	CC	1098682052	PADIERNA CASTIBLANCO	X																25-14	30	$5.355.000	$856.800	EPS005	30	$5.355.000	$214.200	CCF40	30	$5.355.000	$214.200	14-4	30	$5.355.000	6,960%	$372.800	30	$0	$0	Si	$1.658.000
Total Afiliados(26)																						$37.611.738	$6.018.900			$39.035.238	$1.562.400			$39.035.238	$1.562.400			$39.035.238		$2.059.200		$0	$0		$11.202.900

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901050177	7	LERMA CONSTRUCCIONES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	0001	CRA 5 No. 8-03 SANTA ANA	BUCARAMANGA-SANTANDER	6583112	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1000000977	9481788138	E	2025/02/19	2025/02/18	BANCO DE BOGOTA	0	$8,298,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: 0001 (36 Afiliados)						$26,524,550	$4,245,900			$28,991,950	$1,160,900			$27,188,850	$1,088,700			$28,991,950	$1,802,800		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC	37555201	FLOREZ EDHIT	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: OBRAS CIVILES LERMA (35 Afiliados)						$25,101,050	$4,018,100			$27,568,450	$1,103,900			$25,765,350	$1,031,700			$27,568,450	$1,795,300		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (35 Afiliados)						$25,101,050	$4,018,100			$27,568,450	$1,103,900			$25,765,350	$1,031,700			$27,568,450	$1,795,300		$0	$0
2	CC	1007369791	AMARIZ FRANKLIN	230301	24	$1,138,800	$182,300	EPS037	24	$1,138,800	$45,600	CCF39	24	$1,138,800	$45,600	14-4	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
3	CC	1098786700	ARAQUE JESUS	230301	7	$332,150	$53,200	EPS002	7	$332,150	$13,300	CCF39	7	$332,150	$13,300	14-4	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0
4	CC	91248488	BARRERA MANUEL	25-14	24	$1,138,800	$182,300	EPS002	24	$1,138,800	$45,600	CCF39	24	$1,138,800	$45,600	14-4	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
5	PT	5873350	ECHEVERRIA DEIBYS		0	$0	$0	ESSC24	18	$854,100	$34,200	CCF39	18	$854,100	$34,200	14-4	18	$854,100	$59,500	18	$0	$0
6	CC	1003091700	GARCIA BRAYAN	230301	24	$1,138,800	$182,300	EPS037	24	$1,138,800	$45,600	CCF39	24	$1,138,800	$45,600	14-4	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
7	CC	1095802356	GARCIA FLORENTINO	230301	15	$711,750	$113,900	EPS037	15	$711,750	$28,500	CCF39	15	$711,750	$28,500	14-4	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0
8	CC	1007514004	GARCIA RAUL	230301	16	$759,200	$121,500	EPS037	16	$759,200	$30,400	CCF39	16	$759,200	$30,400	14-4	16	$759,200	$52,900	16	$0	$0
9	CC	1007514004	GARCIA RAUL	230301	8	$379,600	$60,800	EPS037	8	$379,600	$15,200	CCF39	0	$0	$0	14-4	8	$379,600	$0	0	$0	$0
10	CC	1005330486	GOMEZ JUNIOR	25-14	3	$142,350	$22,800	EPS002	3	$142,350	$5,700	CCF39	3	$142,350	$5,700	14-4	3	$142,350	$10,000	3	$0	$0
11	CC	91497697	JAIMES EDWING	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
12	CC	1005372355	JAIMES MICHEL	230301	24	$1,138,800	$182,300	ESSC24	24	$1,138,800	$45,600	CCF39	24	$1,138,800	$45,600	14-4	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
13	CC	1095948688	LOPEZ JORGE	230301	1	$47,450	$7,600	EPS046	1	$47,450	$1,900	CCF39	1	$47,450	$1,900	14-4	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
14	CC	1005448149	MALDONADO CRISTIAN	230301	7	$332,150	$53,200	ESSC24	7	$332,150	$13,300	CCF39	7	$332,150	$13,300	14-4	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0
15	CC	1003091037	MARIN FABIO	230201	24	$1,138,800	$182,300	ESSC62	24	$1,138,800	$45,600	CCF39	24	$1,138,800	$45,600	14-4	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
16	CC	1003091035	MARIN HENRY	230301	24	$1,138,800	$182,300	EPS037	24	$1,138,800	$45,600	CCF39	24	$1,138,800	$45,600	14-4	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
17	CC	1002320001	MENDOZA JONATAN	230201	24	$1,138,800	$182,300	EPS002	24	$1,138,800	$45,600	CCF39	24	$1,138,800	$45,600	14-4	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
18	PT	5062038	MONOCHE BRIAN	230301	2	$94,900	$15,200	ESSC24	2	$94,900	$3,800	CCF39	2	$94,900	$3,800	14-4	2	$94,900	$6,700	2	$0	$0
19	CC	1007570335	OSPINO DIEGO	230301	24	$1,138,800	$182,300	EPS002	24	$1,138,800	$45,600	CCF39	24	$1,138,800	$45,600	14-4	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
20	CC	1095952129	PAEZ EDINSON	230301	1	$47,450	$7,600	EPS041	1	$47,450	$1,900	CCF39	1	$47,450	$1,900	14-4	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
21	CC	12502397	QUINTERO URIEL	230201	24	$1,138,800	$182,300	EPS037	24	$1,138,800	$45,600	CCF39	24	$1,138,800	$45,600	14-4	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
22	CC	85202937	RAMIREZ NERIS	230301	24	$1,138,800	$182,300	EPS037	24	$1,138,800	$45,600	CCF39	24	$1,138,800	$45,600	14-4	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
23	CC	91298926	REY LUIS	230201	24	$1,138,800	$182,300	EPS002	24	$1,138,800	$45,600	CCF39	24	$1,138,800	$45,600	14-4	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
24	CC	1005287970	RINCON ANDRES	230201	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF39	3	$142,350	$5,700	14-4	3	$142,350	$10,000	3	$0	$0
25	CC	1095828352	RINCON ENDER	230301	24	$1,138,800	$182,300	EPS002	24	$1,138,800	$45,600	CCF39	24	$1,138,800	$45,600	14-4	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
26	CC	1098692531	RINCON JOSE	230201	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF39	2	$94,900	$3,800	14-4	2	$94,900	$6,700	2	$0	$0
27	CC	91495988	RINCON LUIS	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
28	CC	1234338042	RINCON MAYRA	230301	24	$1,138,800	$182,300	EPS010	24	$1,138,800	$45,600	CCF39	24	$1,138,800	$45,600	14-4	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
29	CC	1097910397	ROJAS EDWARD	25-14	24	$1,138,800	$182,300	EPS037	24	$1,138,800	$45,600	CCF39	24	$1,138,800	$45,600	14-4	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
30	PT	5472000	ROJAS KEIVER		0	$0	$0	ESSC24	7	$332,150	$13,300	CCF39	7	$332,150	$13,300	14-4	7	$332,150	$23,200	7	$0	$0
31	PT	5688268	SALAZAR ENDERBI		0	$0	$0	EPS041	3	$142,350	$5,700	CCF39	3	$142,350	$5,700	14-4	3	$142,350	$10,000	3	$0	$0
32	CC	91273794	SANCHEZ DAVID	230301	11	$521,950	$83,600	EPS046	11	$521,950	$20,900	CCF39	11	$521,950	$20,900	14-4	11	$521,950	$36,400	11	$0	$0
33	CC	5725284	TRUJILLO CARLOS		0	$0	$0	EPS046	24	$1,138,800	$45,600	CCF39	24	$1,138,800	$45,600	14-4	24	$1,138,800	$79,300	24	$0	$0
34	CC	1098751634	URIBE CARLOS	230301	2	$94,900	$15,200	ESSC24	2	$94,900	$3,800	CCF39	2	$94,900	$3,800	14-4	2	$94,900	$6,700	2	$0	$0
35	CC	1095839551	VALENCIA CARLOS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$0	0	$0	$0

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901768348	2	CONSTRUCCIONES VERA SANGUINO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 202 21 A 33	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6759660	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1256093325	9481528407	E	2025/02/12	2025/02/10	BANCO CAJA SOCIAL	0	$4,901,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (15 Afiliados)																							$16,709,500	$2,674,500			$16,709,500	$669,000			$15,184,248	$607,900			$16,709,500		$949,800		$0	$0		$4,901,200
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)																							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300
1	CC	1095804910	SIERRA SANTOS YURLEY							X											25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS046	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (14 Afiliados)																							$15,286,000	$2,446,700			$15,286,000	$612,000			$13,760,748	$550,900			$15,286,000		$942,300		$0	$0		$4,551,900
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (14 Afiliados)																							$15,286,000	$2,446,700			$15,286,000	$612,000			$13,760,748	$550,900			$15,286,000		$942,300		$0	$0		$4,551,900
2	PT	6406812	ABREU MATA RICHARD JOSE																	X	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$284,800
3	CC	91274086	CAMACHO SANTOS JOSE MANUEL	X	X															X	23030 1	11	$521,950	$83,600	EPS002	11	$521,950	$20,900	CCF40	11	$543,698	$21,800	14-4	11	$521,950	6.960%	$36,400	11	$0	$0	Si	$162,700
4	CC	1102387490	CHACON GALVIS OMAR ALEJANDRO	X																	23030 1	23	$1,091,350	$174,700	EPS002	23	$1,091,350	$43,700	CCF40	23	$1,091,350	$43,700	14-4	23	$1,091,350	6.960%	$76,000	23	$0	$0	Si	$338,100
5	CC	1005234391	DUARTE ORDOÑEZ DANIEL MARTIN	X																	23020 1	11	$521,950	$83,600	EPS005	11	$521,950	$20,900	CCF40	11	$521,950	$20,900	14-4	11	$521,950	6.960%	$36,400	11	$0	$0	Si	$161,800
6	CC	88258470	JACOME JACOME EZEQUIEL	X																	23030 1	23	$1,091,350	$174,700	EPS017	23	$1,091,350	$43,700	CCF40	23	$1,091,350	$43,700	14-4	23	$1,091,350	6.960%	$76,000	23	$0	$0	Si	$338,100
7	CC	91156019	LUNA ACOSTA JOSE ANTONIO	X																	23030 1	23	$1,091,350	$174,700	EPS002	23	$1,091,350	$43,700	CCF40	23	$1,091,350	$43,700	14-4	23	$1,091,350	6.960%	$76,000	23	$0	$0	Si	$338,100
8	CC	5747939	PARRA RIOS JUAN ANTONIO	X																	23030 1	18	$854,100	$136,700	EPS046	18	$854,100	$34,200	CCF40	18	$854,100	$34,200	14-4	18	$854,100	6.960%	$59,500	18	$0	$0	Si	$264,600
9	CC	91346298	PEDRAZA FIGUEROA LUIS ALVARO	X																	25-14	17	$806,650	$129,100	EPS005	17	$806,650	$32,300	CCF40	17	$806,650	$32,300	14-4	17	$806,650	6.960%	$56,200	17	$0	$0	Si	$249,900
10	CC	91350653	PEÑA VEGA CARLOS VICENTE	X																	23030 1	23	$1,091,350	$174,700	EPS010	23	$1,091,350	$43,700	CCF40	23	$1,091,350	$43,700	14-4	23	$1,091,350	6.960%	$76,000	23	$0	$0	Si	$338,100
11	CC	5691822	PRADA RINCON LUIS ALBERTO													X					23030 1	7	$332,150	$53,200	EPS037	7	$332,150	$13,300	CCF40	7	$332,150	$13,300	14-4	7	$332,150	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$79,800
12	CC	5691822	PRADA RINCON LUIS ALBERTO																		23030 1	23	$1,091,350	$174,700	EPS037	23	$1,091,350	$43,700	CCF40	23	$1,091,350	$43,700	14-4	23	$1,091,350	6.960%	$76,000	23	$0	$0	Si	$338,100
13	CC	1093738325	RIVERA GOMEZ BAUDILLO	X																	25-14	18	$854,100	$136,700	EPS002	18	$854,100	$34,200	CCF40	18	$854,100	$34,200	14-4	18	$854,100	6.960%	$59,500	18	$0	$0	Si	$264,600
14	CC	91184098	SANCHEZ REY RONAL	X																	23020 1	23	$1,091,350	$174,700	EPS041	23	$1,091,350	$43,700	CCF40	23	$1,091,350	$43,700	14-4	23	$1,091,350	6.960%	$76,000	23	$0	$0	Si	$338,100
15	CC	1096064931	VERA SIERRA JORGE GIOVANNY																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS046	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$435,900
16	CC	1098608113	VERA SANGUINO JORGE ALBERTO																		23020 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS046	30	$2,000,000	$80,000	CCF40	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
Total			**Afiliados(15)**																				$16,709,500	$2,674,500			$16,709,500	$669,000			$15,184,248	$607,900			$16,709,500		$949,800		$0	$0		$4,901,200

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	80089079
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN CARLOS RINCON LOZANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CARRERA 19 B NO 64 - 24	TELÉFONO:	6223036
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7956774505**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES febrero AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/02/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1241567929

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 80089079	RINCON LOZANO JUAN CARLOS	INDEPEND		$ 1.423.500				NO																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 405.800**

Planilla Pagada

PLANILLA NRO. 32641217 Tipo I 2025 02

ASOPAGOS

DATOS GENERALES

TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR
CC	1101597782	OSCAR FABRICIO MEDINA REATIGA	ÚNICO	0	0	2025-02	2025-02	32641217		PRIVADA	I	14-23	86

DIRECCIÓN	CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO	ACTIVIDAD ECONÓMICA	VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
MANZA O CASA 11 BARRIO SANTELMO 1	FLORIDABLANCA	276	SANTANDER	68	3108600613	0	OSMED93@GMAIL.COM	7490	0	1	2025-02-27	2025-03-20

TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT INC	VALOR INC	# AUT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
EPS037	900156264	178000	0	0	0	0	0	178000	0	0	0	178000	0	0	0	0	178000	1

TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AF	COT VOL AP	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
231001	800227940	227800	0	0	0	0	0	0	227800	1

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES

CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# AUT INC	VALOR INC	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
SINARL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL APORTES A ESAP

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A MINISTERIO

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
SINCCF	0	0	0	0	0	1

TOTAL APORTES A ICBF Y SENA

ICBF

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	0

SENA

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	0

NÚMERO ADMINISTRADORAS	
PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	0
CAJAS COMPENSACIÓN	0

TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA	
PENSIONES	227800
SALUD	178000
RIESGOS LABORALES	0
CAJAS COMPENSACIÓN	0
SENA	0
ICBF	0
ESAP	0
MINISTERIO	0
GRAN TOTAL	405800

PAGADO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1100958383	LUISA FERNANDA SANCHEZ CASTRO	Carrera 29 No. 30-25	6975300	ing.luisafernanda10@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		SANTANDER	BUCARAMANGA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-02	I	24/02/2025	84411132	$413.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	7.500				7.500	0	0	7.500			75	7.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	7.500	7.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	413.300	413.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901881924	8	CONSORCIO CONSERVACION HIDRICA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO CONSERVACION HIDRICA	CR 39 51 31 AP 1903	BUCARAMANGA-SANTANDER	3012765665	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1320314061	9482065024	Y	2025/03/07	2025/03/07	BANCO DE OCCIDENTE	0	$297,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1101597782	MEDINA REATIGA OSCAR FABRICIO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
2	CC	80089079	RINCON LOZANO JUAN CARLOS																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
3	CC	1100958383	SANCHEZ CASTRO LUISA FERNANDA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
Total	**Afiliados(3)**																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,270,500	$297,300		$0	$0		$297,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901881924	8	CONSORCIO CONSERVACION HIDRICA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO CONSERVACION HIDRICA	CR 39 51 31 AP 1903	BUCARAMANGA-SANTANDER	3012765665	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1320297530	9482931827	E	2025/03/07	2025/03/07	BANCO DE OCCIDENTE	0	$509,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1064121767	BARRETO CASTRILLO EVELYN DAYANA									X									230301	30	$1,485,391	$237,700	EPS002	30	$1,485,391	$59,500	CCF40	30	$1,485,391	$59,500	14-4	30	$1,485,391	$103,400	30	$0	$0	Si	$460,100
2	CC	1101200012	GUERRERO SAAVEDRA GERALDINE ANDREA		X																25-14	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF40	3	$258,461	$10,400	14-4	3	$142,350	$10,000	3	$0	$0	Si	$48,900
Total	**Afiliados(2)**																						$1,627,741	$260,500			$1,627,741	$65,200			$1,743,852	$69,900			$1,627,741	$113,400		$0	$0		$509,000

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-04-10, 02:10:13 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1070942395

Periodo Cotización 202502 **Periodo Servicio** 202503

PAGADA 2025-03-07 13:58:22.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS				
Documento	NI 901173035	**Dirección**	CR 39 #51 - 31 APT 1503		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6914305		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	9
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal	GOMEZ RONCANCIO EDGAR LEONARDO	**Identificación**	CC 72254372		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 72254372		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					GOMEZ RONCANCIO EDGAR LEONARDO	68001000 - 68		SANTANDER

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
						X									0	30	30	30	30			F	$ 6.552.000	231001		16 %	$ 6.552.000	$ 1.048.400	$ 32.800	$ 32.800	EPS010		4 %	$ 6.552.000	$ 262.100	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 6.552.000	$ 456.100	CCF40	4 %	$ 6.552.000	$ 262.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFENALCO SANTANDER	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 1.048.400	$ 32.800	$ 32.800	$ 262.100	$ 456.100	$ 262.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.094.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-04-10, 02:08:41 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1070942395

Periodo Cotización 202502 **Periodo Servicio** 202503

PAGADA 2025-03-07 13:58:22.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS				
Documento	NI 901173035	**Dirección**	CR 39 #51 - 31 APT 1503		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6914305		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	9
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal	GOMEZ RONCANCIO EDGAR LEONARDO	**Identificación**	CC 72254372		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1098704436		**Residente**		**Exonerado**	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					DONADO ARIAS CLARA MELISSA	68001000 - 68		SANTANDER

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 1.423.500	230201		16 %	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 1.423.500	$ 99.100	CCF40	4 %	$ 1.423.500	$ 57.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFENALCO SANTANDER	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 99.100	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-04-10, 02:15:17 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1070942395

Periodo Cotización 202502 **Periodo Servicio** 202503

PAGADA 2025-03-07 13:58:22.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS				
Documento	NI 901173035	**Dirección**	CR 39 #51 - 31 APT 1503		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6914305		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	9
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal	GOMEZ RONCANCIO EDGAR LEONARDO	**Identificación**	CC 72254372		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1098781831		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					TARAZONA MANTILLA DENNIS MELISSA	68001000 - 68		SANTANDER

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				**Código AFP**	**Código Tras. AFP**	**Tarifa AFP**	**IBC**	**Total Aporte AFP**	**Total Aporte FSP**	**Total Aporte FSPS**	**Código EPS**	**Código Tras. EPS**	**Tarifa EPS**	**IBC EPS**	**Aporte Salud**	**Aporte UPC**	**Código ARL**	**Clase Riesgo**	**Tarifa ARL**	**IBC ARL**	**Aporte Riesgos**	**Código CCF**	**Tarifa CCF**	**IBC CCF**	**Aporte Caja**	**Tarifa SENA**	**Aporte SENA**	**Tarifa ICBF**	**Aporte ICBF**
						X		X							0	30	30	30	30			F	$ 2.484.000	230301		16 %	$ 2.727.000	$ 436.400	$ 0	$ 0	EPS046		4 %	$ 2.727.000	$ 109.100	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 2.727.000	$ 189.800	CCF40	4 %	$ 2.727.000	$ 109.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD MIA EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFENALCO SANTANDER	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 436.400	$ 0	$ 0	$ 109.100	$ 189.800	$ 109.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 844.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900847742	7	INFRACORP SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 74A 22 31	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7920530	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1320547394	9482938248	E	2025/03/11	2025/03/07	BANCO DE OCCIDENTE	0	$18.488.700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (31 Afiliados)																						**$60.987.744**	**$9.839.000**			**$62.411.244**	**$2.497.400**			**$62.568.800**	**$2.503.700**			**$62.411.244**		**$3.648.600**		**$0**	**$0**		**$18.488.700**
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (5 Afiliados)																						**$9.398.144**	**$1.503.800**			**$10.821.644**	**$433.000**			**$10.900.811**	**$436.200**			**$10.821.644**		**$56.700**		**$0**	**$0**		**$2.429.700**
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (5 Afiliados)																						**$9.398.144**	**$1.503.800**			**$10.821.644**	**$433.000**			**$10.900.811**	**$436.200**			**$10.821.644**		**$56.700**		**$0**	**$0**		**$2.429.700**
20	CC	1098682052	PADIERNA CASTIBLANCO							X										25-14	30	$8.000.000	$1.360.000	EPS005	30	$8.000.000	$320.000	CCF40	30	$8.000.000	$320.000	14-4	30	$8.000.000	6,960%	$556.800	30	$0	$0	Si	$2.556.800
Total		Afiliados(31)																				$60.987.744	$9.839.000			$62.411.244	$2.497.400			$62.568.800	$2.503.700			$62.411.244		$3.648.600		$0	$0		$18.488.700

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901050177	7	LERMA CONSTRUCCIONES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	0001	CRA 5 No. 8-03 SANTA ANA	BUCARAMANGA-SANTANDER	6583112	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1349402262	9483293477	E	2025/03/19	2025/03/20	BANCOLOMBIA	1	$15,842,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: 0001 (46 Afiliados)						$50,534,250	$8,087,100			$53,381,250	$2,137,500			$51,957,750	$2,080,500			$53,381,250	$3,526,400		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC	37555201	FLOREZ EDHIT	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: OBRAS CIVILES LERMA (45 Afiliados)						$49,110,750	$7,859,300			$51,957,750	$2,080,500			$50,534,250	$2,023,500			$51,957,750	$3,518,900		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (45 Afiliados)						$49,110,750	$7,859,300			$51,957,750	$2,080,500			$50,534,250	$2,023,500			$51,957,750	$3,518,900		$0	$0
2	CC	1007369791	AMARIZ FRANKLIN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
3	CC	13741744	ANAYA ALVARO	25-14	19	$901,550	$144,300	EPS041	19	$901,550	$36,100	CCF39	19	$901,550	$36,100	14-4	19	$901,550	$62,800	19	$0	$0
4	CC	91248488	BARRERA MANUEL	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
5	CC	1065577118	CALDERON HENRY	231001	27	$1,281,150	$205,000	ESSC24	27	$1,281,150	$51,300	CCF39	27	$1,281,150	$51,300	14-4	27	$1,281,150	$89,200	27	$0	$0
6	CC	88174827	CORREDOR JORGE	230301	1	$47,450	$7,600	EPS041	1	$47,450	$1,900	CCF39	1	$47,450	$1,900	14-4	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
7	CC	91256861	DIAZ HENRY	230201	4	$189,800	$30,400	EPS002	4	$189,800	$7,600	CCF39	4	$189,800	$7,600	14-4	4	$189,800	$13,300	4	$0	$0
8	PT	5873350	ECHEVERRIA DEIBYS		0	$0	$0	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
9	CC	91220106	FLOREZ JAIRO	231001	18	$854,100	$136,700	EPS002	18	$854,100	$34,200	CCF39	18	$854,100	$34,200	14-4	18	$854,100	$59,500	18	$0	$0
10	CC	1003091700	GARCIA BRAYAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
11	CC	1095802356	GARCIA FLORENTINO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
12	CC	1007514004	GARCIA RAUL	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
13	CC	91155552	GOMEZ REYNALDO	230201	5	$237,250	$38,000	EPS002	5	$237,250	$9,500	CCF39	5	$237,250	$9,500	14-4	5	$237,250	$16,600	5	$0	$0
14	CC	91497697	JAIMES EDWING	25-14	22	$1,043,900	$167,100	EPS017	22	$1,043,900	$41,800	CCF39	22	$1,043,900	$41,800	14-4	22	$1,043,900	$72,700	22	$0	$0
15	CC	1005372355	JAIMES MICHEL	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
16	CC	1062874659	LEAL EDINSON	230301	19	$901,550	$144,300	CCFC55	19	$901,550	$36,100	CCF39	19	$901,550	$36,100	14-4	19	$901,550	$62,800	19	$0	$0
17	CC	1098641372	LEMUS EDINSON	230301	28	$1,328,600	$212,600	EPS017	28	$1,328,600	$53,200	CCF39	28	$1,328,600	$53,200	14-4	28	$1,328,600	$92,500	28	$0	$0
18	CC	1003091037	MARIN FABIO	230201	30	$1,423,500	$227,800	ESSC62	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
19	CC	1003091035	MARIN HENRY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
20	CC	91181080	MEJIA CARLOS	230301	26	$1,233,700	$197,400	EPS037	26	$1,233,700	$49,400	CCF39	26	$1,233,700	$49,400	14-4	26	$1,233,700	$85,900	26	$0	$0
21	CC	1098818942	MEJIA JOHAN	230301	26	$1,233,700	$197,400	ESSC24	26	$1,233,700	$49,400	CCF39	26	$1,233,700	$49,400	14-4	26	$1,233,700	$85,900	26	$0	$0
22	CC	15451774	MELGAREJO LUIS	230301	18	$854,100	$136,700	EPS037	18	$854,100	$34,200	CCF39	18	$854,100	$34,200	14-4	18	$854,100	$59,500	18	$0	$0
23	CC	1002320001	MENDOZA JONATAN	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
24	PT	5062038	MONOCHE BRIAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
25	CC	1098764174	OSORIO SERGIO	231001	4	$189,800	$30,400	EPS002	4	$189,800	$7,600	CCF39	4	$189,800	$7,600	14-4	4	$189,800	$13,300	4	$0	$0
26	CC	1007570335	OSPINO DIEGO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
27	CC	13873459	QUINTERO JUAN	230301	14	$664,300	$106,300	EPS037	14	$664,300	$26,600	CCF39	14	$664,300	$26,600	14-4	14	$664,300	$46,300	14	$0	$0
28	CC	12502397	QUINTERO URIEL	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
29	CC	1007369792	RAMIREZ ALEXIS	230301	19	$901,550	$144,300	EPS037	19	$901,550	$36,100	CCF39	19	$901,550	$36,100	14-4	19	$901,550	$62,800	19	$0	$0
30	CC	85202937	RAMIREZ NERIS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
31	CC	91298926	REY LUIS	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
32	CC	1005287970	RINCON ANDRES	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
33	CC	1095828352	RINCON ENDER	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
34	CC	1098692531	RINCON JOSE	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
35	CC	91495988	RINCON LUIS	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
36	CC	1234338042	RINCON MAYRA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.		Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
37	CC	1097910397	ROJAS EDWARD	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
38	CC	91273794	SANCHEZ DAVID	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS046	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
39	PT	1058487	SUAREZ JORGE	230201	17	$806,650	$129,100	EPS002	17	$806,650	$32,300	CCF39	17	$806,650	$32,300	14-4	17	$806,650	$56,200	17	$0	$0
40	CC	13538935	SUAREZ PEDRO	230201	19	$901,550	$144,300	EPS002	19	$901,550	$36,100	CCF39	19	$901,550	$36,100	14-4	19	$901,550	$62,800	19	$0	$0
41	CC	91183717	TOLOZA DEYBI	230301	1	$47,450	$7,600	EPS010	1	$47,450	$1,900	CCF39	1	$47,450	$1,900	14-4	1	$47,450	$3,400	1	$0	$0
42	CC	5725284	TRUJILLO CARLOS		0	$0	$0	EPS046	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
43	CC	1098751634	URIBE CARLOS	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
44	CC	1095839551	VALENCIA CARLOS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$0	0	$0	$0
45	CC	1005149383	VALENCIA JHON	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF39	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
46	CC	1098650467	VANOY JAISON	230301	28	$1,328,600	$212,600	EPS005	28	$1,328,600	$53,200	CCF39	28	$1,328,600	$53,200	14-4	28	$1,328,600	$92,500	28	$0	$0
Total		**Afiliados(46)**				**$50,534,250**	**$8,087,100**			**$53,381,250**	**$2,137,500**			**$51,957,750**	**$2,080,500**			**$53,381,250**	**$3,526,400**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901768348	2	CONSTRUCCIONES VERA SANGUINO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 202 21 A 33	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6759660	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1320467591	9482935996	E	2025/03/12	2025/03/07	BANCO CAJA SOCIAL	0	$8,486,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (24 Afiliados)																							$27,717,900	$4,435,900			$27,717,900	$1,109,800			$27,777,213	$1,112,200			$27,717,900		$1,828,600		$0	$0		$8,486,500
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)																							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300
1	CC	1095804910	SIERRA SANTOS YURLEY																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS046	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (23 Afiliados)																							$26,294,400	$4,208,100			$26,294,400	$1,052,800			$26,353,713	$1,055,200			$26,294,400		$1,821,100		$0	$0		$8,137,200
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (23 Afiliados)																							$26,294,400	$4,208,100			$26,294,400	$1,052,800			$26,353,713	$1,055,200			$26,294,400		$1,821,100		$0	$0		$8,137,200
2	PT	6406812	ABREU MATA RICHARD JOSE																	X	25-14	3	$142,350	$22,800	EPS037	3	$142,350	$5,700	CCF40	0	$0	$0	14-4	3	$142,350	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$28,500
3	PT	6406812	ABREU MATA RICHARD JOSE		X															X	25-14	27	$1,281,150	$205,000	EPS037	27	$1,281,150	$51,300	CCF40	27	$1,468,973	$58,800	14-4	27	$1,281,150	6.960%	$89,200	27	$0	$0	Si	$404,300
4	CC	91350570	CHACON MANTILLA FABIO	X																	23030 1	21	$996,450	$159,500	EPS041	21	$996,450	$39,900	CCF40	21	$996,450	$39,900	14-4	21	$996,450	6.960%	$69,400	21	$0	$0	Si	$308,700
5	CC	1102387490	CHACON GALVIS OMAR ALEJANDRO																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
6	CC	71976713	COA GEOVER	X																	25-14	14	$664,300	$106,300	EPS005	14	$664,300	$26,600	CCF40	14	$664,300	$26,600	14-4	14	$664,300	6.960%	$46,300	14	$0	$0	Si	$205,800
7	CC	1005234391	DUARTE ORDOÑEZ DANIEL MARTIN																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
8	CC	1005370753	INFANTE ARDILA LAUREN ANDREA ZULEY	X																	23030 1	21	$996,450	$159,500	EPS037	21	$996,450	$39,900	CCF40	21	$996,450	$39,900	14-4	21	$996,450	6.960%	$69,400	21	$0	$0	Si	$308,700
9	CC	88258470	JACOME JACOME EZEQUIEL																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
10	CC	1005540877	LOZANO ALMEYDA JESUS MANUEL	X																	25-14	21	$996,450	$159,500	EPS046	21	$996,450	$39,900	CCF40	21	$996,450	$39,900	14-4	21	$996,450	6.960%	$69,400	21	$0	$0	Si	$308,700
11	CC	91156019	LUNA ACOSTA JOSE ANTONIO																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
12	CC	5697988	MARTINEZ SILVA MARIO	X																	23030 1	6	$284,700	$45,600	EPS017	6	$284,700	$11,400	CCF40	6	$284,700	$11,400	14-4	6	$284,700	6.960%	$19,900	6	$0	$0	Si	$88,300
13	CC	91275501	MORA JOSE WILLIAN	X																	23020 1	7	$332,150	$53,200	EPS037	7	$332,150	$13,300	CCF40	7	$332,150	$13,300	14-4	7	$332,150	6.960%	$23,200	7	$0	$0	Si	$103,000
14	CC	91133913	NIEVES NELSON	X																	25-14	14	$664,300	$106,300	EPS037	14	$664,300	$26,600	CCF40	14	$664,300	$26,600	14-4	14	$664,300	6.960%	$46,300	14	$0	$0	Si	$205,800
15	CC	5747939	PARRA RIOS JUAN ANTONIO																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS046	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
16	CC	91346298	PEDRAZA FIGUEROA LUIS ALVARO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
17	CC	91350653	PEÑA VEGA CARLOS VICENTE																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
18	CC	5691822	PRADA RINCON LUIS ALBERTO																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
19	CC	1093738325	RIVERA GOMEZ BAUDILLO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
20	CC	91184098	SANCHEZ REY RONAL																		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
21	CC	91297485	SANGUINO MORENO JOSE GREGORIO	X																	23020 1	21	$996,450	$159,500	EPS002	21	$996,450	$39,900	CCF40	21	$996,450	$39,900	14-4	21	$996,450	6.960%	$69,400	21	$0	$0	Si	$308,700
22	CC	91342187	SANTIESTEBAN GRIMALDOS RUPERTO	X																	23020 1	20	$949,000	$151,900	EPS017	20	$949,000	$38,000	CCF40	20	$949,000	$38,000	14-4	20	$949,000	6.960%	$66,100	20	$0	$0	Si	$294,000
23	CC	1095913930	SARMIENTO CASTRO JHON ERIK	X	X															X	23030 1	7	$332,150	$53,200	EPS037	7	$332,150	$13,300	CCF40	7	$345,990	$13,900	14-4	7	$332,150	6.960%	$23,200	7	$0	$0	Si	$103,600
24	CC	1096064931	VERA SIERRA JORGE GIOVANNY																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS046	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
25	CC	1098608113	VERA SANGUINO JORGE ALBERTO																		23020 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS046	30	$2,000,000	$80,000	CCF40	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
Total			**Afiliados(24)**																				$27,717,900	$4,435,900			$27,717,900	$1,109,800			$27,777,213	$1,112,200			$27,717,900		$1,828,600		$0	$0		$8,486,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901881924	8	CONSORCIO CONSERVACION HIDRICA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO CONSERVACION HIDRICA	CR 39 51 31 AP 1903	BUCARAMANGA-SANTANDER	3012765665	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1396613416	9484422672	E	2025/04/07	2025/04/08	BANCO DE OCCIDENTE	1	$491,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1064121767	BARRETO CASTRILLO EVELYN DAYANA									X									230301	30	$1,585,965	$253,800	EPS002	30	$1,585,965	$63,500	CCF40	30	$1,585,965	$63,500	14-4	30	$1,585,965	$110,400	30	$0	$0	Si	$491,200
Total	**Afiliados(1)**																						$1,585,965	$253,800			$1,585,965	$63,500			$1,585,965	$63,500			$1,585,965	$110,400		$0	$0		$491,200

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	80089079
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JUAN CARLOS RINCON LOZANO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CARRERA 19 B NO 64 - 24	TELÉFONO:	6223036
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7958923605**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/03/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1343151335

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																										PENSIÓN									SALUD							ARP													
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 80089079	RINCON LOZANO JUAN CARLOS	INDEPEND		$ 1.423.500				NO																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000			$ 0		$ 0		$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 405.800

Planilla Pagada

PLANILLA NRO. 32937311 Tipo I 2025 03

ASOPAGOS

DATOS GENERALES

TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR
CC	1101597782	OSCAR FABRICIO MEDINA REATIGA	ÚNICO	0	0	2025-03	2025-03	32937311		PRIVADA	I	14-23	86

DIRECCIÓN	CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO	ACTIVIDAD ECONÓMICA	VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
MANZA O CASA 11 BARRIO SANTELMO 1	FLORIDABLANCA	276	SANTANDER	68	3108600613	0	OSMED93@GMAIL.COM	7490	0	1	2025-03-26	2025-04-22

TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT INC	VALOR INC	# AUT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
EPS037	900156264	178000	0	0	0	0	0	178000	0	0	0	178000	0	0	0	0	178000	1

TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AF	COT VOL AP	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
231001	800227940	227800	0	0	0	0	0	0	227800	1

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES

CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# AUT INC	VALOR INC	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
SINARL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTAL APORTES A ESAP

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A MINISTERIO

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
SINCCF	0	0	0	0	0	1

TOTAL APORTES A ICBF Y SENA

ICBF

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	0

SENA

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	0

NÚMERO ADMINISTRADORAS	
PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	0
CAJAS COMPENSACIÓN	0

TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA	
PENSIONES	227800
SALUD	178000
RIESGOS LABORALES	0
CAJAS COMPENSACIÓN	0
SENA	0
ICBF	0
ESAP	0
MINISTERIO	0
GRAN TOTAL	405800

PAGADO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1100958383	LUISA FERNANDA SANCHEZ CASTRO	Carrera 29 No. 30-25	6975300	ing.luisafernanda10@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		SANTANDER	BUCARAMANGA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-03	I	25/03/2025	85221711	$580.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	250.000	0		0		0	0	0	0	250.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	10.500				10.500	0	0	10.500			105	10.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	250.000	250.000
Pensión	1	320.000	320.000
Riesgos Laborales	1	10.500	10.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	580.500	580.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901881924	8	CONSORCIO CONSERVACION HIDRICA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO CONSERVACION HIDRICA	CR 39 51 31 AP 1903	BUCARAMANGA-SANTANDER	3012765665	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1396620999	9484422957	Y	2025/04/07	2025/04/08	BANCO DE OCCIDENTE	1	$297,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1101597782	MEDINA REATIGA OSCAR FABRICIO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
2	CC	80089079	RINCON LOZANO JUAN CARLOS																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
3	CC	1100958383	SANCHEZ CASTRO LUISA FERNANDA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
Total	**Afiliados(3)**																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,270,500	$297,300		$0	$0		$297,300

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-04-10, 02:10:50 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1071594528

Periodo Cotización 202503 **Periodo Servicio** 202504

PAGADA 2025-04-07 15:23:25.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS				
Documento	NI 901173035	**Dirección**	CR 39 #51 - 31 APT 1503		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6914305		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	43
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal	GOMEZ RONCANCIO EDGAR LEONARDO	**Identificación**	CC 72254372		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 72254372		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					GOMEZ RONCANCIO EDGAR LEONARDO	68001000 - 68		SANTANDER

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30			F	$ 6.552.000	231001		16 %	$ 6.552.000	$ 1.048.400	$ 32.800	$ 32.800	EPS010		4 %	$ 6.552.000	$ 262.100	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 6.552.000	$ 456.100	CCF40	4 %	$ 6.552.000	$ 262.100	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFENALCO SANTANDER	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 1.048.400	$ 32.800	$ 32.800	$ 262.100	$ 456.100	$ 262.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.094.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-04-10, 02:09:31 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1071594528

Periodo Cotización 202503 **Periodo Servicio** 202504

PAGADA 2025-04-07 15:23:25.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS				
Documento	NI 901173035	**Dirección**	CR 39 #51 - 31 APT 1503		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6914305		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	43
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal	GOMEZ RONCANCIO EDGAR LEONARDO	**Identificación**	CC 72254372		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1098704436		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					DONADO ARIAS CLARA MELISSA	68001000 - 68		SANTANDER

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																							**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF						Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	30					F	$ 1.423.500	230201		16 %	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	EPS010		4 %	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 1.423.500	$ 99.100	CCF40	4 %	$ 1.423.500	$ 57.000	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFENALCO SANTANDER	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 99.100	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-04-10, 02:16:03 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 1071594528

Periodo Cotización 202503 **Periodo Servicio** 202504

PAGADA 2025-04-07 15:23:25.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUCCIONES CONAINCO SAS				
Documento	NI 901173035	**Dirección**	CR 39 #51 - 31 APT 1503		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6914305		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	43
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal	GOMEZ RONCANCIO EDGAR LEONARDO	**Identificación**	CC 72254372		

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1098781831		Residente		Exonerado	S	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	01	00					TARAZONA MANTILLA DENNIS MELISSA	68001000 - 68		SANTANDER

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					**Extranjero**	**Tipo salario**	**Salario**	**Pensión**							**Salud**						**Riesgos**					**Caja**				**Parafiscales**			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				**Código AFP**	**Código Tras. AFP**	**Tarifa AFP**	**IBC**	**Total Aporte AFP**	**Total Aporte FSP**	**Total Aporte FSPS**	**Código EPS**	**Código Tras. EPS**	**Tarifa EPS**	**IBC EPS**	**Aporte Salud**	**Aporte UPC**	**Código ARL**	**Clase Riesgo**	**Tarifa ARL**	**IBC ARL**	**Aporte Riesgos**	**Código CCF**	**Tarifa CCF**	**IBC CCF**	**Aporte Caja**	**Tarifa SENA**	**Aporte SENA**	**Tarifa ICBF**	**Aporte ICBF**
								X							0	30	30	30	30			F	$ 2.484.000	230301		16 %	$ 2.821.500	$ 451.500	$ 0	$ 0	EPS046		4 %	$ 2.821.500	$ 112.900	$ 0	14-4	5	6,960 %	$ 2.821.500	$ 196.400	CCF40	4 %	$ 2.821.500	$ 112.900	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD MIA EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	COMFENALCO SANTANDER	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 451.500	$ 0	$ 0	$ 112.900	$ 196.400	$ 112.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 873.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900847742	7	INFRACORP SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 74A 22 31	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7920530	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1388001467	9484204916	E	2025/04/09	2025/04/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$26.459.700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (48 Afiliados)																							**$86.973.483**	**$13.998.000**			**$88.396.983**	**$3.538.200**			**$87.607.417**	**$3.506.500**			**$88.396.983**		**$5.417.000**		**$0**	**$0**		**$26.459.700**
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (4 Afiliados)																							**$9.018.145**	**$1.443.100**			**$10.441.645**	**$417.900**			**$10.441.645**	**$417.900**			**$10.441.645**		**$49.100**		**$0**	**$0**		**$2.328.000**
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (4 Afiliados)																							**$9.018.145**	**$1.443.100**			**$10.441.645**	**$417.900**			**$10.441.645**	**$417.900**			**$10.441.645**		**$49.100**		**$0**	**$0**		**$2.328.000**
31	CC	1098682052	PADIERNA CASTIBLANCO																		25-14	30	$8.000.000	$1.360.000	EPS005	30	$8.000.000	$320.000	CCF40	30	$8.000.000	$320.000	14-4	30	$8.000.000	6,960%	$556.800	30	$0	$0	Si	$2.556.800
Total Afiliados(48)																							$86.973.483	$13.998.000			$88.396.983	$3.538.200			$87.607.417	$3.506.500			$88.396.983		$5.417.000		$0	$0		$26.459.700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901768348	2	CONSTRUCCIONES VERA SANGUINO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 202 21 A 33	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6759660	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1400026004	9484530071	E	2025/04/10	2025/04/09	BANCO CAJA SOCIAL	0	$10,454,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (24 Afiliados)																						$34,360,900	$5,498,800			$34,360,900	$1,370,100			$33,791,500	$1,347,300			$34,360,900		$2,237,800		$0	$0		$10,454,000
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300
Ciudad: FLORIDABLANCA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$349,300
1	CC	1095804910	SIERRA SANTOS YURLEY																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS046	30	$1,423,500	$57,000	CCF40	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$349,300

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO EL "MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEFINIDOS Y PRIORIZADOS POR LA CDMB"



ANEXO No. 2

SEGURIDAD SOCIAL – CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

LIQUIDACIÓN

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO EL "MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEFINIDOS Y PRIORIZADOS POR LA CDMB"



SEGURIDAD SOCIAL

NOVIEMBRE 2024

LIQUIDACIÓN

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-12, 03:31:42 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1067772447

Periodo Cotización: noviembre de 2024 **Periodo Servicio:** noviembre de 2024

PAGADO 11/12/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO		
Documento	CC1096949307	**Dirección**	CR 27 #36 - 14 OFICINA 309
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6844527
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1096949307	MIGUEL FERNANDO QUIROS GOMEZ	57	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.220.000	$ 515.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.220.000	$ 402.500	6,960	$ 3.220.000	$ 224.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.141.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.220.000	$ 3.220.000	$ 3.220.000	$ 0	$ 515.200	$ 402.500	$ 224.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.141.900	$ 6.500	$ 1.148.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-12, 03:28:08 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1068559470

Periodo Cotización: noviembre de 2024 **Periodo Servicio:** diciembre de 2024

PAGADO 11/12/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO CONSERVACION IM		
Documento	NI901881356	**Dirección**	AUT 25 #15 - 12
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6844527
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO	**Identificación**	CC 1096949307
Total Afiliados	2	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1098698064	MARIA ALEXANDRA SANCHEZ RODRIGUEZ	01	00	X																0	11	11	11	11	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.283.334	$ 205.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.283.334	$ 51.400	6,960	$ 1.283.334	$ 89.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.283.334	$ 51.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 397.600
CC 1102804163	PAULA EMILIA FAJARDO SILGADO	01	00	X																0	11	11	11	11	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.283.334	$ 205.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.283.334	$ 51.400	6,960	$ 1.283.334	$ 89.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.283.334	$ 51.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 397.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.566.668	$ 2.566.668	$ 2.566.668	$ 2.566.668	$ 410.800	$ 102.800	$ 178.800	$ 102.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 795.200	$ 0	$ 795.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: lunes, 16 de diciembre de 2024 09:23:42 AM

Período del informe: 202411

Pagada 11/12/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO		
Documento	CC1096949307	**Dirección**	CR 27 #36 - 14 OFICINA 309
Tipo de Empresa		**Teléfono**	6844527
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras							IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 33369716	CONTRERAS VARGAS DIANA EDITH	1067933514	11/12/2024	202411	202412	X																	30	30	30	30	230301	EPS002	14-11	CCF40	$1.300.000	$1.300.000	$1.300.000	$1.300.000	$208.000	$52.000	$90.500	$52.000	$0	$0	$0	$0	$402.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-12, 03:38:23 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1068529445

Periodo Cotización: noviembre de 2024 **Periodo Servicio:** noviembre de 2024

PAGADO 11/12/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ANGIE DANIELA MERCHAN PEREZ		
Documento	CC1098770897	**Dirección**	CR 27 #36 - 14 EDIFICIO SURA OFICINA 309
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6844527
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1098770897	ANGIE DANIELA MERCHAN PEREZ	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.480.000	$ 236.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.480.000	$ 185.000	0,522	$ 1.480.000	$ 7.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.480.000	$ 1.480.000	$ 1.480.000	$ 0	$ 236.800	$ 185.000	$ 7.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600	$ 0	$ 429.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-12, 03:28:06 PM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numéro Planilla:** 1068559866

Periodo Cotización: noviembre de 2024 **Periodo Servicio:** noviembre de 2024

PAGADO 11/12/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO CONSERVACION IM		
Documento	NI901881356	**Dirección**	AUT 25 #15 - 12
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6844527
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO	**Identificación**	CC 1096949307
Total Afiliados	3	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1096949307	MIGUEL FERNANDO QUIROS GOMEZ	59	00	R																0	0	0	11	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 476.667	$ 33.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.200
CC 1098770897	ANGIE DANIELA MERCHAN PEREZ	59	00	R																0	0	0	11	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 476.667	$ 33.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.200
CC 13543090	LUIS ANGEL PINTO ROJAS	59	00	R																0	0	0	11	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 476.667	$ 33.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 1.430.001	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.600	$ 0	$ 99.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO EL "MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEFINIDOS Y PRIORIZADOS POR LA CDMB"



SEGURIDAD SOCIAL

DICIEMBRE 2024

LIQUIDACIÓN

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-04-01, 01:27:14 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1068785435

Periodo Cotización: diciembre de 2024 **Periodo Servicio:** diciembre de 2024

PAGADO 16/01/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO		
Documento	CC1096949307	**Dirección**	CR 27 #36 - 14 OFICINA 309
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6844527
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1096949307	MIGUEL FERNANDO QUIROS GOMEZ	57	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.300.000	$ 162.500	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 461.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 208.000	$ 162.500	$ 90.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 461.000	$ 3.900	$ 464.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-04-01, 01:14:51 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1068784257

Periodo Cotización: diciembre de 2024 **Periodo Servicio:** enero de 2025

PAGADO 16/01/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO CONSERVACION IM		
Documento	NI901881356	**Dirección**	AUT 25 #15 - 12
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6844527
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO	**Identificación**	CC 1096949307
Total Afiliados	2	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1098698064	MARIA ALEXANDRA SANCHEZ RODRIGUEZ	01	00		X															0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.500.000	$ 140.000	6,960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.699.306	$ 148.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.091.600
CC 1102804163	PAULA EMILIA FAJARDO SILGADO	01	00		X															0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.500.000	$ 140.000	6,960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.699.306	$ 148.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.091.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 7.000.000	$ 7.000.000	$ 7.000.000	$ 7.398.612	$ 1.120.000	$ 280.000	$ 487.200	$ 296.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.183.200	$ 1.600	$ 2.184.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: martes, 01 de abril de 2025 01:31:25 PM

Período del informe: Desde el 01 de enero de 2025 hasta el 01 de abril de 2025

Pagada en horario 10/03/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO		
Documento	CC1096949307	**Dirección**	CR 27 #36 - 14 OFICINA 309
Tipo de Empresa		**Teléfono**	6844527
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades															Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 33369716	CONTRERAS VARGAS DIANA EDITH	1070970490	10/03/2025	202502	202503																		30	30	30	30	230301	EPS002	14-11	CCF40	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$227.800	$57.000	$99.100	$57.000	$0	$0	$0	$0	$440.900
CC 33369716	CONTRERAS VARGAS DIANA EDITH	1070285704	20/02/2025	202501	202502	X																	30	30	30	30	230301	EPS002	14-11	CCF40	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$227.800	$57.000	$99.100	$57.000	$0	$0	$0	$0	$440.900
CC 33369716	CONTRERAS VARGAS DIANA EDITH	1068785977	16/01/2025	202412	202501		X																30	30	30	30	230301	EPS002	14-11	CCF40	$1.300.000	$1.300.000	$1.300.000	$1.408.333	$208.000	$52.000	$90.500	$56.400	$0	$0	$0	$0	$406.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-04-01, 11:44:39 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1069466881

Periodo Cotización: diciembre de 2024 **Periodo Servicio:** diciembre de 2024

PAGADO 16/01/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ANGIE DANIELA MERCHAN PEREZ		
Documento	CC1098770897	**Dirección**	CR 27 #36 - 14 EDIFICIO SURA OFICINA 309
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6844527
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1098770897	ANGIE DANIELA MERCHAN PEREZ	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.480.000	$ 236.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.480.000	$ 185.000	0,522	$ 1.480.000	$ 7.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.480.000	$ 1.480.000	$ 1.480.000	$ 0	$ 236.800	$ 185.000	$ 7.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600	$ 0	$ 429.600

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-04-01, 01:14:53 PM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numéro Planilla:** 1068784258

Periodo Cotización: diciembre de 2024 **Periodo Servicio:** diciembre de 2024

PAGADO 16/01/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO CONSERVACION IM		
Documento	NI901881356	**Dirección**	AUT 25 #15 - 12
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6844527
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO	**Identificación**	CC 1096949307
Total Afiliados	3	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1096949307	MIGUEL FERNANDO QUIROS GOMEZ	59	00		R															0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 90.500
CC 1098770897	ANGIE DANIELA MERCHAN PEREZ	59	00		R															0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 90.500
CC 13543090	LUIS ANGEL PINTO ROJAS	59	00		R															0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 90.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 3.900.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 271.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 271.500	$ 200	$ 271.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13543090		PINTO ROJAS LUIS ANGEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6844527	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1118439127	9478486975	I	2025/01/23	2024/12/11	BANCO CAJA SOCIAL	0	$370,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	13543090	PINTO ROJAS LUIS ANGEL	230901	30	$1,300,000	$208,000	EPS001	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$208,000	$0	$0	$208,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				**1**	**$370,500**	**$0**	**$0**	**$370,500**

2024/12/12 03:43 PM

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO EL "MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEFINIDOS Y PRIORIZADOS POR LA CDMB"



SEGURIDAD SOCIAL

ENERO 2025

LIQUIDACIÓN

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-04-01, 01:27:11 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1070286376

Periodo Cotización: enero de 2025 **Periodo Servicio:** enero de 2025

PAGADO 28/02/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO		
Documento	CC1096949307	**Dirección**	CR 27 #36 - 14 OFICINA 309
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6844527
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1096949307	MIGUEL FERNANDO QUIROS GOMEZ	57	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 504.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 99.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 504.900	$ 8.200	$ 513.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-02-27, 03:58:39 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1070285548

Periodo Cotización: enero de 2025 **Periodo Servicio:** febrero de 2025

PAGADO 20/02/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO CONSERVACION IM		
Documento	NI901881356	**Dirección**	AUT 25 #15 - 12
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6844527
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO	**Identificación**	CC 1096949307
Total Afiliados	2	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1098698064	MARIA ALEXANDRA SANCHEZ RODRIGUEZ	01	00	X															0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.500.000	$ 140.000	6,960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600
CC 1102804163	PAULA EMILIA FAJARDO SILGADO	01	00	X															0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.500.000	$ 140.000	6,960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 7.000.000	$ 7.000.000	$ 7.000.000	$ 7.000.000	$ 1.120.000	$ 280.000	$ 487.200	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.167.200	$ 10.400	$ 2.177.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: martes, 01 de abril de 2025 01:31:25 PM

Período del informe: Desde el 01 de enero de 2025 hasta el 01 de abril de 2025

Pagada en horario 10/03/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO		
Documento	CC1096949307	**Dirección**	CR 27 #36 - 14 OFICINA 309
Tipo de Empresa		**Teléfono**	6844527
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 33369716	CONTRERAS VARGAS DIANA EDITH	1070970490	10/03/2025	202502	202503																		30	30	30	30	230301	EPS002	14-11	CCF40	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$227.800	$57.000	$99.100	$57.000	$0	$0	$0	$0	$440.900
CC 33369716	CONTRERAS VARGAS DIANA EDITH	1070285704	20/02/2025	202501	202502	X																	30	30	30	30	230301	EPS002	14-11	CCF40	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$227.800	$57.000	$99.100	$57.000	$0	$0	$0	$0	$440.900
CC 33369716	CONTRERAS VARGAS DIANA EDITH	1068785977	16/01/2025	202412	202501		X																30	30	30	30	230301	EPS002	14-11	CCF40	$1.300.000	$1.300.000	$1.300.000	$1.408.333	$208.000	$52.000	$90.500	$56.400	$0	$0	$0	$0	$406.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-04-01, 11:44:49 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1070286430

Periodo Cotización: enero de 2025 **Periodo Servicio:** enero de 2025

PAGADO 20/02/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ANGIE DANIELA MERCHAN PEREZ		
Documento	CC1098770897	**Dirección**	CR 27 #36 - 14 EDIFICIO SURA OFICINA 309
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6844527
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1098770897	ANGIE DANIELA MERCHAN PEREZ	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.480.000	$ 236.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.480.000	$ 185.000	0,522	$ 1.480.000	$ 7.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.480.000	$ 1.480.000	$ 1.480.000	$ 0	$ 236.800	$ 185.000	$ 7.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600	$ 0	$ 429.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-02-27, 03:57:44 PM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numéro Planilla:** 1070285297

Periodo Cotización: enero de 2025 **Periodo Servicio:** enero de 2025

PAGADO 20/02/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO CONSERVACION IM		
Documento	NI901881356	**Dirección**	AUT 25 #15 - 12
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6844527
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO	**Identificación**	CC 1096949307
Total Afiliados	3	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1096949307	MIGUEL FERNANDO QUIROS GOMEZ	59	00	R																0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.100
CC 1098770897	ANGIE DANIELA MERCHAN PEREZ	59	00	R																0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.100
CC 13543090	LUIS ANGEL PINTO ROJAS	59	00	R																0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 4.270.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 297.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 297.300	$ 1.400	$ 298.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13543090		PINTO ROJAS LUIS ANGEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6844527	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1280286171	9479725608	I	2025/02/21	2025/02/20	BANCO CAJA SOCIAL	0	$405,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	13543090	PINTO ROJAS LUIS ANGEL																		230901	30	$1,423,500	$227,800	EPS001	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$405,800
Total	**Afiliados(1)**																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$405,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13543090		PINTO ROJAS LUIS ANGEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6844527	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1280286171	9479725608	I	2025/02/21	2025/02/20	BANCO CAJA SOCIAL	0	$405,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$227,800	$0	$0	$227,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$405,800**	**$0**	**$0**	**$405,800**

2025/02/27 04:04 PM

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO EL "MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEFINIDOS Y PRIORIZADOS POR LA CDMB"



SEGURIDAD SOCIAL

FEBRERO 2025

LIQUIDACIÓN

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-04-01, 01:27:07 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1070993400

Periodo Cotización: febrero de 2025 **Periodo Servicio:** febrero de 2025

PAGADO 10/03/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO		
Documento	CC1096949307	**Dirección**	CR 27 #36 - 14 OFICINA 309
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6844527
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1096949307	MIGUEL FERNANDO QUIROS GOMEZ	57	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 7.440.000	$ 1.264.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 7.440.000	$ 930.000	6,960	$ 7.440.000	$ 517.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.712.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 7.440.000	$ 7.440.000	$ 7.440.000	$ 0	$ 1.264.800	$ 930.000	$ 517.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.712.700	$ 12.100	$ 2.724.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-03-13, 04:24:08 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1070970235

Periodo Cotización: febrero de 2025 **Periodo Servicio:** marzo de 2025

PAGADO 12/03/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO CONSERVACION IM		
Documento	NI901881356	**Dirección**	AUT 25 #15 - 12
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6844527
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO	**Identificación**	CC 1096949307
Total Afiliados	2	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1098698064	MARIA ALEXANDRA SANCHEZ RODRIGUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.500.000	$ 140.000	6,960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600
CC 1102804163	PAULA EMILIA FAJARDO SILGADO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.500.000	$ 140.000	6,960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 7.000.000	$ 7.000.000	$ 7.000.000	$ 7.000.000	$ 1.120.000	$ 280.000	$ 487.200	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.167.200	$ 0	$ 2.167.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: martes, 01 de abril de 2025 01:31:25 PM

Período del informe: Desde el 01 de enero de 2025 hasta el 01 de abril de 2025

Pagada en horario 10/03/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO		
Documento	CC1096949307	**Dirección**	CR 27 #36 - 14 OFICINA 309
Tipo de Empresa		**Teléfono**	6844527
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras							IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 33369716	CONTRERAS VARGAS DIANA EDITH	1070970490	10/03/2025	202502	202503																		30	30	30	30	230301	EPS002	14-11	CCF40	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$227.800	$57.000	$99.100	$57.000	$0	$0	$0	$0	$440.900
CC 33369716	CONTRERAS VARGAS DIANA EDITH	1070285704	20/02/2025	202501	202502	X																	30	30	30	30	230301	EPS002	14-11	CCF40	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$227.800	$57.000	$99.100	$57.000	$0	$0	$0	$0	$440.900
CC 33369716	CONTRERAS VARGAS DIANA EDITH	1068785977	16/01/2025	202412	202501		X																30	30	30	30	230301	EPS002	14-11	CCF40	$1.300.000	$1.300.000	$1.300.000	$1.408.333	$208.000	$52.000	$90.500	$56.400	$0	$0	$0	$0	$406.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-04-01, 11:44:58 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1070566580

Periodo Cotización: febrero de 2025 **Periodo Servicio:** febrero de 2025

PAGADO 12/03/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ANGIE DANIELA MERCHAN PEREZ		
Documento	CC1098770897	**Dirección**	CR 27 #36 - 14 EDIFICIO SURA OFICINA 309
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6844527
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1098770897	ANGIE DANIELA MERCHAN PEREZ	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.480.000	$ 236.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.480.000	$ 185.000	0.522	$ 1.480.000	$ 7.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.480.000	$ 1.480.000	$ 1.480.000	$ 0	$ 236.800	$ 185.000	$ 7.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600	$ 0	$ 429.600

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-03-13, 04:24:10 PM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numéro Planilla:** 1070970237

Periodo Cotización: febrero de 2025 **Periodo Servicio:** febrero de 2025

PAGADO 10/03/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO CONSERVACION IM		
Documento	NI901881356	**Dirección**	AUT 25 #15 - 12
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6844527
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO	**Identificación**	CC 1096949307
Total Afiliados	3	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1096949307	MIGUEL FERNANDO QUIROS GOMEZ	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.100
CC 1098770897	ANGIE DANIELA MERCHAN PEREZ	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.100
CC 13543090	LUIS ANGEL PINTO ROJAS	59	00																	0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 4.270.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 297.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 297.300	$ 0	$ 297.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13543090		PINTO ROJAS LUIS ANGEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6844527	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1331330534	9482781247	I	2025/03/21	2025/03/12	BANCO CAJA SOCIAL	0	$405,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	13543090	PINTO ROJAS LUIS ANGEL																		230901	30	EPS001	30		0		0	0	No
Total	**Afiliados(1)**																												

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13543090		PINTO ROJAS LUIS ANGEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6844527	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1331330534	9482781247	I	2025/03/21	2025/03/12	BANCO CAJA SOCIAL	0	$405,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$227,800	$0	$0	$227,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$405,800**	**$0**	**$0**	**$405,800**

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO EL "MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEFINIDOS Y PRIORIZADOS POR LA CDMB"



SEGURIDAD SOCIAL

MARZO 2025

LIQUIDACIÓN

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-04-22, 11:11:48 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1071751309

Periodo Cotización: marzo de 2025 **Periodo Servicio:** marzo de 2025

PAGADO 16/04/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO		
Documento	CC1096949307	**Dirección**	CR 27 #36 - 14 OFICINA 309
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6844527
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1096949307	MIGUEL FERNANDO QUIROS GOMEZ	57	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 8.144.957	$ 1.384.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 8.144.957	$ 1.018.200	6,960	$ 8.144.957	$ 566.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.969.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 8.144.957	$ 8.144.957	$ 8.144.957	$ 0	$ 1.384.800	$ 1.018.200	$ 566.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.969.900	$ 27.000	$ 2.996.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-04-21, 08:28:44 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1071684886

Periodo Cotización: marzo de 2025 **Periodo Servicio:** abril de 2025

PAGADO 16/04/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO CONSERVACION IM		
Documento	NI901881356	**Dirección**	AUT 25 #15 - 12
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6844527
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO	**Identificación**	CC 1096949307
Total Afiliados	2	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1098698064	MARIA ALEXANDRA SANCHEZ RODRIGUEZ	01	00		X														0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.500.000	$ 140.000	6,960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.937.500	$ 157.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.101.100
CC 1102804163	PAULA EMILIA FAJARDO SILGADO	01	00		X														0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.500.000	$ 140.000	6,960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.937.500	$ 157.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.101.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 7.000.000	$ 7.000.000	$ 7.000.000	$ 7.875.000	$ 1.120.000	$ 280.000	$ 487.200	$ 315.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.202.200	$ 7.400	$ 2.209.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: martes, 22 de abril de 2025 11:13:22 AM

Período del informe: 202503

Pagada 16/04/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO		
Documento	CC1096949307	**Dirección**	CR 27 #36 - 14 OFICINA 309
Tipo de Empresa		**Teléfono**	6844527
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 33369716	CONTRERAS VARGAS DIANA EDITH	1071083776	16/04/2025	202503	202504																		30	30	30	30	230301	EPS002	14-11	CCF40	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$227.800	$57.000	$99.100	$57.000	$0	$0	$0	$0	$440.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-04-22, 11:42:46 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1071687200

Periodo Cotización: marzo de 2025 **Periodo Servicio:** marzo de 2025

PAGADO 16/04/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ANGIE DANIELA MERCHAN PEREZ		
Documento	CC1098770897	**Dirección**	CR 27 #36 - 14 EDIFICIO SURA OFICINA 309
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6844527
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1098770897	ANGIE DANIELA MERCHAN PEREZ	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.480.000	$ 236.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.480.000	$ 185.000	0,522	$ 1.480.000	$ 7.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.480.000	$ 1.480.000	$ 1.480.000	$ 0	$ 236.800	$ 185.000	$ 7.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600	$ 0	$ 429.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-04-21, 08:28:47 AM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numéro Planilla:** 1071684884

Periodo Cotización: marzo de 2025 **Periodo Servicio:** marzo de 2025

PAGADO 16/04/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO CONSERVACION IM		
Documento	NI901881356	**Dirección**	AUT 25 #15 - 12
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6844527
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	QUIROS GOMEZ MIGUEL FERNANDO	**Identificación**	CC 1096949307
Total Afiliados	3	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1096949307	MIGUEL FERNANDO QUIROS GOMEZ	59	00		X															0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.100
CC 1098770897	ANGIE DANIELA MERCHAN PEREZ	59	00		R															0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.100
CC 13543090	LUIS ANGEL PINTO ROJAS	59	00		R															0	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(NIN-EP) NINGUNA EPS	$ 0	$ 0	6,960	$ 1.423.500	$ 99.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 0	$ 4.270.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 297.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 297.300	$ 1.000	$ 298.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13543090		PINTO ROJAS LUIS ANGEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6844527	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1415561471	9484180239	I	2025/04/23	2025/04/16	BANCO CAJA SOCIAL	0	$405,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	13543090	PINTO ROJAS LUIS ANGEL	230901	30	$1,423,500	$227,800	EPS001	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$227,800	$0	$0	$227,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$405,800**	**$0**	**$0**	**$405,800**

2025/04/22 11:17 AM

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO EL "MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEFINIDOS Y PRIORIZADOS POR LA CDMB"



ANEXO No. 3

SOPORTES DE NÓMINA – CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

LIQUIDACIÓN

CONSORCIO CONSERVACIÓN IM

Nit 901881356

Tel.: 6844527

Comprobante de pago de nómina

No. NPG1

NOMBRE:	**MARIA ALEXANDRA SANCHEZ RODRI**	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
NIT:	1098698064-4	**NÚMERO CONTRATO:**	CTRC-00002
DIRECCION:	CARRERA 9 OCC 29-33	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	BUCARAMANGA		

FECHA	PERIODO LIQUIDADO			TOTAL A PAGAR
30/11/2024	**DESDE:** 20/11/2024	**HASTA:**	30/11/2024	**$ 1.180.666.67**

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	11	Días				$ 1.283.333,33

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	11	Días	4%			$ 51.333,33
Aporte pensión empleado	11	Días	4%			$ 51.333,33

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 1.283.333,33
DEDUCCIONES:	$ 102.666,66
TOTAL A PAGAR:	$ 1.180.666,67

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 30/12/2024	$ 1.180.666,67

MIGUEL FERNANDO QUIROS

RESPONSABLE DE IVA NIT. 1.096.949.307-1

Cra 27 N° 36-14 Telefono: 6844725 - Bucaramanga

Comprobante de pago de nómina

No. NPG32

NOMBRE:	**DIANA EDITH CONTRERAS VARGAS**	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
NI:	33369716-1	**NÚMERO CONTRATO:**	CTRC-00002
DIRECCION:	Cl. 36 #27-71, Mejoras Públicas, B	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	BUCARAMANGA		

FECHA	PERIODO LIQUIDADO	TOTAL A PAGAR
30/11/2024	**DESDE:** 01/11/2024 **HASTA:** 30/11/2024	**$ 1.358.000.00**

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 1.300.000,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				$ 162.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 52.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 52.000,00

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 1.462.000,00
DEDUCCIONES:	$ 104.000,00
TOTAL A PAGAR:	$ 1.358.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 30/12/2024	$ 1.358.000,00

Bucaramanga, 16 diciembre de 2024

N° 016

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO CONSERVACION IM
NIT 901.881.356-4

DEBE A
ANGIE DANIELA MERCHAN PEREZ
C.C. 1.098.770.897

LA SUMA DE UN MILLON CINCUENTA MIL PESOS MCTE
(1.050.000=)

POR CONCEPTO DE:
PRESTACION DE SERVICIOS COMO INGENIERA AMBIENTAL para el contrato de interventoría n° 210.15563.4 cuyo objeto es interventoría técnica, administrativa y financiera sobre el contrato que tiene por objeto el mantenimiento de áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico en la jurisdicción del municipio de Floridablanca, definidos y priorizados por la cdmb. (ra-interventoria-03).

PERIODO: Del 20 de noviembre al 19 de diciembre de 2024.

1. No aplicar retención fuente a título de impuesto sobre de acuerdo a lo indicado en el art 373 del estatuto tributario parágrafo 2.

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que no tomare costos o deducciones asociados a mis rentas de trabajo.

Atentamente,



Bucaramanga, 16 diciembre de 2024

N° 016

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO CONSERVACION IM
NIT 901.881.356-4

DEBE A
LUIS ANGEL PINTO ROJAS
C.C. 13.543.090-0

LA SUMA DE UN MILLON CINCUENTA MIL PESOS MCTE
(1.050.000=)

POR CONCEPTO DE:
PRESTACION DE SERVICIOS COMO INGENIERA FORESTAL para el contrato de interventoría n° 210.15563.4 cuyo objeto es interventoría técnica, administrativa y financiera sobre el contrato que tiene por objeto el mantenimiento de áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico en la jurisdicción del municipio de Floridablanca, definidos y priorizados por la cdmb. (ra-interventoria-03).

PERIODO: Del 20 de noviembre al 19 de diciembre de 2024.

1. No aplicar retención fuente a título de impuesto sobre de acuerdo a lo indicado en el art 373 del estatuto tributario parágrafo 2.

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que no tomare costos o deducciones asociados a mis rentas de trabajo.

Atentamente,



Luis Angel Pinto Rojas
c.c. 13.543.090-0

CONSORCIO CONSERVACIÓN IM

Nit 901881356

Tel.: 6844527

Comprobante de pago de nómina

No. NPG2

NOMBRE:	**PAULA EMILIA FAJARDO SILGADO**	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
NIT:	1102804163-4	**NÚMERO CONTRATO:**	CTRC-00001
DIRECCION:	CRA 27 # 36 - 14 OF 09	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	BUCARAMANGA		

FECHA	PERIODO LIQUIDADO			TOTAL A PAGAR
30/11/2024	**DESDE:** 20/11/2024	**HASTA:**	30/11/2024	**$ 1.180.666.67**

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	11	Días				$ 1.283.333,33

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	11	Días	4%			$ 51.333,33
Aporte pensión empleado	11	Días	4%			$ 51.333,33

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 1.283.333,33
DEDUCCIONES:	$ 102.666,66
TOTAL A PAGAR:	$ 1.180.666,67

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 30/12/2024	$ 1.180.666,67

CONSORCIO CONSERVACIÓN IM

Nit 901881356
Tel.: 6844527

Comprobante de liquidación por terminación de contrato

No. CTRL-2412001

NOMBRE: MARIA ALEXANDRA SANCHEZ ROI
NIT: 1098698064-4
DIRECCION: CARRERA 9 OCC 29-33
CIUDAD: BUCARAMANGA

TIPO CONTRATO: Contrato a término fijo
NÚMERO CONTRATO: CTRC-00002
TIPO TRABAJADOR: Dependiente
TIPO DE TERMINACIÓN: Mutuo acuerdo

FECHA INICIO CONTRATO	FECHA FINALIZACIÓN	PERIODO LIQUIDADO	TOTAL A PAGAR
20/11/2024	30/12/2024	**DESDE:** 01/12/2024 **HASTA:** 30/12/2024	**$ 4.221.975.47**

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 3.500.000,00
Vacaciones liquidadas	1,71	Días				$ 199.305,56
Prima legal	41	Días				$ 398.611,11
Cesantías pagadas al trabajador	41	Días				$ 398.611,11
Intereses cesantías anticipadas	41	Días				$ 5.447,69

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 140.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 140.000,00

TOTALES

DEVENGADOS: $ 4.501.975,47
DEDUCCIONES: $ 280.000,00
TOTAL A PAGAR: $ 4.221.975,47

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 30/01/2025	$ 4.221.975,47

MIGUEL FERNANDO QUIROS

RESPONSABLE DE IVA NIT. 1.096.949.307-1

Cra 27 N° 36-14 Telefono: 6844725 - Bucaramanga

Comprobante de liquidación por terminación de contrato

No. CTRL-2412004

NOMBRE: **DIANA EDITH CONTRERAS VARGA**
NI: 33369716-1
DIRECCION: Cl. 36 #27-71, Mejoras Públicas, B
CIUDAD: BUCARAMANGA

TIPO CONTRATO: Contrato a término fijo
NÚMERO CONTRATO: CTRC-00002
TIPO TRABAJADOR: Dependiente
TIPO DE TERMINACIÓN: Mutuo acuerdo

FECHA INICIO CONTRATO	FECHA FINALIZACIÓN	PERIODO LIQUIDADO	TOTAL A PAGAR
1/11/2024	30/12/2024	**DESDE:** 01/12/2024 **HASTA:** 30/12/2024	**$ 1.958.540.00**

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 1.300.000,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				$ 162.000,00
Vacaciones liquidadas	2,5	Días				$ 108.333,33
Prima legal	60	Días				$ 243.666,67
Cesantías pagadas al trabajador	60	Días				$ 243.666,67
Intereses cesantías anticipadas	60	Días				$ 4.873,33

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 52.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 52.000,00

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 2.062.540,00
DEDUCCIONES:	$ 104.000,00
TOTAL A PAGAR:	$ 1.958.540,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 30/01/2025	$ 1.958.540,00

CONSORCIO CONSERVACIÓN IM

Nit 901881356
Tel.: 6844527

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSE4

INFORMACION DEL PROVEEDOR	FECHA
ANGIE DANIELA MERCHAN PEREZ **NIT No. :** 1098770897-1 **DIRECCION :** PARQUE SAN REMO CASA 2 **TELEFONO :** **CIUDAD :** BUCARAMANGA **PAIS :** Colombia	**31/03/2025** **TOTAL** **$ 1.050.000,00**

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
73103501	CUENTA DE COBRO 17 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO INGENIERIA AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DICIEMBRE 2024 AL 19 DE ENERO 2025	1	$ 1.050.000,00	$ 1.050.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 30/04/2025	$ 1.050.000,00

VALOR (en letras) : UN MILLON CINCUENTA MIL PESO

Observaciones

Aprobado

RECIBI

C.C. O NIT.

FRM-116V (NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9

Resolución DIAN 18764018109867 Prefijo DSE Rango 1 al 300 Vigencia 22/10/2024 hasta 22/10/2026

CUDS: f39472773032d43714befaa3da89fcd2d46db39e657da64a2a5b256f9f4f181bbe8c66ad8059b2a82434198b8346160b
Fecha emisión: 2025-03-31 15:42:22
Fecha validación DIAN: 2025-03-31 15:42:29-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Bucaramanga, 31 de marzo de 2025

N° 017

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO CONSERVACION IM

NIT N° 901.881.356-4

DEBE A
ANGIE DANIELA MERCHAN PEREZ
C.C. 1.098.770.897

LA SUMA DE UN MILLÓN CINCUENTA ML PESOS MCTE
(1.050.000=)

POR CONCEPTO DE:
PRESTACION DE SERVICIOS COMO INGENIERIA AMBIENTAL INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINACIERA SOBRE EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO EL " MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEFINIDOS Y PRIORIZADOS POR LA CDMB". (RA-INTERVENTORIA-03)

PERIODO: correspondiente al periodo 20 de diciembre 2024 al 19 enero 2025

Manifiesto por escrito y bajo gravedad del juramento que NO tomaré costos o deducciones asociadas a los ingresos que reporto en la factura electrónica o documento de cobro.

Atentamente,

Angie Daniela Merchán Pérez
c.c. 1.098.770.897
Dirección: Parque San Remo Casa 2
cel.: 316 5753410

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-04-01, 11:44:39 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1069466881

Periodo Cotización: diciembre de 2024 **Periodo Servicio:** diciembre de 2024

PAGADO 16/01/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ANGIE DANIELA MERCHAN PEREZ		
Documento	CC1098770897	**Dirección**	CR 27 #36 - 14 EDIFICIO SURA OFICINA 309
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6844527
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1098770897	ANGIE DANIELA MERCHAN PEREZ	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.480.000	$ 236.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.480.000	$ 185.000	0,522	$ 1.480.000	$ 7.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.480.000	$ 1.480.000	$ 1.480.000	$ 0	$ 236.800	$ 185.000	$ 7.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600	$ 0	$ 429.600

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14917703928

(415)7707212489984(8020) 000001491770392 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 9 8 7 7 0 8 9 7	1	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 9 8 7 7 0 8 9 7	2 0 1 3 0 6 2 4

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MERCHAN	PEREZ	ANGIE	DANIELA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

41. Dirección principal: CL 56 1 W 25 AP 401 BRR MUTIS

42. Correo electrónico: danielamerchan95@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 4 1 3 1 3 6	3 2 0 8 7 7 5 1 8 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
9 6 0 9	2 0 1 5 0 7 0 1						3 4 7 4	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 2 2 4 9																									

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros																				Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						57. Modo			
																						58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 05 - 31 / 18 : 23: 55

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MERCHAN PEREZ ANGIE DANIELA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CONSORCIO CONSERVACIÓN IM

Nit 901881356
Tel.: 6844527

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSE7

INFORMACION DEL PROVEEDOR	FECHA
LUIS ANGEL PINTO ROJAS **NIT No. :** 13543090-0 **DIRECCION :** CRA 27 36 14 **TELEFONO :** **CIUDAD :** BUCARAMANGA **PAIS :** Colombia	**01/04/2025** **TOTAL** **$ 1.050.000,00**

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
73103501	CUENTA DE COBRO 02 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA FORESTAL DEL 20 DE DIC 2024 AL 19 DE ENERO2025	1	$ 1.050.000,00	$ 1.050.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 01/05/2025	$ 1.050.000,00

VALOR (en letras) : UN MILLON CINCUENTA MIL PESO

Observaciones

Aprobado

RECIBI

C.C. O NIT.

FRM-116V (NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9

Resolución DIAN 18764081090867 Prefijo DSE Rango 1 al 900 Vigencia 22/10/2024 hasta 22/10/2026

CUDS: 15e4be6d40f6459234ce2bf5d425783f1b15f6cb99cf3c4e1c9dbfdf071ffb0c64c0a25e482bbc227d255c9e1b103cf6
Fecha emisión: 2025-04-01 10:21:30
Fecha validación DIAN: 2025-04-01 10:21:36-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Bucaramanga,1 de abril de 2025 N° 002

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO CONSERVACION IM

NIT N° 901.881.356-4

DEBE A
LUIS ANGEL PINTO ROJAS
C.C. 13.543.090

LA SUMA DE UN MILLÓN CINCUENTA ML PESOS MCTE
(1.050.000=)

POR CONCEPTO DE:

PRESTACION DE SERVICIOS DE NGENIERIA FORESTAL PARA LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINACIERA SOBRE EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO EL " MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEFINIDOS
Y PRIORIZADOS POR LA CDMB". (RA-INTERVENTORIA-03)

PERIODO: correspondiente al periodo 20 de diciembre 2024 al 19 enero 2025

Me permito certificar bajo gravedad de juramento, que de acuerdo con el artículo 329 de E.T. Mis ingresos por mi actividad como trabajador independiente corresponden al 80% del total de mis ingresos. Aplicar retención Art.383 E.T. Dcto 099 del 2013.

Atentamente,

Luis Angel Pinto Rojas
C.C. 13.543.090

CONSORCIO CONSERVACIÓN IM

Nit 901881356

Tel.: 6844527

Comprobante de liquidación por terminación de contrato

No. CTRL-2412002

NOMBRE: **PAULA EMILIA FAJARDO SILGADO**
NIT: 1102804163-4
DIRECCION: CRA 27 # 36 - 14 OF 09
CIUDAD: BUCARAMANGA

TIPO CONTRATO: Contrato a término fijo
NÚMERO CONTRATO: CTRC-00001
TIPO TRABAJADOR: Dependiente
TIPO DE TERMINACIÓN: Mutuo acuerdo

FECHA INICIO CONTRATO	FECHA FINALIZACIÓN	PERIODO LIQUIDADO	TOTAL A PAGAR
20/11/2024	30/12/2024	**DESDE:** 01/12/2024 **HASTA:** 30/12/2024	**$ 4.221.975.47**

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 3.500.000,00
Vacaciones liquidadas	1,71	Días				$ 199.305,56
Prima legal	41	Días				$ 398.611,11
Cesantías pagadas al trabajador	41	Días				$ 398.611,11
Intereses cesantías anticipadas	41	Días				$ 5.447,69

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 140.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 140.000,00

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 4.501.975,47
DEDUCCIONES:	$ 280.000,00
TOTAL A PAGAR:	$ 4.221.975,47

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 30/01/2025	$ 4.221.975,47

CONSORCIO CONSERVACIÓN IM

Nit 901881356

Tel.: 6844527

Comprobante de pago de nómina

No. NPG3

NOMBRE:	**MARIA ALEXANDRA SANCHEZ RODRI**	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
NIT:	1098698064-4	**NÚMERO CONTRATO:**	CTRC-00003
DIRECCION:	CARRERA 9 OCC 29-33	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	BUCARAMANGA		

FECHA	PERIODO LIQUIDADO	TOTAL A PAGAR
31/01/2025	**DESDE:** 01/01/2025 **HASTA:** 31/01/2025	**$ 3.220.000.00**

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 3.500.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 140.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 140.000,00

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 3.500.000,00
DEDUCCIONES:	$ 280.000,00
TOTAL A PAGAR:	$ 3.220.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 02/03/2025	$ 3.220.000,00

MIGUEL FERNANDO QUIROS

RESPONSABLE DE IVA NIT. 1.096.949.307-1

Cra 27 N° 36-14 Telefono: 6844725 - Bucaramanga

Comprobante de pago de nómina

No. NPG34

NOMBRE:	**DIANA EDITH CONTRERAS VARGAS**	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
NI:	33369716-1	**NÚMERO CONTRATO:**	CTRC-00003
DIRECCION:	Cl. 36 #27-71, Mejoras Públicas, B	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	BUCARAMANGA		

FECHA	PERIODO LIQUIDADO	TOTAL A PAGAR
31/01/2025	**DESDE:** 01/01/2025 **HASTA:** 31/01/2025	**$ 1.509.620.00**

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 1.423.500,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				$ 200.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 56.940,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 56.940,00

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 1.623.500,00
DEDUCCIONES:	$ 113.880,00
TOTAL A PAGAR:	$ 1.509.620,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 02/03/2025	$ 1.509.620,00

CONSORCIO CONSERVACIÓN IM

Nit 901881356
Tel.: 6844527

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSE5

INFORMACION DEL PROVEEDOR

ANGIE DANIELA MERCHAN PEREZ

NIT No. : 1098770897-1
DIRECCION : PARQUE SAN REMO CASA 2
TELEFONO :
CIUDAD : BUCARAMANGA **PAIS :** Colombia

FECHA
31/03/2025

TOTAL
$ 1.050.000,00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
73103501	CUENTA DE COBRO 18 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO INGENIERIA AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 ENERO AL 19 DE FEBRERO 2025	1	$ 1.050.000,00	$ 1.050.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 30/04/2025	$ 1.050.000,00

VALOR (en letras) : UN MILLON CINCUENTA MIL PESO

Observaciones

Aprobado

RECIBI

C.C. O NIT.

FRM-116V (NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9

Resolución DIAN: 18764081909867 Prefijo: DSE Rango: 1 al 300 Vigencia: 22/10/2024 hasta 22/10/2026

CUDS: 42d0e6f8f5cf709f97bdb435ad5f0bb5355d41d63c4d468287c0095608e40f4d6a38906b685c3431863c42ed0e612407
Fecha emisión: 2025-03-31 15:43:50
Fecha validación DIAN: 2025-03-31 15:43:55-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Bucaramanga, 31 de marzo de 2025

N° 018

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO CONSERVACION IM

NIT N° 901.881.356-4

DEBE A
ANGIE DANIELA MERCHAN PEREZ
C.C. 1.098.770.897

LA SUMA DE UN MILLÓN CINCUENTA ML PESOS MCTE
(1.050.000=)

POR CONCEPTO DE:
PRESTACION DE SERVICIOS COMO INGENIERIA AMBIENTAL INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINACIERA SOBRE EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO EL " MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEFINIDOS Y PRIORIZADOS POR LA CDMB". (RA-INTERVENTORIA-03)

PERIODO: correspondiente al periodo 20 de enero al 19 febrero 2025

Manifiesto por escrito y bajo gravedad del juramento que NO tomaré costos o deducciones asociadas a los ingresos que reporto en la factura electrónica o documento de cobro.

Atentamente,

Angie Daniela Merchán Pérez
c.c. 1.098.770.897
Dirección: Parque San Remo Casa 2
cel.: 316 5753410

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14917703928

(415)7707212489984(8020) 000001491770392 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 9 8 7 7 0 8 9 7	1	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 9 8 7 7 0 8 9 7	2 0 1 3 0 6 2 4

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MERCHAN	PEREZ	ANGIE	DANIELA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

41. Dirección principal: CL 56 1 W 25 AP 401 BRR MUTIS

42. Correo electrónico: danielamerchan95@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 4 1 3 1 3 6	3 2 0 8 7 7 5 1 8 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
9 6 0 9	2 0 1 5 0 7 0 1						3 4 7 4	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	2	2	4	9																						

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 05 - 31 / 18 : 23: 55

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MERCHAN PEREZ ANGIE DANIELA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 24-11-2023 03:18:42PM

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-04-01, 11:44:49 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1070286430

Periodo Cotización: enero de 2025 **Periodo Servicio:** enero de 2025

PAGADO 20/02/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ANGIE DANIELA MERCHAN PEREZ		
Documento	CC1098770897	**Dirección**	CR 27 #36 - 14 EDIFICIO SURA OFICINA 309
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6844527
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1098770897	ANGIE DANIELA MERCHAN PEREZ	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.480.000	$ 236.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.480.000	$ 185.000	0,522	$ 1.480.000	$ 7.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.480.000	$ 1.480.000	$ 1.480.000	$ 0	$ 236.800	$ 185.000	$ 7.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600	$ 0	$ 429.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

CONSORCIO CONSERVACIÓN IM

Nit 901881356
Tel.: 6844527

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSE8

INFORMACION DEL PROVEEDOR	FECHA
LUIS ANGEL PINTO ROJAS **NIT No. :** 13543090-0 **DIRECCION :** CRA 27 36 14 **TELEFONO :** **CIUDAD :** BUCARAMANGA **PAIS :** Colombia	**01/04/2025** **TOTAL** **$ 1.050.000,00**

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
73103501	CUENTA DE COBRO 03 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA FORESTAL DEL 20 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO 2025	1	$ 1.050.000,00	$ 1.050.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 01/05/2025	$ 1.050.000,00

VALOR (en letras) : UN MILLON CINCUENTA MIL PESO

Observaciones

Aprobado

RECIBI

C.C. O NIT.

FRM-116V (NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9

Resolución DIAN: 18764001909867 Prefijo: DSE Rango: 1 al 200 Vigencia: 22/10/2024 hasta 22/10/2026

CUDS: 38160467e04d12943433f96fa1902209ed7d941cc8672d88be0e3e54bab96ffc8c0f29afc6e1973d05a5c2448f89cbb1
Fecha emisión: 2025-04-01 10:25:21
Fecha validación DIAN: 2025-04-01 10:25:26-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Bucaramanga,1 de abril de 2025 N° 003

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO CONSERVACION IM

NIT N° 901.881.356-4

DEBE A
LUIS ANGEL PINTO ROJAS
C.C. 13.543.090

LA SUMA DE UN MILLÓN CINCUENTA ML PESOS MCTE
(1.050.000=)

POR CONCEPTO DE:

PRESTACION DE SERVICIOS DE NGENIERIA FORESTAL PARA LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINACIERA SOBRE EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO EL " MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEFINIDOS
Y PRIORIZADOS POR LA CDMB". (RA-INTERVENTORIA-03)

PERIODO: correspondiente al periodo 20 de enero al 19 febrero 2025

Me permito certificar bajo gravedad de juramento, que de acuerdo con el artículo 329 de E.T. Mis ingresos por mi actividad como trabajador independiente corresponden al 80% del total de mis ingresos. Aplicar retención Art.383 E.T. Dcto 099 del 2013.

Atentamente,

Luis Ángel Pinto Rojas
C.C. 13.543.090

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13543090		PINTO ROJAS LUIS ANGEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6844527	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1280286171	9479725608	I	2025/02/21	2025/02/20	BANCO CAJA SOCIAL	0	$405,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	13543090	PINTO ROJAS LUIS ANGEL																		230901	30	$1,423,500	$227,800	EPS001	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$405,800
Total	**Afiliados(1)**																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$405,800

2025/02/27 04:04 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13543090		PINTO ROJAS LUIS ANGEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6844527	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1280286171	9479725608	I	2025/02/21	2025/02/20	BANCO CAJA SOCIAL	0	$405,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$227,800	$0	$0	$227,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$405,800	$0	$0	$405,800

CONSORCIO CONSERVACIÓN IM

Nit 901881356

Tel.: 6844527

Comprobante de pago de nómina

No. NPG4

NOMBRE:	**PAULA EMILIA FAJARDO SILGADO**	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
NIT:	1102804163-4	**NÚMERO CONTRATO:**	CTRC-00004
DIRECCION:	CRA 27 # 36 - 14 OF 09	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	BUCARAMANGA		

FECHA	PERIODO LIQUIDADO			TOTAL A PAGAR
31/01/2025	**DESDE:** 01/01/2025	**HASTA:**	31/01/2025	**$ 3.220.000.00**

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 3.500.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 140.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 140.000,00

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 3.500.000,00
DEDUCCIONES:	$ 280.000,00
TOTAL A PAGAR:	$ 3.220.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 02/03/2025	$ 3.220.000,00

CONSORCIO CONSERVACIÓN IM

Nit 901881356

Tel.: 6844527

Comprobante de pago de nómina

No. NPG5

NOMBRE:	**MARIA ALEXANDRA SANCHEZ RODRI**	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
NIT:	1098698064-4	**NÚMERO CONTRATO:**	CTRC-00003
DIRECCION:	CARRERA 9 OCC 29-33	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	BUCARAMANGA		

FECHA	PERIODO LIQUIDADO	TOTAL A PAGAR
28/02/2025	**DESDE:** 01/02/2025 **HASTA:** 28/02/2025	**$ 3.220.000.00**

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 3.500.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 140.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 140.000,00

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 3.500.000,00
DEDUCCIONES:	$ 280.000,00
TOTAL A PAGAR:	$ 3.220.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 30/03/2025	$ 3.220.000,00

MIGUEL FERNANDO QUIROS

RESPONSABLE DE IVA NIT. 1.096.949.307-1

Cra 27 N° 36-14 Telefono: 6844725 - Bucaramanga

Comprobante de pago de nómina

No. NPG36

NOMBRE:	**DIANA EDITH CONTRERAS VARGAS**	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
NI:	33369716-1	**NÚMERO CONTRATO:**	CTRC-00003
DIRECCION:	Cl. 36 #27-71, Mejoras Públicas, B	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	BUCARAMANGA		

FECHA	PERIODO LIQUIDADO	TOTAL A PAGAR
28/02/2025	**DESDE:** 01/02/2025 **HASTA:** 28/02/2025	**$ 1.509.620.00**

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 1.423.500,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				$ 200.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 56.940,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 56.940,00

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 1.623.500,00
DEDUCCIONES:	$ 113.880,00
TOTAL A PAGAR:	$ 1.509.620,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 30/03/2025	$ 1.509.620,00

CONSORCIO CONSERVACIÓN IM

Nit 901881356
Tel.: 6844527

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSE6

INFORMACION DEL PROVEEDOR	FECHA
ANGIE DANIELA MERCHAN PEREZ **NIT No. :** 1098770897-1 **DIRECCION :** PARQUE SAN REMO CASA 2 **TELEFONO :** **CIUDAD :** BUCARAMANGA **PAIS :** Colombia	**31/03/2025** **TOTAL** **$ 1.050.000,00**

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
73103501	CUENTA DE COBRO 19 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO INGENIERIA AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 FEBRERO AL 19 DE MARZO 2025	1	$ 1.050.000,00	$ 1.050.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 30/04/2025	$ 1.050.000,00

VALOR (en letras) : UN MILLON CINCUENTA MIL PESO

Observaciones

Aprobado

RECIBI

C.C. O NIT.

FRM-116V (NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9

Resolución DIAN: 18764003109867 Prefijo DSE Rango 1 al 300 Vigencia: 29/10/2024 hasta 29/10/2026

CUDS: 1388e19f6bb1db35be6f25fd4e29a586b819531b2746d33b5e96a527b322f4c14f5b646ea173f1a08723d53979828834
Fecha emisión: 2025-03-31 15:46:19
Fecha validación DIAN: 2025-03-31 15:46:24-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Bucaramanga, 31 de marzo de 2025

N° 019

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO CONSERVACION IM

NIT N° 901.881.356-4

DEBE A
ANGIE DANIELA MERCHAN PEREZ
C.C. 1.098.770.897

LA SUMA DE UN MILLÓN CINCUENTA ML PESOS MCTE
(1.050.000=)

POR CONCEPTO DE:
PRESTACION DE SERVICIOS COMO INGENIERIA AMBIENTAL INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINACIERA SOBRE EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO EL " MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEFINIDOS Y PRIORIZADOS POR LA CDMB". (RA-INTERVENTORIA-03)

PERIODO: correspondiente al periodo 20 de febrero al 19 marzo 2025

Manifiesto por escrito y bajo gravedad del juramento que NO tomaré costos o deducciones asociadas a los ingresos que reporto en la factura electrónica o documento de cobro.

Atentamente,

Angie Daniela Merchán Pérez
c.c. 1.098.770.897
Dirección: Parque San Remo Casa 2
cel.: 316 5753410

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-04-01, 11:44:58 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1070566580

Periodo Cotización: febrero de 2025 **Periodo Servicio:** febrero de 2025

PAGADO 12/03/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ANGIE DANIELA MERCHAN PEREZ		
Documento	CC1098770897	**Dirección**	CR 27 #36 - 14 EDIFICIO SURA OFICINA 309
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6844527
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1098770897	ANGIE DANIELA MERCHAN PEREZ	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.480.000	$ 236.800	(EPS010) EPS SURA	$ 1.480.000	$ 185.000	0.522	$ 1.480.000	$ 7.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.480.000	$ 1.480.000	$ 1.480.000	$ 0	$ 236.800	$ 185.000	$ 7.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600	$ 0	$ 429.600

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14917703928

(415)7707212489984(8020) 000001491770392 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 9 8 7 7 0 8 9 7	1	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 9 8 7 7 0 8 9 7	2 0 1 3 0 6 2 4

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MERCHAN	PEREZ	ANGIE	DANIELA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

41. Dirección principal: CL 56 1 W 25 AP 401 BRR MUTIS

42. Correo electrónico: danielamerchan95@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 4 1 3 1 3 6	3 2 0 8 7 7 5 1 8 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
9 6 0 9	2 0 1 5 0 7 0 1					3 4 7 4	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 2 2 4 9																									

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 05 - 31 / 18 : 23: 55

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MERCHAN PEREZ ANGIE DANIELA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 24-11-2023 03:18:42PM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

CONSORCIO CONSERVACIÓN IM

Nit 901881356
Tel.: 6844527

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSE9

INFORMACION DEL PROVEEDOR

LUIS ANGEL PINTO ROJAS

NIT No. : 13543090-0
DIRECCION : CRA 27 36 14
TELEFONO :
CIUDAD : BUCARAMANGA **PAIS :** Colombia

FECHA
01/04/2025

TOTAL
$ 1.050.000,00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
73103501	CUENTA DE COBRO 04 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA FORESTAL DEL 20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO 2025	1	$ 1.050.000,00	$ 1.050.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 01/05/2025	$ 1.050.000,00

VALOR (en letras) : UN MILLON CINCUENTA MIL PESO

Observaciones

Aprobado

RECIBI

C.C. O NIT.

FRM-116V (NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9

Resolución DIAN: 18764081906867 Prefijo DSE Rango 1 al 300 Vigencia 23/10/2024 hasta 23/10/2026

CUDS: aa7e60da981292237c7c90c866207bc41d91914572356c2411573361e9955b527901defda151b0205264ac73ceff6e7c
Fecha emisión: 2025-04-01 10:27:09
Fecha validación DIAN: 2025-04-01 10:27:14-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Bucaramanga,1 de abril de 2025 N° 004

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO CONSERVACION IM

NIT N° 901.881.356-4

DEBE A
LUIS ANGEL PINTO ROJAS
C.C. 13.543.090

LA SUMA DE UN MILLÓN CINCUENTA ML PESOS MCTE
(1.050.000=)

POR CONCEPTO DE:

PRESTACION DE SERVICIOS DE NGENIERIA FORESTAL PARA LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINACIERA SOBRE EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO EL " MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEFINIDOS
Y PRIORIZADOS POR LA CDMB". (RA-INTERVENTORIA-03)

PERIODO: correspondiente al periodo 20 de febrero al 19 marzo 2025

Me permito certificar bajo gravedad de juramento, que de acuerdo con el artículo 329 de E.T. Mis ingresos por mi actividad como trabajador independiente corresponden al 80% del total de mis ingresos. Aplicar retención Art.383 E.T. Dcto 099 del 2013.

Atentamente,

Luis Angel Pinto Rojas
C.C. 13.543.090

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13543090		PINTO ROJAS LUIS ANGEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6844527	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1331330534	9482781247	I	2025/03/21	2025/03/12	BANCO CAJA SOCIAL	0	$405,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$227,800	$0	$0	$227,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$405,800	$0	$0	$405,800

2025/03/13 04:36 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13543090		PINTO ROJAS LUIS ANGEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 25	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6844527	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1331330534	9482781247	I	2025/03/21	2025/03/12	BANCO CAJA SOCIAL	0	$405,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	13543090	PINTO ROJAS LUIS ANGEL																		230901	30	EPS001	30		0		0	0	No
Total	**Afiliados(1)**																												

2025/03/13 04:36 PM

CONSORCIO CONSERVACIÓN IM

Nit 901881356

Tel.: 6844527

Comprobante de pago de nómina

No. NPG6

NOMBRE:	**PAULA EMILIA FAJARDO SILGADO**	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
NIT:	1102804163-4	**NÚMERO CONTRATO:**	CTRC-00004
DIRECCION:	CRA 27 # 36 - 14 OF 09	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	BUCARAMANGA		

FECHA	PERIODO LIQUIDADO			TOTAL A PAGAR
28/02/2025	**DESDE:** 01/02/2025	**HASTA:**	28/02/2025	**$ 3.220.000.00**

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 3.500.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 140.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 140.000,00

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 3.500.000,00
DEDUCCIONES:	$ 280.000,00
TOTAL A PAGAR:	$ 3.220.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 30/03/2025	$ 3.220.000,00

MIGUEL FERNANDO QUIROS

RESPONSABLE DE IVA NIT. 1.096.949.307-1

Cra 27 N° 36-14 Telefono: 6844725 - Bucaramanga

Factura electrónica de venta

No. FE194

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
CONSORCIO CONSERVACIÓN IM	**21/04/2025**	**$ 12.471.200,00**
NI No. : 901881356-4	VENDEDOR	
DIRECCION : CRA 27 # 36 - 14 OF 309	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BUCARAMANGA **PAIS :** Colombia	21/05/2025	

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
413095	Director de interventoria periodo correspondiente de 20 de noviembre de 2024 al 30 de marzo de 2025.	$ 10.480.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 10.480.000,00
IVA liquidado	$ 10.480.000,00	19%	$ 1.991.200,00
VALOR TOTAL :			$ 12.471.200,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 21/05/2025	$ 12.471.200,00

VALOR (en letras) : DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 21/05/2025.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

CUAGvlh1Z4s2x/drKWIo3FCKbBv38Ag61fwtl9prYOsanKyH9Uwi69qX7bIvN1j67ZOuTM8oBJrlrvl4+5Lgofkv7Gxwd8v8QFM/LEQTsKIX9hJ5CgtCZXeBCQ6MI9j8E5L3HnshXTNwk9RsydDOw5gkLZaIOnWXi60U50EpEIIbGZ0Jq5aS8P4zu/1dXsqA3c9oiyKD/Y2ktaI1mL3AtTlcFrXt2wSe9uf4i7FWfrrmQxCe59C9W/xctSlnp5573+bovyk2RBWIw+SS+g7uQAJxManHl8cK/UVgs4xSNDEl+SOScL6j9ye2lNfW/C86sv7/NIAogWhQ5QlyWQu+jQ==

CUFE: a5077c603d55cce30745736a0e2f71c95b3394aa2ca3544fd060a4538c3ef6cbab87aa1a6d5c1b45fc4dcf6f058e07ac

Fecha emisión: 2025-04-21 08:55:46 **Fecha validación DIAN:** 2025-04-21 08:55:54-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764087940043. Prefijo: FE. Rango: 186 al 400. Vigencia: 29/01/2025 hasta 29/07/2025.

CONSORCIO CONSERVACIÓN IM

Nit 901881356

Tel.: 6844527

Comprobante de pago de nómina

No. NPG8

NOMBRE:	**MARIA ALEXANDRA SANCHEZ RODRI**	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
NIT:	1098698064-4	**NÚMERO CONTRATO:**	CTRC-00003
DIRECCION:	CARRERA 9 OCC 29-33	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	BUCARAMANGA		

FECHA	PERIODO LIQUIDADO	TOTAL A PAGAR
31/03/2025	**DESDE:** 01/03/2025 **HASTA:** 31/03/2025	**$ 3.220.000.00**

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 3.500.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 140.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 140.000,00

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 3.500.000,00
DEDUCCIONES:	$ 280.000,00
TOTAL A PAGAR:	$ 3.220.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 30/04/2025	$ 3.220.000,00

CONSORCIO CONSERVACIÓN IM

Nit 901881356

Tel.: 6844527

Comprobante de liquidación por terminación de contrato

No. CTRL-2503003

NOMBRE: MARIA ALEXANDRA SANCHEZ ROI
NIT: 1098698064-4
DIRECCION: CARRERA 9 OCC 29-33
CIUDAD: BUCARAMANGA

TIPO CONTRATO: Contrato a término fijo
NÚMERO CONTRATO: CTRC-00003
TIPO TRABAJADOR: Dependiente
TIPO DE TERMINACIÓN: Mutuo acuerdo

FECHA INICIO CONTRATO	FECHA FINALIZACIÓN	PERIODO LIQUIDADO	TOTAL A PAGAR
1/01/2025	30/03/2025	**DESDE:** 01/03/2025 **HASTA:** 30/03/2025	**$ 5.433.750.00**

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 3.500.000,00
Vacaciones liquidadas	3,75	Días				$ 437.500,00
Prima legal	90	Días				$ 875.000,00
Cesantías pagadas al trabajador	90	Días				$ 875.000,00
Intereses cesantías anticipadas	90	Días				$ 26.250,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 140.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 140.000,00

TOTALES

DEVENGADOS: $ 5.713.750,00
DEDUCCIONES: $ 280.000,00
TOTAL A PAGAR: $ 5.433.750,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 30/04/2025	$ 5.433.750,00

MIGUEL FERNANDO QUIROS

RESPONSABLE DE IVA NIT. 1.096.949.307-1

Cra 27 N° 36-14 Telefono: 6844725 - Bucaramanga

Comprobante de pago de nómina

No. NPG37

NOMBRE:	**DIANA EDITH CONTRERAS VARGAS**	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
NI:	33369716-1	**NÚMERO CONTRATO:**	CTRC-00003
DIRECCION:	Cl. 36 #27-71, Mejoras Públicas, B	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	BUCARAMANGA		

FECHA	PERIODO LIQUIDADO	TOTAL A PAGAR
31/03/2025	**DESDE:** 01/03/2025 **HASTA:** 31/03/2025	**$ 1.509.620.00**

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 1.423.500,00
Auxilio legal de transporte	30	Días				$ 200.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 56.940,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 56.940,00

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 1.623.500,00
DEDUCCIONES:	$ 113.880,00
TOTAL A PAGAR:	$ 1.509.620,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 30/04/2025	$ 1.509.620,00

CONSORCIO CONSERVACIÓN IM

Nit 901881356
Tel.: 6844527

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSE11

INFORMACION DEL PROVEEDOR	FECHA
ANGIE DANIELA MERCHAN PEREZ **NIT No. :** 1098770897-1 **DIRECCION :** PARQUE SAN REMO CASA 2 **TELEFONO :** **CIUDAD :** BUCARAMANGA **PAIS :** Colombia	**21/04/2025** **TOTAL** **$ 350.000,00**

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
73103501	CUENTA DE COBRO 20 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO INGENIERIA AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 MARZO AL 30 DE MARZO 2025	1	$ 350.000,00	$ 350.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 21/05/2025	$ 350.000,00

VALOR (en letras) : TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESO

Observaciones

Aprobado

RECIBI

C.C. O NIT.

FRM-116V (NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9

Resolución DIAN 18764015492067 Prefijo DSE Rango 1 al 300 Vigencia 22/10/2024 hasta 22/10/2026

CUDS: e6aed796ffbed019cd8604acb78cc2e4b642e52497acbb842eea6594f8e53ef6d28de3107ff1756d5964587961f85aa5
Fecha emisión: 2025-04-21 09:28:37
Fecha validación DIAN: 2025-04-21 09:28:43-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Bucaramanga, 21 de abril de 2025

N° 020

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO CONSERVACION IM

NIT N° 901.881.356-4

DEBE A
ANGIE DANIELA MERCHAN PEREZ
C.C. 1.098.770.897

LA SUMA DE TRESCIENTOS CINCUENTA ML PESOS MCTE
(350.000=)

POR CONCEPTO DE:
PRESTACION DE SERVICIOS COMO INGENIERIA AMBIENTAL INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINACIERA SOBRE EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO EL " MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEFINIDOS Y PRIORIZADOS POR LA CDMB". (RA-INTERVENTORIA-03)

PERIODO: correspondiente al periodo 20 de marzo al 30 marzo 2025

Manifiesto por escrito y bajo gravedad del juramento que NO tomaré costos o deducciones asociadas a los ingresos que reporto en la factura electrónica o documento de cobro.

Atentamente,

Angie Daniela Merchán Pérez
c.c. 1.098.770.897
Dirección: Parque San Remo Casa 2
cel.: 316 5753410

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14917703928

(415)7707212489984(8020) 000001491770392 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 9 8 7 7 0 8 9 7	1	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 9 8 7 7 0 8 9 7	2 0 1 3 0 6 2 4

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MERCHAN	PEREZ	ANGIE	DANIELA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

41. Dirección principal: CL 56 1 W 25 AP 401 BRR MUTIS

42. Correo electrónico: danielamerchan95@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 4 1 3 1 3 6	3 2 0 8 7 7 5 1 8 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
9 6 0 9	2 0 1 5 0 7 0 1					3 4 7 4	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 2 2 4 9

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha 2023 - 05 - 31 / 18 : 23: 55

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: MERCHAN PEREZ ANGIE DANIELA

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 24-11-2023 03:18:42PM

CONSORCIO CONSERVACIÓN IM

Nit 901881356
Tel.: 6844527

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSE10

INFORMACION DEL PROVEEDOR	FECHA
LUIS ANGEL PINTO ROJAS **NIT No. :** 13543090-0 **DIRECCION :** CRA 27 36 14 **TELEFONO :** **CIUDAD :** BUCARAMANGA **PAIS :** Colombia	**21/04/2025** **TOTAL** **$ 350.000,00**

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
73103501	CUENTA DE COBRO 05 POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE INGENIERIA FORESTAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MARZO AL 30 DE MARZO 2025	1	$ 350.000,00	$ 350.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 21/05/2025	$ 350.000,00

VALOR (en letras) : TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESO

Observaciones

Aprobado

RECIBI

C.C. O NIT.

FRM-116V (NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9

Resolución DIAN 18764081929867 Prefijo DSE Rango 1 al 900 Vigencia 22/10/2024 hasta 22/10/2026

CUDS: 3a93e7fcfc54715b1f059e42487658d992a4edfbba9b02520448cb112eb5f4df1402bb9caaf365f18bf4f8edaaaefc0f
Fecha emisión: 2025-04-21 09:27:41
Fecha validación DIAN: 2025-04-21 09:27:49-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Bucaramanga,21 de abril de 2025 Nº 005

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO CONSERVACION IM

NIT N° 901.881.356-4

DEBE A
LUIS ANGEL PINTO ROJAS
C.C. 13.543.090

LA SUMA DE TRESCIENTOS CINCUENTA ML PESOS MCTE
(350.000=)

POR CONCEPTO DE:

PRESTACION DE SERVICIOS DE NGENIERIA FORESTAL PARA LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINACIERA SOBRE EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO EL " MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEFINIDOS
Y PRIORIZADOS POR LA CDMB". (RA-INTERVENTORIA-03)

PERIODO: correspondiente al periodo 20 de marzo al 30 marzo 2025

Me permito certificar bajo gravedad de juramento, que de acuerdo con el artículo 329 de E.T. Mis ingresos por mi actividad como trabajador independiente corresponden al 80% del total de mis ingresos. Aplicar retención Art.383 E.T. Dcto 099 del 2013.

Atentamente,

Luis Ángel Pinto Rojas
C.C. 13.543.090

CONSORCIO CONSERVACIÓN IM

Nit 901881356
Tel.: 6844527

Comprobante de pago de nómina

No. NPG7

NOMBRE:	**PAULA EMILIA FAJARDO SILGADO**	**TIPO CONTRATO:**	Contrato a término fijo
NIT:	1102804163-4	**NÚMERO CONTRATO:**	CTRC-00004
DIRECCION:	CRA 27 # 36 - 14 OF 09	**TIPO TRABAJADOR:**	Dependiente
CIUDAD:	BUCARAMANGA		

FECHA	PERIODO LIQUIDADO			TOTAL A PAGAR
31/03/2025	**DESDE:** 01/03/2025	**HASTA:**	31/03/2025	**$ 3.220.000.00**

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 3.500.000,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 140.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 140.000,00

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 3.500.000,00
DEDUCCIONES:	$ 280.000,00
TOTAL A PAGAR:	$ 3.220.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 30/04/2025	$ 3.220.000,00

CONSORCIO CONSERVACIÓN IM

Nit 901881356

Tel.: 6844527

Comprobante de liquidación por terminación de contrato

No. CTRL-2503004

NOMBRE: **PAULA EMILIA FAJARDO SILGADO**
NIT: 1102804163-4
DIRECCION: CRA 27 # 36 - 14 OF 09
CIUDAD: BUCARAMANGA

TIPO CONTRATO: Contrato a término fijo
NÚMERO CONTRATO: CTRC-00004
TIPO TRABAJADOR: Dependiente
TIPO DE TERMINACIÓN: Mutuo acuerdo

FECHA INICIO CONTRATO	FECHA FINALIZACIÓN	PERIODO LIQUIDADO	TOTAL A PAGAR
1/01/2025	30/03/2025	**DESDE:** 01/03/2025 **HASTA:** 30/03/2025	**$ 5.433.750.00**

DEVENGADOS

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA/HORA INICIAL	FECHA/HORA FINAL	VALOR
Salario básico	30	Días				$ 3.500.000,00
Vacaciones liquidadas	3,75	Días				$ 437.500,00
Prima legal	90	Días				$ 875.000,00
Cesantías pagadas al trabajador	90	Días				$ 875.000,00
Intereses cesantías anticipadas	90	Días				$ 26.250,00

DEDUCCIONES

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PORCENTAJE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR
Aporte salud empleado	30	Días	4%			$ 140.000,00
Aporte pensión empleado	30	Días	4%			$ 140.000,00

TOTALES

DEVENGADOS:	$ 5.713.750,00
DEDUCCIONES:	$ 280.000,00
TOTAL A PAGAR:	$ 5.433.750,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 30/04/2025	$ 5.433.750,00

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO EL "MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEFINIDOS Y PRIORIZADOS POR LA CDMB"



ANEXO No. 4

BITÁCORA DE OBRA

LIQUIDACIÓN

Contrato de Obra No. 210.15562.5 del 23 de octubre de 2024
Mantenimiento de áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico en la jurisdicción del municipio de Floridablanca definidos y priorizados por la CDMB

Bitácora de Obra

Tipo de contrato	Obra	
Contrato	No. 210.15562.5	Fecha: 23/10/2024
Objeto	Mantenimiento de áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico en la jurisdicción del Municipio de Floridablanca definidos y priorizados por la CDMB.	
Contratista	Consorcio Conservación Hídrica	
NIT	901.881.924-8	
Valor inicial	$ 4.521.575.179,94 (cuatro mil quinientos veintiún millones quinientos setenta y cinco mil ciento setenta y nueve pesos con noventa y cuatro centavos moneda corriente)	
Plazo inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2024 (cuarenta y dos [42] días de acuerdo con el Acta de Inicio)	
Fecha de inicio	20/11/2024	
Entidad Contratante	Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga CDMB	
Supervisor	Carlos Alberto Diaz Barrera	
Cargo	Subdirector	

Glosario de Firmas

Nombre	Cargo	Firma
Edgar I. Gomez R	Director	
Maria Alexandra Sánchez	Residente interventoria	
Luis Angel Pinto Rojas	Ing Forestal - interventoria	
Paula Fallia Fgardo	SISO - interventoria	
MIGUEL FERNANDO QUIROS G.	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
Diana Edith Contreras Vargas.	Especialista en Recursos Hidricos.	
Angie Daniela Merchán Pérez	Ing. Ambiental Interventoria	
Andrés Felipe Sandoval M.	Ing. Residente de Obra	
Marcela Padierna	Residente de obra	Marcela Padierna
Melissa Donado Arias	Profesional SISO	Melissa Donado

20/11/2024 Personal de obra: Director, residentes, asesor forestal, asesor ambiental, inspector SISO, PGP, topógrafa, topógrafo, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra.

Equipos: Retroexcavadora, miniretroexcavadora, minicargador, miniretrocargador, herramienta menor.

Clima: Soleado

Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral y reconformación geomorfológicas. Así mismo, se retiran basuras, escombros, se realiza rocería. Se retira material a los correspondientes sitios de disposición final.

Marcela Cadena

Melissa Posada

21-11-2024 Personal de obra: Director, residentes, asesor forestal, asesor ambiental, inspector SISO, PGP, topógrafa, topógrafo, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra.

Equipos: Retroexcavadora, miniretroexcavadora, minicargador, miniretrocargador, herramienta menor.

Clima: Soleado.

Actividades: Se lleva a cabo intervenus de cauces mediante movimiento y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral y reconformación geomorfológicas. Así mismo, se retiran basuras, escombros, se realiza rocería. Se retira material a los correspondientes sitios de disposición final.

Marcela Cadena

22-11-2024 Personal de obra: Director, residentes, asesor forestal, asesor ambiental, inspector SISO, PGP, topógrafa, topógrafo, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra.

Equipos: retroexcavadora, miniretroexcavadora, minicargador, miniretrocargador, herramienta menor.
Clima: Nublado desde las 15:30 hasta las 17:00
Actividades: Se lleva a cabo intervencion el de cauces mediante movimiento y retiro de sedimentos de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral, reconformación geomorfológica. Así mismo, se retiran basuras, escombros, se realiza rocería. Se retira material a los correspondientes sitios de disposición final.

Marcela Cadavid

23-11-2024 Personal de obra: Director, residentes, asesor forestal, asesor ambiental, inspector SISO, PGP, topógrafa, topógrafo, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra.
Equipos: retroexcavadora, miniretroexcavadora, minicargador, miniretrocargador, herramientas menores.
Clima: Soleado
Actividades: Se lleva a cabo intervenciones de cauces mediante movimiento y retiro de sedimentos de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral, reconformación geomorfológica. Así mismo, se retiran basuras, escombros, se realiza rocería. Se retira material a los correspondientes sitios de deposición final.

Melissa Dorado

24-11-2024 Día no laboral

Marcela Cadavid

25-11-2024 Personal de obra: Director, residente, asesor forestal, asesor ambiental, inspector SISO, PGP, topógrafa, topógrafo, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra.

Equipos: Retroexcavadora, miniretroexcavadora, minicargador, miniretrocargador, herramienta menor.

Clima: soleado

Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimentos de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral y reconformación geomorfológica. Se retira material a los correspondientes sitios de deposición final. Así mismo se retira basura, escombros, se realiza rocería.

Marcela Cadiema

26-11-2024 Personal de obra: Director, residente, asesor forestal, asesor ambiental, inspector SISO, PGP, topógrafa, topógrafo, cadenera, auxiliar de obra, cuadrilla de obra.

Equipos: retroexcavadora, miniretroexcavadora, minicargador, miniretrocargador, herramienta menor.

clima: lluvia moderada desde las 7:30 hasta las 9:45

Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimentos de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral, reconformación geomorfológica. Así mismo, se retira, basura, escombros, se realiza rocería. Se retira material a los correspondientes sitios de deposición final.

Marcela Cadiema

Melissa Donado

27-11-2024 Personal de obra: Director, residente, asesor forestal, asesor ambiental, inspector SISO, PGP, topógrafa

topógrafo, cadenera, auxiliar de obra, cuadrilla de obra.

Equipos: retroexcavadora, miniretroexcavadora, minicargador, miniretrocargador, herramienta menor.

clima: Nublado desde las 9:15 hasta las 11:00.

Actividades: se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimentos de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral y reconformación geomorfológica. Así mismo, se retira basura, escombros y se realiza rocería. Se retira material a los correspondientes sitios de deposición final.

Marcela Cadena

28-11-2024 Personal de obra: Director, residentes, asesor forestal, asesor ambiental, inspector SISO, PGP, topógrafo, topógrafo, auxiliar de obra, cuadrilla de obra.

Equipos: retroexcavadora, miniretroexcavadora, minicargador, miniretrocargador, herramienta menor.

clima: soleado

Actividades: se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimentos de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral y reconformación geomorfológica. Así mismo, se retira basura y escombros, se realiza rocería. Se retira material a los correspondientes sitios de deposición final.

Marcela Cadena

29-11-2024 Personal de obra: Director, residentes, asesor forestal, asesor ambiental, inspector SISO, PGP, topógrafo, topógrafo, auxiliar de obra, cuadrilla de obra.

Equipos: retroexcavadora, miniretroexcavadora, minicargador, miniretrocargador, herramienta menor.

clima: soleado

Actividades: Se lleva a cabo de intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimentos de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral y reconformación geomorfológica. Así mismo, se retira basuras, escombros, se realiza rocería. Se retira material a los correspondientes sitios de disposición final.

Marcela Cadierna

30-11-2024 Personal de obra: Director, residentes, asesor forestal, asesor ambiental, inspector SISO, PGP, topógrafo, topógrafo, cadenero, auxiliar de obra, cuadrilla de obra.

Equipos: retroexcavadora, minirretroexcavadora, Minicargador, minirretrocargador, herramienta menor.

clima: soleado

Actividades: se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimentos de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral y reconformación geomorfológica. Así mismo, se retira basura, escombros, se realiza rocería. se retira material a los correspondientes sitios de deposición.

Marcela Cadierna

01-12-2024 Día no laboral.

02-12-2024 Personal de obra: Director, residentes, asesor forestal, asesor ambiental, inspector SISO, PGP, topógrafo, topógrafo, cadenera, auxiliar de obra, cuadrilla de obra.

Equipos: retroexcavadora, minirretroexcavadora, minicargador, minirretrocargador, herramienta menor.

clima: Nublado desde las 7:15 hasta la 1:15
Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauce mediante movimiento y retiro de sedimentos de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral y reconformación geomorfológica. Así mismo, se retira basura, escombros, se realiza roceria. Se retira material a correspondientes sitios de deposición final.

Marcela Cadierna Melissa Donado

03-12-2024 Personal de obra: Director, residentes, asesor forestal, asesor ambiental, inspector SISO, PbP, topógrafo, topógrafos cadenera, auxiliar de obra, cuadrilla de obra.
Equipos: retroexcavadora, minirretroexcavadora, minicargador, miniretrocargador, herramienta menor.
clima: soleado
Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimentos de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral y reconformación geomorfológica. Así mismo se retira basura, escombros, se realiza roceria. Se retira material a correspondientes sitios de deposición final.

Melissa Donado Marcela Cadierna

04-12-2024 Personal de obra: Director, residentes, asesor forestal, asesor ambiental, inspector SISO, PbP, topógrafo, topógrafo cadenera, auxiliar de obra, cuadrilla de obra.
Equipos: retroexcavadora, minirretroexcavadora, minicargador, miniretrocargador.
clima: soleado

Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauce mediante movimiento y retiro de sedimentos de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral y reconformación geomorfológica. Así mismo, se retira basura, escombros, se realiza rocería. Se retira material a correspondientes sitios de deposición final.

Parcela adiema

05-12-2024 Personal de obra: Director, residentes, asesor forestal, asesor ambiental, inspector sitio, PGP, topógrafo, topógrafo, cadenero, auxiliar de obra, cuadrilla de obra.

Equipos: retroexcavadora, miniretroexcavadora, minicargador, miniretrocargador, herramienta menor

Clima: Nublado desde la 9:00am hasta las 11:15

Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimentos de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral y reconformación geomorfológica. Así mismo, se retira basura, escombros, se realiza rocería. Se retira material a correspondientes sitios de deposición final.

Melissa Dorado

Parcela adiema

06-12-2024 Personal de obra: Director, residentes, asesor forestal, asesor ambiental, inspector sitio, PGP, topógrafo, topógrafo, cadenero, auxiliar de obra, cuadrilla de obra.

Equipos: retroexcavadora, miniretroexcavadora, minicargador, miniretrocargador, herramienta menor.

Clima: Nublado desde las 9:00 hasta las 11:15

Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauce mediante movimiento y retiro de sedimentos de fondo,

demolición y retiro de rocas de arrastre, drayado lateral, reconformación geomorfológica. Así mismo, retiro de basura, escombros, se realiza rocería. Se retira material a correspondientes sitios de disposición final.

Marcela Cadierna Melissa Bonado

07-12-2024 Personal de obra: Director, residentes, asesor forestal, asesor ambiental, inspector SISO, PbP, topografa, topógrafo, cadenera, auxiliar de obra, cuadrilla de obra.

Equipos: retroexcavadora, miniretroexcavadora, minicargador, miniretrocargador, herramienta menor.

clima: soleado

Actividades: se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimentos de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, drayado lateral y reconformación geomorfológica. Así mismo, se retira basura, escombros, se realizan rocería. Se retira material a correspondientes sitios de deposición final.

Marcela Cadierna

08-12-2024 Día no laboral

09-12-2024 Personal de obra: Director, residentes, asesor forestal, asesor ambiental, inspector SISO, PbP, topografa, topógrafo, cadenera, auxiliar de obra, cuadrilla de obra.

Equipos: retroexcavadora, miniretroexcavadora, minicargador, miniretrocargador, herramienta menor.

clima: Soleado

Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimentos de fondo,

demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral y reconformación geomorpológica. Así mismo, se retira basura, escombros, se realiza rocería. Se retira material a correspondiente sitio de deposición final.

Marcela Cadierna.

10-12-2024 Personal de obra: Director, residentes, asesor forestal, asesor ambiental, inspector siso, GPG, topógrafo, topógrafo, cadenera, auxiliar de obra, cuadrilla de obra.

Equipos: retroexcavadora, miniretroexcavadora, minicargador, miniretrocargador, herramienta menor.

Clima: Soleado

Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimentos de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral y reconformación geomorfológica. Así mismo, se retira basura, escombros, se realiza rocería. Se retira material a correspondientes sitios de deposición final.

Melissa Donado

Marcela Cadierna

11-12-2024 Personal de obra: Director, residentes, asesor forestal, asesor ambiental, inspector siso, GPG, topógrafo, topógrafo, cadenera, auxiliar de obra, cuadrilla de obra.

Equipos: retroexcavadora, miniretroexcavadora, minicargador, miniretrocargador, herramienta menor.

Clima: soleado

Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimentos de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral y reconformación geomorfológica. Así

mismo, se retira basura, escombros, se realiza rocería. Se retira material a correspondientes sitios de deposición final.

Marcela Cadierna

12-12-2024 Personal de obra: Director, residentes, asesor forestal, asesor ambiental, inspector SISO, PGP, topógrafa, topógrafo, cadenera, auxiliar de obra, cuadrilla de obra.

Equipos: retroexcavadora, miniretroexcavadora, minicargador, miniretrocargador, herramienta menor.

Clima. soleado

Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimentos de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral y reconformación geomorfológica. Así mismo, se retira basura, escombros, se realiza rocería. Se retira material a correspondientes sitios de deposición final.

Melissa Dorado

Marcela Cadierna

13-12-2024 Personal de obra: Director, residentes, asesor forestal, asesor ambiental, inspector SISO, PGP, topógrafa, topógrafo, cadenera, auxiliar de obra, cuadrilla de obra.

Equipos: retroexcavadora, miniretroexcavadora, minicargador, miniretrocargador, herramienta menor.

Clima: Nublado desde las 9 hasta las 11:15

Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimentos de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral y reconformación geomorfológica. Así mismo, se retira basura, escombros, se realiza rocería.

	Se retira material a correspondientes sitios de disposición final.
14-12-2024.	Personal de obra: Director, residentes, asesor forestal, asesor ambiental, inspector siso, PSP, topógrafo, topógrafa, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra. Equipos: Retroexcavadora, miniretroexcavadora, micargador, herramienta menor. Clima: Soleado Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimento de fondo, demolición y retiro de arrastre, dragado lateral y reconformación geomorfológica. Así mismo retiran basuras, escombros, se realiza rocería. Se retira material a los correspondientes sitios de disposición final. Se construye cerramiento en malla eslabonada.
15-12-2024	DÍA NO LABORAL.
16-12-2024.	Personal de obra: Director, residentes, asesor forestal, asesor ambiental, inspector siso, PSP, topógrafa, topografo, cadenero, auxiliar de obra, cuadrillas de obra. Equipos: Retroexcavadora, miniretroexcavadora, micargador, miniretrocargador, herramienta menor. Clima: Soleado Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimento de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral y reconformación geomorfológica. Así mismo se retiran basuras, escombros, se realiza rocería. Se retira material a los correspondientes sitios de disposición final. Se construye

cerramiento en malla eslabonada.

17-12-2024. Personal de obra: Director, residentes, asesor forestal, asesor ambiental, inspector SISO, PGP, topógrafo, topógrafa, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra.

Equipos: Retroexcavadora, miniretroexcavadora, minicargador, miniretrocargador, herramienta menor.

Clima: Lluvia moderada desde las 6:16 hasta las 8:00

Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimientos y retiro de sedimento de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral, y reconformación geomorfológica. Así mismo se retiran basuras, escombros, se realiza rocería. Se retira material a los correspondientes Sitios de disposición final. Se construye cerramiento en malla eslabonada.

18-12-2024. Personal de obra: Director, residentes, asesor forestal, asesor ambiental, inspector SISO, PGP, topógrafo, topógrafa, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra.

Equipos: Retroexcavadora, miniretroexcavadora, minicargador, miniretrocargador herramienta menor.

Clima: Soleado.

Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimientos y retiro de sedimento de fondo, demolición y retiro de roca de arrastre dragado lateral, y reconformación geomorfológica. Así mismo se retiran basuras, escombras, se realiza rocería. Se retira material a los correspondientes sitios de disposición final. Se construye cerramiento en malla eslabonada.

19-12-2024. Personal de obra: Director, residentes, asesor forestal, asesor ambiental, inspector SISO, PGP, topógrafo, topógrafa, cadenera,

auxiliar de obra, cuadrillas de obra.
Equipos: Retroexcavadora, miniretroexcavadora, minicargador, miniretrocargador, herramienta menor.
Clima: Soleado.
Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimento de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral y reconformación geomorfológica. Así mismo se retiran basuras, escombros, se realiza rocería. Se retira material a los correspondientes sitios de disposición final. Se construye cerramiento en malla eslabonada.

20-12-2024. Personal de obra: Director, residentes, asesor forestal, asesor ambiental, inspector siso, PSP, topógrafo, topógrafa, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra.
Equipos: Retroexcavadora, miniretroexcavadora, minicargador, miniretrocargador, herramienta menor.
Clima: Lluvia moderada desde las 8:45 hasta las 11:00
Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimento de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral y reconformación geomorfológica. Así mismo se retiran basuras, escombros, se realiza rocería Se retira material a los correspondientes sitios de disposición final. Se construye cerramiento en malla eslabonada Se realiza mantenimiento perimetral y en alturas de grupos de guaduas.

21-12-2024 Personal de obra: Director, residentes, asesor forestal, asesor ambiental, inspector siso, PSP, topógrafo, topógrafa, cadenera, auxiliar, de obra, cuadrillas de obra.
Equipos: Retroexcavadora, miniretroexcavadora, minicargador, miniretrocargador, herramienta menor.

Clima: Lluvia moderada desde las 13:00 hasta las 16:15.
Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimento de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral y reconformación geomorfológica. Así mismo se retiran basuras, escombros, se realiza rocería. Se retira material a los correspondientes sitios de disposición final. Se construye cerramiento en malla eslabonada. Se realiza mantenimiento permetral y en altura de grupos de guaduas.

22-12-2024. DÍA NO LABORAL.

23-12-2024. Personal de obra: Director, residente, asesor forestal, asesor ambiental, inspector siso, PGP, topógrafa, topógrafa, cadenero, auxiliar de obra, cuadrillas de obra.
Equipos: Retroexcavadora, miniretroexcavadora, minicargador, miniretrocargador, herramienta menor.
Clima: Nublado desde las 7:00 hasta las 10:45.
Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimento de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral y reconformación geomorfológica. Así mismo se retiran basuras, escombros, se realiza rocería. Se retira material a los correspondientes sitios de disposición final. Se construye cerramiento en malla eslabonada. Se realiza mantenimiento permetral y en altura de grupos de guaduas.

24-12-2024 Personal de obra: Director, residentes, asesor forestal, asesor ambental, inspector SSO, PGP, topógrafo, topógrafa, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra.

	Equipos: Retroexcavadora, miniretrocargador, Minicargador, minuretroexcavadora, volquetas, herramienta menor. Clima: Lluvia moderada desde las 12:45 hasta las 15:00 Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimento de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral y reconformación geomorfológica. Así mismo se retiran basuras, escombros, se realiza rocería, Se retira material a los correspondientes sitios de disposición final. Se construye cerramiento en malla eslabonada. Se realiza mantenimiento perimetral y en alturas de guaduas.
25-12-2024	DÍA NO LABORAL.
26-12-2024	Personal de obra: Director, residentes, asesor forestal, asesor ambiental, inspector SISO, PGP, topógrafo, topógrafa, cadenera, auxiliar de obra, Cuadrillas de obra. Equipos: Retroexcavadora, miniretroexcavadora, minicargador, miniretrocargador, volquetas, herramienta menor. Clima: Lluvia moderada desde las 7:15 hasta las 10:30. Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimento de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral y reconformación geomorfológica. Así mismo se retiran basuras, escombros, se realiza rocería. Se retira material a los correspondientes sitios de disposición final. Se construye cerramiento en malla eslabonada. Se realiza mantenimiento perimetral y en alturas de grupos de guaduas.
27-12-2024.	Personal de obra: Director, residentes, asesor forestal, asesor ambiental

	Inspector SISO, PSP, topógrafo, topógrafa, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra. Equipos: Retroexcavadora, miniretroexcavadora, minicargador, miniretrocargador, volquetas y herramienta menor. Clima: Lluvia fuerte desde las 13:45 hasta las 16:30. Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimento de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral y reconformación geomorfológica. Así mismo se retiran basuras, escombros, se realiza rocería. Se retira material a los correspondientes sitios de disposición final. Se construye cerramiento en malla eslabonada. Se realiza mantenimiento perimetral y en alturas de grupos de guaduas.
28-12-2024.	Personal de obra: Director, residentes, asesor forestal, asesor ambiental, inspector SISO, PSP, topógrafo, topógrafa, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra. Equipos: Retroexcavadora, miniretroexcavadora, minicargador, miniretrocargador, volquetas y herramienta menor. Clima: Soleado. Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimento de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral y reconformación geomorfológica. Así mismo se retiran basuras, escombros, se realiza rocería. Se retira material a los correspondientes sitios de disposición final. Se construye cerramiento en malla eslabonada. Se realiza mantenimiento perimetral y en alturas de grupos de guaduas.
29-12-2024	DÍA NO LABORAL.

30-12-2024.	Personal de obra: Director, residentes, asesor Forestal, asesor ambiental, inspector Siso, PGP, topógrafo, topógrafa, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra. Equipos: Retroexcavadora, miniretroexcavadora, minicargador, miniretrocargador, volquetas, herramienta menor. Clima: Soleado. Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimento de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral y reconformación geomorfológica. Así mismo se retiran basuras, escombros, se realiza rocería. Se retira material a los correspondientes sitios de disposición final. Se construye cerramiento en malla eslabonada. Se realiza mantenimiento perimetral y en altura de grapos de guaduas.
31-12-2024.	Personal de obra: Director, residentes, asesor forestal, asesor ambiental, inspector siso, PGP, topógrafo, topógrafa, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra. Equipos: Retroexcavadora, miniretroexcavadora, minicargador, miniretrocargador, volquetas, herramienta menor. Clima: Soleado desde las 9:00 hasta las 12:30 Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimento de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral y reconformación geomorfológica. Así mismo se retiran basuras, escombros, se realiza rocería. Se retira material a los correspondientes sitios de disposicion final. Se construye cerramiento en malla eslabonada. Se realiza mantenimiento permetral y en altura de grapos de guaduas.
1-01-2025	DÍA NO LABORAL.

2-01-2025 Personal de obra: Director, residentes, asesor forestal, asesor forestal, asesor ambiental, inspector SISO, PSP, topógrafo, topógrafa, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra.
Equipos: Retroexcavadora, miniretroexcavadora, minicargador, miniretrocargador, volquetas, herramienta menor.
Clima: Lluvia moderada desde las 9:45 hasta las 12:15.
Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimento de fondo, demolición y retiro de rocas de sedimento de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral y reconformación geomorfológica. Así mismo se retiran basuras, escombros, se realiza rocería. Se retira material a los correspondientes sitios de disposición final. Se construye cerramiento en malla eslabonada. Se realiza mantenimiento perimetral y en altura de grupos de guaduas.

3-01-2025. Personal de obra: Director, residentes, asesor forestal, asesor ambiental, inspector SISO, PSP, topógrafo, topógrafa, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra.
Equipos: Retroexcavadora, miniretroexcavadora, minicargador, miniretrocargador, volquetas, herramienta menor.
Clima: Lluvia fuerte desde las 7:00 hasta las 10:45
Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimento de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral y reconformación geomorfológica. Así mismo se retiran basuras, escombros, se realiza rocería. Se retira material a los correspondientes sitios de disposicion final. Se construye cerramiento en malla eslabonada. Se realiza mantenimiento perimetral y en altura de grupos de guaduas.

4-01-2025. Personal de obra: Director, residentes, asesor forestal, asesor ambiental, inspector SISO, PSP, topógrafo, topógrafa, cadenera,

	auxiliar de obra, herramienta menor. Equipos: Retroexcavadora, miniretrocargador, miniretroexcavadora, mini cargador, volquetas, herramienta menor. Clima: Soleado. Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimento de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral y reconformación geomorfologica. Así mismo se retiran basuras, escombros, se realiza rocería. Se retira material a los correspondientes sitios de disposición final. Se construye cerramiento en malla eslabonada. Se realiza mantenimiento perimetral y en altura de grupos de guaduas.
5-01-2025	DÍA NO LABORAL
6-01-2025	DÍA NO LABORAL
7-01-2025.	Personal de obra: Director, residente, asesor forestal, asesor ambiental, inspector SISO, PGP, topógrafo, topógrafa, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra. Equipos: Retroexcavadora, miniretroexcavadora, minicargador, miniretrocargador, volqoetas, herramienta menor. Clima: Lluvia fuerte desde las 9:15 hasta las 12:00 Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimento de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral y reconformación geomorfológica. Así mismo se retiran basuras, escombros, se realiza rocería. Se retira material a los correspondientes sitios de disposicion final. Se construye cerramiento en malla eslabonada.

Se realiza mantenimiento perimetral y en altura de grapas de gaviones.

8-01-2025. Personal de obra: Directora, residentes, asesor forestal, asesor ambiental, inspector SISO, PSE, topógrafo, topógrafa, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra.

Equipos: Retroexcavadora, minirretroexcavadora, minicargador, mini retrocargador, volquetas, herramienta menor.

Clima: Soleado.

Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimento de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral y reconformación geomorfológica. Así mismo se retiran basuras, escombros, se realiza rocería. Se retira material a los correspondientes sitios de disposición final. Se construye cerramiento en malla eslabonada. Se realiza mantenimiento perimetral y en altura de grapas de gaviones.

-01-2025. Personal de obra: Director, residentes, asesor forestal, asesor ambiental, inspector SISO, PSE, topógrafo, topógrafa, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra.

Equipos: Retroexcavadora, minirretroexcavadora, minicargador, minirretrocargador, volquetas y herramienta menor.

Actividades: Soleado.

Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimento de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral y reconformación geomorfológica. Así mismo se retiran basuras, escombros, se realiza rocería. Se retira material a los correspondientes sitios de disposición final. Se construye cerramiento en malla eslabonada. Se realiza mantenimiento perimetral y en altura de grapas de gaviones.

10-01-2025.	Personal de obra: Director, residentes asesor forestal, asesor ambiental, inspector SISO, PSP, topógrafo, topógrafa, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra. Equipos: Retroexcavadora, miniretroexcavadora, minicargador, miniretrocargador, volquetas, herramienta menor. Clima: Soleado. Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimento de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral y reconformación geomorfológica. Así mismo se retiran basuras, escombros, se realiza rocería. Se retira material a los correspondientes sitios de disposicion final. Se construye cerramiento en malla eslabonada. Se realiza mantenimiento perimetral y en altura de grupos de guaduas.
11-01-2025.	Personal de obra: Director, residentes, asesor forestal, asesor ambiental, inspector SISO, PSP, topógrafo, topógrafa, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra. Equipos: Retroexcavadora, miniretroexcavadora, minicargador, miniretrocargador, volquetas, herramienta menor. Clima: Soleado. Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimientos y retiro de sedimento de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral, y reconformación geomorfológica. Así mismo se retiran basuras, escombros, se realiza rocería, Se retira material a las correspondientes sitios de disposicion final. Se construye cerramiento en malla eslabonada. Se realiza mantenimiento perimetral y en altura de grupos de guaduas.
12-01-2025.	DÍA NO LABORAL

13-01-2025. Personal de obra: Director, residentes, asesor forestal, asesor ambiental, inspector SISO, PSL, topógrafo, topógrafa, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra.
Equipos: Retroexcavadora, miniretroexcavadora, minicargador, miniretrocargador, volquetas, herramienta menor.
Clima: Lluvia fuerte desde las 13:30 hasta las 16:45.
Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimento de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral, y reconformación geomorfológica. Así mismo se retiran basuras, escombros, se realiza rocería Se retira material a los correspondientes sitios de disposición final Se construye cerramiento en malla eslabonada. Se realiza mantenimiento perimetral y en altura de grupos de guaduas.

14-01-2025. Personal de obra: Director, residentes, asesor forestal, asesor ambiental, inspector SISO, PSL, topógrafa, topógrafo, cadenero, auxiliar de obra, cuadrillas.
Equipos: Retroexcavadora, miniretroexcavadora, minicargador, miniretrocargador, volquetas, herramienta menor.
Clima: Nublado desde las 11:15 hasta las 14:15
Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimento de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral y reconformación geomorfológica. Así mismo se retiran basuras, escombros, se realiza rocería Se retira material a los correspondientes sitios de disposicion final. Se construye cerramiento en malla eslabonada Se realiza mantenimiento perimetral y en altura de grupos de guaduas.

15-01-2025. Personal de obra: Director, residentes asesor forestal, asesor ambiental, inspector SISO, PSL, topógrafo, topografa, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra.
Equipos: Retroexcavadora, miniretroexcavadora, minicargador, miniretrocarga-

dor, volquetas, herramienta menor.
Clima: Lluvia fuerte desde las 11:00 hasta las 14:15.
Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimento de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral y reconformación geomorfológica. Así mismo se retiran basuras, escombros, se realiza rocería. Se retira material a los correspondientes sitios de disposición final. Se construye cerramiento en malla eslabonada. Se realiza mantenimiento perimetral y en altura de gaviones de guaduas.

16-01-2025. Personal de obra: Director, residentes, asesor forestal, asesor ambiental, inspector SISO, PSP, topógrafo, topógrafa, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra.
Equipos: Retroexcavadora, minirretroexcavadora, minicargador, minirretrocargador, volquetas, herramienta menor.
Clima: Soleado.
Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimento de fondo; demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral y reconformación geomorfológica. Así mismo se retiran basuras, escombros, se realiza rocería. Se retira material a los correspondientes sitios de disposición final. Se construye cerramiento en malla eslabonada. Se realiza mantenimiento perimetral y en altura de gaviones de guaduas.

17-01-2025. Personal de obra: Director, residentes, asesor forestal, asesor ambiental, inspector SISO, PSP, topógrafo, topógrafa, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra.
Equipos: Retroexcavadora, minirretroexcavadora, minicargador, minirretrocargador, volquetas, herramienta menor.
Clima: Soleado.

Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimento de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral y reconformación geomorfológica. Así mismo se retiran basuras, escombros, se realiza rocería. Se retira material a los correspondientes sitios de disposición final. Se construye cerramiento en malla eslabonada. Se realiza mantenimiento perimetral y en altura de grupos de gaviones.

18-01-2025. Personal de obra: Director, residente, asesor forestal, asesor ambiental, inspector siso, PSP, topógrafo, topógrafa, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra.

Equipos: Retroexcavadora, miniretroexcavadora, minicargador, miniretrocargador, volquetas y herramienta menor.

Clima: Soleado.

Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimento de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral, y reconformación geomorfológica. Así mismo se retiran basuras, escombros, se realiza rocería. Se retira material a los correspondientes sitios de disposición final. Se construye cerramiento en malla eslabonada. Se realiza mantenimiento perimetral y en altura de grupos de gaviones.

19-01-2025. DÍA NO LABORAL.

20-01-2025. Personal de obra: Director, residente, asesor forestal, asesor ambiental, inspector siso, PSP, topógrafo, topógrafa, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra.

Equipos: Retroexcavadora, miniretroexcavadora, minicargador, miniretrocar-

gador, volquetas, herramienta menor.
Clima: Llovia fuerte desde las 6:15 hasta las 9:45.
Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimento de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral y reconformación geomorfológica. Así mismo se retiran baseras, escombros, se realiza rocería, se retira material a los correspondientes sitios de disposición final. Se construye cerramiento en malla eslabonada. Se realiza mantenimiento perimetral y en altura de grapas de goadoras.

Rocería

21-01-2025. Personal de obra: Director, residentes, asesor forestal, asesor ambiental, inspector SISO, PSP, topógrafo, topógrafa, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra
Equipos: Retroexcavadora, minirretroexcavadora, minicargador, minirretrocargador, volquetas, herramienta menor.
Clima: Soleado.
Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimento de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral, y reconformación geomorfologica. Así mismo se retiran baseras, escombros, se realiza rocería. Se retira material a los correspondientes sitios de disposición final. Se construye cerramiento en malla eslabonada. Se realiza mantenimiento perimetral y en altura de grapas de goadoras.

Rocería

22-01-2025. Personal de obra: Director, residentes, asesor forestal, asesor ambiental, inspector SISO, PSP, topógrafo, topógrafa, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra.
Equipos: Retroexcavadora, minirretroexcavadora, minicargador, minirretrocargador, volquetas, herramienta menor.
Clima: Soleado-desde las 6:45 hasta las 9:00

Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimento de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral y reconformación geomorfológica. Así mismo se retiran basuras, escombros, se realiza rocería. Se retira material a los correspondientes sitios de disposicion final. Se construye cerramiento en malla eslabonada. Se realiza mantenimiento perimetral y en altura de grapos de guaduas.

23-01-2025. Personal de obra: Director, residentes, asesor forestal, asesor ambiental, inspector siso, PSP, topógrafo, topógrafa, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra

Equipos: Retroexcavadoras, minirretroexcavadora, minicargador, minirretrocargador, volquetas, herramienta menor.

Clima: Soleado

Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimento de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral y reconformación geomorfológica. Así mismo se retiran basuras, escombros, se realiza rocería. Se retira material a los correspondientes sitios de disposición final. Se construye cerramiento en malla eslabonada. Se realiza mantenimiento perimetral y en altura de grapos de guaduas.

24-01-2025. Personal de obra: Director, residentes, asesor forestal, asesor ambiental, inspector. siso, PSP, topógrafo, topógrafa, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra.

Equipos: Retroexcavadora, minirretroexcavadora, minicargador, minirretrocargador, volquetas, herramienta menor.

Clima: Soleado desde las 9:15 hasta las 12:00

Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimento de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral y reconformación geomorfológica. Así mismo se

retiran basuras, escombros, se realiza roceria. Se retira material a los correspondientes sitios de disposicion final. Se construye cerramiento en malla eslabonada. Se realiza mantenimiento perimetral y en altura de grapas de guaduas.

25-01-2025. Personal de obra: Director, residentes, asesor forestal, asesor ambiental, inspector SISO, PGP, topógrafo, topógrafa, cadenera, auxiliar de obra cuadrillas de obra.

Equipos: Retroexcavadora, miniretrocargador, miniretroexcavadora, minicargador, volquetas, herramienta menor.

Clima: Soleado desde las 10:30 hasta las 13:00.

Actividades: Se llevo a cabo intervencion de cauces mediante movimiento y retiro de sedimento de fondo, demolicion y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral y reconformacion geomorfologica. Asi mismo se retiran basuras, escombros, se realiza roceria. Se retira material a los correspondientes sitios de disposicion final. Se construye cerramiento en malla eslabonada. Se realiza mantenimiento perimetral y en altura de grapas de guaduas.

26-01-2025. DÍA NO LABORAL.

27-01-2025. Personal de obra: Director, residentes, asesor forestal, asesor ambiental, inspector SISO, PGP, topógrafo, topógrafa, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra.

Equipos: Retroexcavadora, miniretroexcavadora, minicargador, miniretrocargador, volquetas, herramienta menor.

Clima: Soleado desde las 12:00 hasta las 15:00

Actividades: Se lleva a cabo intervencion de cauces mediante movimiento

y retiro de sedimento de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral, y reconformación geomorfológica. Así mismo se retiran basuras, escombros, se realiza rocería. Se retira material a los correspondientes sitios de disposición final. Se construye cerramiento en malla eslabonada. Se realiza mantenimiento perimetral y en altura de grupos de gaviones.

Marcela.

28-01-2025 Personal de obra: Director, residentes, asesor forestal, asesor ambiental, inspector SISO, PGP, topógrafo, topógrafa, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra.

Equipos: Retroexcavadora, minirretroexcavadora, minicargador, retrocargador, volquetas, herramienta menor.

Clima: Soleado.

Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimento de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral y reconformación geomorfológica. Así mismo se retiran, basuras, escombros, y se realiza rocería. Se retira material a los correspondientes sitios de disposición final. Se construye cerramiento en malla eslabonada. ~~Se realiza mantenimiento~~ perimetral y en altura de grupos de gaviones.

Marcela.

29-01-2025. Personal de obra: Director, residentes, asesor forestal, asesor ambiental, inspector SISO, PGP, topógrafo, topógrafa, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra.

Equipos: Retroexcavadora, minirretroexcavadora, minicargador, minirretrocargador, volquetas, herramienta menor.

Clima: Soleado.

Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimientos y retiro de sedimento de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral y reconformación geomorfológica. Así mismo

se retiran basuras, escombros, se realiza rocería, se retira material a los correspondientes sitios de disposición final. Se construye cerramiento en malla eslabonada. Se realiza mantenimiento perimetral y en altura de grupos de guaduas.

Arcela

30-01-2025. Personal de obra: Director, residentes, asesor ambiental, asesor forestal, inspector siso, PSP, topógrafo, topógrafa, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra.

Equipos: Retroexcavadora, minirretroexcavadora, minicargador, minirretrocargador, volquetas, herramienta menor.

Clima: Soleado.

Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimento de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral y reconformación geomorfológica. Así mismo se retiran basuras, escombros, se realiza rocería. Se retira material a los correspondientes sitios de disposición final. Se construye cerramiento en malla eslabonada. Se realiza mantenimiento perimetral y en altura de grupos de guaduas.

Arcela

31-01-2025 Personal de obra: Director, residentes, asesor forestal, asesor ambiental, inspector SISO, PSP, topógrafo, topógrafa, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra

Equipos: Retroexcavadora, minirretroexcavadora, minirretrocargador, minicargador, volquetas, herramienta menor.

Clima: Nublado desde las 12:45 hasta las 15:30

Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimento de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral y reconformación geomorfológica. Así mismo se retiran basuras, escombros, se realiza rocería. Se retira material a los correspondientes sitios de disposición final. Se construye cerra-

	miento en malla eslabonada. Se realiza mantenimiento permetral y en altura de grupos de guaduas.
1-02-2025.	Personal de obra: Director, residentes, asesor forestal, asesor ambiental, inspector siso, PSP, topógrafo, topógrafa, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra. Equipos: Retroexcavadora, minirretroexcavadora, minicargador, minirretrocargador, volquetas, herramiento menor. Clima: Soleado Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimento de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral, y reconformación geomorfológica. Así mismo se retiran basuras, escombros, se realiza roceria. Se retira material a los correspondientes sitios de disposición final. Se construye cerramiento en malla eslabonada. Se realiza mantenimiento perimetral y en altura de grupos de guaduas.
2-02-2025.	DÍA NO LABORAL.
3-02-2025.	Personal de obra: Director, residentes, asesor forestal, asesor ambiental, inspector siso, PSP, topógrafa, topógrafo, cadenero, auxiliar de obra, cuadrillas de obra. Equipos: Retroexcavadora, minirretrocavadora, minicargador, minirretrocargador, volquetas, herramienta menor. Clima: Soleado. Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimento de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral y reconformación geomorfológica.

Así mismo se retiran basuras, escombros, se realiza rocería. Se retira material a los correspondientes sitios de disposición final. Se construye cerramiento en malla eslabonada. Se realiza mantenimiento perimetral y en altura de grupos de guaduas.

4-02-2025. Personal de obra: Director, residentes, asesor forestal, asesor ambienta, inspector de obra, SSO, PGP, topógrafa, topógrafa, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra.

Equipos: Miniretroexcavadora, Retroexcavadora, minicargador, miniretrocargador, Volquetas, herramienta menor.

Clima: Lluvia moderada desde las 11:00 hasta las 14:30

Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimento de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral, y reconformación geomorfológica. Así mismo se retiran basuras, escombros, se realiza rocería. Se retira material a los correspondientes sitios de disposición final. Se construye cerramiento en malla eslabonada. Se realiza mantenimiento perimetral y en altura de grupos de guaduas.

5-02-2025. Personal de Obra: Director, residentes, asesor forestal, asesor ambiental, inspector de obra, SISO, PGP, topógrafa, topógrafa, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra.

Equipos: Retroexcavadora, miniretroexcavadora, minicargador, miniretrocargador, volquetas, herramienta menor.

Clima: Lluvia fuerte desde las 13:00 hasta las 16:00

Actividades: Se lleva a cabo intervencion de cauces mediante movimiento y retiro de sedimento de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral y reconformación geomorfológica. Así mismo se retiran basuras, escombros, se realiza rocería. Se retira material a los correspondientes sitios de disposición final. Se construye cerramiento en malla.

estabonada. Se realiza mantenimiento perimetral y en altura de grupos de guaduas.

6-02-2025. Personal de obra: Director, residentes, asesor forestal, asesor ambiental, inspector siso, PSP, topógrafo, topógrafa, cadenera, auxiliar de obra cuadrillas de obra.

Equipos: Retroexcavadora, minirretroexcavadora, minicargador, minirretrocargador, volqueta, herramienta menor.

Clima: Lluvia moderada desde las 7:15 hasta las 10:00.

Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimento de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral, y reconformación geomorfológica. Así mismo se retiran basuras, escombros, se realiza roceria. Se retira material a los correspondientes sitios de disposición final. Se construye cerramiento en malla estabonada. Se realiza mantenimiento perimetral y en altura de grupos de guaduas.

-02-2025 Personal de obra: Director, residentes, asesor forestal, asesor ambiental, inspector siso, PSP, topógrafo, topógrafa, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra.

Equipos: Retroexcavadora, minirretroexcavadora, minicargador, minirretrocargador, volqueta, herramienta menor.

Clima: Nublado desde las 14:00 hasta las 17:30.

Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimento de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral, y reconformación geomorfológica. Así mismo se retiran basuras, escombros, se realiza roceria, Se retira material a los correspondientes sitios de disposición final. Se construye cerramiento en malla estabonada. Se realiza mantenimiento perimetral y en altura de grupos de guaduas.

8-02-2025.	Personal de obra: Director, residentes, asesor forestal, asesor ambiental, inspector SISO, PGP, topógrafo, topógrafa, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra. Equipos: Retroexcavadora, miniretroexcavadora, minicargador, miniretrocargador, volquetas, herramienta menor. Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimento de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral y reconformación geomorfológica. Así mismo se retiran basuras, escombros y se realiza rocería. Se retira material a los correspondientes sitios de disposición final. Se construye cerramiento en malla eslabonada. Se realiza mantenimiento perimetral y en altura de grupos de guaduas.
9-02-2026.	DÍA NO LABORAL
10-02-2025.	Personal de obra: Director, residentes, asesor forestal, asesor ambiental, inspector SISO, PGP, topógrafo, topografa, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra. Equipos: Retroexcavadora, miniretrocargador, miniretroexcavadora, minicargador, volquetas, herramienta menor. Clima: Lluvia fuerte desde las 11:45 hasta las 14:30. Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimento de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral y reconformación geomorfológica. Así mismo se retiran basuras, escombros, se realiza rocería. Se retira material a los correspondientes sitios de disposición final. Se construye cerramiento en malla eslabonada. Se realiza mantenimiento perimetral y en altura de grupos de guaduas.

11-02-2025	Personal de obra: Director, residentes, asesor forestal, asesor ambiental, inspector SISO, PGP, topógrafo, topógrafa, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra. Equipos: Retroexcavadora, minirretroexcavadora, mincargador, minirretrocargador, volquetas, herramienta menor. Clima: Soleado. Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimento de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral y reconformación geomorfológica. Así mismo se retiran basuras, escombros, se realiza rocería Se retira material a los correspondientes sitios de disposicion final, Se construye cerramiento en malla eslabonada. Se realiza mantenimiento perimetral y en altura de grupos de guaduas.
12-02-2025	Personal de obra: Director, residentes, asesor forestal, asesor ambiental, inspector SISO, PGP, topógrafo, topógrafa, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra. Equipos: Retroexcavadora, minirretroexcavadora, mincargador, minirretrocargador, volquetas, herramienta menor. Clima: Lluvia fuerte desde las 12:30 hasta las 15:15. Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimento de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral y reconformación geomorfológica. Así mismo se retiran basuras, escombros, se realiza rocería. Se retira material a las correspondientes sitios de disposición final. Se construye cerramiento en malla eslabonada. Se realiza mantenimiento perimetral, y en altura de grupos de guaduas.
13-02-2025	Personal de obra: Director, residentes, asesor forestal, asesor ambiental, inspector SISO, PGP, topógrafo, topógrafa, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra. Equipos: Retroexcavadora, minirretroexcavadora, mincargador, minirretrocargador,

Volquetas, herramienta menor.
Clima: Nublado desde las 12:00 hasta las 15:00.
Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimento de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral y reconformación geomorfológica. Así mismo se retiran, basuras, escombros y se realiza roceria. Se retira material a los correspondientes sitios de disposición final. Se construye cerramiento en malla eslabonada. Se realiza mantenimiento perimetral y en altura de grupos de guaduas.

14-02-2025 Personal de obra: Director, residentes, asesor forestal, asesor ambiental, inspector SISO, PGP, topógrafo, topógrafa, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra. 17
Equipos: Retroexcavadora, minirretroexcavadora, minicargador, minirretrocargador Volquetas, herramienta menor.
Clima: Soleado.
Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimento de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral, y reconformación geomorfológica. Así mismo se retiran, basuras, escombros, Se realiza roceria. Se retira material a las correspondientes sitios de disposición final. Se construye cerramiento en malla eslabonada. Se realiza mantenimiento perimetral y en altura de grupos de guaduas.

15-02-2025. Personal de obra: Director, residentes, asesor forestal, asesor ambiental, inspector SISO, PGP, topógrafo, topógrafa, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra. 18
Equipos: Retroexcavadora, minirretroexcavadora, minicargador, minirretrocargador, volquetas, herramienta menor.
Clima: Lluvia moderada desde las 13:15 hasta las 16:15

	Actividades: Se llevo a cabo intervención de cauces mediante movimientos y retiro de sedimento de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral y reconformación geomorfológica. Así mismo se retiran basuras, escombros, se realiza roceria, se retira material a los correspondientes sitios de disposición final. Se construye cerramiento en malla eslabonada. Se realiza mantenimiento perimetral y el altura de grupos de guaduas. Roceria.
16-02-2024	DÍA NO LABORAL.
17-02-2025.	Personal de Obra: Director, residentes, asesor forestal, asesor ambiental, inspector SISO, PGP, topografa, topógrafo, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra. Equipos: Retroexcavadora, miniretroexcavadora, minicargador, miniretrocargador, volquetas, herramienta menor. Clima: Soleado. Actividades: Se llevo a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimento de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral y reconformación geomorfológica. Así mismo se retiran basuras, escombros, se realiza roceria, Se retira material a los correspondientes sitios de disposicion final. Se construye cerramiento en malla eslabonada. Se realiza mantenimiento perimetral y en altura de grupos de guaduas. Roceria
18-02-2025.	Personal de Obra: Director, residentes, asesor forestal, asesor ambiental, inspector SISO, PGP, topógrafo, topógrafa, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra. Equipos: Retroexcavadora, miniretroexcavadora, minicargador, minirretrocargador, volquetas, herramienta menor.

	Clima: Nublado desde las 9:30 hasta las 12:45. Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimento de Fondo, demolición y retilo de rocas de arrastre, dragado lateral y reconformación geomorfológica. Así mismo se retiran basuras, escombros, se realiza rocería. Se retira material a los correspondientes sitios de disposicion Final. Se construye cerramiento en malla eslabonada. Se realiza mantenimiento perimetral y en altura de grupos de guaduas. Carcela
19-02-2025	Personal de obra: Director, residente, asesor Forestal, asesor ambiental, inspector SISO, PGP, topógrafo, topógrafa, cadenera, auxiliar de obra, Cuadrillas de obra. Equipos: Retroexcavadora, miniretroexcavadora, minicargador, miniretrocargador, Volquetas, herramienta menor. Clima: lluvia moderada desde las 15:00 hasta las 18:30. Actividades: se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimento de Fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral y reconformación geomorfológica. Así mismo se retiran basuras, escombros, se realiza rocería. Se retira material a los correspondientes sitios de disposicion final. Se construye cerramiento en malla. eslabonada. Se realiza mantenimiento pelimetral y en altura de grupos de guaduas. Carcela

20-02-2025	Personal de obra: Director, residentes, asesor Forestal, asesor ambiental, inspector SISO, PGP, topógrafo topógrafa, Cadenera, auxiliar de obra, Cuadillas de obra. Equipos: Retroexcavadora, miniretro excavadora, minicargador miniretrocargador, Volquetas, herramienta menor Clima: lluvia Fuerte desde las 14:15 hasta las 17:15. Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimento de Fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, diagado lateral y reconformación geomorfológica. Asi mismo se retiran basuras, escombros, se realiza rocería. se retira material a los correspondientes sitios de disposicion Final. Se construye cerramiento en malla eslabonada. Se realiza recuperación de cerramiento existente Se realiza mantenimiento perimetral y en altura de grupos de guaduas.
21-02-2025.	Personal de obra: Director, residentes, asesor Forestal, asesor. ambiental, inspector SISO, PGP, topógrafo, topógrafa, Cadenera, auxiliar de obra, Cuadillas de obra. Equipos: Retroexcavadora, miniretro excavadora, minicargador, miniretrocargador, Volquetas, herramienta menor. Clima: Lluvia moderada desde las 6:00 hasta las 9:45. Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimento de Fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, diagado lateral y reconformación geomorfológica. Asi mismo se retiran basuras, escombros, se realiza rocería. Se retira material a los correspondientes sitios de disposicion Final. Se construye Cerramiento en malla eslabonada. Se realiza recuperación existente. Se realiza mantenimiento.

	perimetral y en altura de grupos de guaduas.
22-02-2025.	Personal de obra: Director, residentes, asesor Forestal, asesor ambiental, inspector SISO, PGP, topógrafo, topógrafa, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra. Equipos: Retroexcavadora, miniretroexcavadora, minicargador, miniretrocargador, Volquetas, herramienta menor. Clima: Soleado. Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimientos y retiros de sedimiento de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral y reconformación geomorfologica. Así mismo se retiran basuras, escombros, se realiza rocería. Se retira material a los correspondientes sitios de disposicion Final. Se Construye cerramiento en malla eslabonada. Se realiza recuperación de cerramiento existente. Se realiza mantenimiento perimetral y en altura de grupos de guaduas.
23-02-2025	Dia no laboral
24-02-2025	Personal de Obra: Director, residentes, asesor Forestal, asesor ambiental, inspector SISO, PGP, topógrafo, topógrafa, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra. Equipos: Retroexcavadora, miniretroexcavadora, minicargador, miniretrocargador, Volquetas, herramienta menor.

Clima: Nublado desde las 8:00 hasta las 11:30
Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimiento de Fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral y reconformación geomorfológica. Así mismo se retiran basuras, escombros, se realiza rocería. Se retira material a los correspondientes sitios de disposicion final. Se construye cerramiento en malla eslabonada. Se realiza recuperación de cerramiento existente. Se realiza mantenimiento perimetral y en altura de grupos de guaduas.

Cadena

25-02-2025. Personal de Obra: Director, residentes, asesor Forestal, asesor ambiental, inspector SISO, PGP, topógrafo, topógrafa, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra
Equipos: Retroexcavadora, miniretroexcavadora, minicargador, miniretrocargador, Volquetas, herramienta menor.
Clima: Soleado desde las 11:45 hasta las 14:15.
Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimento de Fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral y reconformación geomorfológica. Así mismo se realiza el retiro de basuras escombros, se realiza rocería, se retira material a los correspondientes sitios de disposicion Final. Se construye cerramiento en malla eslabonada. Se realiza recuperación de cerramiento existente. Se realiza mantenimiento Perimetral y en altura de grupos de guaduas.

Cadena

26-02-2025.	Personal de obra: Director, residentes, asesor Forestal, asesor ambiental, inspector SISO, P&P, topógrafo, topografa, Cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra. Equipos: Retroexcavadora, miniretroexcavadora, minicargador, miniretrocargador, Volquetas, herramienta menor. Clima: lluvia moderada desde las 6:30 hasta las 9:15 Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimento de fondo, demolición y retiro de rocas de anastre, dragado lateral y reconformación geomorfológica. Asi mismo se retiran basuras, escombros, se realiza roceria. Se retira material a los correspondientes sitios de disposicion Final. Se construye cerramiento en malla eslabonada. Se realiza recuperación de cerramiento existente. Se realiza mantenimiento perimetral y en altura de grupos de guaduas. Garcia.
27-02-2025	Personal de Obra: Director, residentes, asesor Forestal, asesor ambiental, inspector SISO, P&P, topógrafo, topografa, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra. Equipos: Retroexcavadora, miniretroexcavadora, minicargador, miniretrocargador, Volquetas, herramienta menor. Clima: Soleado desde las 13:00 hasta las 16:15. Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces. mediante movimiento y retiro de sedimento de fondo, demolición y retiro de rocas de anastre, dragado lateral y reconformación geomorfologica. Asi mismo se retiran basuras, escombros, se realiza roceria. Se retira material a los correspondientes sitios de disposicion Final. Se Construye cerramiento

en malla eslabonada. Se realiza recuperación de cerramiento existente. Se realiza mantenimiento perimetral y en altura de grupos de guaduas.

Parcela.

28-02-2025. Personal de Obra: Director, residentes, asesor Forestal asesor ambiental, inspector SISO, P&P, topógrafo, topógrafa, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra.
Equipos: Retroexcavadora, miniretroexcavadora, minicargador, miniretrocargador, volquetas, herramienta menor.
Clima: Soleado desde las 13:00 hasta las 16:45.
Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimento de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral y reconformación geomorfológica. Así mismo se retiran basuras, escombros, se realiza rocería. Se retira material a los correspondientes sitios de disposicion Final. Se constiuye cerramiento en malla eslabonada. Se realiza recuperación de cerramiento existente. Se realiza mantenimiento perimetral y en altura de grupos de guaduas.

Parcela.

1-03-2025. Personal de Obra: Director, residentes, asesor Forestal, asesor ambiental, inspector SISO, P&P, topógrafo, topografa, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra.
Equipos: Retroexcavadora, miniretroexcavadora, minicargador, miniretrocargador, volquetas, herramienta menor.
Clima: lluvia moderada desde las 9:30 hasta las 12:00.

Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimento de Fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral y reconformación geomorfológica. Así mismo se retiran basuras, escombros, se realiza rocería. Se retira material a los correspondientes sitios de disposicion final. Se construye cerramiento en malla eslabonada. Se realiza recuperación de cerramiento existente. Se realiza mantenimiento perimetral y en altura de grupos de guaduas

2-03-2025 Dia no laboral.


3-03-2025. Personal de obra: Director, residentes, asesor Forestal, asesor ambiental, inspector SISO, PGP, topógrafo, topógrafa, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra.

Equipos: Retroexcavadora, miniretroexcavadora, minicargador, minirretrocargador, Volquetas, herramienta menor.

Clima: Soleado


Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimento de Fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral y reconformación geomorfológica. Así mismo se retiran basuras, escombros, se realiza rocería. Se retira material a los correspondientes sitios de disposicion Final. Se construye cerramiento en malla eslabonada. Se realiza recuperación de cerramiento existente. Se realiza mantenimiento perimetral y en altura de

grupos de guaduas. Se construye cerramiento con viga en concreto y tubería galvanizada.



Farcela.

4-03-2025. Personal de obra: Director, residentes, asesor Forestal, asesor ambiental, inspector SISO, PGP, topógrafo, topógrafa, cadenera, auxiliar de obra cuadrillas de obra.
Equipos: Retroexcavadora, miniretroexcavadora, minicargador, miniretrocargador, volquetas, herramienta menor.
Clima: Nublado desde las 14:30 hasta las 17:30.
Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimento de fondo, demolición y retilo de rocas de allastle, dragado lateral y reconformación geomorfológica. Así mismo se retiran basuras, escombros, Se realiza roceria. Se retira material a los correspondientes sitios de disposicion final. Se construye cerramiento en malla eslabonada. Se realiza recuperación de cerramiento existente. Se realiza mantenimiento perimetral y en altura de grupos de guaduas. Se construye cerramiento con viga en concreto y tubería galvanizada.



Farcela.

5-03-2025. Personal de obra: Director, residentes, asesor Forestal, asesor ambiental, inspector SISO, PGP, topógrafo, topógrafa, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra.
Equipos: Retroexcavadora, miniretroexcavadora, minicargador, miniretrocargador, volquetas, herramientas menor.
Clima: Nublado desde las 6:30 hasta las 9:15.

	Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimento de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral y reconformación geomorfológica. Así mismo se retiran basuras, escombros, se realiza rocería. Se retira material a los correspondientes sitios de disposicion final. Se constiuye cerramiento en malla eslabonada. Se realiza recuperación de cerramiento existente. Se realiza mantenimiento perimetral y en altura de grupos de guaduas. Se constiuye cerramiento con viga en concreto y tubería galvanizada.
6-03-2025	Personal de Obra: Director, residentes, asesor forestal, asesor ambiental, inspector SISO, PGP, topógrafo, topógrafa, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra. Equipos: Retroexcavadora, miniretroexcavadora, minicargador, miniretrocargador, Volquetas, herramienta menor. Clima: Nublado desde las 9:00 hasta las 12:30. Actividades: se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimientos y retiro de sedimento de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, dragado lateral y reconformación geomorfológica. Así mismo se retiran basuras, escombros, se realiza rocería. Se retira material a los correspondientes sitios de disposicion final. Se constiuye cerramiento en malla eslabonada. Se realiza recuperación de cerramiento existente. Se realiza mantenimiento perimetral y en altura de grupos de guaduas. Se constiuye cerramiento con viga en concreto y tubería galvanizada.

7-03-2025. Personal de Obra: Director, residentes, asesor Forestal, asesor ambiental, inspector SISO, PGP, topógrafo topógrafa, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra.
Equipos: Retroexcavadora, miniretroexcavadora, minicargador miniretrocargador, Volquetas, herramienta menor.
Clima: lluvia moderada desde las 8:00 hasta las 11:00
Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante movimiento y retiro de sedimento de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, diagado lateral y reconformación geomorfológica. Así mismo se retiran basuras, escombros, se realiza rocería. Se retira material a los correspondientes sitios de disposicion Final. Se construye cerramiento en malla eslabonada. Se realiza recuperación de cerramiento existente. Se realiza mantenimiento perimetral y en altura de grupos de guaduas. Se construye cerramiento con viga en concreto y tubería galvanizada.

6-03-2025. Personal de obra: Director, residentes, asesor Forestal, asesor ambiental, inspector SISO, PGP, topogriafo, topógrafa, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra.
Equipos: Retroexcavadora, miniretroexcavadora, minicargador miniretrocargador, volquetas, herramienta menor.
Clima: Soleado.
Actividades: Se lleva a cabo intervención de cauces mediante maximiento y retiro de sedimento de fondo, demolición y retiro de rocas de arrastre, diagado lateral y reconformación geomorfológica. Así mismo se retiran

	basuras, escombros, se realiza rocería. Se retira material a los correspondientes sitios de disposicion final. Se construye cerramiento en malla eslabonada. Se realiza recuperación de cerramiento existente. Se realiza mantenimiento perimetral y en altura de grupos de guaduas. Se construye cerramiento con viga en concreto y tubería galvanizada. Parcela.
9-03-2025.	Día no laboral.
10-03-2025	Personal de obra: Director, residentes, asesor Forestal, asesor ambiental, inspector SISO, PGP, topografo topografa, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra. Equipos: Retroexcavadora, miniretro excavadora, minicargador miniretrocargador, Volquetas herramienta menor. Clima: Nublado desde las 6:30 hasta las 9:15 Actividades: Se retira basura, escombros, se realiza rocería. Se retira material a los correspondientes sitios de disposicion final. Se construye cerramiento en malla eslabonada. Se realiza recuperación de cerramiento existente. Se realiza mantenimiento perimetral y en altura de grupos de guaduas. Se construye cerramiento con viga en concreto y tubería galvanizada. Parcela.

11-03-2025	Personal de Obra: Director, residentes, asesor forestal, asesor ambiental, inspector SISO, PGP, topógrafo, topografía, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra. Equipos: Retroexcavadora, miniretroexcavadora, minicargador, miniretrocargador, Volquetas, hellamienta menor. Clima: Soleado Actividades: Se retiran basuras, escombros, se realiza rocería. Se retira material a los correspondientes sitios de disposicion final. Se construye cerramiento en malla eslabonada. Se realiza recuperación de cerramiento existente. Se realiza mantenimiento perimetral y en altura de grupos de guaduas. Se construye cerramiento con viga en concreto y tubería galvanizada. Cadenera. -
12-03-2025.	Personal de obra: Director, residentes, asesor forestal, asesor. ambiental, inspector SISO, PGP, topógrafo topógrafa, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra. Equipos: Retroexcavadora, miniretroexcavadora, minicargador, miniretrocargador, Volquetas, hellamienta menor. Clima: Soleado. Actividades: Se retiran basuras, escombros, se realiza rocería Se retira material a los correspondientes sitios de disposicion final. Se construye cerramiento en malla eslabonada. Se realiza recuperación de cerramiento existente. Se realiza mantenimiento perimetral y en altura de grupos de guaduas. Se construye cerramiento con viga en concreto y tubería galvanizada. Cadenera.

13-03-2025	Personal de obra: Director, residentes, asesor Forestal, asesor ambiental, inspector SISO, P&P, topógrafo topógrafa, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra. Equipos: Retroexcavadora, miniretroexcavadora, minicargador, miniretrocargador, Volquetas herramienta menor. Clima: Soleado desde las 14:45 hasta las 17:45 Actividades: Se retiran basuras, escombros, se realiza rocería. Se retira material a los correspondientes sitios de disposicion Final. Se construye cerramiento en malla eslabonada. Se realiza recuperación de cerramiento existente. Se realiza mantenimiento Perimetral y en altura de grupos de guaduas. Se construye cerramiento con viga en concreto y tubería galvanizada. Marcela.
14-03-2025.	Personal de Obra: Director, residentes, asesor Forestal, asesor ambiental, inspector SISO, P&P, Topógrafo topógrafa, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de Obra. Equipos: Retroexcavadora, miniretroexcavadora, minicargador, miniretrocargador, Volquetas, herramienta menor. Clima: Nublado desde las 7:45 hasta las 10:30 Actividades: Se retiran basuras, escombros, se realiza rocería. Se retira material a los correspondientes sitios de disposicion final. Se construye cerramiento en malla eslabonada. Se realiza recuperación de cerramiento existente. Se realiza mantenimiento perimetral y en altura de grupos de guaduas. Se construye cerramiento con viga en concreto y tubería galvanizada. Marcela.

15-03-2025.	Personal de Obra: Director, residentes, asesor Forestal, asesor ambiental, inspector SISO, PGP, topógrafo topógrafa, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de Obra. Equipos: Retroexcavadora, miniretroexcavadora, minicargador, miniretrocargador, Volquetas, herramienta menor. Clima: Soleado Actividades: Se retiran basuras, escombros, Se realiza rocería. Se retira material a los correspondientes Sitios de disposicion Final. Se construye cerramiento en malla eslabonada. Se realiza recuperación de cerramiento existente. Se realiza mantenimiento perimetral y en altura de grupos de guaduas. Se construye cerramiento con viga en concreto y tubería galvanizada.
16-03-2025	Día no laboral.
17-03-2025.	Personal de Obra: Director, residentes, asesor Forestal, asesor ambiental, inspector SISO, PGP, topógrafo topógrafa, cadenera, auxiliar de obra, cuadillas de Obra. Equipos: Retroexcavadora, miniretroexcavadora, minicargador, miniretrocargador, Volquetas, herramienta menor. Clima: lluvia Fuerte desde las 15:45 hasta las 18:30. Actividades: Se retiran basuras, escombros, se realiza rocería. Se retira material a los correspondientes sitios de disposicion Final. Se construye cerramiento en malla eslabonada. Se realiza recuperación de cerramiento existente. Se realiza mantenimiento perimetral y en altura de grupos de guaduas. Se construye

	cerramiento con viga en concreto y tubería galvanizada.
18-03-2025.	Personal de obra: Director, residentes, asesor Forestal asesor ambiental, inspector SISO, PGP, topógrafo, topografa, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra: Equipos: Retroexcavadora, miniretro excavadora, minicargador, miniretrocargador, Volquetas, herramienta menor. Clima: Nublado desde las 13:30 hasta las 16:us. Actividades: Se retiran basuras, escombros, se realiza rocería. Se retira material a los correspondientes sitios de disposicion final. Se construye cerramiento en malla eslaborada. Se realiza recuperación de cerramiento existente. Se realiza mantenimiento perimetral y en altura de grupos de guaduas. Se construye cerramiento con viga en concreto y tubería galvanizada.
19-03-2025.	Personal de obra: Director, residentes, asesor forestal asesor ambiental, inspector SISO PGP, topógrafo, Topógrafa, cadenera, auxiliar de obra, Cuadrillas de Obra. Equipos: Retroexcavadora, miniretro excavadora, minicargador, miniretrocargador, Volquetas, herramienta menor. Clima: Soleado. Actividades: Se retiran basuras, escombros, se realiza rocería Se retira material a los collespondientes sitios de cerramiento existente. Se realiza mantenimiento perimetral y en altura

de grupos de guaduas. Se constiuye cerramiento con viga en concreto y tubería galvanizada.

Parcela.

20-03-2025. Personal de obra: Director, residentes, asesor forestal, asesor ambiental, inspector SISO PGP, topógrafo, Topografa, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra.
Equipos: Retroexcavadora, miniretroexcavadora, minicargador, miniretrocargador, Volquetas, herramienta menor.
Clima: Nublado desde las 8:30 hasta las 11:30.
Actividades: Se retiran basuras, escombros, realiza rocería. Se retira material a los correspondientes sitios de disposicion Final. Se Construye cerramiento en malla eslabonada. Se realiza recuperación de cerramiento existente. Se realiza mantenimiento perimetral y en altura. de grupos de guaduas. Se constiuye cerramiento con viga en concreto y tubería galvanizada.

Parcela.

21-03-2025. Personal de Obra: Director, residentes, asesor forestal, asesor ambiental, inspector SISO, PGP, topógrafo, Topógrafa, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra.
Equipos: Retroexcavadora, miniretroexcavadora, miniretrocargador, volquetas, herramienta menor.
Clima: Nublado desde las 11:15 hasta las 14:30.
Actividades: Se retiran basuras, escombros, se realiza rocería. Se retira material a los correspondientes sitios de disposicion Final.

Se construye cerramiento en malla eslabonada.
Se realiza recuperación de cerramiento existente.
Se realiza mantenimiento perimetral y en altura de grupos de guaduas. Se construye cerramiento con viga en concreto y tubería galvanizada.

Marcela


22-03-2025 Personal de Obra: Director, residentes, asesor forestal, asesor ambiental, inspector SISO PGP, topógrafo, Topógrafa, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra.
Equipos: Retroexcavadora, minirretro excavadora, minicargador, minirretro cargador, Volquetas herramienta menor.
Clima: Soleado.
Actividades: Se retiran basuras, escombros, se realiza rocería. Se retira material a los correspondientes sitios de disposición final.
Se construye cerramiento en malla eslabonada.
Se realiza recuperación de cerramiento existente.
Se realiza mantenimiento perimetral y en altura de grupos de guaduas. Se construye cerramiento con viga en concreto y tubería galvanizada.

Marcela

23-03-2025 Día no laboral.

24-03-2025	Dia no laboral.
25-03-2025.	Personal de obra: Director, residentes, asesor Forestal, asesor ambiental, inspector SISO P&P, topógrafo, topógrafa, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra. Equipos: Retroexcavadora, miniretro excavadora, minicargador, miniretrocargador, Volquetas, herramienta menor. Clima: Soleado desde las 6:45 hasta las 9:30. Actividades: Se retiran basuras, escombros, se realiza roceria. Se retira material a los correspondientes sitios de disposicion final. Se constuye cerramiento en malla eslabonada. Se realiza recuperación de cerramiento existente. Se realiza mantenimiento perimetral y en altura de grupos de guaduas. Se constuye cerramiento con viga en concreto y tubería galvanizada.
26-03-2025.	Personal de obra: Director, residentes, asesor Forestal, asesor ambiental, inspector SISO, P&P, topógrafo, Topógrafa, Cadenera, auxiliar de obra cuadrillas de obra. Equipos: Retroexcavadora, miniretroexcavadora, minicargador, miniretrocargador, volquetas, herramienta menor. Clima: Soleado Actividades: Se retiran basuras, escombros, se realiza roceria. Se retira material a los correspondientes sitios de disposicion Final. Se constuye cerramiento: en malla eslabonada. Se realiza recuperación de

de cerramiento existente. Se realiza mantenimiento perimetral y en altura de grupos de guaduas. Se construye cerramiento con viga en concreto y tubería galvanizada.




27-03-2025 Personal de obra: Director, residentes, asesor forestal asesor ambiental, inspector SISO PGP, topógrafo, topografa, Cadenera, auxiliar de Obra, cuadrillas de obra

Equipos: Retroexcavadora, miniretroexcavadora, minicargador, miniretrocargador, Volquetas, herramienta menor.

Clima: Soleado.

Actividades: Se retiran basuras, escombros, Se realiza rocería. Se retira material a los correspondientes sitios de disposicion Final. Se construye cerramiento en malla eslabonada. Se realiza recuperacion de cerramiento existente. Se realiza mantenimiento Perimetral y en altura de grupos de guaduas. Se construye cerramiento con viga en concreto y tubería galvanizada.



28-03-2025. Personal de Obra: Director, residentes, asesor Forestal, asesor ambiental, inspector SISO PGP, topógrafo, Topógrafa, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra.

Equipos: Retroexcavadora, miniretroexcavadora, minicargador, miniretrocargador, Volquetas, herramienta menor.

Clima: Nublado desde las 7:30 hasta las 10:30.

	Actividades: Se retiran basuras, escombros, Se realiza rocería. Se retira material a los correspondientes sitios de disposicion Final. Se construye cerramiento en malla eslabonada. Se realiza recuperación de cerramiento existente. Se realiza mantenimiento Perimetral y en altura de grupos de guaduas. Se construye cerramiento con viga en concreto y tubería galvanizada. Arcela
29-03-2025.	Personal de Obra: Director, residentes, asesor forestal, asesor ambiental, inspector SISO, PGP, topografo, topógrafa, cadenera, auxiliar de obra, cuadrillas de obra. Equipos: Retroexcavadora, minirretroexcavadora, minicargador, miniretrocargador, Volquetas, herramiento menor. Clima: Soleado. Actividades: Se retiran basuras, escombros, se realiza rocería. Se retira material a los correspondientes sitios de disposicion Final. Se construye cerramiento en malla eslabonada. Se realiza recuperación de cerramiento existente. Se realiza mantenimiento Perimetral y en altura de grupos de guaduas Se construye cerramiento con viga en concreto y tubería galvanizada. Arcela
30-03-2025.	Día no laboral.

31-03-2025	Personal de obra: Director, residentes, asesor Forestal, asesor ambiental, inspector SISO P&P, Topógrafo, Topógrafa, Cadenera, auxiliar de obra cuadrillas de obra. Equipos: Retroexcavadora, miniretroexcavadora, minicargador, miniretrocargador, Volquetas, herramienta menor. Clima: Soleado Actividades: Se retiran basuras, escombros, se realiza rocería. Se retira material a los correspondientes sitios de disposicion Final. Se construye cerramiento en malla eslaborada. Se realiza recuperación de cerramiento existente. Se realiza mantenimiento perimetral y en altura. de grupos de guaduas. Se construye cerramiento con viga en concreto y tubería galvanizada.

Marcela

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO EL "MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEFINIDOS Y PRIORIZADOS POR LA CDMB"



ANEXO No. 5

INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA

LIQUIDACIÓN

CDMB
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA

CONSORCIO CONSERVACION IM



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 210.15563.4 DE 2024

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO EL "MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTNCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEFINIDOS Y PRIORIZADOS POR LA CDMB

INFORME FINAL AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA 20 DE NOVIEMBRE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2025	
Miguel Fernando Quirós Gómez Representante Legal Consorcio Conservación IM	Firma:

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVOS 4
2.1 Objetivo general 4
2.2 Objetivos específicos 4
3. INFORMACIÓN DE CONTRATOS 5
4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 6
4.1 QUEBRADA SURATOQUE – SECTOR BUCARICA 7
4.2 QUEBRADA SURATOQUE – SECTOR LAGOS 8
4.3 QUEBRADA LA CALAVERA – SECTOR MOLINOS 9
4.4 QUEBRADA ZAPAMANGA – SECTOR CAÑAVERAL 10
5. PLAN DE ACCIÒN SOCIO AMBIENTAL 11
5.1 PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 12
5.2 PROGRAMA DE CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS. 19
5.3 PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL SUELO – PREVENCIÓN DE PROCESOS EROSIVOS Y CONTROL SOBRE LA ESCORRENTÍA 21
5.4 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS. 22
5.5 PROGRAMA DE MANEJO DE LA VEGETACIÓN, LA FAUNA Y EL PAISAJE. 26
5.6 PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN. 32
5.7 PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL 35
6. CONCLUSIONES 37

1. INTRODUCCIÓN

Mediante el Contrato de Interventoría No. 210.15563.4 celebrado entre la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga y la empresa CONSORCIO CONSERVACIÓN IM con NIT 901.881.356-4 se realiza supervisión, verificación y control de la ejecución del contrato de obra No. 210.15562.5 del CONSORCIO CONSERVACIÓN HIDRICA con NIT 901.881.924-8, cuyo objetivo es la "MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEFINIDOS Y PRIORIZADOS POR LA CDMB"

El contratista de obra finalizó las actividades contractuales que permitieron mejorar las condiciones ambientales de las fuentes hídricas y aumento de la capacidad hídrica de las fuentes de agua superficial que recorre en inmediaciones del casco urbano del municipio de Floridablanca, Santander.

Con el fin de establecer y emplear medidas de prevención, corrección y control de impactos negativos generados por la construcción del proyecto; el contratista de obra presentó el plan de acción socio ambiental el cual se encuentra enmarcado en la normatividad legal para las obras de construcción; esto con el fin de ejercer control antes, durante y después del desarrollo de los procesos constructivos con el fin de garantizar el cuidado y la conservación de los recursos naturales presentes en el sector; del cual el consorcio de obra presenta el informe final de cumplimiento al PASA conformados por siete programas de manejo que contienen actividades preventivas y correctivas enmarcadas en la normatividad legal vigente imponiendo una práctica responsable y apropiada en el manejo del espacio físico del área a intervenir.

En función como firma interventora, se realiza el presente informe final del periodo ejecutado comprendido entre el 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 31 MARZO 2025, seguimiento y control al cumplimiento del Plan de Acción Socio Ambiental por parte del contratista de obra.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

- Supervisar la implementación del Plan de Acción Socio Ambiental para la obra de MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEFINIDOS Y PRIORIZADOS POR LA CDMB en cumplimiento con la ejecución de actividades constructivas del contrato de obra No. 210.15562.5.

2.2 Objetivos específicos

- Consolidar las actividades de gestión ambiental implementadas y requeridas para la ejecución de los programas descritos en el Plan de Acción Socio Ambiental para el periodo contractual del contrato de obra No. 210.15562.5.

3. INFORMACIÓN DE CONTRATOS

CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	210.15562.5 DEL 23 OCTUBRE.
OBJETO:	"MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEFINIDOS Y PRIORIZADOS POR LA CDMB.
ENTIDAD CONTRATANTE:	CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA.
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CONSERVACIÓN HÍDRICA. R.L. EDGAR LEONARDO GÓMEZ RONCANCIO. NIT. 901.881.924-8.
VALOR DEL CONTRATO:	CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($4.521.575.179,94).
SUPERVISOR:	CARLOS ALBERTO DÍAZ BARRERA.
FECHA DE INICIO:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024.
PLAZO INICIAL:	42 DIAS - HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
PLAZO ADICIONAL:	90 DIAS – TRES MESES.
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	31 DE MARZO DE 2025.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONTRATO No.:	210.15563.4 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO EL "MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTNCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEFINIDOS Y PRIORIZADOS POR LA CDMB
ENTIDAD CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA.
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	CONSORCIO CONSERVACIÓN IM. R.L. MIGUEL FERNANDO QUIRÓS GÓMEZ.

	NIT. 901.881.356-4.
VALOR DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($254.886.576,00).
DIRECCIÓN:	CARRERA 15 # 22-02 TORRE 6 OFICINA 422 – GIRÓN SANTANDER.
SUPERVISOR:	CARLOS ALBERTO DÍAZ BARRERA.
FECHA DE INICIO:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024.
PLAZO INICIAL:	42 DIAS - HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
PLAZO ADICIONAL:	90 DIAS – TRES MESES.
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	31 DE MARZO DE 2025.

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Floridablanca es un municipio que forma parte del Área Metropolitana de Bucaramanga, junto con Girón, Bucaramanga y Piedecuesta. Floridablanca está ubicado en el departamento de Santander, en la zona montañosa del costado occidental de la cordillera oriental. Su centro urbano está a 07° 04´ 36´´ de latitud norte y 73° 05´ 52´´ de longitud oeste.

El frente de obra se encontró ubicado en diferentes sectores de las fuentes hídricas de la microcuenca del río Frío es una reserva hídrica del municipio de Floridablanca, Colombia, con una superficie de 74,3 km2. Nace en el cerro de la Judía, a una altura de 2032 msnm, y tiene una longitud aproximada de 30,5 km.

A continuación, se relaciona gráficamente los tramos objeto de limpieza:

Cuerpo Hídrico	Sector	Coordenadas Aguas Arriba	Coordenadas Aguas Abajo
Quebrada Suratoque	Bucarica	7°04'14.6"N 73°05'08.7"W	7°04'07.6"N 73°05'24.9"W
Quebrada Suratoque	Lagos	7°04'07.5"N 73°05'32.0"W	7°04'11.0"N 73°05'51.6"W
Quebrada La Calavera	Molinos	7°04'24.7"N 73°06'17.3"W	7°04'23.1"N 73°06'23.0"W
Quebrada Zapamanga	Cañaveral	7°04'21.5"N 73°06'24.2"W	7°04'14.0"N 73°06'34.9"W

4.1 QUEBRADA SURATOQUE – SECTOR BUCARICA





Quebrada Suratoque


4.2 QUEBRADA SURATOQUE – SECTOR LAGOS





Quebrada Suratoque

4.3 QUEBRADA LA CALAVERA – SECTOR MOLINOS

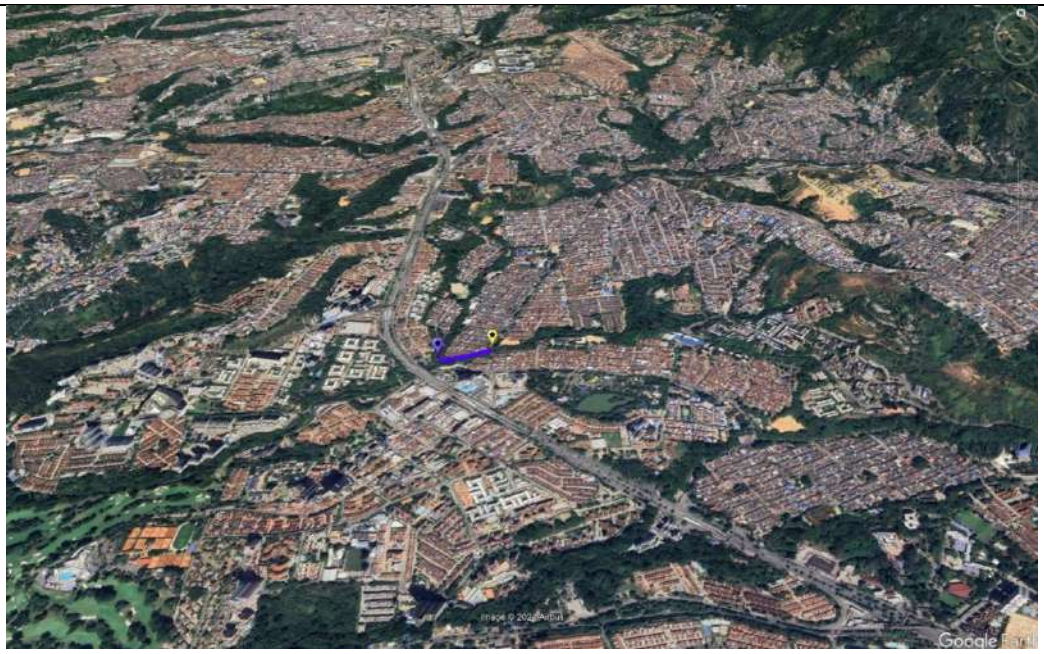



Quebrada La Calavera

4.4 QUEBRADA ZAPAMANGA – SECTOR CAÑAVERAL





Quebrada Zapamanga

5. PLAN DE ACCIÒN SOCIO AMBIENTAL

El Plan de Acción Socio Ambiental se ejecutó en el frente de obra del proyecto en referencia, el cual no estuvo sometido al régimen de Licencia Ambiental. Por lo tanto, se verificó el cumplimiento de la normatividad vigente con los lineamientos ambientales, laborales y sociales establecidos en el PASA.

El Consorcio Conservación Hídrica adoptó el Plan de Acción Socio Ambiental estructurado con siete programas de manejo, en el cual se describieron las acciones que contribuyeron al control y mitigación de impactos ambientales generados por las actividades constructivas y sociales. Los programas ambientales del PASA se relacionan a continuación:

Programas del Plan de Acción Socio Ambiental para el Consorcio Conservación Hídrica

1. Programa para el manejo de residuos.
2. Programa de control de emisiones atmosférica.
3. Programa para la protección del suelo – prevención de procesos erosivos y control sobre la escorrentía.
4. Programa prevención de la contaminación de cuerpos de agua y redes de servicios públicos.
5. Programa para el manejo de la vegetación, la fauna y el paisaje.
6. Programa de señalización.
7. Programa de gestión social.

La implementación de las metodológicas adecuadas para garantizar la calidad en el cumplimiento de la obra pública en desarrollo, permitió la sinergia entre los componentes civiles, ambientales, sociales y laborales (seguridad industrial y salud ocupacional), evidenciando el control de los impactos negativos y que se magnifiquen los beneficios que genera la construcción de obras de mantenimiento de las áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico en la jurisdicción del municipio de Floridablanca definidos y priorizados por la CDMB. Por ello, se describieron los aspectos relacionados con el manejo y

protección ambiental que se realizaron para la ejecución del proyecto según su respectivo programa:

5.1 PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Durante el desarrollo de las actividades contractuales para el cumplimiento del contrato de obra, se evidenció la generación de residuos de diferentes tipos permitiendo el manejo de metodologías por parte del consorcio para el correcto manejo, clasificación, almacenamiento, transporte y disposición final de los residuos sólidos; estas actividades las prescindieron actividades de educación ambiental y recomendaciones dadas por parte de profesionales contractuales; jornadas de orden, aseo y limpieza; manejo de residuos sólidos, clasificación según su origen representado por el código de colores, correcto almacenamiento y disposición final.

Clasificación, almacenamiento y disposición final de residuos sólidos:
Punto ecológico para la disposición temporal de residuos: La interventoría verificó durante el tiempo de ejecución del proyecto que el contratista de obra contó con un punto ecológico según código de colores establecido en el Artículo 4to de la Resolución 2184 expedida el 26 de Diciembre de 2019, habilitado en cada frente de obra:

- Color blanco: Los residuos inorgánicos aprovechables como plástico de baja y alta densidad, chatarra, cartón, entre otras.
- Color verde: Residuos orgánicos aprovechables como restos de comida y desechos vegetales.
- Color negro: Residuos no aprovechables como papel higiénico, servilletas, papel y cartón contaminado, papeles metalizados, residuos de barrido, servilletas, icopor, plástico no reciclable, vasos desechables, envases de tetra pack etc.
- Color rojas: Residuos peligrosos aquellos que tienen características infecciosas, tóxicas, explosivas, corrosivas, inflamables, volátiles, combustibles, radiactivas o reactivas. Los residuos peligrosos que mayormente se generan son bolsas de cemento, material impregnado de hidrocarburos o

sustancias químicas, envases de sustancias químicas y contaminados con grasa y lubricantes; elementos de protección personal contaminados.

Acciones de manejo ambiental para el almacenamiento temporal de residuos sólidos:

Se verificó que el punto ecológico no se sobrecargó según su capacidad de almacenamiento de cada caneca.

El consorcio contratista de obra tuvo en cuenta las rutas de recolección establecida por la Empresa de Aseo del Municipio de Floridablanca y cuyos residuos fueron dispuestos en el relleno sanitario el carrasco.

La zona de almacenamiento temporal fue una zona protegida de humedad, sol y cualquier otro agente externo que pudiera permitir una mayor contaminación y mal manejo de residuos.

La interventoría verificó las condiciones del manejo de estos residuos en el frente de obra y garantizó el cumplimiento de las recomendaciones y observación para el manejo y entrega final.

El contratista de obra realizó pesaje semanal de residuos sólidos generados en el frente de obra y se diligenció formato de control, la presente interventoría verificó y validó la actividad realizada.

El adecuado manejo de residuos generados, permitieron la reducción del impacto visual de la obra, contaminación de zonas verdes, disminución del riesgo de presentarse accidentes laborales producto del mal manejo, entre otros impactos.

Las profesionales ambientales del consorcio de obra e interventoría, fueron insistentes con el personal vinculado al proyecto sobre la adecuada clasificación y manejo de residuos sólidos en el área de trabajo y zonas aledañas.

<u>Disposición final de residuos generados en los frentes de obra</u>

Durante la ejecución de actividades técnicas, el contratista de obra generó residuos los cuales según su tipo fueron entregados a gestores autorizados para su tratamiento y disposición final:

- Residuos ordinarios: Fueron clasificados correctamente, almacenados temporalmente y entregados a la Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A. E.S.P. y transportados hasta el sitio de disposición final "Relleno Sanitario El Carrasco", sitio autorizado para manejo de residuos quien opera bajo la figura de emergencia sanitaria.

- Residuos inorgánicos aprovechables: Se realizó entrega de 14.9 kg a la empresa Corporación Solidaria Nacional para el Aprovechamiento de Residuos y Energías Renovables – RECICLA Y MAS. Se adjunta certificado de la gestión realizada con los residuos aprovechables generados y acopiados durante el tiempo contractual.

- Residuos orgánicos aprovechables: Los residuos generados de las actividades de poda de bambúes y rocería de material vegetal inferior a 1.5 mt; fueron trasladados y dispuestos en la Planta de Tratamiento de Agua Residuos Rio Frío, con el fin de ser aprovechado y reutilizado para actividades relacionadas al tratamiento de biosólido extraído de la Laguna Facultativa N. 02, mediante la conformación y volteo de biosólido al cual se le añade material vegetal triturado para obtener abono; lo anterior es objeto de vigilancia y control de la autoridad ambiental competente. Se adjunta certificado de la gestión realizada con los residuos orgánicos aprovechables generados.

- Residuos peligrosos: No se generaron durante la actividad contractual.

A continuación, se relaciona los residuos sólidos generados durante la ejecución del contrato de obra:

RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS		
PERIODO	NO APROVECHABLES	INORGÁNICO APROVECHABLE

20 de Noviembre al 13 de Diciembre 2024	6.2 kg	4.4 kg
14 Diciembre de 2024 al 31 Marzo 2025	24.1 kg	10.5 kg
Total	30.3 kg	14.9 kg

RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS	
PERIODO	**ORGANICO APROVECHABLE**
01 Noviembre 2024 al Noviembre 2024	5000 kg
01 Marzo 2025 a 31 Marzo 2025	22000 kg
Total	27000 kg

El contratista de obra presentó los soportes de disposición y manejo de residuos sólidos generados durante el periodo reportado.






<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Sector Molinos</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>




Sector Bucarica






Sector Lagos

Actividades de recuperación de la capacidad hidraulica, conformación del lecho y limpieza de la ronda hidrica de las queradas.



Jornadas de orden, aseo y limpieza en zonas perimetrales en los frentes de obra

Indicadores ambientales

Residuos generados durante la ejecución del contrato de obra los cuales han sido entregados a gestores autorizados

- (Volumen residuos entregados gestor ambiental / Volumen residuos generados en el periodo) X 100 = %

(30.3 kg / 30.3 kg) *100 = 100%

Correspondiente a los residuos generados por el personal de obra y dispuesto en punto ecológico

- (Volumen de residuos peligrosos generados/ volumen de residuos sólidos a disponer con gestor autorizado) X 100 = %

No aplica

- (Volumen residuos reciclables entregados a empresas recicladoras / Volumen residuos reciclables generados en el periodo) X 100= %

(14.9 kg / 14.9 kg) *100 = 100%

Correspondiente a los residuos generados por el personal de obra y dispuesto en punto ecológico

5.2 PROGRAMA DE CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS.

Este programa consistió en la implementación de un conjunto de medidas que se requerían para controlar la generación de emisiones atmosféricas como son gases y material particulado, al igual que la generación de ruido durante la ejecución del contrato.

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas según lo establecido en el Plan de acción socio ambiental:

Se controlaron las actividades generadoras de polvo mediante la dispersión de agua en las áreas de trabajo toda vez que fue necesario.

Se realizó verificación del mantenimiento y seguimiento del estado de la maquinaria y equipos utilizados garantizando las condiciones óptimas de funcionamiento.

Las actividades que generaron ruido producto de la utilización de volquetas y maquinaria para actividades de obra, se llevaron a cabo en horarios desde las 7:00 am hasta las 5:00 pm con la finalidad de no afectar las actividades propias de la población aledaña.

Se prohibieron las quemas a cielo abierto de cualquier elemento que emita contaminantes tóxicos al aire. No se evidenció quemas en los frentes de obra.

Durante la ejecución del contrato, se realizó traslado de basuras al relleno sanitario, del cual se hace seguimiento a los vehículos de proveedores que circulan por las vías a una velocidad de 20 Km/h para evitar la emisión de material particulado a la atmósfera, así mismo, se restringió el uso en exceso de bocinas, cornetas, pitos y demás elementos generadores de ruido, se verificó que contaran con alarma de reversa.

Se realizó verificación de los documentos de los vehículos utilizados para actividades propias de la obra, revisión del SOAT y RTM.

VEHÍCULOS ROTATIVOS				
20 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2024				
PLACA	SOAT	FECHA VIGENCIA	RTM	FECHA VIGENCIA
PBA173	3225659800	19/03/2025	172489664	18/03/25
XKC284	1508005686212000	09/05/2025	177364697	22/11/25
14 DE DICIEMBRE 2024 AL 31 DE MARZO 2025				
PLACA	SOAT	FECHA VIGENCIA	RTM	FECHA VIGENCIA
XKC284	1508005686212000	09/05/2025	177364697	22/11/2025



Vehículos utilizados para el cargue de residuos sólidos

Indicadores ambientales

- (Acopios autorizados de materiales de obra / Número total de acopios) x 100= %
  (2 / 2) * 100 = 100 %

- (Vehículos con certificados técnico mecánico / Vehículos en obra) x 100 = %
  (2 / 2) * 100 = 100 %

5.3 PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL SUELO – PREVENCIÓN DE PROCESOS EROSIVOS Y CONTROL SOBRE LA ESCORRENTÍA.

Se realizó mejora de las zonas de protección hídrica con el fin de mejorar la capacidad hidráulica de los cuerpos de agua superficial según el alcance objeto de contrato; el consorcio contratista de obra finalizó las actividades requeridas para el avance técnico del proyecto.

Teniendo en cuenta lo anterior el Consorcio Conservación Hídrica implementó las siguientes acciones de manejo para el programa de protección del suelo:

El contratista de obra realizó extracción de basuras producto de las actividades de limpieza del lecho y la ronda hídrica.

Se controló el arrastre de sedimentos mediante la extracción y trasporte inmediato de materiales extraídos de las actividades de limpieza de basuras al sitio de disposición final el relleno sanitario El Carrasco.

Durante la ejecución del proyecto no se presentaron derrames de ninguna sustancia química.

Se contó con material absorbente y kit de atención antiderrames ubicado en el área de campamento, disponible para atención de emergencias ocasionadas por derrames.

El sitio para la ubicación del campamento y almacén se definió en un lugar donde se necesitó menor intervención sobre el suelo.

En cada frente de obra se disponen de canecas de 55 galones con el fin de almacenar combustible. Se adecuó zona impermeabilizada con el fin de contener cualquier derrame accidental que hasta la fecha no se ha presentado.






Actividades de limpieza, descapote, adecuación del cauce y riberas de los rios.

Indicadores ambientales

- Número de acciones / Número de acciones establecidas en el PASA *100 = %

(5 / 5) * 100 = 100%

5.4 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS.

Se verificaron las acciones para mantener un control sobre el manejo, protección de las aguas superficiales y/o redes de alcantarillado que se puedan ver afectados por la actividad de las obras del proyecto.

Para controlar los impactos negativos se implementan las medidas de manejo ambiental para la correcta manipulación de la extracción de basuras con el fin de evitar el arrastre al cuerpo de agua superficial y a la red de alcantarillado cercanas.

El consorcio contratista de obra no realizó vertimiento de residuos líquidos a las zonas aledañas al frente de obra.

La interventoría evidenció que durante el periodo reportado no se realizaron actividades de lavado de maquinaria o equipos en el frente de obra.

Con el fin de satisfacer las necesidades físicas del personal vinculado al proyecto, el contratista dispuso de un baño portátil en cada frente de obra al cual se le realiza mantenimiento por parte de proveedor encargado.

El material suelto ha sido objeto de limpieza con previa humectación del área y no se permitió ser conducido mediante agua a presión a los desagües de la red de alcantarillado y/o cuerpo de agua superficial.

No se reportaron derrames o fugas de combustibles o residuos líquidos en el área de influencia.

Durante el tiempo de ejecución del contrato, el consorcio contratista de obra dió cumplimiento a las medidas establecidas en el presente programa.



Sector Bucarica



Sector Lagos



Sector Molinos

<table>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Sector Cañaveral</td></tr>
<tr><td colspan="2">Estado de limpieza del cuerpo hídrico posterior a la intervención de mantenimiento</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Unidad sanitaria usada en el Sector Molinos y posteriormente en Cavañeral</td><td>Unidad sanitaria usada en el Sector Bucarica y posteriormente en Lagos</td></tr>
</table>

Indicadores ambientales

- No de unidades sanitarias utilizadas / No de unidades sanitarias requeridas *100 =%

(2 / 2) * 100 = 100%

5.5 PROGRAMA DE MANEJO DE LA VEGETACIÓN, LA FAUNA Y EL PAISAJE.

El contratista de obra realizó las siguientes actividades generales de manejo de fauna y flora:

Las actividades técnicas se realizaron únicamente en las áreas necesarias para la ejecución del proyecto y establecido en el diseño técnico.

No se evidenció el uso de herbicidas y quedó prohibidas las quemas a cielo abierto para realizar actividades de desmontes o con cualquier fin.

No se arrojó basuras, escombros y sobrantes de excavación en el perímetro de árboles o zonas verdes existentes en los frentes de obra.

En los árboles o arbustos presentes no se instalaron alambres, sogas, cables o elementos que dañen la integridad del mismo.

Solo permanecieron en el área de trabajo los equipos necesarios y no circularon por fuera de los respectivos frentes de obra.

Se prohibió el uso o porte de armas de fuego para actividades de casería y/o auyentamiento de fauna.

Las especies de fauna presente en los frentes de obra fueron guiados cuidadosamente hacia áreas con coberturas de vegetación secundaria donde pueden resguardar de forma segura, garantizando su desplazamiento hacia entornos adecuados.

En caso de requerirse si la situación lo amerita se pedirá asistencia a la autoridad ambiental o al cuerpo de bomberos en busca de minimizar las afectaciones a la fauna.

Se realiza limpieza, rocería de la vegetación existente y extracción de basuras como actividad de mantenimiento de la fuente hídrica contribuyendo a la

sostenibilidad y reducción de riesgos asociados al deterioro ambiental del lecho hídrico.

Trámites ambientales:
El día 19 de Diciembre 2024 se realizó reunión en las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, haciendo presencial profesionales de la supervisión del contrato, profesionales de la dependencia de Suryt-CDMB, contratista de obra e interventoría con el fin de socializar y justificar la importancia de realizar la poda y entresaca de la especie *Guadua angustifolia* existentes en las rondas hídricas de los ríos objetos de intervención de la microcuenca Rio Frio. Se aclararon los beneficios de dicha actividad como el control del riesgo de volcamiento ante fuertes lluvias acompañados de vientos, mejora paisajística, seguridad de la ronda hídrica, control de dispersión de plagas y enfermedades, estimulación del crecimiento de ramas y hojas, evasión de la acumulación de material orgánica y residuos sólidos entre otras.

Durante el tiempo posterior al acta de tala hasta la fecha de finalización del contrato, se realizó intervención de 5242.86 m2 la especie *Guadua angustifolia* los cuales estuvieron distribuidos de la siguiente manera:

ÁREA DE *GUADUA ANGUSTIFOLIA* EN LOS FRENTES DE OBRA		
Fuente hídrica	**Sector**	**Metros cuadrados (m²)**
Quebrada Suratoque	Bucarica	1225.25
Quebrada Suratoque	Lagos	1975.69
Quebrada La Calavera	Molinos	1316.23
Quebrada Zapamanga	Cañaveral	725.69
Total		5242.86 m^2

Compensación forestal:
Como Medida de Compensación por la intervención de los bloques de Guadua Angustifolia, el CONSORCIO CONSERVACION HIDRICA, la autoridad ambiental exigió la plantación de cien (100) árboles de la especie nativas.

El contratista de obra realizó cumplimiento a este ítem el mes de Abril 2025 en el cual realizó una siembre de 107 árboles en el área de influencia directa del proyecto en el secto Lagos II y Bucarica.

La selección y separación del material vegetal se realizó a través del vivero "Los Guayacanes", el cual se encuentra registrado ante el Instituto Colombiano Agropecuario ICA y garantiza la calidad de los árboles en cuanto a su condición fitosanitaria y física; los árboles corresponden a individuos con alturas mínimas de 1 mt, las especies seleccionadas corresponden exclusivamente a especies nativas del área metropolitana de Bucaramanga, según recomendación de la autoridad ambiental en el acta mencionada y según su adaptabilidad al ecosistema presente en el área, su servicio de barreras vivas, provisión de sombra y como complemento paisajístico.

Las especies sembradas corresponden a:

- *Jacaranda caucana* o Gualanday
- *Albizia saman* o Samán
- *Cedrela odorata* o Cedro

Etapas de la siembra realizada:

-Plateo, desmonte y limpieza del terreno: Actividad de rocería y eliminación de cobertura vegetal, residuos, escombros o material sobrante para poder garantizar el crecimiento de la especie.
-Trazado y preparación del terreno: Se señala los lugares de siembra para ahoyado con distancia aproximada de 3mts y se dispone de tutores de 1 mt de altura para ayudar al crecimiento de cada planta.
-Hoyado: Se realiza hoyo de 40x40 cm de profundidad y diámetro con el objetivo de que la raíz pueda desarrollarse óptimamente.
-Sustrato de siembra: Se aplica abono orgánico al ahoyado con el fin de mejorar las condiciones nutricionales de suelo.
-Retenedor de agua: Se adiciono a cada árbol 10 gr retenedor de agua hidratado como regulador de humedad del terreno de siembra. Absorbe 350 veces su peso en agua siendo un insumo benéfico en épocas de sequía.

-Control de hormiga: Se adicionó a cada árbol 10 gr de insumo para el control de hormigas arrieras con el fin de evitar el daño de las hojas.
-Siembra: Posterior a las anteriores actividades se realiza retiro de la bolsa y se introduce el pilón sin desmoronar la tierra ni romper las raíces, el cuello de la raíz quedo bien nivelado y en el centro del hoyo.

El contratista de obra presentó informe de compensación en la cuenta de liquidación del contrato de obra.














Actividad de compensación

A continuación, se comparte registro fotográfico del manejo de fauna, flora y el paisaje existente en las zonas de intervención:






Fauna presente en la ronda hídrica









Intervención de poda, entresaca sanitaria y de formación de las guaduas presentes en el área de influencia directa del proyecto en los sectores Lagos 1, Molinos y Cañaveral, municipio de Floridablanca.

Indicador ambiental

- (No. de acciones de manejo implementadas / No. de acciones de manejo propuestas en el PASA) X 100 = %

  (8 / 8) *100 = 100%

- (Especie forestales intervenidas / especies forestales autorizadas) *100= %

  (5242,86 m^2 / 5242,86 m^2) * 100 = 100%

  Área correspondiente para la especie *Guadua angustifolia*

  Se realiza compensación de 100 árboles

5.6 PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN.

Este programa se implementó por parte del contratista de obra para la prevención de impactos que pueda generar la no señalización en los sitios de intervención en

el desarrollo del proyecto, garantizando así la seguridad del personal vinculado y personas que viven en la zona.

El contratista de obra instaló la señalización de inicio de obra, finalización, acceso restringido, e indicaciones para ingreso a los frentes de trabajo.

Se contó con instalación de señalización que da cumplimiento de los requisitos de la misma indicando con antelación la presencia de peligros.

La cinta de peligro utilizada permaneció tensada y sin dobleces durante la ejecución y culminación de actividades constructivas.
Los materiales acopiados en el frente de obra fueron señalizados y delimitados.

El contratista de obra contó con un campamento y almacén los cuales contaban con señalización y elementos para atención a emergencias.

En cada frente de obra se estableció la ruta de escape, salida de emergencia y punto de encuentro.

El contratista realizó mantenimiento a la señalización garantizando que se mantuviera instalada la ruta de escape, elementos de emergencia, uso obligatorio de elementos de protección personal, afiches de interés aportante información a los trabajadores, rotulación del campamento, vestier, baño, área de almacenamiento de materiales, residuos etc.

Durante el tiempo de ejecución actual del contrato, el consorcio contratista de obra dió cumplimiento a las medidas establecidas en el presente programa.







Señalización existente en el frente de trabajo

Indicadores ambientales

- (Áreas señalizadas / Áreas necesarias a señalizar) = %

  (2 / 2) *100 = 100%

- (Acopios en obra / Número de puntos de acopio señalizados) = %

  No aplica

5.7 PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL

En el periodo de ejecución reportado se relacionan las siguientes actividades dando cumplimiento a las acciones del programa social:

Instalación y funcionamiento de la oficina de información y atención a la comunidad: El contratista contó con dos campamentos que fueron trasladados a los frentes de obra operativo según avanzaban las actividades, en el cual se realizó atención a la comunidad en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Los horarios de atención, canales digitales, telefónicos e información general del contrato; estuvo disponible en volante informativo instalados en los campamentos habilitados en los frentes de obra.

Atención a la comunidad de PQRS: El contratista de obra contó con el formato F-113 "Recepción de peticiones, quejas, reclamos y /o solicitudes" a disposición de la comunidad para radicar cualquier trámite correspondiente y referente a la obra. Durante el periodo correspondiente no se realizó atención a la comunidad en temas relacionados con peticiones, quejas, reclamos o sugerencias.

Información a la comunidad: Se llevó a cabo el día 15 de Noviembre del 2024, una reunión informativa con el propósito de socializar los aspectos generales del proyecto, garantizando la transparencia y la participación activa de las partes interesadas. Durante este encuentro, se presentaron detalles relevantes sobre los objetivos, el alcance, las actividades a realizar, los tiempos de ejecución, y los beneficios esperados del proyecto. La reunión contó con la asistencia de representantes clave, incluyendo el contratista encargado de la ejecución de las obras, la interventoría responsable del seguimiento técnico y administrativo, un representante de la comunidad local, comerciantes de la zona, quienes son actores directamente involucrados o impactados por el desarrollo del proyecto.

Acciones de divulgación: El contratista de obra realizó entrega de volantes informativos por vía electrónica, correos y WhatsApp divulgando información de interés en relación con el contrato de obra. Se instaló en la entrada de campamento el volante informativo sobre los canales de atención y lugares.

6. CONCLUSIONES

La presente interventoría realizó recorridos en conjunto al contratista de obra, en el frente de obra existente para la ejecución del proyecto evidenciando así, las acciones de cumplimiento de los programas estipulados en el Plan de Acción Socio Ambiental – PASA.

El contratista de obra presentó dos informes de cumplimiento ambiental del PASA en el cual se detallan acciones de control, corrección, mitigación y compensación de los impactos ambientales y sociales generados por ejecución del contrato de obra.

El contratista de obra realizó gestión de los residuos sólidos generados por el personal operativo, pero mayormente los preexistentes debido a las malas prácticas antrópicas en cuanto a la correcta disposición de residuos, siendo extraídos del cauce y ronda hídrica para ser dispuestos en los sitios autorizados.

Se presenta los soportes del manejo de agua residual producto de las unidades sanitarias instaladas en los frentes de obra.

Se presenta el acta No 001 del 19 de Diciembre de 2024 en el cual se aprueba la poda, entresaca sanitaria y de formación de la especie forestal *Guadua angustifolia* por un total 5242.86 m2 para el cual se realizó compensación de 107 arboles en la zona de influencia directa.

Anexos:

- Certificado de manejo de residuos sólidos
- Certificado de manejo de residuos líquidos
- Documentos de los vehículos tipo volqueta
- Acta No 001 del 19 de Diciembre de 2024
- Informe de seguimiento de intervención, poda y entresaca sanitaria y de formación de las guaduas
- Informe de compensación forestal
- Capacitaciones socioambientales
- Gestión Social

ANEXOS:

CERTIFICADO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

NIT: 901.384.346-0

CERTIFICACIÓN DE DISPOSICIÓN FINAL

La empresa ***CORPORACIÓN SOLIDARIA NACIONAL PARA EL APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS Y ENERGÍAS RENOVABLES,*** identificada con NIT. 901.384.346–0, Certifica que recibió el día 31 de Marzo de 2025 de **CONSORCIO CONSERVACION HIDRICA** identificado con NIT: 901.881.924-8, de obra ubicada en el Municipio de FLORIDABLANCA, el siguiente material para el proceso de reciclaje y aprovechamiento.

TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD EN KILOS
Cartón	7.5
Botellas PET	3.4
Plásticos	4.0
TOTAL	**14.9 *Kg***

Estos materiales se despachan junto al vidrio, otros metales, otros plásticos, otros papeles para su destrucción y transformación.

El siguiente certificado se expide a los dos días (02) días del mes de abril del año 2025 con destino a ***CONSORCIO CONSERVACION HIDRICA.***

MIGUEL EDUARDO SOTO AYALA
Representante Legal

Vereda Guatiguará predio La Carola- Piedecuesta Santander
reciclamasesp@gmail.com www.reciclaymas.com
3024678877
3005794555

EMPAS
EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P.
NIT. 900.115.931-1

Bucaramanga, 05 de diciembre de 2024

Señores:
CONSORCIO CONSERVACIÓN HÍDRICA
NIT: 901.881.924
Ciudad

ASUNTO: CERTIFICACIÓN DISPOSICIÓN FINAL MATERIAL VEGETAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.

La Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. .E.S.P. - EMPAS S.A., certifica que el CONSORCIO CONSERVACIÓN HÍDRICA dispuso en la PTAR Rio Frio, durante el mes de noviembre del presente año; cinco mil (5.000.) kilogramos de residuos de tipo: "**PODAS DE MATERIAL VEGETAL APROVECHABLES**". El respectivo material es utilizado para ejecutar un proyecto piloto de compostaje, utilizándolo con el biosólido generado del tratamiento de las aguas residuales domésticas en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Río Frío, operada y administrada por EMPAS S.A. E.S.P.

Cordialmente;

CESAR AUGUSTO RUEDA ALARCÓN
Subgerente TIAR

Revisó: Ing. Nelson Tobo Davila – Asesor de Gerencia para la Expansión TIAR
Proyectó: Ing. Diego Mauricio Torra Calderón – Profesional III

Calle 24 Nº 23-68 Bucaramanga - Colombia
PBX: (7) 6059370
www.empas.gov.co

Escaneado con CamScanner

EMPAS
EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P.
NIT. 900.115.931-1

Bucaramanga, 3 de abril de 2025

Señores:
CONSORCIO CONSERVACION HIDRICA
NIT: 901.881.924
Ciudad

ASUNTO: CERTIFICACIÓN DISPOSICIÓN FINAL MATERIAL VEGETAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.

La Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. - EMPAS S.A., certifica que la empresa CONSORCIO CONSERVACION HIDRICA. dispuso en la PTAR Rio Frio, durante el mes de marzo del año 2025; veintidós mil (22.000.) kilogramos de residuos de tipo: "**PODAS DE MATERIAL VEGETAL APROVECHABLES**". El respectivo material es utilizado para desarrollar un proyecto piloto de compostaje, utilizándolo con el biosólido generado del tratamiento de las aguas residuales domésticas, en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Río Frío, operada y administrada por EMPAS S.A. E.S.P.

Cordialmente;

CESAR AUGUSTO RUEDA ALARCÓN
Subgerente TIAR

Revisó: Ing. Nelson Tobo Davila – Asesor de Gerencia para la Expansión TIAR
Proyectó: Ing. Diego Mauricio Torra Calderón – Profesional III

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM
icontec ISO 9001

CERTIFICADO DE MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS

RETCOR

EMPRESA COLOMBIANA RECOLECTORA Y TRANSPORTADORA DE RESIDUOS S.A.S. – RETCOR S.A.S.

CERTIFICA:

Que, desde el 26 de noviembre del 2024 al 31 de diciembre del 2024, se realizó la recolección y transporte de 50 galones de residuos generados por la limpieza de una (1) unidad de baño portátil, dicho servicio fue prestado realizando dos visitas de limpieza a la semana, servicio que se prestó al CONSORCIO CONSERVACION HIDRICA Ubicado en la carrera 39 No 51 – 31 ap 1903 Bucaramanga, Santander. en la obra ubicada en el barrio Bucarica del municipio de Floridablanca. con el fin de realizar la disposición final en EDEPSA E.S.P. empresa aliada encargada del tratamiento de los residuos recolectados y con los permisos que posee nuestra empresa para ello.

Se expide la presente certificación en Bucaramanga, Santander a solicitud de los interesados, a los diez (10) días del mes de abril del 2025.

ANDRES FELIPE ANAYA LOPEZ
Representante legal
RETCOR S.A.S.

PROYECTO: N.J.L

REVISO: T.F.V.C

APROBO: A.F.A.L

RETCOR

EMPRESA COLOMBIANA RECOLECTORA Y TRANSPORTADORA DE RESIDUOS S.A.S. – RETCOR S.A.S.

CERTIFICA:

Que, desde el 07 de enero del 2025 al 28 de febrero del 2025, se realizó la recolección y transporte de 75 galones de residuos generados por la limpieza de una (1) unidad de baño portátil, dicho servicio fue prestado realizando dos visitas de limpieza a la semana, servicio que se prestó al CONSORCIO CONSERVACION HIDRICA Ubicado en la carrera 39 No 51 – 31 ap 1903 Bucaramanga, Santander. en la obra ubicada en el barrio Bucarica del municipio de Floridablanca. con el fin de realizar la disposición final en EDEPSA E.S.P. empresa aliada encargada del tratamiento de los residuos recolectados y con los permisos que posee nuestra empresa para ello.

Se expide la presente certificación en Bucaramanga, Santander a solicitud de los interesados, a los diez (10) días del mes de abril del 2025.

ANDRES FELIPE ANAYA LOPEZ
Representante legal
RETCOR S.A.S.

PROYECTO: N.J.L

REVISO: T.F.V.C

APROBO: A.F.A.L

RETCOR

EMPRESA COLOMBIANA RECOLECTORA Y TRANSPORTADORA DE RESIDUOS S.A.S. – RETCOR S.A.S.

CERTIFICA:

Que, desde el 01 de marzo del 2025 al 31 de marzo del 2025, se realizó la recolección y transporte de 40 galones de residuos generados por la limpieza de una (1) unidad de baño portátil, dicho servicio fue prestado realizando dos visitas de limpieza a la semana, servicio que se prestó al CONSORCIO CONSERVACION HIDRICA Ubicado en la carrera 39 No 51 – 31 ap 1903 Bucaramanga, Santander. en la obra ubicada en el barrio Lagos del municipio de Floridablanca. con el fin de realizar la disposición final en EDEPSA E.S.P. empresa aliada encargada del tratamiento de los residuos recolectados y con los permisos que posee nuestra empresa para ello.

Se expide la presente certificación en Bucaramanga, Santander a solicitud de los interesados, a los diez (10) días del mes de abril del 2025.

ANDRES FELIPE ANAYA LOPEZ
Representante legal
RETCOR S.A.S.

PROYECTO: N.J.L

REVISO: T.F.V.C

APROBO: A.F.A.L

RETCOR

EMPRESA COLOMBIANA RECOLECTORA Y TRANSPORTADORA DE RESIDUOS S.A.S. – RETCOR S.A.S.

CERTIFICA:

Que, desde el 28 de noviembre del 2024 al 31 de diciembre del 2024, se realizó la recolección y transporte de 45 galones de residuos generados por la limpieza de una (1) unidad de baño portátil, dicho servicio fue prestado realizando dos visitas de limpieza a la semana, servicio que se prestó al CONSORCIO CONSERVACION HIDRICA Ubicado en la carrera 39 No 51 – 31 ap 1903 Bucaramanga, Santander. en la obra ubicada en el barrio Molinos del municipio de Piedecuesta. con el fin de realizar la disposición final en EDEPSA E.S.P. empresa aliada encargada del tratamiento de los residuos recolectados y con los permisos que posee nuestra empresa para ello.

Se expide la presente certificación en Bucaramanga, Santander a solicitud de los interesados, a los diez (10) días del mes de abril del 2025.

ANDRES FELIPE ANAYA LOPEZ
Representante legal
RETCOR S.A.S.

PROYECTO: N.J.L

REVISO: T.F.V.C

APROBO: A.F.A.L

RETCOR

EMPRESA COLOMBIANA RECOLECTORA Y TRANSPORTADORA DE RESIDUOS S.A.S. – RETCOR S.A.S.

CERTIFICA:

Que, desde el 07 de enero del 2025 al 31 de marzo del 2025, se realizó la recolección y transporte de 115 galones de residuos generados por la limpieza de una (1) unidad de baño portátil, dicho servicio fue prestado realizando dos visitas de limpieza a la semana, servicio que se prestó al CONSORCIO CONSERVACION HIDRICA Ubicado en la carrera 39 No 51 – 31 ap 1903 Bucaramanga, Santander. en la obra ubicada en el barrio Molinos del municipio de Piedecuesta. con el fin de realizar la disposición final en EDEPSA E.S.P. empresa aliada encargada del tratamiento de los residuos recolectados y con los permisos que posee nuestra empresa para ello.

Se expide la presente certificación en Bucaramanga, Santander a solicitud de los interesados, a los diez (10) días del mes de abril del 2025.

ANDRES FELIPE ANAYA LOPEZ
Representante legal
RETCOR S.A.S.

PROYECTO: N.J.L

REVISO: T.F.V.C

APROBO: A.F.A.L

DOCUMENTOS DE LOS VEHÍCULOS TIPO VOLQUETAS

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10018011705

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
PBA173	DODGE	SIN LINEA	1980

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
6.194	MARFIL	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	6000

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
45326019	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
DT009001	N	DT009001	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
CHACON ZARATE FABIO	C.C. 91178736

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
33854

I/E
I

FECHA IMPORT.
28/10/1980

PUERTAS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA
23/07/1984

FECHA EXP. LIC. TTO.
18/03/2019

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

DIR TTOYTTE BUCARAMANGA

LT03002734888

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

AXA COLPATRIA

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00:00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2024 3 19	2024 3 20	2025 3 19

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
3225659800	PBA173	VEHICULOS DE CARGA	PARTICULAR	6194	1980

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	DODGE	

LÍNEA VEHÍCULO: LINEA DEL VEHICULO

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
45326019	DT009001	DT0090010000000000	6

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
CHACON ZARATE, FABIO		CC	91178736	BUCARAMANGA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1306	26	57790510	3225659800	BUCARAMANGA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
332	$919.000,00	$477.800,00	$2.100,00

TOTAL A PAGAR

$1.398.900,00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
	HASTA	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MINIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 818, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

El clausulado que aplica a esta póliza puede ser consultado y descargado en nuestro portal www.axacolpatria.co

CLAUSULA: Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos: Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si la aseguradora evidencia que existe una póliza vigente, la vigencia de la póliza que se expide se modificará, iniciando a partir del día siguiente de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Consulte información sobre la Defensoría del Consumidor Financiero aquí https://www.axacolpatria.co/documents/42201273/76141280/Folleto-virtual-consumidor-financiero.pdf

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:
- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

DE COLOMBIA

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 172489664

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA GIRÓN S.A.S.

NIT: 901140142

No. de Certificado de Acreditación: 18-CIN-093-001

Fecha de expedición: 2024/03/18

Fecha de vencimiento: 2025/03/18

DATOS VEHÍCULO

PLACA: PBA173

CLASE: VOLQUETA

MARCA: DODGE

MODELO: 1980

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 6194

NRO. MOTOR: 45326019

NRO. CHASIS: DT009001

VIN:

LÍNEA: SIN LINEA

COLOR: MARFIL

NOMBRE PROPIETARIO: FABIO CHACON Z.

FIRMA DEL RESPONSABLE

EDUARDO CALDERON PORRAS

Powered by CamScanner



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10033292649

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
XKC284	CHEVROLET	SIN LINEA	1953

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
8.000	VERDE	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	4000

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
T853513V62	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	******	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
FLOREZ GARAVITO EDHIT YAMILE

IDENTIFICACIÓN
C.C. 37555201



RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE	POTENCIA HP
******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
20099

VE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
I	03/06/1953	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
09/11/1953	25/11/2024	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
DIR TTOYTTE BUCARAMANGA

LT03007117436

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO | MES | DÍA)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO | MES | DÍA)	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO | MES | DÍA)
2024-05-09	2024-05-10	2025-05-09

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
1508005686212000	XKC284	CARGA O MIXTO	PARTICULAR	8000	1953

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	CHEVROLET	PLATON

LÍNEA VEHICULO: SIN LINEA

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
T853513V62	XXX		4.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
PARRA RAMIREZ, HUMBERTO	3157402270	CC	91342235	PIEDECUESTA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	15	13518	0	MEDELLIN

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
310	$ 636000	$ 330700	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 968800

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] / 701,68 [2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

•Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
•La autoridad de transito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
•En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 177364697

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA SUPERCAR LA CENTRAL

NIT: 901171195

No. de Certificado de Acreditación: 20-OIN-011

Fecha de expedición: 2024/11/22

Fecha de vencimiento: 2025/11/22

DATOS VEHÍCULO

PLACA: XKC284

CLASE: VOLQUETA

MARCA: CHEVROLET

MODELO: 1953

SERVICIO: Particular

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 8000

NRO. MOTOR: T853513V62

NRO. CHASIS:

VIN:

LÍNEA: SIN LINEA

COLOR: VERDE

NOMBRE PROPIETARIO: PABLO JAIMES C.

FIRMA DEL RESPONSABLE

SAUL BALLESTEROS BALLESTEROS

ACTA NO 001 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2024

	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.		
	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: A-PI-FO05 / VERSION: 5	ACTA DE REUNIÓN		

TEMA:	MANTENIMIENTO DE AREAS DE IMPORTANCIA ESTRATEGICA PARA LA CONSERVACION DEL RECURSO HIDRICO EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEFINIDOS Y PRIORIZADOS POR LA CDMB (RA-OBRA-03)	**ACTA No.1**	**FECHA**		
			DD	MM	AA
		001	19	12	2024
LUGAR:	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO Y SEGURIDAD TERRITORIAL – SURYT, TERCER PISO SEDE ADMINIS TRATIVA CDMB	**Hora Inicio**	2:00 pm		
		Hora final	3:00 pm		

AGENDA		
No.	**ORDEN DEL DIA**	**RESPONSABLE**
1	SALUDO A LOS ASISTENTES	CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
2	CONTEXTUALIZACION DE LA INTERVENCION DE PODA Y ENTRESACA SANITARIA Y DE FORMACION DE LAS GUADAS PRESENTES EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO EN LOS SECTORES LAGOS 1, MOLINOS Y CAÑAVERAL, MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	JESUS EVELIO SANCHEZ SANCHEZ LUISA FERNANDA SANCHEZ CASTRO
3	CONCLUSIONES DE LA REUNION	

No.	DESARROLLO ORDEN DEL DÍA
1	El Subdirector de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial - SURYT de la CDMB Arquitecto Carlos Alberto Díaz Barrera da la bienvenida a los asistentes, indicando que el objeto de la reunión es tratar el tema de la intervención por medio de la poda preventiva de individuos arbóreos de la especie *Guadua Angustifolia* el margen de la ronda hídrica objeto del proyecto, municipio de Floridablanca Santander, en el marco de ejecución del **MANTENIMIENTO DE AREAS DE IMPORTANCIA ESTRATEGICA PARA LA CONSERVACION DEL RECURSO HIDRICO EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEFINIDOS Y PRIORIZADOS POR LA CDMB (RA-OBRA-03)** .
2	El ingeniero Jesús Evelio Sánchez Sánchez, profesional especializado grado 14 – coordinador grupo de gestión del riesgo, indica que se realizó visita al área del proyecto, en conjunto con la ingeniera Luisa Fernanda Sánchez Castro como asesora ambiental del CONSORCIO CONSERVACION HIDRICA y la ingeniera Angie Daniela Merchán Pérez en representación de la Interventoría, en la

cual se verificó que para el sector donde se ejecuta el proyecto, se localizan 5242.86 m2 de *Guadua Angustifolia*, detallados en el área de Molinos 1316.23 m2, Bucarica 1225.25 m2, Cañaveral 725.69 y Lagos II 1975.69 m2, tal como se presenta en el levantamiento topográfico. Las cuales deben recibir una intervención de podas de acuerdo a la dinámica de la ejecución, con el fin de llevar a cabo el mantenimiento perimetral y en altura para las guaduas que representan amenaza de obstrucción de la sección hídrica durante eventos extremos en la microcuenca del rio Frio.

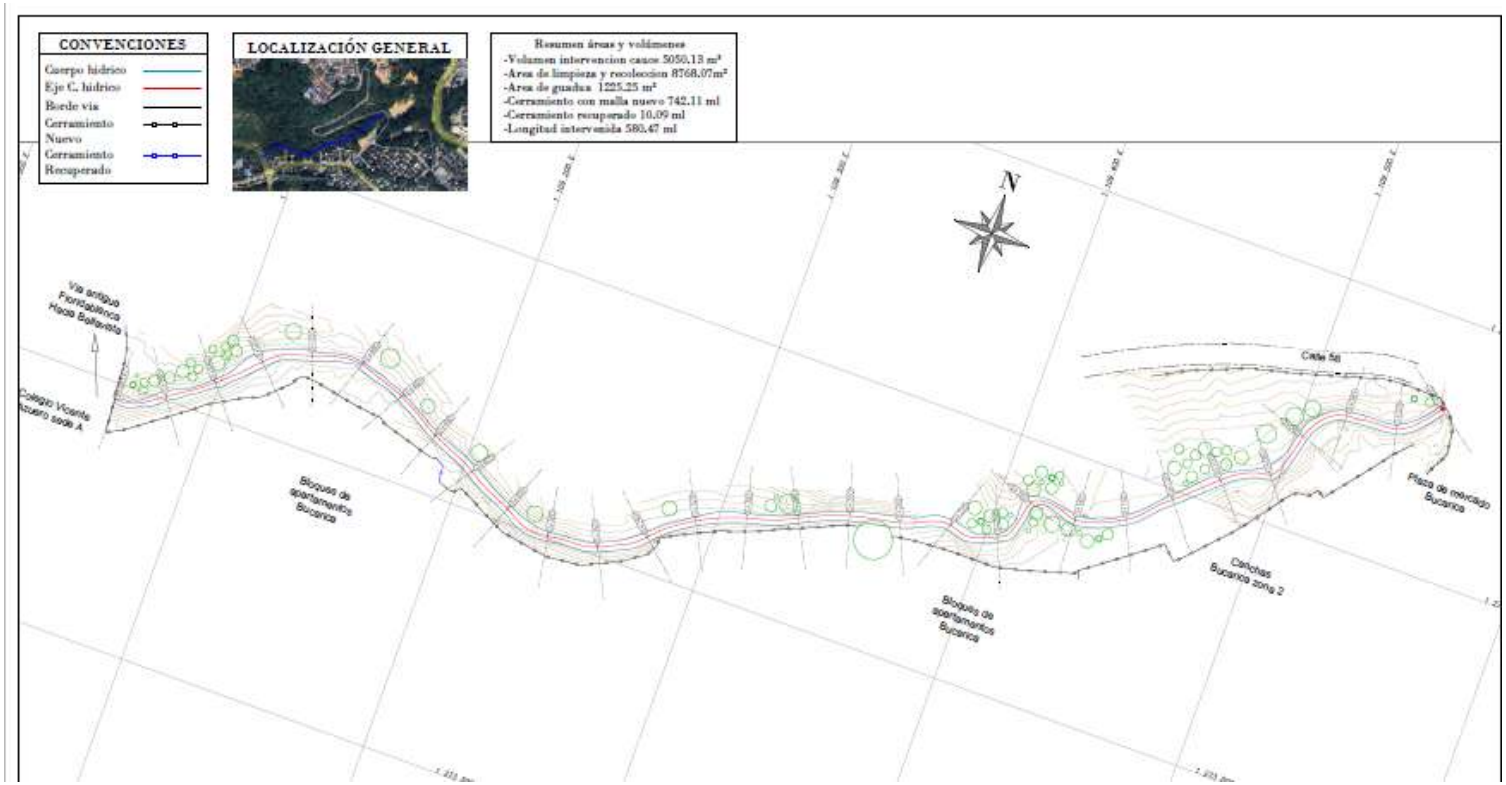


Imagen 1. Area sector bucarica. Fuente Contratista.

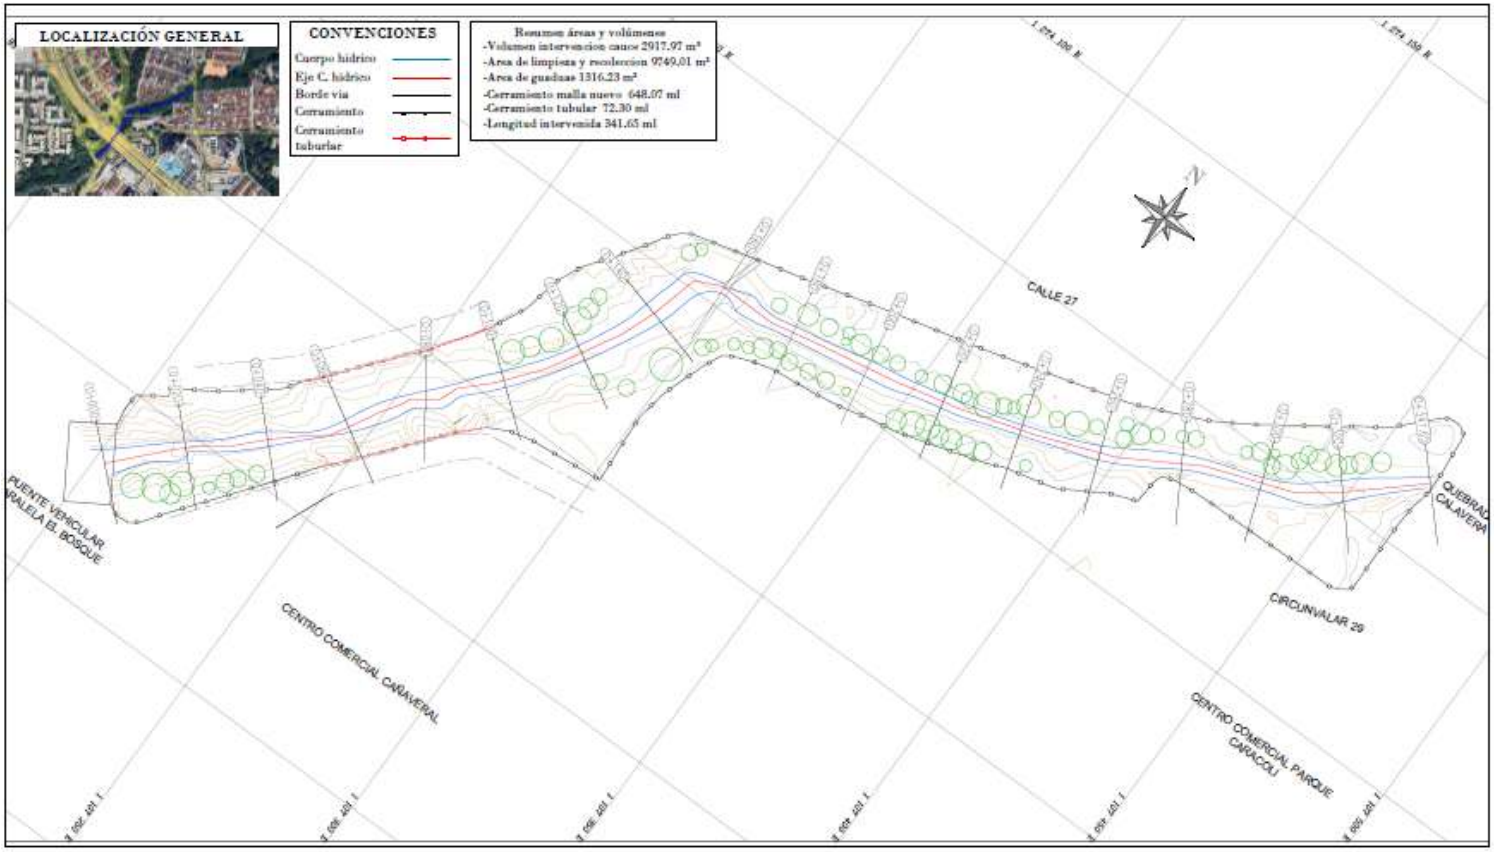


Imagen 2. Area sector Molinos. Fuente: Contratista

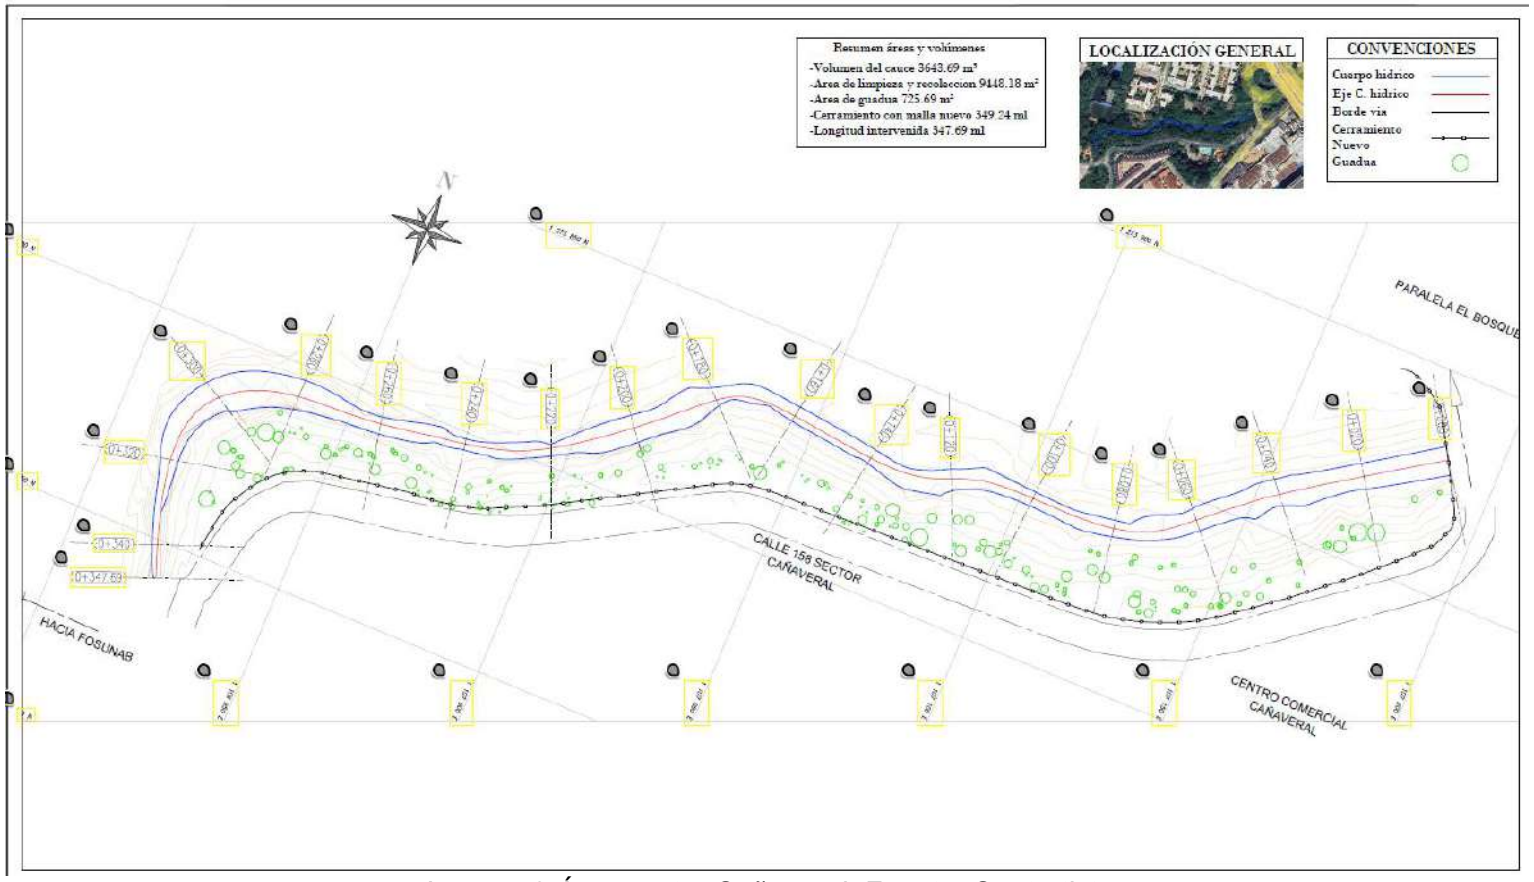


Imagen 3 Área sector Cañaveral. Fuente: Contratista

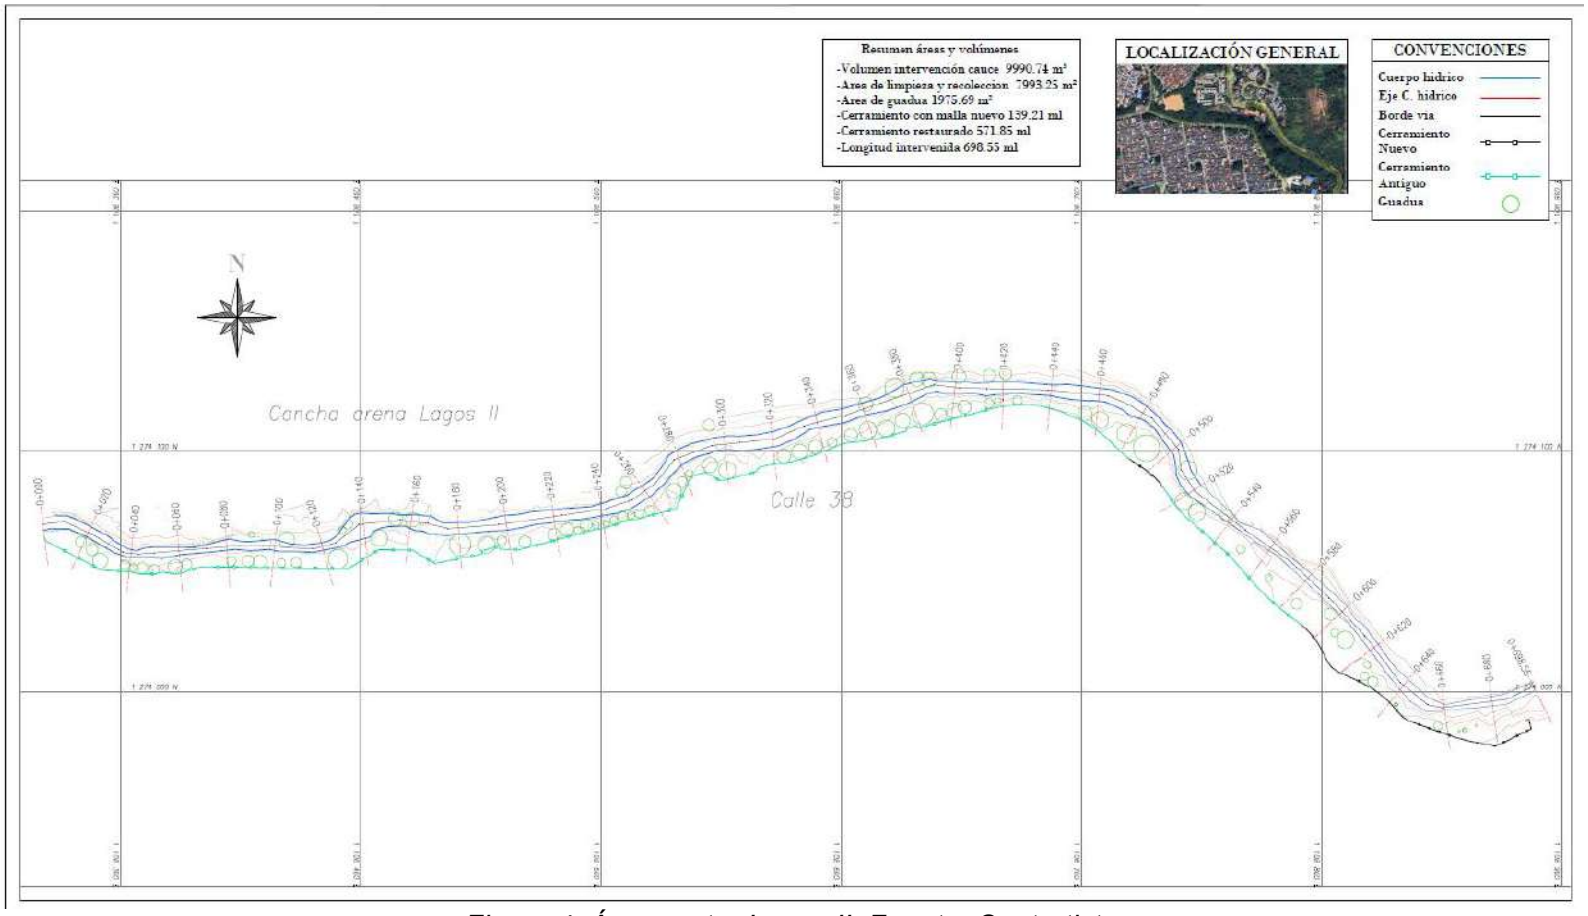


Figura 4. Área sector Lagos II. Fuente: Contratista

La Ingeniería LUISA FERNANDA SÁNCHEZ CASTRO en representación del CONSORCIO CONSERVACION HIDRICA indica que después de llevar a cabo el análisis técnico de la línea base del área de influencia directa del proyecto, se concluyó que la dificultad presentada en la ronda hídrica es exclusivamente por la falta de mantenimiento a los bloques *Guadua Angustifolia*, el objeto del podar la especie *Guadua Angustifolia*, promueve un crecimiento más saludable de la especie, lo que puede ayudar a prevenir que se vuelvan inestables o se rompan durante lluvias o vientos fuertes, estableciendo así que la poda no solo contribuye a la estética del entorno, sino que también es una medida preventiva clave para garantizar la seguridad de la ronda hídrica, el eliminar la acumulación de material vegetal seco disminuye la probabilidad de accidentes, mantiene la seguridad de la zona , reduce la propagación de plagas y enfermedades que puedan poner en riesgo las otras especies forestales de la zona, De igual forma la poda contribuye a mejorar la dinámica normal de la ronda hídrica, evitando la acumulación de materia orgánica en descomposición, facilitando el flujo de agua, lo cual ayuda a prevenir inundaciones, obstrucción del flujo de agua y erosión del suelo en la sección hídrica de la microcuenca del Rio Frio.

Continua, indicando que los árboles con alturas superiores a 3 m se encuentran en condiciones fitosanitarias adecuadas lo que permite la absorción de dióxido de carbono y liberan oxígeno, ya que su follaje contribuye a la purificación del aire, también filtran contaminantes y partículas de aire, mejorando la calidad el mismo, contribuyen a combatir la adversidad del cambio climático, su frondosidad, proporcionan sombra, reduciendo la temperatura en el área de influencia de la ronda hídrica, de igual forma se evidencia que los árboles superiores a 3 m son hábitats para una variedad de especies de fauna y flora, proporcionando refugio y alimento a aves, insectos y otros animales, contribuyendo a la biodiversidad del ecosistema en la microcuenca del Rio Frio, en cuanto a la Prevención de la erosión, sus raíces profundas ayudan a estabilizar el suelo, previniendo la erosión y manteniendo la integridad del terreno, regulan el ciclo del agua al captar y retener agua de lluvia , lo que permite reducir el riesgo de inundaciones y mejora la recarga de los acuíferos del área metropolitana de Bucaramanga, entre otros beneficios más.

Así mismo y continuando con su exposición, indica que la localización de los árboles a intervenir se muestra en el informe de inventario forestal adjunto a la presente acta, en donde en la tabla 3, y tabla 4, se detallan las especies a intervenir con su respectiva localización, información que fue corroborada durante la visita técnica y conjunta (contratista de obra, interventoría, CDMB) adelantada el día 05 de Diciembre de 2024. Igualmente indica que el contratista en dicho informe especifica la manera de intervención de cada especie, los materiales y personal requerido y adicionalmente se presenta el plan de manejo forestal, detallando a los asistentes dicho documento y cada una de las tablas referenciadas.

La Ingeniería Luisa Fernanda Sanchez concluye indicando que la necesidad de intervención con poda y entresaca sanitaria y de formación de los bloques de *Guadua Angustifolia* del área de influencia del proyecto, se ve justificado por la necesidad de intervenir el área presente, para dar cumplimiento al objeto contractual y de esta forma contribuir a la recuperación y el normal flujo del cauce del área y la ronda hídrica, así como la restauración pasiva en el área, ya que la zona es propensa a la disposición de residuos e intervención antrópica.







	  
3	La CDMB por medio de la Subdirección de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial – SURYT, una vez realizada la visita y analizado el levantamiento topográfico con su respectivo anexo, con base en la ley 1523 de 2012 enmarcada en el principio de Precaución el cual reza textualmente: *Cuando exista la posibilidad de daños graves o irreversibles a las vidas, a los bienes y derechos de las personas, a las instituciones y a los ecosistemas como resultado de la materialización del riesgo en desastre, las autoridades y los particulares aplicarán el principio de precaución en virtud del cual la falta de certeza científica absoluta no será óbice para adoptar medidas encaminadas a prevenir, mitigar la situación de riesgo*, ve la necesidad de realizar la poda preventiva, correctiva y el desmoche de los bloques *Guadua Angustifolia* que permitan mejorar el crecimiento y la salud de las plantas restantes. Actividad que busca optimizar el MANTENIMIENTO DE AREAS DE IMPORTANCIA ESTRATEGICA PARA LA CONSERVACION DEL RECURSO HIDRICO EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA. Para ello la entidad solicita a **CONSORCIO CONSERVACION HIDRICA** hacer el seguimiento de cada individuo podado y desmochado que se realice enmarcado en las recomendaciones expuestas en este concepto técnico y una vez realizadas estas actividades elaborar un informe sobre las mismas, informe que deberá ser enviado a la CDMB.

Como Medida de Compensación por la intervención de los bloques de *Guadua Angustifolia*, el **CONSORCIO CONSERVACION HIDRICA,** deberá realizar la plantación de cien **(100) árboles** de la especie nativas entre las cuales pueden ser *Cedrela odorata* o cedro, *Albizia guachapele* o Nauno, *Tabebuia rosea* o guayacán rosado, *Handroanthus chrysanthus* o Guayacan amarillo, Schizolobium parahyba o (frijolito), Jacaranda caucana (Gualanday), Enterolobium cyclocarpum (Orejo), Pithecellobium dulce (Gallinero), Guazuma ulmifolia (Guacimo) al igual en aras de proteger la avifauna del sector deben llevar a cabo la siembra de algunos frutales como *Pouteria sapota* o arbol de Zapote, *Mangifera indica* Mango y *Syzygium malaccense* o Pomarroso Brasilero con una altura de mínima de 110 cm, las cuales están dirigidas a conservación del área y la microcuenca del Rio Frio, ya que el area representa la mejor oportunidad de conservación efectiva, esta actividad deberá realizarse de manera **que se garantice la supervivencia de los individuos y no sean afectados por las actividades de la obra.**

En este sentido se deben realizar actividades de manejo y mantenimiento, así como el control fitosanitario de los individuos arbóreos, la cual debe ser reportada a la CDMB anexando evidencias, con el fin de realizar seguimiento y control a la obligación.
Los residuos generados no podrán ser comercializados, los residuos deben ser repicados y dispuestos en sitios adecuados, con el fin de acelerar la descomposición y mejor incorporación de la materia orgánica al suelo, lejos de fuentes hídricas.

No se permite la intervención de árboles distintos a las aquí mencionados o que se encuentran en predios diferentes al autorizado, ni en zona de afloramientos de agua o áreas protectoras de quebradas, tampoco se permiten quemas ni caza de fauna silvestre de ninguna índole. Este aprovechamiento en ningún caso puede amparar la tala o corta de bosques naturales con el fin de vincular en forma progresiva áreas forestales a otros usos.

COMPROMISOS

No.	TAREAS	RESPONSABLE	FECHA
1	Seguimiento a las actividades de tala	CONSORCIO CONSERVACION IM	Durante el proceso de aprovechamiento
2	Presentación de Informe de tala a la CDMB	CONSORCIO CONSERVACION HIDRICA	Informe mensual una vez se inicie la tala
3	Plan de compensación ambiental por la tala de las especies arbóreas de acuerdo a lo indicado dentro de la conclusión del presente documento.	CONSORCIO CONSERVACION HIDRICA	Dos meses contados a partir de la suscripción de la presente acta

CDMB	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – C.D.M.B.		
	ELABORÓ: Equipo Proceso Relaciones con Partes Interesadas	REVISÓ: REPRESENTANTE DIRECCIÓN SIGC	APROBÓ: DIRECTOR(A) GENERAL
CODIGO: A-PI-FO05 / VERSION: 5	ACTA DE REUNIÓN		

PRÓXIMA REUNIÓN					
FECHA:	----------	HORA:	----------	LUGAR:	----------

Elaboró Acta	Cargo	Firma
JESUS EVELIO SANCHEZ SANCHEZ	COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN DEL RIESGO -PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 14	
Revisó Acta	**Cargo**	**Firma**
CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA	SUBDIRECTOR SURYT	

LISTADO DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS

NO.	NOMBRE COMPLETO	GÉNERO M	GÉNERO F	CARGO U OFICIO	ENTIDAD U ORGANIZACION	TELEFONO FIJO / CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	CARLOS ALBERTO DIAZ BARREA	X		SUBDIRETOR SURYT	CDMB	3167560000	Carlos.diaz@cdmb.gov.co	
2	JESUS EVELIO SANCHEZ SANCHEZ	X		COORDINADOR - PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 14	GRUPO DE GESTIÓN DEL RIESGO -	3202090759	Jesus.sanchez@cdmb.gov.co	
3	LUISA FERNANDA SÁNCHEZ CASTRO		X	ASESOR AMBIENTAL	CONSORCIO CONSERVACION HIDRICA	3123551214	Consorcio@gmail.com	Luisa Fernanda Sanchez C.
4	ANGIE DANIELA MERCHAN PEREZ		X	INTERVENTORIA AMBIENTAL	CONSORCIO CONSERVACION IM	3165753410	Mquirozgomez5@gmail.com	

INFORME DE SEGUIMIENTO DE INTERVENCIÓN, PODA Y ENTRESACA SANITARIA Y DE FORMACIÓN DE LAS GUADUAS



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 210.15563.4 DE 2024

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO EL "MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTNCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEFINIDOS Y PRIORIZADOS POR LA CDMB

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PODA Y ENTRESACA SANITARIA ARBÓREA	
Miguel Fernando Quirós Gómez Representante Legal Consorcio Conservación IM	Firma:

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVOS 4
2.1 Objetivo general 4
2.2 Objetivos específicos 4
3. INFORMACIÓN DE CONTRATOS 5
4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 6
4.1 QUEBRADA SURATOQUE – SECTOR BUCARICA 7
4.2 QUEBRADA SURATOQUE – SECTOR LAGOS 8
4.3 QUEBRADA LA CALAVERA – SECTOR MOLINOS 9
4.4 QUEBRADA ZAPAMANGA – SECTOR CAÑAVERAL 10
5. APROBACIÓN DE INTERVENCIÓN ARBÓREA 11
6. ACTIVIDAD DE PODA Y ENTRESACA SANITARIA ARBÓREA 12
7. COMPENSACIÓN POR REFORESTACIÓN 16
8. CONCLUSIONES 17

1. INTRODUCCIÓN

Mediante el Contrato de Interventoría No. 210.15563.4 celebrado entre la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga y la empresa CONSORCIO CONSERVACIÓN IM con NIT 901.881.356-4 se realiza supervisión, verificación y control de la ejecución del contrato de obra No. 210.15562.5 del CONSORCIO CONSERVACIÓN HIDRICA con NIT 901.881.924-8, cuyo objetivo es la "MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEFINIDOS Y PRIORIZADOS POR LA CDMB"

El contratista de obra, el Consorcio Conservación Hídrica con NIT 210.15562.5 con el fin de continuar con las actividades contractuales que comprenden a grandes rasgos el mejoramiento de la capacidad hídrica en tres sectores mediante actividades de limpieza de cauce y ronda hídrica, dragado, entresaca y poda sanitaria de bambús, cargue y disposición de residuos sólidos, mejoramiento y construcción de cerramiento, entre otras: los sectores son Bucarica, Molinos y Cañaveral cuyo recurso hídrico tiene su trazado en zona urbana y ha sido objeto de malas prácticas antropogénicas. Las rondas hídricas cuentan con formación de bloques de *Guadua Angustifolia* de los cuales se evidencia la necesidad de realizar intervención con poda y entresaca sanitaria y garantizar su restauración pasiva, mejoramiento fitosanitario de las especies vegetales existentes.

En recorridos previos al inicio de actividades se evidenció bloques de guadua en el área objeto del contrato de obra, por ello el contratista de obra gestionó ante la autoridad ambiental competente la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB el permiso para realizar la poda y entresaca sanitaria de 5242.86 m2 de bloques de *Guadua Angustifolia* consignados en el acta N. 001 de Diciembre 19 de 2024 enmarcado en la ley 1523 de 2012 bajo en principio de precaución "cuando exista la posibilidad de daños graves o irreversibles a las vidas, a los bienes y derechos de las personas, a las instituciones y a los ecosistemas como resultados de la materialización del riesgo en desastre, las autoridades y los particulares aplicaran el principio de precaución en virtud del cual la falta de certeza científica absoluta no será óbice para adoptar

medidas encaminadas a prevenir, mitigar la situación de riesgo"; viendo la necesidad de realizar una poda preventiva y entresaca sanitaria lo cual permite el crecimiento y el estado fitosanitario de las demás especies existentes en el área de influencia directa del proyecto.

El presente documento detalla las actividades de supervisión realizadas en obra para la actividad de poda y entresaca arbórea llevada a cabo por el contratista de obra.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

- Supervisar la implementación del plan de aprovechamiento y manejo forestal para la actividad de poda y entresaca de la *Guadua Angustifolia*, en cumplimiento con la ejecución de actividades del contrato de obra No. 210.15562.5.

2.2 Objetivos específicos

- Realizar seguimiento de las medidas y alternativas para mitigar, controlar, corregir y compensar las afectaciones a la fauna y flora por el aprovechamiento de los individuos.
- Supervisar los procedimientos de manejo de residuos generados por la actividad de aprovechamiento forestal.
- Especificar las medidas compensatorias del impacto generado por el aprovechamiento de árboles.

3. INFORMACIÓN DE CONTRATOS

CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	210.15562.5 DEL 23 OCTUBRE.
OBJETO:	"MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEFINIDOS Y PRIORIZADOS POR LA CDMB.
ENTIDAD CONTRATANTE:	CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA.
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CONSERVACIÓN HÍDRICA. R.L. EDGAR LEONARDO GÓMEZ RONCANCIO. NIT. 901.881.924-8.
VALOR DEL CONTRATO:	CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($4.521.575.179,94).
SUPERVISOR:	CARLOS ALBERTO DÍAZ BARRERA.
FECHA DE INICIO:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024.
PLAZO INICIAL:	42 DIAS - HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
PLAZO ADICIONAL:	90 DIAS – TRES MESES.
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	31 DE MARZO DE 2025.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
CONTRATO No.:	210.15563.4 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO EL "MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTNCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEFINIDOS Y PRIORIZADOS POR LA CDMB
ENTIDAD CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA.
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	CONSORCIO CONSERVACIÓN IM. R.L. MIGUEL FERNANDO QUIRÓS GÓMEZ.

	NIT. 901.881.356-4.
VALOR DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($254.886.576,00).
DIRECCIÓN:	CARRERA 15 # 22-02 TORRE 6 OFICINA 422 – GIRÓN SANTANDER.
SUPERVISOR:	CARLOS ALBERTO DÍAZ BARRERA.
FECHA DE INICIO:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024.
PLAZO INICIAL:	42 DIAS - HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
PLAZO ADICIONAL:	90 DIAS – TRES MESES.
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	31 DE MARZO DE 2025.

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Floridablanca es un municipio que forma parte del Área Metropolitana de Bucaramanga, junto con Girón, Bucaramanga y Piedecuesta. Floridablanca está ubicado en el departamento de Santander, en la zona montañosa del costado occidental de la cordillera oriental. Su centro urbano está a 07° 04´ 36´´ de latitud norte y 73° 05´ 52´´ de longitud oeste.

El frente de obra se encontró ubicado en diferentes sectores de las fuentes hídricas de la microcuenca del río Frío es una reserva hídrica del municipio de Floridablanca, Colombia, con una superficie de 74,3 km2. Nace en el cerro de la Judía, a una altura de 2032 msnm, y tiene una longitud aproximada de 30,5 km.

A continuación, se relaciona gráficamente los tramos objeto de limpieza:

Cuerpo Hídrico	Sector	Coordenadas Aguas Arriba	Coordenadas Aguas Abajo
Quebrada Suratoque	Bucarica	7°04'14.6"N 73°05'08.7"W	7°04'07.6"N 73°05'24.9"W
Quebrada Suratoque	Lagos	7°04'07.5"N 73°05'32.0"W	7°04'11.0"N 73°05'51.6"W
Quebrada La Calavera	Molinos	7°04'24.7"N 73°06'17.3"W	7°04'23.1"N 73°06'23.0"W
Quebrada Zapamanga	Cañaveral	7°04'21.5"N 73°06'24.2"W	7°04'14.0"N 73°06'34.9"W

4.1 QUEBRADA SURATOQUE – SECTOR BUCARICA





Quebrada Suratoque


4.2 QUEBRADA SURATOQUE – SECTOR LAGOS





Quebrada Suratoque

4.3 QUEBRADA LA CALAVERA – SECTOR MOLINOS

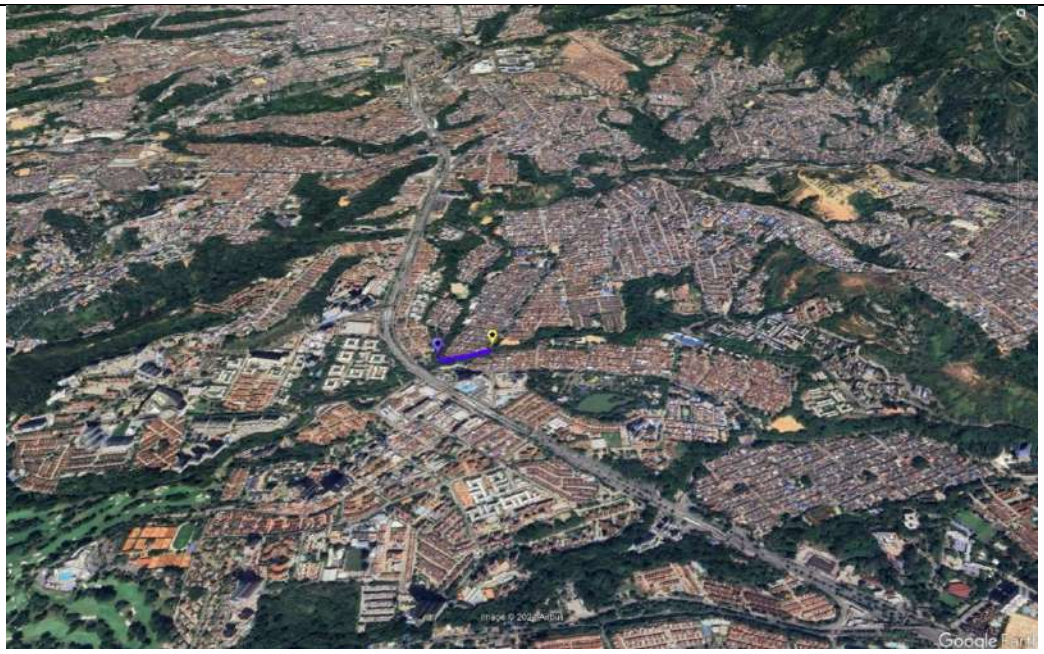



Quebrada La Calavera

4.4 QUEBRADA ZAPAMANGA – SECTOR CAÑAVERAL





Quebrada Zapamanga

5. APROBACIÓN DE INTERVENCIÓN ARBÓREA

El día 19 de Diciembre 2024, se realiza reunión en las instalaciones de la CDMB en la oficia de la Subdirección de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial – SURYT se socializa la importancia y beneficios de realizar la entresaca y poda de la *Guadua Angustifolia* encontrada en los frentes de obra, se presenta los levantamiento topográficos y planos realizados posterior a trabajos en campo,

Con base en la Ley 1523 de 2012 enmarcada en el principio de precaución bajo el principio de precaución "cuando exista la posibilidad de daños graves o irreversibles a las vidas, a los bienes y derechos de las personas, a las instituciones y a los ecosistemas como resultados de la materialización del riesgo en desastre, las autoridades y los particulares aplicaran el principio de precaución en virtud del cual la falta de certeza científica absoluta no será óbice para adoptar medidas encaminadas a prevenir, mitigar la situación de riesgo" la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga autoriza promueve un crecimiento más saludable de la especie, lo que puede ayudar a prevenir que se vuelvan inestables o se rompan durante lluvias o vientos fuertes, estableciendo así que la poda no solo contribuye a la estética del entorno, sino que también es una medida preventiva clave para garantizar la seguridad de la ronda hídrica, el eliminar la acumulación de material vegetal seco disminuye la probabilidad de accidentes, mantiene la seguridad de la zona , reduce la propagación de plagas y enfermedades que puedan poner en riesgo las otras especies forestales de la zona, De igual forma la poda contribuye a mejorar la dinámica normal de la ronda hídrica, evitando la acumulación de materia orgánica en descomposición, facilitando el flujo de agua, lo cual ayuda a prevenir inundaciones, obstrucción del flujo de agua y erosión del suelo en la sección hídrica de la microcuenca del Rio Frio.

Es importante mencionar, que la presente interventoría realizó acompañamiento y verificación del proceso de toma de datos in situ y validación de levantamientos topográficos requeridos para socializar la cantidad a podar y entresacar.

En la siguiente tabla se relaciona el volumen podado y entresacado según los frentes de obra:

Cuerpo Hídrico	Sector	Coordenadas Aguas Arriba	Coordenadas Aguas Abajo	Cantidad
Quebrada Suratoque	Bucarica	7°04'14.6"N 73°05'08.7"W	7°04'07.6"N 73°05'24.9"W	1225.25 m^2
Quebrada Suratoque	Lagos	7°04'07.5"N 73°05'32.0"W	7°04'11.0"N 73°05'51.6"W	1975.69 m^2
Quebrada La Calavera	Molinos	7°04'24.7"N 73°06'17.3"W	7°04'23.1"N 73°06'23.0"W	1316.23 m^2
Quebrada Zapamanga	Cañaveral	7°04'21.5"N 73°06'24.2"W	7°04'14.0"N 73°06'34.9"W	725.69 m^2

ID	Nombre común	Nombre científico	
1	Guadua	*Guadua angustifolia*	5242.86 m^2
TOTAL			5242.86 m^2

6. ACTIVIDAD DE PODA Y ENTRESACA SANITARIA ARBÓREA

Planificación de actividad de poda y entresaca sanitaria: Se realizó visita al frente de obra evidenciando la característica de los árboles y su inclinación para tener en cuenta su derribo y direccionamiento de caída. Se realizó verificación ocular de la morfología y la abundancia de sus copas.

En el frente de obra no existen elementos externos que sirvan de obstáculos como cuerdas eléctricas, viviendas, cercas vivas, cercas en madera o concreto; sin embargo, si se evidenció un cerramiento en postes de concreto y alambre en diferentes trayectos para lo cual se analizó y definió las actividades necesarias para el direccionamiento del árbol.

Preparación de árboles a podar y entresacar: Se realizó desmonte parcial de la zona total donde se encuentran los boques de guadua. Personal vinculado al proyecto por medio de herramienta menor realiza una limpia en las zonas del fuste con el fin de tener una visual del área, zona o dirección de caída y ruta de escape en caso de tal de una emergencia.

Inspección y auyentamiento: Se realizó verificación ocular y se evidenció que no existen nuevos individuos o nidos en los árboles a intervenir. Se realizó auyentamiento de aves mediante instrumentos sonoros, estímulos acústicos que ahuyentaron las aves de paso que estaban en los árboles.
Tumba: Se realizaron cortes a ras del primer o segundo nudo desde la base, evitando así, dejar cavidades que puedan acumular agua y propiciar la pudrición del rizoma.

Dirección del corte: Se inclinó ligeramente el corte para facilitar el escurrimiento del agua y prevenir la acumulación en la superficie cortada.











Actividad de entresaca sanitaria

Trozado: Se realizaron cortes del tallo según longitudes deseadas, para tener como resultados trozas de madera y así manipular mucho más fácilmente.



Trozada

Manejo de materiales residuales de origen forestal: Los residuos como ramas, hojas, aserrín y material fueron trasladados a la Planta de Tratamiento de Agua Residual PTAR Rio Frío en Girón, Santander donde realizan aprovechamiento del material vegetal para el tratamiento de lodo deshidratado al cual se procesa y se genera biosólido clasificado según normativa, este abono es aprovechado según su utilidad y alcance.




Cargue de material vegetal




Descargue de material vegetal en PTAR



Chipeado de material vegetal



Mezcla y volteo de biosólido



Aprovechamiento de residuos vegetales

7. COMPENSACIÓN POR REFORESTACIÓN

La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga en aras de compensar por el impacto causado por el aprovechamiento forestal estableció una compensación de 100 árboles.

A continuación, se relacionan las especies propuestas para realizar la compensación:

Especies propuestas para la compensación forestal	
Especies Nativas	
Nombre común	Nombre científico
Cedro	*Cedrela odorata*
Nauno	*Albizia guachapele*
Guayacan Rosado	*Tabebuia rosea*
Guayacan Amarillo	*Handroanthus chrysanthus*
Frijolito	*Schizolobium parahyba*
Gualanday	*Jacaranada caucana*
Orejo	*Enterolobium cyclocarpum*
Gallinero	*Pithcellobium dulce*
Guacimo	*Guazuma ulmifolia*
Especies Frutales	
Nombre común	Nombre científico

Zapote	*Pouteria sapota*
Mango	*Mangifera indica*
Pomarroso Brasilero	*Syzygium malaccense*

Los individuos a compensar deben ser de una altura mínima de 1.10 metros y su reforestación debe ser en una zona donde se garantice su supervivencia realizando los mantenimientos necesarios de plateo, fertilización, seguimiento del estado fitosanitario, resiembra de ser necesario y limpia o rocería en la zona.

La presente interventoría realizará el seguimiento y control una vez se realice las actividades de compensación en el frente de obra.

8. CONCLUSIONES

- Se realizó un seguimiento y acompañamiento a las actividades técnicas de levantamiento de información en campo en relación al área de intervención objeto del contrato.

- Se realizó visita técnica conjunta: El contratista de obra, la interventoría y profesional de la Subdirección de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial SURYT - CDMB, para realizar la verificación de la especie validando la información reportada.

- Mediante el Acta No. 001 del 19 de Diciembre 2024 la entidad ambiental competente autoriza la la poda y entresaca de 5242.86 m2 de Guadua angustifolia, bajo principio 8 de precaución establecido en la Ley 1523 de 2012 del 24 Abril 2012 - Artículo 3°.

- La interventoría realiza seguimiento de las actividades de poda y entresaca sanitaria: Inspección del área, identificación de fauna, análisis de dirección de caída y actividad de poda y entresaca de 5242.86 m2 de Guadua angustifolia.

- El contratista de obra realizó la actividad sin daños a terceros y/o bienes, accidentes laborales, entre otros. No se presentaron afectaciones a individuos arbóreos que no son objetos de poda y entresaca sanitaria.

- La interventoría realizó seguimiento al plan de aprovechamiento y manejo forestal aprobado para la actividad.

- No se realizó comercialización de la madera extraída producto del cumplimiento de la actividad.

- Se realizó repique en pequeños tamaños y traslado de residuos vegetales a la Planta de Tratamiento de Agua Residual PTAR Rio Frío para el proceso de compostaje de lodo deshidratado mediante mezcla 1 a 1 con material vegetal para ser manejado según actividades técnicas y de control de parámetros físicos.

- La autoridad ambiental designó compensación forestal de un total de 100 árboles, se debe realizar siembra de las especies recomendadas de altura mínima de 1.10 metros. Se realizará seguimiento de dichas actividades.

INFORME DE COMPENSACIÓN FORESTAL

INFORME DE COMPENSACION FORESTAL

MANTENIMIENTO DE AREAS DE IMPORTANCIA ESTRATEGICA PARA LA CONSERVACION DEL RECURSO HIDRICO EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEFINIDOS Y PRIORIZADOS POR LA CDMB

ELABORADO POR:

Luisa Fernanda Sanchez C.

LUISA FERNANDA SANCHEZ
CONSORCIO CONSERVACION HIDRICA

BUCARAMANGA

2025

1. INTRODUCCIÓN

Con el fin de llevar a cabo el proyecto titulado "MANTENIMIENTO DE AREAS DE IMPORTANCIA ESTRATEGICA PARA LA CONSERVACION DEL RECURSO HIDRICO EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEFINIDOS Y PRIORIZADOS POR LA CDMB**,** CONSORCIO CONSERVACION HIDRICA solicitó ante la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB el permiso de intervención forestal de Poda y Entresaca Sanitaria y de Formación de la especie Guadua Angustifolia, cuyo aprovechamiento fue realizado por personal capacitado utilizando las herramientas, equipos y las medidas de seguridad necesarias.

Es así que, en atención a la solicitud realizada por CONSORCIO CONSERVACION HÍDRICA, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB por medio del Acta No 001 del 19 de Diciembre de 2024, autoriza la Intervención de Poda y Entresaca Sanitaria y de Formación de Las Guaduas Presentes en el Área de Influencia Directa del Proyecto al CONSORCIO CONSERVACION HÍDRICA.

En este sentido, como medida de compensación por la intervención de la guadua angustifolia, la CDMB requirió realizar la siembra de cien (100) arboles de especies nativas de la región, en áreas del predio donde se va a realizar la intervención de la guadua, brindando mantenimiento como podas, fertilizaciones, adecuados manejos silviculturales con el propósito de preservar su adecuado desarrollo y garantizar su supervivencia.

Teniendo en cuenta las obligaciones establecidas por la CDMB en la autorización de intervención forestal se establece un total de 100 árboles a sembrar como medida de compensación.

En este sentido y conforme a la responsabilidad ambiental que nos caracteriza, CONSORCIO CONSERVACION HÍDRICA, llevó a cabo la siembra de 107 individuos sobre el área de influencia directa de la obra, siembra que fue llevada a cabo en el mes de abril de 2025.

2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Las actividades de siembra se realizaron de acuerdo al trazado, la distribución y la delimitación de las áreas, ubicando triangularmente los árboles cada tres metros teniendo en cuenta la ubicación y estabilización del talud a los puntos definitivos de siembra.

Las actividades de siembra fueron realizadas por personal capacitado en el mes de abril de 2025, se sembraron 107 individuos, a continuación, se presenta el desarrollo detallado de esta actividad:

Actividad	Siembra de 107 árboles.
Lugar de siembra	área de influencia directa del proyecto, en los sectores Lagos II y Bucarica.
Objeto	Siembra de 107árboles de especies nativas para realizar la compensación forestal del proyecto “MANTENIMIENTO DE AREAS DE IMPORTANCIA ESTRATEGICA PARA LA CONSERVACION DEL RECURSO HIDRICO EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEFINIDOS Y PRIORIZADOS POR LA CDMB”
Fecha	Abril de 2025
Participantes	Equipo de trabajo de CONSORCIO CONSERVACIÓN HÍDRICA

Previamente a cada etapa de siembra, se realizó la selección y separación del material vegetal en el vivero “Los Guayacanes”, el cual se encuentra registrado ante el Instituto Colombiano Agropecuario ICA y garantiza la calidad del material vegetal en cuanto a su condición fitosanitaria y física; los árboles corresponden a individuos con alturas mínimas de 1 mt, las especies seleccionadas corresponden exclusivamente a especies nativas del área metropolitana de Bucaramanga, según recomendación de la autoridad ambiental en el Acta mencionada y según su adaptabilidad al ecosistema presente en el área, su servicio de barreras vivas, provisión de sombra y como complemento paisajístico.

Entre las especies nativas seleccionadas se destacan las siguientes:

- Gualanday
- Samán
- Cedro

3. Zona de compensación

Teniendo en cuenta las condiciones de las áreas donde se desarrolló el proyecto y la cantidad de árboles a compensar, se realizó la selección del área de siembra en el perímetro de los sectores intervenidos ubicados en el los Barrios Lagos II y Bucarica, áreas de influencia directa del proyecto.

4. Preparación del terreno.

Control de Hormigas: Se realizó recorridos para detectar la presencia de hormigas y posteriormente a esto se ubicaron las camas u hormigueros para así realizar su neutralización aplicando productos con el ingrediente activo imidacloprid que es un insecticida el cual se aplica en la base del tallo de cada planta atacada, y en los caminos de las hormigas, sus componentes actúan como atrayente alimenticio de tal forma que las hormigas lleven el veneno a los hormigueros.

El proceso de siembra lo componen las siguientes actividades:

Trazado: teniendo en cuenta el área disponible, se señalizo el lugar de siembra de cada árbol en el terreno, se realizó en tresbolillo para terrenos en pendientes, conservando las distancias de siembra de tres metros entre plantas y tres metros entre surcos.

Plateo: Consistió en la eliminación de cobertura vegetal, maleza y obstáculos o material sobrante de los sitios puntuales, dejando libre de cualquier elemento que impida el buen desarrollo de las especies sembradas.

Ahoyado: El tamaño del hoyo se realizó de 30x30 cm de diámetro para que la raíz pueda desarrollarse óptimamente y cuente con suficiente espacio para el abono orgánico a incorporarse generando un buen sustrato para las plantas.

Sustrato de siembra: con el fin de mejorar las condiciones del suelo existentes en el lugar de siembra se adiciono mezcla de tierra del lugar más abono orgánico para crear un sustrato rico en materia orgánica.

Aplicación de Hidroretenedor: Se aplica 10 gramos de hidroretenedor hidratado, el cual es un polímero capaz de absorber hasta 350 veces su peso en agua, para mantener una reserva efectiva de agua en épocas de sequía.

El uso de Hidroretenedor tiene las siguientes ventajas:

- Provee a las plantas en forma continua del agua indispensable para su crecimiento durante etapas de sequía.

- Facilita el desarrollo de la plantación en regiones secas o con mala distribución de las lluvias.

- Reduce al menos un tercio la pérdida de nutrientes en el suelo.

- Incrementa las reservas de agua de los suelos durante 5 años.

- Mejora la ventilación de los suelos compactos.

- Protege el medio ambiente de la sequía, erosión, desertificación y contaminación del agua.

- Permite el mejor desarrollo de las raíces lo que producirá plantas más fuertes y saludables.

Siembra: El establecimiento definitivo de cada individuo, es la actividad más importante y de mayor cuidado en todo el proceso de la Compensación Forestal.

La siembra se realizó teniendo el mayor cuidado posible del árbol, retirando la bolsa sin destruir el pan de tierra, e introduciendo el pilón en el hoyo sin desmoronar la tierra ni romper las raíces, el cuello de la raíz quedo bien nivelado y en el centro del hoyo para obtener una mejor adaptación y prendimiento del árbol sembrado.

Se realizó la mezcla de todos los componentes como abono orgánico, hidroretenedor y sustratos los cuales se incorporan al hoyo y son compactados lo suficientemente para eliminar las posibles bolsas de aire en el suelo.

Para las especies tipo árbol de copa dominante, las plantas son sembradas en puntos libres de toda clase de infraestructura para garantizar su normal desarrollo y crecimiento sin causar futuros inconvenientes que puedan derivar en la tala de dichos individuos.

Sistema de riego: posterior a la siembra se realiza riego de agua a todos los individuos, por medio de manguera de ½" tomada del punto de agua de las áreas de campamento temporal.
.

5. Registro fotográfico de las actividades realizadas.






Material vegetal seleccionado




Preparación de Terreno ahoyado y Limpieza





Aplicación de Hidro-retenedor





Retiro de la bolsa





Siembra de Individuos Arbóreos





Especies Sembradas





Especies Sembradas

	
Actividades de Riego de agua	

6. MANTENIMIENTOS POSTERIORES

Una vez culminada la etapa de siembra, se han de llevar a cabo las siguientes actividades:

En cumplimiento del Acta No 001 del 19 de Diciembre de 2024, CONSORCIO CONSERVACION HIDRICA ha de realizar actividades de manejo y mantenimiento, así como el control fitosanitario de los individuos sembrados; Adicionalmente se realizarán actividades de abonado y fertilización de aquellas plantas que presenten deficiencias nutricionales.

TRATAMIENTO FITOSANITARIO:

El mantenimiento general de la plantación consiste en eliminar la competencia biológica que se genera entre la vegetación no deseada o comúnmente llamada maleza y el manejo fitosanitario adecuado para conservar vivas las nuevas plantas sembradas.

Como actividades de mantenimientos iniciales tenemos el riego de las plantas sembradas y el control fitosanitario de los individuos atacados y defoliados por la hormiga arriera, aplicando imidacloprid el cual actúa cuando el insecto tiene contacto con el producto aplicado en la base del tallo de los árboles.

A lo largo del crecimiento de los individuos arbóreos, son diferentes plagas invasoras y enfermedades que suelen atacar a plantas o árboles, por ello es imprescindible conocer con antelación cuales son las causas asociadas, así como las épocas del año donde se deben realizar tratamientos preventivos.

Por tal razón se realizarán monitores preventivos en la plantación con el fin de identificar los peligros potenciales. Por otra parte, será necesario identificar aquellos individuos que sufran descortezamiento parcial, pues dichas lesiones son el hábitat propicio para el ataque de microrganismos. De identificarse individuos lesionados se procederá inmediatamente a realizar un tratamiento de cicatrización mediante la aplicación de productos orgánicos adecuados cubriendo la superficie de la herida.

PODAS:

Se realizarán podas de mantenimiento, despunte de ramas laterales, podas sanitarias y podas de formación

- Podas de formación, se aplicará a individuos recién plantados que lo necesiten. Se realiza para dar orientación a la formación de follaje. Esta tarea será más intensiva en aquellas plantas que sean sembradas en las zonas verdes.

- Poda sanitaria, la cual consiste en el retiro de ramas muertas o en mal estado.

- Poda de mantenimiento: se aplicará a individuos ya adaptados al terreno y concrecimiento óptimo.

- Provee a las plantas en forma continua del agua indispensable para su crecimiento durante etapas de sequía.

- Facilita el desarrollo de la plantación en regiones secas o con mala distribución de las lluvias.

- Reduce al menos un tercio la pérdida de nutrientes en el suelo.

- Incrementa las reservas de agua de los suelos durante 5 años.

- Mejora la ventilación de los suelos compactos.

- Protege el medio ambiente de la sequía, erosión, desertificación y contaminación del agua.

- Permite el mejor desarrollo de las raíces lo que producirá plantas más fuertes y saludables.

Siembra: El establecimiento definitivo de cada individuo, es la actividad más importante y de mayor cuidado en todo el proceso de la Compensación Forestal.

La siembra se realizó teniendo el mayor cuidado posible del árbol, retirando la bolsa sin destruir el pan de tierra, e introduciendo el pilón en el hoyo sin desmoronar la tierra ni romper las raíces, el cuello de la raíz quedo bien nivelado y en el centro del hoyo para obtener una mejor adaptación y prendimiento del árbol sembrado.

Se realizó la mezcla de todos los componentes como abono orgánico, hidroretenedor y sustratos los cuales se incorporan al hoyo y son compactados lo suficientemente para eliminar las posibles bolsas de aire en el suelo.

Para las especies tipo árbol de copa dominante, las plantas son sembradas en puntos libres de toda clase de infraestructura para garantizar su normal desarrollo y crecimiento sin causar futuros inconvenientes que puedan derivar en la tala de dichos individuos.

Sistema de riego: posterior a la siembra se realiza riego de agua a todos los individuos, por medio de manguera de ½" tomada del punto de agua de las áreas de campamento temporal.
.

5. Registro fotográfico de las actividades realizadas.






Material vegetal seleccionado




Preparación de Terreno ahoyado y Limpieza





Aplicación de Hidro-retenedor





Retiro de la bolsa





Siembra de Individuos Arbóreos





Especies Sembradas





Especies Sembradas

	
Actividades de Riego de agua	

6. MANTENIMIENTOS POSTERIORES

Una vez culminada la etapa de siembra, se han de llevar a cabo las siguientes actividades:

En cumplimiento del Acta No 001 del 19 de Diciembre de 2024, CONSORCIO CONSERVACION HIDRICA ha de realizar actividades de manejo y mantenimiento, así como el control fitosanitario de los individuos sembrados; Adicionalmente se realizarán actividades de abonado y fertilización de aquellas plantas que presenten deficiencias nutricionales.

TRATAMIENTO FITOSANITARIO:

El mantenimiento general de la plantación consiste en eliminar la competencia biológica que se genera entre la vegetación no deseada o comúnmente llamada maleza y el manejo fitosanitario adecuado para conservar vivas las nuevas plantas sembradas.

Como actividades de mantenimientos iniciales tenemos el riego de las plantas sembradas y el control fitosanitario de los individuos atacados y defoliados por la hormiga arriera, aplicando imidacloprid el cual actúa cuando el insecto tiene contacto con el producto aplicado en la base del tallo de los árboles.

A lo largo del crecimiento de los individuos arbóreos, son diferentes plagas invasoras y enfermedades que suelen atacar a plantas o árboles, por ello es imprescindible conocer con antelación cuales son las causas asociadas, así como las épocas del año donde se deben realizar tratamientos preventivos.

Por tal razón se realizarán monitores preventivos en la plantación con el fin de identificar los peligros potenciales. Por otra parte, será necesario identificar aquellos individuos que sufran descortezamiento parcial, pues dichas lesiones son el hábitat propicio para el ataque de microrganismos. De identificarse individuos lesionados se procederá inmediatamente a realizar un tratamiento de cicatrización mediante la aplicación de productos orgánicos adecuados cubriendo la superficie de la herida.

PODAS:

Se realizarán podas de mantenimiento, despunte de ramas laterales, podas sanitarias y podas de formación

- Podas de formación, se aplicará a individuos recién plantados que lo necesiten. Se realiza para dar orientación a la formación de follaje. Esta tarea será más intensiva en aquellas plantas que sean sembradas en las zonas verdes.

- Poda sanitaria, la cual consiste en el retiro de ramas muertas o en mal estado.

- Poda de mantenimiento: se aplicará a individuos ya adaptados al terreno y concrecimiento óptimo.

CAPACITACIONES AMBIENTALES

CCH	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	SST-F-04
		Fecha	12/11/2019
		Versión	1
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACION [X] CHARLA [ ]

OBRA: Mantenimiento de Areas de Importancia estrategica para Conservacion

TEMA DE CAPACITACIÓN: Manejo y Disposicion Residuos

LUGAR: CCH frente de obra Bucaca | FECHA 25/11/2024

CAPACITADOR: Natoly Castellanos | FIRMA: [signature] | DURACION 30 min.

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Giovanny Vera	1046064031		[signature]
2	Rona Lan sanchez	97784098	Ayudante	Rona Lan sanchez
3	NELSON Nieves	91133913	Ayudante	NELSON Nieves
4	Jesc A Cana	91560[illegible]	[signature]	[signature]
5	Richard José Abreu	13.260.227	Ayudante	[signature]
6	Marco Antonio bardales S.	1095808698	Aux	Marco bardales S.
7	D. Melissa Tarazona Mantilla	1.098.781.831.	Topógrafo	[signature]
8	JESSID PARRA PSMA	7702375757	TOPOGRAFO	JESSID PARRA
9	Andres Sandoval	1098715547	Residente de Obra	[signature]
10	Geraldine Guerrero Saavedra	1.101.200.012	auxiliar de ingenieria	Geraldine Guerrero
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

COORDINADOR DE LA CAPACITACION	CAPACITADOR
	[signature]
FIRMA	FIRMA

CCH	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	SST-F-04
		Fecha	12/11/2019
		Versión	1
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO ☐ CAPACITACION ☒ CHARLA ☐

OBRA Mantenimiento Areas de Importancia para Conservación Recurso

TEMA DE CAPACITACIÓN: manejo y Disposición de Residuos

LUGAR: CCH Frente de obra Molinos

FECHA 25/11/2024

CAPACITADOR Nataly Castellanos

FIRMA Nataly Castellanos.

DURACIÓN 30mn.

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Mauricio Suarez P	1100840118	OP	
2	Alejandra Rincon Burgos	1231338042	SST	Alejandra
3	Evelyn Dayana Barreto.c.	1064121767	Topografia	Evelyn Barreto
4	Brayan Stiven Gonzal A.	1003011400	M	BRAYAN GARCIA
5	FABIO MARIN RAMOS	7003097037	A	FABIO MARIN
6	Henri marin ramos	1.003091093	A	Henri marin
7	Luis Ruy	9129926	AY	Luis Ruy
8	Wilson Freddy Valencia	1003119383	Ay	
9	Edward Yesid Rojas	1047916397	Ay	
10	Ender Giovany Rincón	1095828352	maestro	Ender Rincon
11	JESSID PARRA OSMA	7702375757	TOPOGRAFO	JESSID PARRA
12	Andres Felipe Sandoval	1098715543	Residente de Obra	
13	Geraldine Guerrero Jaquez	1101200012	Auxiliar de Ingenieria	Geraldine Guerrero.
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

COORDINADOR DE LA CAPACITACION	CAPACITADOR
	Nataly Castellanos
FIRMA	FIRMA

CCH	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	SST-F-04
		Fecha	12/11/2019
		Versión	1
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACION [X] CHARLA [ ]

OBRA Mantenimiento Area de Importancia estrategica para conservacion

TEMA DE CAPACITACIÓN: manejo y gestion Riesgos Biologicos

LUGAR: CCH frente de obra Buccanca

FECHA 5/12/2024

FIRMA NATHALIA CASTELLANOS C

DURACION 25min

CAPACITADOR Nataly Castellanos

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	D. Melissa Jaramillo Mantilla	1098781831	Topografa	
2	Marco Antonio Cardenas	1095808698	BUX	
3	Richard Abreu	13.260.227	Ayudante	
4	Nelson Nieves	91183913	Ayudante Obra	
5	Ronal sanchez	97784098	Ayudantes	
6	Giovanni Vera	1064606031		
7	Jose A Luna	91156077		
8	JESSID PARRA OSMA	1102375757	TOPOGRAFO	JESSID PARRA
9	Geraldine Cuervo Jaimes	1101200012	Auxiliar de ingenieria	Geraldine Cuervo
10	Andres Felipe Sandoval	1093765543	Residente de Obra	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

COORDINADOR DE LA CAPACITACION	CAPACITADOR
	NATHALIA CASTELLANOS C
FIRMA	FIRMA

CCH	FORMATO ASISTENCIA DE ENTRENAMIENTO, CHARLAS Y CAPACITACIONES	Código	SST-F-04
		Fecha	12/11/2019
		Versión	1
		Página	1 de 1

ENTRENAMIENTO [ ] CAPACITACION [X] CHARLA [ ]

OBRA mantenimiento areas de importancia para conservación recurso

TEMA DE CAPACITACIÓN: manejo y gestión riesgos biologicos

LUGAR: CCH frente de obra Molinos | FECHA 5/12/2024

CAPACITADOR Natalia Castellanos | FIRMA [signature] | DURACION 15 min

No.	PARTICIPANTE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Mauricio Suarez P	1100890118	OP	[signature]
2	Brayan Steven Garcia	1003091700	A	BRYAN GARCIA
3	FABIO MARIN RAMOS	1003097037	A	FABIO MARIN
4	Henri Marin ramos	1.003091075	A	Henri marin
5	Evelyn Dayana Barreto.C	1064121767	Topografia	Evelyn Barreto
6	Alejandra Rincon Borgos	1234238042.	SST	Alejandra
7	Luis Rex	91290921	AY	Luis Rex
8	Jhon Freddy Valencia	1005749385	AY	[signature]
9	Edward Yesid Rojas	1097910347	AY	[signature]
10	Endy Giovany Rincon	1095828352	maestro	Giovany Rin
11	JESSID PARRA OSMA	7702375757	TOPOGRAFO	JESSID PARRA
12	Geraldine Guerrero Saavedra	1101200072	auxiliar de ingenieria	Geraldine Guerrero
13	Andrés Felipe Sandoval	1096715543	Residente de Obra	[signature]
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

OBSERVACIONES:

COORDINADOR DE LA CAPACITACION	CAPACITADOR
	[signature]
FIRMA	FIRMA

GESTIÓN SOCIAL

	CONTROL ASISTENCIA A REUNIONES F-115		
CDMB	Revisión: 00	Fecha de revisión: Julio de 2019	Página 1 de 1

CCH

CONSORCIO CONSERVACIÓN HÍDRICA
MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE IPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

ASISTENCIA A REUNIÓN INFORMATIVA DE INICIO DE OBRAS

OBJETIVO	FECHA – LUGAR – HORA - REUNIÓN
Informar a actores sociales, entes municipales, líderes y comunidad del área de influencia directa de la obra a desarrollar por el Consorcio Conservación Hídrica en el municipio de Floridablanca	Viernes 15 de noviembre de 2024, 2:00 p.m., Estación de Bomberos de Floridablanca

No.	NOMBRE	BARRIO / VEREDA / ENTIDAD	DOCUMENTO IDENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACIONES
1	ALBA Lucía Sandoval Rivera	Contratista	63302660	3115577718		
2	Angie Daniela Merchán	Interventoría	1098770897	3165753410		
3	Fabián Díaz de Velasquez	PTAJAC Lagos 2	22991659	3112625230		
4	Lady Johana Buitrago P.	Interventoría	37727127	3107542104		
5	Andrés Felipe Sandoval Montilla	Comercio Conservación Hídrica	1098715543	3166962391		
6	Luz Amparo Maldonado F.	Molinos Altos.	63.319208	3156728236		
7	Silva Cristina Pacheco M.	Tayrona II	1098716518	3178539504		
8						
9						
10						

Consorcio Conservación Hídrica
Dirección: Cl. 41 # 27-63 Edificio 041 Bucaramanga
Teléfono: - 3115557728 - 3166962391
Correo electrónico: consorcioconservacionhidrica@gmail.com

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO EL "MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEFINIDOS Y PRIORIZADOS POR LA CDMB"



ANEXO No. 6

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INTERVENTORÍA

LIQUIDACIÓN

CONTRATO INTERVENTORIA N° 210.15563.4 DE 2024

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO EL "MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA DEFINIDOS Y PRIORIZADOS POR LA CDMB"



PERIODO DE EJECUCION:
INFORME FINAL DE INTERVENTORIA

INTERVENTORIA: CONSORCIO CONSERVACIÓN IM
CONTRATO: 210.15563.4 DE 2024

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSERVACIÓN HÍDRICA
CONTRATO: 210.15562.5 DE 2024

REALIZADO POR LA PROFESIONAL SST	**Paula Emilia Fajardo Silgado**	Paula Fajardo S.

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO 2
1 INTRODUCCIÓN 1
2 OBJETIVOS 3
2.1 General 3
2.2 Específicos 3
3 INFORMACIÓN DEL PROYECTO 4
3.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 4
3.2 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 5
4 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 6
5 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 11
5.1 Staff del Personal 11
5.1.2 Gestión de Ingreso 13
5.1.3 Novedades de Retiro 16
5.1.4 Novedades de Traslado: 18
5.1.5 Novedades Rotativas 19
5.2 Control de Seguridad Social 21
6 PARTICIPACION Y CONSULTA 25
7.1 Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 25
7.2 Comité de Convivencia Laboral 26
7.3 Reporte de Actos y Condiciones Inseguras. (Raci) 27
7.4 Charlas y capacitaciones 27
7 PROGRAMA SEGURIDAD INDUSTRIAL 29
8.1 Gestión de los Peligros y Riesgos. 29
8.2 Entrega y reposición de elementos de protección individual 30
8.3 Inspecciones y señalización 30
8.4 Reporte de Incidentes y Accidentes de Trabajo 33
8 CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA INTERVENTORIA 35
8.1 Personal de la Interventoría 35
9.1 Novedades de Ingreso 36
9.2 Novedades de Retiro 36
9.3 Inducciones de Seguridad y Salud en el Trabajo 37
9.4 Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 37
9.5 Comité de Convivencia Laboral 38
9.6 Dotación y Entrega de los Elementos de Protección Personal 38
9.7 Capacitaciones y Charlas de Seguridad y Salud en el Trabajo 39
9.8 Inspecciones de seguridad 40
9.9 Estadísticas de salud 41
9 CONCLUSIONES 42
10 ANEXOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA INTERVENTORIA 42

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 4
Tabla 2 5
Tabla 3 12
Tabla 4 14
Tabla 5 16
Tabla 6 17
Tabla 7 18
Tabla 8 20
Tabla 9 21
Tabla 10 22
Tabla 11 23
Tabla 12 24
Tabla 13 27
Tabla 14 29
Tabla 15 31
Tabla 16 33
Tabla 17 35
Tabla 18 36
Tabla 19 37
Tabla 20 39
Tabla 21 41
Tabla 22 42

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 6
Ilustración 2 7
Ilustración 3 8
Ilustración 4 9
Ilustración 5 10
Ilustración 6 28
Ilustración 7 31
Ilustración 10 39
Ilustración 11 40

1 INTRODUCCIÓN

Mediante el contrato de la Interventoría No. 210.15563.4 de 2024 celebrado entre la corporación autónoma regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga y el consorcio conservación hídrica con NIT 901.881.356-4 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO EL "MANTENIMIENTO DE AREAS DE IMPORTANCIA ESTRATEGICA PARA LA CONSERVACION DEL RECURSO HIDRICO EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEFINIDOS Y PRIORIZADOS POR LA CDMB; quién en cumplimiento y como firma interventora en funciones de supervisar y verificar la ejecución del contrato de obra No. 210.15562.5 cuyo objetivo es "EL MANTENIMIENTO DE AREAS DE IMPORTANCIA ESTRATEGIGA PARA LA CONSERVACION DEL RECURSO HIDRICO EN LA JURIDISCCION DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEFINIDOS Y PRIORIZADOS POR LA CDMB".

Mediante el contratista CONSORCIO CONSERVACION HIDRICA se realizó el mantenimiento de áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico en la jurisdicción del municipio de Floridablanca"; este proyecto de mantenimiento enfocado en el área estratégica de la microcuenca Rio Frío, se formuló con enfoque en adaptación al cambio climático así como de restauración, rehabilitación y recuperación ecológica, a partir de la ejecución de obras de intervención de zonas consideradas críticas dentro de la microcuenca o unidad hidrográfica identificada como estratégica, con el fin de mantener su integridad y con ello la regulación del ciclo del agua, manteniendo una estructura ecológica que lograra cumplir su función ecosistémica.

En el presente **informe de interventoría** se especifican las actividades del componente de seguridad y salud en el trabajo el seguimiento de la ejecución del proyecto evidenciando las acciones implementadas en pro de reducir y eliminar las consecuencias desfavorables para la ejecución de todas las actividades de obra sobre las condiciones de seguridad y potencializando los aspectos favorables así mismo las recomendaciones a tomar como medidas preventivas y correctivas a su vez plasmar el seguimiento a las actividades de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo fundamentado en el cumplimiento de la normativa nacional vigente entendiendo que este promueve la calidad de vida, salud física y mental, el desarrollo de sus capacidades, desarrollo personal y social de todos los grupos de interés

mediante las diferentes estrategias para divulgar la información, establecer medidas de seguridad, sistemas de trabajo seguros para las operaciones riesgos y demás actividades preventivas, correctivas y de seguimiento tanto administrativas y operativas.

2 OBJETIVOS

2.1 General

- Supervisar las acciones del componente de seguridad y salud en el trabajo para la ejecución del contrato de obra con objeto "MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEFINIDOS Y PRIORIZADOS POR LA CDMB."

2.2 Específicos

- Verificar el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad de seguridad y salud en trabajo y demás especificaciones establecidas en el contrato.
- Supervisar la ejecución de las condiciones de seguridad mínimas requeridas encaminadas en la prevención de los accidentes y enfermedades laborales del personal mediante la identificación de peligros, y riesgos.
- Promover el control de los riesgos locativos, así como los elementos de emergencia aplicando controles operacionales para reducir la probabilidad de incidentes, accidentes laborales y estar preparados ante una emergencia.
- Fomentar una cultura encaminada al autocuidado mediante la adopción de hábitos de vida saludable, promoviendo la salud y previniendo la enfermedad y conductas de riesgo en el personal.
- Asegurar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo a través de la gestión efectiva de planes de mejoramiento.

3 INFORMACIÓN DEL PROYECTO

3.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 1

Información del contrato de obra

CONTRATO No.:	210.15562.5 DEL 23 OCTUBRE
OBJETO:	"MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEFINIDOS Y PRIORIZADOS POR LA CDMB.
ENTIDAD CONTRATANTE:	CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA. CDMB
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO CONSERVACIÓN HÍDRICA R.L. EDGAR LEONARDO GÓMEZ RONCANCIO NIT. 901.881.924-8
VALOR DEL CONTRATO:	CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($4.521.575.179,94)
ANTICIPO:	NO APLICA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	CARLOS ALBERTO DÍAZ BARRERA
PLAZO DE EJECUCION:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Plazo ADICIONAL:	TRES (3) MESES- 30 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	31 DE MARZO 2025
% EJECUCIÓN A LA FECHA:	100.00%

Nota. Información del contrato de obra

3.2 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Tabla 2

Información del contrato de interventoría

CONTRATO No.:	210.15563.4 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2024
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO EL "MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE IMPORTNCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEFINIDOS Y PRIORIZADOS POR LA CDMB
ENTIDAD CONTRATANTE:	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA -CDMB
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	CONSORCIO CONSERVACIÓN IM R.L. MIGUEL FERNANDO QUIRÓS GÓMEZ NIT. 901.881.356-4
VALOR DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($254.886.576,00).
DIRECCIÓN:	CARRERA 15 # 22-02 TORRE 6 OFICINA 422 – GIRÓN SANTANDER
TELÉFONO:	6960467
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	CARLOS ALBERTO DÍAZ BARRERA
PLAZO DE EJECUCION:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO ADICIONAL:	TRES (3) MESES – 27 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:	31 DE MARZO DEL 2025
% EJECUCION A LA FECHA:	100.00%

Nota. Información general del contrato de interventoría


4 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Floridablanca es un municipio del departamento de Santander, Colombia. Su extensión territorial es de 97 kilómetros cuadrados, este municipio se encuentra conurbado con la ciudad de Bucaramanga y pertenece a su área metropolitana; es conocida por sus obleas, su turismo, sus parques, sus centros comerciales, sus clínicas, su educación de calidad y ha sido polo del progreso de la región durante los últimos años.

El frente de obra se encuentra ubicado en diferentes sectores de las fuentes hídricas de la microcuenca del río Frío es una reserva hídrica del municipio de Floridablanca, Colombia, con una superficie de 74,3 km2. Nace en el cerro de la Judía, a una altura de 2032 msnm, y tiene una longitud aproximada de 30,5 km.

A continuación, se relaciona gráficamente los tramos objeto de limpieza:

Ilustración 1
Área indirecta del proyecto

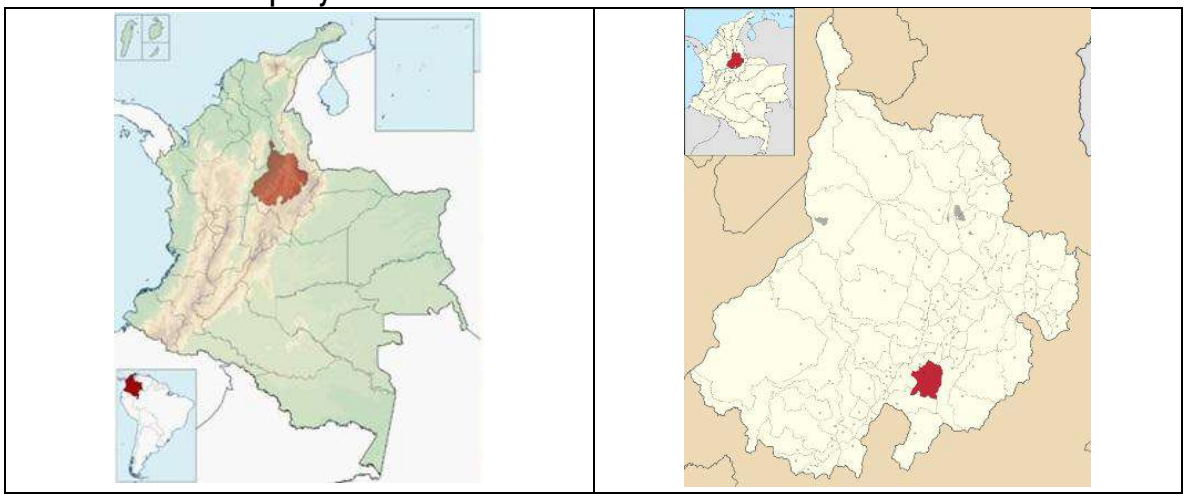

Nota. Colombia – Santander

Ilustración 2

QUEBRADA SURATOQUE – SECTOR BUCARICA

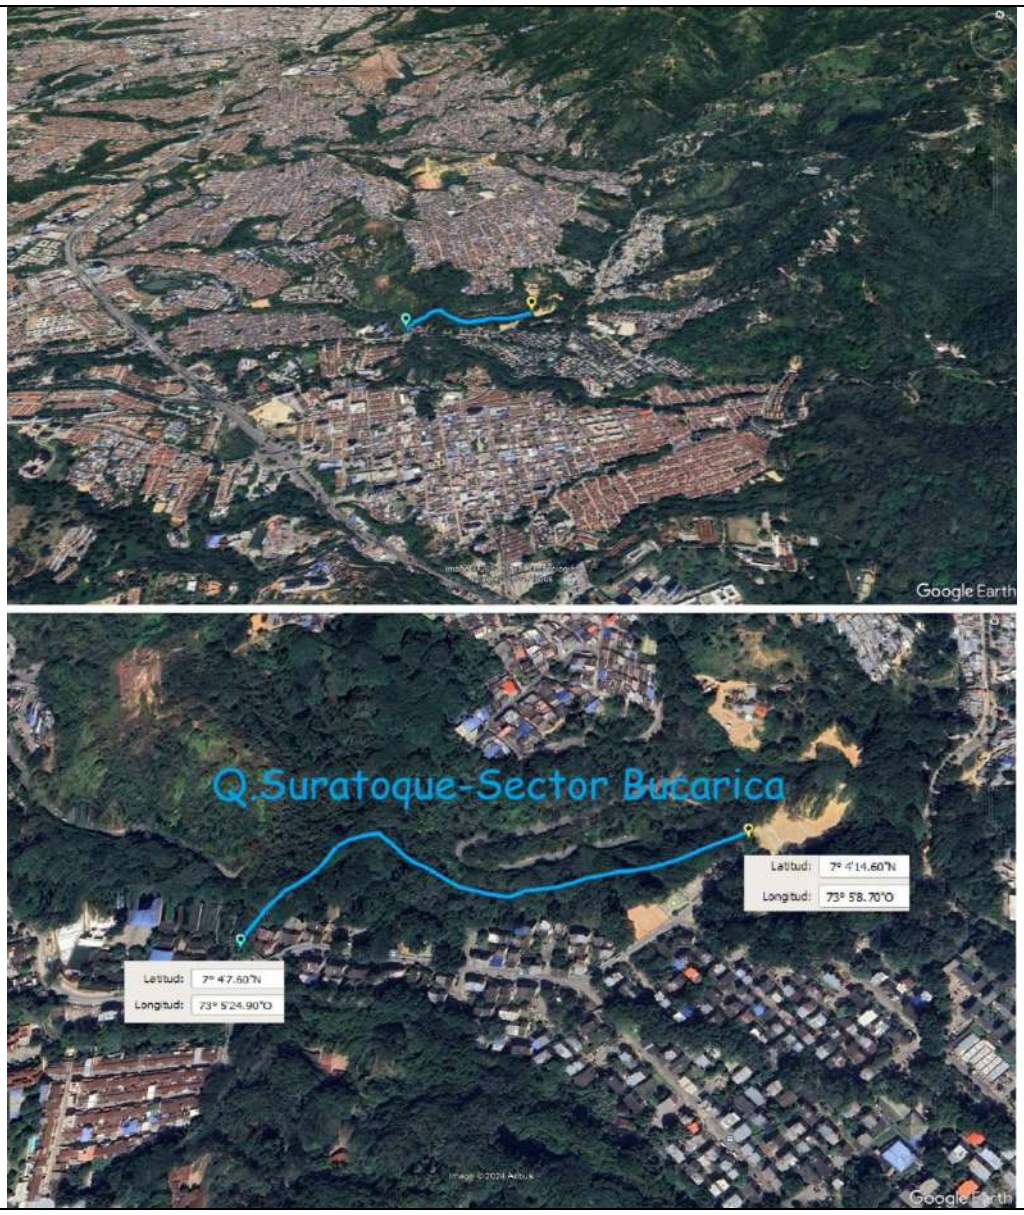


Ilustración 3

QUEBRADA SURATOQUE - SECTOR LAGOS



Ilustración 4

QUEBRADA LA CALAVERA – SECTOR MOLINOS



Ilustración 5

QUEBRADA LA CALAVERA – SECTOR CAÑAVERAL



5 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG – SST es el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. Dando cumplimiento a la legislación colombiana en Seguridad y Salud en el Trabajo, caso particular al Decreto único del sector Trabajo 1072 de 2015 y sus actualizaciones a partir de la fecha hasta hoy. El SG – SST se fundamenta en la organización, la ejecución y evaluación de actividades de medicina preventiva y del trabajo, higiene industrial y seguridad industrial tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones de construcción.

Para el desarrollo de estas actividades el contratista se basa en la resolución 0312 de 2019 por la cual se definen los estándares mínimos del sistema que en apoyo de la ARL determinó el plan de trabajo anual a implementar para el consorcio; sin embargo, se tomaron todos los controles necesarios en campo con el fin de mitigar o disminuir el riesgo.

Para la implementación del SG-SST, se realizó una descripción de las actividades de SST adelantadas por el Contratista y la Interventoría le superviso durante la ejecución del proyecto.

5.1 Staff del Personal

Para la ejecución del proyecto cuya articulación permitió el avance físico de la obra y la realización de las acciones encaminadas a ejecutar en el sistema de seguridad y salud en el trabajo, se contó con un staff de personal de mano de obra calificado y no calificado; conformado por las empresas CONSORCIO CONSERVACION HIDRICA, CONAINCO S.A.S, INFRACORP S.A.S, LERMA CONSTRUCCIONES S.A.S y CONSTRUCCIONES SANGUINO, quienes en mutua colaboración realizaron actividades técnicas, ambientales, sociales y en seguridad y salud en el trabajo para dar cumplimiento al contrato 210.15563.4 el cual finalizo el 31 de Marzo con el siguiente personal relacionado.

Tabla 3

Control del personal

PERSONAL VINCULADO								
CONTRATISTA: CONSORCIO CONSERVACION HIDRICA								
N.	**NOMBRE**	**IDENTIDAD**	**CARGO**	**FECHA INGRESO**	**ARL**	**EPS**	**AFP**	**CCF**
1	Juan Carlos Rincón Lozano	80.089.079	Gerente de proyectos	20/11/2024	Axa Colpatria	Sanitas	Colfondos	N/A
2	Oscar Fabricio Medina Reatiga	1.101.597.782	Asesor Forestal	20/11/2024	Axa Colpatria	Nueva Eps	Colfondos	N/A
3	Luisa Fernanda Sánchez Castro	1.00.958.383	Asesor Ambiental	20/11/2024	Axa Colpatria	Sura	Porvenir	N/A
4	Jessid Ramon Parra Osma	1.102.375.757	Topógrafo	25/11/2024	Axa Colpatria	Nueva Eps	Porvenir	Comfenalco
5	Andrés Felipe Saldoval Mantilla	1.098.715.543	Residente de obra	03/11/2024	Axa Colpatria	Sanitas	Porvenir	Comfenalco
6	Evelyn Dayan Barreto Castillo	1.064.121.767	Cadenera	02/12/2024	Axa Colpatria	Salud Total	Protección	Comfenalco
TOTAL PERSONAL CONTRATISTA								6
SUBCONTRATISTA: CONAINCO								
N.	**NOMBRE**	**IDENTIDAD**	**CARGO**	**FECHA INGRESO**	**ARL**	**EPS**	**AFP**	**CCF**
7	Edgar Leonardo Gómez Roncancio	72.254.372	Director de Obra	20/11/2024	Seguros Bolívar	Sura	Colfondos	N/A
8	Clara Melissa Donado Arias	1.098.704.436	Profesional SST	20/11/2024	Axa Colpatria	Sura	Protección	Comfenalco
9	Dennis Melissa Donado Arias	1.098.781.831	Topografa	2011/2024	Axa Colpatria	Salud Mia	Porvenir	Comfenalco
TOTAL PERSONAL CONTRATISTA								3
SUBCONTRATISTA: INFRACORP								
N.	**NOMBRE**	**IDENTIDAD**	**CARGO**	**FECHA INGRESO**	**ARL**	**EPS**	**AFP**	**CCF**
10	Johana Marcela Padierna Castiblanco	1.098.756.647	Residente de Obra	20/11/2024	Axa Colpatria	Sanitas	Colpensiones	Comfenalco
TOTAL PERSONAL CONTRATISTA								**1**
CONTRATISTA: LERMA CONSTRUCCIONES								
N.	**NOMBRE**	**IDENTIDAD**	**CARGO**	**FECHA INGRESO**	**ARL**	**EPS**	**AFP**	**CCF**
11	Ender Giovanny Rincón	1.095828.352	Oficial	07/01/2025	Axa Colpatria	Sura	Porvenir	Comfenalco
12	Brayan Stiven García Amariz	100.091.700	Ayudante	07/01/2025	Axa Colpatria	Nueva Eps	Porvenir	Comfenalco
13	Edward Yesid Rojas	1.097.910.397	Ayudante	07/01/2025	Axa Colpatria	Coosalud	Protección	Comfenalco
14	Fabio Marín Ramos	1003.091.307	Ayudante	07/01/2025	Axa Colpatria	Nueva Eps	Colpensiones	Comfenalco
15	Henry Marín Ramos	100.091.035	Ayudante	07/01/2025	Axa Colpatria	Salud Total	Colfondos	Comfenalco
16	Raul Dionicio Garcia Amariz	1.007.514.004	Oficial	07/01/2025	Axa Colpatria	Sura	Porvenir	Cajasan
TOTAL PERSONAL CONTRATISTA								**6**

SUBCONTRATISTA: CONSTRUCCIONES SANGUINO								
N.	NOMBRE	IDENTIDAD	CARGO	FECHA INGRESO	EPS	ARL	AFP	CCF
17	José Antonio Luna Acosta	91.156.019	Oficial	08/01/2025	Axa Colpatria	Sura	Porvenir	Comfenalco
18	Jorge Giovanny Vera	1096.064.931	Ayudante	20/11/2024	Axa Colpatria	Salud Mia	Colpensiones	Comfenalco
19	Richard José Abremate	901.768.348	Ayudante	20/11/2024	Axa Colpatria	Salud Total	Colfondos	Comfenalco
20	Marcos Guadrón	1095.808.698	Ayudante	20/11/2024	Axa Colpatria	Coosalud	Protección	Comfenalco
21	Nelson Nieves	91133.913	Ayudante	20/112024	Axa Colpatria	Nueva Eps	Colpensiones	Comfenalco
22	Luis Alberto Prada Rincon	5691822	Ayudante	20/11/2024	Axa Colpatria	Nueva Eps	Porvenir	Comfenalco
24	Ronal Sanchez Rey	91184098	Ayudante	08/01/2025	Axa Colpatria	Nueva Eps	Proteccion	Comfenalco
25	Baudilio Rivera Gómez	1093738325	Ayudante	13/01/2025	Axa Colpatria	Salud Total	Colpensiones	Comfenalco
26	Daniel Martin Duarte Ordoñez	1005234391	Ayudante	20/01/2025	Axa Colpatria	Sanitas	Proteccion	Comfenalco
27	Johan Sebastián Grajales	1000122562	Ayudante	05/03/2025	Axa Colpatria	Sanitas	Colfondos	Comfenalco
28	Esteban Vargas Romano	1099737734	Ayudante	05/03/2025	Axa Colpatria	Sanitas	Colfondos	Comfenalco
TOTAL PERSONAL SUBCONTRATISTA								11
TOTAL, PERSONAL EN OBRA								28

Nota. Control del personal vigente en el periodo

Todo el personal vinculado se encontraba afiliado a las entidades exigidas por la ley de acuerdo con el Articulo 50 de la Ley 79 de 2002, Art 1º de la Ley 828 de 2003 y del Art 23 de la Ley 1150 de 2007.

5.1.2 Gestión de Ingreso

El contratista de obra del Consorcio CONSERVACION HIDRICA garantizó que previo al ingreso de personal a obra, se llevara a cabo las afiliaciones necesarias al sistema general de seguridad social, actividades de inducción y/o reinducción; la notificación de los riesgos teniendo en cuenta la norma GTC 45, la actividad económica de la empresa y cargo del trabajador; de los cuales el contratista mantuvo los controles, recomendaciones y observaciones dadas para el manejo y mitigación de los riesgos existentes.

El contratista de obra ordenó la práctica de exámenes médicos ocupacionales del personal de ingreso, teniendo en cuenta lo establecido en la resolución 2346 de 2007, siendo una de las principales actividades de Medicina Preventiva y del Trabajo que

constituye un instrumento importante en la elaboración del diagnóstico de las condiciones de salud de la población trabajadora, y por ende, es información vital para el desarrollo de los diferentes programas de gestión para la prevención y control de la enfermedad relacionada con el trabajo.
El profesional SST realizó inducciones y/o reinducciones para dar a conocer información general del contratante, definición de seguridad, salud en el trabajo, políticas internas, reglamento de higiene y seguridad industrial, políticas de prevención de alcohol, tabaquismo y sustancias psicoactivas, conceptos de accidente y enfermedad laboral, COPASST, factores de riesgo como químicos, biológicos, físicos, biomecánicos, psicológicos, mecánicos; planes de emergencia, lineamientos en caso de presentarse accidentes laborales, procedimiento de entrega y reposición de EPPS, información de seguridad social y demás información de interés general.

Como evidencia de lo anterior se dejó constancia mediante soporte presentado por contratista mediante el diligenciamiento de los formatos titulados:

"Concepto médicos de preingreso ocupacional"
"Formato de inducción y reinducción"–SST-F-02
"Formato de evaluación de inducción y reinducción"–SST-F-03
"Formato de Notificación de riesgos en seguridad y en salud en el trabajo"–SST-F-06

Los cuales fueron soportados en los informes mensuales entregados por el contratista de obra a la interventoría.

A continuación, se relaciona el personal que tuvo ingreso durante la ejecución del contrato.

Periodo 1: Noviembre 20 a Diciembre 13 del 2024: para esta fecha se presentaron 20 ingresos de personal teniendo en cuenta que era el inicio del proyecto

Tabla 4
Personal de ingreso periodo 1

PERSONAL DE INGRESO								
CONTRATISTA: CONSORCIO CONSERVACION HIDRICA								
N.	**NOMBRE**	**IDENTIDAD**	**CARGO**	**FECHA INGRESO**	**ARL**	**EPS**	**AFP**	**CCF**
1	Juan Carlos Rincón Lozano	80.089.079	Gerente de proyectos	20/11/2024	Axa Colpatria	Sanitas	Colfondos	N/A

2	Oscar Fabricio Medina Reatiga	1.101.597.782	Asesor Forestal	20/11/2024	Axa Colpatria	Nueva Eps	Colfondos	N/A
3	Luisa Fernanda Sánchez Castro	1.00.958.383	Asesor Ambiental	20/11/2024	Axa Colpatria	Sura	Porvenir	N/A
4	Jessid Ramon Parra Osma	1.102.375.757	Topógrafo	25/11/2024	Axa Colpatria	Nueva Eps	Porvenir	Comfenalco
5	Andrés Felipe Saldoval Mantilla	1.098.715.543	Residente de obra	03/11/2024	Axa Colpatria	Sanitas	Porvenir	Comfenalco
6	Evelyn Dayan Barreto Castillo	1.064.121.767	Cadenera	02/12/2024	Axa Colpatria	Salud Total	Protección	Comfenalco
TOTAL PERSONAL CONTRATISTA								3

SUBCONTRATISTA: CONAINCO								
N.	**NOMBRE**	**IDENTIDAD**	**CARGO**	**FECHA INGRESO**	**ARL**	**EPS**	**AFP**	**CCF**
7	Edgar Leonardo Gómez Roncancio	72.254.372	Director de Obra	20/11/2024	Seguros Bolívar	Sura	Colfondos	N/A
8	Clara Melissa Donado Arias	1.098.704.436	Profesional SST	20/11/2024	Axa Colpatria	Sura	Protección	Comfenalco
9	Dennis Melissa Tarazona Mantilla	1.098.781.831	Topógrafa	20/11/2024	Axa Colpatria	Salud Mia	Porvenir	Comfenalco
TOTAL PERSONAL CONTRATISTA								2

SUBCONTRATISTA: INFRACORP								
N.	**NOMBRE**	**IDENTIDAD**	**CARGO**	**FECHA INGRESO**	**ARL**	**EPS**	**AFP**	**CCF**
9	Johana Marcela Padierna Castiblanco	1.098.756.647	Residente de Obra	20/11/2024	Axa Colpatria	Sanitas	Colpensiones	Comfenalco
TOTAL PERSONAL CONTRATISTA								1

CONTRATISTA: LERMA CONSTRUCCIONES								
N.	**NOMBRE**	**IDENTIDAD**	**CARGO**	**FECHA INGRESO**	**ARL**	**EPS**	**AFP**	**CCF**
10	Giovanny Rincón	1.095828.352	Oficial	20/11/2024	Axa Colpatria	Sura	Porvenir	Comfenalco
11	Brayan García	100.091.700	Ayudante	20/11/2024	Axa Colpatria	Nueva Eps	Porvenir	Comfenalco
12	Edward Rojas	1.097.910.397	Ayudante	20/11/2024	Axa Colpatria	Coosalud	Protección	Comfenalco
13	Fabio Marín	1003.091.307	Ayudante	20/11/2024	Axa Colpatria	Nueva Eps	Colpensiones	Comfenalco
14	Henry Marín	100.091.035	Ayudante	20/11/2024	Axa Colpatria	Salud Total	Colfondos	Comfenalco
TOTAL PERSONAL CONTRATISTA								**5**

SUBCONTRATISTA: CONSTRUCCIONES SANGUINO								
N.	**NOMBRE**	**IDENTIDAD**	**CARGO**	**FECHA INGRESO**	**EPS**	**ARL**	**AFP**	**CCF**
15	José Antonio Luna Acosta	91.156.019	Oficial	20/11/2024	Axa Colpatria	Sura	Porvenir	Comfenalco
16	Jorge Giovanny Vera	1096.064.931	Ayudante	20/11/2024	Axa Colpatria	Salud Mia	Colpensiones	Comfenalco
17	Marcos Guadrón	1095.808.698	Ayudante	20/11/2024	Axa Colpatria	Coosalud	Protección	Comfenalco
18	Nelson Nieves	91133.913	Ayudante	20/112024	Axa Colpatria	Nueva Eps	Colpensiones	Comfenalco

19	Richard José Abremate	901.768.348	Ayudante	20/11/2024	Axa Colpatria	Salud Total	Colfondos	Comfenalco
TOTAL PERSONAL SUBCONTRATISTA								5
TOTAL, PERSONAL EN OBRA								19

Nota. Novedades de ingreso de personal del contratista y subcontratista

Periodo 2: Diciembre 14 a 31 de Marzo 2025: durante este periodo se presentaron 12 novedades de ingreso de personal el cual fue vinculado a la empresa Lerma construcciones y construcciones sanguino.

Tabla 5

Personal de ingreso periodo 2

PERSONAL DE INGRESO								
CONTRATISTA: LERMA CONSTRUCCIONES								
N.	NOMBRE	IDENTIDAD	CARGO	FECHA INGRESO	ARL	EPS	AFP	CCF
1	Raúl Dionicio García Amariz	1.007.514.004	Oficial	07/01/2025	Axa Colpatria	Sura	Porvenir	Cajasan
2	Ender Giovanny Rincón	1.095828.352	Oficial	07/01/2025	Axa Colpatria	Sura	Porvenir	Comfenalco
3	Brayan Stiven García Amariz	100.091.700	Ayudante	07/01/2025	Axa Colpatria	Nueva Eps	Porvenir	Comfenalco
4	Edward Yesid Rojas	1.097.910.397	Ayudante	07/01/2025	Axa Colpatria	Coosalud	Protección	Comfenalco
5	Fabio Marín Ramos	1003.091.307	Ayudante	07/01/2025	Axa Colpatria	Nueva Eps	Colpensiones	Comfenalco
6	Henry Marín Ramos	100.091.035	Ayudante	07/01/2025	Axa Colpatria	Salud Total	Colfondos	Comfenalco
TOTAL PERSONAL CONTRATISTA								6
SUBCONTRATISTA: CONSTRUCCIONES VERA SANGUINO								
N.	NOMBRE	IDENTIDAD	CARGO	FECHA INGRESO	EPS	ARL	AFP	CCF
7	José Antonio Luna Acosta	91.156.019	Oficial	08/01/2025	Axa Colpatria	Sura	Porvenir	Comfenalco
8	Ronal Sánchez Rey	91184098	Ayudante	08/01/2025	Axa Colpatria	Nueva Eps	Proteccion	Comfenalco
9	Baudilio Rivera Gómez	1093738325	Ayudante	13/01/2025	Axa Colpatria	Salud Total	Colpensiones	Comfenalco
10	Daniel Martin Duarte Ordoñez	1005234391	Ayudante	20/01/2025	Axa Colpatria	Sanitas	Proteccion	Comfenalco
11	Johan Sebastián Grajales	1000122562	Ayudante	05/03/2025	Axa Colpatria	Sanitas	Colfondos	Comfenalco
12	Esteban Vargas Romano	1099737734	Ayudante	05/03/2025	Axa Colpatria	Sanitas	Colfondos	Comfenalco
TOTAL PERSONAL SUBCONTRATISTA								6
TOTAL, PERSONAL EN OBRA								12

Nota. Novedades de ingreso de personal del contratista y subcontratista

5.1.3 Novedades de Retiro

Durante la ejecución del proyecto el contratista de obra notifico todos los retiros de personal presentados durante los diferentes periodos de ejecución los cuales fueron

relacionados en los informes enviados a la interventoría con sus respectivos soportes de carta de notificación de terminación de contrato, notificación de examen de egreso ocupacional y liquidación de contrato trabajo

A continuación, se relaciona los retiros presentados durante la ejecución del proyecto:

Periodo 1: Noviembre 20 a Diciembre 13 del 2024: durante la ejecución del periodo 1 no se presentaron novedades de retiro

Periodo 2: Diciembre 14 a 31 de Marzo 2025: durante el periodo reportado el contratista de obra notifico 13 retiros de personal de obra (02) desvinculados del consorcio conservación hídrica, (05) de la empresa Lerma Construcciones S.AS y (06) del contratista Vera Sanguino

Tabla 6

Personal de retiro periodo 2

PERSONAL DE RETIRO					
PERIODO: 14 de Diciembre al 31 de Marzo del 2025					
CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVACION HIDRICA					
N.	NOMBRE	IDENTIDAD	CARGO	FECHA INGRESO	FECHA DE RETIRO
1	Jessid Ramon Parra Osma	1.102.375.757	Topógrafo	25/11/2024	30/12/2024
2	Andrés Felipe Saldoval Mantilla	1.098.715.543	Residente de obra	03/11/2024	30/12/2024
TOTAL CONTRATISTA					2
LERMA CONSTRUCCIONES S.A.S					
N.	NOMBRE	IDENTIDAD	CARGO	FECHA INGRESO	FECHA DE RETIRO
3	Ender Giovanny Rincón	1.095828.352	Oficial	20/11/2024	24/12/2024
4	Brayan Stiven García Amariz	100.091.700	Ayudante	20/11/2024	24/12/2024
5	Edward Yesid Rojas	1.097.910.397	Ayudante	20/11/2024	24/12/2024
6	Fabio Marín Ramos	1003.091.307	Ayudante	20/11/2024	24/12/2024
7	Henry Marín Ramos	100.091.035	Ayudante	20/11/2024	24/12/2024
TOTAL CONTRATISTA					5
CONTRATISTA VERA SANGUINO					
N.	NOMBRE	IDENTIDAD	CARGO	FECHA INGRESO	FECHA DE RETIRO
8	José Antonio Luna Acosta	91.156.019	Oficial	08/01/2025	29/12/2024
9	Marcos Gualdron	1.095.808.698	Ayudante	20/11/2024	29/12/2024
10	Nelson Nieves	91.133.913	Ayudante	20/112024	29/12/2024
11	Ronal Sánchez Rey	91184098	Ayudante	08/01/2025	29/12/2024
12	Baudilio Rivera Gómez	1093738325	Ayudante	13/01/2025	29/12/2024
13	Richard José Abremate	901.768.348	Ayudante	20/11/2024	29/12/2024
TOTAL CONTRATISTA					6
TOTAL PERSONAL DE INGRESO					13

Nota. Novedades de retiro del contratista y subcontratista

Periodo Final: teniendo en cuenta que era la finalización del proyecto el contratista realizo retiro de una trabajadora afiliada por el consorcio conservación Hídrica y los demás fueron trasladados a otros frentes de obra.

Tabla 7

Personal de retiro periodo final

PERSONAL DE RETIRO					
PERIODO FINAL					
CONTRATISTA CONSORCIO CONSERVACION HIDRICA					
N.	**NOMBRE**	**IDENTIDAD**	**CARGO**	**FECHA INGRESO**	**FECHA DE RETIRO**
1	Evelyn Dayan Barreto Castillo	1.064.121.767	Cadenera	02/12/2024	09/05/2025
TOTAL CONTRATISTA					**1**

Nota. Novedades de retiro del contratista y subcontratista

5.1.4 Novedades de Traslado:

Periodo 1: Noviembre 20 a Diciembre 13 del 2024: Durante este periodo no se presentaron novedades de traslado

Periodo 2: Diciembre 14 a 31 de Marzo 2025: Durante el periodo 2 no se presentaron novedades de retiro

Periodo Final: teniendo en cuenta que era la finalización del proyecto se presentaron los siguientes traslados de personal los cuales son relacionados a continuación.

PERSONAL DE TRASLADO				
CONTRATISTA: LERMA CONSTRUCCIONES				
NOMBRE	**IDENTIDAD**	**CARGO**	**FECHA INGRESO**	**FECHA DE TRASLADO**
Ender Giovany Rincón	1095828352	Oficial	01/04/2025	31/03/2025
Brayan Stiven García Amariz	1003091700	Ayudante	01/04/2025	31/03/2025
Edward Yesid Rojas	1097910397	Ayudante	01/04/2025	31/03/2025
Fabio Marín Ramos	1003091307	Ayudante	01/04/2025	31/03/2025
Henry Marín Ramos	1003091035	Ayudante	01/04/2025	31/03/2025
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES SANGUINO				
NOMBRE	**IDENTIDAD**	**CARGO**	**FECHA INGRESO**	**FECHA DE TRASLADO**
José Antonio Luna Acosta	91156019	Oficial	01/04/2025	31/03/2025
Jorge Giovanny Vera	1096064931	Ayudante	01/04/2025	31/03/2025
Marcos Guadrón	1095808698	Ayudante	01/04/2025	31/03/2025
Nelson Nieves	91133913	Ayudante	01/04/2025	31/03/2025

5.1.5 Novedades Rotativas

Durante la ejecución del proyecto la interventoría evidenció el uso de vehículos y maquinaria en el frente de obra.

Dando cumplimiento al compromiso ambiental y para garantizar la calidad del servicio de cargue, transporte, excavaciones y actividades afines, fue necesario el uso de maquinaria pesada, equipos menores y vehículos tipo volquetas, de los cuales se realizaron las inspecciones y verificación de su operatividad de los mismos evidenciando condiciones óptimas para el desarrollo de actividades; evidenciando las emisiones de gases, partículas y ruido de forma moderada.

La Interventoría verificó la gestión del área de seguridad y salud en el trabajo validando los documentos vigentes de seguridad social, preoperacionales de maquinaria y vigencia del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, Certificado de Revisión Técnico Mecánico de Gases, uso obligatorio de elementos de protección personal y dotación; entre otros.
La presente interventoría verificó la idoneidad del personal, vehículos y maquinaria mediante verificación en obra de:

-Licencia de transito
-SOAT
-Certificado de revisión técnico mecánica
-Seguridad social del operador
-Ficha técnica de la maquinaria
-Tarjeta de registro de la maquinaria
-Certificado de declaración de importación
-Preoperacionales diarios de la maquinaria

A continuación, se relaciona las actividades de manejo realizado al momento de utilizar maquinaria y vehículos durante el adelanto de ejecución del proyecto:

Los mantenimientos preventivos, correctivos o rutinarios fueron realizados en sitios autorizados. Las inspecciones preoperacionales fueron realizadas previamente al inicio

de las actividades diarias, de tal forma que se realizaran las notificaciones necesarias para sus correspondientes mantenimientos.

Se verificó que cada vehículo usado y maquinaria contara con extintor multipropósito de 10 lb como mínimo. Se daban recomendaciones sobre su estado, ubicación y accesibilidad.

Los vehículos y maquinaria utilizada contaban con pito de reversa e iluminación adecuada.

Se realizó inspecciones de la zona de trabajo previas al inicio de actividades, se realizaban actividades correctivas.

Fueron suspendidas las actividades antes o durante la jornada laboral en caso de presentar fallas mecánicas.

Se prohibió fumar dentro y fuera de la cabina, estando o no en actividades de conducción. De lo cual la interventoría no evidenció actividades contrarias a esto.

Se modero la velocidad de los vehículos mientras transitaban en la zona de trabajo.

A continuación, se relaciona el listado de los vehículos y maquinaria que durante el proyecto se utilizaron y fueron objeto de inspección de las áreas de seguridad y salud en el trabajo por parte del contratista e interventoría.

Periodo 1: 20 Noviembre a diciembre 13 del 2024: durante la ejecución del periodo 1 el contratista reporto a la interventoría el uso de 02 vehículos volquetas y dos máquinas una miniexcavadora y una retroexcavadora las cuales son relacionadas a continuación junto con el pago de planilla de seguridad social de los operadores.

Tabla 8
Información documental de vehículos

VEHICULOS						
PLACA	**MODELO**	**No SOAT**	**FECHA SOAT**	**RTM**	**FECHA RTM**	**CONDUCTOR**
PBA 173	1979	3225659800	19/03/2025	172489664	18/03/2025	Jairo Enrique Cornejo
XKC 284	2018	1508005686 212000	05/09/2025	177364697	22/11/2025	Oscar Mauricio Rojas

SEGURIDAD SOCIAL CONDUCTORES					
INSEGO S.A.S					
NOMBRE		ID	PERIODO COTIZACIÓN	N. DE PLANILLA	FECHA DE PAGO
Jairo Enrique Cornejo		13742035	Noviembre 2024	E:1068413753	04/12/2024
Oscar Mauricio Rojas		91511241	Diciembre 2024	E:9475422209	15/10/2024
MAQUINARIA					
CLASE	MARCA	MODELO	No SERIE	MOTOR	
Miniexcavadora	JSB	2014	JCB1CXWSA01744815	GN66168U920152Y	
Retroexcavadora	DOOSAN	2018	DHKCEBAACJ0007295	DL06C8455591E00	
SEGURIDAD SOCIAL OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA					
NOMBRE		ID	PERIODO COTIZACIÓN	N. DE PLANILLA	FECHA DE PAGO
Jesús Alberto Medrano		1037479814	Noviembre 2024	E:1068413753	04/12/2024
Mauricio Suarez Pedraza		1100890118	Diciembre 2024	E:9475422209	

Periodo 2: 14 Diciembre 2024 a 31 Marzo 2025: durante la ejecución del periodo 2 el contratista reporto a la interventoría el uso de 01 volqueta la cual es relacionada a continuación junto con el pago de planilla de seguridad social del operador del vehículo; para esta fecha no fue necesario el uso de maquinaria.

Tabla 9

Información documental de vehículos

PLACA	MODELO	No SOAT	FECHA SOAT	RTM	FECHA RTM	CONDUCTOR
XKC 284	2018	15080056862120 00	05/09/2025	177364697	22/11/2025	Edwin Jaimes Ramos
SEGURIDAD SOCIAL CONDUCTORES						
LERMA CONSTRUCCIONES S.A.S						
NOMBRE		ID	PERIODO COTIZACIÓN	N. DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	
Edwin Jaimes Ramos		91497697	Diciembre	9480562801	22/01/2025	
			Enero	9481788138	18/02/2025	
			Febrero	9483293477	23/03/2025	

Nota. Información de los vehículos utilizados en obra durante el periodo 2

5.2 Control de Seguridad Social

Teniendo en cuenta que el pago a seguridad social es un derecho y una garantía de cada uno de los trabajadores la interventoría se encargó de verificar y controlar cada uno de

los aportes realizados al personal por parte del contratista durante la ejecución del contrato.

Periodo 1: 20 Noviembre a Diciembre 13 del 2024: para este periodo 1 el contratista de obra envió a la interventoría el soporte de pago de seguridad social mes de Noviembre el cual fue verificado por la misma.

Tabla 10

Control y numero de planilla realizados a seguridad social mes Noviembre

PERSONAL ACTIVO EN OBRA					
CONTRATISTA CONSERVACION HIDRICA					
N.	**NOMBRE**	**IDENTIDAD**	**CARGO**	**N° PLANILLA**	**F. PAGO**
1	Juan Carlos Rincón Lozano	80.089.079	Gerente de proyectos	I:7944297213Y: 9478500257	26/11/2024 05/12/2024
2	Oscar Fabricio Medina Reatiga	1.101.597.782	Asesor Forestal	I:31970529 Y:9478500257	19/12/2024 05/12/2024
3	Luisa Fernanda Sánchez Castro	1.00.958.383	Asesor Ambiental	I:81944395 Y:9478500257	21/11/2024 05/12/2024
CONSORCIO CONAINCO					
N.	**NOMBRE**	**IDENTIDAD**	**CARGO**	**N° PLANILLA**	**F. PAGO**
4	Edgar Leonardo Gómez Roncancio	72.254.372	Director de Obra	E:1068411593	04/12/2024
5	Clara Melissa Donado Arias	1.098.704.436	Profesional SST	E:1068411593	04/12/2024
CONSORCIO CONSERVACION INFRACORP					
N.	**NOMBRE**	**IDENTIDAD**	**CARGO**	**N° PLANILLA**	**F. PAGO**
6	Johana Marcela Padierna Castiblanco	1.098.756.647	Residente de Obra	E:9478542183	05/12/2024
CONSORCIO CONSERVACION HIDRICA					
N.	**NOMBRE**	**IDENTIDAD**	**CARGO**	**N° PLANILLA**	**F. PAGO**
7	Jessid Ramon Parra Osma	1.102.375.757	Topógrafo	E:9478258443	04/12/2024
8	Andrés Felipe Saldoval Mantilla	1.098.715.543	Residente de obra	E:9478258443	04/12/2024
9	Evelyn Dayan Barreto Castillo	1.064.121.767	Cadenera	SOPORTES DE AFILIACIÓN	
SUBCONTRATISTA LERMA CONSTRUCCIONES					
N.	**NOMBRE**	**IDENTIDAD**	**CARGO**	**N° PLANILLA**	**F. PAGO**
10	Giovanny Rincón	1.095.828.352	Oficial	E:9479087665	18/12/2024
11	Brayan García	100.091.700	Ayudante	E:9479087665	18/12/2024
12	Edward Rojas	1.097.910.397	Ayudante	E:9479087665	18/12/2024
13	Fabio Marín	1003.091.307	Ayudante	E:9479087665	18/12/2024
14	Henry Marín	100.091.035	Ayudante	E:9479087665	18/12/2024
SUBCONTRATISTA CONSTRUCCIONES SANGUINO					
N.	**NOMBRE**	**IDENTIDAD**	**CARGO**	**N° PLANILLA**	**F. PAGO**

15	José Antonio Luna Acosta	91.156.019	Oficial	SOPORTES DE AFILIACIÓN
16	Jorge Giovanny Vera	1096.064.931	Ayudante	
17	Marcos Guadrón	1095.808.698	Ayudante	
18	Nelson Nieves	91133.913	Ayudante	
19	Richard José Abremate	901.768.348	Ayudante	

Periodo 2: 14 Diciembre 2024 a Marzo 31 del 2025: para este periodo 2 la interventoría verifico planillas de seguridad social del mes de Diciembre, Enero, Febrero y Marzo.

Tabla 11

Control y numero de planilla realizados a seguridad social mes de Diciembre 2024 y Enero 2025

PERSONAL ACTIVO EN OBRA							
CONTRATISTA CONSERVACION HIDRICA							
N.	NOMBRE	IDENTIDAD	CARGO	DICIEMBRE		ENERO	
				N° PLANILLA	F. PAGO	N° PLANILLA	F. PAGO
1	Juan Carlos Rincón Lozano	80089079	Gerente de proyectos	I:7950546071 Y:9479226821	10/12/2024 08/01/2025	I:7954871309 Y:9480648957	13/01/2025 06/02/2025
2	Oscar Fabricio Medina Reatiga	1101597782	Asesor Forestal	I:31970529 Y:9479226821	19/12/2024 08/01/2025	I:32329591 Y:9480648957	25/02/2025 06/02/2025
3	Luisa Fernanda Sánchez Castro	100958383	Asesor Ambiental	I:82580139 Y:9479226821	10/12/2024 08/01/2025	I:84411287 Y:9480648957	24/02/2025 06/02/2025
4	Jessid Ramon Parra Osma	1102375757	Topógrafo	E:9480069598	08/01/2025	retirado	
5	Andrés Felipe Sandoval Mantilla	1098715543	Residente de obra	E:9480069598	08/01/2025	retirado	
6	Evelyn Dayan Barreto Castillo	1064121767	Cadenera	E:9480069598	08/01/2025	E:9481442561	06/02/2025
CONSORCIO CONAINCO							
N.	NOMBRE	IDENTIDAD	CARGO	N° PLANILLA	F. PAGO	N° PLANILLA	F. PAGO
7	Edgar Leonardo Gómez Roncancio	72254372	Director de Obra	E:1069009033	08/01/2025	E:1070061799	06/02/2025
8	Clara Melissa Donado Arias	1098704436	Profesional SST	E:1069009033	08/01/2025	E:1070061799	06/02/2025
9	Dennis Melissa Tarazona Mantilla	1098781831	Topografa	E:1069009033	08/01/2025	E:1070061799	06/02/2025
CONSORCIO CONSERVACION INFRACORP							
N.	NOMBRE	IDENTIDAD	CARGO	N° PLANILLA	F. PAGO	N° PLANILLA	F. PAGO
10	Johana Marcela Padierna Castiblanco	1098756647	Residente de Obra	E:9480059016	08/01/2025	E:9481583402	11/02/2025
SUBCONTRATISTA LERMA CONSTRUCCIONES							
N.	NOMBRE	IDENTIDAD	CARGO	N° PLANILLA	F. PAGO	N° PLANILLA	F. PAGO
11	Ender Giovanny Rincón	1095828352	Oficial	9480562801	22/01/2025	E:9481788138	18/02/2025
12	Brayan Stiven García Amariz	100091700	Ayudante	9480562801	22/01/2025	E:9481788138	18/02/2025
13	Edward Yesid Rojas	1097910397	Ayudante	9480562801	22/01/2025	E:9481788138	18/02/2025
14	Fabio Marín Ramos	1003091307	Ayudante	9480562801	22/01/2025	E:9481788138	18/02/2025
15	Henry Marín Ramos	100091035	Ayudante	9480562801	22/01/2025	E:9481788138	18/02/2025

16	Raúl Dionicio García Amariz	1007514004	Oficial	9480562801	22/01/2025	E:9481788138	18/02/2025
SUBCONTRATISTA CONSTRUCCIONES SANGUINO							
N.	**NOMBRE**	**IDENTIDAD**	**CARGO**	**N° PLANILLA**	**F. PAGO**	**N° PLANILLA**	**F. PAGO**
17	José Antonio Luna Acosta	91156019	Oficial	E:9480183628	10/01/2025	E:9481528407	10/02/2025
18	Jorge Giovanny Vera	1096064931	Ayudante	E:9480183628	10/01/2025	E:9481528407	10/02/2025
19	Richard José Abreu mata	901768348	Ayudante	E:9480183628	10/01/2025	E:9481528407	10/02/2025
20	Luis Alberto Prada Rincón	5691822	Ayudante	E:9480183628	10/01/2025	E:9481528407	10/02/2025
	Marcos Gualdron	1.095.808.698	Ayudante	E:9480183628	10/01/2025	E:9481528407	10/02/2025
	Nelson Nieves	91.133.913	Ayudante	E:9480183628	10/01/2025	E:9481528407	10/02/2025
21	Ronal Sánchez Rey	91184098	Ayudante	E:9480183628	10/01/2025	E:9481528407	10/02/2025
22	Baudilio Rivera Gómez	1093738325	Ayudante	E:9480183628	10/01/2025	E:9481528407	10/02/2025
23	Daniel Martin Duarte Ordoñez	1005234391	Ayudante	Ingreso en Enero		E:9481528407	10/02/2025

Nota. Información de aportes a seguridad social del contratista

Tabla 12

Control y numero de planilla realizados a seguridad social mes de Febrero y Marzo 2025

PERSONAL ACTIVO EN OBRA							
CONTRATISTA CONSERVACION HIDRICA							
N.	**NOMBRE**	**IDENTIDAD**	**CARGO**	**FEBRERO**		**MARZO**	
				N° PLANILLA	**F. PAGO**	**N° PLANILLA**	**F. PAGO**
1	Juan Carlos Rincón Lozano	80089079	Gerente de proyectos	I:7956774505 Y:9482065024	04/02/2025 07/03/2025	I:7958923605 Y:9484422957	17/03/2025 08/04/2025
2	Oscar Fabricio Medina Reatiga	1101597782	Asesor Forestal	I:32641217 Y:9482065024	27/02/2025 07/03/2025	I:32937311 Y:9484422957	26/03/2025 08/04/2025
3	Luisa Fernanda Sánchez Castro	100958383	Asesor Ambiental	I:84411132 Y:9482065024	24/02/2025 07/03/2025	I:85221711 Y:9484422957	25/03/2025 08/04/2025
4	Evelyn Dayan Barreto Castillo	1064121767	Cadenera	E:9482931827	07/03/2025	E:9484422672	08/04/2025
CONSORCIO CONAINCO							
N.	**NOMBRE**	**IDENTIDAD**	**CARGO**	**N° PLANILLA**	**F. PAGO**	**N° PLANILLA**	**F. PAGO**
4	Edgar Leonardo Gómez Roncancio	72254372	Director de Obra	E:1070942395	07/03/2025	E:1071594528	07/04/2025
5	Clara Melissa Donado Arias	1098704436	Profesional SST	E:1070942395	07/03/2025	E:1071594528	07/04/2025
6	Dennis Melissa Tarazona Mantilla	1098781831	Topografa	E:1070942395	07/03/2025	E:1071594528	07/04/2025
CONSORCIO CONSERVACION INFRACORP							
N.	**NOMBRE**	**IDENTIDAD**	**CARGO**	**N° PLANILLA**	**F. PAGO**	**N° PLANILLA**	**F. PAGO**
7	Johana Marcela Padierna Castiblanco	1098756647	Residente de Obra	E:9482938248	07/03/2025	E:9484204916	04/04/2025
SUBCONTRATISTA CONSTRUCCIONES SANGUINO							
N.	**NOMBRE**	**IDENTIDAD**	**CARGO**	**N° PLANILLA**	**F. PAGO**	**N° PLANILLA**	**F. PAGO**
16	José Antonio Luna Acosta	91156019	Oficial	E:9482935996	07/03/2025	E:9484530071	09/04/2025
17	Jorge Giovanny Vera	1096064931	Ayudante	E:9482935996	07/03/2025	E:9484530071	09/04/2025

19	Richard José Abreu mate	901768348	Ayudante	E:9482935996	07/03/2025	retirado	
20	Luis Alberto Prada Rincón	5691822	Ayudante	E:9482935996	07/03/2025	E:9484530071	09/04/2025
21	Ronal Sánchez Rey	91184098	Ayudante	E:9482935996	07/03/2025	E:9484530071	09/04/2025
22	Baudilio Rivera Gómez	1093738325	Ayudante	E:9482935996	07/03/2025	E:9484530071	09/04/2025
23	Daniel Martin Duarte Ordoñez	1005234391	Ayudante	E:9482935996	07/03/2025	E:9484530071	09/04/2025
24	Johan Sebastián Grajales	1000122562	Ayudante	Ingreso en Marzo		E:9484530071	09/04/2025
25	Esteban Vargas Romano	1099737734	Ayudante	Ingreso en Marzo		E:9484530071	09/04/2025

Nota. Información de aportes a seguridad social del contratista

6 PARTICIPACION Y CONSULTA

Dentro de los mecanismos de participación y consulta se encuentra el comité de convivencia laboral y el Comité Paritario de Seguridad y salud en el trabajo COPASST o Vigía y mecanismos de notificación de riesgos por parte de la población trabajadora; se describieron las diferentes actividades desarrolladas por estos:

7.1 Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo

El COPASST (Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo) es un comité encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo.

El contratista dando cumplimiento a la normatividad del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo el día 30 de Noviembre del 2024 en el campamento de obra se realizó reunión levantando acta N° 1 para designar a los integrantes de copasst; principal con su respectivo suplente con el fin de establecer sus responsabilidades que tienen con respecto a vigilar controlar y supervisar las actividades para la ejecución del contrato de obra, ya que al ser empresa esta cuenta con un comité constituido.

El representante legal Edgar Leonardo Gómez Roncancio, designo como integrante principal de copasst al señor Andrés Felipe Sandoval Mantilla y como suplente a la señora Jhoanna Marcela Padierna y los trabajadores eligieron como integrante principal al señor Yesid Ramon Parra Osma y como suplente a Giovanny Rincón

Durante la ejecución del proyecto los miembros del COPASST se reunieron mes a mes dando cumplimiento a las funciones y responsabilidades del comité.

A continuación, se relacionan las reuniones realizadas durante el proyecto:

ACTAS DE REUNIÓN COPASST		
No. DE ACTA	**FECHA**	**OBJETIVO**
01	30/11/2024	Acta de conformación de COPASST
02	30/01/2025	Acta de Reunión N. 02
03	28/02/2025	Acta de Reunión N. 03
04	31/03/2025	Acta de Reunión N. 04

7.2 Comité de Convivencia Laboral

El comité de convivencia laboral el cual se creó por la Ley de Acoso Laboral (Ley 1010 de 2006) reglamentada por las resoluciones 652 y 1356 de 2012 donde se determinó en forma precisa su conformación y su funcionamiento.
El contratista cumpliendo con la normatividad vigente el día 30 de Noviembre del 2024 se realizó conformación de acta de comité de convivencia laboral en cumplimiento con la resolución 652 de 2012, resolución 1356 de 2012, el decreto 1072 de 2015, resolución 312 de 2019 emanadas por el ministerio de protección social.

Designados por la gerencia:
Presidente: Andrés Felipe Sandoval Mantilla
Secretario: Evelyn Barreto

Posterior a la votación de los presentes, se realiza nombramiento de:
Presidente: Fabio Marín
Secretario: Jessid Ramon Parra

Durante la ejecución del proyecto el comité de convivencia laboral realizo reuniones trimestrales dando cumplimiento a las funciones y responsabilidades del comité.

A continuación, se relaciona las reuniones trimestrales realizadas durante la ejecución del contrato.

ACTAS DE REUNIÓN DEL COCOLA		
No. ACTA	**FECHA**	**OBJETIVO**
01	30/11/2024	Acta de conformación de COCOLA
02	27/02/2025	Acta de reunión

Durante la ejecución del proyecto no se presentaron quejas o reclamaciones laborales por parte de los trabajadores.

7.3 Reporte de Actos y Condiciones Inseguras. (Raci)

Durante la ejecución del proyecto no se presentaron situaciones para reporte por parte de la población trabajadora RACI.

7.4 Charlas y capacitaciones

Para lograr los objetivos del SGSST fue indispensable las capacitaciones, charlas y recomendaciones con la finalidad de adquirir conocimientos, ayudando a los trabajadores a resolver problemas, tomar decisiones, forjar líderes y mejorar las aptitudes, lograr metas individuales a fin de llevar a la práctica en los ambientes laborares, tareas y demás competencias que de manera colectiva o particular se desarrolle.
Como evidencia, el contratista realiza diligenciamiento finalizando la charla dada por profesional en seguridad y salud en el trabajo en supervisión de la interventoría; estas charlas aportaron información de relevancia, interés e importancia, se aportaron recomendaciones y acciones preventivas promocionando las buenas prácticas en seguridad y salud en el trabajo y ambientales.

A continuación, se relaciona las capacitaciones realizadas durante la ejecución del proyecto:

Tabla 13
Temas de las capacitaciones dadas en obra

CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
20 NOVIEMBRE AL 13 DICIEMBRE 2024				
FECHA	**TEMA**	**DURACIÓN (Minutos)**	**FACILITADOR**	**PARTICIPANTES**

20/11/2024	Inducciones	40	Inspectora SST	7
25/11/2024	Salud Peligros y Riesgos	60	Inspectora SST	8
09/12/2024	Cuidado de Epps	40	Inspectora SST	11
11/12/2024	Riesgo Publico	35	Inspectora SST	3
11/12/2024	Plan de emergencia	60	Inspectora SST	3
14 DICIEMBRE AL 31 MAYO 2025				
FECHA	**TEMA**	**DURACIÓN**	**FACILITADOR**	**PARTICIPANTES**
19/12/2024	Inducción al sistema de Gestión sst	30	Inspectora SST	6
13/01/2025	Definición accidente de trabajo	30	Inspectora SST	13
22/01/2025	Socialización reglamento Higiene seguridad Industrial	30	Inspectora SST	10
05/02/2025	Accidente Ofídico	30	Inspectora SST	12
19/02/2025	Primeros Auxilios	30	Inspectora SST	12
28/02/2025	Golpe de calor	30	Inspectora SST	13
04/03/2025	Actos y condiciones inseguras	30	Inspectora SST	11
18/03/20205	Seguridad Vial- Señales de transito	30	Inspectora SST	9

Nota. Formación para el personal de obra

Ilustración 6

Capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo








Nota: Evidencia fotográfica de los temas dados en obra

7 PROGRAMA SEGURIDAD INDUSTRIAL

El Programa de Seguridad Industrial comprende el conjunto de técnicas y actividades destinadas a la identificación, valoración y al control de causas de los accidentes de trabajo es por ello que tiene como objetivo conseguir el mínimo de accidentes y por ello se trabaja con una planeación detallada en la identificación de peligros de las instalaciones y los procesos de trabajo.

A continuación, se detallan las actividades de ejecución y control que en general se desarrollaron en este programa para reducir el riesgo de accidentes durante el periodo en mención:

8.1 Gestión de los Peligros y Riesgos.

La gestión de los riesgos peligros prioritarios en el trabajo requiere mecanismos de prevención adicionales que permitan la gestión adecuada del riesgo, permitiendo ambientes de trabajo más seguros.

Tabla 14
Medidas preventivas

MEDIDAS PREVENTIVAS		
PELIGRO	**GESTIÓN DE LOS PELIGROS**	**FECHA (S)DE REALIZACIÓN.**
Caídas, golpes, heridas	Inducción y/o reinducción Charlas de seguridad	Durante el periodo del informe

Nota. Identificación de peligros y sus respondientes permisos de trabajo

8.2 Entrega y reposición de elementos de protección individual

El suministro de los Elementos de Protección Individual (EPI) y ropa de trabajo se efectuará de acuerdo con la ley (ver código sustantivo del trabajo capítulo IV, artículos 230 a 235) y validado mediante la matriz de EPPs, soportando su entrega en el formato de Entrega de dotación y EPI establecido

El contratista cumplió con la obligación de entregar el suministro de los elementos de protección personal y dotación según el análisis de factor de riesgo al que estará expuesto el trabajador, se realiza cuantas veces fue necesario teniendo en cuenta el ciclo de vida útil del EPP, interventoría realizó supervisión de fuentes de trabajo y estado de los elementos de protección entregados realizando cambios de manera inmediata dado a la necesidad del momento dando un cumplimiento en el abastecimiento y calidad de los insumos necesarios al 100% del personal

8.3 Inspecciones y señalización

La inspección de seguridad se constituye una técnica analítica de seguridad que consiste en el análisis realizado mediante la observación directa de las instalaciones, equipos y procesos productivos para identificar los peligros existentes y evaluar los riesgos en los puestos de trabajos Para esto, el contratista realizó inspección en la oficina, interventoría evidenció que se contara con instalaciones adecuadas para el desarrollo de actividades administrativas, buena iluminación, ventilación, infraestructura adecuada, cartelera informativa con sus políticas internas de SST, información general, MEDEVAC, guías telefónicas, señalización de salidas de emergencias y demarcación de áreas entre otras.

Dentro de la inspección de obra se permitió evidenciar que la obra estuviera señalizada, existe hojas de seguridad de sustancias peligrosas y químicas usadas para la desinfección, almacenamiento según sus recomendaciones de ficha de seguridad, pisos seguros, limpios, secos, libres de obstáculos, demarcación de zonas peatonales, maquinaria, herramienta y equipos en buenas condiciones, orden y limpieza en punto ecológico, teléfonos de emergencia, equipos de atención al lesionado y emergencias entre otras
En la supervisión de la inspección de elementos de protección personal, se evidenció que estuvieran en buenas condiciones los cascos, protectores auditivos, oculares y respiratorios, guantes, tapabocas y demás, el contratista realiza cambios de EPP'S cuando cumplen su vida útil.

El contratista de obra contó con un campamento que estaba dotado con los elementos básicos para la atención de emergencias (Botiquín, extintor, camilla, inmovilizador, listado de instituciones de apoyo externo en caso de emergencia) y cuento con señalización informativa y preventiva.

A continuación, se evidencia la consolidación de las inspecciones de seguridad que se realizaron durante el proyecto por parte del consorcio contratista de obra:

Tabla 15
Inspecciones realizadas en obra

INSPECCIONES DE SEGURIDAD	
20 DE NOVIEMBRE AL 13 DICIEMBRE 2025	
INSPECCION	**FECHAS DE INSPECCIÓN**
Inspección de elementos de protección personal	07 de diciembre de 2024
Inspección locativa de obra	07 de diciembre de 2024
Inspección de botiquín y camilla	07 de diciembre de 2024
Inspección de extintores	07 de diciembre de 2024
14 DE DICIEMBRE AL 31 MARZO 2025	
INSPECCION	**FECHAS DE INSPECCIÓN**
Inspección de elementos de protección personal	31/01/2025 28/02/2025 31/03/2025
Inspección locativa de obra	31/03/2025
Inspección de botiquín y camilla	31/01/2025 28/02/2025 31/03/2025
Inspección de extintores	31/01/2025 28/02/2025 31/03/2025

Nota. Inspecciones realizadas en obra por parte del contratista

Ilustración 7
Inspecciones de seguridad




vehículo




Señalización




Supervisión de actividades





Elementos de emergencia

Nota. Evidencia fotográfica de las inspecciones de obra

8.4 Reporte de Incidentes y Accidentes de Trabajo

Durante la ejecución del proyecto el contratista consorcio conservación hídrica realizo resumen estadístico del ausentismo de origen común y laboral en el cual la interventoría verifico y evidencio que durante la ejecución del contrato no se presentaron eventos derivados de accidentes de trabajo.

Tabla 16

Relación de accidentes presentados en el proyecto

Periodo	Accidentes y/o enfermedad laboral	Accidentes de origen común	Accidentes de transito	Enfermedad común
20 de noviembre a 13 diciembre 2024	0	0	0	0
14 diciembre 2024 al 31 marzo 2025	0	0	0	0

Nota. Indicativos de accidentalidad durante la ejecución del proyecto

CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA INTERVENTORIA

8 CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA INTERVENTORIA

8.1 Personal de la Interventoría

Durante la ejecución del proyecto la empresa contratista de interventoría CONSORCIO CONSERVACION IM conto con asesores especialistas que se desempeñaron en diferentes áreas quienes supervisaban, vigilaban y garantizaban las actividades técnicas, administrativas, financieras y ambientales del proyecto de obra.

El personal vinculado a la empresa contratista de interventoría con el cual finalizo el proyecto es relacionado a continuación:

Tabla 17
Staff del personal de la Interventoría

PERSONAL INTERVENTORIA ACTIVO								
PERIODO: 14 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE MARZO DEL 2025								
N	NOMBRE COMPLETO	IDENTIFICACIÓN	CARGO	INGRESO	EPS	FP	ARL	CCF
1	MIGUEL FERNANDO QUIROS GOMEZ	1096.949.307	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	20/11/2024	Salud Total	Axa Colpatria	Colpensiones	Comfenalco
2	MARIA ALEXANDRA SANCHEZ RODRIGUEZ	1.098.698.064	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	20/11/2024	Salud Total	Axa Colpatria	Colpensiones	Comfenalco
3	DIANA EDITH CONTRERAS VARGAS	33.369.716	ESPECIALISTA EN RECURSOS HIDRICOS	20/11/2024	Salud Total	Axa Colpatria	Colpensiones	Comfenalco
4	ANGIE DANIELA MERCHAN PEREZ	1098.770.897	INGENIERA AMBIENTAL	20/11/2024	Sura	Axa Colpatria	Porvenir	Comfenalco
5	LUIS ANGEL PINTO ROJAS	13543090	INGENIERO FORESTAL	20/11/2024		Axa Colpatria		Comfenalco
6	PAULA EMILIA FAJARDO SILGADO	1102804163	PROFESIONAL SISO	20/11/2024	Sanitas	Axa Colpatria	Colpensiones	Comfenalco

Nota: Información del personal de la interventoría

9.1 Novedades de Ingreso

Durante la ejecución del proyecto en la interventoría se presentaron los siguientes ingresos de personal:

Periodo 1: 20 Noviembre al 13 de Diciembre 2024: para el periodo 1 se presentaron 6 novedades de ingreso teniendo en cuenta que era el inicio del contrato

Tabla 18
Novedades de Ingreso

PERSONAL DE INGRESO DE LA INTERVENTORIA								
PERIODO: 20 DE NOVIEMBRE A 13 DE DICIEMBRE DE 2024								
N.	NOMBRE	IDENTIDAD	CARGO	FECHA INGRESO	EPS	ARL	AFP	CCF
1	MIGUEL FERNANDO QUIROS GOMEZ	1096.949.307	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	20/11/2024	Salud Total	Axa Colpatria	Colpensiones	Comfenalco
2	MARIA ALEXANDRA SANCHEZ RODRIGUEZ	1.098.698.064	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	20/11/2024	Salud Total	Axa Colpatria	Colpensiones	Comfenalco
3	DIANA EDITH CONTRERAS VARGAS	33.369.716	ESPECIALISTA EN RECURSOS HIDRICOS	20/11/2024	Salud Total	Axa Colpatria	Colpensiones	Comfenalco
4	ANGIE DANIELA MERCHAN PEREZ	1098.770.897	INGENIERA AMBIENTAL	20/11/2024	Sura	Axa Colpatria	Porvenir	Comfenalco
5	LUIS ANGEL PINTO ROJAS	13543090	INGENIERO FORESTAL	20/11/2024		Axa Colpatria		Comfenalco
6	PAULA EMILIA FAJARDO SILGADO	1102804163	PROFESIONAL SISO	20/11/2024	Sanitas	Axa Colpatria	Colpensiones	Comfenalco

Nota: información del personal de ingreso

9.2 Novedades de Retiro

Durante la ejecución del proyecto no se presentaron retiros de personal por parte de la interventoría; estos se presentaron únicamente al finalizar el proyecto, el día 31 de

Marzo del 2025 el cual se retiro todo el personal y se ordeno exámenes de egreso ocupacional.

a continuación, se relaciona el personal retirado:

Tabla 19

Novedades de Retiro

PERSONAL DE RETIRO					
N.	**NOMBRE**	**IDENTIDAD**	**CARGO**	**FECHA INGRESO**	**FECHA DE RETIRO**
1	MIGUEL FERNANDO QUIROS GOMEZ	1096.949.307	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	20/11/2024	31/03/2025
2	MARIA ALEXANDRA SANCHEZ RODRIGUEZ	1.098.698.064	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	20/11/2024	31/03/2025
3	DIANA EDITH CONTRERAS VARGAS	33.369.716	ESPECIALISTA EN RECURSOS HIDRICOS	20/11/2024	31/03/2025
4	ANGIE DANIELA MERCHAN PEREZ	1098.770.897	INGENIERA AMBIENTAL	20/11/2024	31/03/2025
5	LUIS ANGEL PINTO ROJAS	13543090	INGENIERO FORESTAL	20/11/2024	31/03/2025
6	PAULA EMILIA FAJARDO SILGADO	1102804163	PROFESIONAL SISO	20/11/2024	31/03/2025

Nota: información del personal de retiro

9.3 Inducciones de Seguridad y Salud en el Trabajo

Antes del ingreso del personal a la empresa se le realiza la respectiva inducción en el sistema de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de dar a conocer generalidades de la empresa, políticas, reglamentos, plan de emergencia, peligros a los que están expuestos, que hacer en caso de accidente de trabajo, uso mantenimiento y reposición de EPP, protocolo de bioseguridad entre otros.

9.4 Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo

La interventoría dando cumplimiento a la normatividad legal vigente, designo al vigía de seguridad y salud en el trabajo en día 25 de Noviembre del 2024 en la oficina principal, con el fin de promover y obtener participación activa en el desarrollo de los programas y actividades de la empresa y lograr mejoramiento de las condiciones laborales en los ambientes de trabajo.

Durante la ejecución del proyecto no se presentaron accidentes ni incidentes de trabajo

A continuación, se relaciona las actas de vigía de seguridad y salud en el trabajo realizadas durante el proyecto

ACTAS DE REUNIÓN COPASST		
No. DE ACTA	**FECHA**	**OBJETIVO**
01	25/11/2024	Acta de designacion Vigía SST
02	12/12/2024	Acta de Reunión N. 01
03	16/01/2025	Acta de Reunión N. 02
04	20/02/2025	Acta de Reunión N. 03
05	19/03/2025	Acta de Reunión N. 04

Nota. Actas de reunión de vigía realizadas durante la ejecución del proyecto

9.5 Comité de Convivencia Laboral

El día 26 de Noviembre interventoría conformo el comité de convivencia laboral como una medida preventiva del acoso laboral que contribuye a proteger a los trabajadores contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo.

Durante la ejecución del proyecto no se presentaron quejas ni conflictos por parte de los trabajadores

A continuación, relaciono las actas de comité de convivencia laboral realizadas durante la ejecución del proyecto

ACTAS DE REUNIÓN DEL COCOLA		
No. ACTA	**FECHA**	**OBJETIVO**
01	26/11/2024	Acta de conformación de COCOLA
02	24/02/2025	Acta de reunión N°1

Nota. Información de actas de reunión trimestrales del comité de convivencia laboral

9.6 Dotación y Entrega de los Elementos de Protección Personal

Durante la ejecución del proyecto el contratista de la interventoría realizo entrega de elementos de protección personal, según factor de riesgo al que estaría expuesto, dando

cumplimiento al artículo 176 de la resolución 2400 de 1979 y de igual forma realizo reposición de los mismos por vida útil, dejando registro en el formato los cuales fueron anexados en los informes mensuales.

Ilustración 8

Evidencia fotográfica de la entrega de dotación.





Nota. Evidencia de la entrega de elementos de protección personal

9.7 Capacitaciones y Charlas de Seguridad y Salud en el Trabajo

Para dar soporte al programa de inducción de seguridad y salud en el trabajo, el consorcio cuenta con un programa de capacitación y entrenamiento para los trabajadores teniendo en cuenta los riesgos identificados en la matriz de riesgos de peligros y los requisitos legales vigentes.

Adicional a esto, diariamente se imparte una charla de seguridad y salud en el trabajo a todos los trabajadores antes de iniciar la jornada laboral, la cual se realiza con el fin de fortalecer las capacidades, conocimientos y actitudes de los empleados en materia de Salud y Seguridad en el trabajo.

A continuación, relaciono los temas de las capacitaciones dadas al personal durante la ejecución del proyecto

Tabla 20

Temas de las capacitaciones realizadas durante el periodo

CAPACITACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
20 NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2024	
FECHA	**TEMA**
27/11/2024	Cumplimiento de las políticas SST
10/12/2024	Reglamento de higiene y seguridad Industrial

CAPACITACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
20 NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2024	
FECHA	TEMA
14 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE MARZO DEL 2025	
FECHA	TEMA
8/01/2025	Inducciones de seguridad
22/01/2025	Identificación de riesgos y peligros
4/02/2025	Funciones y responsabilidades del Copasst
11/02/2025	Inspecciones de seguridad
27/02/2025	Investigación de accidentes
13/03/2025	Higiene postural
26/03/2025	Pausas Activas

Nota. capacitaciones dadas al personal de la Interventoría

Ilustración 9

Evidencia fotográfica de las capacitaciones realizadas durante el periodo





Nota. evidencia de charlas y capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo

9.8 Inspecciones de seguridad

El consorcio es conocedor de la importancia que tiene la implementación de inspecciones de seguridad buscando conocer uno a uno los aspectos que pueda llegar a afectar el buen desarrollo de las actividades administrativas y supervisión de obra es por tal motivo que se realizaron inspecciones de los equipos de emergencia, extintores, botiquín etc. Esto con el fin de generar ambientes de trabajo seguros.

A continuación, relaciono la información de las inspecciones realizadas durante la ejecución del proyecto los cuales fueron anexados los soportes en los informes mensuales entregados a la entidad contratante.

Tabla 21

Inspecciones de seguridad realizadas durante el periodo mencionado

INSPECCIONES DE SEGURIDAD	
20 NOVOEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2024	
INPECCION	**FECHA DE INSPECCION**
Inspección de botiquín	11/12/2024
Inspección de extintores	11/12/2024
Inspección Locativa	11/12/2024
Inspección Epps	11/12/2024
14 DICIEMBRE 2024 AL 31 MARZO 2025	
INPECCION	**FECHA DE INSPECCION**
Inspección de botiquín	14/01/2025 18/02/2025 20/03/2025
Inspección de extintores	14/01/2025 18/02/2025 20/03/2025
Inspección Locativa	14/01/2025 18/02/2025 20/03/2025
Inspección Epps	14/01/2025 18/02/2025 20/03/2025

Nota. Registro de inspecciones

9.9 Estadísticas de salud

Teniendo en cuenta el análisis del ausentismo laboral por causa médica a razón de accidentes laborales, calamidad familia, medicina general o motivos personales como insumos para programación de actividades de promoción y prevención en salud.

Durante la ejecución del proyecto no se presentaron accidentes laborales, ni se presentaron incapacidades por enfermedad laboral.

Tabla 22
Tabla informativa de accidentalidad en el proyecto

PERIODO	INCIDENTES DE TRABAJO	ACCIDENTES DE TRABAJO	AUSENTISMO	INCAPACIDADES
20 de Noviembre al 13 de Diciembre de 2024	0	0	0	0
14 de Diciembre 2024 al 31 de Marzo 2025	0	0	0	0

Nota. Registro de accidentalidad

9 CONCLUSIONES

La interventoría evidenció, supervisó y realizó seguimiento de la implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo aplicado por parte del contratista

La Interventoría realizó acompañamiento a las actividades ejecutadas en obra, capacitaciones, charlas e inspecciones de frentes de trabajo, inspección de maquinaria, botiquín, etc.

Se realizo mejora continua en los frentes de trabajo, mantenimiento de señalización, inspección de herramienta, equipos, trabajos correctivos y demás durante la ejecución del proyecto

Durante la ejecución del proyecto no se presentaron accidentes de trabajo.

10 ANEXOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA INTERVENTORIA

- ✓Anexo 1- ordenes de examen de egreso al personal de interventoría

ANEXO N°1
ORDENES DE EXAMENES MEDICOS DE EGRESO

GRISARCO CONSERVACION M 901.881.556-4	**SOLICITUD PARA LA REALIZACION DE EXAMENES DE RETIRO**	**Código**	FT-SST-106
		Fecha	22/10/2024
		Versión	1
		Página **1** de **1**	

Señor (a)

Miguel Fernando Quirós Gómez

E. S. M.

Asunto: IMPORTANCIA DE PRACTICARSE LOS EXAMENES DE RETIRO

Los Exámenes de Egreso o de Retiro se debe realizar cuando se termina la relación laboral y es una evaluación de cierre ocupacional, que debe permitir evaluar y conocer las condiciones de salud del trabajador y establecer la existencia o no de un daño a la salud asociada a las tareas definidas en el trabajo habitual, o una condición que impida su desempeño.

La realización de estos exámenes es una obligación legal, de acuerdo con las siguientes normas:

1. Artículo 57 del Código Sustantivo de Trabajo: Dar al trabajador que lo solicite, orden para hacerle practicar un examen de retiro.
2. Resolución 2346 de 2007, sobre evaluaciones médicas ocupacionales (EMO), y en su Artículo 6° establece: Son aquellas que se deben realizar al trabajador cuando se termina la relación laboral. Su objetivo es valorar y registrar las condiciones de salud en las que el trabajador se retira de las tareas o funciones asignadas.

Beneficio para los Empleados que se realizan estos exámenes:

- Busca garantizar al empleado que, al momento de salir de la empresa, no presente alteraciones en su estado de salud que estén relacionadas con la labor realizada o medio ambiente al que estuvo expuesto.

Según lo mencionado anteriormente la empresa pone a su disposición los medios para la realización de los exámenes de egreso o retiro y el trabajador se compromete a realizarlos.

Se firma a los 01 días del mes de Abril del 2025.

La Empresa,

Paula Fajardo S.

Paula Emilia Fajardo Silgado
PROFESIONAL SST

El trabajador,

C.C. 1102804163.

CONSORCIO CONSERVACION M 901.881.356-4	**SOLICITUD PARA LA REALIZACION DE EXAMENES DE RETIRO**	**Código**	FT-SST-106
		Fecha	22/10/2024
		Versión	1
		Página **1** de **1**	

Señor (a)

María Alexandra Sánchez Rodríguez

E. S. M.

Asunto: IMPORTANCIA DE PRACTICARSE LOS EXAMENES DE RETIRO

Los Exámenes de Egreso o de Retiro se debe realizar cuando se termina la relación laboral y es una evaluación de cierre ocupacional, que debe permitir evaluar y conocer las condiciones de salud del trabajador y establecer la existencia o no de un daño a la salud asociada a las tareas definidas en el trabajo habitual, o una condición que impida su desempeño.

La realización de estos exámenes es una obligación legal, de acuerdo con las siguientes normas:

1. Artículo 57 del Código Sustantivo de Trabajo: Dar al trabajador que lo solicite, orden para hacerle practicar un examen de retiro.
2. Resolución 2346 de 2007, sobre evaluaciones médicas ocupacionales (EMO), y en su Artículo 6° establece: Son aquellas que se deben realizar al trabajador cuando se termina la relación laboral. Su objetivo es valorar y registrar las condiciones de salud en las que el trabajador se retira de las tareas o funciones asignadas.

Beneficio para los Empleados que se realizan estos exámenes:

- Busca garantizar al empleado que, al momento de salir de la empresa, no presente alteraciones en su estado de salud que estén relacionadas con la labor realizada o medio ambiente al que estuvo expuesto.

Según lo mencionado anteriormente la empresa pone a su disposición los medios para la realización de los exámenes de egreso o retiro y el trabajador se compromete a realizarlos.

Se firma a los 01 días del mes de Abril del 2025.

La Empresa,

Paula Fajardo S.

Paula Emilia Fajardo Silgado
PROFESIONAL SST

El trabajador,

Maria Alexandra Sanchez

C.C. 7098 698 064

CONSORCIO CONSERVACION M 901.881.556-4	**SOLICITUD PARA LA REALIZACION DE EXAMENES DE RETIRO**	**Código**	FT-SST-106
		Fecha	22/10/2024
		Versión	1
		Página **1** de **1**	

Señor (a)

Diana Edith Contreras Vargas

E. S. M.

Asunto: IMPORTANCIA DE PRACTICARSE LOS EXAMENES DE RETIRO

Los Exámenes de Egreso o de Retiro se debe realizar cuando se termina la relación laboral y es una evaluación de cierre ocupacional, que debe permitir evaluar y conocer las condiciones de salud del trabajador y establecer la existencia o no de un daño a la salud asociada a las tareas definidas en el trabajo habitual, o una condición que impida su desempeño.

La realización de estos exámenes es una obligación legal, de acuerdo con las siguientes normas:

1. Artículo 57 del Código Sustantivo de Trabajo: Dar al trabajador que lo solicite, orden para hacerle practicar un examen de retiro.
2. Resolución 2346 de 2007, sobre evaluaciones médicas ocupacionales (EMO), y en su Artículo 6° establece: Son aquellas que se deben realizar al trabajador cuando se termina la relación laboral. Su objetivo es valorar y registrar las condiciones de salud en las que el trabajador se retira de las tareas o funciones asignadas.

Beneficio para los Empleados que se realizan estos exámenes:

- Busca garantizar al empleado que, al momento de salir de la empresa, no presente alteraciones en su estado de salud que estén relacionadas con la labor realizada o medio ambiente al que estuvo expuesto.

Según lo mencionado anteriormente la empresa pone a su disposición los medios para la realización de los exámenes de egreso o retiro y el trabajador se compromete a realizarlos.

Se firma a los 01 días del mes de Abril del 2025.

La Empresa,

Paula Fajardo S.

Paula Emilia Fajardo Silgado
PROFESIONAL SST

El trabajador,

C.C. 33.369716

CONSORCIO CONSERVACION M 901.881.356-4	**SOLICITUD PARA LA REALIZACION DE EXAMENES DE RETIRO**	**Código**	FT-SST-106
		Fecha	22/10/2024
		Versión	1
		Página **1** de **1**	

Señor (a)

Angie Daniela Merchán Pérez

E. S. M.

Asunto: IMPORTANCIA DE PRACTICARSE LOS EXAMENES DE RETIRO

Los Exámenes de Egreso o de Retiro se debe realizar cuando se termina la relación laboral y es una evaluación de cierre ocupacional, que debe permitir evaluar y conocer las condiciones de salud del trabajador y establecer la existencia o no de un daño a la salud asociada a las tareas definidas en el trabajo habitual, o una condición que impida su desempeño.

La realización de estos exámenes es una obligación legal, de acuerdo con las siguientes normas:

1. Artículo 57 del Código Sustantivo de Trabajo: Dar al trabajador que lo solicite, orden para hacerle practicar un examen de retiro.
2. Resolución 2346 de 2007, sobre evaluaciones médicas ocupacionales (EMO), y en su Artículo 6° establece: Son aquellas que se deben realizar al trabajador cuando se termina la relación laboral. Su objetivo es valorar y registrar las condiciones de salud en las que el trabajador se retira de las tareas o funciones asignadas.

Beneficio para los Empleados que se realizan estos exámenes:

- Busca garantizar al empleado que, al momento de salir de la empresa, no presente alteraciones en su estado de salud que estén relacionadas con la labor realizada o medio ambiente al que estuvo expuesto.

Según lo mencionado anteriormente la empresa pone a su disposición los medios para la realización de los exámenes de egreso o retiro y el trabajador se compromete a realizarlos.

Se firma a los 01 días del mes de Abril del 2025.

La Empresa,

Paula Emilia Fajardo Silgado
PROFESIONAL SST

El trabajador,

C.C. 1098770897

ONSORCO CONSERVACION M 901.881.356-4	**SOLICITUD PARA LA REALIZACION DE EXAMENES DE RETIRO**	**Código**	FT-SST-106
		Fecha	22/10/2024
		Versión	1
		Página **1** de **1**	

Señor (a)

Luis Ángel Rojas Pinto

E. S. M.

Asunto: IMPORTANCIA DE PRACTICARSE LOS EXAMENES DE RETIRO

Los Exámenes de Egreso o de Retiro se debe realizar cuando se termina la relación laboral y es una evaluación de cierre ocupacional, que debe permitir evaluar y conocer las condiciones de salud del trabajador y establecer la existencia o no de un daño a la salud asociada a las tareas definidas en el trabajo habitual, o una condición que impida su desempeño.

La realización de estos exámenes es una obligación legal, de acuerdo con las siguientes normas:

1. Artículo 57 del Código Sustantivo de Trabajo: Dar al trabajador que lo solicite, orden para hacerle practicar un examen de retiro.
2. Resolución 2346 de 2007, sobre evaluaciones médicas ocupacionales (EMO), y en su Artículo 6° establece: Son aquellas que se deben realizar al trabajador cuando se termina la relación laboral. Su objetivo es valorar y registrar las condiciones de salud en las que el trabajador se retira de las tareas o funciones asignadas.

Beneficio para los Empleados que se realizan estos exámenes:

- Busca garantizar al empleado que, al momento de salir de la empresa, no presente alteraciones en su estado de salud que estén relacionadas con la labor realizada o medio ambiente al que estuvo expuesto.

Según lo mencionado anteriormente la empresa pone a su disposición los medios para la realización de los exámenes de egreso o retiro y el trabajador se compromete a realizarlos.

Se firma a los 01 días del mes de Abril del 2025.

La Empresa,

Paula Fajardo S.

Paula Emilia Fajardo Silgado
PROFESIONAL SST

El trabajador,

C.C. 1554 3090.
