
DIAGRAMA GENERAL DEL PLAN SDH V2

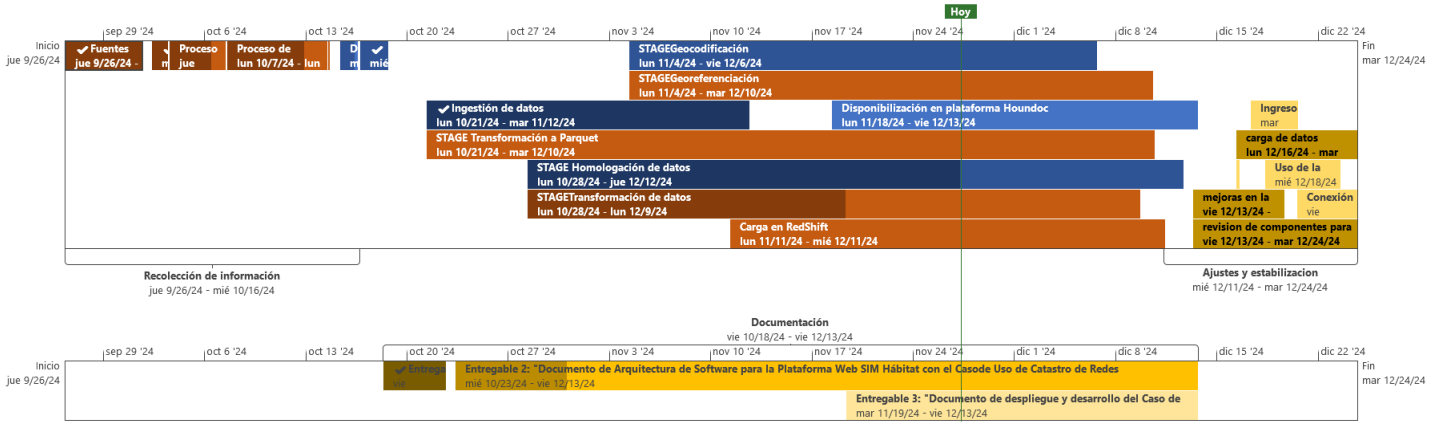

Fecha 29 nov

Task Name	% completado	Trabajo	Comienzo	Fin
PLAN SDH v2	**31%**	**668.8 hrs**	**jue 9/26/24**	**mar 12/24/24**
Recolección de información	**84%**	**164 hrs**	**jue 9/26/24**	**mié 10/16/24**
Definición de plan de trabajo	**100%**	**16 hrs**	**mié 10/16/24**	**vie 10/18/24**
Ingestión de datos	**100%**	**40 hrs**	**lun 10/21/24**	**mar 11/12/24**
STAGE Transformación a Parquet	**0%**	**36 hrs**	**lun 10/21/24**	**mar 12/10/24**
STAGE Homologación de datos	**66%**	**38 hrs**	**lun 10/28/24**	**jue 12/12/24**
STAGETransformación de datos	**52%**	**34.8 hrs**	**lun 10/28/24**	**lun 12/9/24**
STAGEGeocodificación	**0%**	**24 hrs**	**lun 11/4/24**	**vie 12/6/24**
STAGEGeoreferenciación	**0%**	**35 hrs**	**lun 11/4/24**	**mar 12/10/24**
Maps Analytics Desarrollo del componente Maps Analytics	0%	24 hrs	lun 11/11/24	vie 11/15/24
Carga en RedShift	**0%**	**29 hrs**	**lun 11/11/24**	**mié 12/11/24**
Power BI	**7%**	**32 hrs**	**lun 11/11/24**	**vie 12/13/24**
Disponibilización en plataforma Houndoc	**0%**	**40 hrs**	**lun 11/18/24**	**vie 12/13/24**
Documentación	**23%**	**166.5 hrs**	**vie 10/18/24**	**vie 12/13/24**
Ajustes y estabilización	**0%**	**13.5 hrs**	**mié 12/11/24**	**mar 12/24/24**
