

Id	Task Name	% completa	Trabajo	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nombres de los recursos
1	**PLAN SDH v1**	**2%**	**694.3 hrs**	**47 días**	**jue 9/26/24**	**vie 11/29/24**		
2	**Recolección de información**	**2%**	**164 hrs**	**15 días**	**jue 9/26/24**	**mié 10/16/24**		
3	**Fuentes**	**0%**	**32 hrs**	**4 días**	**jue 9/26/24**	**mar 10/1/24**		
4	Obtención de Información Servicio público acueducto y alcantarillado	0%	8 hrs	1 día	jue 9/26/24	jue 9/26/24		SRP
5	Obtención de Información Servicio público gas natural	0%	8 hrs	1 día	vie 9/27/24	vie 9/27/24	4	SRP
6	Obtención de Información Servicio público energía	0%	8 hrs	1 día	lun 9/30/24	lun 9/30/24	5	SRP
7	Obtención de Información Servicio público recolección de residuos	0%	8 hrs	1 día	mar 10/1/24	mar 10/1/24	6	SRP
8	**SharePoint**	**0%**	**16 hrs**	**1.5 días**	**mié 10/2/24**	**jue 10/3/24**	**3**	
9	Obtener la ruta del SharePoint y carpeta específica donde se consumiran los datos	0%	4 hrs	0.5 días	mié 10/2/24	mié 10/2/24		SDHT
10	Solicitar credenciales (usuario y password) se recomieda que la contraseña no cambie, y permisos de lectura (que permita la visualización y descargue de los archivos)	0%	4 hrs	0.5 días	mié 10/2/24	mié 10/2/24	9	SDHT
11	Validar que podamos acceder al SharePoint y que podamos visualizar y descargar archivos	0%	8 hrs	0.5 días	jue 10/3/24	jue 10/3/24	10	Nuvu,SRI
12	**Proceso de Homologación**	**0%**	**24 hrs**	**2 días**	**jue 10/3/24**	**lun 10/7/24**	**8**	
13	Organizar una mesa de trabajo para definir estructura del documento de Homologación y almacenamiento en el SharePoint	0%	8 hrs	1 día	jue 10/3/24	vie 10/4/24		SRP
14	Validar la entrega de los archivos de Homologación	0%	16 hrs	1 día	vie 10/4/24	lun 10/7/24	13	Nuvu,SRI
15	**Proceso de Transformación de datos**	**0%**	**56 hrs**	**5 días**	**lun 10/7/24**	**lun 10/14/24**	**12**	
16	Solicitar muestra de cada una de las fuentes/archivos a trabajar	0%	8 hrs	1 día	lun 10/7/24	mar 10/8/24		SRP
17	Validar entrega de muestra de cada una de las fuentes/archivos a trabaj	0%	8 hrs	0.5 días	mar 10/8/24	mar 10/8/24	16	Nuvu,SRI

Project: Project1 - sdh
Date: vie 10/18/24




Id	Task Name	% completa	Trabajo	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nombres de los recursos
18	Solicitar documentación sobre la metainformación de cada una de las fuentes, la cual debe incluir aspectos como el tipo de dato, fuente, estructura y el significado de las variables	0%	8 hrs	1 día	mié 10/9/24	mié 10/9/24	17	SRP
19	Validar entrega de documentación sobre la metainformación de cada una de las fuentes, la cual debe incluir aspectos como el tipo de dato, fuente, estructura y el significado de las variables	0%	16 hrs	1 día	jue 10/10/24	jue 10/10/24	18	Nuvu,SRI
20	Organizar mesa de trabajo para establecer cada cuanto tiempo se cargan nuevos archivos para ejecutar la ingestión	0%	8 hrs	1 día	vie 10/11/24	vie 10/11/24	19	SRP
21	Solicitar correo electrónico de las personas a la cuales les llegará notificación para que realice la descarga y geocodificar la información	0%	8 hrs	0.5 días	lun 10/14/24	lun 10/14/24	20	Nuvu,SRI
22	**Procesos de Georreferenciación**	**0%**	**8 hrs**	**0.5 días**	**lun 10/14/24**	**lun 10/14/24**	**15**	
23	Organizar mesa de trabajo para obtener y establecer los procesos de georreferenciación necesarios a realizar, establecer capas, filtros y diseños (colores) para su disponibilización.	0%	8 hrs	0.5 días	lun 10/14/24	lun 10/14/24		Nuvu,SRI
24	**Definición de indicadores**	**14%**	**28 hrs**	**1.75 días**	**mar 10/15/24**	**mié 10/16/24**	**22**	
25	Organizar mesa de trabajo para definir la información a visualizar en los mapas y dashboards a disponer (filtros)	0%	8 hrs	0.5 días	mar 10/15/24	mar 10/15/24		Nuvu,SRI
26	Definir si se van a migrar los reportes actuales de PowerBi	100%	4 hrs	0.25 días	mar 10/15/24	mar 10/15/24	25	Nuvu,SRI
27	Validar si se generarán nuevos indicadores en dashboards y mapas	0%	16 hrs	1 día	mar 10/15/24	mié 10/16/24	26	Nuvu,SRI
28	**Definición de plan de trabajo**	**76%**	**16 hrs**	**2 días**	**mié 10/16/24**	**vie 10/18/24**	**2**	
29	Definir plan de trabajo Inicial	80%	8 hrs	1 día	jue 10/17/24	jue 10/17/24		Nuvu
30	Revisión de plan de trabajo	80%	2 hrs	0.13 días	vie 10/18/24	vie 10/18/24	29	Nuvu,SRI
31	Modificaciones a plan de trabajo	80%	4 hrs	0.5 días	vie 10/18/24	vie 10/18/24	30	Nuvu

Project: Project1 - sdh
Date: vie 10/18/24




Id	Task Name	% completa	Trabajo	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nombres de los recursos
32	Entrega final de plan de trabajo	50%	2 hrs	0.25 días	vie 10/18/24	vie 10/18/24	31	Nuvu
33	**Ingestión de datos**	**0%**	**40 hrs**	**5 días**	**lun 10/21/24**	**vie 10/25/24**	**28**	
34	**Desarrollo de Secrets Manager**	**0%**	**6 hrs**	**0.75 días**	**lun 10/21/24**	**lun 10/21/24**		
35	"En AWS Secrets Manager crear un secreto ""sdht-prod-sharepoint-catastro-servicios-publicos"" que almacene:	0%	6 hrs	0.75 días	lun 10/21/24	lun 10/21/24		Nuvu
36	**Desarrollo de S3 Simple Storage Service**	**0%**	**8 hrs**	**1 día**	**lun 10/21/24**	**mar 10/22/24**	**34**	
37	Creación del Bucket de S3 "sdht-prod-catastro-servicios-públicos" (carpeta que solo corresponderá a catastro de servicios públicos)	0%	4 hrs	0.5 días	lun 10/21/24	mar 10/22/24		Nuvu
38	Crear subcarpeta "sdht-prod-raw-data" (carpeta que solo corresponderá a el proceso de ingestión)	0%	4 hrs	0.5 días	mar 10/22/24	mar 10/22/24	37	Nuvu
39	**Desarrollo del Glue "sdht-prod-ingestion"**	**0%**	**22 hrs**	**2.75 días**	**mar 10/22/24**	**vie 10/25/24**	**36**	
40	Crear un Glue Job	0%	3 hrs	0.38 días	mar 10/22/24	mié 10/23/24		Nuvu
41	Asignar los permisos necesarios para acceder a S3 y a Secrets Manager.	0%	1 hr	0.13 días	mié 10/23/24	mié 10/23/24	40	Nuvu
42	Instalar la biblioteca de Microsoft para acceder a SharePoint	0%	2 hrs	0.25 días	mié 10/23/24	mié 10/23/24	41	Nuvu
43	Implementar el código que haga lo siguiente:*Obtener las credenciales del Secrets Manager "sdht-prod-sharepoint-catastro-servicios-publicos"*Acceder a la ruta de SharePoint y descargar los archivos.*Almacenar los archivos descargados en el bucket de S3 "s	0%	8 hrs	1 día	mié 10/23/24	jue 10/24/24	42	Nuvu
44	Ejecutar el Glue "sdht-prod-ingestion" manualmente y verificar que los archivos se descargan correctamente desde SharePoint y se almacenan en S3.	0%	8 hrs	1 día	jue 10/24/24	vie 10/25/24	43	Nuvu
45	**Validación de la Extracción**	**0%**	**4 hrs**	**0.5 días**	**vie 10/25/24**	**vie 10/25/24**	**39**	

Project: Project1 - sdh
Date: vie 10/18/24

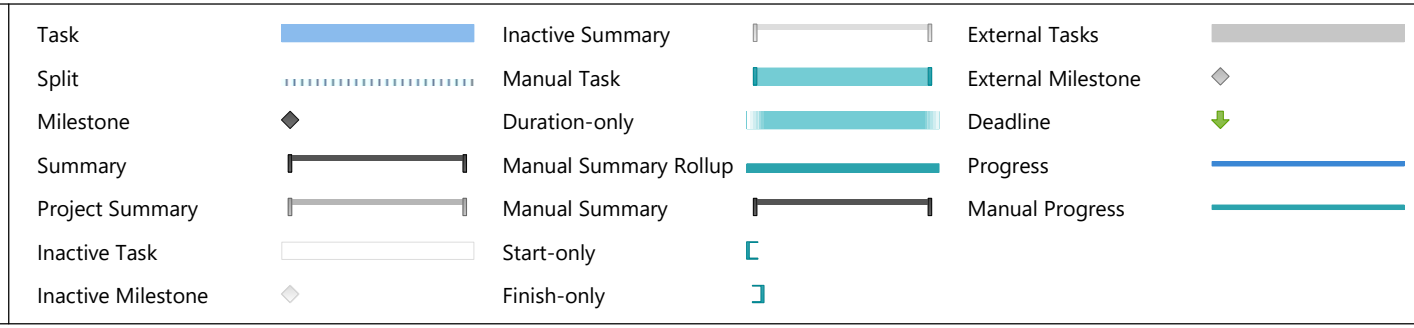


Id	Task Name	% completa	Trabajo	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nombres de los recursos
46	Confirmar que los archivos están en el bucket de S3 "sdht-prod-raw-data	0%	1 hr	0.13 días	vie 10/25/24	vie 10/25/24		Nuvu
47	Verificar la integridad de los datos extraídos.	0%	3 hrs	0.38 días	vie 10/25/24	vie 10/25/24	46	Nuvu
48	**STAGE Transformación a Parquet**	**0%**	**36 hrs**	**5 días**	**lun 10/21/24**	**vie 10/25/24**	**28**	
49	**Desarrollo de S3 Simple Storage Service**	**0%**	**6 hrs**	**0.75 días**	**lun 10/21/24**	**lun 10/21/24**		
50	Creación del Bucket en S3 "sdht-prod-stage" (carpeta que solo corresponderá a todo el procesamiento de la data "stage")	0%	4 hrs	0.5 días	lun 10/21/24	lun 10/21/24		Nuvu2
51	Crear subcarpeta "sdht-prod-parquet-data" (carpeta que solo corresponderá a el proceso de conversión a parquet)	0%	2 hrs	0.25 días	lun 10/21/24	lun 10/21/24	50	Nuvu2
52	**Desarrollo del Glue "sdht-prod-convert"**	**0%**	**26 hrs**	**3.25 días**	**lun 10/21/24**	**jue 10/24/24**	**49**	
53	Crear un Glue Job	0%	3 hrs	0.38 días	lun 10/21/24	mar 10/22/24		Nuvu2
54	Asignar los permisos necesarios para acceder a S3.	0%	1 hr	0.13 días	mar 10/22/24	mar 10/22/24	53	Nuvu2
55	Instalar las bibliotecas necesarias para el desarrollo de conversión	0%	2 hrs	0.25 días	mar 10/22/24	mar 10/22/24	54	Nuvu2
56	Implementar el código que haga lo siguiente:*Obtener los datos del s3 "sdht-prod-raw-data"*Leer los archivos "txt, csv, excel, dbg"*Convertir a parquet*Definir particionamiento para el almacenamiento*Almacenar los archivos .parquet en el bucket de S3	0%	12 hrs	1.5 días	mar 10/22/24	mié 10/23/24	55	Nuvu2
57	Ejecutar el Glue "sdht-prod-convert" manualmente y verificar que los archivos se almacenan en S3.	0%	8 hrs	1 día	jue 10/24/24	jue 10/24/24	56	Nuvu2
58	**Validación de la conversión**	**0%**	**4 hrs**	**0.5 días**	**vie 10/25/24**	**vie 10/25/24**	**52**	
59	Confirmar que los archivos están en el bucket de S3 "sdht-prod-parquet	0%	1 hr	0.13 días	vie 10/25/24	vie 10/25/24		Nuvu2
60	Verificar la integridad de los datos extraídos.	0%	3 hrs	0.38 días	vie 10/25/24	vie 10/25/24	59	Nuvu2
61	**STAGE Homologación de datos**	**0%**	**38 hrs**	**5 días**	**lun 10/28/24**	**vie 11/1/24**	**48**	
62	**Desarrollo de S3 Simple Storage Service**	**0%**	**8 hrs**	**1 día**	**lun 10/28/24**	**lun 10/28/24**		

Project: Project1 - sdh
Date: vie 10/18/24

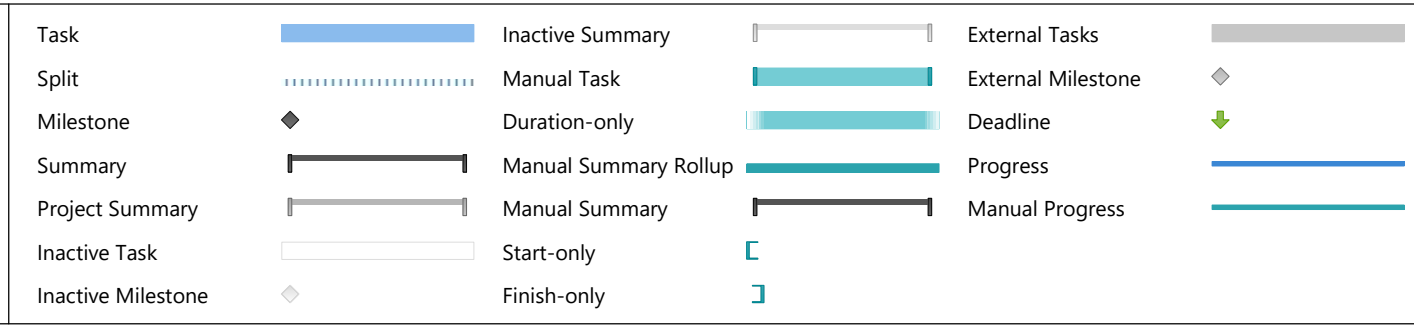


Id	Task Name	% completa	Trabajo	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nombres de los recursos
64	**Desarrollo del Glue "sdht-prod-homologation"**	**0%**	**26 hrs**	**3.25 días**	**mar 10/29/24**	**vie 11/1/24**	**62**	
70	**Validación de la Homologación**	**0%**	**4 hrs**	**0.5 días**	**vie 11/1/24**	**vie 11/1/24**	**64**	
73	**STAGETransformación de datos**	**0%**	**34.8 hrs**	**4.97 días**	**lun 10/28/24**	**vie 11/1/24**	**48**	
74	**Desarrollo de S3 Simple Storage Service**	**0%**	**8 hrs**	**1 día**	**lun 10/28/24**	**lun 10/28/24**		
79	**Desarrollo de SNS Simple Notification Service**	**0%**	**3 hrs**	**0.38 días**	**mar 10/29/24**	**mar 10/29/24**	**74**	
80	En SNS se crea Topic vinculado a los correos otorgados para el envío de notificación	0%	3 hrs	0.38 días	mar 10/29/24	mar 10/29/24		Nuvu
81	**Desarrollo del Glue "sdht-prod-transformation"**	**0%**	**19.8 hrs**	**2.48 días**	**mar 10/29/24**	**jue 10/31/24**	**79**	
82	Crear un Glue Job	0%	2.8 hrs	0.35 días	mar 10/29/24	mar 10/29/24		Nuvu
83	Asignar los permisos necesarios para acceder a S3.	0%	1 hr	0.13 días	mar 10/29/24	mar 10/29/24	82	Nuvu
84	Instalar las bibliotecas necesarias para el desarrollo de homologación	0%	2 hrs	0.25 días	mar 10/29/24	mié 10/30/24	83	Nuvu
85	Crear subcarpeta "sdht-prod-geocoding-standby" en el bucket "sdht-prod-geocoding" (carpeta que solo corresponderá a la data que está en espera para la decodificación)	0%	8 hrs	1 día	mié 10/30/24	jue 10/31/24	84	Nuvu
86	Ejecutar el Glue "sdht-prod-transformation" manualmente y verificar que los archivos se almacenan en S3.	0%	6 hrs	0.75 días	jue 10/31/24	jue 10/31/24	85	Nuvu
87	**Validación de la transformación**	**0%**	**4 hrs**	**1.13 días**	**jue 10/31/24**	**vie 11/1/24**	**81**	
88	Confirmar que los archivos están en el bucket de S3 "sdht-prod-transformation"	0%	1 hr	0.13 días	jue 10/31/24	jue 10/31/24		Nuvu
89	Verificar la integridad de los datos extraídos.	0%	3 hrs	1 día	jue 10/31/24	vie 11/1/24	88	Nuvu3[3
90	**STAGEGeocodificación**	**0%**	**24 hrs**	**5 días**	**lun 11/4/24**	**vie 11/8/24**	**73**	
101	**STAGEGeoreferenciación**	**0%**	**35 hrs**	**5 días**	**lun 11/4/24**	**vie 11/8/24**	**73**	

Project: Project1 - sdh
Date: vie 10/18/24




Id	Task Name	% completa	Trabajo	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nombres de los recursos
102	**Desarrollo de S3 Simple Storage Service**	**0%**	**6 hrs**	**0.75 días**	**lun 11/4/24**	**lun 11/4/24**		
103	Creación del Bucket en S3 "sdht-prod-curado" (carpeta que solo corresponderá a la data limpia en formato geojson y parquet)	0%	4 hrs	0.5 días	lun 11/4/24	lun 11/4/24		Nuvu2
104	Crear subcarpeta "sdht-prod-georeferencing" (carpeta que solo corresponderá a los archivos limpios GeoJson y Parquet)	0%	2 hrs	0.25 días	lun 11/4/24	lun 11/4/24	103	Nuvu2
105	**Desarrollo del Glue "sdhtprodgeoreferencing"**	**0%**	**25 hrs**	**3.13 días**	**lun 11/4/24**	**jue 11/7/24**	**102**	
106	Crear un Glue Job	0%	2 hrs	0.25 días	lun 11/4/24	lun 11/4/24		Nuvu2
107	Asignar los permisos necesarios para acceder a S3.	0%	1 hr	0.13 días	mar 11/5/24	mar 11/5/24	106	Nuvu2
108	Instalar las bibliotecas necesarias para el desarrollo de homologación	0%	2 hrs	0.25 días	mar 11/5/24	mar 11/5/24	107	Nuvu2
109	Implementar el código que haga lo siguiente:*Obtener los datos del s3 "sdht-prod-transformation"*Generar los archivos GeoJson con sus respectivas capas, datos de la fuente y filtros*Conservar archivos formato parquet.*Conservar particionamiento para el al	0%	20 hrs	2.5 días	mar 11/5/24	jue 11/7/24	108	Nuvu2
110	**Validación de la Georeferenciación**	**0%**	4 hrs	**0.5 días**	**jue 11/7/24**	**vie 11/8/24**	**105**	
111	Confirmar que los archivos están en el bucket de S3 "sdht-prod-georeferencing"	0%	1 hr	0.13 días	jue 11/7/24	jue 11/7/24		Nuvu2
112	Verificar la integridad de los datos extraídos.	0%	3 hrs	0.38 días	vie 11/8/24	vie 11/8/24	111	Nuvu2
113	**Maps Analytics Desarrollo del componente Maps Analytics**	**0%**	**24 hrs**	**5 días**	**lun 11/11/24**	**vie 11/15/24**	**101**	
114	Asignar los permisos necesarios para acceder a S3.	0%	2 hrs	0.25 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24		Nuvu3
115	Consumir las diferentes GeoJson o capas	0%	8 hrs	1 día	mié 11/13/24	mié 11/13/24	114	Nuvu
116	Definir diseño, filtros.	0%	12 hrs	1.5 días	jue 11/14/24	vie 11/15/24	115	Nuvu3[5
117	Verificar la integridad de los datos extraídos y visualización.	0%	2 hrs	0.5 días	vie 11/15/24	vie 11/15/24	116	Nuvu[50
118	**Carga en RedShift**	**0%**	**29 hrs**	**5 días**	**lun 11/11/24**	**vie 11/15/24**	**101**	

Project: Project1 - sdh
Date: vie 10/18/24




Id	Task Name	% completa	Trabajo	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nombres de los recursos
119	Crear un Glue Job	0%	4 hrs	0.5 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24		Nuvu3
120	Asignar los permisos necesarios para acceder a S3.	0%	2 hrs	1 día	lun 11/11/24	mar 11/12/24	119	Nuvu2
121	Instalar las bibliotecas necesarias para la disponibilización en RedShift	0%	2 hrs	0.25 días	mar 11/12/24	mar 11/12/24	120	Nuvu2
122	Implementar el código que haga lo siguiente:*Obtener los datos del s3 "sdhtprodgeoreferencing" formato .parquet *Generar la estructura de datos que se va a llevar a Redshift (variables, tipos de datos)*Cargar las información en RedShift	0%	16 hrs	2 días	mié 11/13/24	jue 11/14/24	121	Nuvu2
123	Confirmar que los archivos están esten cargados en sdhtprod.catastroserviciospúblicos	0%	2 hrs	0.25 días	vie 11/15/24	vie 11/15/24	112	Nuvu2
124	Verificar la integridad de los datos extraídos.	0%	3 hrs	0.38 días	vie 11/15/24	vie 11/15/24	123	Nuvu2
125	**Power BI**	**0%**	**32 hrs**	**5 días**	**lun 11/11/24**	**vie 11/15/24**	**113**	
126	**Desarrollo de PowerBi**	**0%**	**16 hrs**	**2 días**	**lun 11/11/24**	**mar 11/12/24**		
127	Migrar los dashboards existentes	0%	8 hrs	1 día	lun 11/11/24	lun 11/11/24		Nuvu
128	Integrar el servicio de RedShift con PowerBi para que haga las actualización de forma automática	0%	8 hrs	1 día	mar 11/12/24	mar 11/12/24	127	Nuvu
129	**Validación en PowerBi**	**0%**	**16 hrs**	**1 día**	**mié 11/13/24**	**mié 11/13/24**		
130	Verificar la integridad de los datos extraídos y visualización.	0%	16 hrs	1 día	mié 11/13/24	mié 11/13/24	128	SRP,Nuvu
131	**Disponibilización en plataforma Houndoc**	**0%**	**40 hrs**	**5 días**	**lun 11/18/24**	**vie 11/22/24**	**125**	
132	**Publicación de Dashboards en la Plataforma Web**	**0%**	**24 hrs**	**3 días**	**lun 11/18/24**	**mié 11/20/24**		
133	Creación de menú padre para catastro servicios públicos	0%	16 hrs	2 días	lun 11/18/24	mar 11/19/24		Nuvu3
134	Creación de menú hijo para cada servicio público	0%	8 hrs	1 día	mié 11/20/24	mié 11/20/24	133	Nuvu
135	**Publicación de Mapas en la Plataforma Web**	**0%**	**16 hrs**	**2 días**	**lun 11/18/24**	**mar 11/19/24**		

Project: Project1 - sdh
Date: vie 10/18/24

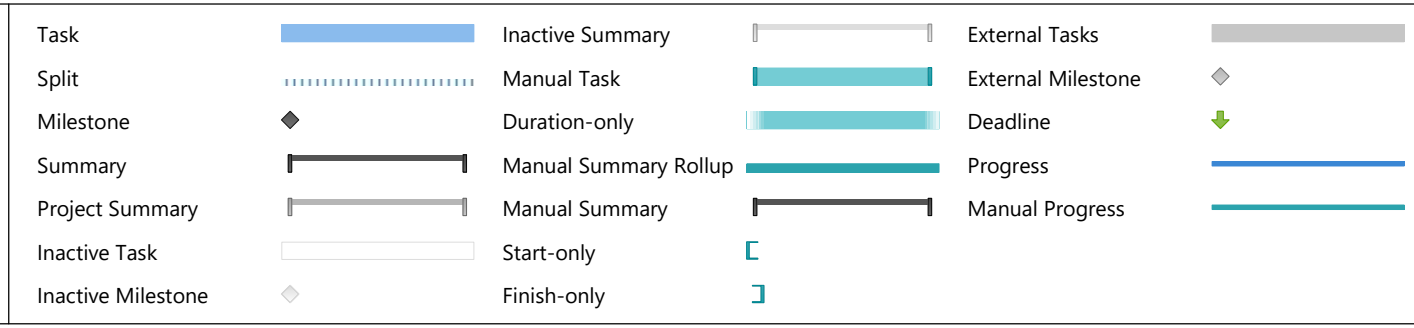

Id	Task Name	% completa	Trabajo	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nombres de los recursos
136	Crear cátalogo de mapa	0%	8 hrs	1 día	lun 11/18/24	lun 11/18/24		Nuvu
137	Refrenciar el cátalogo de mapa al archivo GeoJson de S3	0%	8 hrs	1 día	mar 11/19/24	mar 11/19/24	136	Nuvu
138	**Documentación**	**0%**	**166.5 hrs**	**31 días**	**vie 10/18/24**	**vie 11/29/24**		
139	**Entregable 1: Documento "Plan de Trabajo y Gestión del Proyecto"**	**0%**	**22.5 hrs**	**3 días**	**vie 10/18/24**	**mar 10/22/24**		
140	Cronograma con detalle de la implementación (actividades, tiempos, recursos)	0%	2 hrs	0.25 días	vie 10/18/24	vie 10/18/24		Nuvu3
141	Plan de Comunicaciones	0%	1 hr	0.13 días	vie 10/18/24	vie 10/18/24	140	Nuvu3
142	Equipo de proyecto por roles.	0%	2 hrs	0.25 días	vie 10/18/24	vie 10/18/24	141	Nuvu3
143	Matriz de Riesgos	0%	1.5 hrs	0.25 días	vie 10/18/24	vie 10/18/24	142	Nuvu3
144	Un Backlog de Producto por cada componente de la implementación (1. Arquitectura de Analítica y 2. Plataforma Web, 3. Desarrollo del Caso de Uso Catastro de Redes.)	0%	8 hrs	1 día	vie 10/18/24	lun 10/21/24	143	Nuvu3
145	Un Backlog de Sprints para la implementación de cada uno de los componentes (1. Arquitectura de Analítica y 2. Plataforma Web, 3. Desarrollo del Caso de Uso Catastro de Redes)	0%	8 hrs	1 día	lun 10/21/24	mar 10/22/24	144	Nuvu3
146	**Entregable 2: "Documento de Arquitectura de Software para la Plataforma Web SIM Hábitat con el Casode Uso de Catastro de Redes**	**0%**	**66 hrs**	**28 días**	**mié 10/23/24**	**vie 11/29/24**	**139**	
147	Introducción: Propósito, Alcance, Definiciones, Siglas y Abreviaturas, Referencias, Contexto.	0%	4 hrs	0.5 días	mié 10/23/24	mié 10/23/24		Nuvu3
148	Representación de la Arquitectura: Detalle de la arquitectura utilizando las vistas definidas en el modelo "4+1" [KRU41].	0%	2 hrs	0.25 días	mié 10/23/24	mié 10/23/24	147	Nuvu3

Project: Project1 - sdh
Date: vie 10/18/24



Id	Task Name	% completa	Trabajo	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nombres de los recursos
149	Requerimientos Funcionales y No Funcionales, Restricciones de Arquitectura: Seguridad, Persistencia, Confiabilidad/Disponibilidad, Rendimiento, Escalabilidad.	0%	8 hrs	1 día	jue 10/31/24	jue 10/31/24	148	Nuvu3
150	Vista del Caso de Uso: Actores, Listado de Casos de Uso, Diagramas, Diagramas de Secuencia para la Ejecución de los Casos de Uso.	0%	4 hrs	0.5 días	vie 11/1/24	vie 11/1/24	149	Nuvu
151	Vista Lógica: Descripción de Componentes Lógicos.	0%	4 hrs	0.5 días	mié 11/6/24	jue 11/7/24	150	Nuvu
152	Vista de Procesos: Descripción de Componentes.	0%	4 hrs	0.5 días	jue 11/7/24	jue 11/7/24	151	Nuvu
153	Vista de Descomposición de Módulos: Descripción de Componentes.	0%	4 hrs	0.5 días	jue 11/7/24	vie 11/8/24	152	Nuvu3
154	Vista de Datos: Descripción de Componentes.	0%	4 hrs	0.5 días	vie 11/8/24	vie 11/8/24	153	Nuvu
155	Vista de Despliegue: Descripción de Componentes.	0%	4 hrs	0.5 días	vie 11/8/24	lun 11/11/24	154	Nuvu2
156	Tamaño y Rendimiento: Descripción de Volúmenes, Tamaños, Usuarios Concurrentes, Transacciones por Segundo (tps) soportados por cada uno de los Componentes de la Solución.	0%	4 hrs	0.5 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24	155	Nuvu2
157	Informe con el Detalle de la Ejecución de Pruebas Funcionales y No Funcionales.	0%	8 hrs	1 día	jue 11/21/24	vie 11/22/24	156	Nuvu
158	Recomendaciones y Restricciones.	0%	16 hrs	1.75 días	jue 11/28/24	vie 11/29/24	157	SRP,Nuvu
159	**Entregable 3: "Documento de despliegue y desarrollo del Caso de Uso Catastro de Redes**	**0%**	**78 hrs**	**6.25 días**	**mié 11/20/24**	**jue 11/28/24**	**139**	
160	El contratista deberá elaborar y entregar un documento que contenga el detalle del desarrollo del caso de uso de Catastro de Redes,	0%	8 hrs	1 día	mar 11/19/24	mié 11/20/24		SRP,Nuvu
161	Evidencia (pantallazos, scripting o reporte): del correcto despliegue, configuración, implementación, parametrización o uso de cada componente del desarrollo de los casos de uso priorizados.	0%	4 hrs	0.25 días	mié 11/20/24	mié 11/20/24	160	SRP,Nuvu

Project: Project1 - sdh
Date: vie 10/18/24

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			


Id	Task Name	% completa	Trabajo	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nombres de los recursos
162	Aprobación de cada Componente: aprobación de cada componente de la plataforma web por parte del equipo de la SDHT de acuerdo con los criterios de aceptación definidos en el desarrollo del caso de uso.	0%	4 hrs	0.25 días	mié 11/20/24	mié 11/20/24	161	SRP,Nuvu
163	Manual de usuario y técnico de la Plataforma Web SIM Hábitat: Descripción de usabilidad para el acceso de usuarios a la plataforma, descripción de módulos y componentes implementados en la plataforma relacionados con Catastro de Redes, anexo con las acta	0%	16 hrs	1 día	jue 11/21/24	jue 11/21/24	162	SRP,Nuvu
164	Evidencia de integración de hasta 5 Fuentes de Información (1 punto de conexión física, datos geográficos, alfanuméricas, estructurados y semiestructurados).	0%	8 hrs	0.5 días	vie 11/22/24	vie 11/22/24	163	SRP,Nuvu
165	Cuatro (4) tableros personalizados para el caso de uso, con máximo 2 hojas de visualización por cada tablero.	0%	16 hrs	1 día	vie 11/22/24	lun 11/25/24	164	SRP,Nuvu
166	Desarrollo de hasta 15 indicadores (KPI's) por el caso de uso de Catastro de Redes.	0%	8 hrs	1 día	lun 11/25/24	mar 11/26/24	165	Nuvu3
167	Implementación de Mapa geográfico con hasta 7 indicadores (KPI's)	0%	8 hrs	1 día	mar 11/26/24	mié 11/27/24	166	Nuvu3
168	Evidencia del consumo de datos vía API o JDBC.	0%	2 hrs	0.25 días	mié 11/27/24	mié 11/27/24	167	Nuvu3
169	Evidencia (pantallazos, scripting o reporte) del correcto despliegue, configuración, implementación, parametrización o uso de cada componente de la plataforma web. Aprobación de cada componente de la plataforma web por parte del equipo de la SDHT de acu	0%	4 hrs	0.5 días	vie 11/29/24	vie 11/29/24	168	Nuvu3
170	**Capacitaciones**	**0%**	**15 hrs**	**4 días**	**mar 11/26/24**	**vie 11/29/24**		
171	Ingreso al servicio, descarga de archivos y almacenamiento de archivos	0%	3 hrs	0.38 días	lun 11/25/24	lun 11/25/24		Nuvu,SRI
172	Ingreso al servicio y cambio de credenciales para el SharePoint	0%	4 hrs	0.5 días	jue 11/21/24	mar 11/26/24		Nuvu,SRI
173	Uso de la plataforma	0%	5 hrs	0.63 días	vie 11/22/24	mié 11/27/24		Nuvu,SRI


Project: Project1 - sdh
Date: vie 10/18/24

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			

Id	Task Name	% completa	Trabajo	Duración	Comienzo	Fin	Predece	Nombres de los recursos
174	Conexión de PowerBi a RedShift	0%	3 hrs	0.38 días	mar 11/26/24	jue 11/28/24		Nuvu,SRI


Project: Project1 - sdh
Date: vie 10/18/24

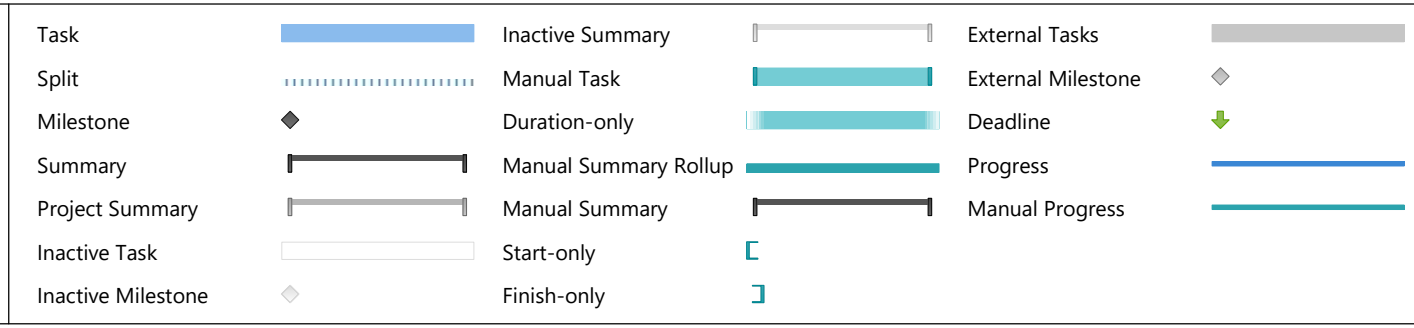

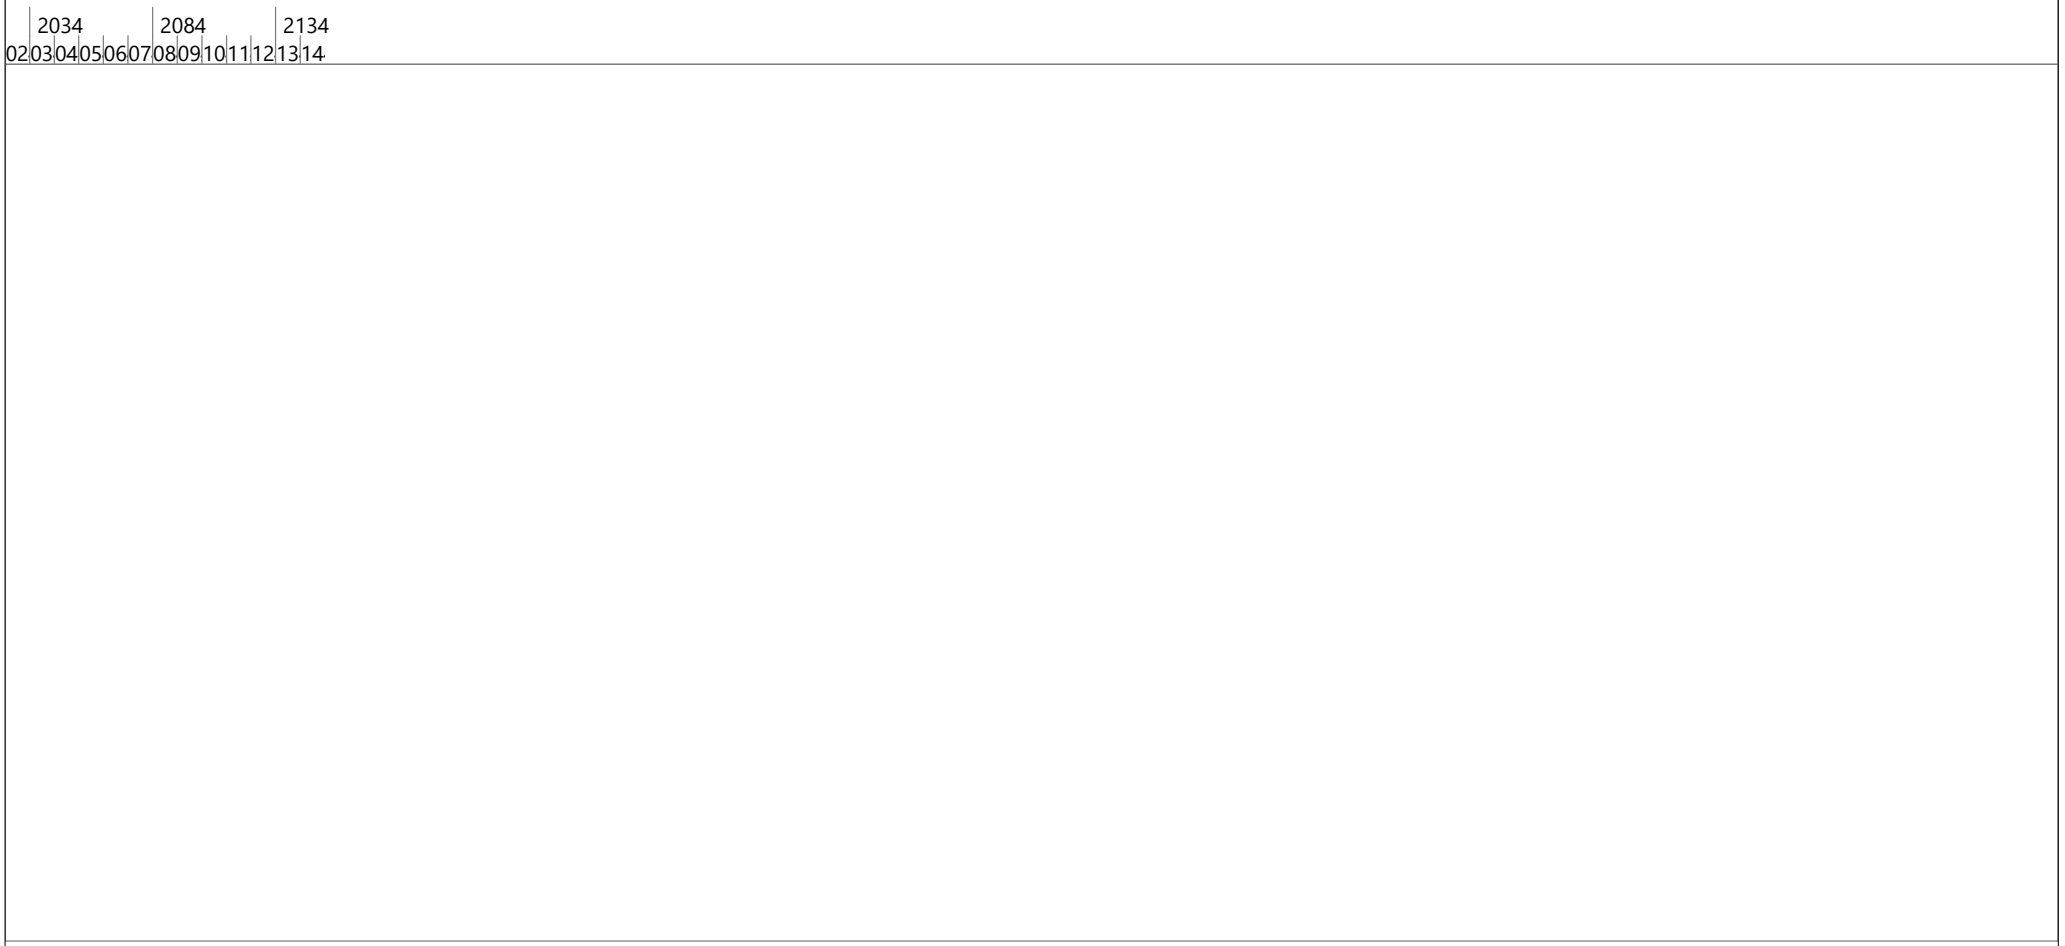


Project: Project1 - sdh
Date: vie 10/18/24

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			

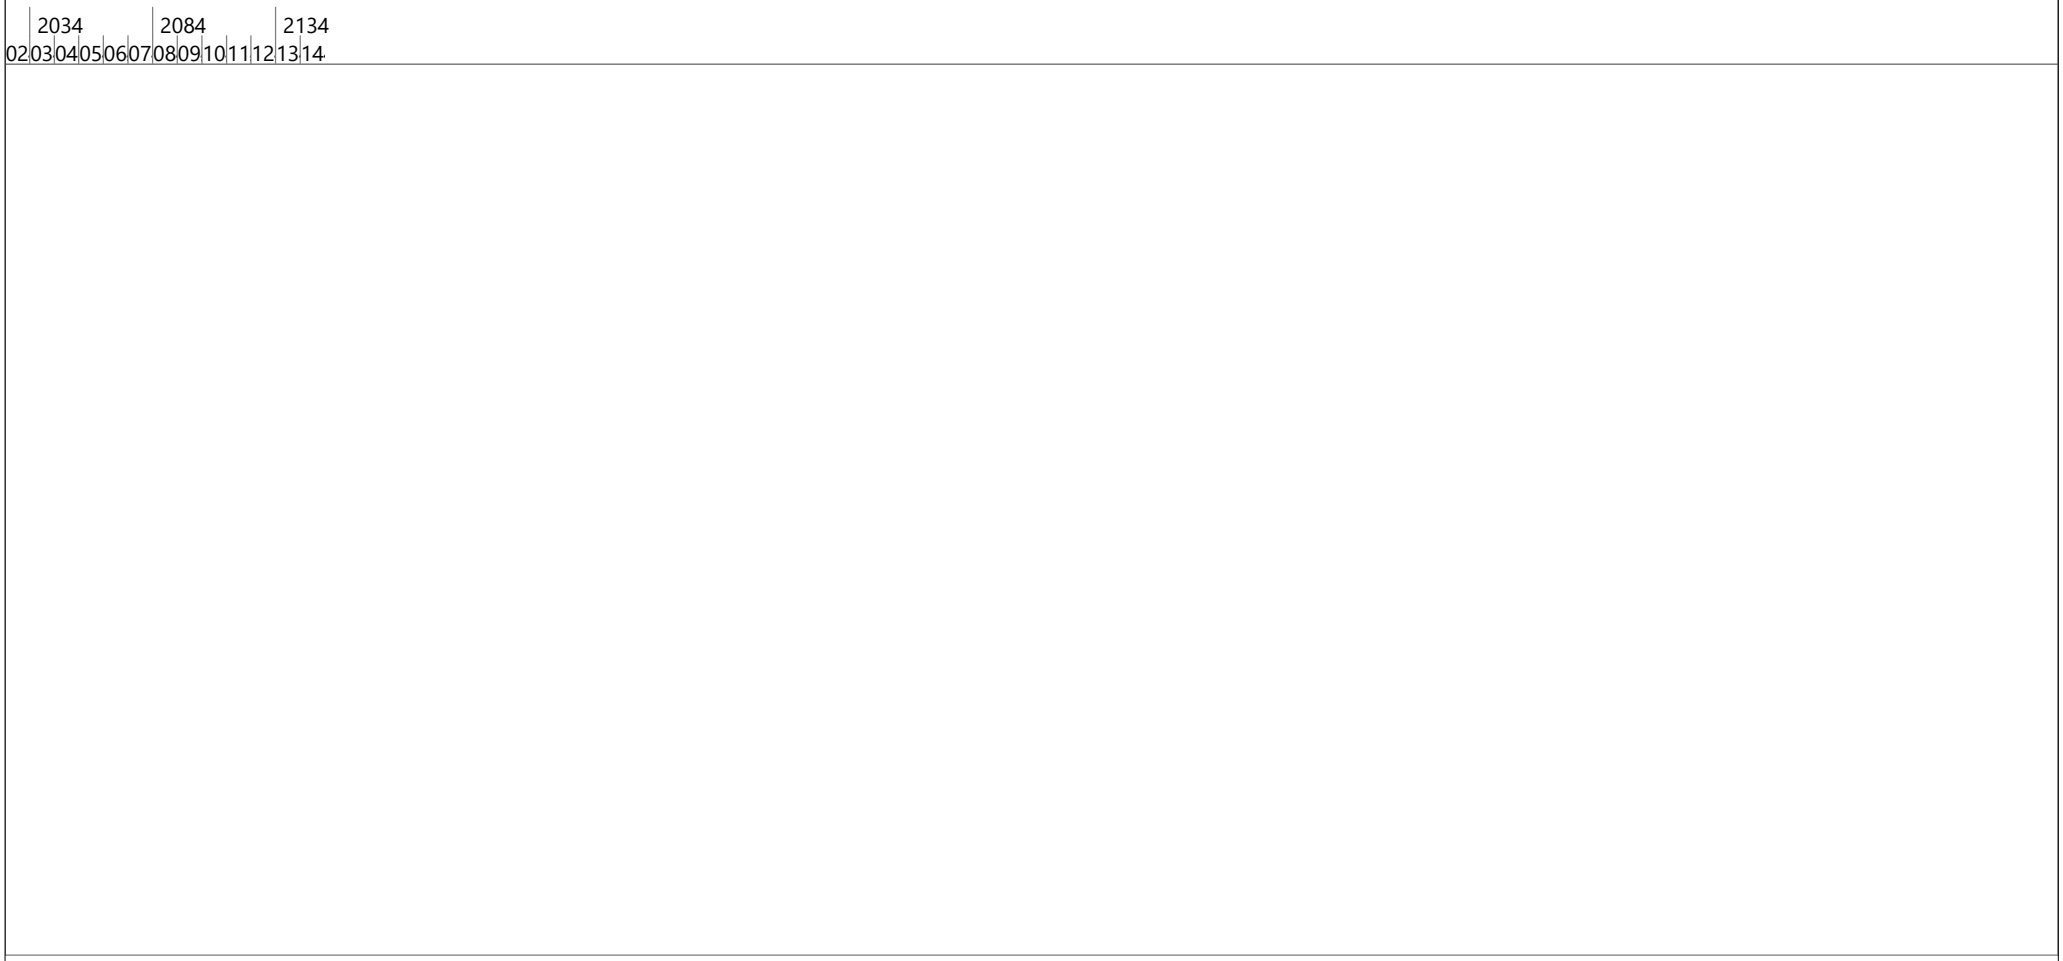


Project: Project1 - sdh
Date: vie 10/18/24

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			




Project: Project1 - sdh
Date: vie 10/18/24

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			

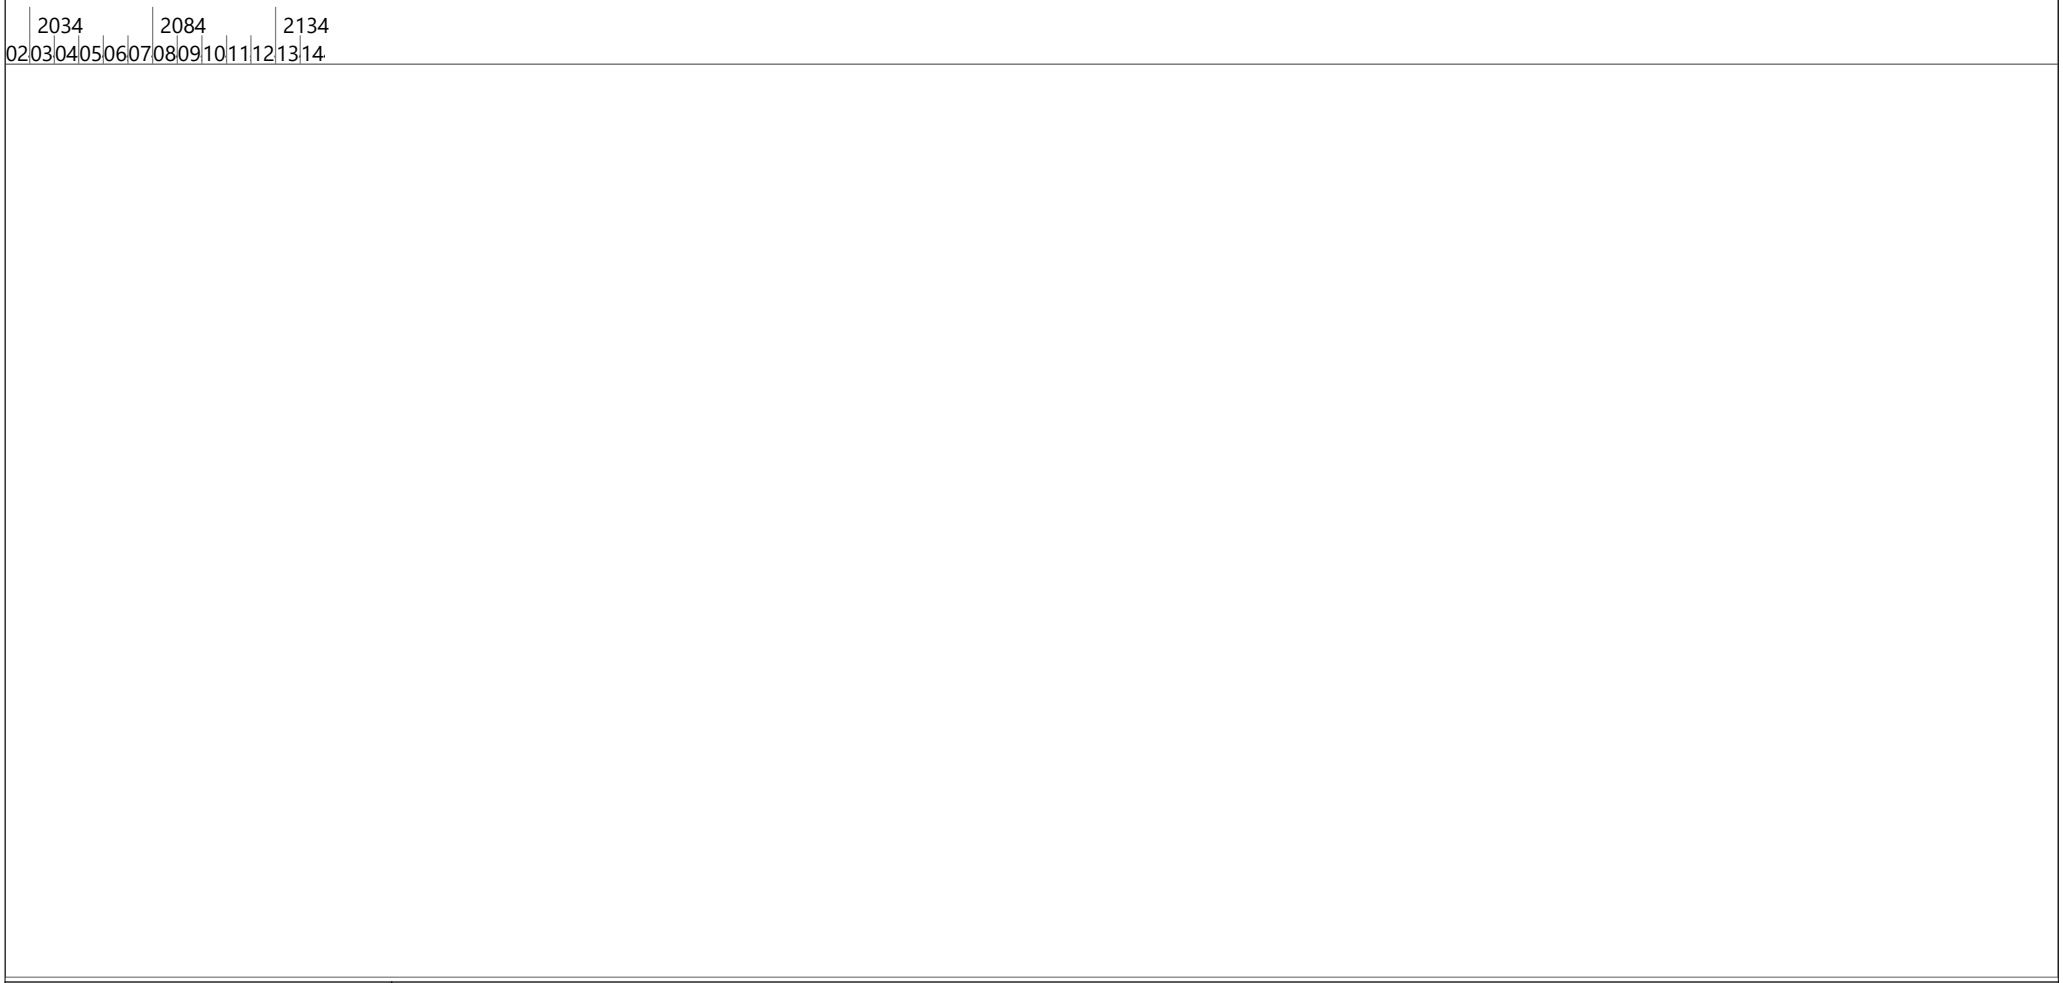


Project: Project1 - sdh
Date: vie 10/18/24

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			

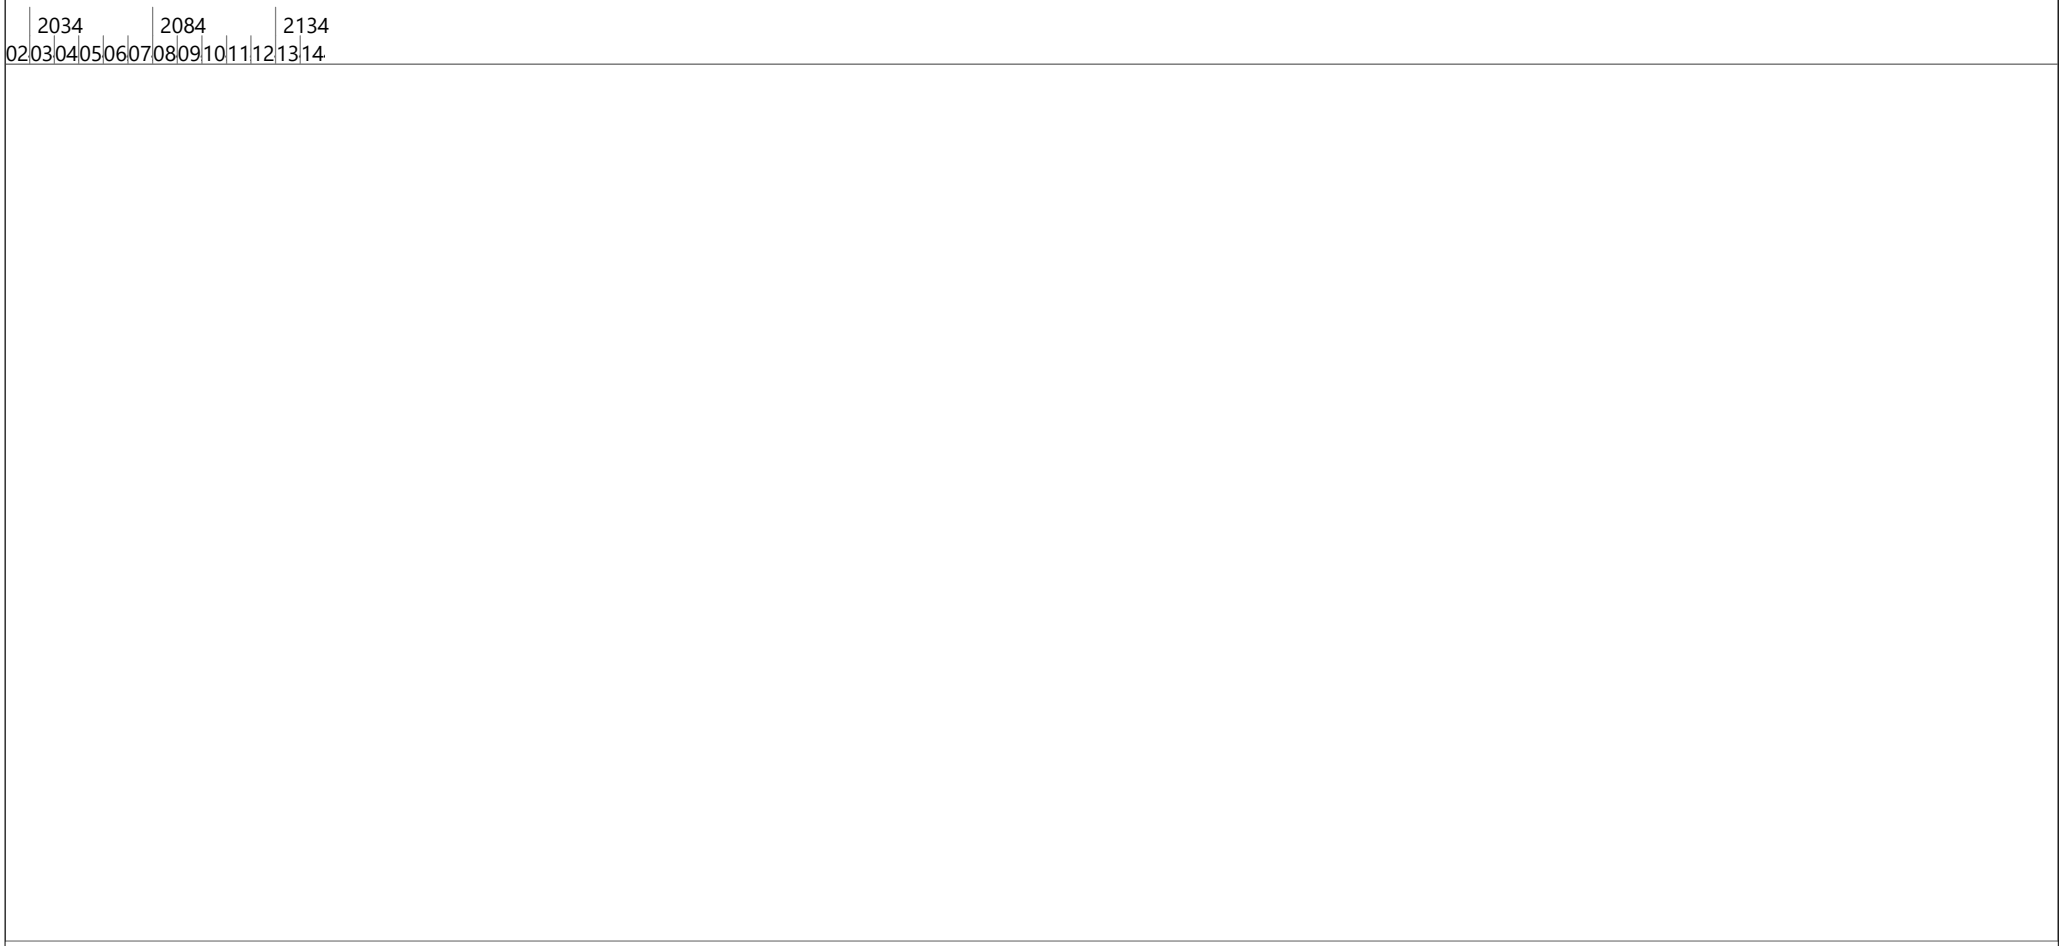


Project: Project1 - sdh
Date: vie 10/18/24

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			




Project: Project1 - sdh
Date: vie 10/18/24

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			

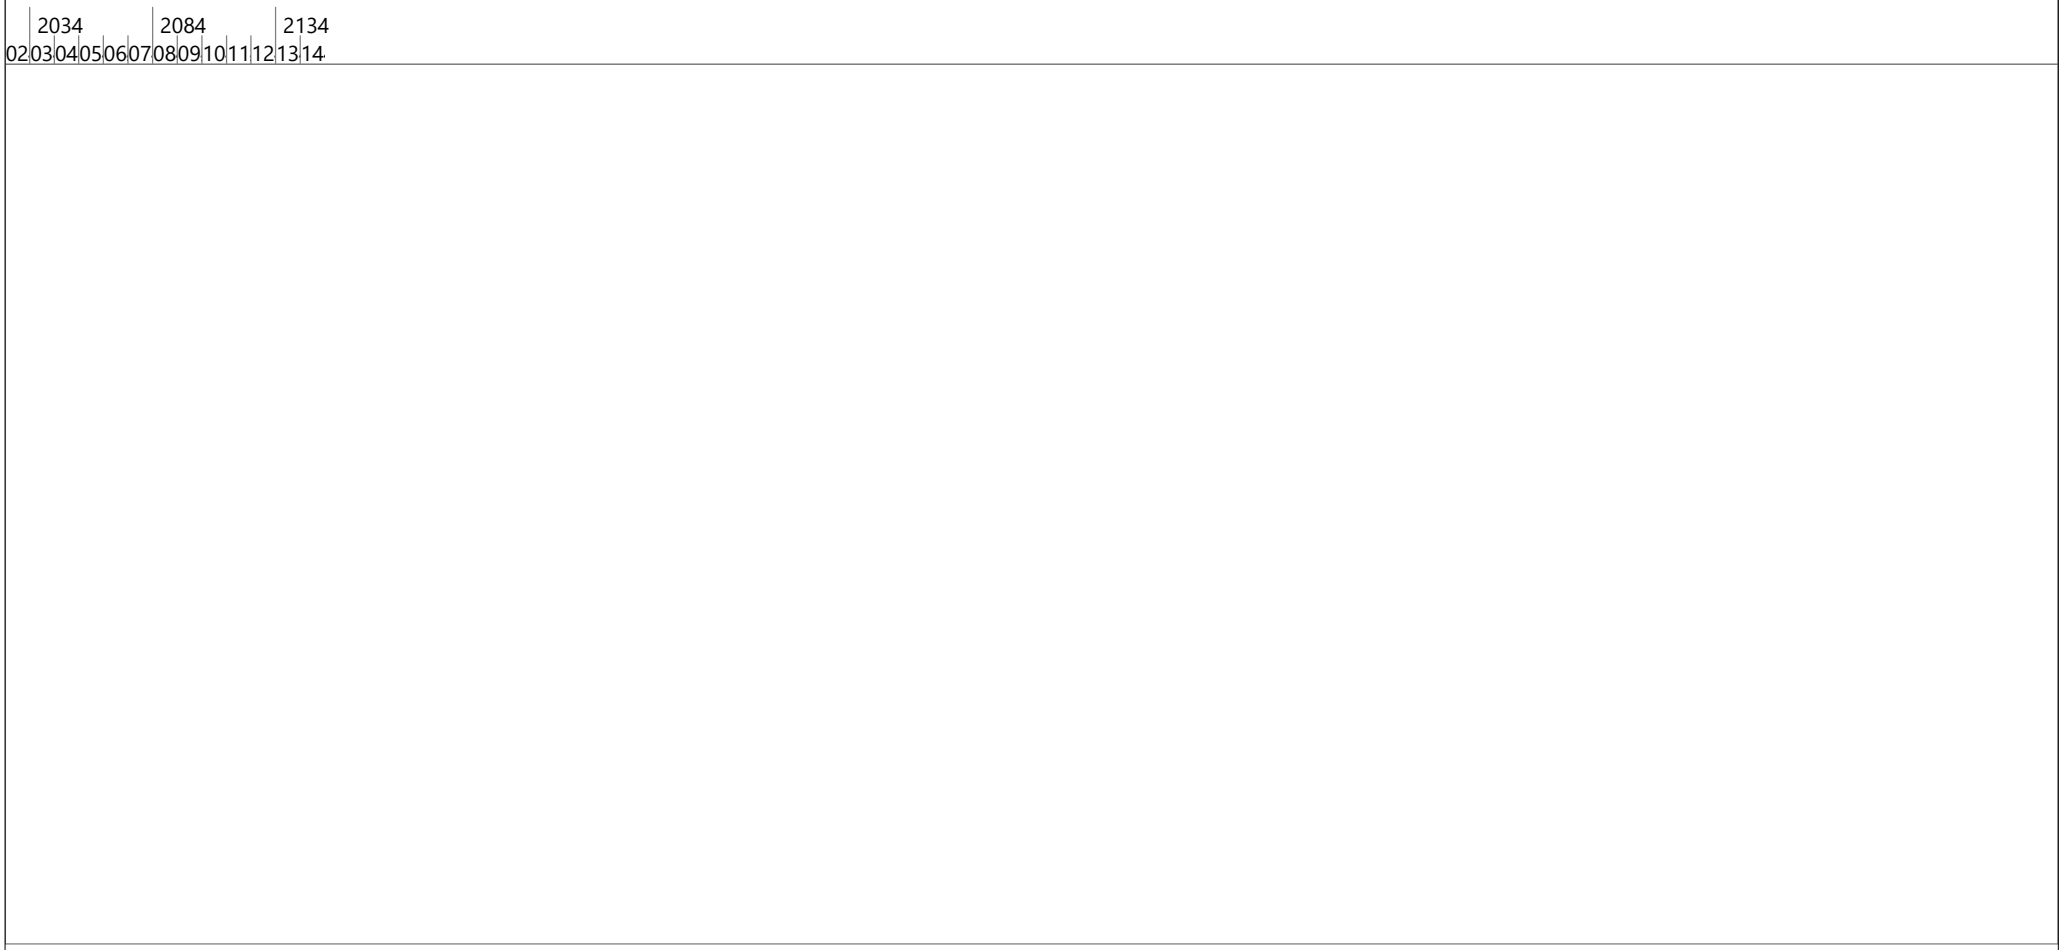


Project: Project1 - sdh
Date: vie 10/18/24

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			

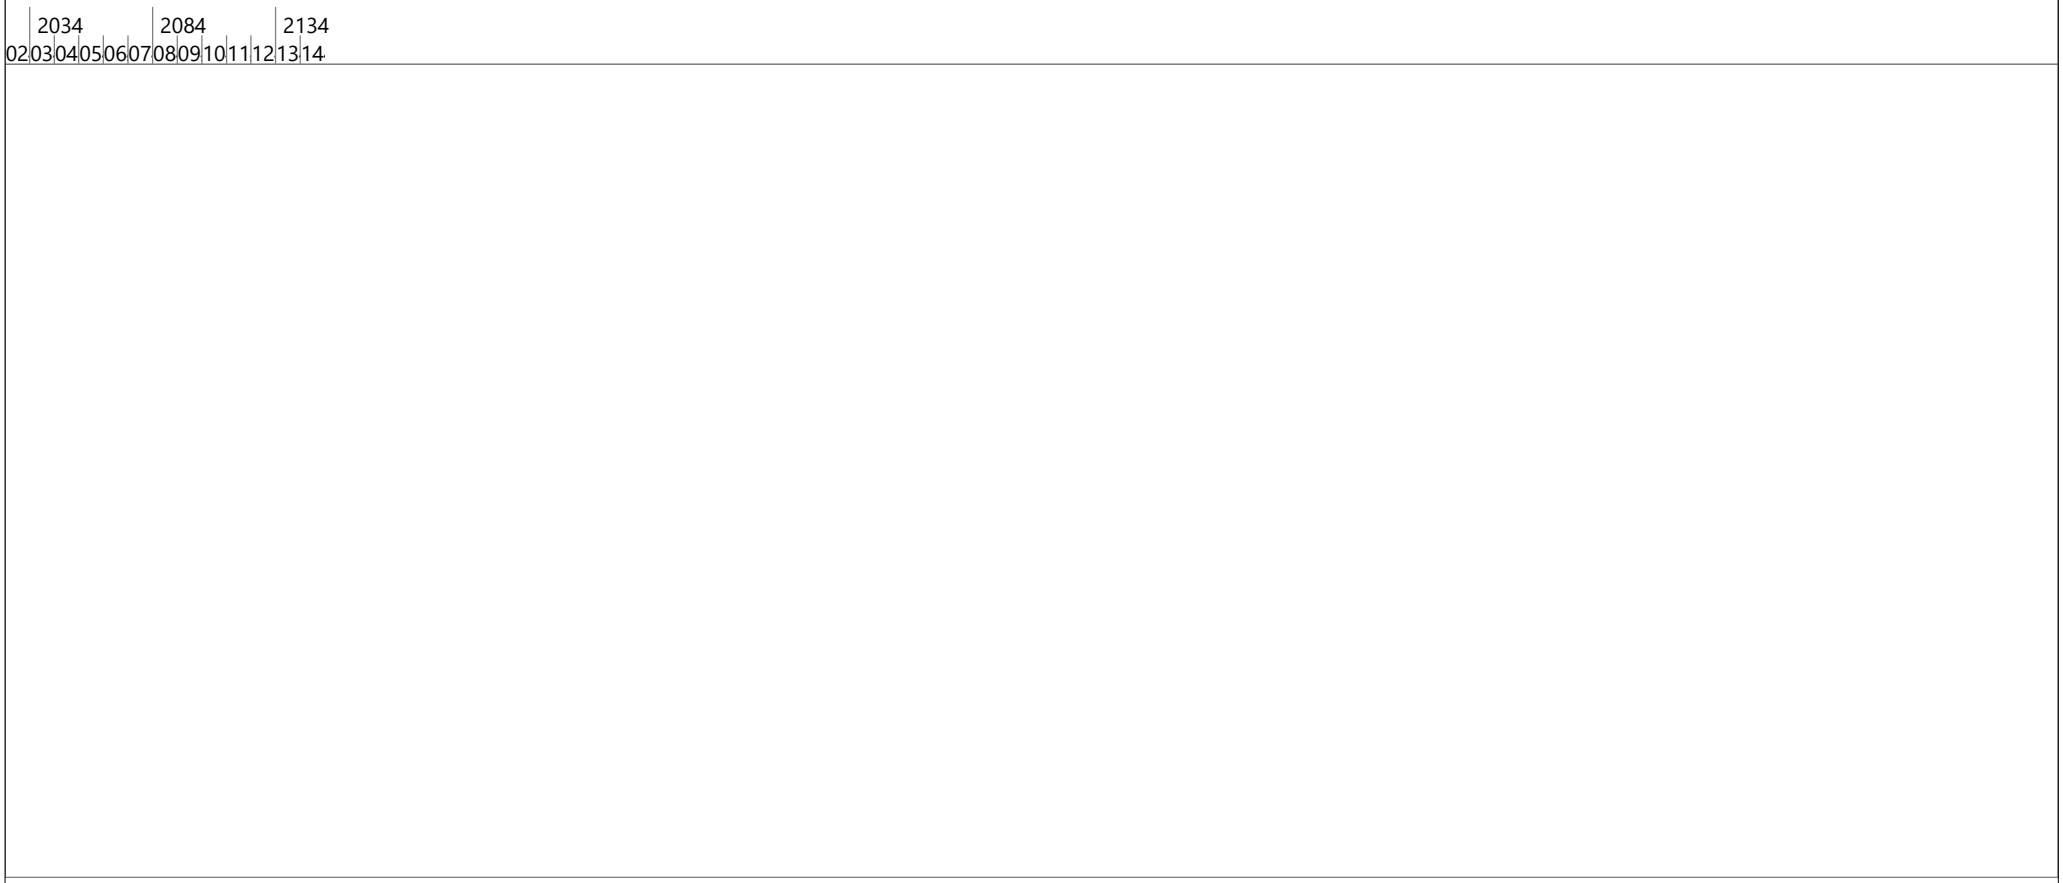


Project: Project1 - sdh
Date: vie 10/18/24

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			




Project: Project1 - sdh
Date: vie 10/18/24

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			

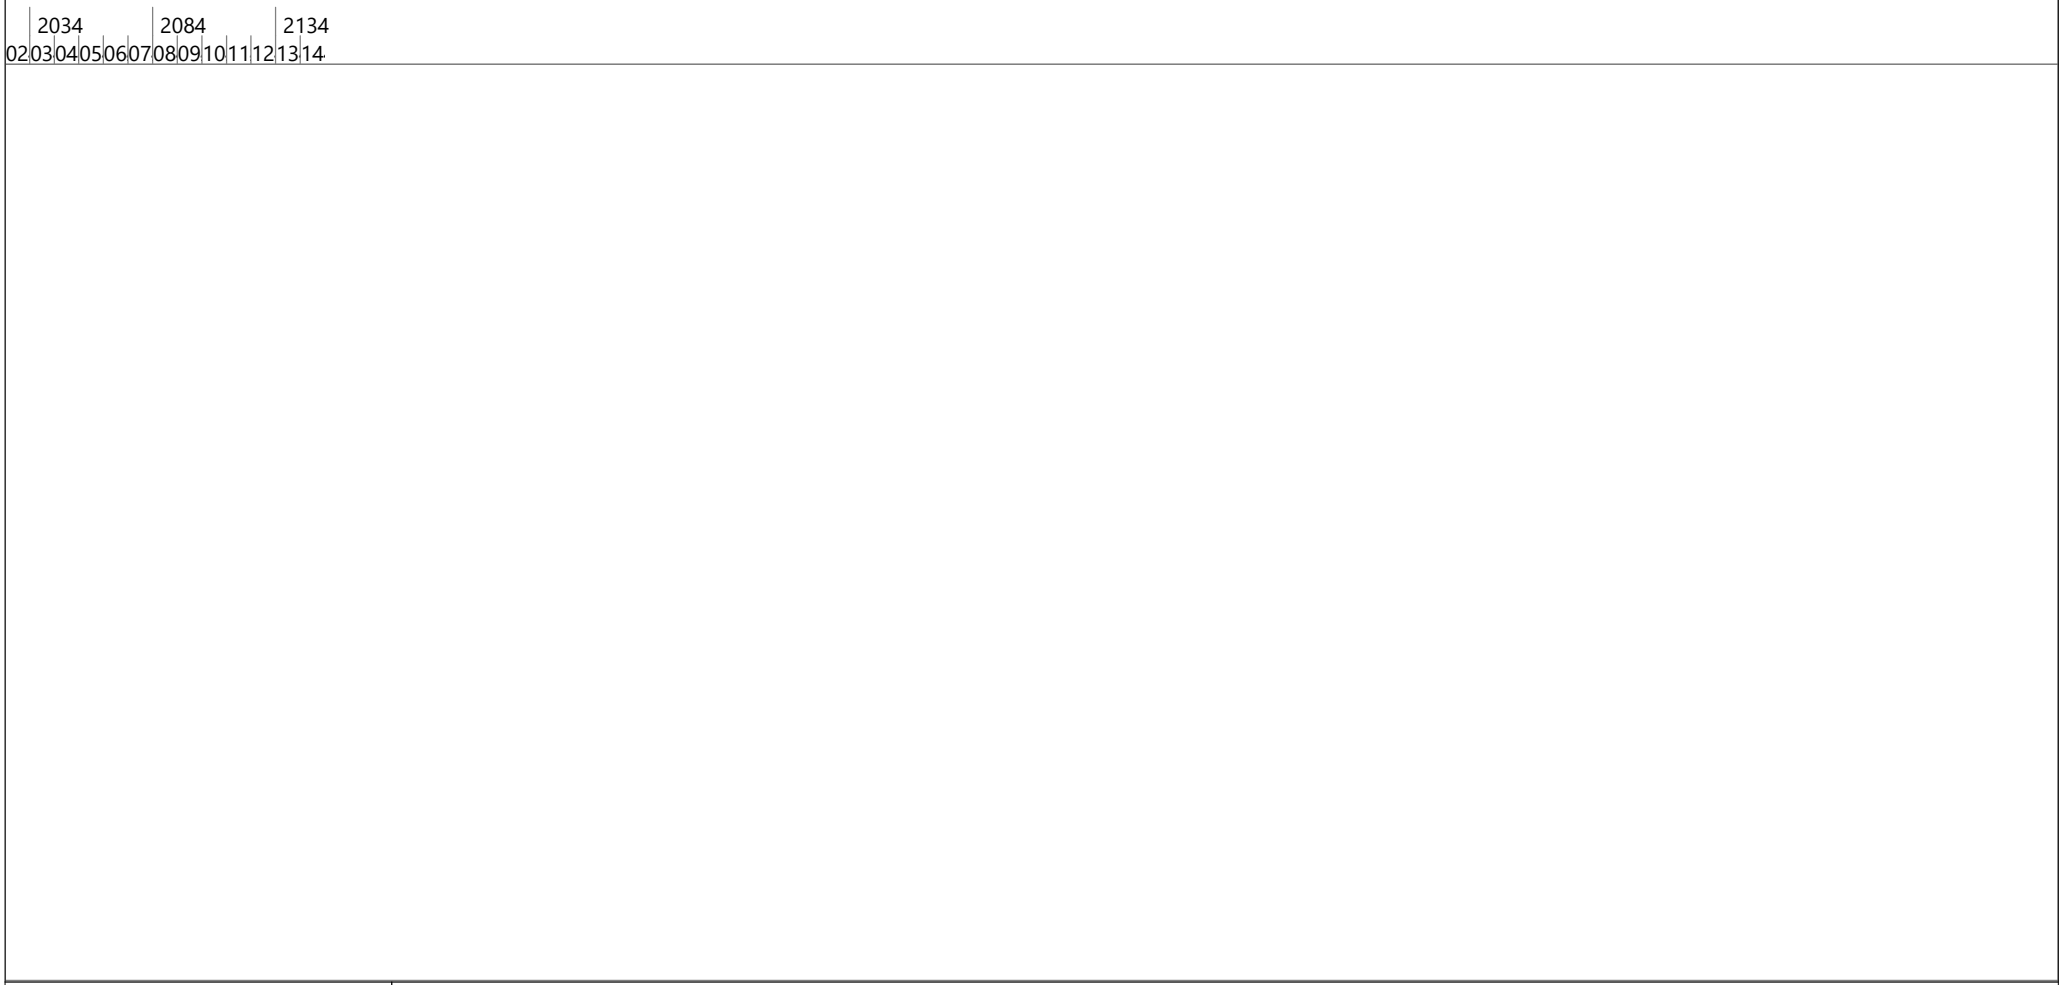

Project: Project1 - sdh
Date: vie 10/18/24

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			



Project: Project1 - sdh
Date: vie 10/18/24

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			
