Fecha	Nombre de la Reunión	Hora Inicio	Hora Fin
04/12/2024	[SIM] Sesión de seguimiento	09:00 am	10:00 am

URL Sesión:	Acta N°	Nombre de quien elabora:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWQzYmE5YTktZTY5Yi00ZTAzLWE4NWEtNWM2NjEzMWIzMGVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d239009e-8fbd-445b-9cb0-2b37507f6006%22%2c%22Oid%22%3a%22189e6896-0ca7-447b-89f8-b8d541e7a0e0%22%7d	8	Juan Bernal - Gerente de proyectos HIGH TECH SOFTWARE

1. Objetivo de la Reunión

Revisar los puntos que están afectando el avance del proyecto

2. Temas a Tratar


Seguimiento de Actividades: Monitorear actividades específicas del cronograma del proyecto.

3. Desarrollo

Con las entregas parciales realizadas por la entidad , se alcanza un avance de 47%, con este avance se define la ruta de entregable y presentaciones para llegar a los compromisos de entrega y facturación. Se revisa el avance en tres grupos de actividades para poder llevar un control más específico de acuerdo a los límites en los compromisos de entregas y facturación;

Task Name	% comp	Task Name	% comp	Task Name	% comp
Recolección de información	85%	STAGE Transformación a Parquete	50%	Documentación	57%
Fuentes	100%	STAGE Homologación de datos	66%	Entregable 1: Documento "Plan de Trabajo y Gestión del Proyecto"	100%
SharePoint	100%	STAGE Transformación de datos	52%	Entregable 2: "Documento de Arquitectura de Softw are para la Plataforma Web SIM Hábitat con el Casode Uso de Catastro de Redes	54%
Proceso de Homologación	75%	STAGE Geocodificación	0%	Entregable 3: "Documento de despliegue y desarrollo del Caso de Uso Catastro de Redes	42%
Proceso de Transformación de datos	82%	STAGE Georeferenciación	50%	Capacitaciones	0%
Procesos de Georreferenciación	0%	Maps Analytics Desarrollo del componente Maps Analytics	50%		
Definición de indicadores	86%	Carga en RedShift	50%		
Definición de plan de trabajo	100%	Power BI	60%		
Ingestión de datos	100%	Disponibilización en plataforma Houndoc	0%		

con esta nueva proyección de las actividades se ajusta el plan de trabajo se ajuste para contar con fechas reales de entrega que les permita a la entidad proyectar los hitos de facturación de los productos para el año en curso así como entregar el caso de uso para su aplicación desde el mes de diciembre como se proyectó al inicio del contrato.

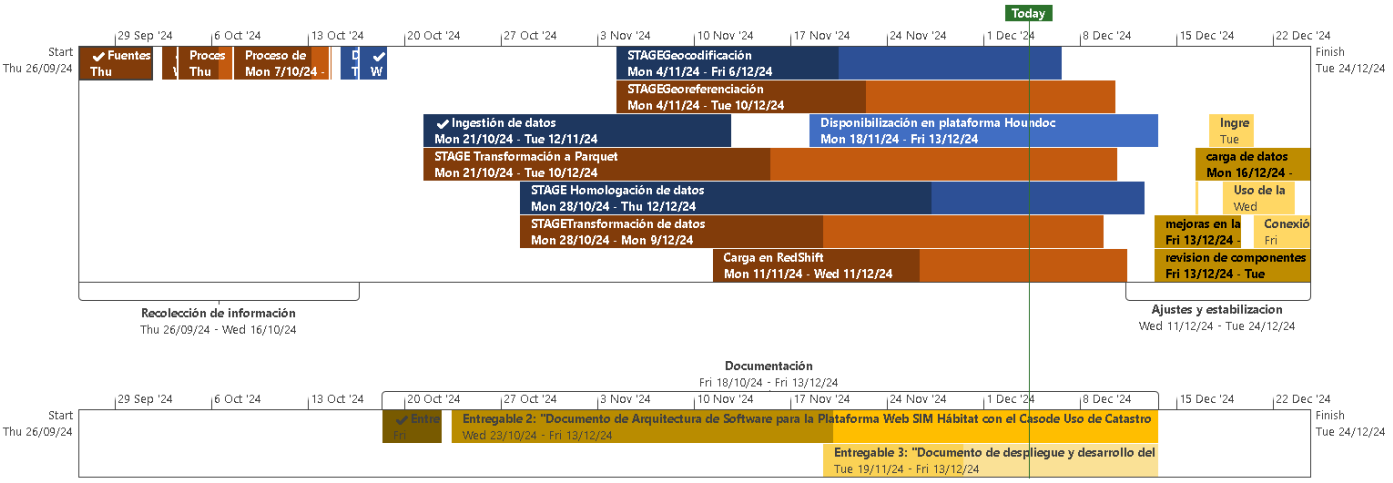

4. Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha
Facturación operación noviembre	Juan Bernal	05/12/2024
Para el caso de Acueducto el archivo Cliente gdb se encuentra en otro sistema de georeferenciación, para el entregable del dashboard consumo EAAB es necesario que sean coordenadas latitud norte	SDH	Pendiente
Entregar los archivos de Uaesp para los usuarios en extensiones comprendidas durante el proyecto (.txt, .csv, . xlsx, .gdb)	SDH	Pendiente
En la fuente Acueducto, en la carpeta de daños, el archivo GDB no se encuentra dentro de una carpeta aparte. Además, no incluye la estructura correspondiente al año. EJ: {cliente}/{fuente}/{año}/{mes}{(.csv/.txt)}	SDH	Pendiente
Para los archivos Delta de la carpeta usuarios por fuente, la estructura debe ser la siguiente: fuente/usuarios/delta/archivo.	SDH	Pendiente
En la fuente Enel, en la carpeta de proyectos 2023, se encuentran dos archivos con el mismo nombre (Proyectos Convenios).	SDH	Pendiente
Los archivos con extensión .dgb que se encuentran dentro de una carpeta encriptada deben ser descomprimidos y dejados en la carpeta sin comprimir (debe quedar la carpeta con los archivos correspondientes al GDB).	SDH	Pendiente

Disponibilizar la homologación de las fuentes de Enel, Acueducto y Uaesp	SDH	Pendiente

5. Asistentes			
Nombre	**Cargo**	**Firmas**	**Entidad**
Juan Camilo Bernal	Gerente de proyectos		HTS
Estefania Vergara	Líder de analitica	Estefania vergara	HTS
Jairo Salas	Líder de analitica		HTS
Leonardo Neira	Gerente de proyectos		SDHT

revisión:

_____

Supervisor 1 :

_____

Supervisor 2 :
