
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE MERCADO**	**76.09 días**	**16/05/25**	**30/07/25**
2		**ESTUDIOS PRELIMINARES**	**36 días**	**16/05/25**	**20/06/25**
3		Estudios Topográficos	6 días	16/05/25	21/05/25
4		Estudio de suelos	30 días	21/05/25	20/06/25
5		Levantamiento arquitectónico de lo actual	8 días	21/05/25	29/05/25
6		Presentación de 2 esquemas básicos para definir con cual alternativa se desarrollan los diseños definitivos y los estudios técnicos.	10 días	29/05/25	9/06/25
7		**DISEÑOS**	**51.25 días**	**6/06/25**	**28/07/25**
8		Diseño Arquitectónico de proyecto final, y detalles	25 días	6/06/25	3/07/25
9		Diseño Estructural	30 días	28/06/25	28/07/25
10		Diseño Hidrosanitarios	26 días	1/07/25	25/07/25
11		Diseños Eléctricos	26 días	2/07/25	27/07/25
12		Plan de Manejo Ambiental	24 días	3/07/25	25/07/25
13		Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos	24 días	3/07/25	25/07/25
14		**PRESUPUESTO**	**9.5 días**	**22/07/25**	**30/07/25**
15		Estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios, presupuesto, cronograma (incluye proceso constructivo y especificaciones técnicas)	9.5 días	22/07/25	30/07/25

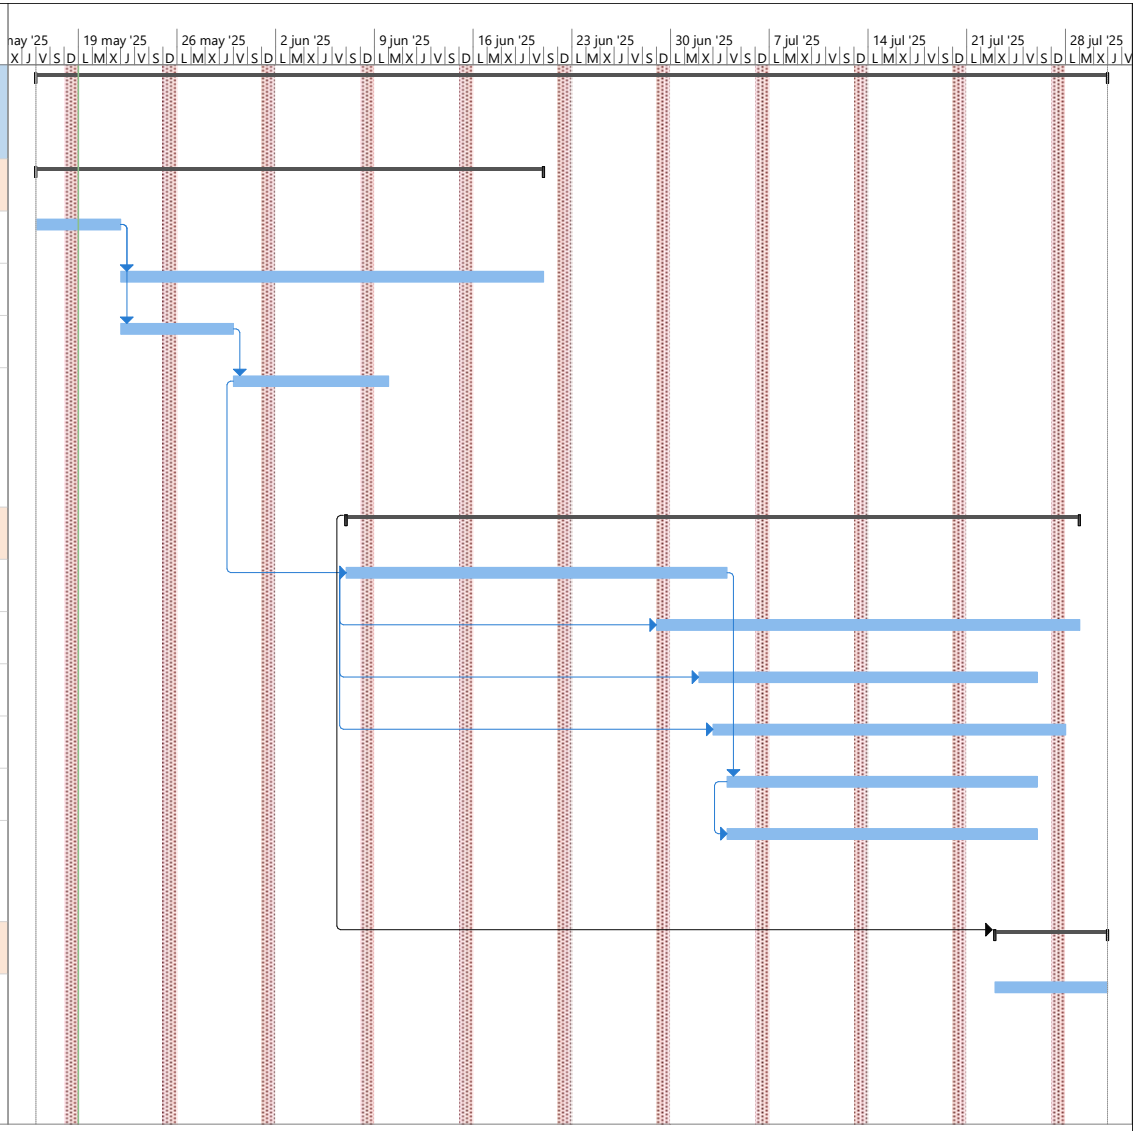

Proyecto: Programación
Fecha: 19/05/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual
