

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
1		**REMOTIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE APOYO A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA TORRE DE CONTROL DEL CACOM-1**	**108 días?**	**mié 9/04/25**	**vie 5/09/25**		
2		FIRMA DE CONTRA	1 día	mié 9/04/25	mié 9/04/25		
3		ACTA DE INICIO	1 día	mar 6/05/25	mar 6/05/25	2	
4		VISITA SITE SURVE\	2 días	jue 5/06/25	vie 6/06/25	3	
5		GENERACION ORDENES DE COMPRA	5 días	lun 9/06/25	vie 13/06/25	4	
6		TRANSPORTE A SITIO INSUMOS FABRICACIÓN NACIONAL	3 días	lun 16/06/25	mié 18/06/25	5	
7		ENTREGA E IMPORTACIÓN ISUMOS IMPORTADOS	10 días	lun 16/06/25	vie 27/06/25	5	
8		**REUBICACION RADIO ENLACE CONTROL REMOTO RADIO AYUDASDESMONT DE EQUIPOS EXISTENTES EN LA**	**16 días**	**lun 30/06/25**	**lun 21/07/25**		
9		REMOVER LOS EQUIPOS EXISTENTES, INCLUYENDO EL RADIOENLACE, RCSU	2 días	lun 30/06/25	mar 1/07/25	7;6	
10		EVALUAR EL ESTADO OPERATIVO DE CADA EQUIPO, DETERMINANDC SI ES	2 días	mié 2/07/25	jue 3/07/25	9	
11		EJECUTAR MANTENIMIENT CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN LOS EQUIPOS	2 días	vie 4/07/25	lun 7/07/25	10	
12		ACTUALIZAR EL HARDWARE, FIRMWARE Y SOFTWARE DE LOS EQUIPOS, SI APLICA,	1 día	mar 8/07/25	mar 8/07/25	11	
13		REALIZAR PRUEBAS DE OPERATIVIDAD PARA	1 día	mié 9/07/25	mié 9/07/25	12	
14		INSTALACIÓN LINEA DE TRANSMISIÓN	4 días	jue 10/07/25	mar 15/07/25	13	
15		INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DEL RADIOENLACE	1 día	mié 16/07/25	mié 16/07/25	14	
16		INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LA RCSU, RADIO	1 día	jue 17/07/25	jue 17/07/25	15	
17		INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LA RSU Y DEL CABLE DE COMUNICACIÓN CON LA RCSU	2 días	vie 18/07/25	lun 21/07/25	16	

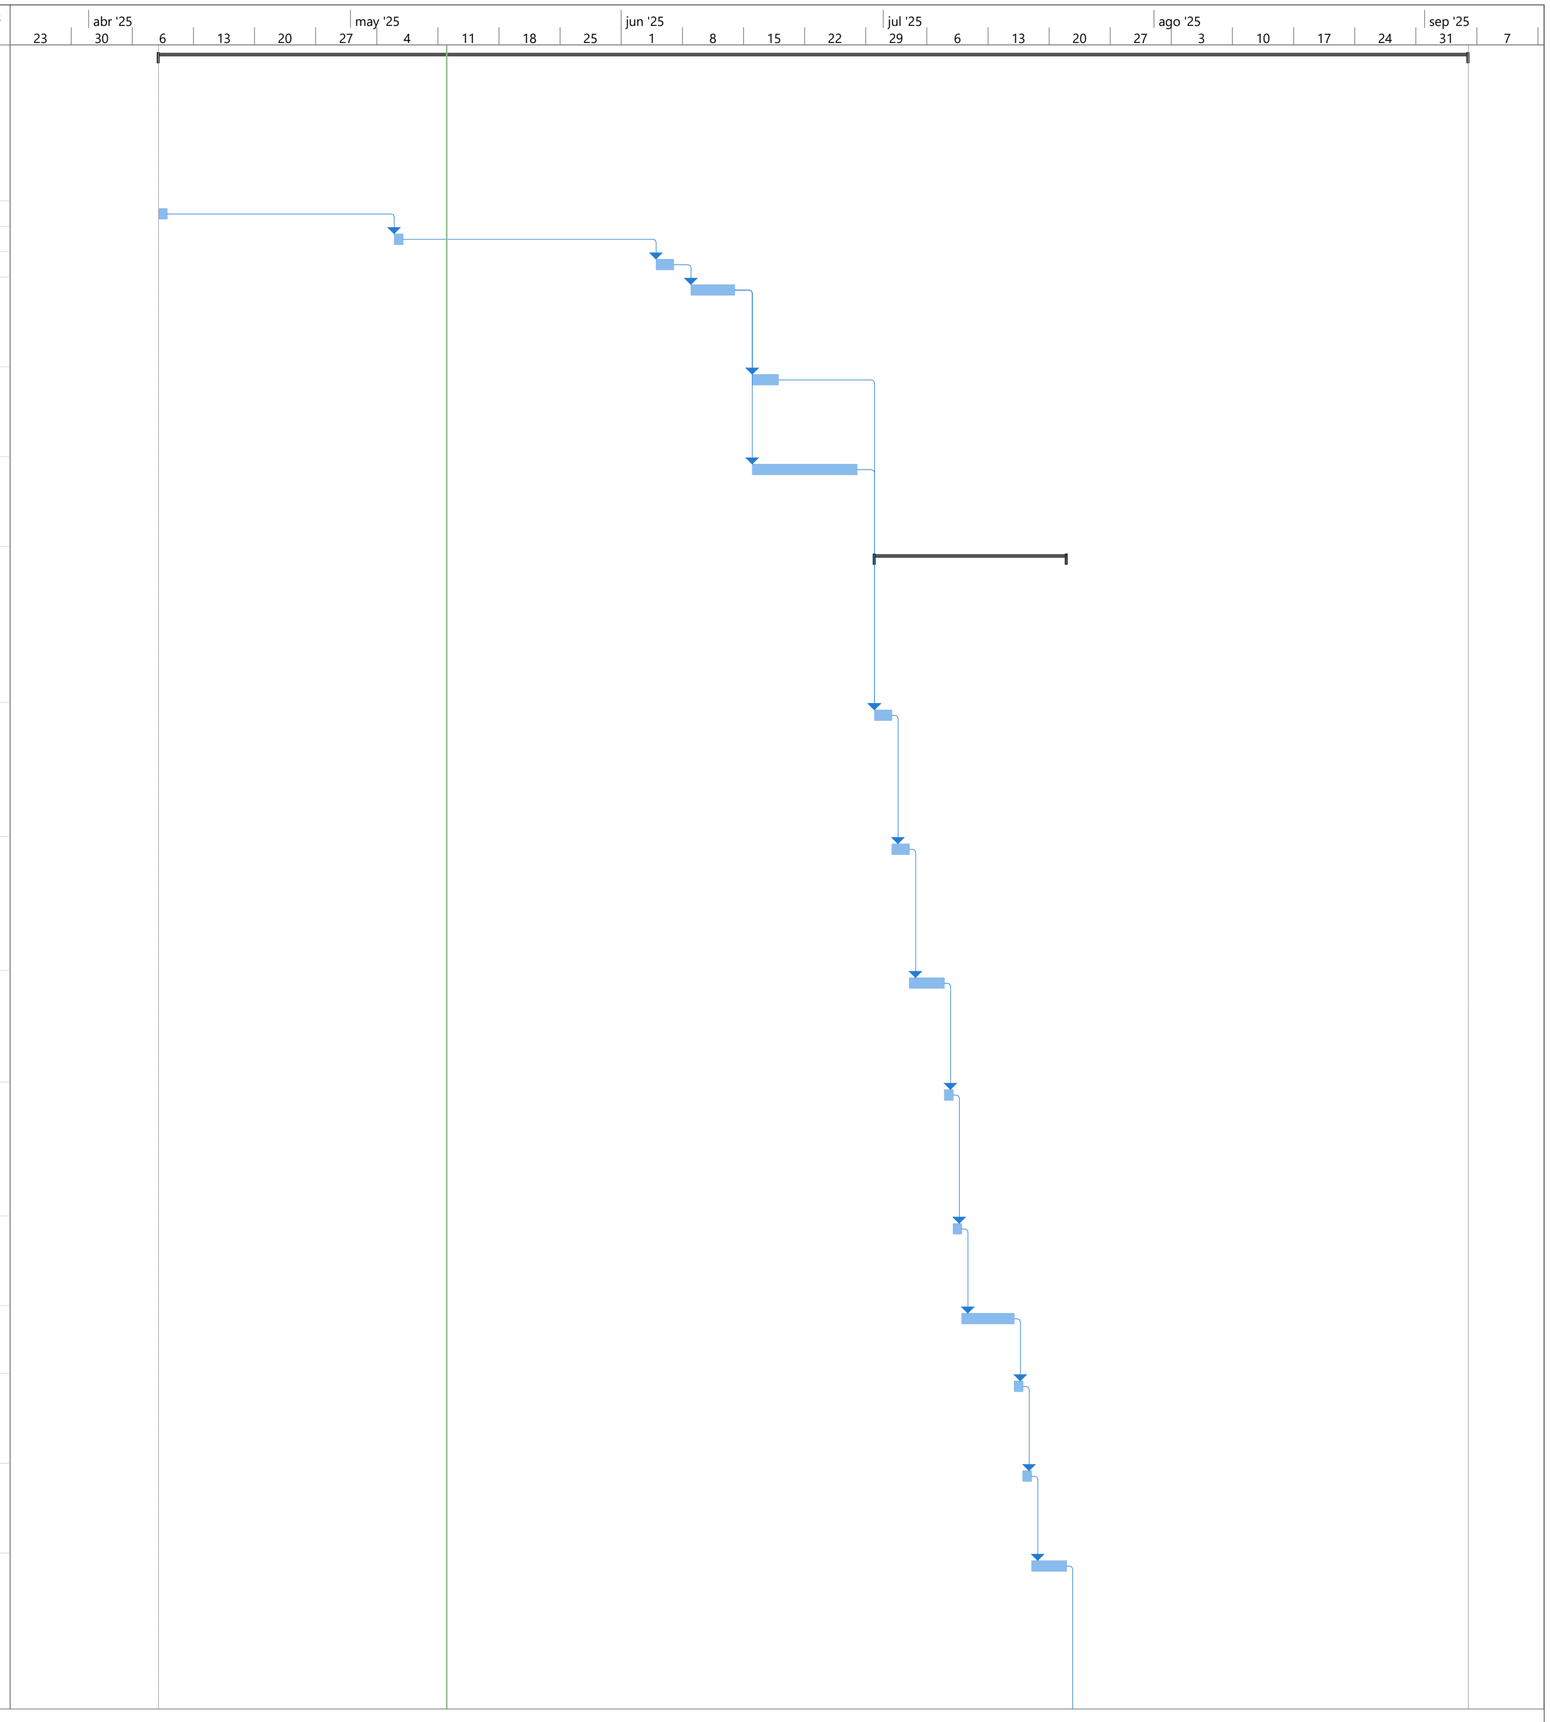

Proyecto: CRONOGRAMA TRAS
Fecha: lun 12/05/25

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	Progreso manual
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Progreso	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
18		**REUBICACIÓN RADIOENLACE DE CONTROL REMOTOBARRERA DE FRENADO**	**13 días**	**mar 22/07/25**	**jue 7/08/25**		
19		DESMONTAJE DE EQUIPOS EN LA ANTIGUA	3 días	mar 22/07/25	jue 24/07/25	17	
20		SUMINISTRO DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN PARA LA CONEXIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL REMOTO	3 días	vie 25/07/25	mar 29/07/25	19	
21		NSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DEL RADIOENLACE	2 días	mié 30/07/25	jue 31/07/25	20	
22		INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DEL CONTROL REMOTO BARRERAS DE FRENADO	5 días	vie 1/08/25	jue 7/08/25	21	
23		**REUBICACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACION DE METEOROLOGIA Y WORKSTATION PARA LA VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN**	**14 días**	**vie 8/08/25**	**mié 27/08/25**		
24		REMOVER EL RADIOENLACE, RACK AVIMET Y EQUIPOS ASOCIADOS, VERIFICANDO LA CONDICIÓN ACTUAL DE LOS EQUIPOS ASÍ COMO SU INTERCONEXIÓN	6 días	vie 8/08/25	vie 15/08/25	22	
25		INSTALACIÓN LINEA DE	3 días	lun 18/08/25	mié 20/08/25	24	
26		INSTALACIÓN EQUIPOS	5 días	jue 21/08/25	mié 27/08/25	25	
27		**REMOTIZACIÓN CONTROL REMOTO PLC**	**7 días?**	**jue 28/08/25**	**vie 5/09/25**		
28		DESMONTAJE DE LA PANTALLA DE CONTROL REMOTO DE LUCES DE PISTA Y EQUIPOS ANEXOS DE LA ANTIGUA	2 días	jue 28/08/25	vie 29/08/25	26	
29		INSTALACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO PANTALLA DE CONTROL REMOTO DE LUCES DE PISTA Y EQUIPOS ANEXOS EN LA NUEVA TORRE	1 día	lun 1/09/25	lun 1/09/25	28	

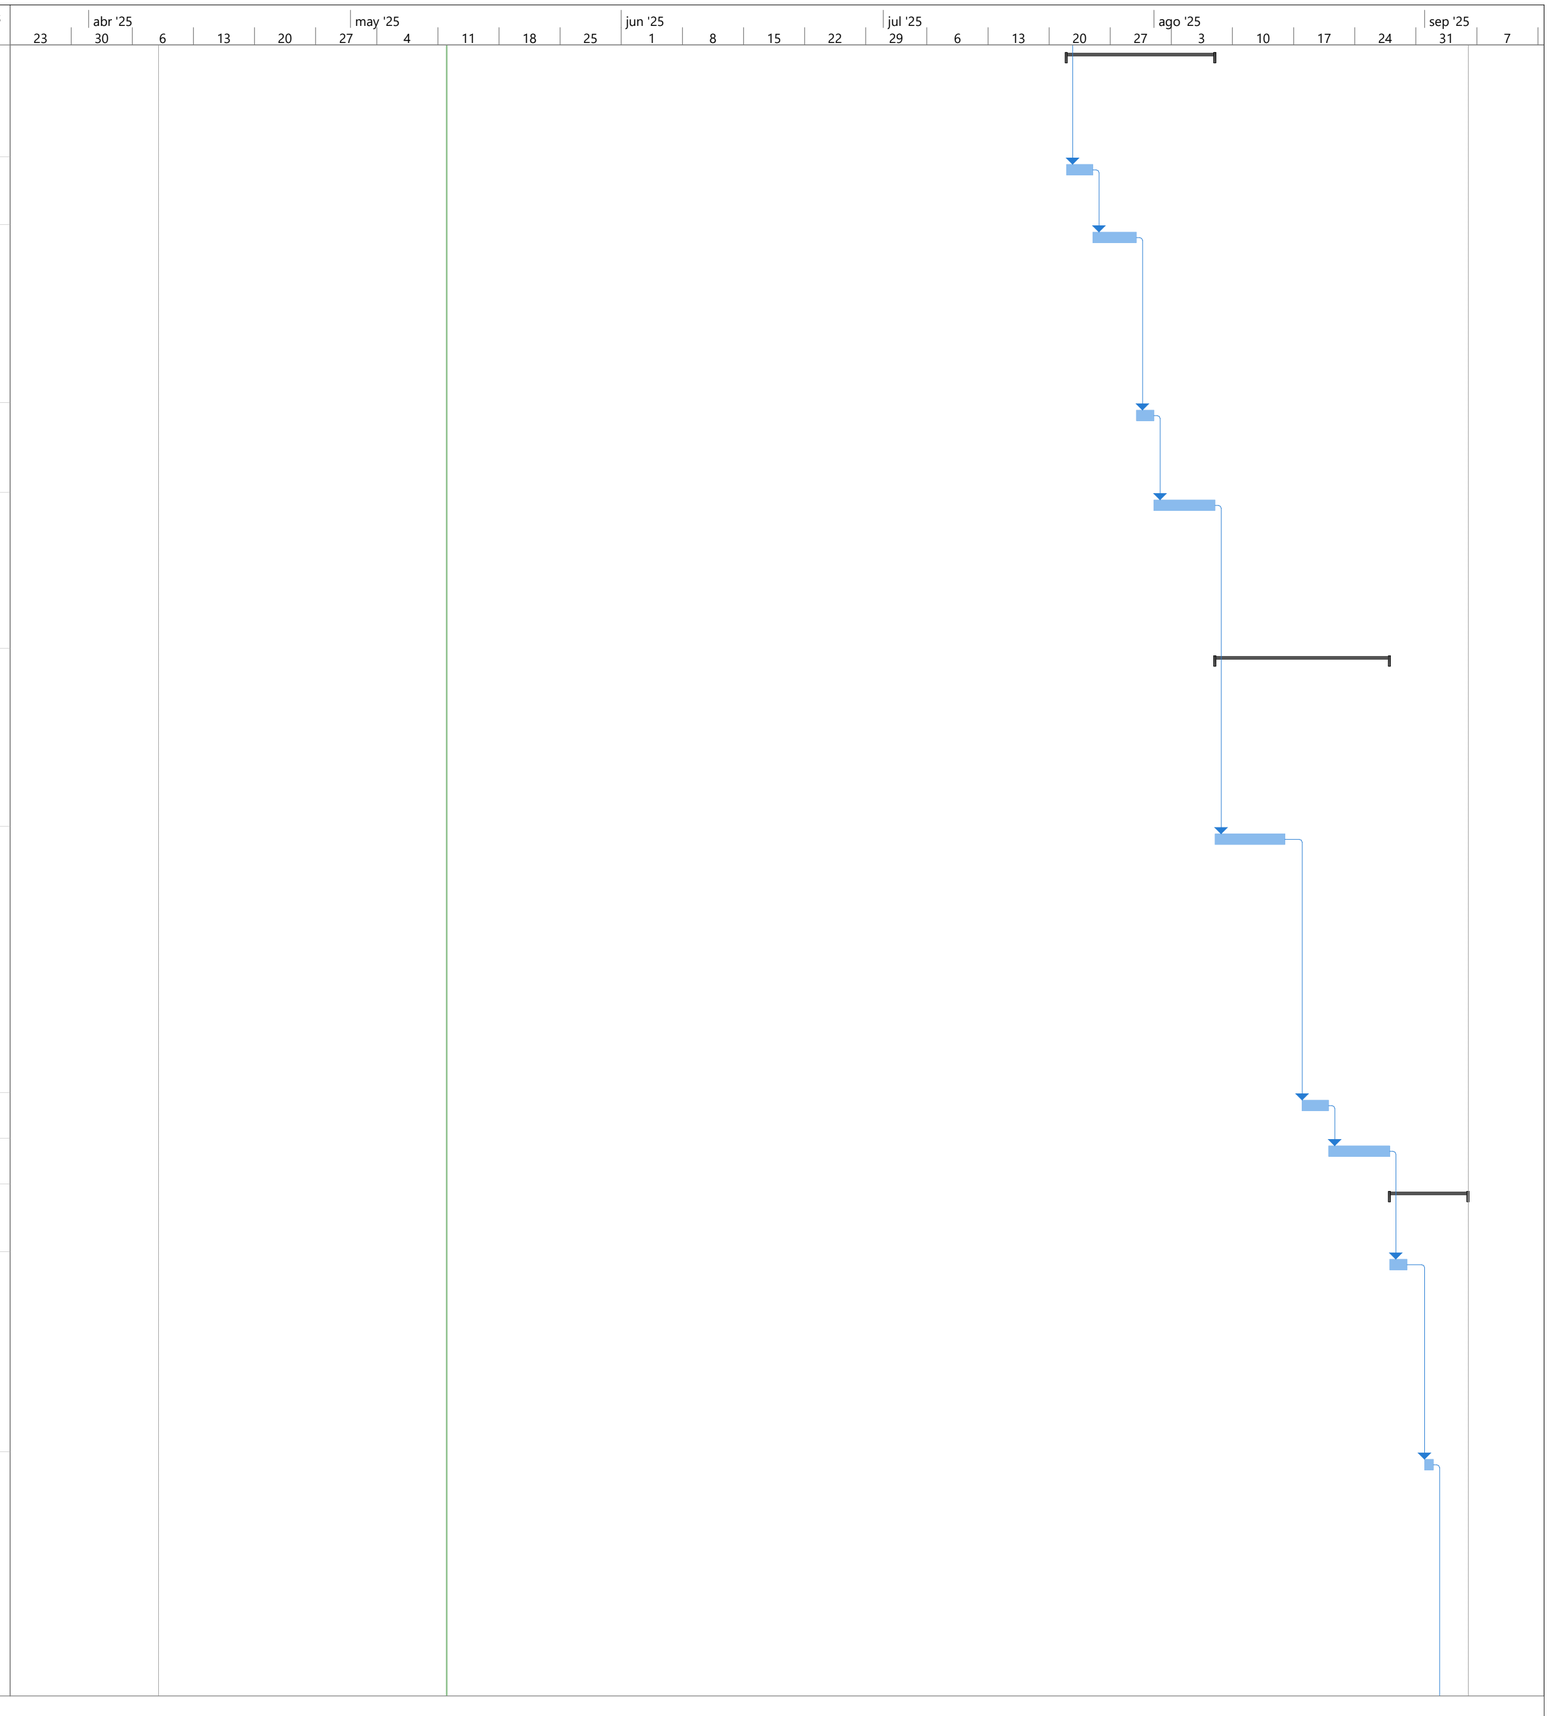

Proyecto: CRONOGRAMA TRAS
Fecha: lun 12/05/25

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · Progreso manual
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Progreso

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
30		CONEXIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LA PANTALLA DE CONTROL REMOTO DE LUCES DE PISTA AL PLC EN LA SALA DE REGULADORES	1 día	mar 2/09/25	mar 2/09/25	29	
31		TRASLADO E INSTALACIÓN FARO DE	1 día	mié 3/09/25	mié 3/09/25	30	
32		INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE FARO GIRATORIO DE	1 día	jue 4/09/25	jue 4/09/25	31	
33		INTEGRACIÓN DEL CONTROL DE ENCENDIDO-APA DEL FARO A LA PANTALLA DE CONTROL REMOTO DE LUCES DE	1 día	vie 5/09/25	vie 5/09/25	32	
34		ENTREGA FINAL	1 día?	vie 5/09/25	vie 5/09/25	32	

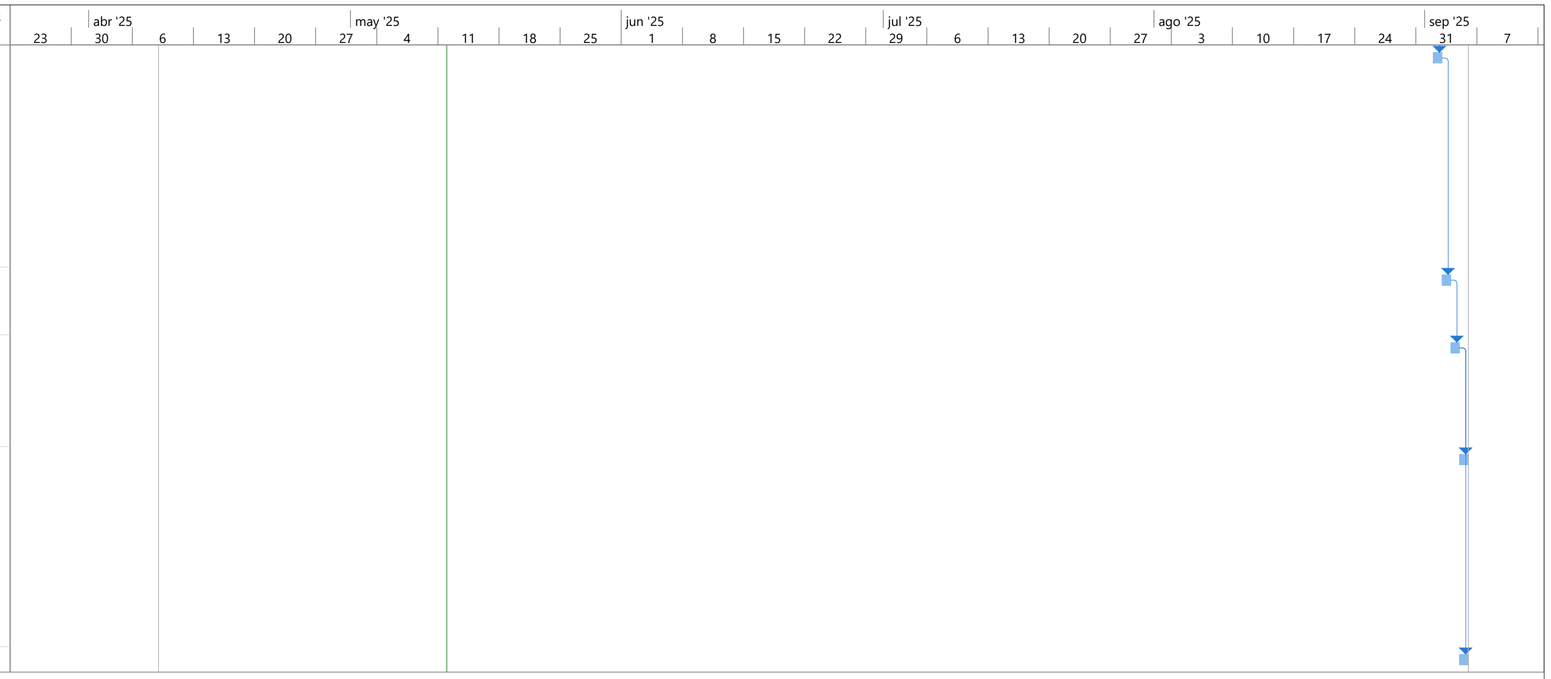

Proyecto: CRONOGRAMA TRAS
Fecha: lun 12/05/25

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	Progreso manual
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Progreso	
