CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA POSCONTRACTUAL
FORMATO ACTA DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN N° 01

DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
CONTRATANTE	SENA – Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca.			
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL SEGURIDAD IND 2024			
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.7096620 DE 2024			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	02 de diciembre 2024			
REP. LEGAL.	Álvaro Alexander Estupiñán Terán C.C 1.032.403.518			
INTERVENTORÍA	N/A			
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N/A			
SUPERVISOR SENA	LUIS NECIMO CASTRO ACOSTA			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 114.746.037,00			
VALOR ADICIONAL 1	$26.910.161			
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$141.656.198			
PORCENTAJE DEL ANTICIPO	0 %			
VALOR DE ANTICIPO	$ 0			
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	Veinticinco (25) DIAS			
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	19 de diciembre de 2024			
SUSPENSIÓN NRO. 01	31 de diciembre de 2024			
TIPO SUSPENSIÓN	PLAZO	X	CONDICIÓN	
TOTAL TIEMPO SUSPENSIÓN	UN (01) MES			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	12 DE FEBRERO DEL 2025			

En la ciudad de Arauca el 27 de Diciembre de 2024 se reunieron en las oficinas SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA, en representación del contratante, el Profesional LUIS NECIMO CASTRO ACOSTA en calidad de supervisor y, por parte del contratista, la señor(a) ÁLVARO ALEXANDER ESTUPIÑÁN TERÁN en

su calidad de Representante legal de UNION TEMPORAL SEGURIDAD IND 2024, con el fin de suspender la ejecución del contrato CO1.PCCNTR.7096620. Lo anterior de conformidad con las siguientes

CONSIDERACIONES

De conformidad con el correo recibido por parte del contratista UNION TEMPORAL SEGURIDAD IND 2024 el día 27 de diciembre de 2024, donde indica textualmente que "*Atentamente me permito informar que, debido a las particularidades propias de la temporada de fin de año, se han presentado las siguientes circunstancias que afectan la ejecución del contrato. Algunos de los ambientes a intervenir objeto del Contrato de Referencia están sellados por causa de la salida a vacaciones de los responsables de estas áreas, por lo tanto, hasta que no se reincorporen no se autoriza el ingreso a dichos ambientes, adicionalmente, debido al cierre de año contable los Proveedores Han suspendido las entregas para el presente año, informando que las operaciones normales se retomarán a partir del mes de enero de 2025.; dado a lo anterior, me permito solicitar respetuosamente la suspensión del CO1.PCCNTR.7096620 de 2024 objeto "Adquisición de bienes y servicios en cumplimiento al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, (extintores, señalización, cinta, lámparas de emergencia y detectores de humo), para el Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca.."*

Conforme a lo anterior, esta supervisión a través de correo electrónico enviado el día 27 de diciembre de 2024 le informo a la ordenadora de gasto de la solicitud realizada por parte del contratista, y quien a su vez, mediante correo electrónico el día 27 de diciembre de 2024 autoriza la suspensión del contrato de la referencia, teniendo en cuenta las circunstancias manifestadas por el contratista y en aras de lograr una correcta ejecución contractual.

CONCEPTO TÉCNICO

Una vez analizadas las situaciones de fuerza mayor indicadas por el contratista, se considera pertinente suspender el contrato No. CO1.PCCNTR.7096620. cuyo objeto corresponde a "ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, (EXTINTORES, SEÑALIZACIÓN, CINTA, LÁMPARAS DE EMERGENCIA Y DETECTORES DE HUMO), PARA EL CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA.", conforme a las razones expuestas por el contratista y la autorización emitida por la ordenadora del gasto, toda vez que se imposibilita el ingreso a algunas de las áreas a intervenir por parte del contratista y su equipo durante el periodo de vacaciones, y adicionalmente por la imposibilidad de despacho de materiales necesarios para ejecutar la obra.

Por todo lo expuesto, los firmantes en la presente Acta, de común acuerdo, convienen:

PRIMERO. Suspender el plazo de ejecución del contrato un mes (01), a partir del 30 de diciembre del 2024 y hasta el 30 de enero del 2025

NOTA INTERNA. Recuerde que el contrato, al ser suspendido en la plataforma electrónica, requiere una fecha. Por tal razón, se recomienda definir una fecha probable de reanudación, así no se tenga conocimiento de cuándo puedan ser superadas las condiciones que dieron origen a la suspensión.

SEGUNDO. El contratista deberá ampliar el plazo de cubrimiento de las garantías constituidas para el contrato ya referenciado por el término aquí estipulado, una vez culmine el término de pactado para la suspensión o se superen los motivos que originaron la suspensión del contrato.

TERCERO. Las demás condiciones del contrato inicial continúan vigentes. Por ende, no comportan modificación alguna.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA REFERIDA PLATAFORMA.

Elaboró: Elaboró: Lilian Alvarado – Apoyo ala gestión contratual Lilian Alvarado V.

Revisó: FIORELA RUBIO V – ABOGADA GESTION CONTRACTUAL

Outlook

CPE No. 81-9-2024-007185 - SOLICITUD SUSPENSION CO1.PCCNTR.7096620 DE 2024

Desde grupoadmondocumentos@sena.edu.co <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>
Fecha Vie 27/12/2024 20:11
Para Luis Necimo Castro Acosta <lncastro@sena.edu.co>
CC Mariluz Hernandez Trujillo <mahernandezt@sena.edu.co>; Lilian Edith Alvarado Valderrama <lealvarado@sena.edu.co>; Recepción Arauca <recepcionarauca@sena.edu.co>

7 archivos adjuntos (2 MB)

C.E.(FRM) - 81-9-2024-007185-(81)-811040 + LUIS NECIMO CASTRO ACOSTA SOLICIT.tif; OFICIO - SOLICITUD SUSPENSIÓN - CO1.PCCNTR.7096620 DE 2024 - EXTINTORES (2).PDF 01-MAIL-Anexos Respue.pdf; ACTA DE INICIO BIENES Y SERVICIOS 1 .PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-007185 - NIS.pdf; INFORME 001 - CO1.PCCNTR.7096620 DE 2024 (2).PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-0071.pdf; MEM SOL SUSPENSION CTO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS (EXTINTORES) (2).DOCX 01-MAIL-Anexos Respues.docx; GCCON-F-020-ACTADESUSPENSIONV04_EXTINTORES (2).DOCX 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2024-0.docx; C.I.(FRM)-9-2024-007185-(81)-811040-+ LUIS NECIMO CASTRO ACOSTA--SOLICITUD SU.html;

Apreciado(a) * LUIS NECIMO CASTRO ACOSTA
Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	N.I.S.	Fecha
81-9-2024-007185	2024-02-566083	12/27/2024 8:11:15 PM

Asunto	Descripción del asunto
SOLICITUDES PRESUPUESTALES	SOLICITUD SUSPENSION CO1.PCCNTR.7096620 DE 2024

En la ciudad de Arauca el 27 de Diciembre de 2024 se reunieron en las oficinas SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA, en representación del contratante, el Profesional LUIS NECIMO CASTRO ACOSTA en calidad de supervisor y, por parte del contratista, la señor(a) ÁLVARO ALEXANDER ESTUPIÑÁN TERÁN en su calidad de Representante legal de UNION TEMPORAL SEGURIDAD IND 2024, con el fin de suspender la ejecución del contrato CO1.PCCNTR.7096620. Lo anterior de conformidad con las siguientes

CONSIDERACIONES

De conformidad con el correo recibido por parte del contratista UNION TEMPORAL SEGURIDAD IND 2024 el día 27 de diciembre de 2024, donde indica textualmente que “Atentamente me permito informar que, debido a las particularidades propias de la temporada de fin de año, se han presentado las siguientes circunstancias que afectan la ejecución del contrato. Algunos de los ambientes a intervenir objeto del Contrato de Referencia están sellados por causa de la salida a vacaciones de los responsables de estas áreas, por lo tanto, hasta que no se reincorporen no se autoriza el ingreso a dichos ambientes, adicionalmente, debido al cierre de año contable los Proveedores Han suspendido las entregas para el presente año, informando que las operaciones normales se retomarán a partir del mes de enero de 2025.; dado a lo anterior, me permito solicitar respetuosamente la suspensión del CO1.PCCNTR.7096620 de 2024 objeto “Adquisición de bienes y servicios en cumplimiento al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, (extintores, señalización, cinta, lámparas de emergencia y detectores de humo), para el Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca..”

Conforme a lo anterior, esta supervisión a través de correo electrónico enviado el día 27 de diciembre de 2024 le informo a la ordenadora de gasto de la solicitud realizada por parte del contratista, y quien a su vez, mediante

correo electrónico el día 27 de diciembre de 2024 autoriza la suspensión del contrato de la referencia, teniendo en cuenta las circunstancias manifestadas por el contratista y en aras de lograr una correcta ejecución contractual.

Atentamente,

Grupo Administración de Documentos
Dirección General
servicioalciudadano@sena.edu.co
PBX:5461500
Calle 57 · 8 - 69 Bogotá Colombia

@SENAcomunica
www.sena.edu.co

NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente

UT Seguridad IND 2024

Arauca 27 de diciembre de 2024

SEÑORES
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

SR LUIS NECIMO CASTRO ACOSTA
Supervisor del Contrato

REF **SOLICITUD DE SUSPENCIÓN CONTRATO CO1.PCCNTR.7096620 de 2024**

Atentamente me permito informar que, debido a las particularidades propias de la temporada de fin de año, se han presentado las siguientes circunstancias que afectan la ejecución del contrato. Algunos de los ambientes a intervenir objeto del Contrato de Referencia están sellados por causa de la salida a vacaciones de los responsables de estas áreas, por lo tanto, hasta que no se reincorporen no se autoriza el ingreso a dichos ambientes, adicionalmente, debido al cierre de año contable los Proveedores Han suspendido las entregas para el presente año, informando que las operaciones normales se retomarán a partir del mes de enero de 2025.

Dado lo anterior, me permito solicitar respetuosamente la suspensión del contrato CO1.PCCNTR.7096620 de 2024, cuyo objeto es “Adquisición de bienes y servicios en cumplimiento al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, (extintores, señalización, cinta, lámparas de emergencia y detectores de humo), para el Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca.”

Solicitamos respetuosamente la suspensión del contrato por un periodo de 30 días calendario contados a partir del 30 de diciembre de 2024. Esta medida permitirá que las condiciones necesarias para su correcta ejecución estén garantizadas.

Agradecemos de antemano su comprensión y quedamos atentos a cualquier información adicional que requieran para gestionar esta solicitud.

Atentamente



ALVARO ALEXANDER ESTUPIÑAN TERAN
CC: 1032403518 DE BOGOTÁ
R/L UNION TEMPORAL SEGURIDAD IND 2024

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO ACTA DE INICIO

CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.7096620 DE 2024
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios
OBJETO	Adquisición de bienes y servicios en cumplimiento al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, (extintores, señalización, cinta, lámparas de emergencia y detectores de humo), para el Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca.
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO CATORCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 114.746.037,00)
PLAZO DEL CONTRATO	El plazo de ejecución del contrato será de veinticinco (25) días, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato/aceptación de la oferta (registro presupuestal y aprobación de la garantía única) sin exceder del 31 de diciembre de 2024
LUGAR DE EJECUCIÓN	La ejecución del contrato será: • Sede Principal (Carrera 20 # 28-163 Barrio Libertadores) Municipio de Arauca. • Sede APE (Calle 24 19-17 Barrio Córdoba) Municipio de Arauca. • Sede Escuela de Gastronomía (Calle 1 # 1-30 Barrio Mate venado) Municipio de Arauca. • Sede Granja el Alcaraván (Municipio de Arauquita/ vereda campo alegre). • Sede Saravena (Carrera 16a # 28-11 Barrio 6 de octubre) Municipio de Saravena •Sede Tame (Carrera 15 # 37-97 Barrio la Araucarias) Municipio de Tame.
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL SEGURIDAD IND 2024
CC o NIT	901894766-7
REPRESENTANTE LEGAL	Álvaro Alexander Estupiñán Terán C.C 1.032.403.518
SUPERVISOR DESIGNADO	LUIS NECIMO CASTRO ACOSTA

En Arauca a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de 2024, entre los suscritos LUIS NECIMO CASTRO ACOSTA, identificado con cedula de ciudadanía nro. 96191245 de **lugar de expedición**, en calidad de supervisor y, de otra parte, Álvaro Alexander Estupiñán Terán, identificado con cedula de ciudadanía nro. 1.032.403.518, en calidad de representante legal de UNION TEMPORAL SEGURIDAD IND 2024, identificada con NIT. 901894766-7, hemos convenido suscribir el acta de inicio del contrato de la referencia, de conformidad con los términos que anteceden y los siguientes:

Número y fecha del registro presupuestal	146324 de 2024-12-17
Fecha de aprobación de las garantías	17 de diciembre de 2024

Fecha de inicio	19 de diciembre de 2024
Fecha de terminación	31 de diciembre de 2024

Se deja constancia de la verificación de los documentos o requisitos establecidos en el contrato para iniciar la ejecución.



LUIS NECIMO CASTRO ACOSTA
Supervisor



ÁLVARO ALEXANDER ESTUPIÑÁN TERAN
NIT. 901894766-7
Representante legal
gerencia@soccoing.com.co

Elaboró: LUIS NECIMO CASTRO ACOSTA, Supervisor contrato CO1.PCCNTR.7096620



INFORME DE AVANCE

001

SENA – ARAUCA

CONTRATO Nº
CO1.PCCNTR.7096620 de 2024

Adquisición de bienes y servicios en cumplimiento al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, (extintores, señalización, cinta, lámparas de emergencia y detectores de humo), para el Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca.

24 DICIEMBRE DE 2024

UT SEGURIDAD IND 2024
NIT: 901894766-7

UT Seguridad IND 2024

Contenido

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO 3
2. AVANCE DE LAS ACTIVIDADES 4
3. MANTENIMIENTO DE EXTINTORES 5
4. ENTREGA DE ITEMS EN ALMACEN 6
5. AVANCE EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO 7

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATANTE	Centro de gestión y desarrollo agroindustrial de Arauca, Regional Arauca
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.7096620 de 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	02 de diciembre 2024
OBJETO	Adquisición de bienes y servicios en cumplimiento al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, (extintores, señalización, cinta, lámparas de emergencia y detectores de humo), para el Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca.
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL SEGURIDAD IND 2024
CC o NIT	901894766-7
LUGAR DE EJECUCIÓN	Sede Principal (Carrera 20 # 28-163 Barrio Libertadores) Municipio de Arauca. Sede APE (Calle 24 19-17 Barrio Córdoba) Municipio de Arauca. Sede Escuela de Gastronomía (Calle 1 # 1-30 Barrio Mate venado) Municipio de Arauca. Sede Granja el Alcaraván (Municipio de Arauquita/ vereda campo alegre). Sede Saravena (Carrera 16a # 28-11 Barrio 6 de octubre) Municipio de Saravena. Sede Tame (Carrera 15 # 37-97 Barrio la Araucarias) Municipio de Tame.
FECHA DE INICIO	19 de diciembre de 2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	El plazo de ejecución del contrato será de veinticinco (25) días, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato/aceptación de la oferta (registro presupuestal y aprobación de la garantía única) sin exceder del 31 de diciembre de 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$114.746.037
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2024

2. AVANCE DE LAS ACTIVIDADES

ITEM	UNSPSC	DESCRIPCION TÉCNICA DEL PRODUCTO (IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD LIBERTADORES	CANTIDAD CORDOBA	CANTIDAD MATEVENADO	CANTIDAD ARAUQUITA	CANTIDAD SARAVENA	CANTIDAD TAME	TOTAL
SEDES DEPARTAMENTO DE ARAUCA										
3	46191603	Suministro e Instalación de Manguera para Extintor de multiproposito de 10 Lbs	unidad	16	0	1	12	13	2	**44**
		Renovación de Pintura para Cilindro (CO2) Cap 10 libras	unidad				5			**5**
4	46191618	Renovación de Pintura para Cilindro Cap 10 libras	unidad	5		1	3			**9**
5		Renovación de Pintura para Cilindro Cap 20 libras	unidad	5		3	5			**13**
6	46191618	Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC Capacidad de 10 Lbs	unidad	16		1	7	11	2	**37**
7		Mantenimiento de extintor en aluminio dióxido de carbono (CO2) Capacidad de 10 libras.	unidad	28	12	2	10	10	10	**72**
8		Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC capacidad 150 Lbs Tipo Satelite	unidad	4		1	1	1	2	**9**
9		Mantenimiento y Recarga de Extintores Clase K Acetato y citrato de potacio de 1,5 galon	unidad	6		4	3	2	3	**18**
10		Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC Capacidad de 5 Lbs	unidad	3						**3**
11		Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC Capacidad de 20 Lbs	unidad	29		7	10	10	21	**77**
12		Mantenimiento y Recarga de Extintores de agua a presión de 2,5 galon	unidad	1			1	1	1	**4**

ITEM	UNSPSC	NOMBRE DEL EQUIPO	DESCRIPCION TÉCNICA DEL PRODUCTO (IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA)	UNIDAD DE MEDID	CANTIDAD LIBERTADORES	CANTIDAD CORDOBA	CANTIDAD MATEVENADO	CANTIDAD ARAUQUITA	CANTIDAD SARAVENA	CANTIDAD TAME	TOTAL
Sedes Departamento de Arauca											
1	46191618	Recarga y Mantenimiento de Extintores	Gancho universal para extintor de incendios, soporte, colgador para extintores de 10 y 20 libras, la cantidad se divide en las dos clases.	unidad	15	5	5	5	10	10	**50**
			Gancho universal para extintor de incendios, soporte, colgador para extintores de 10 y 20 libras multiproposito y Co2 de 10 libras, la cantidad se divide en las clases de extintores.					5			**5**
13	55121700	Señalización de Extintores	Señalización Emergencia (contra incendio) para **Extintor de aluminio dióxido de carbono (CO2)** capacidad 10 libras, lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm	unidad	32	12	4	10	8	10	**76**
14			Señalización Emergencia (contra incendio) para **Extintor tipo K cetato y citrato de potacio de 1,5 gls** Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm	unidad	8	0	2	4	3	2	**19**
15			Señalizaciónn Emergencia (contra incendio) para **Extintor de agua a presión de 2,5 galon** Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm	unidad	2	0	0	2	2	2	**8**
16			Señalización Emergencia (contra incendio) para **Extintor Multiproposito** Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm	unidad	54	0	10	27	23	24	**138**


3. MANTENIMIENTO DE EXTINTORES

Durante el periodo ejecución del contrato se realizaron actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en los extintores instalados en las sedes del SENA de los municipios de Arauca, Arauquita, Saravena y Tame, de acuerdo con el cronograma establecido en el contrato. Estas actividades tienen como objetivo garantizar el correcto funcionamiento y disponibilidad de los equipos de protección contra incendios

RECURSOS UTILIZADOS

- Equipos: Manómetros, herramientas de ajuste, dispositivos de prueba de presión.
- Personal: Equipo técnico compuesto por personas capacitadas en mantenimiento de equipos contra incendios.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

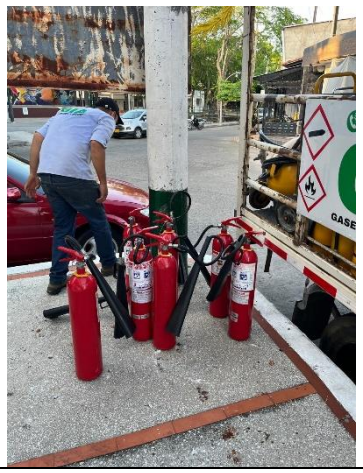	
SEDE LIBERTADORES	SEDE LIBERTADORES
	
SEDE APE	SEDE GASTRONOMIA

	
SEDE SARAVENA	SEDE SARAVENA
	
SEDE TAME	SEDE TAME

4. ENTREGA DE ITEMS EN ALMACEN


En el marco del suministro de elementos, se llevó a cabo la entrega de elementos de señalización de extintores y ganchos para extintores.

LAMINAS DE SEÑALIZACIÓN	VERIFICACIÓN DE CANTIDADES
	
ELEMENTOS EN LA CAJA	UBICADOS EN LA BODEGA

5. AVANCE EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO

El desarrollo del contrato avanza de manera satisfactoria. De un total de 1,051 ítems programados (100%), se han completado 615 ítems, lo que representa un avance del 58.52%. Quedan pendientes por entregar 436 ítems, equivalentes al 41.48%

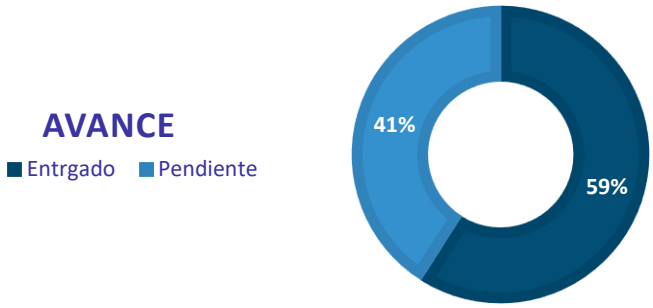

Para constancia se firma se firma el presente informe en la ciudad de Arauca el veintitrés (23) día del mes de diciembre del 2024.

ALVARO ALEXANDER ESTUPIÑAN TERAN
CC: 1032403518 DE BOGOTÁ
R/L UNION TEMPORAL SEGURIDAD IND 2024
