

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**PROYECTO ICBF**	**20,8 días?**	**mar 26/11/24**	**lun 30/12/24**	
2		<Hito nuevo>	0 días	mar 26/11/24	mar 26/11/24	
3		**OBRAS PREELIMINARES**	**2 días**	**mar 26/11/24**	**jue 28/11/24**	
4		DESCAPOTE Y LIMPIEZA	1 día	mar 26/11/24	mié 27/11/24	2
5		CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE H.=2,00 M	1 día	mié 27/11/24	jue 28/11/24	4
6		**PINTURAS-PAREDES**	**2 días**	**jue 28/11/24**	**lun 2/12/24**	
7		ESTUCO SOBRE MUROS (INCLUYE APLICACIÓN Y LIJADA)PATIO INTERIOR	1 día	jue 28/11/24	vie 29/11/24	5
8		VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS)PATIO INTERIOR	1 día	jue 28/11/24	vie 29/11/24	5
9		ESTUCO SOBRE MUROS (INCLUYE APLICACIÓN Y LIJADA) SALONES	1 día	vie 29/11/24	lun 2/12/24	8
10		VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS)SALONES	1 día	vie 29/11/24	lun 2/12/24	8
11		**BAÑO COCINA**	**2 días**	**lun 2/12/24**	**mié 4/12/24**	
12		RETIRO Y DISPISICION DE BALDOSA CERAMICA,DISEÑO BLANCO.(Espesor 0,025m)	1 día	mar 3/12/24	mié 4/12/24	10
13		RETIRO Y DISPOSICION DE ENCHAPE EN CERAMICA(Espersor0,025m)	1 día	mar 3/12/24	mié 4/12/24	10
14		BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA)	1 día	mar 3/12/24	mié 4/12/24	10
15		BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA)	1 día	mar 3/12/24	mié 4/12/24	10
16		**COCINA**	**1 día**	**mié 4/12/24**	**mié 4/12/24**	
17		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS DE COMBINACIÓN	1 día	mié 4/12/24	jue 5/12/24	15
18		**SALONES**	**4 días**	**jue 5/12/24**	**mié 11/12/24**	
19		DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN CUALQUIER MATERIAL	1 día	jue 5/12/24	vie 6/12/24	17
20		MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - B=80 cm (ANTIC - ESMALTE)	1 día	jue 5/12/24	vie 6/12/24	17
21		PUERTA SENCILLA LAMINA (ANTIC - ESMALTE)	1 día	jue 5/12/24	vie 6/12/24	17
22		PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3,E=1.5 CM	1 día	vie 6/12/24	lun 9/12/24	21
23		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL	1 día	vie 6/12/24	lun 9/12/24	21
24		BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA)	1 día	vie 6/12/24	lun 9/12/24	21
25		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA TIPO TELÉFONO	1 día	mar 10/12/24	mié 11/12/24	24
26		SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL EN PORCELANA SANITARIA AHORRADOR	1 día	mar 10/12/24	mié 11/12/24	24
27		SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS COLGAR(INCLUYE GRIFERIA)	1 día	mar 10/12/24	mié 11/12/24	24
28		SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFON TIPO BOTELLA CON REJILLA PARA LAVAMANOS,(ICLUYE RESANES)	1 día	mar 10/12/24	mié 11/12/24	24

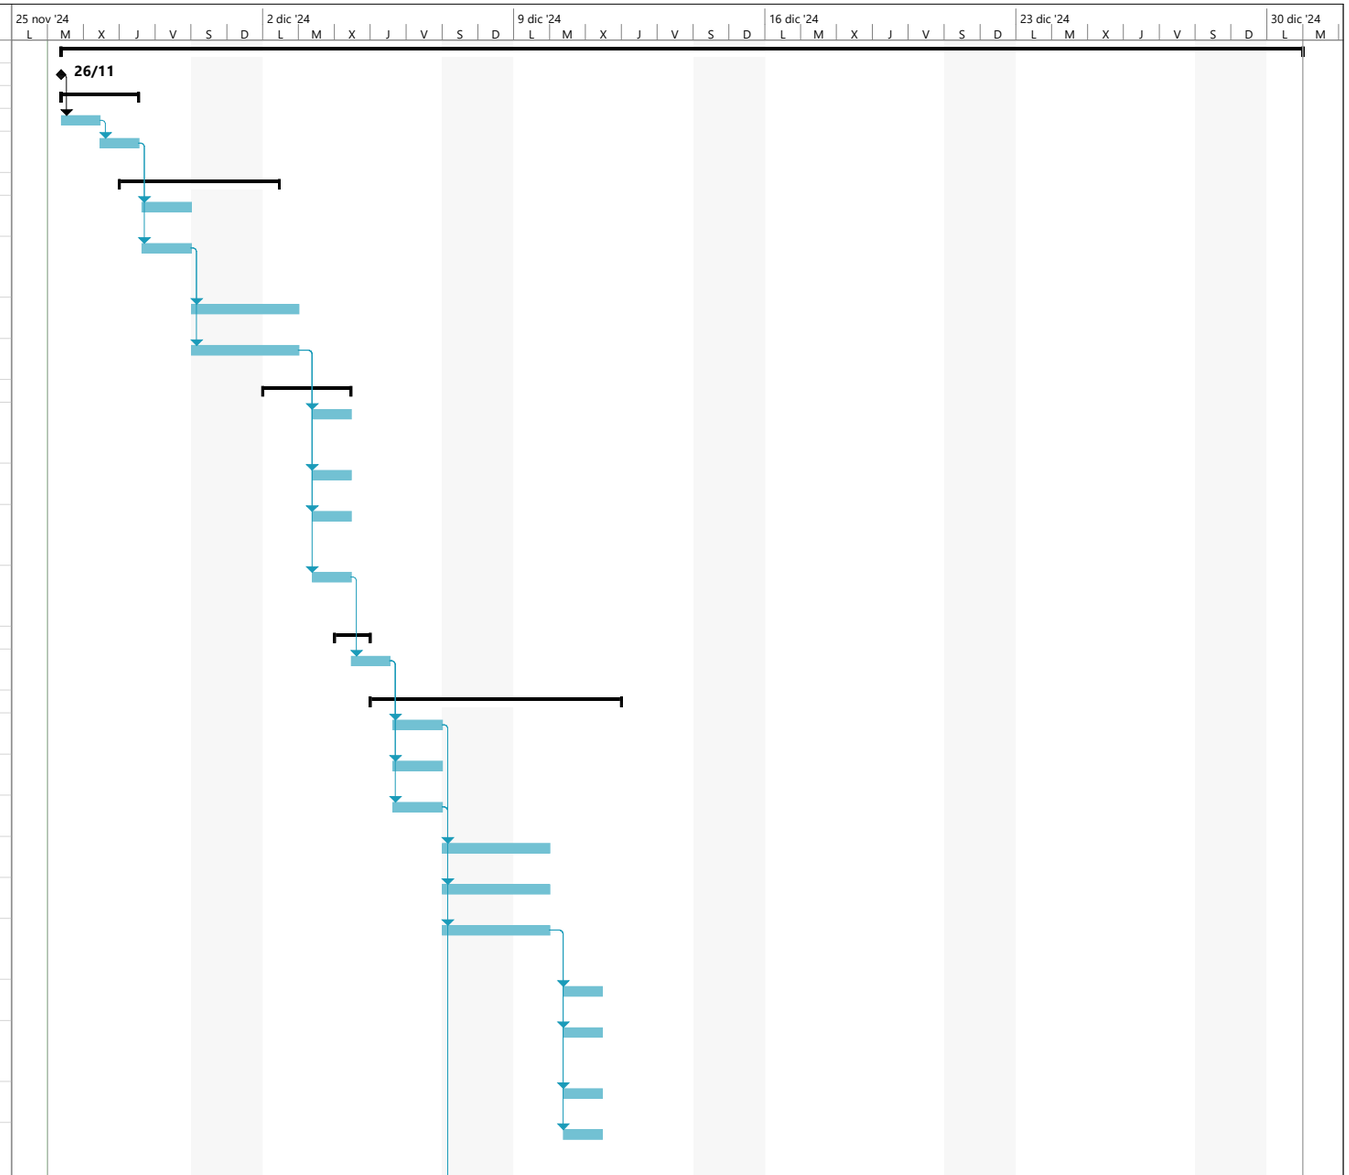

Proyecto: PROYECTO ICBF
Fecha: mar 26/11/24

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite	Hito de línea base
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Tareas críticas	Resumen de línea base
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	División crítica	Progreso
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Línea base	Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
29		**CANCHA DE MICRO FUTBOL**	**4 días**	**vie 6/12/24**	**jue 12/12/24**	
30		DEMOLICION PLACA MACIZA 0,15M	2 días	vie 6/12/24	mié 11/12/24	19
31		CONTRAPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E =0,12	1 día	mié 11/12/24	jue 12/12/24	30
32		LINEAS TRAFICO 0,10	1 día	mié 11/12/24	jue 12/12/24	
33		**CERRAMIENTO**	**3 días**	**vie 6/12/24**	**mié 11/12/24**	
34		MANTENIMIENTO Y PINTURA CON ESMALTE DEL CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA EXISTENTE CON REMPLAZOS PARCIALES DE LA MALLA	2 días	vie 6/12/24	mié 11/12/24	19
35		CONCERTINA EN ACERO INOXIDABLE DE 18 PULGADAS	1 día	mié 11/12/24	jue 12/12/24	34
36		**CUBIERTAS**	**1 día**	**jue 12/12/24**	**jue 12/12/24**	
37		TEJA PLASTICA No.6	1 día	jue 12/12/24	vie 13/12/24	35
38		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA	1 día	jue 12/12/24	vie 13/12/24	35
39		**ELECTRICO**	**1 día**	**vie 13/12/24**	**vie 13/12/24**	
40		SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA	1 día	vie 13/12/24	sáb 14/12/24	35
41		SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	1 día	vie 13/12/24	sáb 14/12/24	35
42		**ASEO Y LIMPIEZA GENERAL**	**1 día**	**sáb 14/12/24**	**sáb 14/12/24**	
43		ASEO Y LIMPIEZA GENERAL	1 día	vie 13/12/24	sáb 14/12/24	32
44		fin	0 días	lun 16/12/24	lun 16/12/24	43

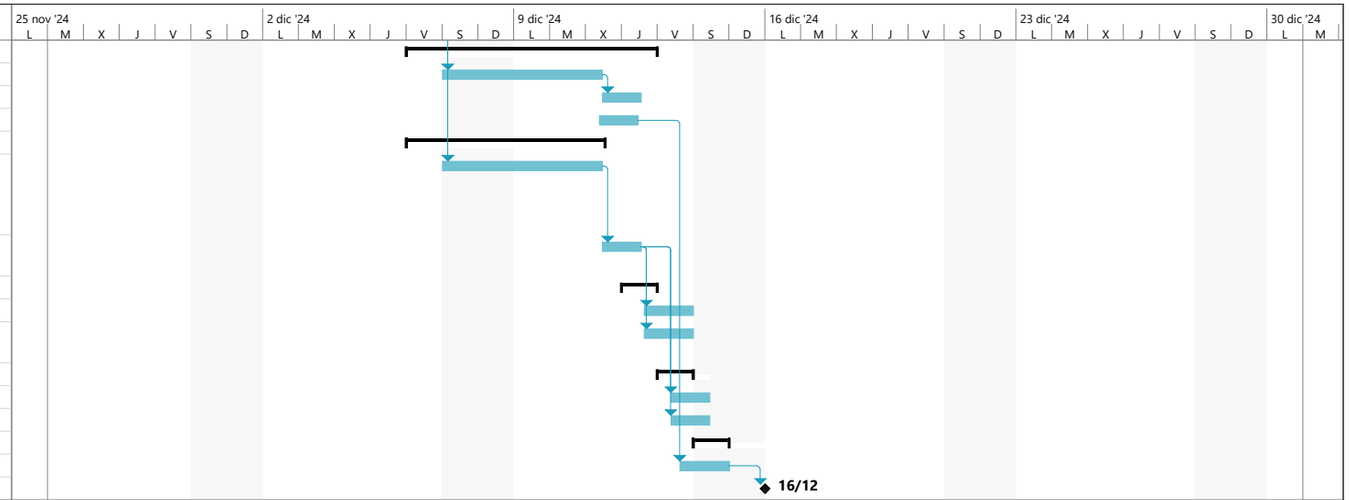

Proyecto: PROYECTO ICBF
Fecha: mar 26/11/24

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite	Hito de línea base
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Tareas críticas	Resumen de línea base
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	División crítica	Progreso
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Línea base	Progreso manual
