COMUNICACIÓN INTERNA

ASUNTO: Solicitud de suspensión, contrato de Obra No. 065 de 2024	Fecha: 09 de julio de 2025.
	Ciudad: Popayán.

PARA: Dra. Sandra Mónica Gaviria M. - Asesora Jurídica
DE: Ing. Diego Felipe Cuervo González – Asesor Área de Salud y Saneamiento Básico.

Contratista:	LERA INGENIERIA SAS
Contrato de obra No.	065 de 2024
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
Valor contrato:	$ 1.000.000.000
Plazo inicial:	Hasta el 20 de diciembre de 2024 desde la aprobación de la póliza
Prórroga No. 1	Hasta el 20 de abril de 2025
Prorroga No. 2	Hasta el 20 de junio de 2025
Prórroga No. 3	Hasta el 31 de julio de 2025
Suspensión:	Solicitud actual, hasta el 31 de julio de 2025

Cordial saludo.

Por medio de la presente comunicación solicito a usted, elaborar acta de suspensión al contrato de obra No 065 de 2024 cuyos datos se relacionan con antelación, teniendo en cuenta el oficio No. ADMLERA 05-08-07-2025 remitido por parte del contratista (adjunto), en el cual se argumentan situaciones de conocimiento institucional, causadas por la intensa ola invernal que se presenta en el territorio, lo cual derivó en el crecimiento desmedido del Río Páez y sus afluentes ocasionando varias situaciones que afectan la movilidad y el libre tránsito en la región, como son: la pérdida total o parcial de bancas en las vías, deslizamientos de tierra y colapsos parciales o totales de estructuras en pasos obligados de ingreso a la zona; trayendo como consecuencia de manera particular la pérdida total de la banca de la vía que comunica la localidad de la Plata con Puerto Valencia, lugar de ubicación de la obra, impidiendo el transporte de materiales y el traslado de personal de mano de obra, proveniente del municipio de La Plata, requerido para la ejecución de las actividades constructivas faltantes, necesarias para la terminación del proyecto.

Por lo anterior, se considera pertinente y oportuno por parte de la supervisión, suspender el contrato de obra 065 de 2024, a partir de la fecha hasta el 31 de julio de 2025, momento en el cual se evaluarán los motivos que ocasionaron la suspensión.

SI las condiciones son superadas antes de esta fecha, se procederá a efectuar el reinicio inmediato del contrato y de esta forma continuar con su ejecución.

Atentamente,

Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ.
Asesor Área de Salud y Saneamiento Básico.

Proyectó: Ing. Carlos E. Beltrán V. - Contratista apoyo a la supervisión ASSB .

Anexos:
Solicitud suspensión del Contratista.
Evidencias hechos: Registros fotográficos, boletines informativos, comunicados oficiales Instituto Nacional de Vías.

La Plata, 08 de julio de 2025

ADMLERA05-08-07-2025

Ingeniero
DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ
Supervisor CTO 065 de 2024
CORPORACIÓN NASA KIWE
Popayán Cauca

Referencia: Contrato de obra No. 065 de 2024, cuyo objeto es: *"LA CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA*".

Asunto: Solicitud de suspensión al contrato de obra de la referencia.

Respetuoso saludo,

Por medio de la presente solicitamos a la entidad la suspensión temporal del referido Contrato, debido a que durante las últimas semanas se ha venido presentando en la región una temporada invernal con precipitaciones extremas, lo cual ha derivado en el crecimiento desmedido del Río Páez, generando la pérdida total o parcial de banca en las vías de acceso al sitio de obra en varios puntos, incomunicando el sitio de la obra tanto en la vía que va del Municipio de Inza a Popayán como la vía que comunica el Huila con el Municipio de Inza. Adicionalmente, se han presentado deslizamientos de tierra y colapsos estructurales, particularmente en los pasos obligados de ingreso a la zona, dificultando el arribo de los materiales faltantes y el traslado del personal de obra.

Se solicita se autorice la suspensión del plazo contractual por el término que resulte necesario hasta el restablecimiento de las condiciones mínimas de acceso, seguridad y operatividad del sitio de obra, para lo cual sugerimos en primera medida un plazo hasta el 31 de julio de 2025, el cual pueda ser prorrogado hasta tanto se consideren superadas las condiciones que ocasionaron la problemática objeto de esta suspensión.

Agradezco la atención prestada e importancia al asunto y respuesta positiva a la solicitud.

Anexos: Registro fotográfico de evidencia de sucesos presentados y reporte de Invias

Atentamente,

ING. LUIS EDUARDO RENGIFO ARBELAEZ
Representante Legal
LERA INGENIERIA S.A.S
Contratista de Obra
CO No. 065 de 2024

Lera Ingeniería S.A.S

REGISTRO FOTOGRAFICO Y EVIDENCIAS DE SUCESOS







Emisora La Caliente 88.4Fm Belalcázar Páez
1 de julio a las 9:29 a. m. ·

Así amaneció la vía que de el casco urbano de Belalcázar conduce a el minuto de Dios - la Plata huila



Instituto Nacional de Vías - Invías
3 de julio a las 8:23 a. m. ·

Invías desplaza personal y maquinaria de mantenimiento rutinario para la atención de un movimiento en masa que generó deslizamiento de material sobre la banca y obstruye la calzada sobre el km 13 en el corredor circuitos ecoturísticos Huila – Cauca, en el municipio de Páez, Cauca.
Soy Mafe Rojas Ministerio de Transporte Colombia



Emisora La Caliente 88.4Fm Belalcázar Páez
3 de julio a las 8:36 a. m. ·

🚨🚨 ¡Atención!
Se encuentra cerrada la vía Inzá – La Plata (Huila) debido a la pérdida total de la banca en el sector afectado.

⚠️ Tránsito vehicular suspendido.
Se recomienda no intentar pasar y estar atentos a la información oficial.



Aumento del caudal de los ríos Páez, Símbola y Moras no está relacionado con la actividad del volcán Nevado del Huila

Noticias

03 de julio de 2025

- *El incremento en los caudales fue causado por **lluvias intensas** registradas entre el 2 y 3 de julio, con un acumulado de hasta **377 mm**, según estaciones de monitoreo del Servicio Geológico Colombiano.*
- ***No se han registrado sismos ni señales asociadas a cambios en la actividad del volcán**, según el análisis de la red de monitoreo del SGC.*
- *El **volcán Nevado del Huila continúa en nivel de alerta amarilla** y bajo observación permanente por parte del SGC.*

Popayán, 3 de julio de 2025. El Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, informa que, gracias a la red de monitoreo instalada para el seguimiento de la actividad del volcán Nevado del Huila, se tiene la siguiente información de los eventos ocurridos en la cuenca del río Páez:

Los pluviómetros instalados en las estaciones de Tóez (río Páez) y Pueblo Nuevo (río Símbola) han registrado lluvias intensas desde el mediodía del 2 de julio, con un acumulado de 75 mm hacia la media noche y 164 mm a las 5 a. m. del día de hoy. Estas precipitaciones se mantuvieron el día de hoy, con un acumulado de 377 mm a las 5 p. m. y generaron un aumento en los caudales de los ríos Páez, Símbola y Moras.

El aumento del caudal de estos ríos fue captado a través de las estaciones sismológicas Yusayú, Maravillas y Caloto, así como en las estaciones de monitoreo de flujos de lodo Tóez y Pueblo Nuevo.

Desde el Servicio Geológico Colombiano confirmamos que **ninguna de estas señales registradas a través de nuestra red de monitoreo están asociadas con la ocurrencia de sismos o aumento en la actividad del volcán Nevado del Huila.**

Noticias Tierradentro
3 de julio a las 9:50 a. m. ·

🚨 #Emergencia | Lluvias dejan incomunicado Tierradentro 🌧️🌪️

Las intensas lluvias de las últimas horas han provocado una grave emergencia en el territorio ancestral de Tierradentro, oriente del Cauca. La mayor parte de la zona se encuentra incomunicada debido a deslizamientos y el desbordamiento de quebradas.

La avalancha de la quebrada El Lucero arrasó varios puentes fundamentales para la movilidad de las comunidades:

- Puente de Territorio de Huila Toez - Caloto Huila
- Puente de El Cristo
- Puente de La María el Salvajino
- Puente de Avirama

Las autoridades indígenas y la comunidad hacen un llamado urgente a las instituciones competentes para atender la situación. Se solicita extrema precaución a quienes transiten por la región.

📍 Emergencia en desarrollo.

#Tierradentro #EmergenciaClimática #LluviasCauca #CRIC #NasaÇxhãçxha #DesastreNatural

Sucesos Tierradentro Noticias
3 de julio a las 10:13 a. m. ·

Reporte emergencia en Páez Cauca. Dos puentes colapsados y una mujer desaparecida por creciente súbita del río Páez

El reporte ante la alerta de desbordamiento y avalancha por la crecida del río Páez (Cauca) por el aumento de las lluvias en las últimas horas, es de dos puentes colapsados y una persona desaparecida; un puente peatonal sobre el río Símbola sector La Salvajina - El Guamo y un puente vehicular sobre la quebrada El Lucero al norte de Páez, jurisdicción del resguardo indígena de Vitoncó, así como de una mujer que cayó al río mientras observaba la creciente, debido a derrumbe de tierra según información se identificó como Valentina Chaux Chilito.

Además no hay paso en la vía transversal el libertador sector Patico por pérdida de banca.

La Alcaldía Municipal de Páez y los Organismos de Socorro hacen un llamado a las personas para que se mantengan alejadas de las riberas del río.

#NoticiaEnDesarrollo







Sucesos Tierradentro Noticias
3 de julio a las 12:13 p. m. ·

Belalcázar queda incomunicado con Popayán y el departamento del Huila, en el sector el Carmen en el resguardo de Cohetando la creciente del río Páez se llevó la banca de la vía de acceso a la cabecera municipal Belalcázar.



Noticias Tierradentro
4 de julio a las 9:38 p. m. ·

#Noticias| Vía totalmente incomunicada entre Cohetando y Belalcázar, municipio de Páez

La Alcaldía Municipal de Páez – Belalcázar informa a la comunidad en general que, debido a las fuertes lluvias y deslizamientos, la vía principal entre Cohetando centro y Belalcázar se encuentra totalmente incomunicada.

🔴 Ruta cerrada: Cohetando centro – Belalcázar.
✅ Rutas alternas habilitadas:

Para motocicletas: Guadualejo – Caloto – La Florida – La Palma – Belalcázar.

Para vehículos (carros): Ricaurte – Caloto – La Palma – Belalcázar.

Se recomienda tomar las debidas precauciones, evitar transitar por zonas de alto riesgo y mantenerse atentos a los comunicados oficiales.




Instituto Nacional de Vías - Invías
5 de julio a las 8:24 p. m. ·

⚠️ Cierre total en la vía Popayán – Inzá (Cauca)
📍 Municipio: Totoró – entre los km 60 y 60.7
🚧 Un movimiento en masa por falla rotacional mantiene cerrada la vía desde el 5 de julio.

👷 Avanzamos con:
🔹 Coordinación con el contratista
🔹 Monitoreo técnico en la zona
🔹 Construcción de paso alterno mediante corte de talud

🚛 Ruta alterna: Popayán – Santa Leticia – La Plata
📅 Apertura estimada: 7 de julio de 2025
#InvíasEstáEnLaVía #Cauca #GestiónDelRiesgo

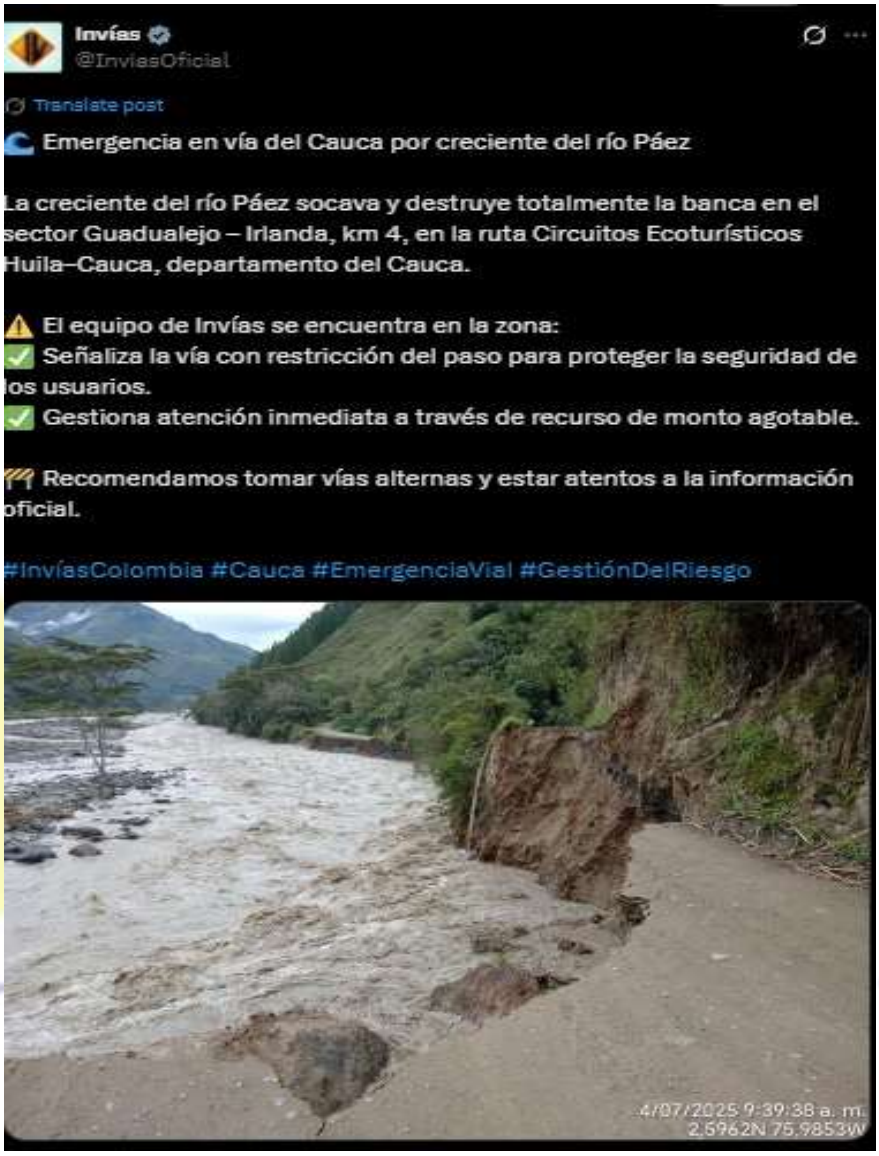


Invías
@InviasOficial
Translate post
Emergencia en vía del Cauca por creciente del río Páez
La creciente del río Páez socava y destruye totalmente la banca en el sector Guadualejo – Irlanda, km 4, en la ruta Circuitos Ecoturísticos Huila–Cauca, departamento del Cauca.
El equipo de Invías se encuentra en la zona:
Señaliza la vía con restricción del paso para proteger la seguridad de los usuarios.
Gestiona atención inmediata a través de recurso de monto agotable.
Recomendamos tomar vías alternas y estar atentos a la información oficial.
#InvíasColombia #Cauca #EmergenciaVial #GestiónDelRiesgo
4/07/2025 9:39:38 a. m.
2.5962N 75.9853W

El Ministerio de Transporte en coordinación con sus Entidades adscritas, ha dispuesto de todos sus recursos técnicos y operativos para la atención de los eventos o situaciones que han afectado nuestra infraestructura vial nacional a cargo de INVIAS y de la ANI.

Reporte de Emergencias

1. **Vigencia 2022 – 2025**

En lo que va corrido del 2025, con corte al 03 de julio de 2025, se han registrado **759** emergencias viales, **583** en la red no concesionada y **176** eventos en las vías nacionales concesionadas.

Durante el periodo de este Gobierno, se han registrado **2016 emergencias** en las carreteras a cargo del INVIAS. Actualmente tenemos **4 corredores con cierre total** y **3 cierres parciales** en la red a cargo de INVIAS; **0 cierres totales y 9 cierres parciales** en las vías concesionadas administradas por la ANI.

2. **Reportes durante el 03 de julio de 2025**

2.1. INVIAS

En las últimas 12 horas, se han presentado cierres totales por emergencias (movimientos en masa, pérdidas de banca, inundaciones, novedades en puentes, caída de material vegetal, sismos, entre otros) de la red vial primaria nacional no concesionada.

DT: HUILA
Departamento: Huila
Municipio: La Plata
Tipo de cierre: total
Localización:
Código Tramo: 3701
Nombre Ruta: Transversal Huila-Cauca
Sector: La Plata - Puerto Valencia
PR inicial: 74+0500
PR final: 74+0540
Tipo de evento: Pérdida de Banca

	**Descripción del Evento:** Cierre total debido a socavación por creciente del Río Páez, ocasionando pérdida de banca **Estado:** Cierre total en atención **Rutas Alternas:** Popayán-Patico- Puracé-Candelaria
Plan de Acción: • Cooperativa presente en el sector, realiza, señalización y control de tráfico sobre la calzada	
Fecha Estimada de Apertura: • En atención	

DT: HUILA
Departamento: Huila
Municipio: Isnos
Tipo de cierre: total
Localización:
Código Tramo: 2002
Nombre Ruta: Popayán - Paletara - San José de Isnos - Pitalito - San Agustín
Sector: Río Mazamorras - Sombrerillos
PR inicial: 82+0800
PR final: 82+0850
Tipo de evento: Movimiento en masa

	**Descripción del Evento:** Cierre total de la vía por deslizamiento de material sobre la calzada. **Estado:** Cierre total en atención **Rutas Alternas:** N.A
Plan de Acción: • Cooperativa presente en el sector, realiza, señalización, limpieza y retiro de material sobre la calzada, se solicitó apoyo al contratista 1006_2021, para remoción mecánica	
Fecha Estimada de Apertura: • En atención	
