| Cruz Roja Colombiana<br>Seccional Bolívar | **INFORME FINAL DE PROYECTO, CONTRATO O CONVENIO** |
|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. contrato o convenio** | No. CD-OAGRD-CONVASO-001-2024 | | | | |
| **Nombre Contratante** | Alcaldía Mayor de Cartagena | | | | |
| **Nombre y Cargo Supervisor** | Daniel Antonio Vargas Diaz, Jefe de Oficina Asesora para la Gestión Riesgos de Desastres | | | | |
| **Fecha inicio contrato o convenio** | 24/09/2024 | **Fecha inicio contrato o convenio** | 31/12/2024 | **Informe Parcial**<br>**Informe final** | <br>**X** |

1. Información del contrato o proyecto

| | |
|---|---|
| Objeto del Contrato | «AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA LA REALIZACION DE CARACTERIZACION CON GEOREFERENCIACION DE ASENTAMIENTOS EN LAS ZONAS RURAL, INSULAR Y URBANA PRIORIZADAS POR LA OFICINA ASESORA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES DE CARTAGENA, ESPECIALMENTE EN BARRIOS IDENTIFICADOS COMO ZONAS NO MITIGABLES Y DE ALTO RIESGO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA QUE PERMITA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y LA GESTIÓN DE DESASTRES EN LA CIUDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN CARTAGENA DE INDIAS» |
| Valor total del convenio | Doscientos Doce Millones Ochocientos Cincuenta y Siete Millones Ciento Cuarenta y Tres ($212.857.143) Pesos Mcte |
| Valor aporte de Cruz Roja | Sesenta y Tres Millones Ochocientos Cincuenta y Siete Mil Ciento Cuarenta y Tres pesos ($ 63.857.143) M/Cte. |
| Valor del aporte del distrito | Ciento Cuarenta y Nueve Millones de pesos ($ 149.000.000) M/Cte |
| No. Disponibilidad Presupuestal y fecha de expedición | CDP 195 del 11 de julio de 2024 |
| No. Registro Presupuestal y fecha de expedición | RP 367 del 19 de septiembre de 2024 |
| No. de Póliza | Póliza de Garantía Única de Cumplimiento No 440-47-994000028867<br>Póliza de Responsabilidad Civil 440-74-99400000-299 |


Barrio España, Cl. 30 No. 44 D - 71 Cartagena de Indias D., T. y C. Colombia Tel: +57 3172180488
email: bolivar@cruzrojacolombiana.org


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. contrato o convenio** | No. CD-OAGRD-CONVASO-001-2024 | | | | |
| **Nombre Contratante** | Alcaldía Mayor de Cartagena | | | | |
| **Nombre y Cargo Supervisor** | Daniel Antonio Vargas Diaz, Jefe de Oficina Asesora para la Gestión Riesgos de Desastres | | | | |
| **Fecha inicio contrato o convenio** | 24/09/2024 | **Fecha inicio contrato o convenio** | 31/12/2024 | **Informe Parcial** | |
| | | | | **Informe final** | **X** |

2. Ejecución del contrato

| OBLIGACIONES CONTRACTUALES | ACTIVIDADES DESARROLLADAS |
|---|---|
| 1. La ESAL, debe suministrar a su equipo humano los equipos tecnológicos (tabletas y/o celulares, para recolectar la información en el aplicativo y el Wi Fi, posterior para el cargue de la información del equipo a la base de datos correspondiente | Actividades desarrolladas en el marco de esta obligación: Revisión, instalación y actualización del aplicativo Kobocollect a los equipos dispuestos, por la Cruz Roja Colombiana Seccional Bolívar para el desarrollo de la actividad en terreno |
| 2. Toda la recolección se hará asistida tecnológicamente y no se podrá utilizar papel y luego digitalizar, porque así no se puede garantizar la georreferenciación de los predios, ni la autorización de uso de la información y los datos personales por parte de las personas encuestadas | Actividades desarrolladas en el marco de esta obligación: Revisión técnica del aplicativo Kobocollect junto con el personal técnico de OAGRD y personal técnico de la oficina de informática de la Alcaldía.<br>Revisión, instalación y actualización del aplicativo Kobocollect a los equipos dispuestos por la Cruz Roja Colombiana Seccional Bolívar para el desarrollo de la actividad en terreno. |
| 3. Aplicar, cinco mil ciento treinta y seis (5.136), fichas digitales de caracterización de asentamientos de alto riesgo de desastres usando la guía metodológica de asentamientos para el inventario de zonas de alto riesgo del Ministerio de Viviendas y el formato establecido por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD para la Evaluación de Daños, Necesidades y registro de familias, en las zonas más vulnerable de los sectores identificados por el Distrito a través de la Oficina Asesora de Gestión de Riesgo de Desastres - OAGRD. | Se completan las actividades de este punto de caracterización en las siguientes comunidades:<br>**Barrios** / **Total**<br>San Francisco — 1260<br>Torices sector la Unión — 36<br>Membrillal — 1167<br>El Pozón Sectores Nuevo Horizonte, La Unión, 20 de Enero y Los Ángeles — 280<br>Tierra Baja — 619<br>Cerro de Albornoz — 147<br>**Total** — **3.509** |


Barrio España, Cl. 30 No. 44 D - 71 Cartagena de Indias D., T. y C. Colombia Tel: +57 3172180488
email: bolivar@cruzrojacolombiana.org

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. contrato o convenio** | No. CD-OAGRD-CONVASO-001-2024 | | | | |
| **Nombre Contratante** | Alcaldía Mayor de Cartagena | | | | |
| **Nombre y Cargo Supervisor** | Daniel Antonio Vargas Diaz, Jefe de Oficina Asesora para la Gestión Riesgos de Desastres | | | | |
| **Fecha inicio contrato o convenio** | 24/09/2024 | **Fecha inicio contrato o convenio** | 31/12/2024 | **Informe Parcial** | |
| | | | | **Informe final** | **X** |

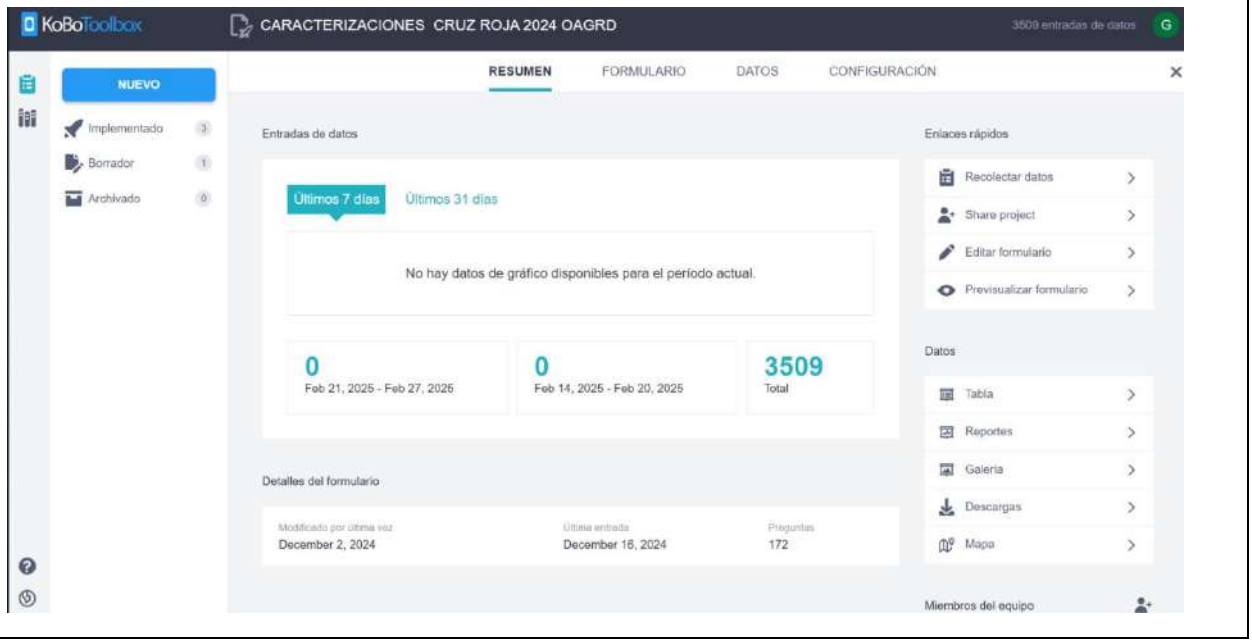


3. Reporte financiero:

En total se realizaron tres mil quinientas nueve (3.509) caracterizaciones con una inversión total de ciento cuarenta y cinco millones cuatrocientos dieciséis mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos m/l ($145.416.469.00). Con aportes de la alcaldía por ciento un millones setecientos noventa y un mil quinientos veintiocho pesos m/c ($101.791.528.00); equivalente al 70% de los aportes, y por la Cruz Roja Colombiana Seccional Bolívar por un valor de cuarenta y tres millones seiscientos veinticuatro mil novecientos cuarenta pesos m/c. ($43.624.940.00), equivalente al 30% restante.

El valor de la caracterización, sumados los dos aportes fue de cuarenta y un mil cuatrocientos cuarenta y un pesos m/c ($41.441.00).

En el siguiente cuadro se da la discriminación de los gastos:


Barrio España, Cl. 30 No. 44 D - 71 Cartagena de Indias D., T. y C. Colombia Tel: +57 3172180488
email: bolivar@cruzrojacolombiana.org

Cruz Roja Colombiana
Seccional Bolívar

# INFORME FINAL DE PROYECTO, CONTRATO O CONVENIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. contrato o convenio** | No. CD-OAGRD-CONVASO-001-2024 | | | | |
| **Nombre Contratante** | Alcaldía Mayor de Cartagena | | | | |
| **Nombre y Cargo Supervisor** | Daniel Antonio Vargas Diaz, Jefe de Oficina Asesora para la Gestión Riesgos de Desastres | | | | |
| **Fecha inicio contrato o convenio** | 24/09/2024 | **Fecha inicio contrato o convenio** | 31/12/2024 | **Informe Parcial** | |
| | | | | **Informe final** | **X** |

| ITEM | ACTIVIDAD | CANTIDAD | UNIDAD | APORTE ALCALDIA CARTAGENA | APORTE CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL BOLIVAR | TOTAL APORTES EJECUTADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECOLECCION, PREPARACION Y REVISION DE LA INFORMACION** | | | | | | |
| 1.1 | Sub-Actividad 1. Aplicación de tres mil quinientos nueve (3.509) fichas de caracterizaciones de asentamientos de alto riesgo de desastres, acorde a la guía metodológica "Asentamientos para el inventario de zonas de alto riesgo" del Ministerio de Viviendas, en zonas vulnerables del Distrito de Cartagena de Indias | | | | | |
| 1.1.1 | Talento Humano (Coordinador del proyecto, logístico, líder de zona, validadores y encuestadores) | 16 | personas | $51.868.443 | $22.229.332 | $74.097.776 |
| 1.1.2 | Logística y Transporte | GB | GB | $9.331.623 | $3.999.267 | $13.330.889 |
| 1.1.3 | Insumos y equipos | GB | GB | $9.621.908 | $4.123.675 | $13.745.583 |
| **VERIFICACION CARACTERIZACIONES** | | | | | | |
| 2 | Actividad 2. Verificación de la información recolectada para el inventario, de acuerdo con los campos y la obligatoriedad definida en la guía metodológica "Asentamientos para el inventario de zonas de alto riesgo" del Ministerio de Viviendas | | | | | |
| 2.1.1 | Talento Humano (Coordinador del proyecto, logístico, validadores) | 8 | personas | $10.458.152 | $4.482.065 | $14.940.217 |
| 2.1.2 | Logística y Transporte | GB | GB | $578.363 | $247.870 | $826.232 |
| 2.1.3 | Insumos y equipos | GB | GB | $302.790 | $129.767 | $432.557 |
| **VALIDACION** | | | | | | |
| 3 | Actividad 3. Elaboración y presentación de informes por cada una de las zonas afectadas y sectores caracterizadas, una vez terminado laS etapas de recolección y validación | | | | | |
| 2.1.1 | Talento Humano (Coordinador del proyecto, logístico, validadores) | 5 | personas | $4.244.019 | $1.818.865 | $6.062.884 |
| 2.1.2 | logística y Transporte | GB | GB | $3.339.340 | $1.431.147 | $4.770.488 |


Barrio España, Cl. 30 No. 44 D - 71 Cartagena de Indias D., T. y C. Colombia Tel: +57 3172180488
email: bolivar@cruzrojacolombiana.org

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. contrato o convenio** | No. CD-OAGRD-CONVASO-001-2024 | | | | |
| **Nombre Contratante** | Alcaldía Mayor de Cartagena | | | | |
| **Nombre y Cargo Supervisor** | Daniel Antonio Vargas Diaz, Jefe de Oficina Asesora para la Gestión Riesgos de Desastres | | | | |
| **Fecha inicio contrato o convenio** | 24/09/2024 | **Fecha inicio contrato o convenio** | 31/12/2024 | **Informe Parcial** | |
| | | | | **Informe final** | **X** |

| ITEM | ACTIVIDAD | CANTIDAD | UNIDAD | APORTE ALCALDIA CARTAGENA | APORTE CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL BOLIVAR | TOTAL APORTES EJECUTADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.3 | Insumos y equipos | GB | GB | $3.330.611 | $1.427.405 | $4.758.016 |
| **SUMINISTRO INFORME FINAL** | | | | | | |
| 2 | Actividad 4. Informe técnico detallado de las acciones realizadas, zonas identificadas, priorizadas y censadas junto con soporte información entregable en medio magnético. | | | | | |
| 2.1.1 | Talento Humano (Coordinador del proyecto, logístico, validadores) | 5 | personas | $3.935.050 | $1.686.450 | $5.621.501 |
| 2.1.2 | logística y Transporte | 6 | personas | $3.060.595 | $1.311.683 | $4.372.278 |
| 2.1.3 | Insumos y equipos | 6 | personas | $1.720.634 | $737.415 | $2.458.048 |
| **VALOR TOTAL** | | | | **$101.791.528** | **$43.624.940** | **$145.416.469** |
| **PARTICIPACIÓN** | | | | **70%** | **30%** | **100%** |
| **VALOR PONDERADO POR CARACTERIZACION OFERTADO** | | | | $29.009 | $12.432 | $41.441 |
| **CANTIDAD TOTAL DE CARACTERIZACIONES** | | | | 3509 | | |

4. Documentos y/o Registros Anexos

| DESCRIPCIÓN | SOPORTE |
|---|---|
| Certificado de interventoría | 1 |
| Certificado de aportes a seguridadsocial y parafiscales | 1 |
| Copia de contrato | 1 |
| Factura | 2 |


Barrio España, Cl. 30 No. 44 D - 71 Cartagena de Indias D., T. y C. Colombia Tel: +57 3172180488
email: bolivar@cruzrojacolombiana.org

Cruz Roja Colombiana
Seccional Bolívar

# INFORME FINAL DE PROYECTO, CONTRATO O CONVENIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. contrato o convenio** | No. CD-OAGRD-CONVASO-001-2024 | | | | |
| **Nombre Contratante** | Alcaldía Mayor de Cartagena | | | | |
| **Nombre y Cargo Supervisor** | Daniel Antonio Vargas Diaz, Jefe de Oficina Asesora para la Gestión Riesgos de Desastres | | | | |
| **Fecha inicio contrato o convenio** | 24/09/2024 | **Fecha inicio contrato o convenio** | 31/12/2024 | **Informe Parcial** | |
| | | | | **Informe final** | **X** |

| DESCRIPCIÓN | SOPORTE |
|---|---|
| Caracterizaciones realizadas y validadas | 3509 |

| CONCEPTO | Fecha | VALOR |
|---|---|---|
| Primer Pago Factura F1-18756 | 04/10/2024 | $ 59.600.000 |


Barrio España, Cl. 30 No. 44 D - 71 Cartagena de Indias D., T. y C. Colombia Tel: +57 3172180488
email: bolivar@cruzrojacolombiana.org

| Cruz Roja Colombiana<br>Seccional Bolívar | **ALCANCE INFORME FINAL DE PROYECTO, CONTRATO O CONVENIO** |
|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. contrato o convenio** | No. CD-OAGRD-CONVASO-001-2024 | | | | |
| **Nombre Contratante** | Alcaldía Mayor de Cartagena | | | | |
| **Nombre y Cargo Supervisor** | Daniel Antonio Vargas Diaz, Jefe de Oficina Asesora para la Gestión Riesgos de Desastres | | | | |
| **Fecha inicio contrato o convenio** | 24/09/2024 | **Fecha inicio contrato o convenio** | 31/12/2024 | **Informe Parcial**<br>**Informe final** | <br>**X** |

1. Información del contrato o proyecto

| | |
|---|---|
| Objeto del Contrato | «AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA LA REALIZACION DE CARACTERIZACION CON GEOREFERENCIACION DE ASENTAMIENTOS EN LAS ZONAS RURAL, INSULAR Y URBANA PRIORIZADAS POR LA OFICINA ASESORA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES DE CARTAGENA, ESPECIALMENTE EN BARRIOS IDENTIFICADOS COMO ZONAS NO MITIGABLES Y DE ALTO RIESGO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA QUE PERMITA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO Y LA GESTIÓN DE DESASTRES EN LA CIUDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO EN CARTAGENA DE INDIAS» |
| Valor total del convenio | Doscientos Doce Millones Ochocientos Cincuenta y Siete Millones Ciento Cuarenta y Tres ($212.857.143) Pesos Mcte |
| Valor aporte de Cruz Roja | Sesenta y Tres Millones Ochocientos Cincuenta y Siete Mil Ciento Cuarenta y Tres pesos ($ 63.857.143) M/Cte. |
| Valor del aporte del distrito | Ciento Cuarenta y Nueve Millones de pesos ($ 149.000.000) M/Cte |
| No. Disponibilidad Presupuestal y fecha de expedición | CDP 195 del 11 de julio de 2024 |
| No. Registro Presupuestal y fecha de expedición | RP 367 del 19 de septiembre de 2024 |
| No. de Póliza | Póliza de Garantía Única de Cumplimiento No 440-47-994000028867<br>Póliza de Responsabilidad Civil 440-74-99400000-299 |


Barrio España, Cl. 30 No. 44 D - 71 Cartagena de Indias D., T. y C. Colombia Tel: +57 3172180488
email: bolivar@cruzrojacolombiana.org

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. contrato o convenio** | No. CD-OAGRD-CONVASO-001-2024 | | | | |
| **Nombre Contratante** | Alcaldía Mayor de Cartagena | | | | |
| **Nombre y Cargo Supervisor** | Daniel Antonio Vargas Diaz, Jefe de Oficina Asesora para la Gestión Riesgos de Desastres | | | | |
| **Fecha inicio contrato o convenio** | 24/09/2024 | **Fecha inicio contrato o convenio** | 31/12/2024 | **Informe Parcial** | |
| | | | | **Informe final** | **X** |

2. Ejecución del contrato

Teniendo en cuenta que, dentro de las obligaciones contractuales del convenio, de la referencia, está "*Aplicar, cinco mil ciento treinta y seis (5.136), fichas digitales de caracterización de asentamientos de alto riesgo de desastres usando la guía metodológica de asentamientos para el inventario de zonas de alto riesgo del Ministerio de Viviendas y el formato establecido por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD para la Evaluación de Daños, Necesidades y registro de familias, en las zonas más vulnerable de los sectores identificados por el Distrito a través de la Oficina Asesora de Gestión de Riesgo de Desastres - OAGRD*" y se dio cumplimiento a un total de tres mil quinientas nueve (3.509) caracterizaciones en las mismas comunicades, es decir se realizaron 1.627 caracterizaciones menos, se da la siguiente claridad del menor o mayor número de caracterizaciones ejecutadas por barrio.

Es de aclarar que, durante la ejecución del convenio, se realizaron, entre otras las siguientes actividades en conjunto con la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo del Distrito – OAGRD:

- Conformación de una mesa de coordinación técnica y metodológica, para el seguimiento de la ejecución del convenio con el equipo de profesionales de la OAGRD de Cartagena.
- Aproximación al territorio, con los delegados de la OAGRD, para la verificación del asentamiento, delimitación de los sectores y coordinación con los líderes.
- Definir el cronograma de trabajo de campo. Este podía tener modificaciones de acuerdo con las necesidades que presente la OAGRD o por circunstancias presentadas en la zona a intervenir, como puede ser: emergencias, fuertes lluvias, no coordinación con la comunidad, entre otras. En este espacio, por determinación de la OAGRD se definía si se ampliaba, reducía el número de caracterizaciones o se determinada un nuevo sitio para realizar.
- Acompañamiento de funcionarios de la OAGRD durante la toma de la información de las caracterizaciones, en las zonas, con el fin de aclarar dudas de la comunidad, de la institución con el polígono de la zona entregado por la OAGRD.
- Cualquier instrucción de cambio o modificación en la ejecución se recibía desde los funcionarios de la OAGRD.


Barrio España, Cl. 30 No. 44 D - 71 Cartagena de Indias D., T. y C. Colombia Tel: +57 3172180488
email: bolivar@cruzrojacolombiana.org

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. contrato o convenio** | No. CD-OAGRD-CONVASO-001-2024 | | | | |
| **Nombre Contratante** | Alcaldía Mayor de Cartagena | | | | |
| **Nombre y Cargo Supervisor** | Daniel Antonio Vargas Diaz, Jefe de Oficina Asesora para la Gestión Riesgos de Desastres | | | | |
| **Fecha inicio contrato o convenio** | 24/09/2024 | **Fecha inicio contrato o convenio** | 31/12/2024 | **Informe Parcial** | |
| | | | | **Informe final** | **X** |

Con las anteriores acciones, en el siguiente cuadro resume el cumplimiento.

| Barrio | Asentamiento | Caracterizaciones Proyectada por la OAGRD | Caracterizaciones Ejecutadas con la aprobación de la OAGRD | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| San Francisco | San Francisco<br>Censo previo por emergencia | *500* | 1260 | 760 |
| Torices | Canal Juan Angola sector La Unión | *250* | 36 | -214 |
| Membrilla | Todo Membrillal | *1200* | 1167 | -33 |
| El Pozón | Umata o 5 febrero<br>14 de enero<br>Isla de León<br>20 de enero<br>Nuevo Horizonte<br>La Roca de Cristo | *2786* | 280 | -2.506 |
| Tierra Baja | Mar Rojo<br>Puerto<br>Palenquillo<br>La Pila | *400* | 619 | 219 |
| Cerros de Albornoz | | 0 | 147 | 147 |
| | | ***5136*** | ***3509*** | ***-1.627*** |

2.1. Barrio San Francisco: Inicialmente la información suministrada por la OAGRD, era de cubrir las familias afectadas por la ola invernal del 2010, y que se encontraban en la zona al momento. Sin embargo, como es de conocimiento, durante los últimos años los asentamientos humanos han aumentado en número de habitantes por diferentes situaciones sociales, lo que obligó en la primera reunión, con los líderes de la


Barrio España, Cl. 30 No. 44 D - 71 Cartagena de Indias D., T. y C. Colombia Tel: +57 3172180488
email: bolivar@cruzrojacolombiana.org

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. contrato o convenio** | No. CD-OAGRD-CONVASO-001-2024 | | | | |
| **Nombre Contratante** | Alcaldía Mayor de Cartagena | | | | |
| **Nombre y Cargo Supervisor** | Daniel Antonio Vargas Diaz, Jefe de Oficina Asesora para la Gestión Riesgos de Desastres | | | | |
| **Fecha inicio contrato o convenio** | 24/09/2024 | **Fecha inicio contrato o convenio** | 31/12/2024 | **Informe Parcial** | |
| | | | | **Informe final** | **X** |

comunidad a replantear el número a cubrir y el cual fue aprobado por la OAGRD y se dio inicio al proceso, arrojando el mayor número registrado.

2.2. Canal Juan Angola sector La Unión (Torices): La disminución del número de caracterizaciones se dio por la renuencia de la comunidad para ser caracterizada. En un principio con los funcionarios de la OAGRD, los líderes habían aceptado el proceso, sin embargo, cuando se dio inicio, varios pobladores expresaron, en ocasiones en forma contundente, la negativa a ser caracterizados. Se coordinó con los funcionarios, en terreno, suspender mientras de definía la situación, pero no se logró ningún consenso, obligando a cancelar la caracterización. Se alcanzó a realizar el número de caracterizaciones registradas.

2.3. Membrillal: Fueron 33 caracterizaciones menos, esto se da por lo que, al realizarse, por parte de la OAGRD el polígono de intervención y al ejecutar se puede ver una diferencia, en este caso fue un 2,75% menos, valor que no obedece a situaciones críticas.

2.4. El Pozón: Finalizado el periodo de caracterización en las fechas estipuladas abarcando solo 10% de las caracterizaciones programadas en la comunidad, es decir un total de 280 caracterizaciones. El número de viviendas encontradas no sobrepaso el número de las contempladas, esto por directriz de la OAGRD, quien comunico que solo se realizaran las viviendas que se encontraba cerca al canal que atraviesa esos sectores del pozón, con un máximo de 6 metros desde la borde del canal, por tal razón bajó el número en un principio establecido.

2.5. Tierra Baja: Igual situación que la presentada en el barrio San Francisco, donde el numero de habitantes que han llegado a la zona aumenta con el tiempo.

2.6. Cerros de Albornoz: Por situaciones de emergencias y, teniendo en cuenta que se venían presentando lluvias en la ciudad, y donde se presentan movimientos en masa


Barrio España, Cl. 30 No. 44 D - 71 Cartagena de Indias D., T. y C. Colombia Tel: +57 3172180488
email: bolivar@cruzrojacolombiana.org
