Gmail

Administración Terra ingenieros civiles <administracion.terra@terraingenierosciviles.com>

Confirmación Transacción CUS 1675150362

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 27 de septiembre de 2022, 17:44
Para: administracion.terra@terraingenierosciviles.com

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico:3811147

TRANSACCIÓN PSE - PSE PAGOS

FORMA DE PAGO

DATOS DEL PAGO

Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	27/09/2022
Ticket ID:	20970
Transacción/CUS:	1675150362
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	RENDIMIENTO FINANCIEROS CONTRATO 2247 DE 2021 MES DE JULIO 2022
Ciclo Transacción:	1
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	1004
Total:	22190.61
Total Iva:	0
No. Pago:	20970

* Transacciones sujetas a verificación

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-2 1 de 1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 11/11/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☑ (Indique si corresponde) **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐ (Indique si corresponde)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2247-2021 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No.: 699-000032-94 **BANCO** BANCOLOMBIA SUCURSAL: CALLE 100

ANTICIPO OTORGADO: 10,4 **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$ 150.000.000,00 (M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA. GRUPO 1

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	*ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de interventoría Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	NOMINA	$ 105.000.000,00	$ 104.168.916,00		$ 104.168.916,00	$ 831.084,00
2	DOTACIÓN OFICINA	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00		$ 2.000.000,00	$ -
3	ARRIENDO CAMPAMENTO	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00		$ 1.500.000,00	$ -
4	HONORARIOS ESPECIALISTAS	$ 30.000.000,00	$ 29.767.401,60		$ 29.767.401,60	$ 232.598,40
5	TRABAJO DE TOPOGRAFIA	$ 11.500.000,00	$ 11.500.000,00		$ 11.500.000,00	$ -
6	ENSAYO DE LABORATORIO					
7	APERTURA DE CUENTA					$ 150.000,00
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					$ 38.802,79
9	DESCUENTOS BANCARIOS					$ (845.541,63)
	TOTALES	$ 150.000.000,00	$ 148.936.317,60	$ -	$ 148.936.317,60	$ 406.943,56

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____): SEPTIEMBRE (Indicar el mes) $ 16.612,16 (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 38.802,79 (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
20968	$ 0,02		JUNIO	27/09/2022	$ 0,020
20970	$ 22.190,61		JULIO	27/09/2022	$ 22.190,630
20973	$ 16.612,16		AGOSTO	27/09/2022	$ 38.802,790

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-3)

NOTA:
Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Interventor de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor.**

Firma:
Nombre:JOEGE HERNANDO FORERO FORERO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:25202 -43747CND

Firma: Firmado digitalmente por ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES
Nombre: ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-153300 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
Interventoría
NIT 901.551.572-

CONCILIACION BANCARIA

Empresa:	CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
Nit	901.551.572-
Banco donde se posee la cuenta	**BANCOLOMBIA**
Oficina	
Ciudad	BOGOTA D.C.
Tipo de cuenta	
Corriente	-
Ahorros	X
Fondo Común o Fiduciario	-
Número de la cuenta	699 000032 94
Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación	**31/08/2022**

Saldo según libros **$ 149.953.071,65**

Menos: Cheques de Gerencia Solicitados y Retiros

Beneficiario	No. Documento	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
		10/08/2022	$ 89.162.056,00
		26/08/2022	$ 46.774.261,60
			$ -
			$ -
			$ -

$ -135.936.317,60

Mas: Notas crédito bancarias por Intereses liquidados por los saldo diarios, para reintegrar a INVIAS.

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
NC Intereses liquidados (Para Reintegrar a INVIAS)	**31/07/2022**	$ 16.612,16

$ 16.612,16

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
Pago Interbancario ANTICIPO INVIAS		$ -
		$ -
		$ -

$ -

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
ND Rte Fte		$ -
IMPUESTO4X1000	**31/08/2022**	$ 544.074,65
ND COMISION POR EXPEDICION CHQ GERENCIA	**31/08/2022**	$ 69.200,00
ND IVA POR COMISION	**31/08/2022**	$ 13.148,00
COMPRA LIBRETA AHORROS		$ -

$ -626.422,65

Total Saldo según Extracto **$ 13.406.943,56**

Reviso: _____

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/07/31 HASTA: 2022/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69900003294

SUCURSAL CALLE 100

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

AK 15 100 69 OF 306

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Soluciones para potenciar tu negocio
desde $0 de comisión.



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	149,953,071.65	*SALDO PROMEDIO*	$	77,325,298
TOTAL ABONOS	$	16,612.16	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	136,562,740.25	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	16,612.16
SALDO ACTUAL	$	13,406,943.56	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
9/08	ABONO INTERESES AHORROS			11,092.77	149,964,164.42
10/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-356,648.22	149,607,516.20
10/08	RETIRO LOCAL	CALLE 100	361441	-89,162,056.00	60,445,460.20
24/08	ABONO INTERESES AHORROS			4,968.23	60,450,428.43
25/08	ABONO INTERESES AHORROS			330.78	60,450,759.21
25/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-329.39	60,450,429.82
25/08	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-13,148.00	60,437,281.82
25/08	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-69,200.00	60,368,081.82
26/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-187,097.04	60,180,984.78
26/08	RETIRO LOCAL	CALLE 100	361442	-46,774,261.60	13,406,723.18
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			220.38	13,406,943.56
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Gmail

Administración Terra ingenieros civiles <administracion.terra@terraingenierosciviles.com>

Confirmación Transacción CUS 1675182648

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 27 de septiembre de 2022, 17:54
Para: administracion.terra@terraingenierosciviles.com

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico:3811147

TRANSACCIÓN PSE - PSE PAGOS

FORMA DE PAGO

DATOS DEL PAGO

Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	27/09/2022
Ticket ID:	20973
Transacción/CUS:	1675182648
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATO 2247 DE 2021 MES DE AGOSTO 2022
Ciclo Transacción:	1
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	1004
Total:	16612.16
Total Iva:	0
No. Pago:	20973

* Transacciones sujetas a verificación

Comprobante

de pago en línea



MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

BANCOLOMBIA S.A. bancolombia.com/sa
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Pago realizado por: Jorge Hernando Forero Forero

Nro. de factura: 20973

Descripción del pago: RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATO 2247 DE 2021 MES DE AGOSTO 2022

Nro. de referencia: 181.51.17.197

Nro. de referencia 2: 9015515723

Nro. de referencia 3:

Fecha y hora de la transacción: Martes 27 de Septiembre de 2022 05:52:45 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 16,612.16

Cuenta: *******8501

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 11/11/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO -I (Indique si corresponde) **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** (Indique si corresponde)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2247-2021 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No.: 699-000032-94 **BANCO** BANCOLOMBIA SUCURSAL: CALLE 100

ANTICIPO OTORGADO: 10,4 **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$** **150.000.000,00** **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA. GRUPO 1

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de interventoría Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	NOMINA	$ 105.000.000,00	$ 104.168.916,00	$ -	$ 104.168.916,00	$ 831.084,00
2	DOTACIÓN OFICINA	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00		$ 2.000.000,00	$ -
3	ARRIENDO CAMPAMENTO	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	$ -	$ 1.500.000,00	$ -
4	HONORARIOS ESPECIALISTAS	$ 30.000.000,00	$ 29.767.401,60	$ -	$ 29.767.401,60	$ 232.598,40
5	TRABAJO DE TOPOGRAFIA	$ 11.500.000,00	$ 11.500.000,00	$ -	$ 11.500.000,00	$ -
6	ENSAYO DE LABORATORIO		$ -	$ -	$ -	$ -
7	APERTURA DE CUENTA					$ 150.000,00
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					$ 39.904,69
9	DESCUENTOS BANCARIOS					$ (845.541,63)
	TOTALES	$ 150.000.000,00	$ 148.936.317,60	$ -	$ 148.936.317,60	$ 408.045,46

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____): OCTUBRE (Indicar el mes) $ 1.101,90 (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 39.904,69 (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
20968	$ 0,02		JUNIO	27/09/2022	$ 0,020
20970	$ 22.190,61		JULIO	27/09/2022	$ 22.190,630
20973	$ 16.612,16		AGOSTO	27/09/2022	$ 38.802,790
23304	$ 1.101,90		SEPTIEMBRE	3/11/2022	$ 39.904,690

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-3)

NOTA:
Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Interventor de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor.**

Firma:
Nombre:JOEGE HERNANDO FORERO FORERO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:25202 -43747CND

Firma: Firmado digitalmente por ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES
Nombre: ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-153300 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
Interventoría
NIT 901.551.572-

CONCILIACION BANCARIA

Empresa: CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
Nit 901.551.572-

Banco donde se posee la cuenta **BANCOLOMBIA**
Oficina
Ciudad BOGOTA D.C.

Tipo de cuenta
Corriente -
Ahorros X
Fondo Común o Fiduciario -

Número de la cuenta 699 000032 94

Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación **30/09/2022**

Saldo según libros **$ 13.406.943,56**

Menos: Cheques de Gerencia Solicitados y Retiros

Beneficiario	No. Documento	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -

$ -

Mas: Notas crédito bancarias por Intereses liquidados por los saldo diarios, para reintegrar a INVIAS.

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
NC Intereses liquidados (Para Reintegrar a INVIAS)	**30/09/2022**	$ 1.101,90

$ 1.101,90

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
Pago Interbancario ANTICIPO INVIAS		$ -
		$ -
		$ -

$ -

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
ND Rte Fte		$ -
IMPUESTO4X1000		$ -
ND COMISION POR EXPEDICION CHQ GERENCIA		$ -
ND IVA POR COMISION		$ -
COMPRA LIBRETA AHORROS		$ -

$ -

Total Saldo según Extracto **$ 13.408.045,46**

Reviso: _____

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/08/31 HASTA: 2022/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69900003294


SUCURSAL CALLE 100

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

AK 15 100 69 OF 306

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Soluciones para potenciar tu negocio
desde $0 de comisión.

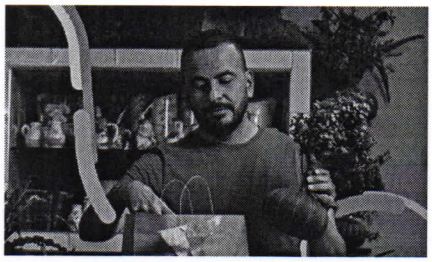

¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	13,406,943.56	*SALDO PROMEDIO*	$	13,406,980
TOTAL ABONOS	$	1,101.90	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	1,101.90
SALDO ACTUAL	$	13,408,045.46	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/09	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			1,101.90	13,408,045.46

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Gmail

Administración Terra ingenieros civiles <administracion.terra@terraingenierosciviles.com>

Resultado de una transacción - Multipagos PSE

1 mensaje

notificaciones@bancolombia.com <notificaciones@bancolombia.com> 3 de noviembre de 2022, 17:06
Para: administracion.terra@terraingenierosciviles.com

Notificación
de pago en línea

Has recibido una notificación correspondiente a una transacción realizada a través de pagos PSE de Bancolombia.

Pago realizado por: Jorge Hernando Forero Forero

Tienda virtual o recaudador: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Nro. de factura: 23304

Descripción del pago: RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO CONTRATO 2247 DE 2021 MES DE OCTUBRE 2022

Nro. de referencia: 181.63.105.35

Nro. de referencia 2: 901551572

Nro. de referencia 3:

Fecha y hora de la transacción: Jueves 3 de Noviembre de 2022 04:56:02 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 1,101.90

Cuenta: *******8501

Bancolombia S.A.


Ésta es una notificación automática, por favor no responda este mensaje

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico.
En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

Comprobante

de pago en línea

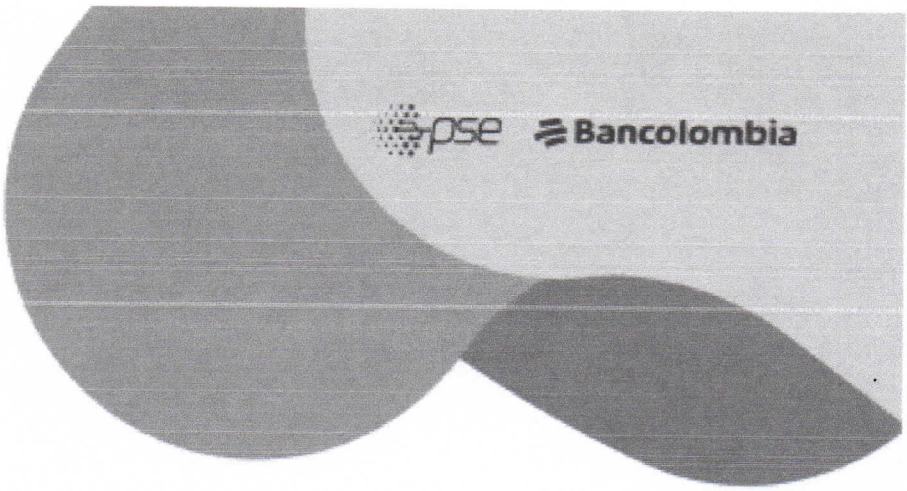

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Pago realizado por: Jorge Hernando Forero Forero

Nro. de factura: 23304

Descripción del pago: RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO CONTRATO 2247 DE 2021 MES DE OCTUBRE 2022

Nro. de referencia: 181.63.105.35

Nro. de referencia 2: 901551572

Nro. de referencia 3:

Fecha y hora de la transacción: Jueves 3 de Noviembre de 2022 04:56:02 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 1,101.90

Cuenta: *******8501

Bancolombia S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 11/11/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☑ (Indique si corresponde) **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐ (Indique si corresponde)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2247-2021 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No.: 699-000032-94 **BANCO** BANCOLOMBIA SUCURSAL: CALLE 100

ANTICIPO OTORGADO: 10,4 **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$ 150.000.000,00 (M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA. GRUPO 1

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de interventoría Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	NOMINA	$ 105.000.000,00	$ 104.168.916,00	$ -	$ 104.168.916,00	$ 831.084,00
2	DOTACIÓN OFICINA	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00		$ 2.000.000,00	$ -
3	ARRIENDO CAMPAMENTO	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	$ -	$ 1.500.000,00	$ -
4	HONORARIOS ESPECIALISTAS	$ 30.000.000,00	$ 29.767.401,60	$ -	$ 29.767.401,60	$ 232.598,40
5	TRABAJO DE TOPOGRAFIA	$ 11.500.000,00	$ 11.500.000,00	$ -	$ 11.500.000,00	$ -
6	ENSAYO DE LABORATORIO		$ -	$ -	$ -	$ -
7	APERTURA DE CUENTA					$ 150.000,00
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					$ 39.992,07
9	DESCUENTOS BANCARIOS					$ (897.541,63)
	TOTALES	$ 150.000.000,00	$ 148.936.317,60	$ -	$ 148.936.317,60	$ 356.132,84

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____): NOVIEMBRE $ 87,38
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 39.992,07
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
20968	$ 0,02		JUNIO	27/09/2022	$ 0,02
20970	$ 22.190,61		JULIO	27/09/2022	$ 22.190,63
20973	$ 16.612,16		AGOSTO	27/09/2022	$ 38.802,79
23304	$ 1.101,90		SEPTIEMBRE	3/11/2022	$ 39.904,69
24435	$ 87,38		OCTUBRE	17/11/2022	$ 39.992,07

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-3)

NOTA:
Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Interventor de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor.**

Firma:
Nombre:JOEGE HERNANDO FORERO FORERO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:25202 -43747CND

Firmado digitalmente por ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES
Firma:
Nombre: ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-153300 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
Interventoria
NIT 901.551.572-

CONCILIACION BANCARIA

Empresa:	CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
Nit	901.551.572-3
Banco donde se posee la cuenta	**BANCOLOMBIA**
Oficina	
Ciudad	BOGOTA D.C.
Tipo de cuenta	
Corriente	-
Ahorros	X
Fondo Común o Fiduciario	-
Número de la cuenta	699 000032 94
Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación	**31/10/2022**

Saldo según libros $ 13.408.045,46

Menos: Cheques de Gerencia Solicitados y Retiros

Beneficiario	No. Documento	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
Retiro Local	361444	03/10/2022	$ 13.000.000,00
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -

$ -13.000.000,00

Mas: Notas crédito bancarias por Intereses liquidados por los saldo diarios, para reintegrar a INVIAS.

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
NC Intereses liquidados (Para Reintegrar a INVIAS)	31/10/2022	$ 87,38

$ 87,38

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
Pago Interbancario ANTICIPÓ INVIAS		$ -
		$ -
		$ -

$ -

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
ND Rte Fte		$ -
IMPUESTO4X1000		$ 52.000,00
ND COMISION POR EXPEDICION CHQ GERENCIA		$ -
ND IVA POR COMISION		$ -
COMPRA LIBRETA AHORROS		$ -

$ -52.000,00

Total Saldo según Extracto $ 356.132,84

Reviso: _____

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/09/30 HASTA: 2022/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69900003294

SUCURSAL CALLE 100

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

AK 15 100 69 OF 306

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.



Conéctate con miles de empresas en Tu360Negocios, podrás publicar tus productos, necesidades y encontrar aliados, proveedores o clientes potenciales Conoce más en www.bancolombia.com/tu360/negocios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	13,408,045.46	SALDO PROMEDIO	$	1,198,181
TOTAL ABONOS	$	87.38	CUENTAS X COBRAR	$	.00
TOTAL CARGOS	$	13,052,000.00	VALOR INTERESES PAGADOS	$	87.38
SALDO ACTUAL	$	356,132.84	RETEFUENTE	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/10	ABONO INTERESES AHORROS			73.46	13,408,118.92
3/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-52,000.00	13,356,118.92
3/10	RETIRO LOCAL	CALLE 100	361444	-13,000,000.00	356,118.92
31/10	ABONO INTERESES AHORROS			13.92	356,132.84
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores "

PÁGINA: 1

Empresa: TERRA INGENIEROS CIV **Nit:** 860038275
Usuario: Jorge Hernando Forero Forero

17 de Noviembre de 2022 12:37:13 PM
Dirección IP: 181.51.106.143

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 16 de noviembre de 2022 - 3:20 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción

User id:	Carlos95
Fecha _ hora:	2022-11-17 12:29:25
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción

Tienda virtual o recaudador:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Número de factura:	24435
Nro. de referencia:	181.51.106.143
Nro. de referencia 2:	901551572-3
Descripción del pago:	RENDIMIENTO FINANCIERO ANTICIPO CONTRATO 2247 DE 2021 MES DE OCTUBRE 2022
Valor a pagar:	$87.38
Fecha y hora de la transacción:	2022-11-17 12:31:00
Cuenta a debitar:	193-145185-01
Número de comprobante:	0000073786
Id usuario aprobador:	Jorge196

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2022 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-2
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	1

FECHA: 05/04/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☑ (Indique si corresponde) **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐ (Indique si corresponde)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2247-2021 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No.: 699-000032-94 **BANCO** BANCOLOMBIA SUCURSAL: CALLE 100

ANTICIPO OTORGADO: 10,4 **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$ 150.000.000,00 (M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA. GRUPO 1

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de interventoría Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	NOMINA	$ 105.000.000,00	$ 104.168.916,00	$ -	$ 104.168.916,00	$ 831.084,00
2	DOTACIÓN OFICINA	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00		$ 2.000.000,00	$ -
3	ARRIENDO CAMPAMENTO	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	$ -	$ 1.500.000,00	$ -
4	HONORARIOS ESPECIALISTAS	$ 30.000.000,00	$ 29.767.401,60	$ -	$ 29.767.401,60	$ 232.598,40
5	TRABAJO DE TOPOGRAFIA	$ 11.500.000,00	$ 11.500.000,00	$ -	$ 11.500.000,00	$ -
6	ENSAYO DE LABORATORIO		$ -	$ -	$ -	$ -
7	APERTURA DE CUENTA					$ 150.000,00
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					$ 40.006,47
9	DESCUENTOS BANCARIOS					$ (897.541,63)
	TOTALES	$ 150.000.000,00	$ 148.936.317,60	$ -	$ 148.936.317,60	$ 356.147,24

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____): DICIEMBRE (Indicar el mes) $ 14,40 (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 40.006,47 (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
20968	$ 0,02		JUNIO	27/09/2022	$ 0,02
20970	$ 22.190,61		JULIO	27/09/2022	$ 22.190,63
20973	$ 16.612,16		AGOSTO	27/09/2022	$ 38.802,79
23304	$ 1.101,90		SEPTIEMBRE	3/11/2022	$ 39.904,69
24435	$ 87,38		OCTUBRE	17/11/2022	$ 39.992,07
32737	$ 14,40		NOVIEMBRE	28/03/2023	$ 40.006,47

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-3)

NOTA:
Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Interventor de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor.**

Firma:
Nombre:JOEGE HERNANDO FORERO FORERO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:25202 -43747CND

Firmado digitalmente por ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES
Firma:
Nombre: ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-153300 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
Interventoría
NIT 901.551.572-

CONCILIACION BANCARIA

Empresa: CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
Nit 901.551.572-3

Banco donde se posee la cuenta **BANCOLOMBIA**
Oficina
Ciudad BOGOTA D.C.

Tipo de cuenta
Corriente -
Ahorros X
Fondo Común o Fiduciario -

Número de la cuenta 699 000032 94

Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación **30/11/2022**

Saldo según libros **$ 356.132,84**

Menos: Cheques de Gerencia Solicitados y Retiros

Beneficiario	No. Documento	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -

$ -

Mas: Notas crédito bancarias por Intereses liquidados por los saldo diarios, para reintegrar a INVIAS.

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
NC Intereses liquidados (Para Reintegrar a INVIAS)	**30/11/2022**	$ 14,40

$ 14,40

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
		$ -
		$ -
		$ -

$ -

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
ND Rte Fte		$ -
IMPUESTO4X1000		$ -
ND COMISION POR EXPEDICION CHQ GERENCIA		$ -
ND IVA POR COMISION		$ -
COMPRA LIBRETA AHORROS		$ -

$ -

Total Saldo según Extracto **$ 356.147,24**

Reviso: _____

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/10/31 HASTA: 2022/11/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69900003294

SUCURSAL CALLE 100

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

AK 15 100 69 OF 306

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.



Conéctate con miles de empresas en Tu360Negocios, podrás publicar tus productos, necesidades y encontrar aliados, proveedores o clientes potenciales Conoce más en www.bancolombia.com/tu360/negocios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	356,132.84	*SALDO PROMEDIO*	$	356,132
TOTAL ABONOS	$	14.40	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	14.40
SALDO ACTUAL	$	356,147.24	*RETEFUENTE*	$	.00


FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/11	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			14.40	356,147.24

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores "

Comprobante

de pago en línea

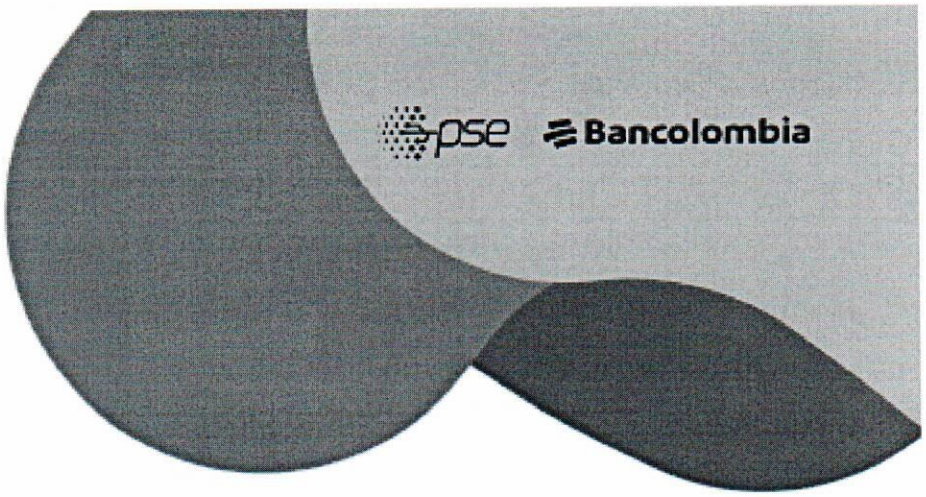

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Pago realizado por: Jorge Hernando Forero Forero

Nro. de factura: 32737

Descripción del pago: RENDIMIENTO FINANCIERO ANTICIPO CONTRATO 2247 DE 2021 MES DE NOVIEMBRE DE 2022

Nro. de referencia: 190.249.253.22

Nro. de referencia 2: 9015515723

Nro. de referencia 3:

Fecha y hora de la transacción: Martes 28 de Marzo de 2023 10:48:07 AM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 14.40

Cuenta: *******8501

VIGILADO

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

Empresa: TERRA INGENIEROS CIV **Nit:** 860038275
Usuario: Jorge Hernando Forero Forero

28 de Marzo de 2023 10:53:15 AM
Dirección IP: 190.249.253.22

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 27 de marzo de 2023 - 3:33 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	Carlos95
Fecha _ hora:	2023-03-28 10:49:00
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Número de factura:	32737
Nro. de referencia:	190.249.253.22
Nro. de referencia 2:	9015515723
Descripción del pago:	RENDIMIENTO FINANCIERO ANTICIPO CONTRATO 2247 DE 2021 MES DE NOVIEMBRE DE 2022
Valor a pagar:	$14.40
Fecha y hora de la transacción:	2023-03-28 10:51:23
Cuenta a debitar:	193-145185-01
Número de comprobante:	0000016521
Id usuario aprobador:	Jorge196

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2023 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **3811147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	3811147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	9015515723
Nombre del Obligado:	CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
Teléfono de Contacto:	3122958359
Correo Electrónico del Pagador:	administracion.terra@terraingenierosciviles.com
IP:	190.249.253.22

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	32737
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	28/03/2023
Ticket ID:	32737
Transacción/CUS:	1992603908
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada

DATOS DEL PAGO	
Concepto:	RENDIMIENTO FINANCIERO ANTICIPO CONTRATO 2247 DE 2021 MES DE NOVIEMBRE DE 2022
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	1004
Total:	14,40
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 05/04/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☑ (Indique si corresponde) **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐ (Indique si corresponde)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2247-2021 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No.: 699-000032-94 **BANCO** BANCOLOMBIA SUCURSAL: CALLE 100

ANTICIPO OTORGADO: 10,4 **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$ 150.000.000,00 (M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA. GRUPO 1

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de interventoría Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	NOMINA	$ 105.000.000,00	$ 104.168.916,00	$ -	$ 104.168.916,00	$ 831.084,00
2	DOTACIÓN OFICINA	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00		$ 2.000.000,00	$ -
3	ARRIENDO CAMPAMENTO	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	$ -	$ 1.500.000,00	$ -
4	HONORARIOS ESPECIALISTAS	$ 30.000.000,00	$ 29.767.401,60	$ -	$ 29.767.401,60	$ 232.598,40
5	TRABAJO DE TOPOGRAFIA	$ 11.500.000,00	$ 11.500.000,00	$ -	$ 11.500.000,00	$ -
6	ENSAYO DE LABORATORIO		$ -	$ -	$ -	$ -
7	APERTURA DE CUENTA					$ 150.000,00
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					$ 40.021,35
9	DESCUENTOS BANCARIOS					$ (897.541,63)
	TOTALES	$ 150.000.000,00	$ 148.936.317,60	$ -	$ 148.936.317,60	$ 356.162,12

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____): ENERO $ 14,88
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 40.021,35
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
20968	$ 0,02		JUNIO	27/09/2022	$ 0,02
20970	$ 22.190,61		JULIO	27/09/2022	$ 22.190,63
20973	$ 16.612,16		AGOSTO	27/09/2022	$ 38.802,79
23304	$ 1.101,90		SEPTIEMBRE	3/11/2022	$ 39.904,69
24435	$ 87,38		OCTUBRE	17/11/2022	$ 39.992,07
32737	$ 14,40		NOVIEMBRE	28/03/2023	$ 40.006,47
32738	$ 14,88		DICIEMBRE	28/03/2023	$ 40.021,35

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-3)

NOTA:
Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Interventor de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor.**

Firma:
Nombre:JOEGE HERNANDO FORERO FORERO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:25202 -43747CND

Firmado digitalmente por ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES
Firma:
Nombre: ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-153300 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
Interventoría
NIT 901.551.572-

CONCILIACION BANCARIA

Empresa: CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
Nit 901.551.572-3

Banco donde se posee la cuenta **BANCOLOMBIA**
Oficina
Ciudad BOGOTA D.C.

Tipo de cuenta
Corriente -
Ahorros X
Fondo Común o Fiduciario -

Número de la cuenta 699 000032 94

Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación **31/12/2022**

Saldo según libros **$ 356.147,24**

Menos: Cheques de Gerencia Solicitados y Retiros

Beneficiario	No. Documento	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -

$ -

Mas: Notas crédito bancarias por Intereses liquidados por los saldo diarios, para reintegrar a INVIAS.

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
NC Intereses liquidados (Para Reintegrar a INVIAS)	**31/12/2022**	$ 14,88

$ 14,88

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
		$ -
		$ -
		$ -

$ -

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
ND Rte Fte		$ -
IMPUESTO4X1000		$ -
ND COMISION POR EXPEDICION CHQ GERENCIA		$ -
ND IVA POR COMISION		$ -
COMPRA LIBRETA AHORROS		$ -

$ -

Total Saldo según Extracto **$ 356.162,12**

Reviso: _____

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/11/30 HASTA: 2022/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69900003294

SUCURSAL CALLE 100

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

AK 15 100 69 OF 306

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.



Conéctate con miles de empresas en Tu360Negocios, podrás publicar tus productos, necesidades y encontrar aliados, proveedores o clientes potenciales Conoce más en www.bancolombia.com/tu360/negocios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	356,147.24	*SALDO PROMEDIO*	$	356,147
TOTAL ABONOS	$	14.88	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	14.88
SALDO ACTUAL	$	356,162.12	*RETEFUENTE*	$	.00


FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/12	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			14.88	356,162.12

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores "

Comprobante

de pago en línea

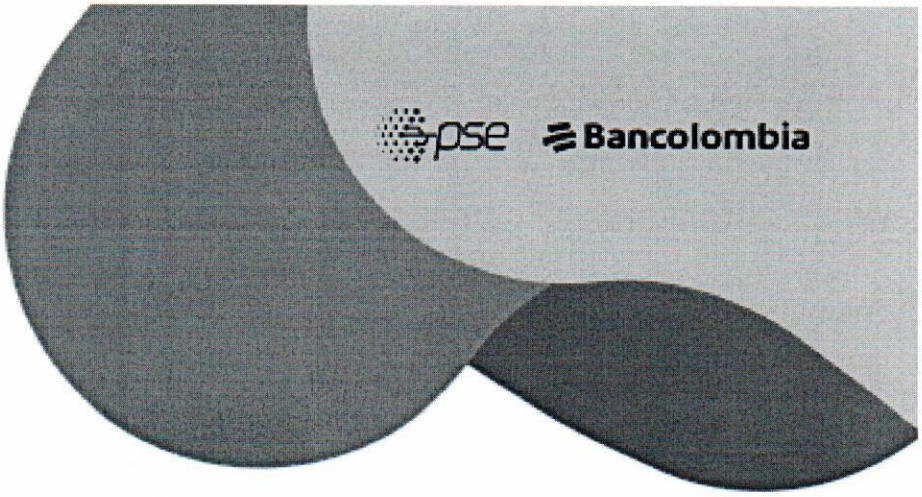

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Pago realizado por: Jorge Hernando Forero Forero

Nro. de factura: 32738

Descripción del pago: RENDIMIENTO FINANCIERO ANTICIPO CONTRATO 2247 DE 2021 MES DE DICIEMBRE DE 2022

Nro. de referencia: 190.249.253.22

Nro. de referencia 2: 9015515723

Nro. de referencia 3:

Fecha y hora de la transacción: Martes 28 de Marzo de 2023 10:58:40 AM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 14.88

Cuenta: *******8501

VIGILADO

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

Empresa: TERRA INGENIEROS CIV **Nit:** 860038275
Usuario: Jorge Hernando Forero Forero

28 de Marzo de 2023 11:07:59 AM
Dirección IP: 190.249.253.22

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 27 de marzo de 2023 - 3:34 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	Jorge196
Fecha _ hora:	2023-03-28 10:59:20
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Número de factura:	32738
Nro. de referencia:	190.249.253.22
Nro. de referencia 2:	9015515723
Descripción del pago:	RENDIMIENTO FINANCIERO ANTICIPO CONTRATO 2247 DE 2021 MES DE DICIEMBRE DE 2022
Valor a pagar:	$14.88
Fecha y hora de la transacción:	2023-03-28 11:03:50
Cuenta a debitar:	193-145185-01
Número de comprobante:	0000081901
Id usuario aprobador:	Carlos95

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2023 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **3811147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	3811147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	9015515723
Nombre del Obligado:	CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
Teléfono de Contacto:	3122958359
Correo Electrónico del Pagador:	administracion.terra@terraingenierosciviles.com
IP:	190.249.253.22

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	32738
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	28/03/2023
Ticket ID:	32738
Transacción/CUS:	1992628955
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada

DATOS DEL PAGO	
Concepto:	RENDIMIENTO FINANCIERO ANTICIPO CONTRATO 2247 DE 2021 MES DE DICIEMBRE DE 2022
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	1004
Total:	14,88
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 11/11/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☑ (Indique si corresponde) **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐ (Indique si corresponde)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2247-2021 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No.: 699-000032-94 **BANCO** BANCOLOMBIA SUCURSAL: CALLE 100

ANTICIPO OTORGADO: 10,4 **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$ 150.000.000,00 (M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA. GRUPO 1

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de interventoría Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	NOMINA	$ 105.000.000,00	$ 104.168.916,00	$ -	$ 104.168.916,00	$ 831.084,00
2	DOTACIÓN OFICINA	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00		$ 2.000.000,00	$ -
3	ARRIENDO CAMPAMENTO	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	$ -	$ 1.500.000,00	$ -
4	HONORARIOS ESPECIALISTAS	$ 30.000.000,00	$ 29.767.401,60	$ -	$ 29.767.401,60	$ 232.598,40
5	TRABAJO DE TOPOGRAFIA	$ 11.500.000,00	$ 11.500.000,00	$ -	$ 11.500.000,00	$ -
6	ENSAYO DE LABORATORIO		$ -	$ -	$ -	$ -
7	APERTURA DE CUENTA					$ 150.000,00
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					$ 40.036,23
9	DESCUENTOS BANCARIOS					$ (897.541,63)
	TOTALES	$ 150.000.000,00	$ 148.936.317,60	$ -	$ 148.936.317,60	$ 356.177,00

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____): FEBRERO (Indicar el mes) $ 14,88 (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 40.036,23 (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
20968	$ 0,02		JUNIO	27/09/2022	$ 0,02
20970	$ 22.190,61		JULIO	27/09/2022	$ 22.190,63
20973	$ 16.612,16		AGOSTO	27/09/2022	$ 38.802,79
23304	$ 1.101,90		SEPTIEMBRE	3/11/2022	$ 39.904,69
24435	$ 87,38		OCTUBRE	17/11/2022	$ 39.992,07
32737	$ 14,40		NOVIEMBRE	28/03/2023	$ 40.006,47
32738	$ 14,88		DICIEMBRE	28/03/2023	$ 40.021,35
32743	$ 14,88		ENERO	28/03/2023	$ 40.036,23

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-3)

NOTA:
Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Interventor de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor.**

Firma:
Nombre:JOEGE HERNANDO FORERO FORERO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:25202 -43747CND

Firmado digitalmente por ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES
Firma:
Nombre: ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-153300 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
Interventoría
NIT 901.551.572-

CONCILIACION BANCARIA

Empresa:	CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
Nit	901.551.572-3
Banco donde se posee la cuenta	BANCOLOMBIA
Oficina	
Ciudad	BOGOTA D.C.
Tipo de cuenta	
Corriente	-
Ahorros	X
Fondo Común o Fiduciario	-
Número de la cuenta	699 000032 94
Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación	31/01/2023

Saldo según libros **$ 356.162,12**

Menos: Cheques de Gerencia Solicitados y Retiros

Beneficiario	No. Documento	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -

$ -

Mas: Notas crédito bancarias por Intereses liquidados por los saldo diarios, para reintegrar a INVIAS.

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
NC Intereses liquidados (Para Reintegrar a INVIAS)	31/01/2023	$ 14,88

$ 14,88

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
		$ -
		$ -
		$ -

$ -

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
ND Rte Fte		$ -
IMPUESTO4X1000		$ -
ND COMISION POR EXPEDICION CHQ GERENCIA		$ -
ND IVA POR COMISION		$ -
COMPRA LIBRETA AHORROS		$ -

$ -

Total Saldo según Extracto **$ 356.177,00**

Reviso: _____

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/12/31 HASTA: 2023/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69900003294

SUCURSAL CALLE 100

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

AK 15 100 69 OF 306

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.



Conéctate con miles de empresas en Tu360Negocios, podrás publicar tus productos, necesidades y encontrar aliados, proveedores o clientes potenciales Conoce más en www.bancolombia.com/tu360/negocios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	356,162.12	*SALDO PROMEDIO*	$	356,162
TOTAL ABONOS	$	14.88	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	14.88
SALDO ACTUAL	$	356,177.00	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/01	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			14.88	356,177.00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Empresa: TERRA INGENIEROS CIV **Nit:** 860038275
Usuario: Jorge Hernando Forero Forero

28 de Marzo de 2023 11:24:19 AM
Dirección IP: 190.249.253.22

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 28 de marzo de 2023 - 11:01 AM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	Carlos95
Fecha _ hora:	2023-03-28 11:22:40
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Número de factura:	32743
Nro. de referencia:	190.249.253.22
Nro. de referencia 2:	9015515723
Descripción del pago:	RENDIMIENTO FINANCIERO ANTICIPO CONTRATO 2247 DE 2021 MES DE ENERO 2023
Valor a pagar:	$14.88
Fecha y hora de la transacción:	2023-03-28 11:24:03
Cuenta a debitar:	193-145185-01
Número de comprobante:	0000063836
Id usuario aprobador:	Jorge196

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2023 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **3811147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	3811147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	9015515723
Nombre del Obligado:	CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
Teléfono de Contacto:	3122958359
Correo Electrónico del Pagador:	administracion.terra@terraingenierosciviles.com
IP:	190.249.253.22

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	32743
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	28/03/2023
Ticket ID:	32743
Transacción/CUS:	1992684446
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada

DATOS DEL PAGO	
Concepto:	RENDIMIENTO FINANCIERO ANTICIPO CONTRATO 2247 DE 2021 MES DE ENERO 2023
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	1004
Total:	14,88
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 11/11/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☑ (Indique si corresponde) **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐ (Indique si corresponde)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2247-2021 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No.: 699-000032-94 **BANCO** BANCOLOMBIA SUCURSAL: CALLE 100

ANTICIPO OTORGADO: 10,4 **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$ 150.000.000,00 (M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA. GRUPO 1

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de interventoría Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	NOMINA	$ 105.000.000,00	$ 104.168.916,00		$ 104.168.916,00	$ 831.084,00
2	DOTACIÓN OFICINA	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00		$ 2.000.000,00	$ -
3	ARRIENDO CAMPAMENTO	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	$ -	$ 1.500.000,00	$ -
4	HONORARIOS ESPECIALISTAS	$ 30.000.000,00	$ 29.767.401,60		$ 29.767.401,60	$ 232.598,40
5	TRABAJO DE TOPOGRAFIA	$ 11.500.000,00	$ 11.500.000,00	$ -	$ 11.500.000,00	$ -
6	ENSAYO DE LABORATORIO		$ -	$ -	$ -	$ -
7	APERTURA DE CUENTA					$ 150.000,00
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					$ 40.049,67
9	DESCUENTOS BANCARIOS					$ (897.541,63)
TOTALES		$ 150.000.000,00	$ 148.936.317,60	$ -	$ 148.936.317,60	$ 356.190,44

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____): MARZO (Indicar el mes) $ 13,44 (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 40.049,67 (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
20968	$ 0,02		JUNIO	27/09/2022	$ 0,02
20970	$ 22.190,61		JULIO	27/09/2022	$ 22.190,63
20973	$ 16.612,16		AGOSTO	27/09/2022	$ 38.802,79
23304	$ 1.101,90		SEPTIEMBRE	3/11/2022	$ 39.904,69
24435	$ 87,38		OCTUBRE	17/11/2022	$ 39.992,07
32737	$ 14,40		NOVIEMBRE	28/03/2023	$ 40.006,47
32738	$ 14,88		DICIEMBRE	28/03/2023	$ 40.021,35
32743	$ 14,88		ENERO	28/03/2023	$ 40.036,23
32744	$ 13,44		FEBRERO	28/03/2023	$ 40.049,67

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-3)

NOTA:
Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Interventor de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor.**

Firma:
Nombre:JOEGE HERNANDO FORERO FORERO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:25202 -43747CND

Firma: Firmado digitalmente por ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES
Nombre: ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-153300 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
Interventoría
NIT 901.551.572-

CONCILIACION BANCARIA

Empresa: CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

Nit: 901.551.572-3

Banco donde se posee la cuenta: **BANCOLOMBIA**

Oficina:

Ciudad: BOGOTA D.C.

Tipo de cuenta

Corriente	-
Ahorros	X
Fondo Común o Fiduciario	-

Número de la cuenta: 699 000032 94

Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación: **28/02/2023**

Saldo según libros **$ 356.177,00**

Menos: Cheques de Gerencia Solicitados y Retiros

Beneficiario	No. Documento	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -

$ -

Mas: Notas crédito bancarias por Intereses liquidados por los saldo diarios, para reintegrar a INVIAS.

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
NC Intereses liquidados (Para Reintegrar a INVIAS)	**28/02/2023**	$ 13,44

$ 13,44

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
		$ -
		$ -
		$ -

$ -

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
ND Rte Fte		$ -
IMPUESTO4X1000		$ -
ND COMISION POR EXPEDICION CHQ GERENCIA		$ -
ND IVA POR COMISION		$ -
COMPRA LIBRETA AHORROS		$ -

$ -

Total Saldo según Extracto **$ 356.190,44**

Reviso: _____

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/01/31 HASTA: 2023/02/28

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69900003294

SUCURSAL CALLE 100

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

AK 15 100 69 OF 306

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.



Conéctate con miles de empresas en Tu360Negocios, podrás publicar tus productos, necesidades y encontrar aliados, proveedores o clientes potenciales Conoce más en www.bancolombia.com/tu360/negocios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	356,177.00	*SALDO PROMEDIO*	$	356,177
TOTAL ABONOS	$	13.44	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	13.44
SALDO ACTUAL	$	356,190.44	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/02	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			13.44	356,190.44

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Empresa: TERRA INGENIEROS CIV **Nit:** 860038275
Usuario: Jorge Hernando Forero Forero

28 de Marzo de 2023 11:34:50 AM
Dirección IP: 190.249.253.22

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 28 de marzo de 2023 - 11:23 AM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	Carlos95
Fecha _ hora:	2023-03-28 11:32:27
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada


Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Número de factura:	32744
Nro. de referencia:	190.249.253.22
Nro. de referencia 2:	9015515723
Descripción del pago:	RENDIMIENTO FINANCIERO ANTICIPO CONTRATO 2247 DE 2021 MES DE FEBRERO 2023
Valor a pagar:	$13.44
Fecha y hora de la transacción:	2023-03-28 11:34:03
Cuenta a debitar:	193-145185-01
Número de comprobante:	0000075162
Id usuario aprobador:	Jorge196

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2023 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

Comprobante

de pago en línea

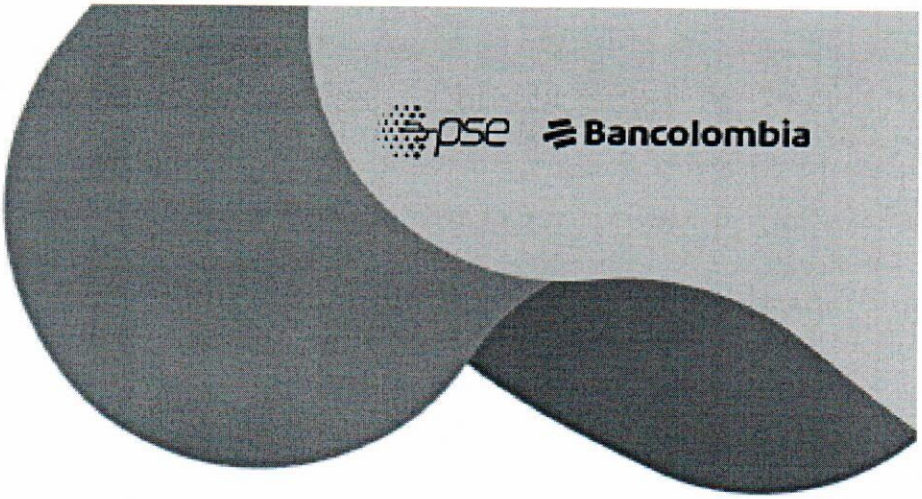

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

Pago realizado por: Jorge Hernando Forero Forero

Nro. de factura: 32744

Descripción del pago: RENDIMIENTO FINANCIERO ANTICIPO CONTRATO 2247 DE 2021 MES DE FEBRERO 2023

Nro. de referencia: 190.249.253.22

Nro. de referencia 2: 9015515723

Nro. de referencia 3:

Fecha y hora de la transacción: Martes 28 de Marzo de 2023 11:31:35 AM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 13.44

Cuenta: *******8501

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **3811147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	3811147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	9015515723
Nombre del Obligado:	CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
Teléfono de Contacto:	3122958359
Correo Electrónico del Pagador:	administracion.terra@terraingenierosciviles.com
IP:	190.249.253.22

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	32744
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	28/03/2023
Ticket ID:	32744
Transacción/CUS:	1992707948
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada

DATOS DEL PAGO	
Concepto:	RENDIMIENTO FINANCIERO ANTICIPO CONTRATO 2247 DE 2021 MES DE FEBRERO 2023
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	1004
Total:	13,44
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 25/04/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☑ (Indique si corresponde) **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐ (Indique si corresponde)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2247-2021 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No.: 699-000032-94 **BANCO** BANCOLOMBIA SUCURSAL: CALLE 100

ANTICIPO OTORGADO: 10,4 **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$ 150.000.000,00 (M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA. GRUPO 1

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de interventoría Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	NOMINA	$ 105.000.000,00	$ 104.168.916,00		$ 104.168.916,00	$ 831.084,00
2	DOTACIÓN OFICINA	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00		$ 2.000.000,00	$ -
3	ARRIENDO CAMPAMENTO	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	$ -	$ 1.500.000,00	$ -
4	HONORARIOS ESPECIALISTAS	$ 30.000.000,00	$ 29.767.401,60		$ 29.767.401,60	$ 232.598,40
5	TRABAJO DE TOPOGRAFIA	$ 11.500.000,00	$ 11.500.000,00	$ -	$ 11.500.000,00	$ -
6	ENSAYO DE LABORATORIO			$ -	$ -	$ -
7	APERTURA DE CUENTA					$ 150.000,00
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					$ 40.064,55
9	DESCUENTOS BANCARIOS					$ (897.541,63)
TOTALES		$ 150.000.000,00	$ 148.936.317,60	$ -	$ 148.936.317,60	$ 356.205,32

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____): ABRIL $ 14,88
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 40.064,55
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
20968	$ 0,02		JUNIO	27/09/2022	$ 0,02
20970	$ 22.190,61		JULIO	27/09/2022	$ 22.190,63
20973	$ 16.612,16		AGOSTO	27/09/2022	$ 38.802,79
23304	$ 1.101,90		SEPTIEMBRE	3/11/2022	$ 39.904,69
24435	$ 87,38		OCTUBRE	17/11/2022	$ 39.992,07
32737	$ 14,40		NOVIEMBRE	28/03/2023	$ 40.006,47
32738	$ 14,88		DICIEMBRE	28/03/2023	$ 40.021,35
32743	$ 14,88		ENERO	28/03/2023	$ 40.036,23
32744	$ 13,44		FEBRERO	28/03/2023	$ 40.049,67
34840	$ 14,88		MARZO	25/04/2023	$ 40.064,55

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-3)

NOTA:
Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Interventor de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor.**

Firma:
Nombre:JOEGE HERNANDO FORERO FORERO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:25202 -43747CND

Firma: Firmado digitalmente por ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES
Nombre: ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-153300 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
Interventoría
NIT 901.551.572-

CONCILIACION BANCARIA

Empresa:	CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
Nit	901.551.572-3
Banco donde se posee la cuenta	**BANCOLOMBIA**
Oficina	
Ciudad	BOGOTA D.C.
Tipo de cuenta	
Corriente	-
Ahorros	X
Fondo Común o Fiduciario	-
Número de la cuenta	699 000032 94
Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación	**31/03/2023**

Saldo según libros **$ 356.190,44**

Menos: Cheques de Gerencia Solicitados y Retiros

Beneficiario	No. Documento	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -

$ -

Mas: Notas crédito bancarias por Intereses liquidados por los saldo diarios, para reintegrar a INVIAS.

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
NC Intereses liquidados (Para Reintegrar a INVIAS)	**31/03/2023**	$ 14,88

$ 14,88

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
		$ -
		$ -
		$ -

$ -

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
ND Rte Fte		$ -
IMPUESTO4X1000		$ -
ND COMISION POR EXPEDICION CHQ GERENCIA		$ -
ND IVA POR COMISION		$ -
COMPRA LIBRETA AHORROS		$ -

$ -

Total Saldo según Extracto **$ 356.205,32**

Reviso: _____

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/02/28 HASTA: 2023/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 69900003294


SUCURSAL CALLE 100

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

AK 15 100 69 OF 306

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

Soluciones para potenciar tu negocio
desde $0 de comisión.

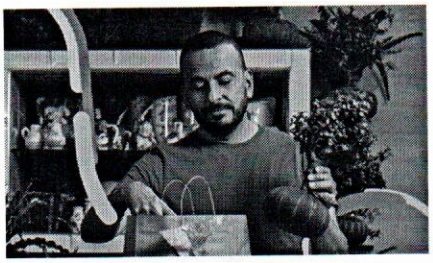

¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN


SALDO ANTERIOR	$	356,190.44	*SALDO PROMEDIO*	$	356,190
TOTAL ABONOS	$	14.88	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	14.88
SALDO ACTUAL	$	356,205.32	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/03	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			14.88	356,205.32

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Comprobante

de pago en línea

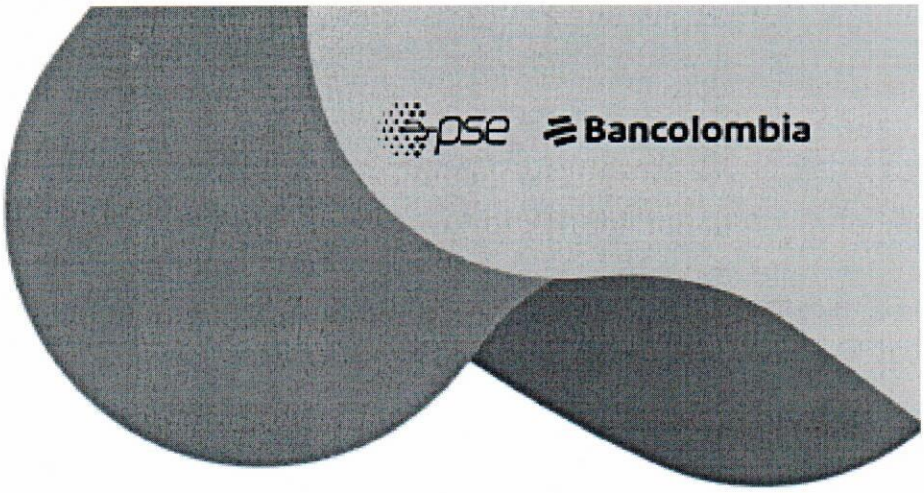

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Pago realizado por: Jorge Hernando Forero Forero

Nro. de factura: 34840

Descripción del pago: RENDIMIENTO FINANCIEROS ANTICIPO CONTRATO 2247 DE 2021 MES DE MARZO 2023

Nro. de referencia: 190.249.219.63

Nro. de referencia 2: 9015515723

Nro. de referencia 3:

Fecha y hora de la transacción: Martes 25 de Abril de 2023 04:26:13 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 14.88

Cuenta: *******8501

Consorcio Intermunicipios
Pago Rend. Financieros Marzo/23

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **3811147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	3811147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE

Identificación del Obligado:	9015515723
Nombre del Obligado:	CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
Teléfono de Contacto:	3166508003
Correo Electrónico del Pagador:	terraingenierosltda@gmail.com
IP:	190.249.219.63

DATOS DEL PAGO

FORMA DE PAGO

No. Pago:	34840
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	25/04/2023
Ticket ID:	34840
Transacción/CUS:	2043521032
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	RENDIMIENTO FINANCIEROS ANTICIPO CONTRATO 2247 DE 2021 MES DE MARZO 2023
Ciclo Transacción:	5

DATOS DEL PAGO	
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	1004
Total:	14,88
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 05/06/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** TOLIMA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☑ (Indique si corresponde) **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐ (Indique si corresponde)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2247-2021 (Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No.: 699-000032-94 **BANCO** BANCOLOMBIA SUCURSAL: CALLE 100

ANTICIPO OTORGADO: 10,4 **%**

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: **$ 150.000.000,00 (M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA. GRUPO 1

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de interventoría Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	NOMINA	$ 105.000.000,00	$ 104.168.916,00		$ 104.168.916,00	$ 831.084,00
2	DOTACIÓN OFICINA	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00		$ 2.000.000,00	$ -
3	ARRIENDO CAMPAMENTO	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	$ -	$ 1.500.000,00	$ -
4	HONORARIOS ESPECIALISTAS	$ 30.000.000,00	$ 29.767.401,60		$ 29.767.401,60	$ 232.598,40
5	TRABAJO DE TOPOGRAFIA	$ 11.500.000,00	$ 11.500.000,00	$ -	$ 11.500.000,00	$ -
6	ENSAYO DE LABORATORIO			$ -	$ -	$ -
7	APERTURA DE CUENTA					$ 150.000,00
8	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					$ 40.078,95
9	DESCUENTOS BANCARIOS					$ (897.541,63)
TOTALES		$ 150.000.000,00	$ 148.936.317,60	$ -	$ 148.936.317,60	$ 356.219,72

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____): MAYO (Indicar el mes) $ 14,40 (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 40.078,95 (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
20968	$ 0,02		JUNIO	27/09/2022	$ 0,02
20970	$ 22.190,61		JULIO	27/09/2022	$ 22.190,63
20973	$ 16.612,16		AGOSTO	27/09/2022	$ 38.802,79
23304	$ 1.101,90		SEPTIEMBRE	3/11/2022	$ 39.904,69
24435	$ 87,38		OCTUBRE	17/11/2022	$ 39.992,07
32737	$ 14,40		NOVIEMBRE	28/03/2023	$ 40.006,47
32738	$ 14,88		DICIEMBRE	28/03/2023	$ 40.021,35
32743	$ 14,88		ENERO	28/03/2023	$ 40.036,23
32744	$ 13,44		FEBRERO	28/03/2023	$ 40.049,67
34840	$ 14,88		MARZO	25/04/2023	$ 40.064,55
37491	$ 14,40		ABRIL	31/05/2023	$ 40.078,95

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-3)

NOTA:
Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Interventor de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor.**

Firma:
Nombre:JOEGE HERNANDO FORERO FORERO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:25202 -43747CND

Firma: Firmado digitalmente por ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES
Nombre: ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-153300 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
Interventoría
NIT 901.551.572-

CONCILIACION BANCARIA

Empresa:	CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
Nit	901.551.572-3
Banco donde se posee la cuenta	**BANCOLOMBIA**
Oficina	
Ciudad	BOGOTA D.C.
Tipo de cuenta	
Corriente	-
Ahorros	X
Fondo Común o Fiduciario	-
Número de la cuenta	699 000032 94
Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación	**30/04/2023**

Saldo según libros **$ 356.205,32**

Menos: Cheques de Gerencia Solicitados y Retiros

Beneficiario	No. Documento	Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -
			$ -

$ -

Mas: Notas crédito bancarias por Intereses liquidados por los saldo diarios, para reintegrar a INVIAS.

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
NC Intereses liquidados (Para Reintegrar a INVIAS)	**30/04/2023**	$ 14,40

$ 14,40

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
		$ -
		$ -
		$ -

$ -

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor
ND Rte Fte		$ -
IMPUESTO4X1000		$ -
ND COMISION POR EXPEDICION CHQ GERENCIA		$ -
ND IVA POR COMISION		$ -
COMPRA LIBRETA AHORROS		$ -

$ -

Total Saldo según Extracto **$ 356.219,72**

Reviso: _____

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **3104052770**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	3104052770
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	901551572
Nombre del Obligado:	CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
Teléfono de Contacto:	3166508003
Correo Electrónico del Pagador:	COMERCIAL@TERRAINGENIEROSCIVILES.COM
IP:	190.249.253.148

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	37491
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	31/05/2023
Ticket ID:	37491
Transacción/CUS:	2109787075
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/03/31 HASTA: 2023/04/30

CUENTA DE AHORROS


NÚMERO 69900003294

SUCURSAL CALLE 100

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

AK 15 100 69 OF 306

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.

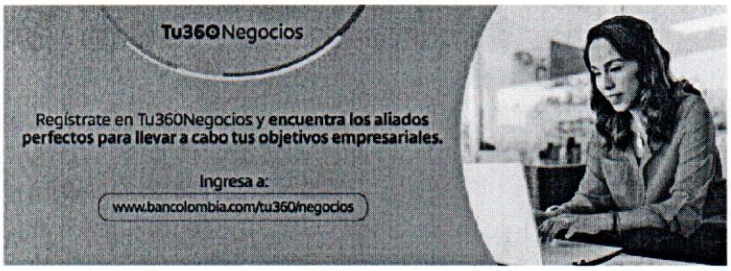

Regístrate en Tu360Negocios y encuentra los aliados perfectos para llevar acabo tus objetivos empresariales.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	356,205.32	*SALDO PROMEDIO*	$	356,205
TOTAL ABONOS	$	14.40	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	14.40
SALDO ACTUAL	$	356,219.72	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/04	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			14.40	356,219.72

ANEXO 20

Relación Correspondencia

CONVENIO No. 1131-21 alpujarra
CONTRATO No. 050-22

FECHA	OFICIO No.	DESTINATARIO	REMITENTE	ASUNTO	RADICADO No
Mayo					
31 de mayo de 2024					
			Comunicaciones Enviadas.		
3 de Mayo 2024	CIM-2247-21-1131-21-352	• Ing. Arnulfo Hernán Arias Díaz • Ing. Gilberto Martínez Agudelo (Secretario de planeación e infraestructura Municipio de Alpujarra)	• CONSORCIO INTERMUNICIPIOS -MARISOL AMAYA CORREA (Directora Interventoría)	Alcance a la Comunicación CIM-2247-21-1131-21-348 – Incumplimiento en la entrega Informe mensual SST abril 2024.	
7 de Mayo 2024	CIM-2247-21-1131-21-353	• Ing. Arnulfo Hernán Arias Díaz • C.C.: Ing. Lenin Tito Mendoza Peña (Director Territorial INVIAS) • Ing. Gilberto Martínez Agudelo (Secretario de planeación e infraestructura Municipio de Alpujarra)	• CONSORCIO INTERMUNICIPIOS -MARISOL AMAYA CORREA (Directora Interventoría)	Reiteración presentación Información Mensual.	
7 de Mayo 2024	CIM-2247-21-1131-21-354	• Ing. Arnulfo Hernán Arias Díaz • Ing. Gilberto Martínez Agudelo (Secretario de planeación e infraestructura Municipio de Alpujarra)	• CONSORCIO INTERMUNICIPIOS -MARISOL AMAYA CORREA (Directora Interventoría)	Respuesta a su comunicación OF-175-02-05-2024- Entrega Formatos Informe Mensual febrero 2024.	
7 de Mayo 2024	CIM-2247-21-1131-21-3555	• Ing. Arnulfo Hernán Arias Díaz • Ing. Gilberto Martínez Agudelo (Secretario de planeación e infraestructura Municipio de Alpujarra)	• CONSORCIO INTERMUNICIPIOS -MARISOL AMAYA CORREA (Directora Interventoría)	Respuesta a su comunicación OF-176-02-05-2024 - Entrega Formatos Informe Mensual abril 2024.	
9 de Mayo 2024	CIM-2247-21-1131-21-356	• Ing. Arnulfo Hernán Arias Díaz • Ing. Gilberto Martínez Agudelo (Secretario de planeación e infraestructura Municipio de Alpujarra)	• CONSORCIO INTERMUNICIPIOS -MARISOL AMAYA CORREA (Directora Interventoría)	Requerimiento de cumplimiento de Cláusulas contractuales y presentación de informes.	
10 de Mayo 2024	CIM-2247-21-1131-21-357	• Ing. Arnulfo Hernán Arias Díaz • Ing. Gilberto Martínez Agudelo (Secretario de planeación e infraestructura Municipio de Alpujarra)	• CONSORCIO INTERMUNICIPIOS -MARISOL AMAYA CORREA (Directora Interventoría)	Acta Parcial N°23 – Mes de abril 2024.	
16 de Mayo 2024	CIM-2247-21-1131-21-358	• Ing. Arnulfo Hernán Arias Díaz • Ing. Gilberto Martínez Agudelo (Secretario de planeación e infraestructura Municipio de Alpujarra)	• CONSORCIO INTERMUNICIPIOS -MARISOL AMAYA CORREA (Directora Interventoría)	Requerimientos pendientes para aval Acta Parcial N°2	
16 de Mayo 2024	CIM-2247-21-1131-21-359	• Ing. Arnulfo Hernán Arias Díaz • Ing. Gilberto Martínez Agudelo (Secretario de planeación e infraestructura Municipio de Alpujarra)	• CONSORCIO INTERMUNICIPIOS -MARISOL AMAYA CORREA (Directora Interventoría)	Inactividad actividad en la ejecución de obra.	
17 de Mayo 2024	CIM-2247-21-1131-21-360	• Ing. Arnulfo Hernán Arias Díaz • Ing. Gilberto Martínez Agudelo (Secretario de planeación e infraestructura Municipio de Alpujarra)	• CONSORCIO INTERMUNICIPIOS -MARISOL AMAYA CORREA (Directora Interventoría)	Socavación y Hundimiento de Cunetas en el Sector del Muro K3+600	
17 de Mayo 2024	CIM-2247-21-1131-21-361	• Ing. Arnulfo Hernán Arias Díaz • Ing. Gilberto Martínez Agudelo (Secretario de planeación e infraestructura Municipio de Alpujarra)	• CONSORCIO INTERMUNICIPIOS -MARISOL AMAYA CORREA (Directora Interventoría)	Remisión Acta Parcial de Obra N°22 V6- Febrero de 2024	
20 de Mayo 2024	CIM-2247-21-1131-21-362	• Ing. Arnulfo Hernán Arias Díaz • C.C.: Ing. Lenin Tito Mendoza Peña (Director Territorial INVIAS) • Ing. Gilberto Martínez Agudelo (Secretario de planeación e infraestructura Municipio de Alpujarra)	• CONSORCIO INTERMUNICIPIOS -MARISOL AMAYA CORREA (Directora Interventoría)	Observaciones Informe Ambiental – Informe Enero de 2024	
21 de Mayo 2024	CIM-2247-21-1131-21-363	• Ing. Gilberto Martínez Agudelo (Secretario de planeación e infraestructura Municipio de Alpujarra) • C.C.: Ing. Lenin Tito Mendoza Peña – Director Territorial Tolima INVIAS • Ing. Diego Caicedo – Gestor Técnico INVIAS	• CONSORCIO INTERMUNICIPIOS -MARISOL AMAYA CORREA (Directora Interventoría)	Estado de Avance de Obra	
22 de Mayo 2024	CIM-2247-21-1131-21-364	• Ing. Arnulfo Hernán Arias Díaz • Ing. Boanerges Caicedo (Director de obra) • C.C.: Ing. Lenin Tito Mendoza Peña (Director Territorial INVIAS) • Jairo Fernando Arguello Agudelo – Subdirector de Sostenibilidad – INVIAS-SS • Ing. Gilberto Martínez Agudelo (Secretario de planeación e infraestructura Municipio de Alpujarra) • David Tovar Guerrero –Alcalde municipal de Alpujarra • Jefferson Alberto Manrique Aya –Personero Municipal de Alpujarra • Carolina Giraldo Velásquez –Contraloría Departamental del Tolima	• CONSORCIO INTERMUNICIPIOS -MARISOL AMAYA CORREA (Directora Interventoría)	Segunda Reiteración de Gestión a Peticiones Abiertas.	
23 de Mayo 2024	CIM-2247-21-1131-21-365	• Ing. Arnulfo Hernán Arias Díaz • Ing. Gilberto Martínez Agudelo (Secretario de planeación e infraestructura Municipio de Alpujarra)	• CONSORCIO INTERMUNICIPIOS -MARISOL AMAYA CORREA (Directora Interventoría)	Solicitud presentación formatos Informe Mensual Mayo de 202	
24 de Mayo 2024	CIM-2247-21-1131-21-366	• ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALPUJARRA - Ing. Gilberto Martínez Agudelo- Secretaria de Planeación e Infraestructura Alpujarra, Tolima . • Ing. Lenin Tito Mendoza Peña – Director Territorial Tolima INVIAS • Ing. Diego Caicedo – Gestor Técnico INVIAS • Ing. Jorge Fernando Arguello U. – Subdirector Sostenibilidad INVIAS • Ing. Arnulfo Arias Días – Contratista.	• CONSORCIO INTERMUNICIPIOS -MARISOL AMAYA CORREA (Directora Interventoría)	Solicitud aplicación Sanciones Contrato de Obra N°050 de 2022 – Convenio N°1131-2021.	
27 de Mayo 2024	CIM-2247-21-1131-21-367	• Ing. Arnulfo Hernán Arias Díaz • Ing. Gilberto Martínez Agudelo (Secretario de planeación e infraestructura Municipio de Alpujarra)	• CONSORCIO INTERMUNICIPIOS -MARISOL AMAYA CORREA (Directora Interventoría)	Reiteración Presentación Planos Récord	
29 de Mayo 2024	CIM-2247-21-1131-21-368	• Ing. Arnulfo Hernán Arias Díaz • Ing. Gilberto Martínez Agudelo (Secretario de planeación e infraestructura Municipio de Alpujarra)	• CONSORCIO INTERMUNICIPIOS -MARISOL AMAYA CORREA (Directora Interventoría)	Acta de comité de obra N°22.	

Comunicaciones Recibidas.					
2 de Mayo 2024	OF-175-02-05-2024	• -MARISOL AMAYA CORREA (Directora Interventoria) • C.C.: - Secretario de planeación e infraestructura Municipio de Alpujarra (Ing. Ing. Gilberto Martínez Agudelo) -Supervisor	• Ing. Arnulfo Hernán Arias Díaz –ingearias27@hotmail.com	Entrega Formatos Informe Mensual Febrero de 2024 del Contrato de Obra No. 050-2022	No hay radicado
2 de Mayo 2024	OF-176-02-05-2024	• -MARISOL AMAYA CORREA (Directora Interventoria) • C.C.: - Secretario de planeación e infraestructura Municipio de Alpujarra (Ing. Ing. Gilberto Martínez Agudelo) -Supervisor	• Ing. Arnulfo Hernán Arias Díaz –ingearias27@hotmail.com	Entrega Formatos Informe Mensual Abril de 2024 del Contrato de Obra No. 050-2022,	No hay radicado
8 de Mayo 2024	• –ingearias27@hotmail.com -	• -MARISOL AMAYA CORREA (Directora Interventoria)	• Ing. Arnulfo Hernán Arias Díaz –ingearias27@hotmail.com	INFORME SST Febrero 2024	No hay radicado
9 de Mayo 2024	OF-177-09-05-2024	• -MARISOL AMAYA CORREA (Directora Interventoria)	• Ing. Arnulfo Hernán Arias Díaz –ingearias27@hotmail.com	Respuesta a oficio CIM-2247-21-1131-21-356, Contrato de Obra No 050 del 03 de febrero de 2022	No hay radicado
8 de Mayo 2024	• –ingearias27@hotmail.com -	• -MARISOL AMAYA CORREA (Directora Interventoria)	• Ing. Arnulfo Hernán Arias Díaz –ingearias27@hotmail.com	02 - ACTA PARCIAL No 23 V1 -PDF	No hay radicado
9 de Mayo 2024	• –ingearias27@hotmail.com	•consorciointermunicipios@gmail.com (Directora Interventoría) • C.C.: - secretariaplaneacion@alpujarra	• Ing. Arnulfo Hernán Arias Díaz –ingearias27@hotmail.com	ACTA PARCIAL No 23 -PDF	No hay radicado
9 de Mayo 2024	• –ingearias27@hotmail.com -	•consorciointermunicipios@gmail.com (Directora Interventoría) • C.C.: - secretariaplaneacion@alpujarra	• Ing. Arnulfo Hernán Arias Díaz –ingearias27@hotmail.com	• Planillas de febrero 2024. • Informe ambiental	No hay radicado
10 de Mayo 2024	• –ingearias27@hotmail.com -	•consorciointermunicipios@gmail.com (Directora Interventoría) • C.C.: - secretariaplaneacion@alpujarra	• Ing. Arnulfo Hernán Arias Díaz –ingearias27@hotmail.com	• Acta parcial 23-V6.5-2 PDF • 02 -Acta parcial 23-V6.5 Excel.	No hay radicado
15 de Mayo 2024	• –ingearias27@hotmail.com -	•consorciointermunicipios@gmail.com (Directora Interventoría) • C.C.: - secretariaplaneacion@alpujarra	• Ing. Arnulfo Hernán Arias Díaz –ingearias27@hotmail.com	• Acta parcial 23-V6.6 PDF • Memorias V6.6 PDF	No hay radicado
24 de Mayo 2024	2024E-VUVRAZ-047042	•consorciointermunicipios@gmail.com (Directora Interventoría)	• Correo ele	Solicitud aplicacion Sanciones Contrato de Obra N 050 de 2022 Convenio N 1131 2021.	No hay radicado
28 de Mayo 2024	SPEI-CE-0273	• Ing. Arnulfo Arias Dias – Contratista. ingearias27@hotmail.com	• ALCALDIA MUNICIPAL DE ...	Solicitud intervención del predio Finca Calarcá de la Vereda Guasimal.	No hay radicado

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS	Contrato No. 2247 de 2021. Objeto "Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Y Ambiental Para El Y Mejoramiento Y Mantenimiento De Vías Terciarias Del Programa “Colombia Rural” En Los Municipios Del Departamento Del Tolima Grupo 1"				
	CORRESPONDENCIA ENVIADA				
NOMBRE PROYECTO	**Contrato de Obra No. 167-2022 con Objeto : " Mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de corredores rurales en el municipio de Fresno departamento del Tolima, programa ¨Colombia Rural"**				
No. De Consecutivo	**Fecha de Carta**	**Enviado A**	**Referencia / Asunto**	**Elaborado Por**	**Fecha y Numero de Radicación**
CIM-2247-21-1133-21-229	3 de mayo de 2024	CONSORCIO FRESNO IC	Rpta. Correo 30-abr-24 - Plan de contingencia y Reprogramación N°10	MAC	Enviado el 03-05-24 sin anexos.
CIM-2247-21-1133-21-230	3 de mayo de 2024	CONSORCIO FRESNO IC	Compromisos Reunión y Recorrido 26-abr-24	MAC	Enviado el 03-05-24 sin anexos.
CIM-2247-21-1133-21-231	3 de mayo de 2024	CONSORCIO FRESNO IC	Estado avance de obra	MAC	Enviado el 03-05-24 sin anexos.
CIM-2247-21-1133-21-232	3 de mayo de 2024	CONSORCIO FRESNO IC	Alcance a la comunicación CIM-2247-21-1133-21-228 – Incumplimiento en la entrega del Informe mensual SST abril 2024.	DZC/MAC	Enviado el 03-05-24 sin anexos.
CIM-2247-21-1133-21-233	7 de mayo de 2024	CONSORCIO FRESNO IC	Estado avance de obra - Inactividad de obra.	LBMF/MAC	Enviado el 07-05-24 sin anexos.
CIM-2247-21-1133-21-234	7 de mayo de 2024	CONSORCIO FRESNO IC	Directrices para elaboración Informes Mensuales Seguimiento Ambiental	GYHO/MAC	Enviado el 07-05-24 sin anexos.
CIM-2247-21-1133-21-235	8 de mayo de 2024	DISTRITO JUDICIAL DE IBAGUÉ JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL -FRESNO	Respuesta oficio circular N°316 – Acción de Tutela -Héctor B. Escucha Barragán	MAC	Enviado el 08-05-24 con 5 anexos - Radicado Juzgado de recibo a las 9:57H. RAD. ALCALDÍA N°
CIM-2247-21-1133-21-236	9 de mayo de 2024	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Reiteración Solicitud aplicación Sanciones Contrato de Obra N°167 de 2022 – Convenio N°1133-2021	MAC	Enviado el 09-05-24 con anexos.
CIM-2247-21-1133-21-237	9 de mayo de 2024	CONSORCIO FRESNO IC	Compromisos Reunión y Recorrido 26-abr-24	MAC	Enviado el 09-05-24 sin anexos.
CIM-2247-21-1133-21-238	16 de mayo de 2024	CONSORCIO FRESNO IC	Estado avance de obra	LBMF/MAC	Enviado el 16-05-24 sin anexos.
CIM-2247-21-1133-21-239	22 de mayo de 2024	CONSORCIO FRESNO IC	Tercera Reiteración de Gestión a Peticiones Abiertas	FTA/MAC	Enviado el 22-05-24 sin anexos.
CIM-2247-21-1133-21-240	23 de mayo de 2024	CONSORCIO FRESNO IC	Solicitud presentación formatos Informe Mensual mayo de 2024.	LBMF/MAC	Enviado el 23-05-24 sin anexos.
CIM-2247-21-1133-21-241	24 de mayo de 2024	HECTOR ESCUCHA B.	Respuesta a su derecho de Petición.	FTA/MAC	Enviado el 24-05-24 sin anexos.
CIM-2247-21-1133-21-242	24 de mayo de 2024	CONSORCIO FRESNO IC	Solicitud aplicación Sanciones Contrato de Obra N°167 de 2022 – Convenio N°1133-2021	FTA/MAC	Enviado el 24-05-24 sin anexos.
CIM-2247-21-1133-21-243	4 de mayo de 2024	CONSORCIO FRESNO IC	Reiteración Solicitud presentación formatos Informe Mensual mayo de 2024.	MAC	Enviado el 4-06-24 sin anexos.

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS	Contrato No. 2247 de 2021. Objeto "Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Y Ambiental Para El Y Mejoramiento Y Mantenimiento De Vías Terciarias Del Programa “Colombia Rural” En Los Municipios Del Departamento Del Tolima Grupo 1"
	CORRESPONDENCIA RECIBIDA
NOMBRE PROYECTO	**Contrato de Obra No. 167-2022 con Objeto : " Mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de corredores rurales en el municipio de Fresno departamento del Tolima, programa ¨Colombia Rural"**

No. De Radicación	Fecha de Recibo	Procedencia	Contenido o Tema Tratado	ANEXOS			Requiere Respuesta		Se Contesto Con
				SI	Cantidad y Presentación	No	Si	No	
CFIC-OFI-336	3/05/2024	CONSORCIO FRESNO IC	Informe de Social abril de 2024	X	4 anexos				
CFIC-OFI-337	4/05/2024	CONSORCIO FRESNO IC	Soportes planillas sguridad social oct, nov y dic-2023	X	4 anexos				

ANEXO 21

Registros Fotográficos

REGISTRO FOTOGRÁFICO

INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERMUNICIPIOS	**CONTRATO NO.**	2247 DE 2021
CONTRATISTA DE OBRA	ING. ARNULFO HERNAN ARIAS DIAZ	**CONTRATO NO.**	050 DE 2022
NOMBRE DEL PROYECTO	VIA LAS DELICIAS-ALPUJARRA		



No se realiza ninguna actividad en el Sector No1. K00+000 –K00+480.



No se realiza ninguna actividad en el Sector No1. K00+000 –K00+480.



No se realiza ninguna actividad en el Sector No3. K01+823 –K0+350.



No se realiza ninguna actividad en el Sector No3. K01+823 –K0+350.



Ser realiza suministro e instalación de Cuneta de Concreto Vaciada In Situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo y acero en el sector No4. K3+600.



No se realiza ninguna actividad desde el 11-may-2024.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Ser realiza suministro e instalación de Cuneta de Concreto Vaciada In Situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo y acero en el sector No6. K14+150. Construcción bordillo..	No se realiza ninguna actividad desde el 11-may-2024.
	
No se realiza ninguna actividad en obra, está pendiente mejorar base granular y aplicación de mezcla asfáltica. sector No6. K14+500 hasta K14+640.	No se realiza ninguna actividad en obra, está pendiente mejorar base granular, aplicación de mezcla asfáltica y limpieza. sector No6. K14+500 hasta K14+640.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERMUNICIPIOS	**CONTRATO N°**	2247 DE 2021
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO FRESNO IC	**CONTRATO N°**	167 DE 2022
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN EL MUNICIPIO DE FRESNO DEPARTAMENTO DE TOLIMA - COLOMBIA RURAL, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO No. 1133 – 2021 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y EL MUNICIPIO DE FRESNO.		



Muro Gavión K2+870 Acopio de material-piedra para construcción gaviones



Muro Gavión K2+870 Construcción gaviones



Reunión y recorrido proyecto 15-may-2024 Contratista e Interventoría



Muro Gavión K2+870 Construcción gaviones

REGISTRO FOTOGRÁFICO

INTERVENTORÍA	CONSORCIO INTERMUNICIPIOS	**CONTRATO N°**	2247 DE 2021
CONTRATISTA DE OBRA	CONSORCIO FRESNO IC	**CONTRATO N°**	167 DE 2022
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN EL MUNICIPIO DE FRESNO DEPARTAMENTO DE TOLIMA - COLOMBIA RURAL, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO No. 1133 – 2021 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y EL MUNICIPIO DE FRESNO.		



Muro gavión K2+870 Construcción gaviones



Muro gavión K2+870 Construcción gaviones muro



K0+450 a K0+630 Construcción bordillos y cunetas



K0+450 a K0+630 Construcción bordillos y cunetas

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: Noviembre 2022 | **DIRECCIÓN:** CORREDOR VIAL RURAL - MUNICIPIO DE ALPUJARRA, PUENTE LAS DELICIAS. | **ELABORADO POR:** DILAN ZABALA | **NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES :** 06

PROCESO	ZONA - LUGAR	CARGOS	ACTIVIDADES	TAREAS	RUTINARIO (SI O NO)	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACION DEL RIESGO							VALORACION DEL RIESGO	CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES			MEDIDAS DE INTERVENCION				
						DESCRIPCION	CLASIFICACION		FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE PROBABILIDAD ND X NE	INTERPERTACION DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO NR E INTERVENCION	INTERPRETACION DEL NR	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	NUMERO DE EXPUESTOS	PEOR CONSECUENCIA	EXISTENCIA REQUISITO LEGAL ESPECIFICO SI o NO	ELIMINACION	SUSTITUCION	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, SEÑALIZACION, ADVERTENCIA	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
					SI	**Exposición a niveles altos de ruido**	**FISICO**	Reducción de la percepción, interferencia en las comunicaciones, afectación sobre la capacidad auditiva.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	6	3	18	**ALTO**	100	1800	I	**NO ACEPTABLE**	6	La muerte	Resolución 0627 del 2006 Resolución 2400 de 1979	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Capacitar al personal con el fin de generar conciencia sobre los riesgos a los cuales se expone el personal en las zonas donde se presentan altos índices de ruido. Impartir medidas de prevención con el fin de que el personal evite la exposición prolongada en las zonas donde se evidencien altos índices de ruido.	Utilización de Tapa oídos de copa o de inserción.
					SI	**Exposición a temperaturas extremas** (calor) (frio) (precipitaciones)	**FISICO**	**Calor:** Estrés, fatiga, síndrome por golpe de calor, deshidratación. **Precipitaciones:** Exposición al frio, infecciones respiratorias, otitis, neumonía entre otras enfermedades.	Ninguno	Ninguno	Actividad de hidratación al personal.	2	3	6	**MEDIO**	25	150	II	**ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO**	6	Golpe de calor. Enfermedades que requieren incapacidad laboral temporal	Decreto 1281 de 1994	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Concientizar al personal sobre la importancia de estarse hidratando constantemente. Concientizar al personal con el fin de realizar pausas activas. Garantizar que se cumpla la actividad de hidratación sobre el personal. Concientizar al personal con el fin de que no se exponga en caso de presentarse precipitaciones en campo.	Utilización de sombrilla e impermeables en caso de ser necesario.
					SI	**Exposición a Vibraciones**	**FISICO**	Lumbalgias, alteraciones discales, neuropatías.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	1	2	**BAJO**	10	20	IV	**ACEPTABLE**	6	Efectos perniciosos sobre la columna vertebral.	Norma iso 2631 Resolución 2400 de 1979	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Concientizar al personal sobre las medidas de prevención a tener en cuenta en las zonas donde estén operando las maquinas que produzcan vibraciones al momento de operar.	NO APLICA
					SI	**Exposición a radiación no ionizante** (Rayos Solares).	**FISICO**	Alteración sobre la visión, manchas en la piel, envejecimiento prematuro de la piel.	Ninguno	Ninguno	Utilización de Dotación y elementos de protección personal.	6	2	12	**ALTO**	10	120	III	**MEJORABLE**	6	Cáncer de piel.	Proyecto de ley 129 de 2016.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Concientizar al personal para que en lo posible evite la exposición sobre los rayos solares. Concientizar al personal para que utilice la dotación y los elementos de protección personal en busca de evitar el contacto prolongado de los rayos solares sobre la piel. Concientizar al personal con el fin de que utilicen protector solar. Concientizar al personal para que realicen pausas activas buscando ubicarse bajo la sombra en los momentos donde los rayos solares se evidencian demasiado fuertes.	Entrega de Dotación y (EPPS) con el fin de evitar la exposición de los rayos solares sobre la piel.
					SI	**Exposición a material particulado** (polvo)	**QUIMICO**	Alergia, molestias respiratorias, malestar general	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	**BAJO**	25	100	III	**MEJORABLE**	6	Enfermedades cardiacas o pulmonares.	Resolución 2254 del 2017	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Concientizar al personal con el fin de que en lo posible eviten la exposición a la proliferación de material particulado. Concientizar al personal para que utilicen el tapabocas y las gafas en caso de verse expuestos a un alto índice de proliferación de material particulado.	Utilización de Tapabocas y gafas de seguridad.
					SI	**Exposición a sustancias químicas, líquidas, gases y vapores y humos.**	**QUIMICO**	Neumonitis por hipersensibilidad, alergias, intoxicaciones.	Sustancias químicas suministradas por proveedores que garantizan sus condiciones mínimas de seguridad.	Ninguno	Productos químicos con sus respectivas fichas de seguridad.		1		**BAJO**	10	0	IV	**ACEPTABLE**	6	Infección pulmonar.	Decreto 1973 de 1995	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Concientizar al personal sobre las medidas preventivas a tener en cuenta a la hora de manipular sustancias químicas Concientizar al personal sobre las medidas preventivas a tener en cuenta al momento de sentirse expuestos sobre humos y vapores. Concientizar al personal sobre los riesgos a la salud que puede generar la exposición sobre sustancias químicas solidas, líquidas, gases y vapores. Concientizar al personal sobre el almacenamiento correcto y el transporte de sustancias químicas.	Utilización de los elementos de protección personal y la dotación correspondiente de acuerdo a lo indicado en las fichas de seguridad de cada producto.
					SI	**Exposición a virus, bacterias, hongos.**	**BIOLOGICO**	Infecciones, alergias, y efectos tóxicos o intoxicaciones.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	8	**MEDIO**	25	200	II	**ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO**	6	Patologías o enfermedades que requieran incapacidad temporal.	Ley 9 de 1979	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Implementación del programa de orden y aseo. Capacitación al personal sobre las consecuencias por exposición ante este tipo de riesgo y las medidas preventivas a tener en cuenta. Implementación del programa de recolección de residuos y disposición final.	Utilización del tapabocas en caso de evidenciar la presencia de virus sobre el entorno laboral.
					SI	**Exposición a vegetales y animales**	**BIOLOGICO**	Picaduras, mordeduras, reacciones alérgicas ante la cobertura vegetal.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	6	2	12	**ALTO**	25	300	II	**ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO**	6	Muerte	Ley 9 de 1979	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Capacitación al personal sobre las consecuencias por exposición ante este tipo de riesgo y las medidas preventivas a tener en cuenta. Tener a disposición el kit de emergencia ante un posible evento que requiera atención de primeros auxilios.	NO APLICA

OPERATIVO

MUNICIPIO ALPUJARRA

DIRECTOR DE OBRA, INGENIERO RESIDENTE, INSPECTOR SST, PROFESIONAL SOCIAL, INGENIERO AMBIENTAL, TOPOGRAFA

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental para el mejoramiento y mantenimiento de vías terciarias del programa "Colombia Rural" en los municipios del Departamento del Tolima Grupo 1.

1. INSPECCIONAR QUE EL CONTRATISTA EJECUTE SUS ACTIVIDADES DE OBRA, CUMPLIENDO LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS EN LAS PARTES: TECNICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

SI	**Presencia de maquinaria, equipos y herramientas.**	**MECANICO**	Golpes, cortes, laceraciones, aplastamiento, amputaciones.	Ninguno	Ninguno	Licencia de conducción y certificados competentes como operadores de maquinaria.	6	3	18	**ALTO**	100	1800	I	**NO ACEPTABLE**	6	La Muerte	Resolución 2400 de 1979	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Concientizar al personal sobre los riesgos a los cuales se exponen ante la presencia de equipos maquinaria y vehículos en la obra. Concientizar al personal sobre las medidas de prevención que se deben de tener en cuenta ante la operación de equipos vehículos y maquinaria. Implementar la actividad de inspección (preoperacionales) de equipos, vehículos y maquinaria con el fin de garantizar su correcto funcionamiento como medida de prevención ante cualquier incidente y accidente que se pueda llegar a presentar. En el diligenciamiento de los (ATS) describir el procedimiento seguro para el desarrollo de las actividades de obra teniendo en cuenta la presencia de los equipos, vehículos y maquinaria que se encuentre presente en la obra. Establecer un procedimiento seguro para ubicar los equipos, los vehículos y la maquinaria dentro de la obra.	NO APLICA
SI	**Superficies lisas o irregulares** (Caídas del mismo o de diferente nivel)	**LOCATIVO**	Contusiones, torceduras, lesiones, fracturas.	Ninguno	Ninguno	Certificado vigente para trabajo seguro en alturas.	6	3	18	**ALTO**	100	1800	I	**NO ACEPTABLE**	6	La Muerte	Resolución 2400 de 1979	NO APLICA	NO APLICA	En las excavaciones que se realicen y generen riesgo de caída de diferente nivel, se deben de instalar sistemas de acceso que brinden seguridad para el ascenso y descenso de los trabajadores.	Concientizar al personal con el fin de que sean precavidos al desplazarse dentro de la obra. Concientizar al personal con el fin de prevenirlos ante los actos inseguros que no se deben de cometer dentro de la obra. Concientizar al personal con el fin de tener claro la definición de condición insegura y como prevenir un accidente o incidente ante esta condición. Implementar los permisos de trabajo y los ATS con el fin de establecer un procedimiento seguro para los trabajos que se consideren trabajo en alturas según la normatividad vigente. Exigir y verificar los soportes de los certificados de trabajo en alturas vigentes, en caso de que los trabajadores necesiten realizar actividades sobre alturas o profundidades mayores a dos metros sobre el nivel del terreno estable. Verificar que las condiciones inseguras que se evidencien cuenten con su respectivo sistema de señalización y demarcación.	Equipos y elementos de protección contra caídas para el trabajo seguro según la expedido en la resolución 4271 del 2021.
SI	**Riesgo por atropellamiento.**	**LOCATIVO**	Lesiones físicas o corporales de importante gravedad.	Ninguno	Ninguno	Licencia de conducción y certificados competentes como operadores de maquinaria.	6	3	18	**ALTO**	100	1800	I	**NO ACEPTABLE**	6	La muerte	Resolución 1885 del 2015	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Concientizar a los conductores y operadores ante el límite de velocidad permisible sobre el cual deben de transitar dentro de la obra. Verificar que la obra cuente con sistemas de señalización representados mediante unidades uniformes de señalización informativa, reglamentaria y preventiva. Concientizar al personal sobre las medidas preventivas que deben de tener en cuenta al momento de transitar dentro y fuera de la obra. Mediante los formatos de inspección (preoperacionales) verificar que los vehículos y la maquinaria se encuentren en excelente estado antes de dar inicio ante cualquier actividad.	Verificar que los conductores y operadores cuenten con la documentación mínima requerida para operar vehículos y maquinaria.
SI	**Riesgo por atrapamiento.**	**LOCATIVO**	Fracturas, cortes, amputaciones.	Ninguno	Soportes de inspección (preoperacionales) (inspección locativa)	Ninguno	6	3	18	**ALTO**	60	1080	I	**NO ACEPTABLE**	6	Puede generar la muerte	* Resolución 1016 de 1989 artículo 11 * Resolución 2400 de 1979 título 5, artículo 202	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Concientizar al personal sobre las medidas de prevención a tener en cuenta con el fin de evitar atrapamientos mecánicos o por movimiento de materiales. Implementar los (ATS) como procedimiento seguro con el fin de evitar cualquier tipo de atrapamientos. Tener en cuenta las actuaciones y las condiciones inseguras.	NO APLICA
SI	**Riesgo por exposición ante caída de objetos.**	**LOCATIVO**	Lesiones corporales, traumas, contusiones, fracturas.	Ninguno	Ninguno	Utilización del casco de seguridad	6	3	18	**ALTO**	100	1800	I	**NO ACEPTABLE**	6	Invalidez con incapacidad permanente o la muerte.	Resolución 2400 de 1979	NO APLICA	NO APLICA	En el caso de la excavaciones que se realizan, implementar un procedimiento que permita perfilar los cajeos con el fin de evitar el derrumbe de material sobre el personal que vaya a realizar actividades manuales dentro de la excavación.	Velar por el orden y correcto almacenamiento o ubicación de materiales, herramientas y equipos con el fin de evitar que sean un factor de riesgo ante el personal. Concientizar al personal sobre este tipo de riesgo al cual se pueden exponer y las medidas preventivas a tener en cuenta. Utilizar los elementos de protección personal (casco de seguridad). Concientizar al personal sobre como identificar las condiciones inseguras y realizar el respectivo reporte para que se realicen las correcciones pertinentes. Concientizar al personal con el fin de evitar actuaciones inseguras dentro de la obra. Implementar sistemas de señalización y demarcación sobre las condiciones inseguras que se identifiquen en la obra.	Implementación y uso de elementos de protección personal (Casco de seguridad).
SI	**Actividad laboral monótona.** (Sobrecarga de trabajo)	**PSICOLABORAL**	Estrés, fatiga, ansiedad.	Ninguno	Ninguno	Implementación de pausas activas.		1	0	**BAJO**	25	0	IV	**ACEPTABLE**	6	Síndrome de burnout (cronificación de estrés laboral)	Resolución 2646 del 2008	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Concientizar al personal para que sean organizados en el desarrollo de las actividades correspondientes con el fin de evitar sobrecargas de trabajo. Concientizar al personal con el fin de realizar pausas activas en momentos donde se haga evidente la fatiga por sobrecarga de trabajo.	NO APLICA
SI	**Malas relaciones interpersonales.**	**PSICOLABORAL**	Estrés, ansiedad, fatiga, desmotivación laboral, disminución del rendimiento laboral.	Ninguno	Ninguno	Implementación del comité de convivencia laboral	6	2	12	**ALTO**	25	300	II	**ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO**	6	Daños físicos por conflictos interpersonales dentro de la labor.	Resolución 2646 del 2008	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Conformación del comité de convivencia laboral. Concientizar al personal ante las buenas practicas que conlleven a generar una buena convivencia en el entorno laboral. Capacitar al personal ante los procedimientos que se implementaran con el fin de promover una excelente convivencia laboral ante el personal.	NO APLICA
SI	**Movimientos repetitivos.**	**BIOMECANICO**	Tendinitis, bursitis, síndromes de atrapamiento nervioso.	Ninguno	Ninguno	Implementación de pausas activas.	6	2	12	**ALTO**	10	120	III	**MEJORABLE**	6	Desordenes musculoesqueléticos.	Decreto 1477 de 2014, Decreto 676 del 2020.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Capacitar al personal sobre la posible exposición ante este riesgo y las medidas de prevención a tener en cuenta. Realizar pausas activas.	NO APLICA
SI	**Posturas inadecuadas.**	**BIOMECANICO**	Molestias cervicales, abdominales, trastorno en la zona lumbar de la espalda, alteraciones en el sistema nervioso y circulatorio.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	6	1	6	**MEDIO**	25	150	II	**ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO**	6	Afectaciones sobre la columna vertebral.	NTC 5723 del 2009	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Capacitar al personal con el fin de concientizarlos sobre la importancia de adoptar correctas posturas en la realización de sus actividades. Concientizar al personal sobre las posturas correctas en el momento de manipular cargas. Concientizar al personal para que realicen pausas activas al momento de estar realizando alguna actividad que exija alguna posición corporal durante un lapso de tiempo largo y continuo.	Cinturón de seguridad para realizar posiciones corporales individuales para cargar y descargar de elementos pesados.

				SI	**Presencia de líquidos y gases inflamables.**	**RIESGO DE ICENDIO Y EXPLOSION**	Quemaduras de primer, segundo y tercer grado.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	6	2	12	**ALTO**	100	1200	I	**NO ACEPTABLE**	6	La muerte	Decreto 1347 del 2021, Decreto 1072 del 2015 Ley 1575 del 2012	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Capacitar al personal sobre la posible exposición a este tipo de riesgo y las medidas preventivas a tener en cuenta. Tener conformadas las brigadas y el plan de emergencia. Disponer del kit de emergencias. Establecer un procedimiento seguro que permita actuar con eficacia ante un la ocurrencia de algún siniestro derivado al riesgo de incendio o explosión. Establecer una zona para el almacenamiento seguro de combustibles o gases inflamables. Implementar señalización informativa, reglamentaria o informativa de ser requerido.	NO APLICA
				SI	**Condiciones inadecuadas de los puestos de trabajo.**	**ERGONÓMICO**	Malas posturas, fatiga, cansancio, estrés.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	**BAJO**	10	40	III	**MEJORABLE**	6	Problemas de columna, síndrome del túnel carpiano.	Gatito 2007	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Capacitar al personal sobre el riesgo ergonómico y las medidas de prevención que se deben de tener en cuenta. Implementar el programa de pausas activas.	NO APLICA
				SI	**Sismo, terremotos, vendavales, inundaciones, derrumbes, lluvias granizadas, nevadas, tormentas eléctricas.**	**DESASTRES POR FENOMENOS NATURALES**	Contusiones, traumatismo corporal, araqumientos, caídas de distinto o diferente nivel, electrocución.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	6	1	6	**MEDIO**	100	600	I	**NO ACEPTABLE**	6	La muerte	Ley 1523 del 2012	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Establecer y divulgar el plan de emergencias Establecer las brigadas de emergencia y capacitarlas. Realizar capacitaciones, charlas, reentrenamiento y simulacros. Instalar señalización informativa sobre puntos de encuentro y rutas de evacuación.	NO APLICA
				SI	**Secuestro y hurto.**	**PUBLICO**	Afectación sobre la integridad física, moral y psicológica.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	6	4	24	**MUY ALTO**	100	2400	I	**NO ACEPTABLE**	6	La muerte	Ley 418 de 1997	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Capacitar al personal sobre la posible exposición a este tipo de riesgo y las medidas preventivas a tener en cuenta. Solicitar el apoyo de las autoridades competentes en la zona y un canal de comunicación efectivo ante la exposición sobre este tipo de riesgos.	NO APLICA
				SI	**Accidentes de trafico**	**TRANSPORTE**	Lesiones físicas y psicológicas.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	6	2	12	**ALTO**	100	1200	I	**NO ACEPTABLE**	6	La muerte	Ley 2251 del 2022 Decreto 1252 del 2021	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Contar con la documentación reglamentaria del vehículo. Contar con un vehículo que cuente con las medidas mínimas de seguridad para el transporte de personal y materiales de acuerdo a la actividad económica de la empresa. Contar con una póliza de seguro todo riesgo. Contar con los elementos básicos que exige la norma para el tránsito vehicular. Realizar los respectivos mantenimientos y las revisiones mecánicas que requiera el vehículo para su optimo funcionamiento. Para el transporte de personal en moto utilizar los elementos de protección respectivos. Implementar el formato de inspección vehicular con el fin de verificar que el vehículo se encuentra en optimas condiciones para su uso. Realizar capacitaciones en seguridad vial.	Licencia de conducción vigente del conductor.

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS

CONSORCIO INTERMUNICIPIOS

FECHA DE ELABORACIÓN: Noviembre 2022 | **DIRECCIÓN:** CORREDORES RURALES - MUNICIPIO DE FRESNO. | **ELABORADO POR:** DILAN ZABALA | **NÚMERO TOTAL DE TRABAJADORES :** 06

PROCESO	ZONA - LUGAR	CARGOS	ACTIVIDADES	TAREAS	RUTINARIO (SI O NO)	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACION DEL RIESGO							VALORACION DEL RIESGO	CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES			MEDIDAS DE INTERVENCION				
						DESCRIPCION	CLASIFICACION		FUENTE	MEDIO	INDIVIDUO	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICION	NIVEL DE PROBABILIDAD ND X NE	INTERPERTACION DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO NR E INTERVENCION	INTERPRETACION DEL NR	ACEPTABILIDAD DEL RIESGO	NUMERO DE EXPUESTOS	PEOR CONSECUENCIA	EXISTENCIA REQUISITO LEGAL ESPECIFICO SI o NO	ELIMINACION	SUSTITUCION	CONTROLES DE INGENIERIA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS, SEÑALIZACION, ADVERTENCIA	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
					SI	**Exposición a niveles altos de ruido**	**FISICO**	Reducción de la percepción, interferencia en las comunicaciones, afectación sobre la capacidad auditiva.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	6	3	18	**ALTO**	100	1800	I	**NO ACEPTABLE**	6	La muerte	Resolución 0627 del 2006 Resolución 2400 de 1979	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Capacitar al personal con el fin de generar conciencia sobre los riesgos a los cuales se expone el personal en las zonas donde se presentan altos índices de ruido. Impartir medidas de prevención con el fin de que el personal evite la exposición prolongada en las zonas donde se evidencien altos índices de ruido.	Utilización de Tapa oídos de copa o de inserción.
					SI	**Exposición a temperaturas extremas** (calor) (frio) (precipitaciones)	**FISICO**	**Calor:** Estrés, fatiga, síndrome por golpe de calor, deshidratación. **Precipitaciones:** Exposición al frio, infecciones respiratorias, otitis, neumonía entre otras enfermedades.	Ninguno	En el caso de presencia de lluvias, existen zonas con cubierta (techo)para el resguardo de personal.	Actividad de hidratación al personal.	2	2	4	**BAJO**	25	100	III	**MEJORABLE**	6	Golpe de calor. Enfermedades que requieren incapacidad laboral temporal	Decreto 1281 de 1994	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Concientizar al personal sobre la importancia de estarse hidratando constantemente. Concientizar al personal con el fin de realizar pausas activas. Garantizar que se cumpla la actividad de hidratación sobre el personal. Concientizar al personal con el fin de que no se exponga en caso de presentarse precipitaciones en campo.	Utilización de sombrilla e impermeables en caso de ser necesario.
					SI	**Exposición a Vibraciones**	**FISICO**	Lumbalgias, alteraciones discales, neuropatías.	Ninguno	Ninguno	Ninguno		1	0	**BAJO**	10	0	IV	**ACEPTABLE**	6	Efectos perniciosos sobre la columna vertebral.	Norma iso 2631 Resolución 2400 de 1979	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Concientizar al personal sobre las medidas de prevención a tener en cuenta en las zonas donde estén operando las maquinas que produzcan vibraciones al momento de operar.	NO APLICA
					SI	**Exposición a radiación no ionizante** (Rayos Solares).	**FISICO**	Alteración sobre la visión, manchas en la piel, envejecimiento prematuro de la piel.	Ninguno	Ninguno	Utilización de Dotación y elementos de protección personal.	2	2	4	**BAJO**	10	40	III	**MEJORABLE**	6	Cáncer de piel.	Proyecto de ley 129 de 2016.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Concientizar al personal para que en lo posible evite la exposición sobre los rayos solares. Concientizar al personal para que utilice la dotación y los elementos de protección personal en busca de evitar el contacto prolongado de los rayos solares sobre la piel. Concientizar al personal con el fin de que utilicen protector solar. Concientizar al personal para que realicen pausas activas buscando ubicarse bajo la sombra en los momentos donde los rayos solares se tornen demasiado fuertes.	Entrega de Dotación y (EPPS) con el fin de evitar la exposición de los rayos solares sobre la piel.
					SI	**Exposición a material particulado** (polvo)	**QUIMICO**	Alergia, molestias respiratorias, malestar general	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	**BAJO**	25	100	III	**MEJORABLE**	6	Enfermedades cardiacas o pulmonares.	Resolución 2254 del 2017	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Concientizar al personal con el fin de que en lo posible eviten la exposición a la proliferación de material particulado. Concientizar al personal para que utilicen el tapabocas y las gafas en caso de verse expuestos a un alto índice de proliferación de material particulado.	Utilización de Tapabocas y gafas de seguridad.
					SI	**Exposición a sustancias químicas, líquidas, gases y vapores y humos.**	**QUIMICO**	Neumonitis por hipersensibilidad, alergias, intoxicaciones.	Sustancias químicas suministradas por proveedores que garantizan sus condiciones mínimas de seguridad.	Ninguno	Productos químicos con sus respectivas fichas de seguridad.		1		**BAJO**	10	0	IV	**ACEPTABLE**	6	Infección pulmonar.	Decreto 1973 de 1995	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Concientizar al personal sobre las medidas preventivas a tener en cuenta a la hora de manipular sustancias químicas Concientizar al personal sobre las medidas preventivas a tener en cuenta al momento de ventirse expuestos sobre humos y vapores. Concientizar al personal sobre los riesgos a la salud que puede generar la exposición sobre sustancias químicas solidas, líquidas, gases y vapores. Concientizar al personal sobre el almacenamiento correcto y el transporte de sustancias químicas.	Utilización de los elementos de protección personal y la dotación correspondiente de acuerdo a lo indicado en las fichas de seguridad de cada producto.
					SI	**Exposición a virus, bacterias, hongos.**	**BIOLOGICO**	Infecciones, alergias, y efectos tóxicos o intoxicaciones.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	4	8	**MEDIO**	25	200	II	**ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO**	6	Patologías o enfermedades que requieran incapacidad temporal.	Ley 9 de 1979	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Implementación del programa de orden y aseo. Capacitación al personal sobre las consecuencias por exposición ante este tipo de riesgo y las medidas preventivas a tener en cuenta. Implementación del programa de recolección de residuos y disposición final.	Utilización del tapabocas en caso de evidenciar la presencia de virus sobre el entorno laboral.
					SI	**Exposición a vegetales y animales**	**BIOLOGICO**	Picaduras, mordeduras, reacciones alérgicas ante la cobertura vegetal.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	**BAJO**	25	100	III	**MEJORABLE**	6	Muerte	Ley 9 de 1979	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Capacitación al personal sobre las consecuencias por exposición ante este tipo de riesgo y las medidas preventivas a tener en cuenta. Tener a disposición el kit de emergencia ante un posible evento que requiera atención de primeros auxilios.	NO APLICA

OPERATIVO

MUNICIPIO FRESNO

DIRECTOR DE OBRA, INGENIERO RESIDENTE, INSPECTOR SST, PROFESIONAL SOCIAL, INGENIERO AMBIENTAL, TOPOGRAFA

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental para el mejoramiento y mantenimiento de vías terciarias del programa "Colombia Rural" en los municipios del Departamento del Tolima Grupo 1.

1. INSPECCIONAR QUE EL CONTRATISTA EJECUTE SUS ACTIVIDADES DE OBRA, CUMPLIENDO LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS EN LAS PARTES: TECNICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

SI	**Presencia de maquinaria, equipos y herramientas.**	**MECANICO**	Golpes, cortes, laceraciones, aplastamiento, amputaciones.	Ninguno	Ninguno	Licencia de conducción y certificados competentes como operadores de maquinaria.	6	3	18	**ALTO**	100	1800	I	**NO ACEPTABLE**	6	La Muerte	Resolución 2400 de 1979	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Concientizar al personal sobre los riesgos a los cuales se exponen ante la presencia de equipos maquinaria y vehículos en la obra. Concientizar al personal sobre las medidas de prevención que se deben de tener en cuenta ante la operación de equipos vehículos y maquinaria. Implementar la actividad de inspección (preoperacionales) de equipos, vehículos y maquinaria con el fin de garantizar su correcto funcionamiento como medida de prevención ante cualquier incidente y accidente que se pueda llegar a presentar. En el diligenciamiento de los (ATS) describir el procedimiento seguro para el desarrollo de las actividades de obra teniendo en cuenta la presencia de los equipos, vehículos y maquinaria que se encuentre presente en la obra. Establecer un procedimiento seguro para ubicar los equipos, los vehículos y la maquinaria dentro de la obra.	NO APLICA
SI	**Superficies lisas o irregulares** (Caídas del mismo o de diferente nivel)	**LOCATIVO**	Contusiones, torceduras, lesiones, fracturas.	Ninguno	Ninguno	Certificado vigente para trabajo seguro en alturas.	6	3	18	**ALTO**	100	1800	I	**NO ACEPTABLE**	6	La Muerte	Resolución 2400 de 1979	NO APLICA	NO APLICA	En las excavaciones que se realicen y generen riesgo de caída de diferente nivel, se deben de instalar sistemas de acceso que brinden seguridad para el ascenso y descenso de los trabajadores.	Concientizar al personal con el fin de que sean precavidos al desplazarse dentro de la obra. Concientizar al personal con el fin de prevenirlos ante los actos inseguros que no se deben de cometer dentro de la obra. Concientizar al personal con el fin de tener claro la definición de condición insegura y como prevenir un accidente o incidente ante esta condición. Implementar los permisos de trabajo y los ATS con el fin de establecer un procedimiento seguro para los trabajos que se consideren trabajo en alturas según la normatividad vigente. Exigir y verificar los soportes de los certificados de trabajo en alturas vigentes, en caso de que los trabajadores necesiten realizar actividades sobre alturas o profundidades mayores a dos metros sobre el nivel del terreno estable. Verificar que las condiciones inseguras que se evidencien cuenten con su respectivo sistema de señalización y demarcación.	Equipos y elementos de protección contra caídas para el trabajo seguro según la expedido en la resolución 4271 del 2021.
SI	**Riesgo por atropellamiento.**	**LOCATIVO**	Lesiones físicas o corporales de importante gravedad.	Ninguno	Ninguno	Licencia de conducción y certificados competentes como operadores de maquinaria.	6	3	18	**ALTO**	100	1800	I	**NO ACEPTABLE**	6	La muerte	Resolución 1885 del 2015	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Concientizar a los conductores y operadores ante el límite de velocidad permisible sobre el cual deben de transitar dentro de la obra. Verificar que la obra cuente con sistemas de señalización representados mediante unidades uniformes de señalización informativa, reglamentaria y preventiva. Concientizar al personal sobre las medidas preventivas que deben de tener en cuenta al momento de transitar dentro y fuera de la obra. Mediante los formatos de inspección (preoperacionales) verificar que los vehículos y la maquinaria se encuentren en excelente estado antes de dar inicio ante cualquier actividad.	Verificar que los conductores y operadores cuenten con la documentación mínima requerida para operar vehículos y maquinaria.
SI	**Riesgo por atrapamiento.**	**LOCATIVO**	Fracturas, cortes, amputaciones.	Ninguno	Soportes de inspección (preoperacionales) (inspección locativa)	Ninguno	6	3	18	**ALTO**	60	1080	I	**NO ACEPTABLE**	6	Puede generar la muerte	* Resolución 1016 de 1989 artículo 11 * Resolución 2400 de 1979 título 5, artículo 202	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Concientizar al personal sobre las medidas de prevención a tener en cuenta con el fin de evitar atrapamientos mecánicos o por movimiento de materiales. Implementar los (ATS) como procedimiento seguro con el fin de evitar cualquier tipo de atrapamientos. Tener en cuenta las actuaciones y las condiciones inseguras.	NO APLICA
SI	**Riesgo por exposición ante caída de objetos.**	**LOCATIVO**	Lesiones corporales, traumas, contusiones, fracturas.	Ninguno	Ninguno	Utilización del casco de seguridad	6	3	18	**ALTO**	100	1800	I	**NO ACEPTABLE**	6	Invalidez con incapacidad permanente o la muerte.	Resolución 2400 de 1979	NO APLICA	NO APLICA	En el caso de la excavaciones que se realizan, implementar un procedimiento que permita perfilar los cajeos con el fin de evitar el derrumbe de material sobre el personal que vaya a realizar actividades manuales dentro de la excavación.	Velar por el orden y correcto almacenamiento o ubicación de materiales, herramientas y equipos con el fin de evitar que sean un factor de riesgo ante el personal. Concientizar al personal sobre este tipo de riesgo al cual se pueden exponer y las medidas preventivas a tener en cuenta. Utilizar los elementos de protección personal (casco de seguridad). Concientizar al personal sobre como identificar las condiciones inseguras y realizar el respectivo reporte para que se realicen las correcciones pertinentes. Concientizar al personal con el fin de evitar actuaciones inseguras dentro de la obra. Implementar sistemas de señalización y demarcación sobre las condiciones inseguras que se identifiquen en la obra.	Implementación y uso de elementos de protección personal (Casco de seguridad).
SI	**Actividad laboral monótona.** (Sobrecarga de trabajo)	**PSICOLABORAL**	Estrés, fatiga, ansiedad.	Ninguno	Ninguno	Implementación de pausas activas.		1	0	**BAJO**	25	0	IV	**ACEPTABLE**	6	Síndrome de burnout (cronificación de estrés laboral)	Resolución 2646 del 2008	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Concientizar al personal para que sean organizados en el desarrollo de las actividades correspondientes con el fin de evitar sobrecargas de trabajo. Concientizar al personal con el fin de realizar pausas activas en momentos donde se haga evidente la fatiga por sobrecarga de trabajo.	NO APLICA
SI	**Malas relaciones interpersonales.**	**PSICOLABORAL**	Estrés, ansiedad, fatiga, desmotivación laboral, disminución del rendimiento laboral.	Ninguno	Ninguno	Implementación del comité de convivencia laboral	6	2	12	**ALTO**	25	300	II	**ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO**	6	Daños físicos por conflictos interpersonales dentro de la labor.	Resolución 2646 del 2008	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Conformación del comité de convivencia laboral. Concientizar al personal ante las buenas practicas que conlleven a generar una buena convivencia en el entorno laboral. Capacitar al personal ante los procedimientos que se implementaran con el fin de promover una excelente convivencia laboral ente el personal.	NO APLICA
SI	**Movimientos repetitivos.**	**BIOMECANICO**	Tendinitis, bursitis, síndromes de atrapamiento nervioso.	Ninguno	Ninguno	Implementación de pausas activas.	6	2	12	**ALTO**	10	120	III	**MEJORABLE**	6	Desordenes musculoesqueléticos.	Decreto 1477 de 2014, Decreto 676 del 2020.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Capacitar al personal sobre la posible exposición ante este riesgo y las medidas de prevención a tener en cuenta. Realizar pausas activas.	NO APLICA
SI	**Posturas inadecuadas.**	**BIOMECANICO**	Molestias cervicales, abdominales, trastorno en la zona lumbar de la espalda, alteraciones en el sistema nervioso y circulatorio.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	6	1	6	**MEDIO**	25	150	II	**ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO**	6	Afectaciones sobre la columna vertebral.	NTC 5723 del 2009	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Capacitar al personal con el fin de concientizarlos sobre la importancia de adoptar correctas posturas en la realización de sus actividades. Concientizar al personal sobre las posturas correctas en el momento de manipular cargas. Concientizar al personal para que realicen pausas activas al momento de estar realizando alguna actividad que exija alguna posición corporal durante un lapso de tiempo largo y continuo.	Cinturón de seguridad para realizar posiciones corporales individuales para cargar y descargar de elementos pesados.

				SI	**Presencia de líquidos y gases inflamables.**	**RIESGO DE ICENDIO Y EXPLOSION**	Quemaduras de primer, segundo y tercer grado.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	6	2	12	**ALTO**	100	1200	I	**NO ACEPTABLE**	6	La muerte	Decreto 1347 del 2021, Decreto 1072 del 2015 Ley 1575 del 2012	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Capacitar al personal sobre la posible exposición a este tipo de riesgo y las medidas preventivas a tener en cuenta. Tener conformadas las brigadas y el plan de emergencia. Disponer del kit de emergencias. Establecer un procedimiento seguro que permita actuar con eficacia ante un la ocurrencia de algún siniestro derivado al riesgo de incendio o explosión. Establecer una zona para el almacenamiento seguro de combustibles o gases inflamables. Implementar señalización informativa, reglamentaria o informativa de ser requerido.	NO APLICA
				SI	**Condiciones inadecuadas de los puestos de trabajo.**	**ERGONÓMICO**	Malas posturas, fatiga, cansancio, estrés.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2	2	4	**BAJO**	10	40	III	**MEJORABLE**	6	Problemas de columna, síndrome del túnel carpiano.	Gatito 2007	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Capacitar al personal sobre el riesgo ergonómico y las medidas de prevención que se deben de tener en cuenta. Implementar el programa de pausas activas.	NO APLICA
				SI	**Sismo, terremotos, vendavales, inundaciones, derrumbes, lluvias granizadas, nevadas, tormentas eléctricas.**	**DESASTRES POR FENOMENOS NATURALES**	Contusiones, traumatismo corporal, araqumientos, caídas de distinto o diferente nivel, electrocución.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	6	1	6	**MEDIO**	100	600	I	**NO ACEPTABLE**	6	La muerte	Ley 1523 del 2012	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Establecer y divulgar el plan de emergencias Establecer las brigadas de emergencia y capacitarlas. Realizar capacitaciones, charlas, reentrenamiento y simulacros. Instalar señalización informativa sobre puntos de encuentro y rutas de evacuación.	NO APLICA
				SI	**Secuestro y hurto.**	**PUBLICO**	Afectación sobre la integridad física, moral y psicológica.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	6	4	24	**MUY ALTO**	100	2400	I	**NO ACEPTABLE**	6	La muerte	Ley 418 de 1997	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Capacitar al personal sobre la posible exposición a este tipo de riesgo y las medidas preventivas a tener en cuenta. Solicitar el apoyo de las autoridades competentes en la zona y un canal de comunicación efectivo ante la exposición sobre este tipo de riesgos.	NO APLICA
				SI	**Accidentes de trafico**	**TRANSPORTE**	Lesiones físicas y psicológicas.	Ninguno	Ninguno	Ninguno	6	2	12	**ALTO**	100	1200	I	**NO ACEPTABLE**	6	La muerte	Ley 2251 del 2022 Decreto 1252 del 2021	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Contar con la documentación reglamentaria del vehículo. Contar con un vehículo que cuente con las medidas mínimas de seguridad para el transporte de personal y materiales de acuerdo a la actividad económica de la empresa. Contar con una póliza de seguro todo riesgo. Contar con los elementos básicos que exige la norma para el tránsito vehicular. Realizar los respectivos mantenimientos y las revisiones mecánicas que requiera el vehículo para su optimo funcionamiento. Para el transporte de personal en moto utilizar los elementos de protección respectivos. Implementar el formato de inspección vehicular con el fin de verificar que el vehículo se encuentra en optimas condiciones para su uso. Realizar capacitaciones en seguridad vial.	Licencia de conducción vigente del conductor.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO		CÓDIGO	MEPI-MNL-IN-9-FR-2
VERSIÓN		VERSIÓN	1
PÁGINA		PÁGINA	1
FECHA		FECHA	16/05/2024 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL ■

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS ■ **No.** 11
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL ■

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: TOLIMA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2247-2021

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA. GRUPO 1

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERMUNICIPIOS
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORIA: LENIN TITO MENDOZA PEÑA
RESOLUCIÓN No.: 871 DE 16/03/2022 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No.:	050	CONTRATISTA:	ARNULFO ARIAS DÍAZ
CONTRATO DE OBRA No.:	073	CONTRATISTA:	PRODAVIC LTDA
CONTRATO DE OBRA No.:	167	CONTRATISTA:	CONSORCIO FRESNO IC
CONTRATO DE OBRA No.:	215	CONTRATISTA:	CONSORCIO LOS CHORROS
CONTRATO DE OBRA No.:	898	CONTRATISTA:	ISAIAS VARGAS

PLAZO INICIAL: Hasta el 31 de julio de 2022 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 04/04/2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSION: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 1.716.988.701,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 2.486.988.701,00

PLAZO ACUMULADO: 26,2 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 03/07/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 770.000.000,00

R	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 10. de fecha 15/04/2024		2022														2023														2024												TOTAL
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO - JUL 3	
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																																																								
		PERSONAL PROFESIONAL																																																							
1	1	Director	$ 5.900.000,00		7,00	$ 41.300.000,00			22,10	$ 130.390.000,00	0,58	$ 3.422.000,00	0,64	$ 3.776.000,00	0,64	$ 3.776.000,00	0,64	$ 3.776.000,00	0,64	$ 3.776.000,00	0,64	$ 3.776.000,00	0,64	$ 3.776.000,00	0,64	$ 3.776.000,00	0,64	$ 3.776.000,00	1,00	$ 5.900.000,00	1,00	$ 5.900.000,00	1,00	$ 5.900.000,00	1,00	$ 5.900.000,00	1,00	$ 5.900.000,00	1,00	$ 5.900.000,00	1,00	$ 5.900.000,00	1,00	$ 5.900.000,00	1,00	$ 5.900.000,00	1,00	$ 5.900.000,00	1,00	$ 5.900.000,00	1,00	$ 5.900.000,00	1,00	$ 5.900.000,00	0,54	$ 3.186.000,00	1,00	$ 5.900.000,00	1,00	$ 5.900.000,00	22,14	$ 130.626.000,00
2	1	Ingeniero Residente No.1	$ 4.000.000,00		11,00	$ 44.000.000,00			8,40	$ 33.600.000,00	0,80	$ 3.600.000,00	1,00	$ 4.000.000,00	1,00	$ 4.000.000,00	1,00	$ 4.000.000,00	1,00	$ 4.000.000,00	1,00	$ 4.000.000,00	1,00	$ 4.000.000,00	1,00	$ 4.000.000,00	1,00	$ 4.000.000,00	0,50	$ 2.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	8,40	$ 33.600.000,00
	1	Ingeniero Residente No.2	$ 4.000.000,00		11,00	$ 44.000.000,00			18,27	$ 73.080.000,00	0,20	$ 800.000,00	1,00	$ 4.000.000,00	1,00	$ 4.000.000,00	1,00	$ 4.000.000,00	1,00	$ 4.000.000,00	1,00	$ 4.000.000,00	1,00	$ 4.000.000,00	1,00	$ 4.000.000,00	1,00	$ 4.000.000,00	1,00	$ 4.000.000,00	0,67	$ 2.680.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	17,77	$ 71.080.000,00
	1	Ingeniero Residente No.3	$ 4.000.000,00		11,00	$ 44.000.000,00			17,37	$ 69.480.000,00	0,00	$ -	0,87	$ 3.480.000,00	1,00	$ 4.000.000,00	1,00	$ 4.000.000,00	1,00	$ 4.000.000,00	1,00	$ 4.000.000,00	1,00	$ 4.000.000,00	1,00	$ 4.000.000,00	1,00	$ 4.000.000,00	1,00	$ 4.000.000,00	1,00	$ 4.000

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

Codigo	MINFRA-MN-IN-15-FR-2
Version	1
Pagina	1 de 1
Fecha	2024/06/11 11:03

Informacion General

Proyecto Carretera	CONVENIO 1131-2021 VIA LAS DELICIAS – ALPUJARRA (MUNICIPIO ALPUJARRA)			Tramo y o sector		VIA LAS DELICIAS.ALPUJARRA	
Unidad Ejecutora	SUBDIRECCION VIAS REGIONALES	Direccion territorial	Dirección Territorial Tolima	SemanaNo: 110			
Supervisor Contrato interventoria:	Lenin Tito Mendoza Peña			Gestor tècnico del proyecto:	DIEGO FERNANDO CAICEDO CASTRO		
Objeto del conrato de obra:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE UN TRAMO DE LA VÍA SECTOR URBANO MUNICIPIO DE ALPUJARRA-PUENTE LAS DELICIAS CON RECURSOS DE CORREDORES RURALES INVIAS PROGRAMA"COLOMBIA RURAL"					Fecha de inicio	2022/02/03

Km a mejorar:	.00	Km a rehabilitar	.00	Km a Construir	.00	No. Puente	.00	Otros	

Contrato de Obra:				Contrato de Interventoria			
Contratista	Arnulfo Hernán Arias Díaz			Interventor	Consorcio Intermunicipios		
Integrantes	Nit	Razon social	%	Integrantes	Nit	Razon social	%
Contrato No	050 - 2022	Valor Inicial	$4,045,951,045	Contrato No	2247 - 2021	Valor Inicial	$1,716,988,701
Plazo Inicial	4.00	Adiciones	$0	Plazo Inicial	3.87	Adiciones	$0
Plazo acumulado	24.90	Valor acumulado	$4,045,951,045	Plazo acumulado	28.00	Valor Acumulado	$2,646,988,701

II Informacion Presupuestal y avance financiero

Distribuciòn de recursos presupuestales contrato de obra por vigencia

Vigencia
Recursos x vigencia
Ejecutado

Contrato de obra:		Contrato de interventoria		
Valor básico contrato de obra	$3,176,083,087			
Anticipos asignados	$2,022,975,522			
Inversion obra, programada acumulada	$3,176,083,087			
Inversion obra, ejecutada acumulada	$0			
Avance obra en % B/A	.00			
Avance obra fisica %	80.50			
Otras inversiones ejecutadas (Estudios y diseños gestion predial, social ambiental y otras)	$0	Ejecutado acumulado		$635,548,794
Total inversion ejecutada	$0			
Anticipo amortizado	$0			
Presento factura en la presente semana	Si[ ] No[X]	Presento factura en la presente semana	Si[ ] No[X]	
Mes facturado	2022-9	Mes facturado	27	
Valor factura	$0	Fecha factura 2024/06/06	Valor factura	$6,781,822 Fecha factura 2024/06/06
Pagos acumulados reporte SIIF NACION		Pagos acumulados reporte SIIF NACION		

III Avance Físico

Actividad	PRG	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	Total
BACHEO (%)	8.0											0.0
MUROS DE CONTENCION (ML)	23.0				24.4							24.4
PAVIMENTO FLEXIBLE (ml)	1677.0			392.0		662.0						1054.0



Maquinaria	MMR	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	Total
Moto niveladoras:	1.0			1.0	1.0	1.0						3.0
Vibro compactadores:	1.0			1.0	1.0	1.0						3.0
Finisher	1.0			1.0		1.0						2.0
Volquetas	1.0			7.0	2.0	3.0						12.0
Moto niveladoras:	1.0											0.0

IV Gestion Ambiental

Fuentes de materiales

Ubicación	Permiso minero	Licencia ambiental
UNION TEMPORAL JC Y HYS S.A.S -Purificación	Si[X] No[ ]	Si[ ] No[X]
EL MANA -Guamo/Saldaña	Si[X] No[ ]	Si[X] No[ ]

Observaciones:No se cuenta con información actualizada de los proveedores de los recursos necesarios para el desarrollo del Proyecto.

P.A.G.A. (Programa de Adaptación a la Guia Ambiental)

Estado: El Contratista no realiza entrega de los informes del PAGA del proyecto. En cumplimiento de las funciones como interventor del contrato de la referencia, se ha venido realizando la solicitud de los informes mensuales de seguimiento ambiental, los cu

Permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental

Zonas de deposito	Si[ ] No[X] N/A[_]	Ocupación de causes	Si[ ] No[X] N/A[_]
Licencia ambiental	Si[ ] No[X] N/A[_]	Vertimientos	Si[ ] No[X] N/A[_]
Aprovechamiento forestal	Si[ ] No[X] N/A[_]	Emisiones	Si[ ] No[X] N/A[_]
Concesion de aguas	Si[ ] No[X] N/A[_]	Otros	

Observaciones:No se cuenta con resultados en la ejecución del PAGA del proyecto.

Observaciones: Esta Interventoría no cuenta con resultados en la ejecución del PAGA del proyecto, desde el mes de Julio de 2023 hasta la fecha. De acuerdo al estado del proyecto se tiene un avance del 80,5%.

V. Gestion predial

Total predios a adquirir	0	Observaciones: El proyecto no requiere Gestión Predial.
Fichas prediales aprobadas	0	
Avaluos aprobados	0	
Predios adquiridos	0	

VI. Gestion Social

Total empleos generados	29	No. Socializaciones realizadas	1
Empleos directos generados	19	No. Capacitaciones realizadas	0
Empleos indirectos generados	7	Direccion sede atencion al usuario: ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALPUJARRA	
Otros			

Observaciones:CONTRATISTA:
* El contratista NO presenta el informe mensual correspondiente a la gestión social del mes mayo.

INTERVENTORÍA:
* Se realiza seguimiento a las actividades ejecutadas por el contratista.
* Elaboración del informe mensual N°26 - MAYO.


VII. Actividades realizadas en la semana

Durante la semana se observo baja actividad en la obra, se reiteró remate de actividades de concreto y rellenos en cunetas.

VIII. Actividades a realizar en la siguiente semana

1. Continuar suministro e instalación de base granular en el K14+630 hasta K14 +640 - Remate.
2. Continuar suministro e instalación de Riego de imprimación con emulsión asfáltica K14+ 250 hasta K14 +640.
3. Continuar suministro e instalación de Mezcla Densa en Caliente tipo MDC-25 en el K14+ 550 hasta K14 +640 ambas carriles
4. Continuar suministro e instalación de Mezcla Densa en Caliente tipo MDC-19 en el K14+ 250 hasta K14 +640 ambos carriles
5. Continuar construcción Cuneta de Concreto Vaciada In Situ.
6. Continuar suministro e instalación de Relleno para hombro de las Cunetas en concreto.

IX. Esquema grafico del proyecto



X. Registro fotografico








Nota: Las cifras cantidades y valores consignadas en el presente reporte son responsabilidad exclusiva del interventor

XI. Describir las acciones a seguir por parte de la interventoria que contribuyan al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista de obra	Director de interventoria

1. Continuar seguimiento a las actividades de obra de acuerdo a las especificaciones INVIAS ejecutadas por el contratista de obra.
2. Continuar seguimiento cronograma de obra.
3. Supervisión instalación de los diferentes materiales en obra.
4. Con la comunicación CIM-2247-21-1131-21-367 (27-may-24) - Reiteración Presentación Planos Récord.
5. Con la comunicación CIM-2247-21-1131-21-368 (29-may-24) - Acta de comité de obra N°22.
6. Con la comunicación CIM-2247-21-1131-21-369 (4-jun-24) - Estado de Avance de Obra.



Nombre MARISOL AMAYA CORREA

Mat Prof25202-74273 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	Codigo	MINFRA-MN-IN-15-FR-2
		Version	1
		Pagina	1 de 1
		Fecha	2024/06/17 15:32

Informacion General

Proyecto Carretera	CONVENIO 1131-2021 VIA LAS DELICIAS – ALPUJARRA (MUNICIPIO ALPUJARRA)					Tramo y o sector		VIA LAS DELICIAS.ALPUJARRA	
Unidad Ejecutora	SUBDIRECCION VIAS REGIONALES	Direccion territorial	Dirección Territorial Tolima			SemanaNo: 111			
Supervisor Contrato interventoria:	Lenin Tito Mendoza Peña			Gestor tècnico del proyecto:		DIEGO FERNANDO CAICEDO CASTRO			
Objeto del conrato de obra:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE UN TRAMO DE LA VÍA SECTOR URBANO MUNICIPIO DE ALPUJARRA-PUENTE LAS DELICIAS CON RECURSOS DE CORREDORES RURALES INVIAS PROGRAMA"COLOMBIA RURAL"							Fecha de inicio	2022/02/03
Km a mejorar: .00	Km a rehabilitar .00	Km a Construir .00		No. Puente .00		Otros			

Contrato de Obra:				Contrato de Interventoria			
Contratista	Arnulfo Hernán Arias Díaz			Interventor	Consorcio Intermunicipios		
Integrantes	Nit / Razon social / %			Integrantes	Nit / Razon social / %		
Contrato No	050 - 2022	Valor Inicial	$4,045,951,045	Contrato No	2247 - 2021	Valor Inicial	$1,716,988,701
Plazo Inicial	4.00	Adiciones	$0	Plazo Inicial	3.87	Adiciones	$0
Plazo acumulado	24.90	Valor acumulado	$4,045,951,045	Plazo acumulado	28.00	Valor Acumulado	$2,646,988,701

II Informacion Presupuestal y avance financiero

Distribuciòn de recursos presupuestales contrato de obra por vigencia	Vigencia Recursos x vigencia Ejecutado

Contrato de obra:		Contrato de interventoria		
Valor básico contrato de obra	$3,176,083,087			
Anticipos asignados	$2,022,975,522			
Inversion obra, programada acumulada	$3,176,083,087			
Inversion obra, ejecutada acumulada	$0			
Avance obra en % B/A	.00			
Avance obra fisica %	80.50			
Otras inversiones ejecutadas (Estudios y diseños gestion predial, social ambiental y otras)	$0	Ejecutado acumulado		$635,548,794
Total inversion ejecutada	$0			
Anticipo amortizado	$0			
Presento factura en la presente semana	Si[ ] No[X]	Presento factura en la presente semana	Si[ ] No[X]	
Mes facturado	2022-9	Mes facturado	27	
Valor factura $0	Fecha factura 2024/06/13	Valor factura $19,966,058	Fecha factura	2024/06/13
Pagos acumulados reporte SIIF NACION		Pagos acumulados reporte SIIF NACION		

III Avance Físico

Actividad	PRG	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	Total
BACHEO (%)	8.0											0.0
MUROS DE CONTENCION (ML)	23.0				24.4							24.4
PAVIMENTO FLEXIBLE (ml)	1677.0			387.0		242.0						629.0



Maquinaria	MMR	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	Total
Moto niveladoras:	1.0			1.0	1.0	1.0						3.0
Vibro compactadores:	1.0			1.0	1.0	1.0						3.0
Finisher	1.0			1.0		1.0						2.0
Volquetas	1.0			7.0	2.0	1.0						10.0
Moto niveladoras:	1.0											0.0

IV Gestion Ambiental

Fuentes de materiales

Ubicación	Permiso minero	Licencia ambiental
EL MANA -Guamo /Saldaña	Si[X] No[ ]	Si[X] No[ ]
UNION TEMPORAL JC Y HYS S.A.S -Purificación	Si[X] No[ ]	Si[ ] No[X]

Observaciones:No se cuenta con información actualizada de los proveedores de los recursos necesarios para el desarrollo del Proyecto.

P.A.G.A. (Programa de Adaptación a la Guia Ambiental)

Estado	El pasado 03 de junio de 2024, el contratista envía informe del período del mes de enero -febrero de 2024, mediante el Radicado No. OF-178-06-03-2024, para el cual está interventoría se realiza requerimientos.

Permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental

Zonas de deposito	Si[ ] No[X] N/A[_]	Ocupación de causes	Si[ ] No[X] N/A[_]
Licencia ambiental	Si[ ] No[X] N/A[_]	Vertimientos	Si[ ] No[X] N/A[_]
Aprovechamiento forestal	Si[ ] No[X] N/A[_]	Emisiones	Si[ ] No[X] N/A[_]
Concesion de aguas	Si[ ] No[X] N/A[_]	Otros	

Observaciones:El Proyecto no requirió de permisos ambientales ante la respectiva CAR. Sin embargo no implementa, ni presenta informes del PAGA

Observaciones: El soporte del sitio de disposición de materiales de excavación y demolición, no cumple, teniendo en cuenta que el soporte que adjunta trata de una solicitud emitida por la Alcaldía en septiembre de 2022, en la cual solicita que el proyecto le done material pétreo generado por el proyecto, para ser dispuesto en vías y volúmenes no especificados, por lo tanto, la gestión no cumple con el mínimo de criterios ambientales.

Es importante aclarar, que el tipo de residuos a disponer son provenientes de excavaciones y demoliciones, que deben ser dispuestos en sitios autorizados por la interventoría, con la debida gestión previa.

De acuerdo al seguimiento realizado por la interventoría, el contratista ha venido disponiendo material de excavaciones, contaminados de bolsas de cemento en los derechos de vía, a lo largo del tramo (K14+640, K3+600, K14+823) del proyecto, los cuales a la fecha no han sido recogidos. A continuación, se relacionan algunos sitios en los cuales se evidencia incu

V. Gestion predial

Total predios a adquirir	0	Observaciones: El proyecto no requiere Gestión Predial.
Fichas prediales aprobadas	0	
Avaluos aprobados	0	
Predios adquiridos	0	

VI. Gestion Social

Total empleos generados	29	No. Socializaciones realizadas	1	Observaciones:CONTRATISTA: * El contratista presenta los paz y salvos firmados por las siguientes personas para el cierre a las quejas presentadas reclamando el pago por servicios prestados para la ejecución del proyecto: Octalivar Motta, Alveiro Arias Hernández y Carlos Riveros. INTERVENTORÍA: * Se realiza seguimiento a las actividades ejecutadas por el contratista.
Empleos directos generados	19	No. Capacitaciones realizadas	0	
Empleos indirectos generados	7	Direccion sede atencion al usuario: ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALPUJARRA		
Otros				


VII. Actividades realizadas en la semana

1. El contratista está llevando a cabo la nivelación y el restablecimiento de la capa de base granular. En el Sector N°6. (K 14+500 hasta K14+640).
2.El contratista está llevando a cabo trabajos de mejora del relleno para corregir las fallas y garantizar la estabilidad del terreno. En el Sector N°4. (Muro). K3+600

VIII. Actividades a realizar en la siguiente semana

1. Continuar suministro e instalación de base granular en el K14+630 hasta K14 +640 - Remate.
2. Continuar suministro e instalación de Riego de imprimación con emulsión asfáltica K14+ 250 hasta K14 +640.
3. Continuar suministro e instalación de Mezcla Densa en Caliente tipo MDC-25 en el K14+ 550 hasta K14 +640 ambas carriles
4. Continuar suministro e instalación de Mezcla Densa en Caliente tipo MDC-19 en el K14+ 250 hasta K14 +640 ambos carriles
5. Continuar construcción Cuneta de Concreto Vaciada In Situ.
6. Continuar suministro e instalación de Relleno para hombro de las Cunetas en concreto.

IX. Esquema grafico del proyecto



X. Registro fotografico








Nota: Las cifras cantidades y valores consignadas en el presente reporte son responsabilidad exclusiva del interventor

XI. Describir las acciones a seguir por parte de la interventoria que contribuyan al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista de obra	Director de interventoria

1. Continuar seguimiento a las actividades de obra de acuerdo a las especificaciones INVIAS ejecutadas por el contratista de obra.
2. Continuar seguimiento cronograma de obra.
3. Supervisión instalación de los diferentes materiales en obra.
4. Con la comunicación CIM-2247-21-1131-21-370 (7-jun-24) - Solicitud Ensayos..
5. Con la comunicación CIM-2247-21-1131-21-371 (11-jun-24) - Resultado de la revisión de informe Ambiental del período del mes de enero - febrero de 2024.
6. Con la comunicación CIM-2247-21-1131-21-372 (12-jun-24) - Solicitud de Certificado de Pago de Aportes de Parafiscales



Nombre MARISOL AMAYA CORREA

Mat Prof25202-74273 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

Codigo	MINFRA-MN-IN-15-FR-2
Version	1
Pagina	1 de 1
Fecha	2024/06/24 16:05

Informacion General

Proyecto Carretera	CONVENIO 1131-2021 VIA LAS DELICIAS – ALPUJARRA (MUNICIPIO ALPUJARRA)					Tramo y o sector		VIA LAS DELICIAS.ALPUJARRA	
Unidad Ejecutora	SUBDIRECCION VIAS REGIONALES	Direccion territorial	Dirección Territorial Tolima			SemanaNo: 112			
Supervisor Contrato interventoria:	Lenin Tito Mendoza Peña			Gestor tècnico del proyecto:		DIEGO FERNANDO CAICEDO CASTRO			
Objeto del conrato de obra:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE UN TRAMO DE LA VÍA SECTOR URBANO MUNICIPIO DE ALPUJARRA-PUENTE LAS DELICIAS CON RECURSOS DE CORREDORES RURALES INVIAS PROGRAMA"COLOMBIA RURAL"							Fecha de inicio	2022/02/03
Km a mejorar:	.00	Km a rehabilitar	.00	Km a Construir	.00	No. Puente	.00	Otros	

Contrato de Obra:				Contrato de Interventoria			
Contratista	Arnulfo Hernán Arias Díaz			Interventor	Consorcio Intermunicipios		
Integrantes	Nit	Razon social	%	Integrantes	Nit	Razon social	%
Contrato No	050 - 2022	Valor Inicial	$4,045,951,045	Contrato No	2247 - 2021	Valor Inicial	$1,716,988,701
Plazo Inicial	4.00	Adiciones	$0	Plazo Inicial	3.87	Adiciones	$0
Plazo acumulado	24.90	Valor acumulado	$4,045,951,045	Plazo acumulado	28.00	Valor Acumulado	$2,646,988,701

II Informacion Presupuestal y avance financiero

Distribuciòn de recursos presupuestales contrato de obra por vigencia

Vigencia
Recursos x vigencia
Ejecutado

Contrato de obra:		Contrato de interventoria		
Valor básico contrato de obra	$3,176,083,087			
Anticipos asignados	$2,022,975,522			
Inversion obra, programada acumulada	$3,176,083,087			
Inversion obra, ejecutada acumulada	$0			
Avance obra en % B/A	.00			
Avance obra fisica %	93.00			
Otras inversiones ejecutadas (Estudios y diseños gestion predial, social ambiental y otras)	$0	Ejecutado acumulado		$635,548,794
Total inversion ejecutada	$0			
Anticipo amortizado	$0			
Presento factura en la presente semana	Si[ ] No[X]	Presento factura en la presente semana	Si[ ] No[X]	
Mes facturado	2022-9	Mes facturado	27	
Valor factura	$507,322,160 Fecha factura 2024/06/20	Valor factura	$19,966,058	Fecha factura 2024/06/20
Pagos acumulados reporte SIIF NACION		Pagos acumulados reporte SIIF NACION		

III Avance Físico

Actividad	PRG	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	Total
BACHEO (%)	8.0											0.0
MUROS DE CONTENCION (ML)	23.0				24.4							24.4
PAVIMENTO FLEXIBLE (ml)	1677.0			387.0		1060.0						1447.0



Maquinaria	MMR	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	Total
Moto niveladoras:	1.0			1.0	1.0	1.0						3.0
Vibro compactadores:	1.0			1.0	1.0	1.0						3.0
Finisher	1.0			1.0		1.0						2.0
Volquetas	1.0			7.0	2.0	4.0						13.0
Moto niveladoras:	1.0											0.0

IV Gestion Ambiental

Fuentes de materiales

Ubicación	Permiso minero	Licencia ambiental
EL MANA -Guamo/Saldaña	Si[X] No[ ]	Si[X] No[ ]
UNION TEMPORAL JC Y HYS S.A.S -Parificación	Si[X] No[ ]	Si[ ] No[X]

Observaciones:No se cuenta con información actualizada de los proveedores de los recursos necesarios para el desarrollo del Proyecto.

P.A.G.A. (Programa de Adaptación a la Guia Ambiental)

Estado: El contratista nuevamente es requerido mediante oficio No. CIM-2247-21-1131-21-376 del 18 de junio de 2024, para que presente los informes ambientales mensuales y trimestrales del Período que va del 05 de mayo de 2022 a Mayo de 2024.

Permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental

Zonas de deposito	Si[ ] No[X] N/A[_]	Ocupación de causes	Si[ ] No[X] N/A[_]
Licencia ambiental	Si[ ] No[X] N/A[_]	Vertimientos	Si[ ] No[X] N/A[_]
Aprovechamiento forestal	Si[ ] No[X] N/A[_]	Emisiones	Si[ ] No[X] N/A[_]
Concesion de aguas	Si[ ] No[X] N/A[_]	Otros	

Observaciones:El Proyecto no requirió de permisos ambientales ante la respectiva CAR. Sin embargo no implementa, ni presenta informes del PAGA.

Observaciones: Para el presente período el contratista, continúa con las actividades constructivas; sin embargo no ha realizado la limpieza del material producto de la demolición de cunetas. Al día de hoy cuenta con una avance del 93% de obra.

V. Gestion predial

Total predios a adquirir	0	Observaciones: El proyecto no requiere Gestión Predial.
Fichas prediales aprobadas	0	
Avaluos aprobados	0	
Predios adquiridos	0	

VI. Gestion Social

Total empleos generados	28	No. Socializaciones realizadas	1
Empleos directos generados	18	No. Capacitaciones realizadas	0
Empleos indirectos generados	7	Direccion sede atencion al usuario: ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALPUJARRA	
Otros			

Observaciones:CONTRATISTA:
* El contratista presenta los paz y salvos sobre deudas canceladas por servicios prestados para la ejecución del contrato.

INTERVENTORÍA:
* Se realiza seguimiento a las actividades ejecutadas por el contratista.


VII. Actividades realizadas en la semana

1. Excavaciones varias en material común en seco =260 m³
2. Base granular clase C =180 m³
3. Sub-base granular clase C =113m³
4. Riego de imprimación con emulsión asfaltica CRL-0 =3430 m²
5. Mezcla Densa en Caliente tipo MDC-19 =120m³
6. Mezcla Densa en Caliente tipo MDC-25=26,3 m³
7. Nivelacion y compactacion de la subrasante= 1587 m²
8. Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm = 30 Unidades.
9. Tacha Reflectiva. = 2738,04 Unidades.
10. Línea de Demarcación con Resina Termoplástica. = 4880,52 m

VIII. Actividades a realizar en la siguiente semana

1. Continuar suministro e instalación de base granular en el K3+600 - Remate.
2. Continuar suministro e instalación de Riego de imprimación con emulsión asfáltica K3+ 505 hasta K3 +625.
3. Continuar suministro e instalación de Mezcla Densa en Caliente tipo MDC-25 en el K3+ 505 hasta K3 +625. ambas carriles
4. Continuar suministro e instalación de Mezcla Densa en Caliente tipo MDC-19 en el K3+ 505 hasta K3 +625. ambos carriles
5. Continuar construcción Cuneta de Concreto Vaciada In Situ.
6. Continuar suministro e instalación de Relleno para hombro de las Cunetas en concreto.
7. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO

IX. Esquema grafico del proyecto



X. Registro fotografico







Nota: Las cifras cantidades y valores consignadas en el presente reporte son responsabilidad exclusiva del interventor

XI. Describir las acciones a seguir por parte de la interventoria que contribuyan al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista de obra	Director de interventoria
1. Continuar seguimiento a las actividades de obra de acuerdo a las especificaciones INVIAS ejecutadas por el contratista de obra. 2. Continuar seguimiento cronograma de obra. 3. Supervisión instalación de los diferentes materiales en obra. 4. Con la comunicación CIM-2247-21-1131-21-374 (14-jun-24) - Solicitud presentación Documentos Liquidación de Contrato de Obra 5. Con la comunicación CIM-2247-21-1131-21-376 (18-jun-24) - PAGA Actualizado - Solicitud de Informes. 6. Se realizó visita y comité de obra para verificación el avance y estado de obra, conjuntamente con el Contratista, Secretaría de Planeación e Infraestructura del Municipio de Alpujarra, Director Territorial INVIAS y la Interventoría el día 19 de junio 2024.	 Nombre MARISOL AMAYA CORREA Mat Prof25202-74273 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	Codigo	MINFRA-MN-IN-15-FR-2
		Version	1
		Pagina	1 de 1
		Fecha	2024/07/03 14:00

Informacion General

Proyecto Carretera	CONVENIO 1131-2021 VIA LAS DELICIAS – ALPUJARRA (MUNICIPIO ALPUJARRA)							Tramo y o sector		VIA LAS DELICIAS.ALPUJARRA	
Unidad Ejecutora	SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		Direccion territorial	Dirección Territorial Tolima				SemanaNo: 113			
Supervisor Contrato interventoria:	Lenin Tito Mendoza Peña					Gestor tècnico del proyecto:		DIEGO FERNANDO CAICEDO CASTRO			
Objeto del conrato de obra:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE UN TRAMO DE LA VÍA SECTOR URBANO MUNICIPIO DE ALPUJARRA-PUENTE LAS DELICIAS CON RECURSOS DE CORREDORES RURALES INVIAS PROGRAMA"COLOMBIA RURAL"									Fecha de inicio	2022/02/03
Km a mejorar:	.00	Km a rehabilitar	.00	Km a Construir	.00	No. Puente	.00	Otros			

Contrato de Obra:				Contrato de Interventoria			
Contratista	Arnulfo Hernán Arias Díaz			Interventor	Consorcio Intermunicipios		
Integrantes	Nit	Razon social	%	Integrantes	Nit	Razon social	%
Contrato No	050 - 2022	Valor Inicial	$4,045,951,045	Contrato No	2247 - 2021	Valor Inicial	$1,716,988,701
Plazo Inicial	4.00	Adiciones	$0	Plazo Inicial	3.87	Adiciones	$0
Plazo acumulado	24.90	Valor acumulado	$4,045,951,045	Plazo acumulado	28.00	Valor Acumulado	$2,646,988,701

II Informacion Presupuestal y avance financiero

Distribuciòn de recursos presupuestales contrato de obra por vigencia	Vigencia Recursos x vigencia Ejecutado

Contrato de obra:		Contrato de interventoria		
Valor básico contrato de obra	$3,176,083,087			
Anticipos asignados	$2,022,975,522			
Inversion obra, programada acumulada	$3,176,083,087			
Inversion obra, ejecutada acumulada	$0			
Avance obra en % B/A	.00			
Avance obra fisica %	93.00			
Otras inversiones ejecutadas (Estudios y diseños gestion predial, social ambiental y otras)	$0	Ejecutado acumulado		$635,548,794
Total inversion ejecutada	$0			
Anticipo amortizado	$0			
Presento factura en la presente semana	**Si[ ] No[X]**	Presento factura en la presente semana	**Si[ ] No[X]**	
Mes facturado	2022-9	Mes facturado	26	
Valor factura	$0	Fecha factura	2024/06/27	Valor factura	$19,966,058	Fecha factura	2024/06/27
Pagos acumulados reporte SIIF NACION		Pagos acumulados reporte SIIF NACION		

III Avance Físico

Actividad	PRG	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	Total
BACHEO (%)	8.0											0.0
MUROS DE CONTENCION (ML)	23.0				24.4							24.4
PAVIMENTO FLEXIBLE (ml)	1677.0			387.0		1060.0						1447.0



Maquinaria	MMR	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	Total
Moto niveladoras:	1.0			1.0	1.0	1.0						3.0
Vibro compactadores:	1.0			1.0	1.0	1.0						3.0
Finisher	1.0			1.0		1.0						2.0
Volquetas	1.0			7.0	2.0	4.0						13.0
Moto niveladoras:	1.0											0.0

IV Gestion Ambiental

Fuentes de materiales

Ubicación	Permiso minero	Licencia ambiental
EL MANA -Guamo /Saldaña	**Si[X] No[ ]**	**Si[X] No[ ]**
UNION TEMPORAL JC Y HYS S.A.S -Purificación	**Si[X] No[ ]**	**Si[ ] No[X]**

Observaciones:No se cuenta con información actualizada de los proveedores de los recursos necesarios para el desarrollo del Proyecto.

P.A.G.A. (Programa de Adaptación a la Guia Ambiental)

Estado: El contratista no presenta informes ambientales mensuales y trimestrales desde el inicio de las actividades del proyecto.

Permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental

Zonas de deposito	**Si[ ] No[X] N/A[_]**	Ocupación de causes	**Si[ ] No[X] N/A[_]**
Licencia ambiental	**Si[ ] No[X] N/A[_]**	Vertimientos	**Si[ ] No[X] N/A[_]**
Aprovechamiento forestal	**Si[ ] No[X] N/A[_]**	Emisiones	**Si[ ] No[X] N/A[_]**
Concesion de aguas	**Si[ ] No[X] N/A[_]**	Otros	

Observaciones:El Proyecto no requirió de permisos ambientales ante la respectiva CAR. Sin embargo no implementa, ni presenta informes del PAGA.

Observaciones: Para el presente período el contratista, no ha realizado ningún actividad en obra, en el presente período. Al día continúa con una avance del 93% de obra.

V. Gestion predial

Total predios a adquirir	0	Observaciones: El proyecto no requiere Gestión Predial.
Fichas prediales aprobadas	0	
Avaluos aprobados	0	
Predios adquiridos	0	

VI. Gestion Social

Total empleos generados	28	No. Socializaciones realizadas	1	Observaciones:CONTRATISTA: * El contratista presenta paz y salvos firmados por las siguientes personas: Esteban Ramírez Trujillo y Jonathan Pérez Rivero, quienes durante la ejecución del contrato prestaron sus servicios para la ejecución del contrato. INTERVENTORÍA: * Se solicita al contratista la presentación del informe mensual correspondiente al mes de junio para el día viernes 28 de junio de 2024.
Empleos directos generados	18	No. Capacitaciones realizadas	0	
Empleos indirectos generados	7	Direccion sede atencion al usuario: ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALPUJARRA		
Otros				

VII. Actividades realizadas en la semana

-Durante la semana se observó baja actividad en la obra, se reiteró remate de actividades de concreto y rellenos en cunetas, limpieza de obra retiro de escombros.
-El contratista informó en el subcontratista del asfalto, suspendió labores debido a las festividades del Huila, la gente no le quiso trabajar en estos días y le fue imposible conseguir personal adicional, el cual reiniciará el día martes 2-jul-24.

VIII. Actividades a realizar en la siguiente semana

1. Continuar suministro e instalación de Riego de imprimación con emulsión asfáltica K3+ 505 hasta K3 +625.
2. Continuar suministro e instalación de Mezcla Densa en Caliente tipo MDC-25 en el K3+ 505 hasta K3 +625. ambas carriles
3. Continuar suministro e instalación de Mezcla Densa en Caliente tipo MDC-19 en el K3+ 505 hasta K3 +625. ambas carriles
4. Continuar construcción Cuneta de Concreto Vaciada In Situ.
5. Continuar suministro e instalación de Relleno para hombro de las Cunetas en concreto.
6. ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO

IX. Esquema grafico del proyecto



X. Registro fotografico








Nota: Las cifras cantidades y valores consignadas en el presente reporte son responsabilidad exclusiva del interventor

XI. Describir las acciones a seguir por parte de la interventoria que contribuyan al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista de obra	Director de interventoria

1. Continuar seguimiento a las actividades de obra de acuerdo a las especificaciones INVIAS ejecutadas por el contratista de obra.
2. Continuar seguimiento cronograma de obra.
3. Supervisión instalación de los diferentes materiales en obra.
4. Con la comunicación CIM-2247-21-1131-21-377 (24-jun-24) - Solicitud presentación formatos Informe Mensual junio de 2024.
5. Con la comunicación CIM-2247-21-1131-21-378 (24-jun-24) - Inactividad actividad en la ejecución de obra.
6. Con la comunicación CIM-2247-21-1131-21-379 (25-jun-24) - Solicitud de resultados de densidades (INV E – 161 – 13)
7. La Interventoría realizó el Acta Previa de Obra y se esta gestionando el Acta de Recibo de Obra.



Nombre MARISOL AMAYA CORREA

Mat Prof25202-74273 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

Codigo	MINFRA-MN-IN-15-FR-2
Version	1
Pagina	1 de 1
Fecha	2024/06/10 17:09

Informacion General

Proyecto Carretera	CONVENIO 1133-2021 PALENQUE – AGUAS CLARAS (MUNICIPIO FRESNO)			Tramo y o sector		PALENQUE - AGUAS CLARAS	
Unidad Ejecutora	SUBDIRECCION VIAS REGIONALES	Direccion territorial	Dirección Territorial Tolima	SemanaNo: 111			
Supervisor Contrato interventoria:	Lenin Tito Mendoza Peña		Gestor tècnico del proyecto:	DIEGO FERNANDO CAICEDO CASTRO			
Objeto del conrato de obra:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN EL MUNICIPIO DE FRESNO DEPARTAMENTO DE TOLIMA - COLOMBIA RURAL, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO No. 1133 – 2021 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y EL MUNICIPIO DE FRESNO.					Fecha de inicio	2022/03/12
Km a mejorar: .00	Km a rehabilitar .00	Km a Construir .00		No. Puente .00		Otros	

Contrato de Obra:				Contrato de Interventoria			
Contratista	CONSORCIO FRESNO IC			Interventor	Consorcio Intermunicipios		
Integrantes	Nit: 813005203-3 — Razon social: INGENIERIA Y MINERIA INGEMIN S.A.S — %: 95% Nit: 80427986 — Razon social: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA — %: 5%			Integrantes	Nit: 41775005 — Razon social: ALCIRA PAEZ DURAN — %: 40% Nit: 860038275-3 — Razon social: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S — %: 60%		
Contrato No	167 - 2022	Valor Inicial	$4,046,192,741	Contrato No	2247 - 2021	Valor Inicial	$1,716,988,701
Plazo Inicial	5.00	Adiciones	$0	Plazo Inicial	3.87	Adiciones	$0
Plazo acumulado	22.60	Valor acumulado	$4,046,192,741	Plazo acumulado	29.00	Valor Acumulado	$2,646,988,701

II Informacion Presupuestal y avance financiero


Distribuciòn de recursos presupuestales contrato de obra por vigencia

Vigencia	2022
Recursos x vigencia	$4,046,192,741
Ejecutado	$289,147,076

Contrato de obra:		Contrato de interventoria	
Valor básico contrato de obra	$4,046,192,741		
Anticipos asignados	$0		
Inversion obra, programada acumulada	$4,046,192,741		
Inversion obra, ejecutada acumulada	$1,903,074,854		
Avance obra en % B/A	47.03		
Avance obra fisica %	69.31		
Otras inversiones ejecutadas (Estudios y diseños gestion predial, social ambiental y otras)	$0	Ejecutado acumulado	$549,836,692
Total inversion ejecutada	$1,141,844,912		
Anticipo amortizado	$761,229,942		
Presento factura en la presente semana	Si[ ] No[X]	Presento factura en la presente semana	Si[ ] No[X]
Mes facturado	2023-9	Mes facturado	6
Valor factura $200,000,000 — Fecha factura 2024/06/30		Valor factura $80,000,000 — Fecha factura 2024/06/30	
Pagos acumulados reporte SIIF NACION		Pagos acumulados reporte SIIF NACION	

III Avance Físico

Actividad	PRG	1	2	3	4	5	6	7	Total
ALCANTARILLAS (Und)	7.0								0.0
GAVION DE MALLA EN ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1 (m3)	130.0			16.0					16.0
MANTENIMIENTO (ML)	2369.0								0.0
PLACA HUELLA (ML)	3131.0								0.0



Maquinaria	MMR	1	2	3	4	5	6	7	Total
Moto niveladoras:	1.0								0.0
Vibradores de concreto	1.0								0.0
Compresor	1.0								0.0
Carrotanques	1.0								0.0
Compactador manual vibratorio (Rana)	1.0								0.0
Vibro compactadores:	1.0								0.0
Mezcladora de concreto	1.0								0.0
Retroexcavadora Neumática	1.0								0.0

IV Gestion Ambiental

Fuentes de materiales

Ubicación	Permiso minero	Licencia ambiental
Mina San Pedro Armero Guayabal	Si[X] No[ ]	Si[X] No[ ]
Concesión de agua San Pedro Armero Guayabal	Si[X] No[ ]	Si[X] No[ ]

Observaciones:El Proyecto no requirió de permisos ambientales ante la respectiva CAR.

P.A.G.A. (Programa de Adaptación a la Guia Ambiental)

Estado: Esta Interventoría no cuenta con resultados en la ejecución del PAGA del proyecto, desde el mes de Julio de 2023 hasta la fecha. De acuerdo al estado del proyecto se tiene Programado un avance de obra del 82,29%, sin embargo se ha ejecutado 68,9

Permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental

Zonas de deposito	Si[ ] No[X] N/A[_]	Ocupación de causes	Si[ ] No[X] N/A[_]
Licencia ambiental	Si[ ] No[X] N/A[_]	Vertimientos	Si[ ] No[X] N/A[_]
Aprovechamiento forestal	Si[ ] No[X] N/A[_]	Emisiones	Si[ ] No[X] N/A[_]
Concesion de aguas	Si[ ] No[X] N/A[_]	Otros	

Observaciones:El Proyecto no requirió de permisos ambientales ante la respectiva CAR.

Observaciones: Esta Interventoría no cuenta con resultados en la ejecución del PAGA del proyecto, desde el mes de Julio de 2023 hasta la fecha. De acuerdo al estado del proyecto se tiene Programado un avance de obra del 82,29%, sin embargo se ha ejecutado 68,96, evidenciando un atraso en el avance del 13,33%.

V. Gestion predial

Total predios a adquirir	0	
Fichas prediales aprobadas	0	
Avaluos aprobados	0	
Predios adquiridos	0	

Observaciones: El proyecto no requiere Gestión Predial.

VI. Gestion Social

Total empleos generados	15	No. Socializaciones realizadas	2
Empleos directos generados	12	No. Capacitaciones realizadas	2
Empleos indirectos generados	3	Direccion sede atencion al usuario: Puesto de Salud Vereda Aguas Claras	
Otros			

Observaciones:CONTRATISTA:
* Se presenta el informe mensual de la gestión social correspondiente al mes de mayo.
* Sobre el oficio No. 365 radicado por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Fresno remitió donde notifica el fallo de la acción de tutela Rad. 2024-00083 promovida por el Señor HECTOR BERNARDO ESCUCHA, el contratista radica oficio de respuesta al peticionario el día 28-may-2024.
INTERVENTORÍA:
* Se radica la comunicación CIM-2247-21-1133-21-241 como respuesta al derecho de petición presentado por el señor Héctor Escucha y atendiendo el fallo del 22-may-2024 presentado por el Juzgado 01 Promiscuo Municipal de Fresno.
* Con el oficio CIM-2247-21-121 se radica el informe trimestral N°8 de la gestión social, radicado N°2024E-VUVRAZ-049244 del 31-may-2024 por Atención al Ciudadano - INVIAS.
* Elaboración del informe mensual N°26 - MAYO

VII. Actividades realizadas en la semana

1. K2+870 Muro gavión. Conformación de canastas y elaboración gaviones. Construcción muro

VIII. Actividades a realizar en la siguiente semana

1. K2+870 Muro gavión - Continuar con la conformación de canastas y elaboración gaviones
2. Reparación de fisuras pendiente en placa huella.
3. K0+450 al K0+630 Construcción cunetas y bordillos - terminar la actividad para completar áreas faltantes.

IX. Esquema grafico del proyecto



X. Registro fotografico







Nota: Las cifras cantidades y valores consignadas en el presente reporte son responsabilidad exclusiva del interventor

XI. Describir las acciones a seguir por parte de la interventoria que contribuyan al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista de obra	Director de interventoria

1. La Interventoría realiza supervisión de la obra.
2. Personal Ingeniero residente de obra, SST, 1 maestro, 1 oficial y 6 ayudantes.
3. Durante la semana comprendida entre el 31 de mayo al 06 de junio se presentaron lluvias el día 31 de mayo y días soleados el 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de junio.
4. El Contratista no ha cumplido con la totalidad de los compromisos pactados Reunión 26.abr-2024, por lo que nuevamente se le ofició solicitandole que cumpla con lo requerido en anteriores comunicaciones.
5. Se envió al Contratista comunicación CIM-2247-21-1133-21-243 del 4-06-2024 -Reiteración presentación formatos Informe Mensual mayo 2024.
6. Con la comunicación CIM-2247-21-1133-21-244 del 4-06-2024-Estado avance de obra, se relaciona el estado de avance de obra y se le informa al contratista que se está presentando atraso en la obra.Se le solicita al contratista incrementar otros frentes de trabajo.



Nombre Marisol Amaya Correa

Mat Prof25202-74273 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	Codigo	MINFRA-MN-IN-15-FR-2
	Version	1
	Pagina	1 de 1
	Fecha	2024/06/17 10:05

Informacion General

Proyecto Carretera	CONVENIO 1133-2021 PALENQUE – AGUAS CLARAS (MUNICIPIO FRESNO)							Tramo y o sector		PALENQUE - AGUAS CLARAS	
Unidad Ejecutora	SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		Direccion territorial	Dirección Territorial Tolima				SemanaNo: 112			
Supervisor Contrato interventoria:	Lenin Tito Mendoza Peña					Gestor tècnico del proyecto:		DIEGO FERNANDO CAICEDO CASTRO			
Objeto del conrato de obra:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN EL MUNICIPIO DE FRESNO DEPARTAMENTO DE TOLIMA - COLOMBIA RURAL, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO No. 1133 – 2021 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y EL MUNICIPIO DE FRESNO.									Fecha de inicio	2022/03/12
Km a mejorar:	.00	Km a rehabilitar	.00	Km a Construir	.00	No. Puente	.00	Otros			

Contrato de Obra:				Contrato de Interventoria			
Contratista	CONSORCIO FRESNO IC			Interventor	Consorcio Intermunicipios		
Integrantes	Nit: 813005203-3 — Razon social: INGENIERIA Y MINERIA INGEMIN S.A.S — %: 95% Nit: 80427986 — Razon social: JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA — %: 5%			Integrantes	Nit: 41775005 — Razon social: ALCIRA PAEZ DURAN — %: 40% Nit: 860038275-3 — Razon social: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S — %: 60%		
Contrato No	167 - 2022	Valor Inicial	$4,046,192,741	Contrato No	2247 - 2021	Valor Inicial	$1,716,988,701
Plazo Inicial	5.00	Adiciones	$0	Plazo Inicial	3.87	Adiciones	$0
Plazo acumulado	22.60	Valor acumulado	$4,046,192,741	Plazo acumulado	29.00	Valor Acumulado	$2,646,988,701

II Informacion Presupuestal y avance financiero


Distribuciòn de recursos presupuestales contrato de obra por vigencia

Vigencia	2022
Recursos x vigencia	$4,046,192,741
Ejecutado	$289,147,076

Contrato de obra:				Contrato de interventoria			
Valor básico contrato de obra	$4,046,192,741						
Anticipos asignados	$0						
Inversion obra, programada acumulada	$4,046,192,741						
Inversion obra, ejecutada acumulada	$1,903,074,854						
Avance obra en % B/A	47.03						
Avance obra fisica %	69.71						
Otras inversiones ejecutadas (Estudios y diseños gestion predial, social ambiental y otras)	$0				Ejecutado acumulado	$549,836,692	
Total inversion ejecutada	$1,141,844,912						
Anticipo amortizado	$761,229,942						
Presento factura en la presente semana	Si[ ] No[X]				Presento factura en la presente semana	Si[ ] No[X]	
Mes facturado	2023-9				Mes facturado	6	
Valor factura	$200,000,000	Fecha factura	2024/06/30		Valor factura	$80,000,000	Fecha factura: 2024/06/30
Pagos acumulados reporte SIIF NACION					Pagos acumulados reporte SIIF NACION		

III Avance Físico

Actividad	PRG	1	2	3	4	5	6	7	Total
ALCANTARILLAS (Und)	7.0								0.0
GAVION DE MALLA EN ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1 (m3)	130.0			16.0					16.0
MANTENIMIENTO (ML)	2369.0								0.0
PLACA HUELLA (ML)	3131.0	190.0							190.0



Maquinaria	MMR	1	2	3	4	5	6	7	Total
Moto niveladoras:	1.0								0.0
Vibradores de concreto	1.0								0.0
Compresor	1.0								0.0
Carrotanques	1.0								0.0
Compactador manual vibratorio (Rana)	1.0								0.0
Vibro compactadores:	1.0								0.0
Mezcladora de concreto	1.0	1.0							1.0
Retroexcavadora Neumática	1.0								0.0

IV Gestion Ambiental

Fuentes de materiales

Ubicación	Permiso minero	Licencia ambiental
Mina San Pedro Armero Guayabal	Si[X] No[ ]	Si[X] No[ ]
Concesión de agua San Pedro Armero Guayabal	Si[X] No[ ]	Si[X] No[ ]

Observaciones:El Proyecto no requirió de permisos ambientales ante la respectiva CAR.

P.A.G.A. (Programa de Adaptación a la Guia Ambiental)

Estado: Esta Interventoría no cuenta con resultados en la ejecución del PAGA del proyecto, desde el mes de Julio de 2023 hasta la fecha. De acuerdo al estado del proyecto se tiene Programado un avance de obra del 91,48%, sin embargo se ha ejecutado 69,71%

Permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental

Zonas de deposito	Si[ ] No[X] N/A[_]	Ocupación de causes	Si[ ] No[X] N/A[_]
Licencia ambiental	Si[ ] No[X] N/A[_]	Vertimientos	Si[ ] No[X] N/A[_]
Aprovechamiento forestal	Si[ ] No[X] N/A[_]	Emisiones	Si[ ] No[X] N/A[_]
Concesion de aguas	Si[ ] No[X] N/A[_]	Otros	

Observaciones:El Proyecto no requirió de permisos ambientales ante la respectiva CAR.

Observaciones: Esta Interventoría no cuenta con resultados en la ejecución del PAGA del proyecto, desde el mes de Julio de 2023 hasta la fecha. De acuerdo al estado del proyecto se tiene Programado un avance de obra del 91,48%, sin embargo se ha ejecutado 69,71% evidenciando un atraso en el avance del 21,77%

V. Gestion predial

Total predios a adquirir	0	Observaciones: El proyecto no requiere Gestión Predial.
Fichas prediales aprobadas	0	
Avaluos aprobados	0	
Predios adquiridos	0	

VI. Gestion Social

Total empleos generados	15	No. Socializaciones realizadas	2
Empleos directos generados	12	No. Capacitaciones realizadas	2
Empleos indirectos generados	3	Direccion sede atencion al usuario: Puesto de Salud Vereda Aguas Claras	
Otros			

Observaciones:CONTRATISTA:
* Se presenta el informe mensual de la gestión social correspondiente al mes de mayo.
* Sobre el oficio No. 365 radicado por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Fresno remitió donde notifica el fallo de la acción de tutela Rad. 2024-00083 promovida por el Señor HECTOR BERNARDO ESCUCHA, el contratista radica oficio de respuesta al peticionario el día 28-may-2024.
INTERVENTORÍA:
* Se radica la comunicación CIM-2247-21-1133-21-241 como respuesta al derecho de petición presentado por el señor Héctor Escucha y atendiendo el fallo del 22-may-2024 presentado por el Juzgado 01 Promiscuo Municipal de Fresno.
* Con el oficio CIM-2247-21-121 se radica el informe trimestral N°8 de la gestión social, radicado N°2024E-VUVRAZ-049244 del 31-may-2024 por Atención al Ciudadano - INVIAS.
* Elaboración del informe mensual N°26 - MAYO.

VII. Actividades realizadas en la semana

1. K2+870 Muro gavión. Conformación de canastas y elaboración gaviones. Construcción muro
2. K0+450 al K0+630 Construcción cunetas y bordillos

VIII. Actividades a realizar en la siguiente semana

1. K2+870 Muro gavión - Continuar con la conformación de canastas y elaboración gaviones
2. Reparación de fisuras pendiente en placa huella.
3. K2+870 - K2+850 Construcción de Alcantarillas

IX. Esquema grafico del proyecto



X. Registro fotografico







Nota: Las cifras cantidades y valores consignadas en el presente reporte son responsabilidad exclusiva del interventor

XI. Describir las acciones a seguir por parte de la interventoria que contribuyan al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista de obra	Director de interventoria

1. La Interventoría realiza supervisión de la obra
2. Personal Ingeniero residente de obra, SST, 1 maestro, 1 oficial y 6 ayudantes
3. Durante la semana comprendida entre el 07 de junio al 13 de junio se presentaron lluvias el día 8 de junio y días soleados el 7, 9, 10, 11, 1 2, 13 de junio soleados
4. Se envió Comunicación CIM-2247-21-1133-245 de 6-06-2024- Seguimiento a Derechos de petición. Solicitando a Planeación su colaboración para que el Contratista gestione el cierre de las peticiones y solicitudes, ya que no ha sido factible que atienda el requerimiento por ningún
medio
5. Con la comunicación CIM-2247-21-1133-21-246 de 11-06-2024-Avance de obra. la Interventoría ejerciendo su compromiso en la supervisión del proyecto relaciona el estado de avance de obra e informa el atraso en las actividades, lo que significa que no se va a cumplir la meta física para el 3 de julio.



Nombre Marisol Amaya Correa

Mat Prof25202-74273 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

Codigo	MINFRA-MN-IN-15-FR-2	
Version	1	
Pagina	1 de 1	
Fecha	2024/06/23 18:11	

Informacion General

Proyecto Carretera	CONVENIO 1133-2021 PALENQUE – AGUAS CLARAS (MUNICIPIO FRESNO)					Tramo y o sector		PALENQUE - AGUAS CLARAS	
Unidad Ejecutora	SUBDIRECCION VIAS REGIONALES	Direccion territorial	Dirección Territorial Tolima			SemanaNo: 113			
Supervisor Contrato interventoria:	Lenin Tito Mendoza Peña			Gestor tècnico del proyecto:		DIEGO FERNANDO CAICEDO CASTRO			
Objeto del conrato de obra:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN EL MUNICIPIO DE FRESNO DEPARTAMENTO DE TOLIMA - COLOMBIA RURAL, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO No. 1133 – 2021 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y EL MUNICIPIO DE FRESNO.							Fecha de inicio	2022/03/12
Km a mejorar: .00	Km a rehabilitar .00	Km a Construir .00		No. Puente .00		Otros			

Contrato de Obra:				Contrato de Interventoria			
Contratista	CONSORCIO FRESNO IC			Interventor	Consorcio Intermunicipios		
Integrantes	Nit / Razon social / %			Integrantes	Nit / Razon social / %		
	813005203-3	INGENIERIA Y MINERIA INGEMIN S.A.S	95%		41775005	ALCIRA PAEZ DURAN	40%
	80427986	JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA	5%		860038275-3	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	60%
Contrato No	167 - 2022	Valor Inicial	$4,046,192,741	Contrato No	2247 - 2021	Valor Inicial	$1,716,988,701
Plazo Inicial	5.00	Adiciones	$0	Plazo Inicial	3.87	Adiciones	$0
Plazo acumulado	22.60	Valor acumulado	$4,046,192,741	Plazo acumulado	29.00	Valor Acumulado	$2,646,988,701

II Informacion Presupuestal y avance financiero


Distribuciòn de recursos presupuestales contrato de obra por vigencia

Vigencia	2022
Recursos x vigencia	$4,046,192,741
Ejecutado	$289,147,076

Contrato de obra:		Contrato de interventoria	
Valor básico contrato de obra	$4,046,192,741		
Anticipos asignados	$0		
Inversion obra, programada acumulada	$4,046,192,741		
Inversion obra, ejecutada acumulada	$1,903,074,854		
Avance obra en % B/A	47.03		
Avance obra fisica %	69.86		
Otras inversiones ejecutadas (Estudios y diseños gestion predial, social ambiental y otras)	$0	Ejecutado acumulado	$549,836,692
Total inversion ejecutada	$1,141,844,912		
Anticipo amortizado	$761,229,942		
Presento factura en la presente semana	Si[ ] No[X]	Presento factura en la presente semana	Si[ ] No[X]
Mes facturado	2023-9	Mes facturado	6
Valor factura $200,000,000	Fecha factura 2024/06/30	Valor factura $80,000,000	Fecha factura 2024/06/30
Pagos acumulados reporte SIIF NACION		Pagos acumulados reporte SIIF NACION	

III Avance Físico

Actividad	PRG	1	2	3	4	5	6	7	Total
ALCANTARILLAS (Und)	7.0								0.0
GAVION DE MALLA EN ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1 (m3)	130.0	0.0		2.0					2.0
MANTENIMIENTO (ML)	2369.0								0.0
PLACA HUELLA (ML)	3131.0	204.0							204.0



Maquinaria	MMR	1	2	3	4	5	6	7	Total
Moto niveladoras:	1.0								0.0
Vibradores de concreto	1.0								0.0
Compresor	1.0								0.0
Carrotanques	1.0								0.0
Compactador manual vibratorio (Rana)	1.0								0.0
Vibro compactadores:	1.0								0.0
Mezcladora de concreto	1.0	1.0							1.0
Retroexcavadora Neumática	1.0								0.0

IV Gestion Ambiental

Fuentes de materiales

Ubicación	Permiso minero	Licencia ambiental
Concesión de agua San Pedro Armero Guayabal	Si[X] No[ ]	Si[X] No[ ]
Mina San Pedro Armero Guayabal	Si[X] No[ ]	Si[X] No[ ]

Observaciones:No se cuenta con información actualizada de los proveedores de los recursos necesarios para el desarrollo del Proyecto.

P.A.G.A. (Programa de Adaptación a la Guia Ambiental)

Estado: El contratista continúa con el incumplimiento en la entrega de informes ambientales mensuales y trimestrales, los cuales a la fecha no han sido radicados.

Permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental

Zonas de deposito	Si[ ] No[X] N/A[_]	Ocupación de causes	Si[ ] No[X] N/A[_]
Licencia ambiental	Si[ ] No[X] N/A[_]	Vertimientos	Si[ ] No[X] N/A[_]
Aprovechamiento forestal	Si[ ] No[X] N/A[_]	Emisiones	Si[ ] No[X] N/A[_]
Concesion de aguas	Si[ ] No[X] N/A[_]	Otros	

Observaciones:El Proyecto no requirió de permisos ambientales ante la respectiva CAR. Sin embargo no implementa, ni presenta informes del PAGA.

Observaciones: El Contratista continua con las actividades constructivas en los sectores del K2+870 Construcción Muro Gavión y Excavación para alcantarilla, K0450+K0+630 construcción cuneta y bordillo y K0+980 Excavación manual para construcción muro gavión.
De acuerdo al estado del proyecto se tiene Programado un avance de obra del 91,48%, sin embargo se ha ejecutado 69,86, continuando con atraso en el avance de obra y entrega de informes de ejecución del PAGA.

V. Gestion predial

Total predios a adquirir	0	Observaciones: El proyecto no requiere Gestión Predial
Fichas prediales aprobadas	0	
Avaluos aprobados	0	
Predios adquiridos	0	

VI. Gestion Social

Total empleos generados	15	No. Socializaciones realizadas	2	Observaciones:CONTRATISTA: * Entrega de información a la comunidad para cierre de vía. * Reunión con comunidad convocada por la alcaldía municipal de Fresno con el fin de dialogar sobre el tiempo de finalización del contrato. INTERVENTORÍA: * Seguimiento a la gestión social del contrato. * Aprobación de piezas gráficas para informar a la comunidad sobre el cierre de la vía.
Empleos directos generados	12	No. Capacitaciones realizadas	2	
Empleos indirectos generados	3	Direccion sede atencion al usuario: Puesto de Salud Vereda Aguas Claras		
Otros				

VII. Actividades realizadas en la semana

1. K2+870 Muro gavión. Conformación de canastas y elaboración gaviones. Construcción muro
2. K0+450 al K0+630 Construcción cunetas y bordillos
3. K2+870 Excavación manual para construcción alcantarilla
4. K0+980 Excavación manual para construcción muro gavión

VIII. Actividades a realizar en la siguiente semana

1. K2+870 Muro gavión - Continuar con la conformación de canastas y elaboración gaviones-Construcción muro
2. K2+870 - Construcción de Alcantarilla
3. K0+980 - Construcción muro gavión


IX. Esquema grafico del proyecto



X. Registro fotografico







Nota: Las cifras cantidades y valores consignadas en el presente reporte son responsabilidad exclusiva del interventor

XI. Describir las acciones a seguir por parte de la interventoria que contribuyan al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista de obra

Director de interventoria

1. La Interventoría realiza supervisión de la obra
2. Personal Ingeniero residente de obra, SST, 1 maestro, 1 oficial y 6 ayudantes
3. Durante la semana comprendida entre el 14de junio al 20 de junio se presentaron lluvias el día 15 de junio y días soleados el 14, 17, 18, 19, 20 de junio soleados
4. Con la comunicación CIM-2247-21-1133-21-249 de 13-06-2024-Incumplimiento de obligaciones de Contrato de obra. la Interventoría presenta la relación de los presuntos incumplimientos que a la actualidad posee el Contratista Consorcio Fresno IC y la tasación por los incumplimientos
5.Con la comunicación CIM-2247-21-1133-21-250 de 13-06-2024 Invitación a reunión -Estado del Contrato. Por solicitud de la Dirección Territorial Tolima – INVIAS, la Interventoría citó el día martes 2-jul-2024 a las 02:00 pm en las instalaciones de la Dirección sede Ibagué, a una reunión al Alcalde Municipio De Flandes, Secretario de Planeación



Nombre Marisol Amaya Correa

Mat Prof25202-74273 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

Codigo	MINFRA-MN-IN-15-FR-2
Version	1
Pagina	1 de 1
Fecha	2024/07/18 17:12

Informacion General

Proyecto Carretera	CONVENIO 1133-2021 PALENQUE – AGUAS CLARAS (MUNICIPIO FRESNO)					Tramo y o sector		PALENQUE - AGUAS CLARAS	
Unidad Ejecutora	SUBDIRECCION VIAS REGIONALES	Direccion territorial	Dirección Territorial Tolima			SemanaNo: 114			
Supervisor Contrato interventoria:	Lenin Tito Mendoza Peña			Gestor tècnico del proyecto:		DIEGO FERNANDO CAICEDO CASTRO			
Objeto del conrato de obra:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES EN EL MUNICIPIO DE FRESNO DEPARTAMENTO DE TOLIMA - COLOMBIA RURAL, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO No. 1133 – 2021 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y EL MUNICIPIO DE FRESNO.							Fecha de inicio	2022/03/12
Km a mejorar: .00	Km a rehabilitar .00	Km a Construir .00		No. Puente .00		Otros			

Contrato de Obra:

Contratista	CONSORCIO FRESNO IC				
Integrantes	Nit	Razon social	%		
	813005203-3	INGENIERIA Y MINERIA INGEMIN S.A.S	95%		
	80427986	JUAN FRANCISCO CASTAÑEDA FONSECA	5%		
Contrato No	167 - 2022	Valor Inicial	$4,046,192,741		
Plazo Inicial	5.00	Adiciones	$0		
Plazo acumulado	22.60	Valor acumulado	$4,046,192,741		

Contrato de Interventoria

Interventor	Consorcio Intermunicipios				
Integrantes	Nit	Razon social	%		
	41775005	ALCIRA PAEZ DURAN	40%		
	860038275-3	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	60%		
Contrato No	2247 - 2021	Valor Inicial	$1,716,988,701		
Plazo Inicial	3.87	Adiciones	$0		
Plazo acumulado	29.00	Valor Acumulado	$2,646,988,701		

II Informacion Presupuestal y avance financiero

Distribuciòn de recursos presupuestales contrato de obra por vigencia

Vigencia	2022
Recursos x vigencia	$4,046,192,741
Ejecutado	$289,147,076

Contrato de obra:		Contrato de interventoria	
Valor básico contrato de obra	$4,046,192,741		
Anticipos asignados	$0		
Inversion obra, programada acumulada	$4,046,192,741		
Inversion obra, ejecutada acumulada	$1,903,074,854		
Avance obra en % B/A	47.03		
Avance obra fisica %	69.93		
Otras inversiones ejecutadas (Estudios y diseños gestion predial, social ambiental y otras)	$0	Ejecutado acumulado	$549,836,692
Total inversion ejecutada	$1,141,844,912		
Anticipo amortizado	$761,229,942		
Presento factura en la presente semana	Si[ ] No[X]	Presento factura en la presente semana	Si[ ] No[X]
Mes facturado	2023-6	Mes facturado	6
Valor factura $200,000,000	Fecha factura 2024/07/05	Valor factura $80,000,000	Fecha factura 2024/07/05
Pagos acumulados reporte SIIF NACION		Pagos acumulados reporte SIIF NACION	

III Avance Físico

Actividad	PRG	1	2	3	4	5	6	7	Total
ALCANTARILLAS (Und)	7.0	1.0	2.0		1.0	1.0			5.0
GAVION DE MALLA EN ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1 (m3)	130.0			124.0					124.0
MANTENIMIENTO (ML)	2369.0	200.0	80.0	270.0	293.0	120.0			963.0
PLACA HUELLA (ML)	3131.0	402.0	1020.0	220.0		540.0			2182.0



Maquinaria	MMR	1	2	3	4	5	6	7	Total
Moto niveladoras:	1.0								0.0
Vibradores de concreto	1.0								0.0
Compresor	1.0								0.0
Carrotanques	1.0								0.0
Compactador manual vibratorio (Rana)	1.0								0.0
Vibro compactadores:	1.0								0.0
Mezcladora de concreto	1.0								0.0
Retroexcavadora Neumática	1.0								0.0

IV Gestion Ambiental

Fuentes de materiales

Ubicación	Permiso minero	Licencia ambiental
Concesión de agua San Pedro	Si[X] No[ ]	Si[X] No[ ]
Mina San Pedro	Si[X] No[ ]	Si[X] No[ ]

Observaciones:No se cuenta con información actualizada de los proveedores de los recursos necesarios para el desarrollo del Proyecto.

P.A.G.A. (Programa de Adaptación a la Guia Ambiental)

Estado: El contratista continúa con el incumplimiento en la entrega de informes ambientales mensuales y trimestrales, los cuales a la fecha no han sido radicados.

Permisos ambientales y/o licenciamiento ambiental

Zonas de deposito	Si[ ] No[X] N/A[_]	Ocupación de causes	Si[ ] No[X] N/A[_]
Licencia ambiental	Si[ ] No[X] N/A[_]	Vertimientos	Si[ ] No[X] N/A[_]
Aprovechamiento forestal	Si[ ] No[X] N/A[_]	Emisiones	Si[ ] No[X] N/A[_]
Concesion de aguas	Si[ ] No[X] N/A[_]	Otros	

Observaciones:El Proyecto no requirió de permisos ambientales ante la respectiva CAR. Sin embargo no implementa, ni presenta informes del PAGA.

Observaciones: El Contratista continua con las actividades constructivas. De acuerdo al estado del proyecto se tiene Programado un avance de obra del 91,48%, sin embargo se ha ejecutado 69,86, continuando con atraso en el avance de obra y entrega de informes de ejecución del PAGA.

V. Gestion predial

Total predios a adquirir	0	
Fichas prediales aprobadas	0	
Avaluos aprobados	0	
Predios adquiridos	0	

Observaciones: El proyecto no requiere Gestión Predial.

VI. Gestion Social

Total empleos generados	22	No. Socializaciones realizadas	2
Empleos directos generados	18	No. Capacitaciones realizadas	2
Empleos indirectos generados	3	Direccion sede atencion al usuario: Puesto de salud Vereda Aguas Claras	
Otros			

Observaciones:CONTRATISTA:
* Cierre de actas de compromiso
* Cierre actas de intervención voluntaria
* Cierre actas de vecindad.

INTERVENTORÍA:
* Seguimiento a la gestión social del contrato.
* Acompañamiento a las actividades programadas para el cierre de los compromisos adquiridos durante la ejecución del contrato.
* Se solicita al contratista la presentación del informe mensual correspondiente al mes de junio para el día viernes 28 de junio de 2024.

VII. Actividades realizadas en la semana

1. K2+870 Muro gavión. Conformación de canastas y elaboración gaviones. Construcción muro
2. K2+870 Excavación manual para construcción alcantarilla K2+880

VIII. Actividades a realizar en la siguiente semana

1. K2+870 Muro gavión - Continuar con la conformación de canastas y elaboración gaviones-Construcción muro
2. K2+880 y K2+860 - Construcción de Alcantarillas
3. K0+980 - Construcción muro gavión

IX. Esquema grafico del proyecto



X. Registro fotografico








Nota: Las cifras cantidades y valores consignadas en el presente reporte son responsabilidad exclusiva del interventor

XI. Describir las acciones a seguir por parte de la interventoria que contribuyan al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista de obra	Director de interventoria

1. La Interventoría realiza supervisión de la obra.
2. Personal Ingeniero residente de obra, SST, 1 maestro, 1 oficial y 3 ayudantes .
3. Durante la semana comprendida entre el 21de junio al 27 de junio se presentaron lluvias el día 21, 22 de junio y dias soleados el 23, 24, 25, 26 20 de junio soleados.
4. Con la comunicación CIM-2247-21-1133-21-253 de 21-06-2024-Incumplimiento de las obligaciones contractuales, establecidas en el Contrato de obra No.167 de 2022 e imposición de multas, sanciones y declaratoria de incumplimiento de acuerdo con las cláusulas 14 y 15 del Contrato de obra No.167 de 2022, la Interventoría solicita al Municipio de Fresno dar aplicación de la cláusula 14 Multas y la cláusula 15 Penal, del Contrato de Obra, motivo por el cual, se procederá a la realización de lo señalado en el Art. 86 -Imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento de la Ley 1474 de 2011.



Nombre MARISOL AMAYA CORREA

Mat Prof25202-74273 CND
