Andirec LTDA
NIT:900.271.287-3

**Bogota D.C. 22 DE Julio de 2025**

**Señores**

SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL
Grupo Administrativo Intercentros CEET
**ATENCION: Supervisor del contrato**

Ciudad

**REFERENCIA: CONFIRMACION ADICION Y SOLICITUD DE PRORROGA, ENTREGA CONTRATO CO1.PCCNTR.7930803**

El suscrito **CLAUDIA MILENA FONSECA RAMIREZ** identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad de Representante Legal de **ANDIREC LTDA** identificada con NIT: 900.271.287-3, conforme lo establece en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 art. 5, y conforme el decreto 1082 de 2015 y bajo lo que me confiere la ley respetuosamente presento Aceptación de adición y solicitud de prorroga al contrato CO1.PCCNTR.7930803 cuyo objeto es CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS ÁREAS DE ELECTRICIDAD, ELECTRONICA, TELECOMUNICACIONES DEL CEET.. Debido a lo siguiente:

1. La entidad solicita adición a los siguientes lotes, dichos elementos son de carácter especializado y se encuentran en las cotizaciones adjuntas a esta solicitud.

| LOTE | VALOR A ADICIONAR |
|---|---|
| LOTE 3 TELECOMUNICACIONES | $ 8.253.128,38 |
| LOTE 4 ELECTRICIDAD | $ 47.723.023,39 |
| LOTE 6 TELEINFORMÁTICA | $ 8.219.306,20 |

**Confirmamos que aceptamos dichas adiciones sin modificar los precios ofertados.**

2. Sin embargo lo anterior, para los elementos ***solicitados en la adición,*** y ***para elementos del contrato inicial*** Se presentan demoras considerables en los tiempos de entrega como se relaciona a continuación:

LOTE 3

CONTRATO INICIAL FECHA DE ENTREGA ELEMENTOS ESTIMADA:

| | | |
|---|---|---|
| 5 | Transmisor optico | Agosto 25 2025 EN BOGOTA |
| 20 | Tarjeta grafica | Agosto 25 2025 EN BOGOTA |

ADICION FECHA DE ENTREGA COMPROMISO

| ITEM | ELEMENTO | TIEMPO DE ENTREGA |
|---|---|---|
| 16 | Unidad de almacenamiento | SEPTIEMBRE 4 DE 2025 |
| 17 | Memoria | SEPTIEMBRE 4 DE 2025 |
| 18 | Tarjeta de red | SEPTIEMBRE 4 DE 2025 |
| 19 | Bus de datos | SEPTIEMBRE 4 DE 2025 |

CALLE 56A 74B-32 BOGOTÁ D.C. COLOMBIA
(57)+1+2919005- (57)+1+2918858
(57)+3002815301
info@andirec.com-andirecltda@gmail.com
www.andirec.com

| | | |
|---|---|---|
| 20 | Tarjeta grafica | SEPTIEMBRE 4 DE 2025 |

LOTE 4

Por la cantidad de elementos solicitados y lo dispendioso de la logística de compra los tiempos son de 30 días adicionales para cumplir a cabalidad con lo requerido, EN LA SOLICITUD DE adición.

***COMPROMISO PARA: SEPTIEMBRE 4 DE 2025***

LOTE 6

***CONTRATO INICIAL FECHA DE ENTREGA ELEMENTOS ESTIMADA:***

*ITEM 19*

| | | |
|---|---|---|
| 19 | Estuche Oculus Quest 2 | AGOSTO 15 |


***ADICION FECHA DE ENTREGA COMPROMISO SEPTIEMBRE 4 2025***

| ITEM | NOMBRE DEL ELEMENTO |
|---|---|
| 1 | Audifonos Profesionales |
| 2 | Tripode 360° 2-en-1 Monopie |
| 3 | Microfono de Solapa Omnidireccional |
| 4 | Luz LED 5500K recargable |
| 23 | Cartulina Pliego X 25 Und Blanc |
| 25 | Vinilo Acrílico Negro 125 Gr X 3 Unidades |
| 26 | Vinilo Acrílico Blanco 125 Gr X 3 Unidades |
| 27 | Vinilo Acrílico Amarillo 125 Gr X 3 Unidades |
| 28 | Vinilo Acrílico Azul 125 Gr X 3 Unidades |
| 29 | Vinilo Acrílico Rojo 125 Gr X 3 Unidades |
| 30 | Set de Pinceles Planos x 6 un |
| 31 | convertidores vga a displayport |

Estos tiempos son definidos a partir de la orden de compra y pago del pedido. Teniendo claro que las negociaciones y definiciones técnicas se realizaron para la mayoría de los ítems en las primeras semanas de ejecución del contrato bajo el entendido que los procesos de compra se hacen a merced de los contratos celebrados y en ejecución; ya que con esto hay certeza de la compra por parte de la entidad estatal, y no se puede realizar anticipos ni compras bajo informes de selección ni adjudicación ya que como se ha visto en muchos procesos son demandados durante al término del acto de adjudicación, y estos riesgos serian asumidos por el contratista.

De lo anterior indicamos a la entidad que la realización de la compra y los despachos se realizaron como se ve a continuación:

Lote 3:

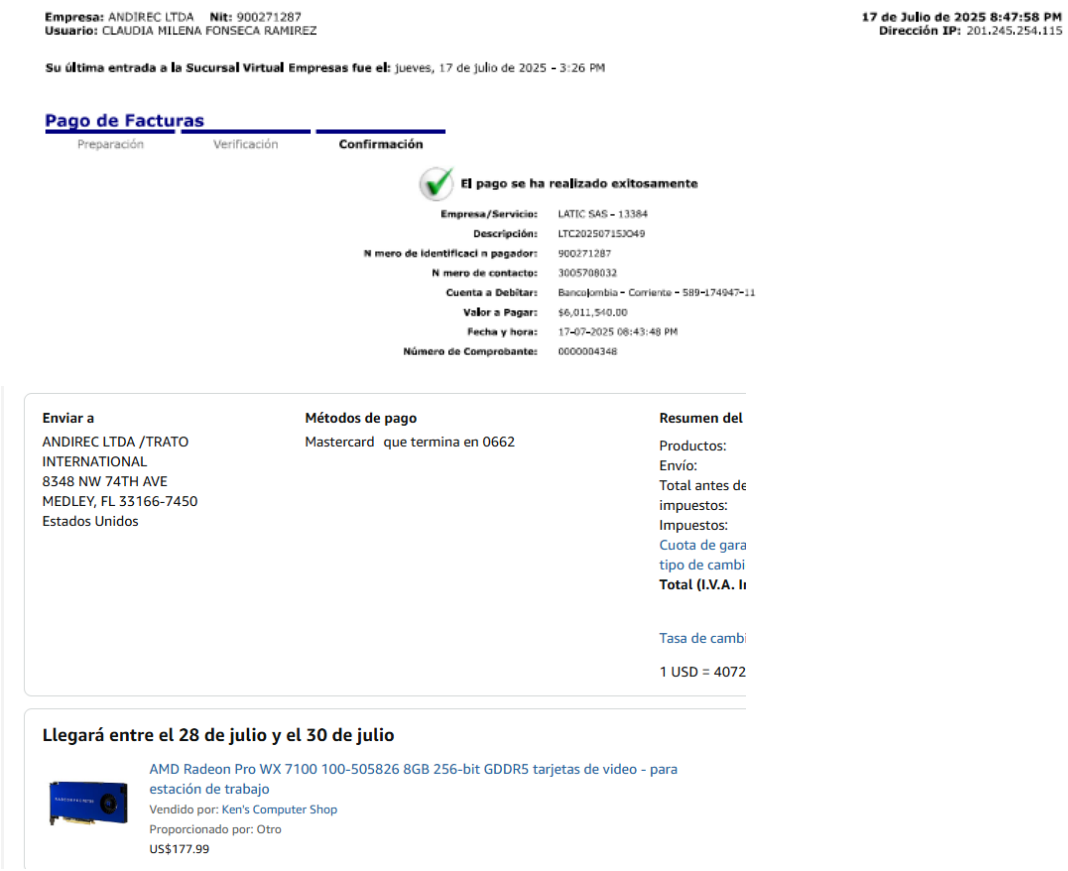

**Empresa:** ANDIREC LTDA **Nit:** 900271287
**Usuario:** CLAUDIA MILENA FONSECA RAMIREZ

**17 de Julio de 2025 8:47:58 PM**
**Dirección IP:** 201.245.254.115

**Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el:** Jueves, 17 de Julio de 2025 - 3:26 PM

**Pago de Facturas**

Preparación | Verificación | **Confirmación**

**El pago se ha realizado exitosamente**

| | |
|---|---|
| **Empresa/Servicio:** | LATIC SAS - 13384 |
| **Descripción:** | LTC20250715O049 |
| **N mero de identificaci n pagador:** | 900271287 |
| **N mero de contacto:** | 3005708032 |
| **Cuenta a Debitar:** | Bancolombia - Corriente - 589-174947-11 |
| **Valor a Pagar:** | $6,011,540.00 |
| **Fecha y hora:** | 17-07-2025 08:43:48 PM |
| **Número de Comprobante:** | 0000004348 |

**Enviar a**
ANDIREC LTDA /TRATO INTERNATIONAL
8348 NW 74TH AVE
MEDLEY, FL 33166-7450
Estados Unidos

**Métodos de pago**
Mastercard que termina en 0662


**Resumen del**
Productos:
Envío:
Total antes de impuestos:
Impuestos:
Cuota de gara
tipo de cambi
**Total (I.V.A. I**

Tasa de cambi
1 USD = 4072

**Llegará entre el 28 de julio y el 30 de julio**

AMD Radeon Pro WX 7100 100-505826 8GB 256-bit GDDR5 tarjetas de video - para estación de trabajo
Vendido por: Ken's Computer Shop
Proporcionado por: Otro
US$177.99

Lote 6 ITEM 19

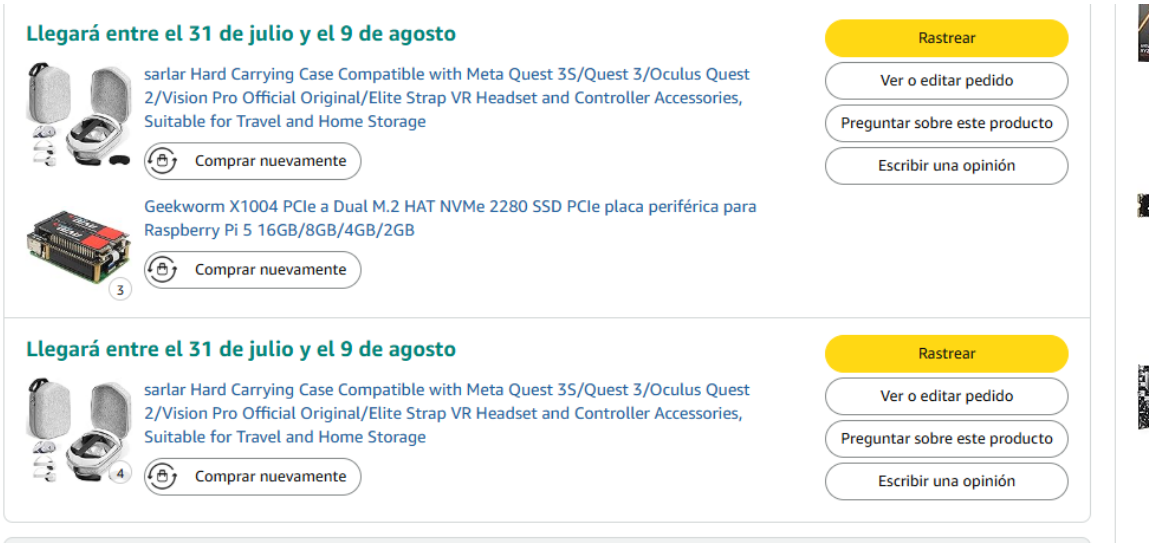

**Llegará entre el 31 de julio y el 9 de agosto**

sarlar Hard Carrying Case Compatible with Meta Quest 3S/Quest 3/Oculus Quest 2/Vision Pro Official Original/Elite Strap VR Headset and Controller Accessories, Suitable for Travel and Home Storage

Comprar nuevamente

Geekworm X1004 PCIe a Dual M.2 HAT NVMe 2280 SSD PCIe placa periférica para Raspberry Pi 5 16GB/8GB/4GB/2GB

Comprar nuevamente

Rastrear
Ver o editar pedido
Preguntar sobre este producto
Escribir una opinión

**Llegará entre el 31 de julio y el 9 de agosto**

sarlar Hard Carrying Case Compatible with Meta Quest 3S/Quest 3/Oculus Quest 2/Vision Pro Official Original/Elite Strap VR Headset and Controller Accessories, Suitable for Travel and Home Storage

Comprar nuevamente

Rastrear
Ver o editar pedido
Preguntar sobre este producto
Escribir una opinión

Dichos documentos, transferencias, o capturas de sitio web sustentan la realidad del acto de comercio, y la veracidad de la demora en la entrega de los elementos y/o equipos solicitados.

Si bien somos conscientes de la necesidad de contar con los elementos objeto del contrato en los plazos establecidos, lo es igualmente, que a la fecha no es posible entregar los equipos señalados en los tiempos acordados a causas no imputables en su querer y voluntad en este caso de ANDIREC LTDA, toda vez, que algunos equipos , conforme las características técnicas de los mismas conforme a lo informado por las empresas productoras existen retrasos en los procesos de aduana y despacho en estados unidos debido a los riesgos arancelarios de la administracion TRUMP lo cual, impacta negativamente el proceso de logística.

Estas demoras son generadas por hechos de un tercero, por lo que, no ha sido factible durante este lapso de tiempo previo al vencimiento del contrato que nos hagan entrega de los equipos para culminar el proceso, por consiguiente, los tiempos de entrega indudablemente son más largos de lo estimado. Así las cosas, la demora en la entrega constituye un suceso de fuerza mayor o caso fortuito y bajo esta línea de razonabilidad debe a nuestro juicio la supervisión adoptar medidas contractuales y administrativas con el fin de temporalmente ajustar los cronogramas de entrega de los elementos a unos plazos mucho mayores, dada la situación inminente que ocasiona retrasos en las entregas.

Si bien como contratistas estamos en el deber de adoptar medidas para poder adquirir los elementos, no implica entonces esto que las situaciones se mantengan inalteradas e inalterables durante toda la relación contractual. El fenómeno global de escases de componentes, la tensión de la manufactura y la relación entre los gobiernos de CHINA Y ESTADOS UNIDOS,y ha tenido impacto en la consecución de componentes necesarios para la fabricación de los equipos de tecnología, al margen de la modalidad de ejecución pactada, y nadie está obligado a soportar cargas que jurídicamente no le corresponde, es decir, nadie está obligado a lo imposible, de modo que, cuando los circunstancias cambian, deben reconocerse, porque el contratista no podrá responder de manera adecuada a la entrega del bien, en la medida en que puede suceder que la ejecución del contrato resulte mucho más extensa en el tiempo, aclarando que para este caso en particular con el ánimo de minimizar el impacto de entrega y reducir los tiempos, se importan los equipos vía área, por lo que se estima que los equipos lleguen al país y se entreguen de acuerdo al siguiente cronograma:

| | | |
|---|---|---|
| Lote 2 | Contrato inicial 25 de agosto 2025 | ADICION 4 DE SEPTIEMBRE 2025 |
| Lote 3 | Contrato inicial 25 de agosto 2025 | N/A |
| Lote 4 | Contrato inicial 25 de agosto 2025 | ADICION 4 DE SEPTIEMBRE 2025 |

| | | |
|---|---|---|
| Lote 6 | Contrato inicial 25 de agosto 2025 | ADICION 4 DE SEPTIEMBRE 2025 |

En consecuencia, evidenciada la intervención de terceros, se corrobora también la existencia de circunstancias extraordinarias, no previstas en el vínculo contractual, que ameritan no hablar de conflictos por motivos de la ejecución del contractual, sino de fuerza mayor o caso fortuito, como es el caso que nos ocupa.

Por ello, la decisión ajustada a derecho, respecto de nuestra solicitud es la de que se reconozcan las circunstancias de fuerza mayor relacionadas con la intervención de un tercero, anteriormente fundamentadas y **por consiguiente se acepte la siguiente solicitud:**

1. **PRORROGA PLAZO DE ENTREGA**

**Se nos prorrogue hasta el día 4 de Septiembre de 2025 la entrega de los equipos a suministrar en el marco del contrato de la referencia junto con la adicion,** aclarando que esta es una fecha máxima, dado que en el caso que los equipos se encuentren disponibles antes para la entrega se lo informaremos oportunamente al supervisor del contrato.

Solicitamos entonces a la supervisión y a los comités, la modificación de la CLÁUSULA .PLAZO DEL CONTRATO así:

**CLÁUSULA PLAZO DEL CONTRATO El plazo de ejecución será, desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, con fecha máxima de entrega hasta el día 4 septiembre de 2025.**

Lo anterior, conforme con los hechos expresados se evidencia que son hechos externos a las partes, dado que el hecho generador de fuerza mayor o caso fortuito (incumplimiento fabricante), no depende del actuar de ninguna de las partes que se encuentran vinculadas al hecho dañino y no debe ser imputable ni a quien lo causa ni a quien lo sufre.

Agradecemos su atención a la presente, y sin otro en particular,

Atentamente,

**CLAUDIA MILENA FONSECA RAMÍREZ**
C.C No. 52.911.358 de Bogotá
Representante Legal
**ANDIREC LTDA**
900.271.287-3
CALLE 56A 74B-32-Bogotá
Tel. +57 (1) 2919005-2918858

Andirec LTDA
NIT:900.271.287-3

CALLE 56A 74B-32 BOGOTÁ D.C. COLOMBIA
(57)+1+2919005- (57)+1+2918858
(57)+3002815301
info@andirec.com-andirecltda@gmail.com
www.andirec.com
