
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE MERCADO**	**122.7 días**	**16/05/25**	**15/09/25**
2		**ESTUDIOS PRELIMINARES**	**36 días**	**16/05/25**	**20/06/25**
3		Estudios Topográficos	6 días	16/05/25	21/05/25
4		Estudio de suelos	30 días	21/05/25	20/06/25
5		Levantamiento arquitectónico de lo actual	7 días	21/05/25	28/05/25
6		Presentación de 2 esquemas básicos para definir con cual alternativa se desarrollan los diseños definitivos y los estudios técnicos.	20 días	28/05/25	17/06/25
7		**DISEÑOS**	**82 días**	**17/06/25**	**8/09/25**
8		Diseño Arquitectónico de proyecto final, y detalles	40 días	17/06/25	28/07/25
9		Diseño Estructural	40 días	28/07/25	5/09/25
10		Diseño Hidrosanitarios	24 días	6/08/25	1/09/25
11		Diseños Eléctricos	27 días	12/08/25	8/09/25
12		Plan de Manejo Ambiental	21 días	28/07/25	19/08/25
13		Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos	15 días	28/07/25	12/08/25
14		**PRESUPUESTO**	**20 días**	**27/08/25**	**15/09/25**
15		Estudio de cantidades de obra, análisis de precios unitarios, presupuesto, cronograma (incluye proceso constructivo y especificaciones técnicas)	20 días	27/08/25	15/09/25

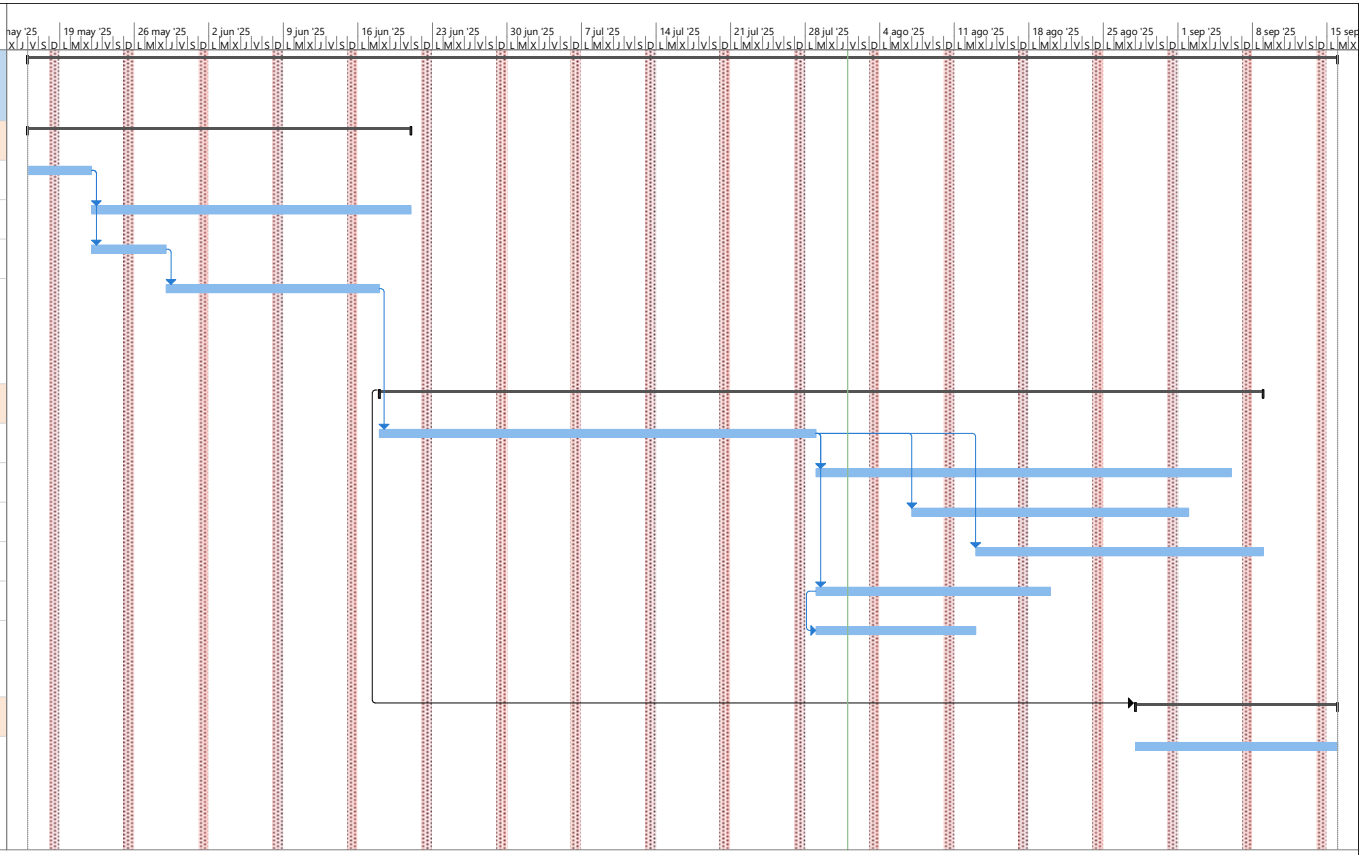

Proyecto: Programación
Fecha: 1/08/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual
