CONSORCIO TAURI 2

***TAURI 2 -OF-341-2025***

Bogotá D.C., 06 de agosto de 2025

Señores
**CONSORCIO CAQUETÁ JINT 027**
**Atte. Ing. César Augusto Palacios**
Representante Legal de Interventoría
L.C.-

***REFERENCIA:*** *CONTRATO DE OBRA 2715 DE 2023 CUYO OBJETO CORRESPONDE A …" MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN VICENTE DEL CAGUÁN LOS POZOS, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ." …*

***ASUNTO: SOLICITUD DE SUSPENSIÓN No. 2 DEL CONTRATO DE OBRA NO. 2715 DE 2023***

Cordial saludo, respetado ingeniero.

Por medio del presente y en búsqueda del cumplimiento de nuestro objeto contractual; nos permitimos remitir a ustedes la respectiva solicitud de suspensión al contrato de obra de la referencia a partir del día 06 de agosto y el 18 de agosto de 2025, con lo cual la fecha de reactivación de este será el 19 de agosto de 2025 y la nueva fecha de terminación se dará el día 27 de agosto de 2025. Lo anterior argumentado en lo siguiente:

***CAUSAL DE SOLICITUD***

En atención a las condiciones climáticas adversas que actualmente afectan el desarrollo del contrato de obra No. 2715 de 2023, cuyo objeto corresponde al "Mejoramiento de la vía San Vicente del Caguán – Los Pozos, departamento del Caquetá", se presenta formalmente la solicitud de suspensión temporal de actividades entre el 06 de agosto y el 18 de agosto de 2025, con el fin de garantizar condiciones técnicas y de seguridad necesarias para la ejecución del componente estructural Box Coulvert localizado en la abscisa K0+550,00 y la construcción del sistema de contención ubicado entre el sector comprendido en el K2+770 y el K2+850.

Esta solicitud se fundamenta en la afectación directa que la temporada invernal ha generado sobre el nivel del río Caguán, el cual ha presentado crecimientos sostenidos y súbitos que imposibilitan las labores constructivas en el cauce. Dichas condiciones representan un alto riesgo de socavaciones, inundaciones, pérdida de material, erosión en las excavaciones y comprometen la calidad del concreto vaciado, además de la seguridad del personal técnico y operativo.

Cabe resaltar que las labores asociadas al box coulvert (demolición de estructura existente, excavación, desvío hidráulico, fundaciones, estribos y vaciados de losa de fondo y muros) requieren estabilidad hidrológica, control de nivel freático y ventanas

secas para su adecuada ejecución. Bajo las condiciones actuales, no es posible desarrollar de manera segura y técnicamente aceptable las actividades programadas en este frente.

**JUSTIFICACIÓN TÉCNICA**


Ahora bien, el Consorcio Tauri 2 a pesar de la problemática expuesta; se encuentra adelantando actividades de obra como el caso de la extensión, nivelación y compactación de la segunda capa de material granular tratada con cemento **MGTC**, previa a la instalación de la capa de rodadura en **MDC19** entre el K0+120 y el K0+990 y el K2+030 y el K3+100 , la preparación de materiales, enlonado y demás insumos para la ejecución de las actividades en el Box Coulvert y aprovisionamiento de materiales granulares para garantizar el funcionamiento del equipo dispuesto.

Dichas actividades de obra se han visto afectadas en su ejecución; por agentes externos asociado a la **ola invernal** que se viene presentando a nivel nacional; específicamente en el departamento de Caquetá; lo cual ha venido siendo documentado tanto en la **bitácora de obra** como en los **informes de seguimiento semanales del proyecto**. Lo anterior se ve intensificado por **los cierres de carreteras o sectores específicos por afectaciones que impiden el paso de vehículos de carga**; lo cual también se ha documentado por los respectivos medios de comunicación del departamento, informes generados por el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, en su página institucional y reportes generados por el **IDEAM - Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales** los cuales pueden ser validados en la página de dicha entidad, listada en el enlace http://dhime.ideam.gov.co/atencionciudadano/

A continuación, se presenta el respectivo análisis y evidencia de cada uno de los sucesos mencionados.

Para el análisis de incidencia de las lluvias en los atrasos de obra reflejados a la fecha se debe mencionar que; de acuerdo con el inventario de estaciones meteorológicas del INVIAS, en el departamento de Caquetá existe un registro de 54 estaciones de medición, de las cuales 8 son de orden **Climática Ordinaria,** 5 de orden **Climática Principal** y 12 corresponden a un orden **Pluviométrico.** Ver imagen 1.

***Ilustración 1.*** *Ubicación de las estaciones de medición del IDEAM*

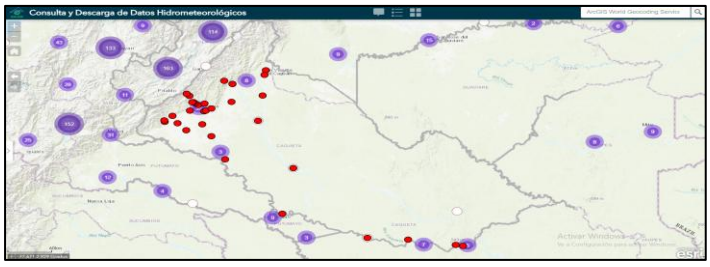


**Fuente:** IDEAM – Recuperado de http://dhime.ideam.gov.co/atencionciudadano/


Ahora bien, teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto y la cuenca hidrográfica asociada; se procede a identificar un total de 9 estaciones de las cuales se procederá a consultar la información histórica de precipitaciones; y a su vez se realizará, el análisis en mención. Estas se relacionan a continuación.

***Tabla 1.*** *Catálogo de estaciones meteorológicas cercanas al proyecto*

| CODIGO | NOMBRE | CATEGORIA | ESTADO | FECHA_INSTALACION | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | AREA_OPERATIVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44030060 | LARANDIA [44030060] | Pluviométrica | Activa | 15/08/1984 | Caquetá | Florencia | Área Operativa 04 - Huila-Caquetá |
| 44035020 | AEROPUERTO G ARTUNDUAGA [44035020] | Climática Ordinaria | Suspendida | 15/10/1969 | Caquetá | Florencia | Área Operativa 04 - Huila-Caquetá |
| 44040020 | BELEN DE ANDAQUIES [44040020] | Pluviométrica | Activa | 15/03/1990 | Caquetá | Belén De Los Andaquíes | Área Operativa 04 - Huila-Caquetá |
| 44045010 | SAN JOSE DE FRAGUA [44045010] | Climática Ordinaria | Activa | 15/10/1972 | Caquetá | San José Del Fragua | Área Operativa 04 - Huila-Caquetá |
| 44055010 | TRES ESQUINAS [44055010] | Climática Principal | Activa | 14/04/1971 | Caquetá | Solano | Área Operativa 11 - Cundinamarca-Amazonas |
| 44135010 | ARARACUARA [44135010] | Climática Principal | Activa | 15/03/1979 | Caquetá | Solano | Área Operativa 04 - Huila-Caquetá |
| 46015020 | SANTA ROSA CAGUAN [46015020] | Climática Ordinaria | Activa | 15/09/1984 | Caquetá | San Vicente Del Caguán | Área Operativa 04 - Huila-Caquetá |
| 46015030 | SAN VICENTE DEL CAGUAN - AUT [46015030] | Climática Principal | En Mantenimiento | 30/09/2008 | Caquetá | San Vicente Del Caguán | Área Operativa 04 - Huila-Caquetá |

**Fuente:** IDEAM – Recuperado de http://dhime.ideam.gov.co/atencionciudadano/

***Ilustración 2.*** *Ubicación de las estaciones de medición del IDEAM cercanas al proyecto*

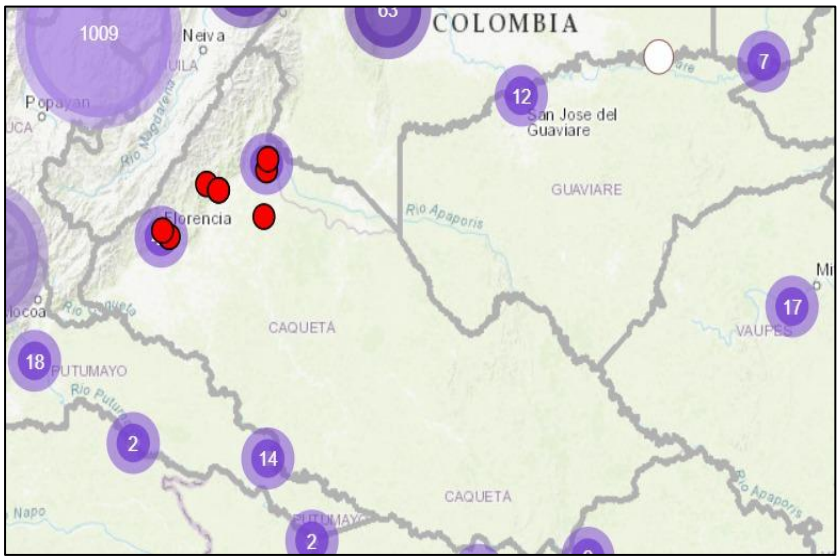


**Fuente:** IDEAM – Recuperado de http://dhime.ideam.gov.co/atencionciudadano/

De las 9 estaciones citadas; se pudo constatar que la Estación de San Vicente del Caguán – Código 46015030 se encuentra en mantenimiento y que a su vez las estaciones del Aeropuerto G. Artunduaga, Santa Rosa del Caguán y San Vicente del Caguán no almacenan datos históricos para el primer semestre del año de 2025; por tal motivo se descartan dichas lecturas para efectos de análisis.

Aunado a lo anterior y tras realizar las evaluaciones de la información del repositorio; se establece un orden de importancia de las estaciones meteorológicas disponibles; teniendo en cuenta la proximidad al centro de gravedad del proyecto; siendo el siguiente.

***Tabla 2.*** *Catálogo de estaciones meteorológicas cercanas al proyecto (Orden de importancia)*

| CODIGO | NOMBRE | CATEGORIA | ESTADO | ORDEN DE IMPORTANCIA | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46015030 | SAN VICENTE DEL CAGUAN - AUT [46015030] | Climática Principal | En Mantenimiento | 1 | Caquetá | San Vicente Del Caguán |
| 46015020 | SANTA ROSA CAGUAN [46015020] | Climática Ordinaria | Activa | 2 | Caquetá | San Vicente Del Caguán |
| 44035020 | AEROPUERTO G ARTUNDUAGA [44035020] | Climática Ordinaria | Suspendida | 3 | Caquetá | Florencia |
| 44030060 | LARANDIA [44030060] | Pluviométrica | Activa | 4 | Caquetá | Florencia |
| 44040020 | BELEN DE ANDAQUIES [44040020] | Pluviométrica | Activa | 5 | Caquetá | Belén De Los Andaquíes |
| 44045010 | SAN JOSE DE FRAGUA [44045010] | Climática Ordinaria | Activa | 6 | Caquetá | San José Del Fragua |
| 44055010 | TRES ESQUINAS [44055010] | Climática Principal | Activa | 7 | Caquetá | Solano |
| 44135010 | ARARACUARA [44135010] | Climática Principal | Activa | 8 | Caquetá | Solano |

**Fuente:** IDEAM – Recuperado de http://dhime.ideam.gov.co/atencionciudadano/

De las 8 estaciones, se descartaron 3 por las causas mencionadas y quedan disponibles 4 para hacer el análisis de incidencia pluviométrica (Filas verdes). Una vez seleccionada la muestra, se procede a consultar la información existente para el último semestre del año 2025 y se obtiene los siguientes datos.

- **Estación LARANDIA (44030060)**

Se cuenta con 214 registros diarios (día pluviométrico) con corte al 06 de agosto de 2025, en valores de mm de precipitación; dentro de los cuales encontramos intensidades que van desde lluvias ligeras hasta torrenciales, de la siguiente forma.

| Tipo | Días |
|---|---|
| Lluvia ligera | 119 |
| Lluvia moderada | 51 |
| Lluvia fuerte | 35 |
| Lluvia muy fuerte | 7 |
| Lluvia torrencial | 2 |
| **Total** | **214** |

Realizando otro análisis, desde el día **07 de marzo de 2025**; fecha en la que se reactivo el contrato luego de la **suspensión No. 01**; se han presentado **27 días de lluvias fuertes**, y **4 de lluvias muy fuertes**; los cuales generaron paras en gran parte de las jornadas y reprocesos y cese en algunas actividades como el caso específico de la dosificación y extensión de las capas de material granular tratados con cemento, ya que por las lluvias se generó perdida del material cementante suministrado y aparte de representar pérdidas económicas; genero pérdidas de tiempo. **Es de acotar adicionalmente, que a pesar de que en su gran mayoría las lluvias presentan intensidad moderada en el sector de San Vicente del Caguán, no es el caso de aguas arriba (hacia la cordillera oriental) en donde si se presentan actualmente altos niveles de precipitación, lo cual genera el aumento considerable del nivel de la lámina de agua en el cauce del río Caguán, y por tanto se ha desbordado el cauce generando incluso la emisión de estados de emergencia por la alcaldía municipal de San Vicente del Caguán, caso expreso del Decreto 081 del 13 de julio de 2025 anexo a la presente solicitud.**

Otra de las tareas afectadas por este factor y que **mayor incidencia** presenta; es el caso de las actividades asociadas a la construcción del **Box Coulvert** en la abscisa **K0+550,00**; toda vez que el caudal y nivel de la lámina de agua se encuentra por encima de su medida normal; lo cual imposibilita las actividades de obra; al convertirse directamente en una actividad de alto riesgo por la posibilidad de crecientes súbitas. Es de acotar que el hecho de que las precipitaciones en ocasiones no se presentan puntualmente en el sector; si se presentan aguas arriba del cuerpo hídrico; por lo cual por más que se observe una normalidad aparente, no es recomendable realizar las labores, debido a la posible generación de estas crecientes instantáneas.

Por otra parte, es pertinente mencionar que **las condiciones enunciadas aún persisten en el área de influencia del proyecto y por ende no ha sido posible atender de manera adecuada las actividades de obra de manera óptima lo cual a su vez ha repercutido en un crecimiento acelerado del atraso del cronograma, impactando directamente la correcta ejecución del contrato de obra 2715 de 2025.** Esto se puede también validar en los siguientes enlaces y publicaciones.

https://www.radionacional.co/noticias-colombia/desbordamiento-rio-caguan-familias-afectadas?utm_source=chatgpt.com

Adicionalmente, lo expuesto puede ser validado en las diversas notas consignadas en la bitácora de obra y en los cuadros de control del clima consignados en los informes semanales presentados por interventoría a la entidad contratante y que se anexan a la presente solicitud.

Inicio > Mi país > Lluvias no dan tregua: desbordamiento del río Caguán afecta cientos de familias en San Vicente

Domingo, 13 Julio , 2025

# Lluvias no dan tregua: desbordamiento del río Caguán afecta cientos de familias en San Vicente

*El desbordamiento del río Caguán en Caquetá deja varios barrios inundados y cientos de familias afectadas.*




**MÁS COMPARTIDO**

Boric promete no escatimar recursos en el rescate de cinco mineros atrapados en la mina El Teniente, en Chile

Bucaramanga vibra con el 5.° Encuentro de Gaitas del Oriente Colombiano 2025

Álvaro Uribe Vélez fue condenado a doce años de prisión

**MÁS LEÍDO**

Así funcionará el pico y placa en Bogotá del 4 al 10 de agosto: consulte si puede circular

Solicitan vigilancia internacional por presunta presión a jueza del caso del expresidente Álvaro Uribe

Tribunal Superior de Bogotá negó solicitud de la defensa de Uribe de suspender provisionalmente su detención domiciliaria

**NUEVAS HISTORIAS**

Consejo de la Judicatura prioriza fallo de Uribe en segunda instancia

Logros del Gobierno del Cambio: presidente Petro entrega balance a tres años de mandato

## Vías

**Las intensas lluvias también han afectado las vías, dejando incomunicado al departamento de Caquetá:** en la zona de reserva campesina Cuenca del Río Pato y Valle del Balsillas, se han presentado avalanchas y derrumbes de lodo y tierra tapando la **Vía San Vicente del Caguán – Balsillas – Neiva, por lo que a esta hora se encuentra incomunicado este importante corredor vial. Mientras por el sector de Florencia–Suaza se han registrado deslizamientos de tierra en el km 37**, impidiendo el paso vehicular. Personal de Invías ya trabaja en la remoción de material con maquinaria amarilla para habilitar el paso.

Las autoridades locales han declarado estado de alerta preventiva y continúan atendiendo las múltiples emergencias en distintos sectores del municipio. La situación sigue siendo delicada, y han solicitado a la ciudadanía mantener la calma y seguir las recomendaciones de los organismos de socorro.

## Además, se habilitaron líneas de atención en caso de emergencia.

**Bomberos: 3134965259**

**Defensa Civil: 3232402852**

**Hospital San Rafael: 3187130247 ext:129**

**Policía Nacional: 3202794421**

https://www.contextoganadero.com/regiones/ideam-emite-alerta-roja-por-riesgo-de-inundaciones-en-46-cuencas-hidrograficas?utm_source=chatgpt.com

CONtextoganadero
UNA LECTURA RURAL DE LA REALIDAD COLOMBIANA

| TRM 4.093,12 Miércoles 6 de Agosto de 2025 | ECONOMÍA: ¿Qué está pasando en el mercado del ganado que los precios están subiendo sin freno? |

GANADERÍA | SISTEMAS PECUARIOS | COLOMBIA | ECONOMÍA | MUNDO | TENDENCIAS | OPINIÓN

Regiones

# Ideam emite alerta roja por riesgo de inundaciones en 46 cuencas hidrográficas

José D. Pacheco Martínez 17 de Julio 2025



Foto: Ungrd

46 subzonas hidrográficas del país presentan condiciones críticas por incremento en los niveles de los ríos, probabilidad de crecientes

Especial atención merece el departamento de Huila, donde el río Magdalena mantiene niveles altos entre los municipios de Gigante, Neiva, Palermo y Villavieja. El Ideam reporta también **creciente súbita en la cuenca alta del río Bogotá y niveles elevados en su cuenca baja**, afectando municipios de Cundinamarca como La Mesa, Apulo, Tocaima y Girardot.

Finalmente, el preocupante informe incluye la Amazonía, con **énfasis en las cuencas del río Caguán y del río Putumayo**, donde se presentan niveles altos con posibles afectaciones en municipios como San Vicente del Caguán, Puerto Leguízamo, Puerto Alegría y Tarapacá.

Habida cuenta de la situación, la entidad solicita a las autoridades locales deben mantener vigilancia activa sobre los niveles de los ríos, seguir las recomendaciones de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y activar los planes de contingencia establecidos para este tipo de eventos.

Para mayor información y monitoreo en tiempo real, invita a utilizar la aplicación móvil **Mi Pronóstico** y la plataforma digital oficial www.ideam.gov.co.

Noticias Relacionadas



Regiones
Alerta por deslizamientos se extiende a 740 municipios en Colombia: Ideam

por CONtexto ganadero- 11 de Abril 2025









## 2. CIERRES VIALES POR EFECTOS DE LA TEMPORADA INVERNAL

Respecto a este causal, el Consorcio Tauri 2 el día **20 de junio de 2025** presenta el comunicado **TAURI-2-OF-288-2025** con asunto ***INCONVENIENTES CON EL TRASLADO DE MAQUINARIA PARA LA ACTIVIDAD DE PAVIMENTACIÓN***; el cual se orienta básicamente a las afectaciones e impactos ocasionados en infraestructura vial que permite el

acceso de maquinaria, equipos, vehículos, materiales y demás insumos requeridos para la ejecución del proyecto.

El documento informa sobre la imposibilidad de iniciar las actividades de pavimentación programadas en el marco del contrato de obra 2715 de 2023 para el mejoramiento de la vía San Vicente del Caguán – Los Pozos, debido a inconvenientes en el traslado de la maquinaria requerida. La causa principal es el cierre total de vías por condiciones climáticas extremas en el departamento del Caquetá, particularmente el desbordamiento de una quebrada en el sector Las Delicias, que ha obligado al retorno de los equipos en dos ocasiones.

Adicionalmente, se reportan afectaciones graves en el corredor vial Florencia – Suaza por deslizamientos y caída de rocas en sectores como El Pórtico, Los Túneles y El Cóndor, limitando severamente las rutas alternas disponibles. Ante este contexto, el Consorcio TAURI 2 ha suspendido temporalmente el transporte de maquinaria pesada, comprometiéndose a reactivar el traslado en cuanto mejoren las condiciones climáticas y se habilite el paso seguro, garantizando la continuidad del proyecto.

A continuación, se presentan las fuentes en donde puede ser consultada cada una de las afectaciones derivadas de la temporada ambiental; los cuales pueden ser validados en los URL anexos.












A continuación, se presentan enlaces donde se puede validar la información dada.

https://cdn.jwplayer.com/previews/1ociAhdm

https://www.infobae.com/colombia/2025/06/17/varios-municipios-del-norte-de-caqueta-estan-en-emergencia-tras-el-desbordamiento-de-la-quebrada-las-delicias/?utm_source – Noticia IFOBAE




https://www.radionacional.co/noticias-colombia/afectaciones-por-lluvia-en-caqueta?utm_source – Noticia Radio Nacional de Colombia

"¡Atención! #CierreTotalDeViaSe presenta cierre total en la vía #Florencia – #PuertoRico, sector Puente Las Delicias, debido a la creciente súbita de la quebrada. #Caqueta (sic)", informó la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.




La Dirección de Tránsito y Transporte reportó la crítica situación en la zona - crédito @TransitoPolicia/X

https://caracol.com.co/2025/06/02/deslizamientos-afectan-movilidad-entre-huila-y-caqueta/?utm_source – Noticia Caracol.com



**Deslizamientos afectan movilidad entre Huila y Caquetá**

Las lluvias han generado paso restringido y cierre total en tramos clave de la vía entre Florencia y Suaza.

Las lluvias han dificultado los trabajos de remoción. Foto Redes Sociales.

— José Lisardo Moreno Ramírez 02/06/2025 - 15:14 h COT

**Neiva** • La Seccional de Tránsito y Transporte del departamento del Huila y Caquetá, informaron sobre una afectación vial en la vía Florencia–Neiva, a la altura del kilómetro 29 de la ruta 2003. **En el sector conocido como Alto Brasil,** jurisdicción del municipio de Suaza, se presenta cierre total. Esta situación se debe a un deslizamiento de tierra, rocas y ramas provocado por las constantes

PUBLICIDAD

SÍGANOS
LAS NOTICIAS Y DEPORTES DE CARACOL RADIO
ESTÁN EN FACEBOOK
CARACOL RADIO

**Últimas Noticias**

Corte Suprema de EE.UU. limita la capacidad de los jueces para detener órdenes del presidente Trump




La situación ha sido informada previamente mediante los siguientes oficios y comunicaciones:

- **TAURI-2-OF-288-2025 (20 de junio de 2025):** Reporte sobre cierres viales y dificultades en el traslado de maquinaria.

- **TAURI-2-OF-301-2025 (28 de junio de 2025**): Se realiza un reporte amplio, enfocado en las afectaciones generadas por la ola invernal en el departamento del Caquetá; lo cual trajo consigo cierres viales, aumento de caudales en el río el Caguán y cese de actividades por estas condicionales. En él se presentan los respectivos recursos que permiten analizar esta incidencia e impacto en el cronograma.

- **Bitácoras de obra e informes semanales con corte al 31 de julio de 2025:**Evidencia de lluvias fuertes (35 días) y muy fuertes (4 días) que han ocasionado suspensiones y reprocesos.

- Reportes climáticos del IDEAM e INVIAS **con corte al 06 de agosto de 2025**, y artículos de prensa regional sobre desbordamientos y cierres.

- Decreto 081 del 13 de julio de 2025 expedido por la Alcaldía municipal de San Vicente del Caguán en donde se declara la situación de calamidad pública.

Por todo lo anterior, y con el objetivo de evitar reprocesos, garantizar la calidad técnica de la estructura y salvaguardar la integridad del equipo humano y técnico, solicitamos de manera respetuosa la aprobación de esta suspensión temporal, estableciendo

como nueva fecha de terminación contractual el 27 de agosto de 2025, conforme a lo previsto en la planificación general del proyecto y en línea con la solicitud de prórroga No. 5 previamente presentada.

Es importante destacar, que el día 13 de julio de 2025 la Alcaldía del Municipio de San Vicente del Caguán expidió el Decreto No. 081, por medio del cual ***…"DECLARA LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN (CAQUETÁ) Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" …*** el cual se anexa al presente documento.

Agradeciendo de antemano su atención y gestión, quedamos atentos a la aprobación formal de esta solicitud.

Cordialmente,

Sin otro particular.

**MANUEL E. BERMUDEZ MENDOZA**
Representante Legal
CONSORCIO TAURI 2
Elaboró: Ing. Edwin Rodriguez – Gerente de Proyecto
Anexos: Lo indicado en el comunicado
