INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
NIT. 800.215.807

DEBE A

TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
NIT. 860.038.275-3

LA SUMA DE:

TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($300.000)

POR CONCEPTO DE:

REEMBOLSO OTROS COSTOS EDICIÓN DE INFORMES, PAPELERÍA, REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS, PLANOS, FOTOGRAFÍAS, VIDEOS PARA EL PROYECTO DE "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.", DE JUNIO 2024.



JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Representante Legal
TERRA INGENIEROS CIVILES SAS

FAVOR REALIZAR TRASLADO DE FONDOS A LA CUENTA CORRIENTE No. 193-145185-01 DE BANCOLOMBIA A NOMBRE DE: TERRA INGENIEROS CIVILES SAS Nit 860.038.275-3

Bogotá, Julio 11 de 2024

TIC-INVIAS-1631-077

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS
Att: Ing. CARLOS ALBERTO PARRA SILVA.
Supervisor Contrato de Interventoría

REF: **Contrato No. 1631 DE 2024 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.".**

ASUNTO: INFORME MENSUAL No 2 - JUNIO

Respetado Ingeniero:

De manera atenta me permito remitir el informe mensual No 2 Correspondiente al mes de junio de 2024, lo anterior para su revisión y fines pertinentes.

Atentamente,

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría

Anexo: Un (1) archivo tipo PDF

Copia: Ing. PEDRO JOSÉ BARÓN ÁVILA – APOYO A LA SUPERVISIÓN INVIAS – (pbaron@invias.gov.co)
Copia: Ing. REYNADO MANTILLA - COORDINADOR DE PROGRAMA INVIAS – (rmantilla@invias.gov.co)

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 2

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PERÍODO: JUNIO DE 2024

TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
Nit. 860.038.275-3

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 2
01/06/2024 a 30/06/2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

CONVENIADO:

Organismos de Acción Comunal en los municipios de Bolívar, Florián, Guavatá, La Belleza, Sucre y Vélez en el departamento del Santander, para lo cual se requiere realizar labores de control y seguimiento.

Objeto del Convenio Solidario

MUNICIPIO	ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL	CONVENIO No	OBJETO
BOLIVAR	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUAMAL	3951-2023	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUAMAL DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
FLORIAN	JUNTA DE ACCION COMUNAL EL GUALILO	4267-2023	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL GUALILO DEL MUNICIPIO FLORIAN DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL
GUAVATA	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE LA UNION	4478-2023	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE LA UNION DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
GUAVTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA POPOA	4767-2023	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA POPOA DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
LA BELLEZA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLIN	3753-2023	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLIN DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
LA BELLEZA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CACHIPAYAL	4175-2023	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CACHIPAYAL DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
SUCRE	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE ORGANOS	4490-2023	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE ORGANOS DEL MUNICIPIO DE SUCRE, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
VELEZ	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TUBAVITA	4357-2023	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA TUBAVITA DEL MUNICIPIO DE VELEZ- SANTANDER EN EL

			DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VELEZ	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL GAITAL	4367-2023	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL GAITAL DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VELEZ	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DE TEBAIDA	4424-2023	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE TEBAIDA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
VELEZ	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PALMERA	4565-2023	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PALMERA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Interventoría

TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

Nit. 860.038.275-3.

N.º de Contrato de Interventoría
1631 de 2024

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 2 01/06/2024 a 30/06/2024

REVISIÓN DOCUMENTAL				
	CARGO	**FIRMA**	**FECHA**	**VERSIÓN**
ELABORÓ	Director de Interventoría	Jorge Hernando Forero Forero	30/06/2024	V01
	Residente de interventoría	Jorge Ricardo Cárdenas	30/06/2024	V01
REVISÓ	Director de Interventoría	Jorge Hernando Forero Forero	30/06/2024	V01

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN 10
2 DESCRIPCION DEL PROYECTO 13
2.1 Localización 13
2.2 Municipios en la zona de influencia: 33
2.3 Inventario y estado inicial de la vía: 36
2.4 Características técnicas del proyecto: 41
3 INFORMACION DEL CONVENIO SOLIDARIO. 42
3.1 Información general de los convenios solidarios: 42
3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes y acciones a seguir por la interventoría: 54
3.2.1 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ORGANOS: 54
3.2.2 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUALILO: 55
3.2.3 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BERLIN: 56
3.2.4 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CHACHIPAYAL: 57
3.2.5 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TUBAVITA: 58
3.2.6 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PALMERA: 59
3.2.7 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL GAITAL: 60
3.2.8 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TEBAIDA: 61
3.2.9 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA POPOA: 62
3.2.10 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA UNION: 63
3.2.11 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUAMAL: 64
3.3 Seguimientos ítem no previstos: 64
3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría: 64
3.4.1 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ORGANOS: 64
3.4.2 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUALILO: 65
3.4.3 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BERLIN: 65
3.4.4 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CHACHIPAYAL: 65

3.4.5 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TUBAVITA:....65
3.4.6 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PALMERA:....65
3.4.7 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL GAITAL:....65
3.4.8 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TEBAIDA:....66
3.4.9 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA POPOA:....66
3.4.10 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA UNION:....66
3.4.11 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUAMAL: 66
4 REPORTE DE EJECUCION MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO.....66
4.1 Informes semanales.....66
4.2 Maquinaria y Equipos convenio solidario. 66
4.3 Personal, control aportes legales y seguridad social convenio solidario. 67
4.3.1 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ORGANOS: 67
4.3.2 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUALILO: 68
4.3.3 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BERLIN: 68
4.3.4 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CHACHIPAYAL:....68
4.3.5 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TUBAVITA:....69
4.3.6 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PALMERA:....69
4.3.7 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL GAITAL:....69
4.3.8 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TEBAIDA:....70
4.3.9 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA POPOA:....70
4.3.10 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA UNION:....70
4.3.11 UNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUAMAL: 70
4.4 Informe financiero y presupuestal convenios solidarios. 71
4.5 Estado general del tiempo.....71
4.6 Resumen de ensayos de laboratorio. 71
4.7 Seguimiento garantías y seguros convenio solidario.....71
4.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra.....75
4.9 Otros documentos seguimiento mensual. 75

4.9.1 Seguimiento a la inversión del anticipo de obra....75
4.9.2 Seguimiento al programa de obra....75
4.9.3 Seguimiento al programa de inversiones....76
4.9.4 Actas suscritas....76
4.9.5 Actas de reunión....76
5 INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA....77
5.1 Información general del contrato de interventoría: 77
5.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor: 78
5.3 Informes de especialistas y profesionales:....78
5.4 Informes del programa anual de caja....78
5.5 Informes matrices de riesgo. 79
5.6 REPORTE DE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA. 86
5.6.1 Equipo y vehículos contrato de interventoría. 86
5.6.2 6.2 Personal control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría. .87
5.6.3 Información financiera y presupuestal contrato de interventoría. 87
5.6.4 Seguimiento garantías contrato de interventoría....87
5.6.5 Seguimiento al plan de calidad de contrato de interventoría. 88
5.6.6 Vigilancia y control de actividades en campo....88
5.6.7 Sistematización de información....88
5.6.8 Personal y equipo de las JAC 89
5.6.9 Calidad de los materiales empleados....89
5.6.10 Otros documentos seguimiento mensual....89
6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 89
7 ANEXOS....90
7.1 Relación de correspondencia:....90
7.2 Registro fotográfico:.... **¡Error! Marcador no definido.**
7.2.1 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL GUAMAL: .. **¡Error! Marcador no definido.**
7.3 Bitácora del mes correspondiente. 97

INDICE DE ILUTRACIONES

ILUSTRACIÓN 1 Localización del proyecto....13
ILUSTRACIÓN 2 Ubicación de bolívar, en Santander....14
ILUSTRACIÓN 3 Vereda Guamal – Bolívar....15
ILUSTRACIÓN 4 Vereda Guamal – Bolívar....15
ILUSTRACIÓN 5 . Ubicación de Florián, en Santander....16
ILUSTRACIÓN 6 . Vereda Galilo, Florián en Santander....17
ILUSTRACIÓN 7 Ubicación de Guavatá, en Santander....17
ILUSTRACIÓN 8 Vereda la unión, Guavatá en Santander....18
ILUSTRACIÓN 9 Vereda la unión, Guavatá en Santander....18
ILUSTRACIÓN 10 Vereda la Popoa, Guavatá en Santander....19
ILUSTRACIÓN 11 Vereda la Popoa, Guavatá en Santander....19
ILUSTRACIÓN 12 Ubicación de La Belleza, en Santander....20
ILUSTRACIÓN 13 Sector Curva Elver Marin Lizimaco – La Belleza....21
ILUSTRACIÓN 14 Vereda Berlín-Municipio La Belleza – Departamento Santander....21
ILUSTRACIÓN 15 Sector La Ye – La Belleza....22
ILUSTRACIÓN 16 Vereda Cachipayal – Municipio La Belleza – Departamento de Santander....22
ILUSTRACIÓN 17 Municipio de Sucre – Departamento de Santander....23
ILUSTRACIÓN 18 Vía La Peña de Órganos – Municipio de Sucre....24
ILUSTRACIÓN 19 Vereda Órganos – Municipio Sucre – Departamento Santander....24
ILUSTRACIÓN 20 Vélez en Santander....25
ILUSTRACIÓN 21 Tramo Vereda El Gaital – Vélez....26
ILUSTRACIÓN 22 Vereda El Gaital – Vélez....26
ILUSTRACIÓN 23 Tramo Vereda La Palmera – Vélez....27
ILUSTRACIÓN 24 Vereda La Palmera – Vélez....27
ILUSTRACIÓN 25 Tramo Vereda Tebaida – Vélez....28
ILUSTRACIÓN 26 Vereda Tebaida – Vélez....28

ILUSTRACIÓN 27 Tramo Vereda Tubavita – Vélez.....29

INDICE DE TABLAS

TABLA 1 Municipio área de influencia.....33
TABLA 2 Municipio área de influencia.....33
TABLA 3 Municipio área de influencia.....34
TABLA 4 Municipio área de influencia.....34
TABLA 5 Municipio área de influencia.....35
TABLA 6 Municipio área de influencia.....35
TABLA 7 Registro fotográfico inicial.....40
TABLA 8 Información convenio solidario.....53
TABLA 9 Relación de equipo en obra en los convenios.....67
TABLA 10 Horas precipitaciones del mes.....71
TABLA 11 Relación de Pólizas del contrato de obra - convenio No. 1631 de 2024.....75
TABLA 12 Información contrato de interventoría.....78
TABLA 13 Informe presupuestal PAC.....78
TABLA 14 Fuente: Pliego de condiciones proceso CMA-DEO-SVR-CCPT-010-2024.....86
TABLA 15 Personal de interventoría.....87
TABLA 16 Pólizas contrato de interventoría.....88
TABLA 17 Relación de correspondencia.....97

1 INTRODUCCIÓN

Bolívar: El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de **Bolívar** del departamento de Santander, en la **vereda Guamal**, teniendo como punto de referencia inicial en el **PR 0+00 Latitud**: **5,969724 Longitud: -73,776561** y punto de referencia final el **PR 2 + 700 Latitud: 5,983081 Longitud: -73,782193**, de la **vía Tres esquinas siempre viva**, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Santander del INVIAS.

Florián: El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de **Florián** del departamento de **Santander**, en la vereda **El Gualilo**, teniendo como punto de referencia inicial en el **PR 0+000** con coordenadas **latitud 5,816922** y **longitud** de -**73,976306** y punto de referencia final el **PR 0 + 250** con coordenadas **latitud 5,815680** y **longitud -73,978134,** de la vía El Occidente, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial SANTANDER del INVIAS.

Guavatá: El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de **Guavatá** del departamento de **Santander**, en la **vereda La Unión,** teniendo como punto de referencia inicial en el **PR 0+00 Latitud**: **5,9195512 Longitud: -73,7520709** y punto de referencia final el **PR 1 + 109 Latitud: 5,9140169 Longitud: -73,7560334**, de la vía Escuela La Unión, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Santander del INVIAS.

Guavatá: El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de **Guavatá** del departamento de **Santander**, en la **vereda Popoa**, teniendo como punto de referencia inicial en el **PR 0+00 Latitud: 5,9578883 Longitud: -73,7072234** y punto de referencia final el **PR 0 + 860 Latitud: 5,9552618 Longitud: -73,703082,** de la **vía La Loma Buena Vista - Popoa**, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Santander del INVIAS.

La Belleza: El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de **La Belleza** del departamento de **Santander**, en la **vereda Berlín**, teniendo como punto de referencia inicial en el **PR 0+000** con coordenadas **latitud 5,900514** y **longitud de -73,955943** y punto de referencia final el **PR 0 + 253** con coordenadas **latitud 5.902776** y **longitud -73,956393**, de la **vía Curva Elver Marin Lizimaco**, conforme a la información

levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial SANTANDER del INVIAS.

La Belleza: El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de **La Belleza** del departamento de **Santander**, en la **vereda Cachipayal**, teniendo como punto de referencia inicial en el **PR 0+000** con coordenadas **latitud 5,841841** y **longitud de -74,027477** y punto de referencia final el **PR 0 + 200** con coordenadas **latitud 5,842706** y **longitud -74,027531**, de la **vía Sector la Ye**, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial SANTANDER del INVIAS.

Sucre: El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Sucre del departamento de **Santander**, en la **vereda Órganos**, teniendo como punto de referencia inicial en el **PR 0+000** con coordenadas **latitud 5,910798 y longitud de -73,805426** y punto de referencia final el PR 0 + 200 con coordenadas **latitud 5,911956 y longitud -73,80666,** de la **vía La Peña de Órganos**, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial SANTANDER del INVIAS.

Vélez: El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de **Vélez** del departamento de **Santander**, en la **vereda El Gaital,** teniendo como punto de referencia inicial en el **PR 0+00 Latitud: 6,0714167 Longitud: -73,7115468** y punto de referencia final el **PR 1 + 530 Latitud: 6,0696692 Longitud: -73,69917**, de la **vía Gaital alto**, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Santander del INVIAS.

Vélez: El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de **Vélez** del departamento de **Santander**, en la **vereda La Palmera**, teniendo como punto de referencia inicial en el **PR 0+00 Latitud: 6,0100299 Longitud: -73,6610768** y punto de referencia **final el PR 0 + 701 Latitud: 6,0202302 Longitud: -73,6544321**, de **la vía Vereda Palmeras**, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Santander del INVIAS.

Vélez: El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de **Vélez** del departamento de **Santander,** en la **vereda Tebaida**, teniendo como punto de referencia inicial en el **PR 0+00 Latitud: 6,0591036 Longitud: -73,7113136** y punto de referencia final el **PR 2 + 650 Latitud: 6,0682169 Longitud: -73,7257631**, de **la vía La Florida el Salitre**, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Santander del INVIAS.

Vélez: El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de **Vélez** del departamento de **Santander**, en la **vereda Tubavita**, teniendo como punto de referencia inicial en el **PR 0+00 Latitud: 6,0253102 Longitud: -73,6674229** y punto de referencia final el **PR 0 + 652 Latitud: 6,026582 Longitud: -73,6622084**, de **la vía San Victorino**, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Santander del INVIAS.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

2 DESCRIPCION DEL PROYECTO.

2.1 Localización

Los proyectos objeto del siguiente Concurso se encuentran en las vías que comunican las diferentes veredas de los municipios de Bolívar, Florián, Guavatá, La Belleza, Sucre y Vélez; a continuación, se registra la ubicación de cada obra a ejecutar y realizar por la interventoría.

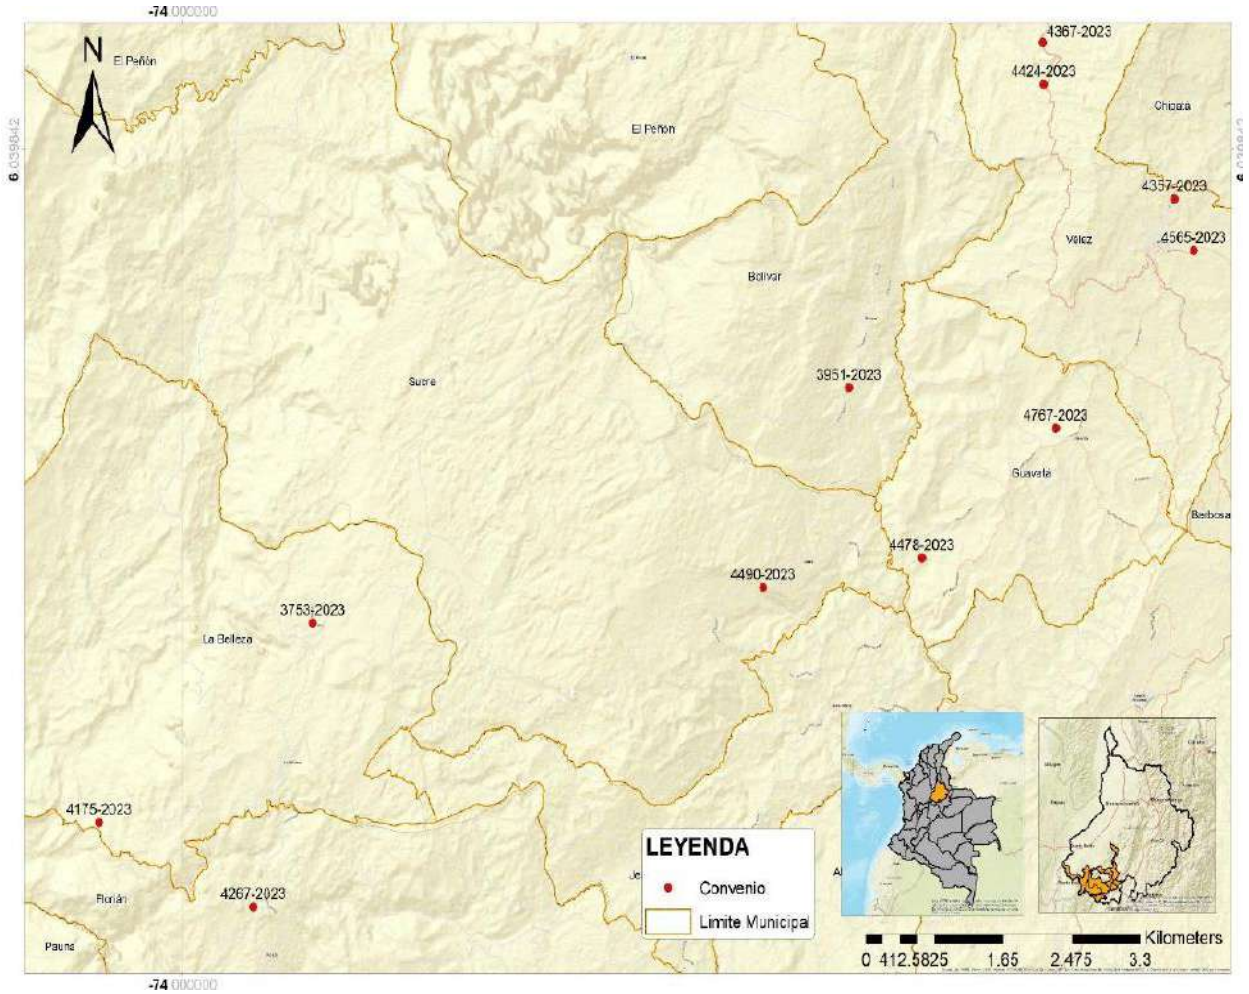


ILUSTRACIÓN 1 Localización del proyecto.

El Municipio de **Bolívar** se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: **5,98897**
Longitud: **-73,7711**

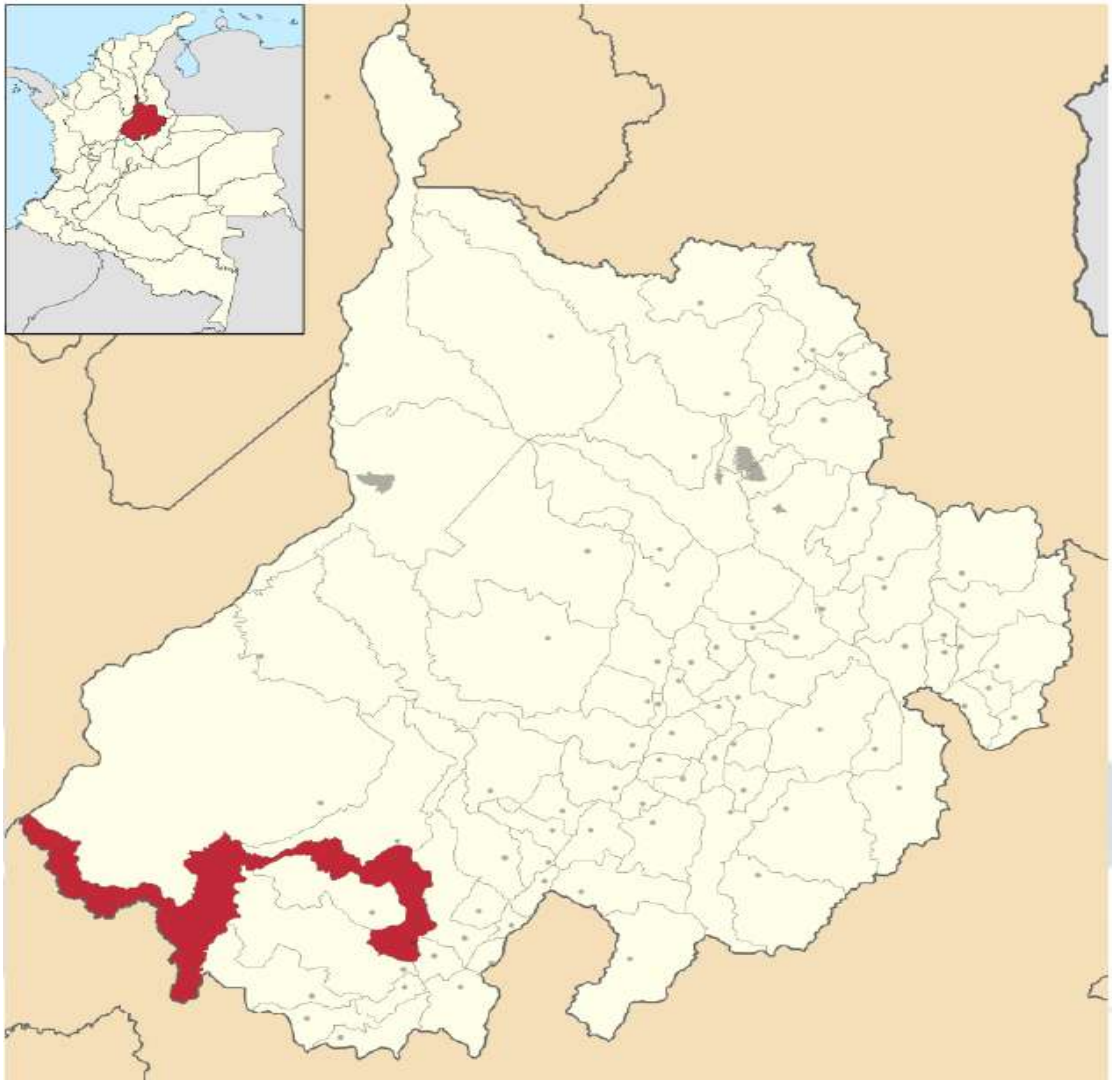


ILUSTRACIÓN 2 Ubicación de bolívar, en Santander



ILUSTRACIÓN 3 Vereda Guamal – Bolívar



ILUSTRACIÓN 4 Vereda Guamal – Bolívar

El Municipio de **FLORIAN** se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: **5°48'10"N**
Longitud: **73°58'17"O**



ILUSTRACIÓN 5 . Ubicación de Florián, en Santander



ILUSTRACIÓN 6 . Vereda Galilo, Florián en Santander

El Municipio de **Guavatá** se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: **5,95483**
Longitud: **-73,7013**



ILUSTRACIÓN 7 Ubicación de Guavatá, en Santander

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 2 01/06/2024 a 30/06/2024



ILUSTRACIÓN 8 Vereda la unión, Guavatá en Santander

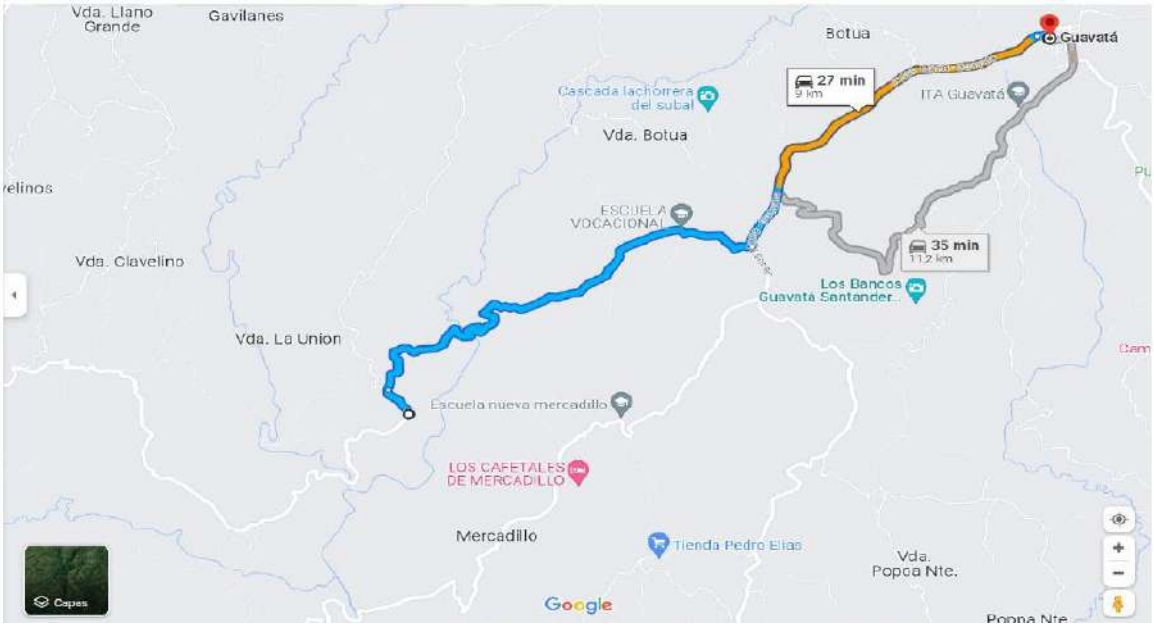


ILUSTRACIÓN 9 Vereda la unión, Guavatá en Santander

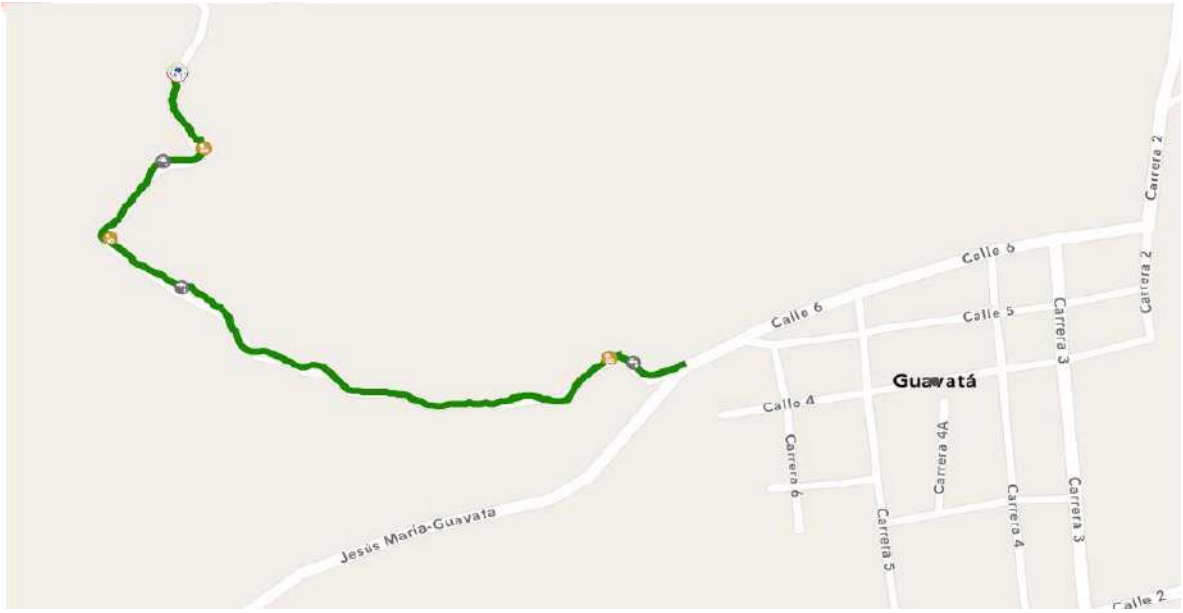


ILUSTRACIÓN 10 Vereda la Popoa, Guavatá en Santander



ILUSTRACIÓN 11 Vereda la Popoa, Guavatá en Santander

El Municipio de **La Belleza** se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: **5°51'27"N**
Longitud: **73°57'56"O**



ILUSTRACIÓN 12 Ubicación de La Belleza, en Santander



ILUSTRACIÓN 13 Sector Curva Elver Marin Lizimaco – La Belleza

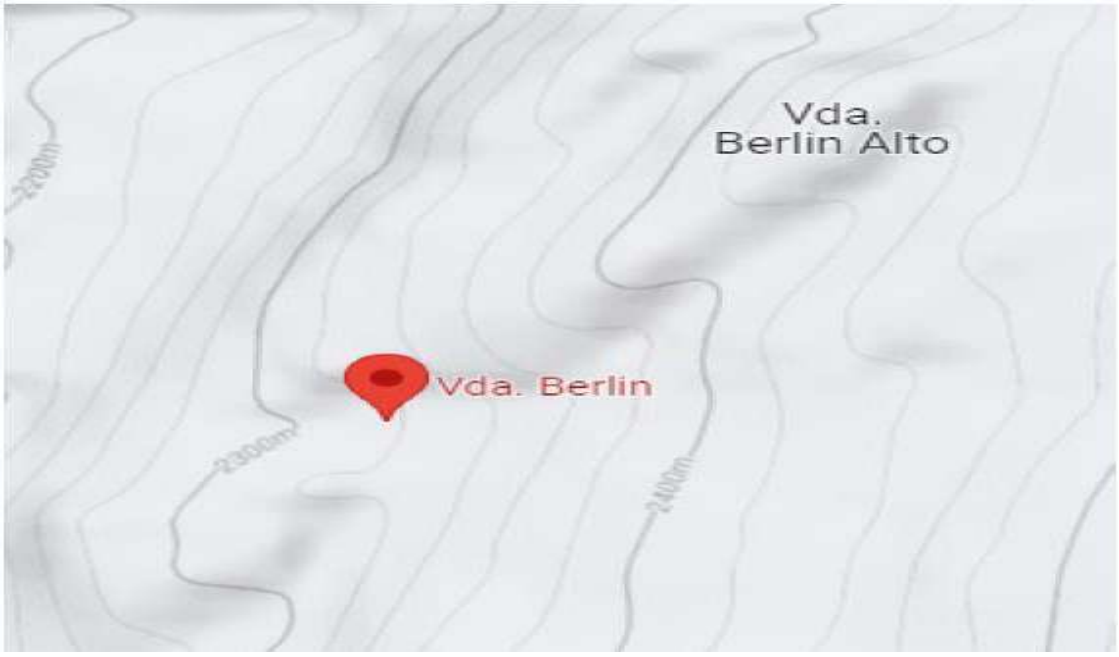


ILUSTRACIÓN 14 Vereda Berlín-Municipio La Belleza – Departamento Santander



ILUSTRACIÓN 15 Sector La Ye – La Belleza

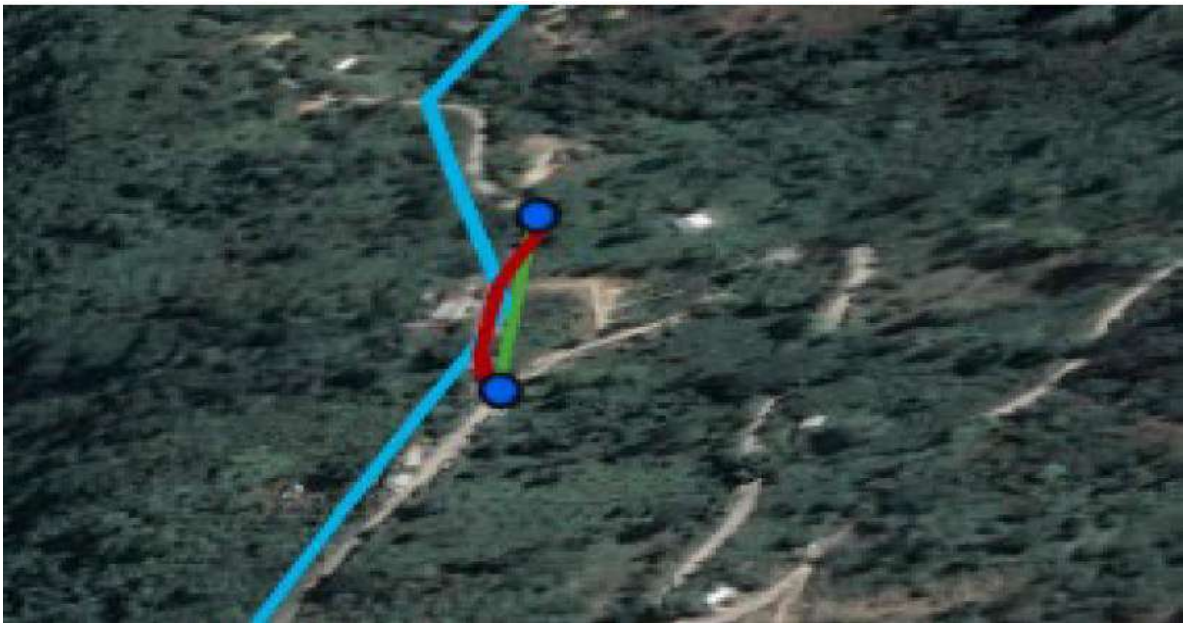


ILUSTRACIÓN 16 Vereda Cachipayal – Municipio La Belleza – Departamento de Santander

El Municipio de **Sucre** se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: **5°55'05"N**
Longitud: **73°47'29"O**



ILUSTRACIÓN 17 Municipio de Sucre – Departamento de Santander

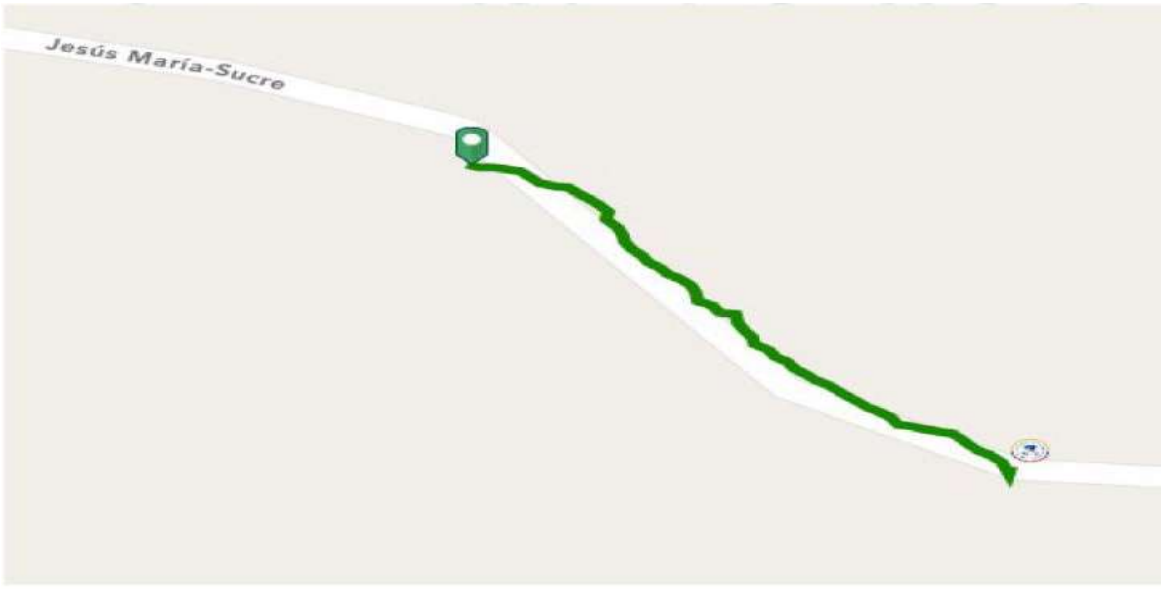


ILUSTRACIÓN 18 Vía La Peña de Órganos – Municipio de Sucre

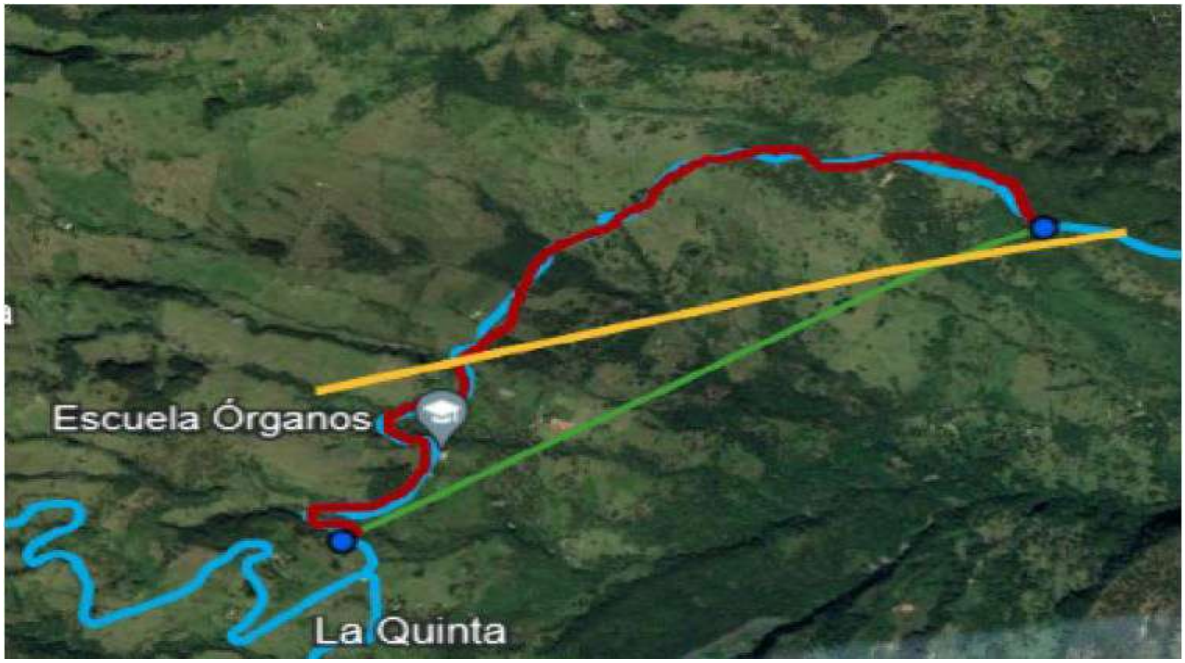


ILUSTRACIÓN 19 Vereda Órganos – Municipio Sucre – Departamento Santander

El Municipio de **Vélez** se localiza en las siguientes coordenadas:

Latitud: **6,017**
Longitud: **-73,667**



ILUSTRACIÓN 20 Vélez en Santander

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 2 01/06/2024 a 30/06/2024



ILUSTRACIÓN 21 Tramo Vereda El Gaital – Vélez

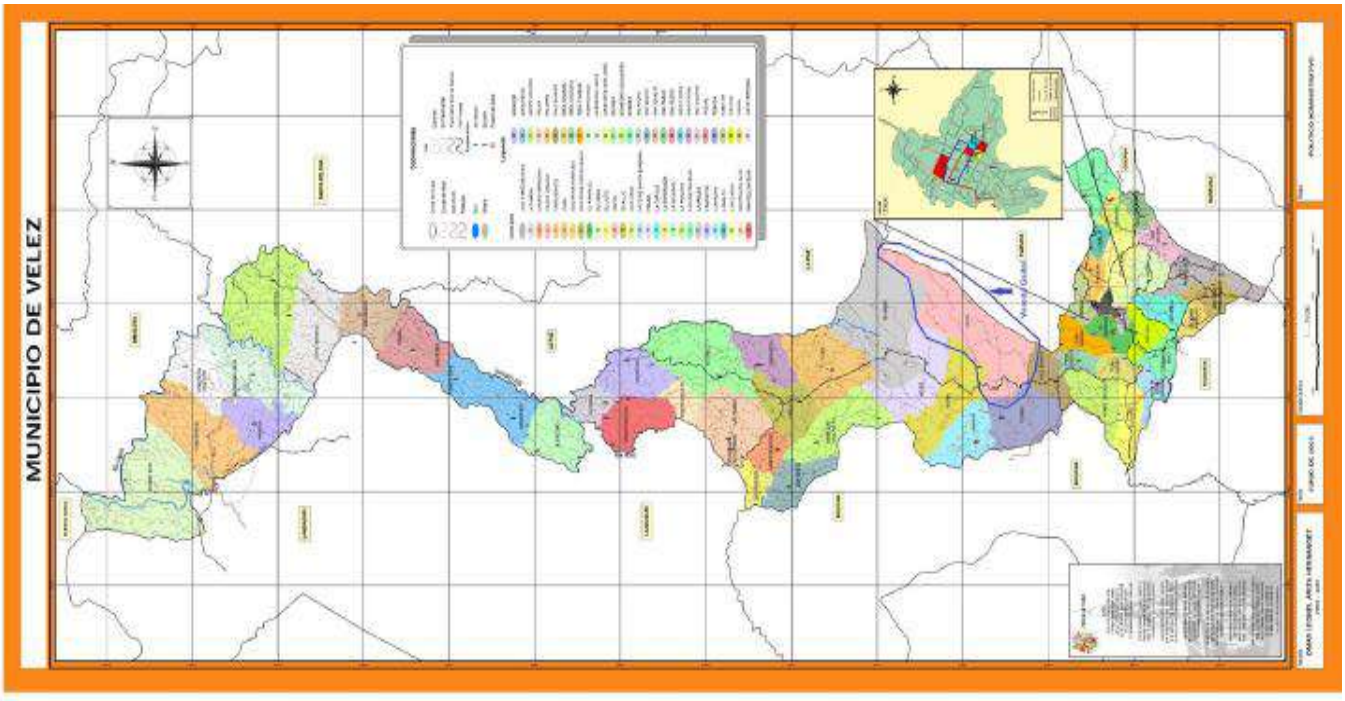


ILUSTRACIÓN 22 Vereda El Gaital – Vélez

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 2 01/06/2024 a 30/06/2024



ILUSTRACIÓN 23 Tramo Vereda La Palmera – Vélez

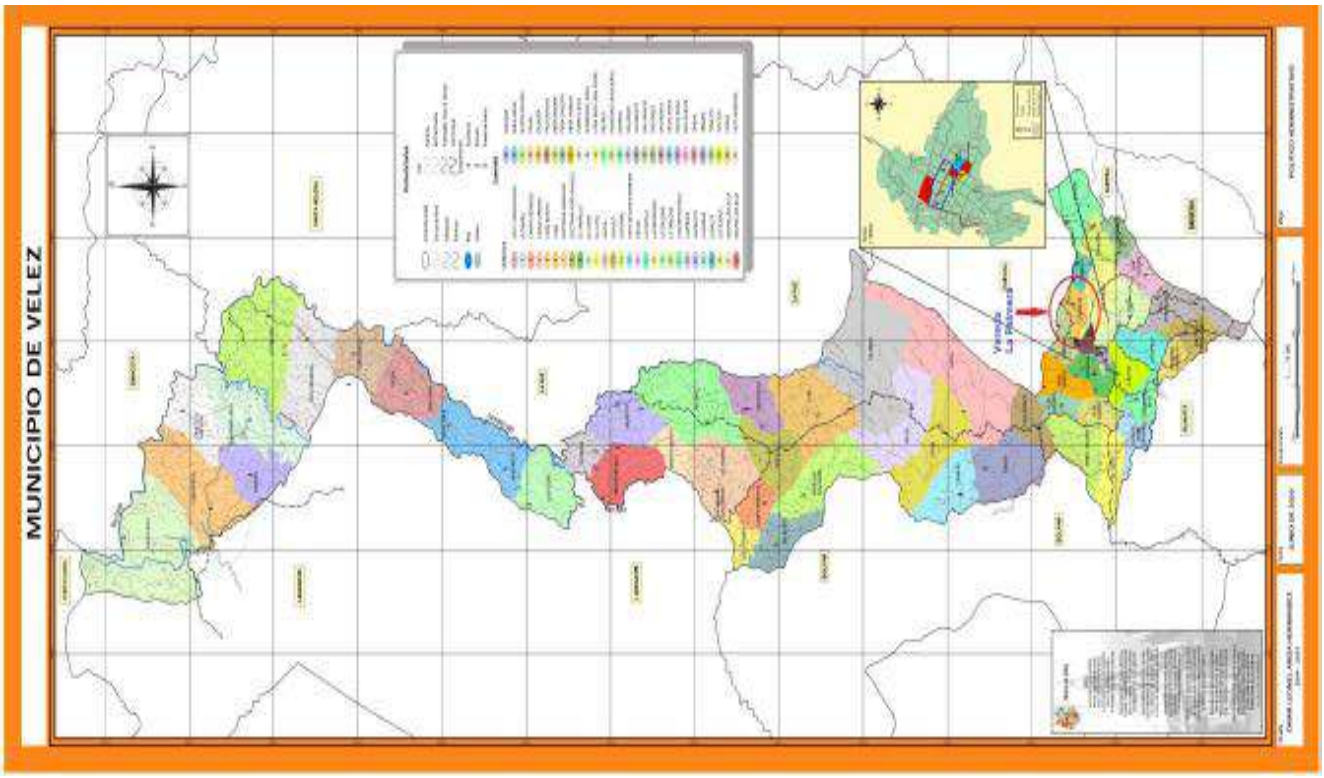


ILUSTRACIÓN 24 Vereda La Palmera – Vélez

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 2 01/06/2024 a 30/06/2024



ILUSTRACIÓN 25 Tramo Vereda Tebaida – Vélez

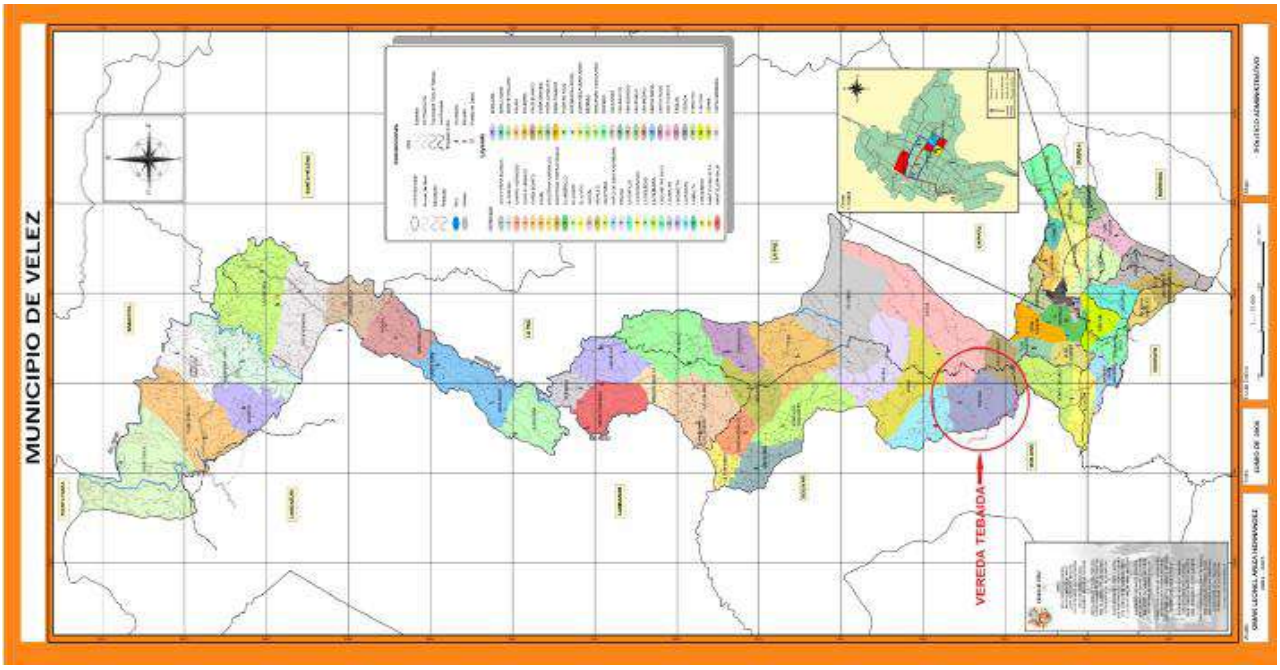


ILUSTRACIÓN 26 Vereda Tebaida – Vélez

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 2 01/06/2024 a 30/06/2024



ILUSTRACIÓN 27 Tramo Vereda Tubavita – Vélez

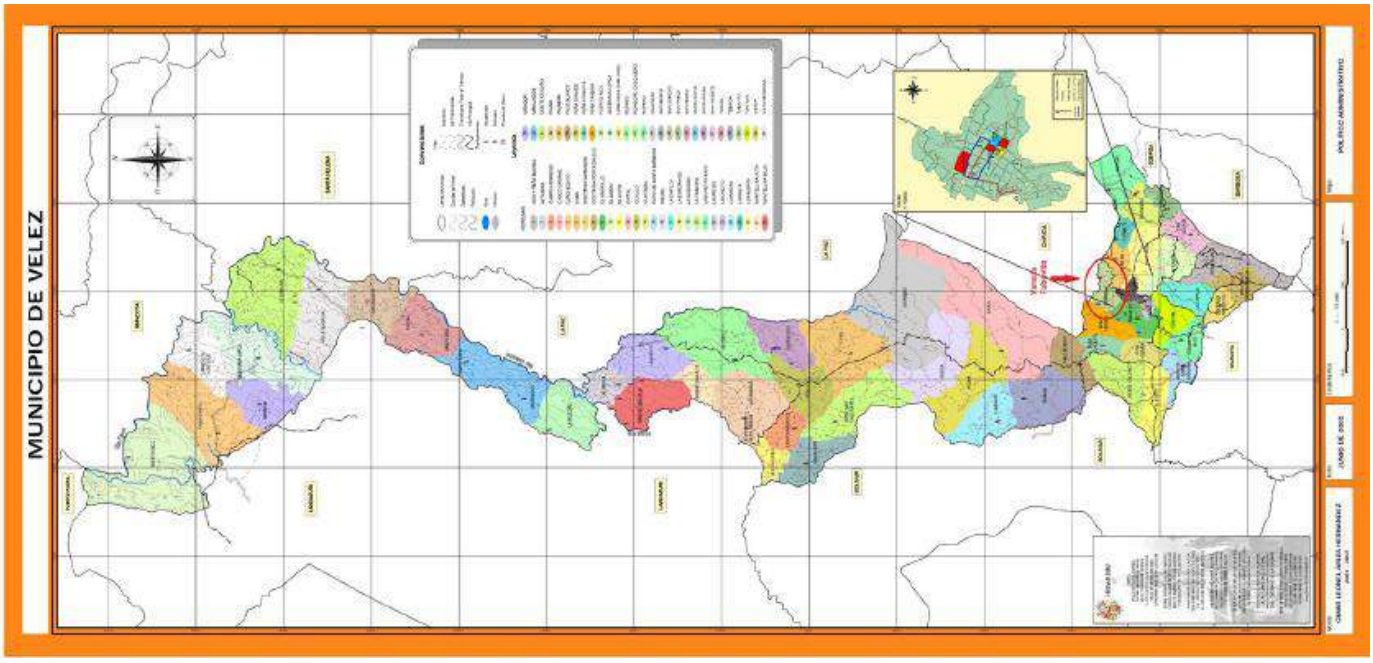


Ilustración 28. Vereda Tubavita – Vélez

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 2
01/06/2024 a 30/06/2024

MUNICIPIO BOLIVAR



Ubicación del tramo Vereda Guamal



Ubicación del tramo Vereda Guamal

MUNICIPIO DE FLORIAN



Ubicación del tramo Vereda Gualilo



Ubicación del tramo Vereda Gualilo

MUNICIPIO DE GUAVATA



Ubicación del tramo Vereda La unión



Ubicación del tramo Vereda La unión

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 2
01/06/2024 a 30/06/2024



Ubicación del tramo Vereda Popoa



Ubicación del tramo Vereda Popoa

LA BELLEZA



Ubicación del tramo Vereda Berlín



Ubicación del tramo Vereda Berlín



Ubicación del tramo Vereda Cachipayal



Ubicación del tramo Vereda Cachipayal

Sucre





"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 2
01/06/2024 a 30/06/2024

Ubicación del tramo Vereda Organos	Ubicación del tramo Vereda Organos
VELEZ	
	
Ubicación del tramo Vereda Tubavita	**Ubicación del tramo Vereda Tubavita**
	
Ubicación del tramo Vereda Gaital	**Ubicación del tramo Vereda Gaital**
	
Ubicación del tramo Vereda Tebaida	**Ubicación del tramo Vereda Tebaida**
	
Ubicación del tramo Vereda Palmera	**Ubicación del tramo Vereda Palmera**

Fuente. Anexo 1 Técnico

2.2 Municipios en la zona de influencia:

El municipio de **Bolívar** se encuentra localizado en la provincia de Vélez del Departamento de Santander, dista **246 kilómetros** de la Ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con la agricultura y la ganadería, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de **957,25 Km** cuadrados de los cuales solo 150,00 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

Municipio:	**BOLIVAR**
N° Habitantes:	**11.803**
Actividad económica:	Ganadería y agricultura (caña de azúcar,aguacate).

TABLA 1 Municipio área de influencia
Fuente: Elaboración propia. – TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. – 2024

El municipio de **FLORIAN** se encuentra localizado en la provincia VELEZ del Departamento del SANTANDER, dista 334,6 kilómetros de la Ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada principalmente la ganadería y la avicultura, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de 191 Km cuadrados, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

Municipio:	**FLORIAN**
N° Habitantes:	**6.000**
Actividad económica:	Ganadería y agricultura (caña de azúcar,cafe).

TABLA 2 Municipio área de influencia
Fuente: Elaboración propia. – TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. – 2024

El municipio de **Guavatá** se encuentra localizado en la provincia de Vélez del Departamento de Santander, dista 238 kilómetros de la Ciudad capital del departamento. En su territorio

la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con la agricultura y la ganadería y producción de derivados de la guayaba, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de 56,00 Km cuadrados de los cuales solo 2,00 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

Municipio:	**GUAVATA**
N° Habitantes:	**4.464**
Actividad económica:	Ganadería y agricultura (caña de azúcar,café, guayaba).

TABLA 3 Municipio área de influencia
Fuente: Elaboración propia. – TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. – 2024

El municipio de **LA BELLEZA** se encuentra localizado en la provincia VELEZ del Departamento del SANTANDER, dista 273,8 kilómetros de la Ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada principalmente cultivo de café, fique, ganadería, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de 219 Km cuadrados, de los cuales solo 0.18 kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

Municipio:	**LA BELLEZA**
N° Habitantes:	**8.700**
Actividad económica:	Ganadería y agricultura (tomate, gulupa, mora, lulo).

TABLA 4 Municipio área de influencia
Fuente: Elaboración propia. – TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. – 2024

El municipio de **SUCRE** se encuentra localizado en la provincia **VELEZ** del Departamento del **SANTANDER**, dista **254,6** kilómetros de la Ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada principalmente cultivo de café, fique, ganadería, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de **606,95** Km cuadrados, de los cuales solo **0.39** kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

Municipio:	**SUCRE**
N° Habitantes:	**8.842**
Actividad económica:	Ganadería y agricultura (caña de azúcar, café).

TABLA 5 Municipio área de influencia
Fuente: Elaboración propia. – TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. – 2024

El municipio de **Vélez** se encuentra localizado en la provincia de Vélez del Departamento de Santander, dista **231** kilómetros de la Ciudad capital del departamento. En su territorio la actividad económica del área rural del municipio está estrechamente relacionada con **la agricultura y la ganadería y producción de derivados de la guayaba**, no obstante, existe un amplio sector con características agroecológicas para su desarrollo bajo condiciones ideales de explotación. Tiene una extensión total de **271,34** Km cuadrados de los cuales solo **20,00** kilómetros cuadrados corresponden a la superficie urbana, por lo cual se puede asegurar que el municipio en su totalidad responde a dinámicas rurales.

Municipio:	**VELEZ**
N° Habitantes:	**20.000**
Actividad económica:	Ganadería y agricultura (caña de azúcar, café,guayaba).

TABLA 6 Municipio área de influencia
Fuente: Elaboración propia. – TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. – 2024

2.3 Inventario y estado inicial de la vía:

La vía de la vereda el **Guamal** tiene una longitud aproximada 702 ml con un ancho promedio de 5m, actualmente en condiciones regulares, a lo largo del corredor no cuenta con obras de arte de drenajes que requieren su implementación. El área de influencia de la vía está destinada principalmente para el desarrollo de actividades agropecuarias, y es una zona de amplia influencia agrícola.

La vía de la vereda **Gualilo** tiene una longitud aproximada 250 ml con un ancho promedio de 5m, actualmente en condiciones regulares, a lo largo del corredor no cuenta con obras de arte de drenajes que requieren su implementación. El área de influencia de la vía está destinada principalmente para el desarrollo de actividades agropecuarias, y es una zona de amplia influencia agrícola.

La vía de la vereda **La unión** tiene una longitud aproximada 108 ml con un ancho promedio de 5m, actualmente en condiciones regulares, a lo largo del corredor cuenta con obras de arte de drenajes que requieren limpieza. El área de influencia de la vía está destinada principalmente para el desarrollo de actividades agropecuarias, y es una zona de amplia influencia agrícola.

La vía de la vereda **Popoa** tiene una longitud aproximada 860 ml con un ancho promedio de 5m, actualmente en condiciones regulares, a lo largo del corredor cuenta con obras de arte de drenajes que requieren limpieza. El área de influencia de la vía está destinada principalmente para el desarrollo de actividades agropecuarias, y es una zona de amplia influencia agrícola.

La vía de la vereda **Berlín** tiene una longitud aproximada 253 ml con un ancho promedio de 5m, actualmente en condiciones regulares, a lo largo del corredor no cuenta con obras de arte de drenajes que requieren implementación. El área de influencia de la vía está destinada principalmente para el desarrollo de actividades agropecuarias, y es una zona de amplia influencia agrícola.

La vía de la vereda **Cachipayal** tiene una longitud aproximada 200 ml con un ancho promedio de 5m, actualmente en condiciones regulares, a lo largo del corredor cuenta con obras de arte de drenajes que requieren limpieza. El área de influencia de la vía está destinada principalmente para el desarrollo de actividades agropecuarias, y es una zona de amplia influencia agrícola.

La vía de la vereda **Órgano** tiene una longitud aproximada 200 ml con un ancho promedio de 5m, actualmente en condiciones regulares, a lo largo del corredor no cuenta con obras de arte de drenajes que requieren implementación. El área de influencia de la vía está destinada principalmente para el desarrollo de actividades agropecuarias, y es una zona de amplia influencia agrícola.

La vía de la vereda **Palmera** tiene una longitud aproximada 701 ml con un ancho promedio de 5m, actualmente en condiciones regulares, a lo largo del corredor cuenta con obras de arte de drenajes que requieren limpieza. El área de influencia de la vía está destinada principalmente para el desarrollo de actividades agropecuarias, y es una zona de amplia influencia agrícola.

La vía de la vereda **Tebaida** tiene una longitud aproximada 652 ml con un ancho promedio de 5m, actualmente en condiciones regulares, a lo largo del corredor no cuenta con obras de arte de drenajes que requieren implementación. El área de influencia de la vía está destinada principalmente para el desarrollo de actividades agropecuarias, y es una zona de amplia influencia agrícola.

La vía de la vereda **Tubavita** tiene una longitud aproximada 652 ml con un ancho promedio de 5m, actualmente en condiciones regulares, a lo largo del corredor cuenta con obras de arte de drenajes que requieren limpieza. El área de influencia de la vía está destinada principalmente para el desarrollo de actividades agropecuarias, y es una zona de amplia influencia agrícola.

A continuación, en la siguiente tabla se muestra el registro fotográfico inicial.

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 2
01/06/2024 a 30/06/2024

MUNICIPIO BOLIVAR



Ubicación del tramo Vereda Guamal



Ubicación del tramo Vereda Guamal

MUNICIPIO DE FLORIAN



Ubicación del tramo Vereda Gualilo



Ubicación del tramo Vereda Gualilo

MUNICIPIO DE GUAVATA



Ubicación del tramo Vereda La unión



Ubicación del tramo Vereda La unión

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 2
01/06/2024 a 30/06/2024



Ubicación del tramo Vereda Popoa



Ubicación del tramo Vereda Popoa

LA BELLEZA



Ubicación del tramo Vereda Berlín



Ubicación del tramo Vereda Berlín



Ubicación del tramo Vereda Cachipayal



Ubicación del tramo Vereda Cachipayal

SUCRE



Ubicación del tramo Vereda Órganos



Ubicación del tramo Vereda Órganos

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 2
01/06/2024 a 30/06/2024

VELEZ	
	
Ubicación del tramo Vereda Tubavita	**Ubicación del tramo Vereda Tubavita**
	
Ubicación del tramo Vereda Gaital	**Ubicación del tramo Vereda Gaital**
	
Ubicación del tramo Vereda Tebaida	**Ubicación del tramo Vereda Tebaida**
	
Ubicación del tramo Vereda Palmera	**Ubicación del tramo Vereda Palmera**

TABLA 7 Registro fotográfico inicial

Fuente: Elaboración propia – TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. – 2024

2.4 Características técnicas del proyecto:

El Alcance priorizado para el corredor consiste en la construcción de las obras de infraestructura vial para el EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS en los municipios de Bolívar, Florián, Guavatá, la Belleza, Sucre y Vélez. Comprende las siguientes intervenciones:

- En conjunto con el Instituto realizar la revisión e implementación del contenido de la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales.

- Mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o de placa huella y/o pavimentos y/u obras de contención y/o aplicación de nuevas tecnologías en los sectores priorizados, así como todas las gestiones y trámites a efectuarse en los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a toda la normatividad vigente.

También siguiendo los lineamientos de las normas:

- CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES actualizadas mediante Resolución No 002483 del 19 de octubre de 2020 del Ministerio de Transporte.

- NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS – INVIAS, actualizadas mediante Resolución No 001375 del 26 de mayo de 2014 del Ministerio de Transporte.

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 2 01/06/2024 a 30/06/2024

3 INFORMACION DEL CONVENIO SOLIDARIO.

3.1 Información general de los convenios solidarios:

NUMERO DE CONVENIO	3951 de 2023 GUAMAL
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUAMAL DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONVENIADO	**JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUAMAL** **MUNICIPIO DE BOLIVAR SANTANDER**
NIT	900.302.264-9 GUAMAL
REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR MANUEL GALEANO ARIZA
DIRECCIÓN	**Municipio de Bolívar** Vereda Guamal
E-MAIL	jacguamalbolivar@gmail.com
MUNICIPIO IMPACTADO	BOLIVAR
ESTADO	EJECUCIÓN
VALOR	$201.006.719,00 GUAMAL
PLAZO INICIAL	10 DIAS GUAMAL
FECHA DE INICIO	21/12/2023 GUAMAL
FECHA DE TERMINACION SEGÚN ORDEN DE INICIO	31/12/2023 GUAMAL
PRORROGA N°1	Hasta el 27 de septiembre de 2024
FECHA PREVISTA TERMINACIÓN CON PRORROGA N°1	27/09/2024 GUAMAL

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 2
01/06/2024 a 30/06/2024

NUMERO DE CONVENIO	4267 de 2023 GUALILO
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL GUALILO DEL MUNICIPIO FLORIAN DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.
CONVENIADO	**JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUALILO** **MUNICIPIO DE FLORIAN SANTANDER**
NIT	804.006.290-3 GUALILO
REPRESENTANTE LEGAL	YINET RODRIGUEZ TORRES
DIRECCIÓN	**Municipio de Florián** Vda El Gualilo Fca San Andrecito
E-MAIL	reases1957@hotmail.com
MUNICIPIO IMPACTADO	FLORIAN
ESTADO	EJECUCIÓN
VALOR	$ 200.963.321,00 GUALILO
PLAZO INICIAL	57 DIAS GUALILO
FECHA DE INICIO	11/03/2023 GUALILO
FECHA DE TERMINACION SEGÚN ORDEN DE INICIO	31/12/2023 GUALILO
PRORROGA N°1	Hasta el 17 de septiembre de 2024
FECHA PREVISTA TERMINACIÓN CON PRORROGA N°1	17/09/2024 GUALILO

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 2
01/06/2024 a 30/06/2024

NUMERO DE CONVENIO	4478 de 2023 LA UNION
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA UNION DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONVENIADO	**JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA UNION MUNICIPIO DE GUAVATA SANTANDER**
NIT	800.026.045-6 LA UNION
REPRESENTANTE LEGAL	YAMID ARDILA MARIN
DIRECCIÓN	**Municipio de Guavatá** CR 3 4 30 BRR CENTRO
E-MAIL	ardila1959@gmail.com
MUNICIPIO IMPACTADO	GUAVATA
ESTADO	EJECUCIÓN
VALOR	$ 200.981.336,00 LA UNION
PLAZO INICIAL	45 DIAS LA UNION
FECHA DE INICIO	17/11/2023 LA UNION
FECHA DE TERMINACION SEGÚN ORDEN DE INICIO	31/12/2023 LA UNION
PRORROGA N°1	Hasta el 27 de septiembre de 2024
FECHA PREVISTA TERMINACIÓN CON PRORROGA N°1	27/09/2024 LA UNION

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 2 01/06/2024 a 30/06/2024

NUMERO DE CONVENIO	4767 de 2023 POPOA
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA POPOA DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONVENIADO	**JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA POPOA** **MUNICIPIO DE GUAVATA SANTANDER**
NIT	901.736.580-8 POPOA
REPRESENTANTE LEGAL	ADRIANA GERENA GONZALEZ
DIRECCIÓN	**Municipio de Guavatá** CR 3 4 30 BRR CENTRO Vda popoa mcp de Guavatá
E-MAIL	Adriana.gerena.rodriguez@gmail.com
MUNICIPIO IMPACTADO	GUAVATA
ESTADO	EJECUCIÓN
VALOR	$ 200.995.632,00 POPOA
PLAZO INICIAL	31 DIAS POPOA
FECHA DE INICIO	30/11/2023 POPOA
FECHA DE TERMINACION SEGÚN ORDEN DE INICIO	31/12/2023 POPOA
PRORROGA N°1	Hasta el 27 de septiembre de 2024
FECHA PREVISTA TERMINACIÓN CON PRORROGA N°1	27/09/2024 POPOA

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 2
01/06/2024 a 30/06/2024

NUMERO DE CONVENIO	3753 de 2023 BERLIN
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLIN DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONVENIADO	**JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BERLIN** **MUNICIPIO DE LA BELLEZA SANTANDER**
NIT	901.069.98-5 BERLIN
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS NORBEY CLAVIJO VELASCO
DIRECCIÓN	**Municipio La Belleza** Vda Berlin Fca Las Violetas
E-MAIL	jacberlinlabelleza@gmail.com
MUNICIPIO IMPACTADO	LA BELLEZA
ESTADO	EJECUCIÓN
VALOR	$ 200.108.139,00 LA BERLIN
PLAZO INICIAL	86 DIAS BERLIN
FECHA DE INICIO	10/05/2023 BERLIN
FECHA DE TERMINACION SEGÚN ORDEN DE INICIO	31/12/2023 BERLIN
PRORROGA N°1	Hasta el 27 de septiembre de 2024
FECHA PREVISTA TERMINACIÓN CON PRORROGA N°1	27/09/2024 BERLIN

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 2
01/06/2024 a 30/06/2024

NUMERO DE CONVENIO	4175 de 2023 CACHIPAYAL
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CACHIPAYAL DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONVENIADO	**JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CACHIPAYAL MUNICIPIO DE LA BELLEZA SANTANDER**
NIT	800.010.670-1 CACHIPAYAL
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN PABLO OVALLE PINEDA
DIRECCIÓN	**Municipio La Belleza** Vda Cachipayal
E-MAIL	ovallepinedajp@gmail.com
MUNICIPIO IMPACTADO	LA BELLEZA
ESTADO	EJECUCIÓN
VALOR	
	$ 200.319.574,00 CACHIPAYAL
PLAZO INICIAL	58 DIAS CACHIPAYAL
FECHA DE INICIO	11/03/2023 CACHIPAYAL
FECHA DE TERMINACION SEGÚN ORDEN DE INICIO	31/12/2023 CACHIPAYAL
PRORROGA N°1	Hasta el 27 de septiembre de 2024
FECHA PREVISTA TERMINACIÓN CON PRORROGA N°1	27/09/2024 CACHIPAYAL

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 2
01/06/2024 a 30/06/2024

NUMERO DE CONVENIO	4490 de 2023 ORGANOS
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ORGANOS DEL MUNICIPIO DE SUCRE, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONVENIADO	**JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ORGANOS MUNICIPIO DE SUCRE SANTANDER**
NIT	901.689.546-5 ORGANOS
REPRESENTANTE LEGAL	LEIDY JOHANA CARANTON CARANTON
DIRECCIÓN	**Municipio de sucre** Vda Organos Fca San Isidro
E-MAIL	cominito1001@hotmail.com
MUNICIPIO IMPACTADO	SUCRE
ESTADO	EJECUCIÓN
VALOR	$ 200.785.769,00 ORGANOS
PLAZO INICIAL	44 DIAS ORGANOS
FECHA DE INICIO	17/11/2023 ORGANOS
FECHA DE TERMINACION SEGÚN ORDEN DE INICIO	31/12/2023 ORGANOS
PRORROGA N°1	Hasta el 27 de septiembre de 2024
FECHA PREVISTA TERMINACIÓN CON PRORROGA N°1	27/09/2024 ORGANOS

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 2
01/06/2024 a 30/06/2024

NUMERO DE CONVENIO	4357 de 2023 GAITAL
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL GAITAL DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONVENIADO	**JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GAITAL** **MUNICIPIO DE LA VELEZ SANTANDER**
NIT	800.220.791-3 GAITAL
REPRESENTANTE LEGAL	JAIRO GONZALEZ PINZON
DIRECCIÓN	**Municipio de velez**
	Vda Gaital
E-MAIL	gladyschaconher@hotmail.com
MUNICIPIO IMPACTADO	VELEZ
ESTADO	EJECUCIÓN
VALOR	$ 201.016.649,00 GAITAL
PLAZO INICIAL	47 DIAS GAITAL
FECHA DE INICIO	15/11/2023 GAITAL
FECHA DE TERMINACION SEGÚN ORDEN DE INICIO	31/12/2023 GAITAL
PRORROGA N°1	Hasta el 27 de septiembre de 2024
FECHA PREVISTA TERMINACIÓN CON PRORROGA N°1	27/09/2024 GAITAL

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 2
01/06/2024 a 30/06/2024

NUMERO DE CONVENIO	4367 de 2023 PALMERA
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PALMERA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONVENIADO	**JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PALMERA** **MUNICIPIO DE LA VELEZ SANTANDER**
NIT	800.069.65-1 PALMERA
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS AUGUSTO ARIZA SANTAMARIA
DIRECCIÓN	**Municipio de velez** Vda La Palmera Fca El Porvenir
E-MAIL	juntaveredapalmera@gmail.com
MUNICIPIO IMPACTADO	VELEZ
ESTADO	EJECUCION
VALOR	$ 201.029.468,00 PALMERA
PLAZO INICIAL	40 DIAS PALMERA
FECHA DE INICIO	21/11/2023 PALMERA
FECHA DE TERMINACION SEGÚN ORDEN DE INICIO	31/12/2023 PALMERA
PRORROGA N°1	Hasta el 27 de septiembre de 2024
FECHA PREVISTA TERMINACIÓN CON PRORROGA N°1	27/09/2024 PALMERA

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 2
01/06/2024 a 30/06/2024

NUMERO DE CONVENIO	4424 de 2023 TEBAIDA
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE TEBAIDA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONVENIADO	**JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TEBAIDA**
	MUNICIPIO DE LA VELEZ SANTANDER
NIT	800.002.824-3 TEBAIDA
REPRESENTANTE LEGAL	NESTOR ILDEFONSO FONTECHA SANDOVAL
DIRECCIÓN	**Municipio de velez** Vda tebaida fca Buenavista chachafruto
E-MAIL	asesoriasaura@yahoo.es
MUNICIPIO IMPACTADO	VELEZ
ESTADO	EJECUCION
VALOR	$ 200.996.240,00 TEBAIDA
PLAZO INICIAL	46 DIAS TEBAIDA
FECHA DE INICIO	16/11/2023 TEBAIDA
FECHA DE TERMINACION SEGÚN ORDEN DE INICIO	31/12/2023 TEBAIDA
PRORROGA N°1	Hasta el 27 de septiembre de 2024
FECHA PREVISTA TERMINACIÓN CON PRORROGA N°1	27/09/2024 TEBAIDA

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 2
01/06/2024 a 30/06/2024

NUMERO DE CONVENIO	4565 de 2023 TUBAVITA
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TUBAVITA DEL MUNICIPIO DE VELEZ-SANTANDER EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONVENIADO	**JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TUBAVITA** **MUNICIPIO DE LA VELEZ SANTANDER**
NIT	900.058.159-7 TUBAVITA
REPRESENTANTE LEGAL	GLADYS CHACON HERNANDEZ
DIRECCIÓN	**Municipio de velez** Vda tebaida fca Buenavista chachafruto
E-MAIL	nestorfsandoval98@gmail.com
MUNICIPIO IMPACTADO	VELEZ
ESTADO	EJECUCION
VALOR	$ 201.030.449,00 TUBAVITA
PLAZO INICIAL	46 DIAS TUBAVITA
FECHA DE INICIO	16/11/2023 TUBAVITA
FECHA DE TERMINACION SEGÚN ORDEN DE INICIO	31/12/2023 TUBAVITA
PRORROGA N°1	Hasta el 27 de septiembre de 2024
FECHA PREVISTA TERMINACIÓN CON PRORROGA N°1	27/09/2024 TUBAVITA

TABLA 8 Información convenio solidario.
Fuente: Elaboración propia. – TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. – 2024

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas en el mes y acciones a seguir por la interventoría:

Durante el mes de mayo de 2024, no se realizaron actividades relacionadas con la ejecución del convenio en las veredas de los municipios de Bolívar, Florián, Guavatá, la Belleza, Sucre y Vélez continuación, se resume el progreso y las acciones realizadas:

3.2.1 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ORGANOS:

Durante la ejecución del convenio se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Se realizó la socialización inicial con la junta de acción comunal vereda Órganos del municipio de Sucre – Santander el día 05 de junio del 2024, en la cual se creó el comité de participación ciudadana y el comité operativo.




Registro fotográfico socialización inicial vereda Órganos

- El día miércoles 26 de junio se tomaron datos y muestras para:
  - Estudio de suelos
  - Estudio hidrográfico
  - Estudio de tránsito
  - Levantamiento topográfico

- Para realizar el diseño geométrico y estructural y de obras hidráulicas si se requieren




Registro fotográfico toma de muestra vereda Organos

3.2.2 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUALILO:

Durante la ejecución del convenio se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Se realizó la socialización inicial con la junta de acción comunal vereda Gualilo del municipio Florián – Santander el día 07 de junio del 2024, en la cual se creó el comité de participación ciudadana y el comité operativo.




Registro fotográfico socialización inicial vereda Gualilo

- Se realiza visita de campo para referencia de nuevo tramo de vía.



Registro fotográfico visita vía vereda Gualilo

3.2.3 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BERLIN:

Durante la ejecución del convenio se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Se realizó la socialización inicial con la junta de acción comunal vereda Berlín del municipio de la Belleza – Santander el día 07 de junio del 2024, en la cual se creó el comité de participación ciudadana y el comité operativo.



Registro fotográfico socialización inicial vereda Berlín

- El día lunes 24 de junio se tomaron datos y muestras para:
  - Estudio de suelos

- Estudio hidrográfico
- Estudio de tránsito
- Levantamiento topográfico
- Para realizar el diseño geométrico y estructural y de obras hidráulicas si se requieren



Registro fotográfico toma de muestra vereda Berlín

3.2.4 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CACHIPAYAL:

Durante la ejecución del convenio se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Se realizó la socialización inicial con la junta de acción comunal vereda Cachipayal del municipio de la Belleza – Santander el día 07 de junio del 2024, en la cual se creó el comité de participación ciudadana y el comité operativo.



Registro fotográfico socialización inicial vereda Cachipayal

- El día lunes 24 de junio se tomaron datos y muestras para:
  - Estudio de suelos
  - Estudio hidrográfico
  - Estudio de tránsito
  - Levantamiento topográfico
  - Para realizar el diseño geométrico y estructural y de obras hidráulicas si se requieren




Registro fotográfico toma de muestra vereda Cachipayal

3.2.5 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TUBAVITA:

Durante la ejecución del convenio se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Se realizó la socialización inicial con la junta de acción comunal vereda Tubavita del municipio de Vélez – Santander el día 06 de junio del 2024, en la cual se creó el comité de participación ciudadana y el comité operativo.




Registro fotográfico socialización inicial vereda Tubavita

- Se realiza visita en sitio de obra para verificación de tramos para coordinar una vez aprobado la iniciación de estudios y diseños tener claro los puntos a intervenir




Registro fotográfico visita vía vereda Tubavita

3.2.6 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PALMERA:

Durante la ejecución del convenio se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Se realizó la socialización inicial con la junta de acción comunal vereda La Palmera del municipio de Vélez – Santander el día 06 de junio del 2024, en la cual se creó el comité de participación ciudadana y el comité operativo.




Registro fotográfico socialización inicial vereda La Palmera

- Se realiza visita en sitio de obra para verificación de tramos para coordinar una vez aprobado la iniciación de estudios y diseños tener claro los puntos a intervenir




Registro fotográfico toma de muestra vereda La Palmera

3.2.7 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL GAITAL:

Durante la ejecución del convenio se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Se realizó la socialización inicial con la junta de acción comunal vereda Gaital del municipio de Vélez – Santander el día 06 de junio del 2024, en la cual se creó el comité de participación ciudadana y el comité operativo.




Registro fotográfico socialización inicial vereda Gaital

- Se realizó una inspección en obra donde se encontró un afloramiento de aguas Subterráneas en la zona a intervenir a las cuales se le debe dar una alternativa para la canalización de estas.



Registro fotográfico visita a vía vereda Gaital

3.2.8 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TEBAIDA:

Durante la ejecución del convenio se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Se realizó la socialización inicial con la junta de acción comunal vereda Tebaida del municipio de Vélez – Santander el día 06 de junio del 2024, en la cual se creó el comité de participación ciudadana y el comité operativo.



Registro fotográfico socialización inicial vereda Tebaida

3.2.9 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA POPOA:

Durante la ejecución del convenio se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Se realizó la socialización inicial con la junta de acción comunal vereda Popoa del municipio de Guavatá – Santander el día 08 de junio del 2024, en la cual se creó el comité de participación ciudadana y el comité operativo.




Registro fotográfico socialización inicial vereda Popoa

- Se hace el aforo vehicular para el estudio de tránsito
- Se realiza visita al lugar donde se realizarán las obras para verificar el estado de la vía por las lluvias ocasionadas en la semana




Registro fotográfico visita a vía vereda Popoa

3.2.10 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA UNION:

Durante la ejecución del convenio se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Se realizó la socialización inicial con la junta de acción comunal vereda La Unión del municipio de Guavatá – Santander el día 05 de junio del 2024, en la cual se creó el comité de participación ciudadana y el comité operativo.




Registro fotográfico socialización inicial vereda La Unión

- El día lunes 24 de junio se tomaron datos y muestras para:
  - Estudio de suelos
  - Estudio hidrográfico
  - Estudio de tránsito
  - Levantamiento topográfico
  - Para realizar el diseño geométrico y estructural y de obras hidráulicas si se requieren




Registro fotográfico toma de muestra vereda La Unión

3.2.11 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUAMAL:

Durante la ejecución del convenio se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Se realizó la socialización inicial con la junta de acción comunal vereda Guamal del municipio de Bolívar – Santander el día 05 de junio del 2024, en la cual se creó el comité de participación ciudadana y el comité operativo.





Registro fotográfico socialización inicial vereda Guamal

3.3 Seguimientos ítem no previstos:

N/A

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría:

Estado de avance:

En el presente período, no se realizó seguimiento y verificación mensual dado que no se han iniciado actividades de obra física.

3.4.1 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ORGANOS:

En el presente período, no se realizó seguimiento y verificación mensual dado que no se han iniciado actividades de obra física.

3.4.2 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUALILO:

En el presente período, no se realizó seguimiento y verificación mensual dado que no se han iniciado actividades de obra física.

3.4.3 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BERLIN:

En el presente período, no se realizó seguimiento y verificación mensual dado que no se han iniciado actividades de obra física.

3.4.4 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CHACHIPAYAL:

En el presente período, no se realizó seguimiento y verificación mensual dado que no se han iniciado actividades de obra física.

3.4.5 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TUBAVITA:

En el presente período, no se realizó seguimiento y verificación mensual dado que no se han iniciado actividades de obra física.

3.4.6 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PALMERA:

En el presente período, no se realizó seguimiento y verificación mensual dado que no se han iniciado actividades de obra física.

3.4.7 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL GAITAL:

En el presente período, no se realizó seguimiento y verificación mensual dado que no se han iniciado actividades de obra física.

3.4.8 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TEBAIDA:

En el presente período, no se realizó seguimiento y verificación mensual dado que no se han iniciado actividades de obra física.

3.4.9 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA POPOA:

En el presente período, no se realizó seguimiento y verificación mensual dado que no se han iniciado actividades de obra física.

3.4.10 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA UNION:

En el presente período, no se realizó seguimiento y verificación mensual dado que no se han iniciado actividades de obra física.

3.4.11 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUAMAL:

En el presente período, no se realizó seguimiento y verificación mensual dado que no se han iniciado actividades de obra física.

4 REPORTE DE EJECUCION MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO.

4.1 Informes semanales

No se han iniciado actividades en campo.

4.2 Maquinaria y Equipos convenio solidario.

Según lo consignado en el anexo técnico, el cual es parte integral del convenio solidario, se relaciona el equipo mínimo requerido en la siguiente tabla, cabe aclarar que actualmente las JAC no ha dispuesto de equipos en la obra puesto que no se han iniciado actividades en campo.

EQUIPO	MINIMO SOLICITADO	EN OBRA
Compactador manual (SALTARÍN) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de impacto por golpe (KN) 12.	1	0
Mezcladora de concreto 1 bulto	1	0
Cizalla manual de 90 cm.	1	0
Carrotanque de agua (1000 Galones)	1	0
Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton.	1	0
Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton.	1	0
Ruteadora	1	0
Compresor (barrido y soplado)	1	0
Camioneta D – 300	1	0
Volquetas Sencillas	4	0
Compresor 120 HP, con martillo	1	0
Herramienta menor	1	0
Equipo de computo	2	0

TABLA 9 Relación de equipo en obra en los convenios

Fuente: Elaboración propia. – TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. – 2024

4.3 Personal, control aportes legales y seguridad social convenio solidario.

4.3.1 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ORGANOS:

Personal que a la fecha ha laborado con la JAC:

- Residente de obra: Cristian Iván Marín Quitian
- Contador: Leila María Reyes Mosquera
- Topógrafos: (No ha iniciado actividades)
- Cadeneros: (No ha iniciado actividades)
- Maestro de obra: (No ha iniciado actividades)
- Ayudantes de obra: (No ha iniciado actividades)

4.3.2 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUALILO:

Personal que a la fecha ha laborado con la JAC:

- Residente de obra: Edwar Alfonso Fajardo Delgado
- Contador: Sindy Tatiana Herrera Fandiño
- Topógrafos (No ha iniciado actividades)
- Cadeneros (No ha iniciado actividades)
- Maestro de obra (No ha iniciado actividades)
- Ayudantes de obra (No ha iniciado actividades)

4.3.3 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BERLIN:

Personal que a la fecha ha laborado con la JAC:

- Residente de obra: Jorge Ronaldo Fandiño Gómez
- Contador: María Magdalena Albino Pilonieta
- Topógrafos (No ha iniciado actividades)
- Cadeneros (No ha iniciado actividades)
- Maestro de obra (No ha iniciado actividades)
- Ayudantes de obra (No ha iniciado actividades)

4.3.4 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CHACHIPAYAL:

Personal que a la fecha ha laborado con la JAC:

- Residente de obra: Jorge Eduardo Hurtado Pedraza
- Contador: Diana Milena González Rodríguez
- Topógrafos (No ha iniciado actividades)
- Cadeneros (No ha iniciado actividades)
- Maestro de obra (No ha iniciado actividades)
- Ayudantes de obra (No ha iniciado actividades)

4.3.5 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TUBAVITA:

Personal que a la fecha ha laborado con la JAC:

- Residente de obra: María Camila Díaz Carrasco
- Contador: Alba Ruth Santamaría Ariza
- Topógrafos (No ha iniciado actividades)
- Cadeneros (No ha iniciado actividades)
- Maestro de obra (No ha iniciado actividades)
- Ayudantes de obra (No ha iniciado actividades)

4.3.6 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PALMERA:

Personal que a la fecha ha laborado con la JAC:

- Residente de obra: Jesús Alberto Díaz Ariza
- Contador: Laura Carolina Ariza Nieves
- Topógrafos (No ha iniciado actividades)
- Cadeneros (No ha iniciado actividades)
- Maestro de obra (No ha iniciado actividades)
- Ayudantes de obra (No ha iniciado actividades)

4.3.7 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL GAITAL:

Personal que a la fecha ha laborado con la JAC:

- Residente de obra: Gustavo Andrés Vargas
- Contador: Juan Harvey Ramírez Camacho
- Topógrafos (No ha iniciado actividades)
- Cadeneros (No ha iniciado actividades)
- Maestro de obra (No ha iniciado actividades)
- Ayudantes de obra (No ha iniciado actividades)

4.3.8 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TEBAIDA:

Personal que a la fecha ha laborado con la JAC:

- Residente de obra: Miguel Ángel Masmela Zapata
- Contador: Yaneth González Fontecha
- Topógrafos (No ha iniciado actividades)
- Cadeneros (No ha iniciado actividades)
- Maestro de obra (No ha iniciado actividades)
- Ayudantes de obra (No ha iniciado actividades)

4.3.9 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA POPOA:

Personal que a la fecha ha laborado con la JAC:

- Residente de obra: Viviana Paola Rodríguez Ariza
- Contador: Yeimmy Dianith Gerena Ardila
- Topógrafos (No ha iniciado actividades)
- Cadeneros (No ha iniciado actividades)
- Maestro de obra (No ha iniciado actividades)
- Ayudantes de obra (No ha iniciado actividades)

4.3.10 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA UNION:

Personal que a la fecha ha laborado con la JAC:

- Residente de obra: Jeison Leandro Camacho Ávila
- Contador: Clara Inés García Mahecha
- Topógrafos (No ha iniciado actividades)
- Cadeneros (No ha iniciado actividades)
- Maestro de obra (No ha iniciado actividades)
- Ayudantes de obra (No ha iniciado actividades)

4.3.11 UNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUAMAL:

Personal que a la fecha ha laborado con la JAC:

- Residente de obra (No ha iniciado actividades)
- Contador: Nancy Andrea Duran Valdivieso
- Topógrafos (No ha iniciado actividades)
- Cadeneros (No ha iniciado actividades)
- Maestro de obra (No ha iniciado actividades)
- Ayudantes de obra (No ha iniciado actividades)

La interventoría ha sugerido la contratación inmediata del Ingeniero Residente para cumplir con los compromisos contractuales del convenio.

4.4 Informe financiero y presupuestal convenios solidarios.

N/A

4.5 Estado general del tiempo.

CLASE DE TIEMPO	HORAS	PORCENTAJE
Seco	0	000%
Lluvias moderadas	0	0%
Lluvias intensas	0	0%
TOTAL, HORAS	**0**	**000%**

TABLA 10 Horas precipitaciones del mes

Fuente: Elaboración propia. – TERRA INGENIEROS CIVILES – 2024

4.6 Resumen de ensayos de laboratorio.

En el presente período, no se realizó seguimiento y verificación mensual dado que no se han iniciado actividades de obra física.

4.7 Seguimiento garantías y seguros convenio solidario.

En el presente período, no se realizó seguimiento y verificación mensual dado que no se han iniciado actividades de obra física.

POLIZ**AS – COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A - ACTA DE INCIO CONVENIO 3951**			
POLIZA	N°	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento	NB-100042548	17/10/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	NB-100042548	17/10/2023	31/12/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	NB-100042548	31/12/2023	31/12/2028
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			

POLIZAS – MUNDIAL DE SEGUROS S.A - ACTA DE INCIO CONVENIO 4267			
POLIZA	N°	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento	NB-100316381	29/11/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	NB-100316381	29/11/2023	31/12/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	NB-100316381	31/12/2023	31/12/2028
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 2
01/06/2024 a 30/06/2024

POLIZAS – LA PREVISORA S.A. - ACTA DE INCIO CONVENIO 4478			
POLIZA	N°	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento	NB-3001992	16/11/2023	30/10/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	NB-3001992	16/11/2023	31/12/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	NB-3001992	31/12/2023	31/12/2028
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			

POLIZAS – LA PREVISORA S.A. - ACTA DE INCIO CONVENIO 4767			
POLIZA	N°	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento	NB-3002003	30/11/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	NB-3002003	30/11/2023	31/12/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	NB-3002003	31/12/2023	31/12/2028
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 2
01/06/2024 a 30/06/2024

POLIZAS – LA PREVISORA S.A. - ACTA DE INCIO CONVENIO 3753			
POLIZA	N°	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento	NB-3001976	04/10/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	NB-3001976	04/10/2023	31/12/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	NB-3001976	31/12/2023	31/12/2028
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			

POLIZAS – LA PREVISORA S.A. - ACTA DE INCIO CONVENIO 4175			
POLIZA	N°	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento	NB-3001983	03/11/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	NB-3001983	03/12/2023	31/12/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	NB-3001983	31/12/2023	31/12/2028
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 2
01/06/2024 a 30/06/2024

POLIZAS – LA PREVISORA S.A. - ACTA DE INCIO CONVENIO 4490			
POLIZA	N°	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento	NB-3001994	17/11/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	NB-3001994	17/11/2023	31/12/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	NB-3001994	31/12/2023	31/12/2028
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			

POLIZAS – LA PREVISORA S.A. - ACTA DE INCIO CONVENIO 4357			
POLIZA	N°	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento	NB-3001997	15/11/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	NB-3001997	15/11/2023	31/12/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	NB-3001997	31/12/2023	31/12/2028
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			

POLIZAS – LA PREVISORA S.A. - ACTA DE INCIO CONVENIO 4367			
POLIZA	N°	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento	NB-3001991	14/11/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	NB-3001991	14/11/2023	31/12/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	NB-3001991	31/12/2023	31/12/2028
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			

POLIZAS – LA PREVISORA S.A. - ACTA DE INCIO CONVENIO 4424			
POLIZA	N°	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento	NB-3001993	15/11/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	NB-3001993	15/11/2023	31/12/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	NB-3001993	31/12/2023	31/12/2028
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			

POLIZAS – MUNDIAL DE SEGUROS S.A - ACTA DE INCIO CONVENIO 4565			
POLIZA	N°	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento	NB-100043087	21/11/2023	31/10/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	NB-100043087	21/11/2023	31/12/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	NB-100043087	31/12/2023	31/12/2028
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			

TABLA 11 Relación de Pólizas del contrato de obra - convenio No. 1631 de 2024
Fuente: Elaboración propia. – TERRA INGENIEROS CIVILES – 2024

4.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra.

En el presente período, no se realizó seguimiento y verificación mensual del plan de calidad puesto que la JAC Guamal la fecha no ha hecho entrega del mismo a la interventoría.

4.9 Otros documentos seguimiento mensual.

4.9.1 Seguimiento a la inversión del anticipo de obra.

Para los presentes convenios solidarios no se realizó anticipo de obra.

4.9.2 Seguimiento al programa de obra.

En el presente período, no se realizó seguimiento y verificación mensual dado que no se han iniciado actividades de obra física.

Es importante aclarar que los convenios en sus cuarenta y cinco (45) días iniciales contempla revisión de la "Guía de Obras Menores"

4.9.3 Seguimiento al programa de inversiones.

En el presente período, no se realizó seguimiento y verificación mensual dado que no se han iniciado actividades de obra física.

4.9.4 Actas suscritas

En el presente mes y lo transcurrido del presente convenio no se han realizado actas.

4.9.5 Actas de reunión

En el presente mes se realizaron 11 actas de reunión las cuales se discrimina en el presente informe adjunto.

5 INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

5.1 Información general del contrato de interventoría:

NUMERO DE CONTRATO	1631 DE 2024
PROCESO	CMA-DEO-SVR-CCPT-010-2024,
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.
CONTRATISTA	**TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.**
NIT	860.038.275-3
REPRESENTANTE LEGAL	JORGE HERNANDO FORERO FORERO
DIRECCIÓN	Av. Carrera 15 # 100-69 Oficina 306
TELEFONO	312 2958359
E-MAIL	Gerencia@terraingenierosciviles.com
ID SECOP	CO1.NTC.5196283
MUNICIPIO IMPACTADO	BOLIVAR
SUPERVISOR	CARLOS ALBERTO PARRA SILVA
ESTADO	EJECUCIÓN
VALOR INICIAL	TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS ($394.093.490)
ADICIÓN N°1	N/A
VALOR TOTAL ACUMULADO	N/A
PLAZO INICIAL	CUATRO MESES
FECHA DE INICIO	27/05/2024
FECHA DE TERMINACION ACTUAL	27/09/2024
PRORROGA N°1	N/A
FECHA PREVISTA TERMINACIÓN CON PRORROGA N°1	N/A

TABLA 12 Información contrato de interventoría.

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor:

La interventoría en cumplimiento de las funciones emanadas del contrato N°1631 de 2024 suscrito con el INVIAS, ha realizado actividades concernientes a sus obligaciones, estas enmarcadas en velar el buen desarrollo de la obra y el cumplimiento del objeto contractual a cabalidad, a continuación, describimos las actividades realizadas que conllevan.

5.3 Informes de especialistas y profesionales:

Hasta la fecha, no se han recibido informes de los especialistas responsables de los diseños y estudios.

5.4 Informes del programa anual de caja

Realizando el control y evaluación de la programación mensual de los recursos a ejecutar en el presente convenio solidario y para el contrato de interventoría, se realiza comparación con la ejecución mensual para el presente mes.

INFORMACIÓN PRESPUESTAL - PAC			
TOTAL, INVERSION	**VALOR CONTRATADO**	**VALOR EJECUTADO**	**% EJECUTADO**
INTERVENTORÍA	$ 394.093.490	$ 43.441.545,00	11.02%
Total, Inversión	$ 394.093.490	$ 43.441.545,00	11.02%

TABLA 13 Informe presupuestal PAC.

Fuente: Elaboración propia. – TERRA INGENIEROS CIVILES – 2024

5.5 *Informes matrices de riesgo.*

En el presente período, no se realizó seguimiento y verificación mensual dado que no se han iniciado actividades de obra física.

.

No.	Tipo de Riesgo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Categoría	A QUIEN SE ASIGNA		TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	AFECTA LA EJECUCION DEL CONVENIO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
					INVIAS	JAC					
1	Riesgo Económico	**Desabastecimiento de materias primas e insumos.** Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del convenio, se presenten limitaciones a la consecución de materia primas e insumos de las fuentes de suministros previstas o por el retiro del mercado por parte de sus productores.	Retrasos de las Obras, incumplimiento de cronogramas, mayores costos al la JAC	Riesgo Bajo		X	Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de contingencia	Si el insumo es materia prima básica puede afectarla, mientras se acuerda solución alterna.	Gestores y/o Supervisores, Interventor, JAC	Al inicio de la ejecución del convenio	A la terminación de la ejecución del convenio
2	Riesgo Económico	**Variación de precios durante la ejecución del convenio.** Se refiere a la posibilidad de que los precios del Formulario 1 - Presupuesto oficial sean influenciados con alzas en el mercado.	Afectación al equilibrio económico del convenio	Riesgo Bajo	X	X	Durante la etapa de ejecución se validará por la Interventoría y la Supervisión del convenio el alza en los precios para tomar las medidas correctivas pertinentes.	SI	Gestores y/o Supervisores, Interventor, JAC	Al inicio de la ejecución del convenio	A la terminación de la ejecución del convenio

3	Riesgo Operacional - Social	**Cambio en la ubicación de las obras menores.** Se refiere a solicitudes realizadas por Autoridades Municipales, usuarios o vecinos de la carretera invocando derechos de petición u otras herramientas legales.	Ajustes en la programación de obras y eventual generación de mayores costos al proyecto.	Riesgo Bajo	X	X	Efectuar la socialización del proyecto, para conocimiento de autoridades y comunidad. Control y Gestión con los solicitantes, para que los cambios en la ubicación de obras menores afecten en menor medida o no afecten las previsiones del proyecto tanto técnicas, como en costos y tiempo. Seguimiento a la ejecución del convenio, incrementando inspecciones y revisiones para asegurar el cumplimiento del mismo.	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor, JAC	Al inicio de la ejecución del convenio	A la terminación de la ejecución del convenio
4	Riesgo Sociales o Políticos	**Orden público:** Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas, manifestaciones, disturbios y demás que afecten el orden público y se ubiquen en las zonas de influencia de las obras.	Posible pérdida de Bienes de la JAC, daños en obras del proyecto, reprogramación de cronogramas, retrasos en la ejecución de las obras.	Riesgo Alto	X	X	Es responsabilidadde la JAC junto con la Interventoría, únicamente de Informar a las autoridades competentes la novedad sobre orden público en la zona de influencia de las obras y de protegera sus colaboradores y los bienes puestos al servicio del convenio. El INVIAS de igual forma realizará la solicitud a las autoridades a fin de que se llegue a soluciones que permitan la continuidad en la ejecución del convenio. La JAC e Interventor deberán adoptar medidas de contingencia para en tal caso superar los atrasos.	SI	Gestores y/o Supervisores, Interventor, JAC	Al inicio de la presentación del evento	A la terminación de la ocurrencia del evento

5	Riesgo Operacional	**Accidentalidad:** Se refiere a los perjuicios ocasionados por la deficiente colocación de señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores,etc., por parte de la JAC.	Impacto Negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes de usuarios de la via y trabajadores de la obra, inconformidad con la obra por parte de los usuarios de la vía.	Riesgo Alto		**X**	El Interventor debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización temporal de obras, y seguridad industrial, verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas sancionatorias contractuales de ser necesario. Seguimiento por parte de la Entidad en visitas técnicas.	SI	Gestores y/o Supervisores, Interventor, JAC	Al inicio de la ejecución del convenio	A la terminación de la ejecución del convenio
6	Riesgo Operacional	**Variación de las actividades y cantidades de obra por revisión y aplicación de la Cartilla de Obras de Drenaje y Estructuras Viales del INVIAS por la JAC:** Ocurre cuando se presentan efectos originados por cambios resultados de la aplicación de la Cartilla de Obras de Drenaje y Estructuras Viales del INVIAS necesaria para la correcta ejecución y operación de las obras.	Retrasos en el cronograma de ejecución, variación de algunas obras del convenio y por ende las actividades y las cantidades de obra.	Riesgo Medio	**X**	**X**	Realizar una interventoría adecuada durante la etapa revisión y aplicación de la Cartilla de Obras de Drenaje y Estructuras Viales del INVIAS para evitar cambios que impacten negativamente el proyecto. Realizar las consultas pertinentes y oportunas cuando se encuentren diferencias o inconsistencias en la revisión y aplicación de la cartilla.	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor, JAC	al inicio de la revisión y aplicación de la Cartilla de Obras de Drenaje y Estructuras Viales del INVIAS	al final de la revisión y aplicacióndela Cartilla de Obras de Drenaje y Estructuras Viales del INVIAS
8	Riesgo Operacional	**Ejecución de mayores cantidades de obra no autorizadas, por materiales y/o procedimientos constructivos inadecuados, y/o** por deficiente programación de ejecución de las obras.	Demora en la ejecución de la obra por correctivos necesarios.	Riesgo Bajo		**X**	Interventoría permanente en la ejecución de las obras, para controlar obras no autorizadas, materiales, procedimientos constructivos, ajustados a las obras requeridas y especificaciones técnicas contractuales.	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor, JAC	Al inicio de la ejecución del convenio	A la terminación de la ejecución del convenio

9	Riesgo Operacional	**Variación de cantidades de obra debidamente justificadas:** Son los efectos derivados de los cambios en las condiciones técnicasque incrementen o disminuyan las cantidades previstas para la ejecución de las obras. INVIAS asume las variaciones de las cantidades de obra técnicamente requeridas para la ejecución del proyecto y la JAC asume el riesgo de ejecutar las cantidades de obra en las variaciones que sean necesarias.	Genera variación de las cantidades de obra previstas inicialmente, siendo necesario ajustes al balance de cantidades de obra, para ceñirse al presupuesto contractual.	Riesgo Medio	**X**	**X**	Seguimiento por la Supervisión e Interventoría en la fase revisión y aplicación de la Cartilla de Obras de Drenaje y Estructuras Viales del INVIAS	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor, JAC	al inicio de la revisión y aplicación de la Cartilla de Obras de Drenaje y Estructuras Viales del INVIAS	al final de la revisión y aplicaciónde la Cartilla de Obras de Drenaje y Estructuras Viales del INVIAS
10	Riesgo Operacional	**Requerimiento de mayor tiempo en la etapa de ejecución de las obras** por efectos de la existencia de dificultades técnicas no imputables a la JAC para la construcción de obras; la JAC debe ejecutar las actividades y obras necesarias de acuerdo a los valores presentados en el Formulario No. 1 Presupuesto oficial, y el INVIAS ajustará las condiciones del plazo.	Retrasoen el plazo de ejecución del convenio y el aumento en los costos administrativos del convenio.	Riesgo Alto	**X**	**X**	Seguimiento permanente por parte de la Interventoría y la Supervisión al cumplimiento en la etapa de construcción	SI	Gestores y/o Supervisores, Interventor, JAC	Al inicio de la ejecución del convenio.	A la terminación de la ejecución del convenio
11	Riesgo Operacional	**Modificación y/o cambios de ubicación en las fuentes de materiales y/o Lugares de disposición de sobrantes, presentados y/o propuestos y/o proyectados por la JAC**. Hace referencia al riesgo técnico, económico, ambiental y/o social, en cuanto a calidad y cantidad del material, explotación y su distancia de acarreo para las fuentes de materiales y/o para los lugares de disposición de sobrantes.	Impacto económico, social y ambiental para la ejecución del convenio.	Riesgo Alto	**X**	**X**	Ajuste a las distancias estimadas inicialmente por el INVIAS con base en la información recogida en la zona de ejecución con acompañamiento de la Interventoría y la Supervisión.	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor, JAC	En la planeación del proyecto y en la etapa precontractual	A la terminación de la ejecución del convenio

12	Riesgo Operacional	**Interferencia con las de redes de servicios públicos existentes:** Ocurre por la presencia de redes existentes, que puedan interferir con el proyecto, afectando el normal desarrollo de las obras. La JAC deberá realizar todas las gestiones que correspondan. EL INVIAS asumirá los costos que correspondan de acuerdo con lo establecido en el Capítulo III de la Ley 1682 de 2013	Impacto negativo en el desarrollo del objeto contractual, por la interferencia de las redes existentes con la ejecución del proyecto	Riesgo Bajo	X	X	Desde la Fase Precontractual y en la etapa contractual solicitar a las Entidades encargadas de Servicios Públicos informar con el mayor detalle posible sobre la existencia de redes de servicios que puedan interferir conel proyecto. En caso de detección de una red no referenciada, gestionar de inmediato lo pertinente con la Empresa de Servicios, para la menor afectación al proyecto.	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor, JAC	Fase precontractual, y cuando se detecte la existencia de redes de servicio público que interfieran con el proyecto	cuando se solucione la interferencia de las redes de servicio público existentes
13	Riesgo Financiero-Administrativo	**Riesgo Administrativo:** Se deriva de los efectos provenientes de la mayor permanencia del personal calificado y así como todos los gastos descritos en la administración que exceden el plazo inicial del convenio que puedan afectar el presupuesto del convenio.	Impacto negativo por el aumento de los costos en la ejecución del convenio.	Riesgo Alto	X	X	Realizar por parte de L JAC proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables descritas, anexo técnico y con el estudio de mercado financiero con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo.	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor JAC	Al inicio de la ejecución del convenio	A la terminación del convenio
14	Riesgo Regulatorio	**Expedición y/o modificación de normas:** Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la firma del convenio, que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas.	Afectación del desarrollo del convenio previsto con la normatividad existente.	Riesgo Bajo	X	X	Proceder de acuerdo a las normas aplicables vigentes. Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior a la firma del convenio, que afecten el normal desarrollo de este, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar.	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor-JAC	Fase precontractual, y cuando se expida la nueva normatividad que pueda afectar el convenio	A la terminación del convenio
15	Riesgo Ambiental	**Gestión Ambiental:** Demora en la obtención de permisos ambientales por demora y/o inadecuada presentación de soportes y estudios.	Retrasoen la Ejecución de los trabajos	Riesgo Bajo		X	Seguimiento por parte del Interventor a la gestión documentada de JAC para la obtención de licencias, permisos y autorizaciones ambientales.	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor-JAC	Al inicio de la ejecución del convenio	Una vez obtenida la licencia y/o permisos y/o autorizaciones ambientales

16	Riesgo Ambiental	**Pasivos Ambientales:** Pasivos ambientales generados en el proceso constructivo, desde el punto de vista ambiental.	Impacto Negativo por efectos en la Ejecución del Proyecto	Riesgo Bajo		**X**	Seguimiento por parte del Interventor a los procesos constructivos, para evitar que se generen pasivos ambientales por esta causa, acompañamiento de Especialistas Ambientales del proyecto cuando sea necesario. Una vez causados, exigir el cumplimiento de las medidas compensatorias de los mismos impuestas por la autoridad ambiental. Seguimiento por parte de la Subdirección de Sostenibilidad. De ser necesario llevar a cabo procesos sancionatorios para conminar su cumplimiento o sancionar el incumplimiento.	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor-JAC	Al inicio de la ejecución del convenio	A la terminación del convenio
17	Riesgo Social	**Manifestación Social**: Se refiere a la posibilidad de que la Comunidad presente inconformidades frente a la construcción y puesta en servicio del proyecto. Riesgo asociado a los procesos de Gestión Social que realice la JAC y que estén en cabeza de esta.	Inconformidad de la comunidad en proceso de Gestión Social por la socialización del proyecto y ejecución de la obra, puede generar atrasos en la ejecución de la obra.	Riesgo Bajo		**X**	Seguimiento de la Interventoría y la Supervisión de todos los protocolos y procesos de Gestión Social de los proyectos que así lo requieran. Socialización desde el comienzo del proyecto a las comunidades que se encuentran directamente afectadas. Atención a las inconformidades de la comunidad. Seguimiento al proceso en conjunto con el Ministerio del Interior, cuando sea requerido.	SI	Gestores y/o Supervisores, Interventor-JAC	Al inicio de la ejecución del convenio	A la liquidación del convenio con el cierre ambiental

18	Riesgo de la naturaleza	**Fuerza mayor asegurable**. Son las relacionadas con los impactos adversos debido a la ocurrencia de desastres naturales, que afecten los bienes, equipos, maquinaria, personal, insumos, materiales, etc. De propiedad de la JAC. Riesgo que asume la JAC. Se excluyen daños en bienes de la nación que estarán a cargo de INVIAS.	Demora en la ejecución del proyecto. Pérdida de bienes de la JAC	Riesgo Medio		**X**	Recopilación de datos estadísticos e información a partir de las fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la ocurrencia de fenómenos naturales en la región del proyecto, para adoptar medidas tendientes a mitigar su impacto sobre bienes de la JAC, tales como ubicación de campamentos y oficinas, maquinaria y equipos, acopios de materiales, planes de seguridad industrial para protección del personal en dichos eventos, etc.	SI	JAC	Etapa precontractual	Una vez instalado la JAC en el proyecto e implementado el plan de seguridad industrial con las debidas revisiones.
19	Riesgo político-social, Riesgo de la naturaleza	**Fuerza mayor no asegurable.** Incertidumbre de ocurrencia de eventos de fuerza mayor no asegurables, tales como guerras, hallazgos arqueológicos, yacimientos mineros. Se define la Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los términos de la legislación existente.	Interferencia en la ejecución del proyecto, pérdidas de bienes de la nación ó de la JAC, cambios en las obras por necesidad de ajustar la intervención .	Riesgo Medio	**X**	**X**	Recopilación de datos estadísticos e información a partir de fuentes oficiales durante la etapa precontractual y contractual, sobre la posibilidad de aparición de hallazgos arqueológicos o yacimientos mineros en la región del proyecto, para advertir oportunamente sobre su interferencia con el proyecto y tomar las medidas tendientes a mitigar el impacto. Ante la aparición del evento efectuar los ajustes de diseño para las modificaciones a que hubiere lugar en la ejecución del proyecto. En caso de guerra tratar y acordar con INVIAS el tratamiento contractual al proyecto	SI	Gestores y/o Supervisores, Interventor-JAC	Etapa precontractual	A la terminación del convenio

20	Riesgos de la Salud	**Presencia de Riesgos Biológicos.** Se refiere a la posibilidad que, durante la ejecución del convenio, los colaboradores de la JAC, presenten síntomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal.	Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio	Riesgo Alto		X	La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Saluden Colombia y sus respectivos Protocolos, el cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019, Informar de inmediato las novedades de salud.	SI	Gestores y/o Supervisores, Interventor-JAC	Al inicio de la ejecución del convenio	A la terminación del convenio
21	Riesgos de la Salud	**Disponibilidad de los Elementos de Protección Personal.** Se refiere a la posibilidad de que la JAC no disponga o suministre a sus colaboradores y demás, los Elementos de Protección Personal EPP y los de Riesgo Biológico.	Accidentes de trabajo y posible exposición a Riegos Biológicos	Riesgo Medio		X	El Interventor debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad en lo atinente a los EPP y la de riesgo biológico.	SI	Gestores y/o Supervisores, Interventor-JAC	Al inicio de la ejecución del convenio y de manera permanente.	A la terminación del convenio
22	Riesgos de Corrupción	**Gestión Indebida y dolosa de los Recursos Financieros, de Insumos y Obras.** Se refiere a la posibilidad de que la JAC, la Interventoría y los funcionarios del Invias, promuevan y/o participen de acciones fraudulentas en el manejo de los recursos destinados a las obras tanto en los aspectos financieros, facturación, calidad y cantidad de materiales e insumos y obras sin justificar.	Graves daños Institucionales. Daño a la reputación de las entidades participantes, pérdida de recursos y daños sociales.	Riesgo Alto	X	X	Socialización e inspecciones visuales con la comunidad de los recursos desembolsados contra las obras en ejecución. Un manejo de cuenta conjunto. Cheques a primer beneficiario. Pagos contra facturas. Informes semanales de avances de obras. Denuncias en tiempo real de acciones fraudulentas.	SI	Gestores y/o Supervisores, Interventor-JAC, Ciudadanía	Al inicio de la ejecución del convenio	A la terminación del convenio

TABLA 14 Fuente: Pliego de condiciones proceso CMA-DEO-SVR-CCPT-010-2024

5.6 REPORTE DE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

5.6.1 Equipo y vehículos contrato de interventoría.

En el presente perdido la interventoría dispuso de vehículo para el transporte de personal en visitas y reuniones en la obra, la información el vehículo cumple con las especificaciones que exige el INVIAS en el marco del contrato de interventoría.

5.6.2 6.2 Personal control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría.

El control de personal para el presente mes arroja que ***TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S***. a la fecha tiene un total de 4 personas empleadas de las cuales 4 son empleos directos, a continuación, se presenta la tabla para información del personal.

N°	DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD CONTRATANTE
1	79.343.910	JORGE HERNANDO FORERO FORERO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Interventoría
2	13.275.235	JORGE RICARDO CARDENAS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Interventoría
3	1.143.324.283	KAROL KRISTINA BLANCO	PROFESIONAL SOCIAL	Interventoría
4	1.002.583.483	STEPTHANY RONDANO GAMBOA	TÉCNICO ADMINISTRATIVO	Interventoría

TABLA 15 Personal de interventoría.
Fuente: Elaboración propia. – TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. – 2024

En el formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-7 PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL INTERVENTORIA,* muestra el control y los documentos pertinentes al personal de interventoría.

5.6.3 Información financiera y presupuestal contrato de interventoría.

En el formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-9 INF FIN Y PRESUPUESTAL INT, se* muestra el control presupuestal de la ejecución del contrato de interventoría.

5.6.4 Seguimiento garantías contrato de interventoría.

Se realiza seguimiento a las garantías y seguros del contrato de interventoría, a la fecha del presente informe ha transcurrido un periodo inicial desde el 27 de mayo de 2024 fecha del acta de inicio, en ese orden en la siguiente tabla se registra en resumen las garantías y seguros que amparan a la entidad INVIAS en el marco del presente contrato de interventoría.

SEGUROS DEL ESTADO S.A. -INICIAL 1631			
POLIZA	No	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento	33-44-101249469	08/05/2024	08/01/2025
Buen manejo y correcta y correcta inversión del anticipo	33-44-101249469	08/05/2024	08/01/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	33-44-101249469	08/05/2024	08/09/2027
Calidad del servicio	33-44-101249469	08/09/2024	08/09/2029

TABLA 16 Pólizas contrato de interventoría.
Fuente: Elaboración propia. – Terra Ingenieros Civiles S.A.S. – 2024

A continuación, en el formato *MEPI-MN1-IN-15-FR-13 SEG GARANTIAS INT, se* muestra el control a las garantías para los meses descritos anteriormente.

5.6.5 Seguimiento al plan de calidad de contrato de interventoría.

Para garantizar el cumplimiento de este aspecto, se han implementado recursos técnicos y administrativos, acompañados de la supervisión constante del personal profesional designado con este propósito específico. Estas medidas se orientan a elevar la calidad de los proyectos, siguiendo rigurosamente los lineamientos establecidos por el sistema de gestión de calidad.

5.6.6 Vigilancia y control de actividades en campo

Durante las labores de campo, se seguirá un plan basado en las actividades diarias de interventoría. Se realizará un riguroso seguimiento de las tareas diarias llevadas a cabo por el contratista, verificando tanto los procedimientos como la metodología empleada en la ejecución.

5.6.7 Sistematización de información

Se dispone de personal debidamente capacitado para el manejo de la información, garantizando así que los datos recolectados en el campo se procesen correctamente de acuerdo con los formatos requeridos. Además, se lleva a cabo una verificación y control exhaustivo de la información recopilada por la interventoría. Paralelamente, se supervisa que el contratista implemente los procedimientos apropiados para el procesamiento de su información, asegurando la integridad y precisión de los datos en todo el proceso.

5.6.8 Personal y equipo de las JAC

Se garantiza que durante la ejecución del contrato se disponga del personal profesional y técnico necesario para llevar a cabo las actividades de manera adecuada. Además, se asegura la participación activa de este personal en las reuniones programadas, contribuyendo así a la eficiencia y efectividad en el desarrollo de los proyectos.

5.6.9 Calidad de los materiales empleados

Esta interventoría se encargará de verificar, calificar y aprobar o rechazar los materiales que se utilizarán en el contrato de obra, según los requisitos del proyecto.

5.6.10 Otros documentos seguimiento mensual

- *Seguimiento a la inversión del anticipo*.

Para el presente contrato no se tiene contemplado anticipo, por lo tanto, no se realiza seguimiento.

- Plan de cargas o seguimiento al plan de cargas.

A continuación, en el formato MEPI-MN1-IN-9-FR-2 PLAN CARGAS, se muestra el resumen del seguimiento al de la programación de recursos de la interventoría.

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

En el presente período, no se realizó seguimiento y verificación mensual dado que no se han iniciado actividades de obra física.

7 ANEXOS

7.1 Relación de correspondencia:

En el presente período, se realizó seguimiento y verificación mensual a :.

FECHA	REMITENTE	N° OFICIO	DESTINATARIO	ASUNTO
1/06/2024	JORGE HERNANDO FORERO FORERO	9	Doctora Nelcy Téllez Marín Alcalde Municipio de Sucre	Invitación socialización de inicio de Convenios Solidarios para el mejoramiento y mantenimiento vial de las Juntas de Acción Comunal del municipio de Sucre en el Departamento de Santander, en el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, Convenio 4490.
1/06/2024	JORGE HERNANDO FORERO FORERO	10	Doctor Herison Burgos Personero Municipio de Sucre	Invitación socialización de inicio de Convenios Solidarios para el mejoramiento y mantenimiento vial de las Juntas de Acción Comunal del municipio de Sucre en el Departamento de Santander, en el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, Convenio 4490.
1/06/2024	JORGE HERNANDO FORERO FORERO	11	Doctor Roniver Raúl Pérez Galeano Alcalde Municipio de Bolívar	Invitación socialización de inicio de Convenios Solidarios para el mejoramiento y mantenimiento vial de las Juntas de Acción Comunal del municipio de Bolívar en el Departamento de Santander, en el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, Convenio 3951.
1/06/2024	JORGE HERNANDO FORERO FORERO	12	Doctora Nubia Cruz Personería Municipio de Bolívar	Invitación socialización de inicio de Convenios Solidarios para el mejoramiento y mantenimiento vial de las Juntas de Acción Comunal del municipio de Bolívar en el Departamento de Santander, en el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, Convenio 3951.
1/06/2024	JORGE HERNANDO FORERO FORERO	13	Doctor José Joaquín Cubides Ariza Alcalde Municipio de Guavatá	Invitación socialización de inicio de Convenios Solidarios para el mejoramiento y mantenimiento vial de las Juntas de Acción Comunal del municipio de Guavatá en el Departamento de Santander, en el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, Convenios 4767 y 4478.

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 2
01/06/2024 a 30/06/2024

1/06/2024	JORGE HERNANDO FORERO FORERO	14	Doctora Daniela Bello Ariza Personera Municipio de Guavatá	Invitación socialización de inicio de Convenios Solidarios para el mejoramiento y mantenimiento vial de las Juntas de Acción Comunal del municipio de Guavatá en el Departamento de Santander, en el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, Convenios 4767 y 4478.
1/06/2024	JORGE HERNANDO FORERO FORERO	15	Doctora Deisy Yasmid Correa Jaimes Profesional Social DT Santander	Cronograma de Socialización de Programa Camino Comunitarios de la Paz de Total
1/06/2024	JORGE HERNANDO FORERO FORERO	16	Doctor Orlando Ariza Ariza Alcalde Municipio de Vélez	Invitación socialización de inicio de Convenios Solidarios para el mejoramiento y mantenimiento vial de las Juntas de Acción Comunal del municipio de Vélez en el Departamento de Santander, en el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, Convenios 4357-4565-4367-4424.
1/06/2024	JORGE HERNANDO FORERO FORERO	17	Doctor Nelson Fernando Muñoz Ayala Personero Municipio de Vélez	Invitación socialización de inicio de Convenios Solidarios para el mejoramiento y mantenimiento vial de las Juntas de Acción Comunal del municipio de Vélez en el Departamento de Santander, en el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, Convenios 4357-4565-4367-4424.
1/06/2024	JORGE HERNANDO FORERO FORERO	18	Doctor Néstor Orlando Delgado Pardo Alcalde Municipio de Florián	Invitación socialización de inicio de Convenios Solidarios para el mejoramiento y mantenimiento vial de las Juntas de Acción Comunal del municipio de Florián en el Departamento de Santander, en el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, Convenio 4267.
1/06/2024	JORGE HERNANDO FORERO FORERO	19	Doctora Yineth Narioth Tellez Perez Alcalde Municipio de la Belleza	Invitación socialización de inicio de Convenios Solidarios para el mejoramiento y mantenimiento vial de las Juntas de Acción Comunal del municipio de Guavatá en el Departamento de Santander, en el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, Convenios 3753 y 4175.
7/06/2024	JORGE HERNANDO FORERO FORERO	20	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Att: Ing. CARLOS ALBERTO PARRA SILVA. Supervisor Contrato de Interventoría	Hoja de Vida Técnico Administrativo
11/06/2024	JORGE HERNANDO FORERO FORERO	21	Señores JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAMAL Atn. VÍCTOR MANUEL GALEANO ARIZA. Representante Legal	APROBACIÓN HOJAS DE VIDA CONVENIO 3951 DE 2023

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 2
01/06/2024 a 30/06/2024

11/06/2024	JORGE HERNANDO FORERO FORERO	22	Señores JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA POPOA Atn. ADRIANA GERENA GONZALES. Representante Legal	APROBACIÓN HOJAS DE VIDA CONVENIO 4767 DE 2023
11/06/2024	JORGE HERNANDO FORERO FORERO	23	Señores JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ÓRGANOS Atn. LEIDI JOHANA CARANTON CARANTON. Representante Legal	APROBACION HOJAS DE VIDA CONVENIO 4490 DE 2023
14/06/2024	JORGE HERNANDO FORERO FORERO	24	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Att: Ing. CARLOS ALBERTO PARRA SILVA. Supervisor Contrato de Interventoría Att: Ing. PEDRO JOSÉ BARÓN Apoyo supervisión Interventoría	INFORMES SEMANALES
13/06/2024	JORGE HERNANDO FORERO FORERO	25	Señores JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUALILO Atn. YINED RODRIGUEZ TORRES Representante Legal	APROBACIÓN HOJAS DE VIDA CONVENIO 4267 DE 2023
17/06/2024	JORGE HERNANDO FORERO FORERO	26	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Att: Ing. CARLOS ALBERTO PARRA SILVA. Supervisor Contrato de Interventoría Att: Ing. PEDRO JOSÉ BARÓN Apoyo supervisión Interventoría	Póliza actualizada con orden de inicio
18/06/2024	JORGE HERNANDO FORERO FORERO	27	Señores JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TEBAIDA Atn. NESTOR ILDEFONSO FONTECHA SANDOVAL Representante Legal	APROBACIÓN HOJAS DE VIDA CONVENIO 4424 DE 2023
18/06/2024	JORGE HERNANDO FORERO FORERO	28	Señores JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CACHIPAYAL Atn. JUAN PABLO OVALLE PINEDA Representante Legal	APROBACIÓN HOJAS DE VIDA CONVENIO 4175 DE 2023

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 2
01/06/2024 a 30/06/2024

18/06/2024	JORGE HERNANDO FORERO FORERO	29	Señores JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PALMERA Atn. CARLOS AUGUSTO ARIZA SANTAMARIA Representante Legal	APROBACIÓN HOJAS DE VIDA CONVENIO 4565 DE 2023
19/06/2024	JORGE HERNANDO FORERO FORERO	30	Señores JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNIÓN Atn. YAMID ARDILA MARÍN Representante Legal	APROBACIÓN HOJAS DE VIDA CONVENIO 4478 DE 2023
19/06/2023	JORGE HERNANDO FORERO FORERO	31	Señores JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TUBAVITA Atn. GLADYS CHACON HERNANDEZ Representante Legal	APROBACIÓN HOJAS DE VIDA CONVENIO 4357 DE 2023
19/06/2023	JORGE HERNANDO FORERO FORERO	32	Señores JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLÍN Atn. CARLOS NORBEY CLAVIJO VELASCO Representante Legal	APROBACIÓN HOJAS DE VIDA CONVENIO 3753 DE 2023
20/06/2023	JORGE HERNANDO FORERO FORERO	33	Señores JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GAITAL Atn. JAIRO GONZALEZ PINZON Representante Legal	APROBACIÓN HOJAS DE VIDA CONVENIO 4367 DE 2023
20/06/2023	JORGE HERNANDO FORERO FORERO	34	Señores JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA POPOA Atn. ADRIANA GERENA GONZALES. Representante Legal	APROBACIÓN No 2 HOJAS DE VIDA CONVENIO 4767 DE 2023
20/06/2023	JORGE HERNANDO FORERO FORERO	35	Señores **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAMAL** Atn. VÍCTOR MANUEL GALEANO ARIZA Representante Legal	APROBACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS CONVENIO 3951 DE 2023
2/07/2023	JORGE HERNANDO FORERO FORERO	36	Señores **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GAITAL** Atn. JAIRO GONZALEZ PINZON Representante Legal	RECHAZO DE OFERTA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CONVENIO 4367 DE 2023
20/06/2023	JORGE HERNANDO FORERO FORERO	37	Señores **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNIÓN** Atn. YAMID ARDILA MARÍN Representante Legal	APROBACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS CONVENIO 4478 DE 2023

20/06/2023	JORGE HERNANDO FORERO FORERO	38	Señores **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA POPOA** Atn. ADRIANA GERENA GONZALEZ Representante Legal	APROBACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS CONVENIO 4767 DE 2023
20/06/2023	JORGE HERNANDO FORERO FORERO	39	Señores **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLIN** Atn. CARLOS NORBEY CLAVIJO VELASCO Representante Legal	APROBACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS CONVENIO 3753 DE 2023
20/06/2023	JORGE HERNANDO FORERO FORERO	40	Señores **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CACHIPAYAL** Atn. JUAN PABLO OVALLE PINEDA Representante Legal	APROBACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS CONVENIO 4175 DE 2023
20/06/2023	JORGE HERNANDO FORERO FORERO	41	Señores **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ÓRGANOS** Atn. LEIDY JOHANA CARANTON CARANTON Representante Legal	APROBACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS CONVENIO 4490 DE 2023
28/06/2023	JORGE HERNANDO FORERO FORERO	42	Señores **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TUBAVITA** Atn. GLADYS CHACON HERNANDEZ Representante Legal	APROBACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS CONVENIO 4357 DE 2023
26/06/2023	JORGE HERNANDO FORERO FORERO	43	Señores **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TEBAIDA** Atn. NESTOR ILDEFONSO FONTECHA SANDOVAL Representante Legal	RECHAZO DE OFERTAS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CONVENIO 4424 DE 2023
02/07/2023	JORGE HERNANDO FORERO FORERO	44	Señores **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUALILO** Atn. YINED RODRIGUEZ TORRES Representante Legal	RECHAZO DE OFERTAS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CONVENIO 4267 DE 2023
20/06/2023	JORGE HERNANDO FORERO FORERO	45	Señores **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PALMERA** Atn. CARLOS AUGUSTO ARIZA SANTAMARIA Representante Legal	APROBACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS CONVENIO 4565 DE 2023

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 2
01/06/2024 a 30/06/2024

21/06/2023	JORGE HERNANDO FORERO FORERO	46	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Att: Ing. CARLOS ALBERTO PARRA SILVA. Supervisor Contrato de Interventoría Att: Ing. PEDRO JOSÉ BARÓN Apoyo supervisión Interventoría	INFORMES SEMANALES No 4
24/06/2023	JORGE HERNANDO FORERO FORERO	47	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Att: Ing. CARLOS ALBERTO PARRA SILVA. Supervisor Contrato de Interventoría Att: Ing. PEDRO JOSÉ BARÓN Apoyo supervisión Interventoría	Solicitud aclaración forma de pago de convenios solidarios suscritos entre el INVIAS y los organismos de acción comunal.
24/06/2023	JORGE HERNANDO FORERO FORERO	48	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Att: Ing. CARLOS ALBERTO PARRA SILVA. Supervisor Contrato de Interventoría Att: Ing. PEDRO JOSÉ BARÓN Apoyo supervisión Interventoría	Solicitud aclaración zona a intervenir convenio N°4565 de 2023.
26/06/2023	JORGE HERNANDO FORERO FORERO	49	Señores JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAMAL Atn. VÍCTOR MANUEL GALEANO ARIZA Representante Legal	NOTIFICACIÓN CORREO ELECTRÓNICO PQRS
26/06/2023	JORGE HERNANDO FORERO FORERO	50	Señores JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUALILO Atn. YINED RODRIGUEZ TORRES Representante Legal	NOTIFICACIÓN CORREO ELECTRÓNICO PQRS
26/06/2023	JORGE HERNANDO FORERO FORERO	51	Señores JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNIÓN Atn. YAMID ARDILA MARÍN Representante Legal	NOTIFICACIÓN CORREO ELECTRÓNICO PQRS
26/06/2023	JORGE HERNANDO FORERO FORERO	52	Señores JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA POPOA Atn. ADRIANA GERENA GONZALEZ Representante Legal	NOTIFICACIÓN CORREO ELECTRÓNICO PQRS

26/06/2023	JORGE HERNANDO FORERO FORERO	53	Señores JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLIN Atn. CARLOS NORBEY CLAVIJO VELASCO Representante Legal	NOTIFICACIÓN CORREO ELECTRÓNICO PQRS
26/06/2023	JORGE HERNANDO FORERO FORERO	54	Señores JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CACHIPAYAL Atn. JUAN PABLO OVALLE PINEDA Representante Legal	NOTIFICACIÓN CORREO ELECTRÓNICO PQRS
26/06/2023	JORGE HERNANDO FORERO FORERO	55	Señores JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ÓRGANOS Atn. LEIDY JOHANA CARANTON CARANTON Representante Legal	NOTIFICACIÓN CORREO ELECTRÓNICO PQRS
26/06/2023	JORGE HERNANDO FORERO FORERO	56	Señores JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TUBAVITA Atn. GLADYS CHACON HERNANDEZ Representante Legal	NOTIFICACIÓN CORREO ELECTRÓNICO PQRS
26/06/2023	JORGE HERNANDO FORERO FORERO	57	Señores JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GAITAL Atn. JAIRO GONZALEZ PINZON Representante Legal	NOTIFICACIÓN CORREO ELECTRÓNICO PQRS
26/06/2023	JORGE HERNANDO FORERO FORERO	58	Señores JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TEBAIDA Atn. NESTOR ILDEFONSO FONTECHA SANDOVAL Representante Legal	NOTIFICACIÓN CORREO ELECTRÓNICO PQRS
26/06/2023	JORGE HERNANDO FORERO FORERO	59	Señores JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PALMERA Atn. CARLOS AUGUSTO ARIZA SANTAMARIA Representante Legal	NOTIFICACIÓN CORREO ELECTRÓNICO PQRS
27/06/2023	JORGE HERNANDO FORERO FORERO	60	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Att: Ing. CARLOS ALBERTO PARRA SILVA. Supervisor Contrato de Interventoría Att: Ing. PEDRO JOSÉ BARÓN Apoyo supervisión Interventoría	Certificación del PAGA a Convenios 3753 DE 2023, 3951 DE 2023, 4175 DE 2023, 4267 DE 2023, 4357 DE 2023, 4367 DE 2023, 4424 DE 2023, 4478 DE 2023, 4490 DE 2023, 4565 DE 2023, 4767 DE 2023

28/06/2023	JORGE HERNANDO FORERO FORERO	61	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Att: Ing. CARLOS ALBERTO PARRA SILVA. Supervisor Contrato de Interventoría Att: Ing. PEDRO JOSÉ BARÓN Apoyo supervisión Interventoría	INFORME SEMANAL
28/06/2023	JORGE HERNANDO FORERO FORERO	62	Señores INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Att: Ing. MARY LORENA SAYAGO BOTELLO. subdirectora de vías regionales	Hojas de Vida Residente

TABLA 17 Relación de correspondencia.
Fuente: Elaboración propia. – Terra Ingenieros Civiles S.A.S. – 2024

7.2 Bitácora del mes correspondiente.

En el presente período, no se realizó seguimiento y verificación mensual dado que no se han iniciado actividades de obra física

FORMATOS CONVENIO 3951 DE 2023 GUAMAL BOLIVAR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No.	3951 DE 2023	**Contratista:**	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAMAL
Contrato de Interventoría No.	1631 DE 2023	**Interventoría:**	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

Objeto Contrato de Obra:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUAMAL DEL MUNICIPIO BOLIVAR DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No.	2	**MES O PERIODO:**	jun-24

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		
2.1	Localización		
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		
2.4	Características técnicas del proyecto		
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		
3.1	Información general del contrato		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
5.1	Información general del contrato		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

CARLOS ALBERTO PARRA SILVA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
RESOLUCION DE DESIGANCION N°1786 DEL 23 DE MAYO DE 2024

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/6/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **PERIODO MES:** jun-24

CONTRATO DE OBRA No.: 3951 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUAMAL DEL MUNICIPIO BOLIVAR DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAMAL

PLAZO INICIAL: 10 DIAS
FECHA DE INICIO: 21/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 27/5/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 27/9/2024
PLAZO ACUMULADO: 4 30 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201.006.719,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201.006.719,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 201.006.719,00
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Placa Huella	ML	
	Mejoramiento	N/A	
	Rehabilitación	N/A	
Estructuras	Alacantarillas	UND	
	Gavión	N/A	
	Pontones	N/A	
Mantenimiento		N/A	
Otros (Especificar cuales)	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	GB	

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Placa Huella	ML	0	0
	Mejoramiento	N/A		0
	Rehabilitación	N/A		0
Estructuras	Alacantarillas	UND	0	0
	Gavión	N/A		0
	Pontones	N/A		0
Mantenimiento		N/A		0
Otros (Especificar cuales)	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	GB	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 152,242,362.00	$ 0.00	$ 152,242,362.00
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 43,197,086.00	$ 0.00	$ 43,197,086.00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4,567,271.00	$ 0.00	$ 4,567,271.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 200,006,719.00	$ 0.00	$ 200,006,719.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00
VALOR EJECUTADO	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0.00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

Indicar la localización y actividad.

Foto 2

Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

N/A

Firma

Nombre JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula
Profesional 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/6/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **SANTANDER**

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: jun-2024

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUAMAL DEL MUNICIPIO BOLIVAR DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.

CONTRATO No. 3951 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAMAL

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1631 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																													
			TOTAL ACTIVO																													
			TOTAL EN REPARACIÓN																													
			TOTAL INACTIVO																													

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	0	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Nota: Sin residente a la fecha

Firma
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Residente de Interventoría JORGE RICARDO CARDENAS GARCIA
Matrícula Profesional No.: 54202-303410 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/6/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 3951 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAMAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUAMAL DEL MUNICIPIO BOLIVAR DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

NOMBRE ARL: 0 **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** 0

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indica Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1																																										
2																																										
3																																										
4																																										
5																																										
6																																										
7																																										
8																																										
9																																										
10																																										
N																																										

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma N.A
Nombre: 0
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 0

Nota: Sin residente a la fecha

Firma
Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/6/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 3951 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAMAL

MES INFORME MENSUAL: JUNIO **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUAMAL DEL MUNICIPIO BOLIVAR DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2023	1191323	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	Nacion	Principal	$ 200,006,719
			TOTAL			$ 200,006,719

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 200,006,719.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma N.A
Nombre: 0
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 0

NOTA: SIN RESIDENTE A LA FECHA

Firma
Nombe: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/6/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 3951 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAMAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUAMAL DEL MUNICIPIO BOLIVAR DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	8	24																													
Lluvias moderadas	8	0																													
Lluvias intensas	8	0																													
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma Nota: sin residente a la fecha
Nombre: 0
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 0

Firma
Nombre: JORGE RICARDO CARDENAS GARCIA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-303410 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA 30/6/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.:	3951 DE 2023	**CONTRATISTA:**	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAMAL
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:	jun-2024	**PROYECTO:**	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUAMAL DEL MUNICIPIO BOLIVAR DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	1631 DE 2023	**INTERVENTOR:**	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma N.A
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Nota: sin residente a la fecha

Firma
Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional N 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 30/6/2024
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 3951 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAMAL

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUAMAL DEL MUNICIPIO BOLIVAR DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 21/12/2023
PLAZO INICIAL: 10 DIAS
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/9/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 201,006,719.00
VALOR ACUMULADO: $ 201,006,719.00
(Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		40.201.343,80	17/10/2023	31/10/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		10.050.335,95	17/10/2023	31/12/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		60.302.015,70	31/12/2023	31/12/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100842548
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 21/7/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Otros			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
			Día	Mes	Año			
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matricula Profesional: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

FORMATOS CONVENIO 4175 DE 2023 CACHIPAYAL LA BELLEZA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No.	4175 DE 2023	**Contratista:**	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CACHIPAYAL
Contrato de Interventoría No.	1631 DE 2023	**Interventoría:**	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

Objeto Contrato de Obra:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CACHIPAYAL DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INFORME MENSUAL No.	2	**MES O PERIODO:**	jun/2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		
2.1	Localización		
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		
2.4	Características técnicas del proyecto		
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		
3.1	Información general del contrato		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
3.3	Seguimiento Items no previstos		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
5.1	Información general del contrato		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

CARLOS ALBERTO PARRA SILVA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
RESOLUCION DE DESIGANCION N°1786 DEL 23 DE MAYO DE 2024

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/6/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** SANTANDER **PERIODO MES:** jun/2024

CONTRATO DE OBRA No.: 4175 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CACHIPAYAL DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CACHIPAYAL

PLAZO INICIAL: 58 dias
FECHA DE INICIO: 11/3/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 27/5/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 27/9/2024
PLAZO ACUMULADO: 13.80 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200,319,574.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200,319,574.00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 200,319,574.00
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Placa Huella	ML	
	Mejoramiento	N/A	
	Rehabilitación	N/A	
Estructuras	Alacantarillas	UND	
	Gavión	N/A	
	Pontones	N/A	
Mantenimiento		N/A	
Otros (Especificar cuales)	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	GB	

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Placa Huella	ML	0	0
	Mejoramiento	N/A		0
	Rehabilitación	N/A		0
Estructuras	Alacantarillas	UND	0	0
	Gavión	N/A		0
	Pontones	N/A		0
Mantenimiento		N/A		0
Otros (Especificar cuales)	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	GB	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 151,577,812.00	$ 0.00	$ 151,577,812.00
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
#¡REF!	$ 43,194,428.00	$ 0.00	$ 43,194,428.00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4,547,334.00	$ 0.00	$ 4,547,334.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199,319,574.00	$ 0.00	$ 199,319,574.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00
#¡REF!	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00
VALOR EJECUTADO	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0.00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

Indicar la localización y actividad.

Foto 2

Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

N/A

Firma

Nombre JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoria
Matricula
Profesional 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/6/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** **SANTANDER**

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: jun/2024

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CACHIPAYAL DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. 4175 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CACHIPAYAL

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1631 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																															
			TOTAL ACTIVO																															
			TOTAL EN REPARACION																															
			TOTAL INACTIVO																															

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	0	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre:
Residente de Obra Jorge Eduardo Hurtado Pedraza
Matrícula Profesional No.: 041037-0547416 BYC

Firma
Nombre:
Residente de Interventoría JORGE RICARDO CARDENAS GARCIA
Matrícula Profesional No.: 54202-303410 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/6/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 4175 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CACHIPAYAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun/2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CACHIPAYAL DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

NOMBRE ARL: 0 **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** 0

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	Jorge Eduardo Hurtado Pedraza	1.049.634.413	Ing Residente	$ 3.500.000																		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jorge Hurtado		$ 8.200	IV	NUEVA EPS	7935994831	$ 41.800	PROTECCION	7935994831	$ 53.400	X	X	X	
2																																																		
3																																																		
4																																																		
5																																																		
6																																																		
7																																																		
8																																																		
9																																																		
10																																																		
N																																																		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma N/A
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: Jorge Eduardo Hurtado Pedraza
Residente de Obra:
Matrícula Profesional No: 041037-0547416 BYC

Firma
Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

SISPRO
Sistema Integral de Información de la Protección Social

RUAF
Registro Único de Afiliados

Afiliaciones de una Persona en el Sistema

INFORMACIÓN BASICA

Fecha de Corte: 2024-08-09

Número de Identificación	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Sexo
CC 1049634413	JORGE	EDUARDO	HURTADO	PEDRAZA	M

AFILIACIÓN A SALUD

Fecha de Corte: 2024-08-09

Administradora	Régimen	Fecha Afiliacion	Estado de Afiliación	Tipo de Afiliado	Departamento -> Municipio
NUEVA EPS S.A.	Contributivo	01/07/2024	Retirado	COTIZANTE	LA BELLEZA

AFILIACIÓN A PENSIONES

Fecha de Corte: 2024-08-09

Régimen	Administradora	Fecha de Afiliación	Estado de Afiliación
PENSIONES: AHORRO INDIVIDUAL	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIA PROTECCION SA	2011-12-21	Activo no cotizante

AFILIACIÓN A RIESGOS LABORALES

Fecha de Corte: 2024-08-09

No se han reportado afiliaciones para esta persona

AFILIACIÓN A COMPENSACIÓN FAMILIAR

Fecha de Corte: 2024-08-09

Administradora CF	Fecha de Afiliación	Estado de Afiliación	Tipo de Miembro de la Población Cubierta	Tipo de Afiliado	Municipio Labora
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA COMFABOY	2011-12-01	Activo	Afiliado	Trabajador afiliado dependiente	

CONFORME CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, LAS ADMINISTRADORAS SON LAS RESPONSABLE DEL CONTENIDO Y LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN REPORTADA AL RUAF, CUALQUIER INCONSISTENCIA DEBE SER INFORMADA A LA ADMINISTRADORA RESPECTIVA, QUIEN DEBE RESOLVERLA.

Ministerio de Salud y Protección Social.
Dirección: Cra. 13 # 32 - 76. Colombia, Bogotá D.C. PBX: (57-1) 330 5000, Fax: (57-1) 330 5050.

SISPRO
Sistema Integral de Información de la Protección Social

RUAF
Registro Único de Afiliados

Afiliaciones de una Persona en el Sistema

AFILIACIÓN A CESANTIAS Fecha de Corte: 2024-08-09

No se han reportado afiliaciones para esta persona

PENSIONADOS Fecha de Corte: 2024-08-09

No se han reportado pensiones para esta persona.

VINCULACIÓN A PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL Fecha de Corte: 2024-08-09

No se han reportado vinculaciones para esta persona.

CONFORME CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, LAS ADMINISTRADORAS SON LAS RESPONSABLE DEL CONTENIDO Y LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN REPORTADA AL RUAF, CUALQUIER INCONSISTENCIA DEBE SER INFORMADA A LA ADMINISTRADORA RESPECTIVA, QUIEN DEBE RESOLVERLA.

Ministerio de Salud y Protección Social.
Dirección: Cra. 13 # 32 - 76. Colombia, Bogotá D.C. PBX: (57-1) 330 5000, Fax: (57-1) 330 5050.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1049634413
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JORGE EDUARDO HURTADO PEDRAZA
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	TRAVN 10A NO 26-77	TELÉFONO:	7455555
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7935994831**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		27			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/07/31	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		812582045

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 52.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 52.300	$ 1.100	$ 53.400
SUBTOTALES:										**$ 52.300**	**$ 1.100**	**$ 53.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 40.900	$ 0	$ 900	$ 0	$ 40.900	$ 900	$ 0	$ 41.800
SUBTOTALES:													**$ 40.900**	**$ 900**	**$ 0**	**$ 41.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 8.000	$ 8.000	$ 200	$ 0	$ 8.200
SUBTOTALES:									**$ 8.000**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 8.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP												
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																																																			ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1049634413	HURTADO PEDRAZA JORGE EDUARDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.400.000				NO	24																230201-PROTECCION	7	$ 326.667	$ 52.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 52.300	NUEVA EPS CM	7	$ 326.667	$ 40.900	$ 0	$ 40.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	7	$ 326.667	104963441	$ 8.000		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 103.400**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/6/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCION TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 4175 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CACHIPAYAL

MES INFORME MENSUAL: JUNIO

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CACHIPAYAL DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1631 DE 2023

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2023	1253123	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	Nacion	Principal	$ 199,319,574
			TOTAL			$ 199,319,574

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 199,319,574.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma N.A
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: Jorge Eduardo Hurtado Pedraza
ResidentedeObra:
MatriculaProfesional No: 041037-0547416 BYC

Firma
Nombe: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/6/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 4175 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CACHIPAYAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun/2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CACHIPAYAL DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	8	24																													
Lluvias moderadas	8	0																													
Lluvias intensas	8	0																													
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NUMERO DE HORAS POR DIA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DIA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: Jorge Eduardo Hurtado Pedraza
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 041037-0547416 BYC

Firma
Nombre: JORGE RICARDO CARDENAS GARCIA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-303410 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA 30/6/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.:	4175 DE 2023	**CONTRATISTA:**	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CACHIPAYAL
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:	jun/2024	**PROYECTO:**	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CACHIPAYAL DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	1631 DE 2023	**INTERVENTOR:**	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORIA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma N.A
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: Jorge Eduardo Hurtado Pedraza
Residente de Obra:
MatriculaProfesional No: 041037-0547416 BYC

Firma
Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional N 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 30/6/2024
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 4175 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CACHIPAYAL

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CACHIPAYAL DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 11/3/2023
PLAZO INICIAL: 58 dias
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/9/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 200,319,574.00
VALOR ACUMULADO: $ 200,319,574.00
(Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		40.063.915,00	3/11/2023	31/10/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		10.015.979,00	3/11/2023	31/12/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		60.095.873,00	31/12/2023	31/12/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3001983
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: LA PREVISORA S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 18/9/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde Día	Desde Mes	Desde Año	VIGENCIA Hasta Día	Hasta Mes	Hasta Año
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)								
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matricula Profesional: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

FORMATOS CONVENIO 4267 DE 2023 GUALILO FLORIAN

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No.	4267 DE 2023	**Contratista:**	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUALILO
Contrato de Interventoría No.	1631 DE 2023	**Interventoría:**	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

Objeto Contrato de Obra:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL GUALILO DEL MUNICIPIO FLORIAN DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No.		2		**MES O PERIODO:**	jun-24	

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		
2.1	Localización		
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		
2.4	Características técnicas del proyecto		
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		
3.1	Información general del contrato		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
5.1	Información general del contrato		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

CARLOS ALBERTO PARRA SILVA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
RESOLUCION DE DESIGANCION N°1786 DEL 23 DE MAYO DE 2024

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **PERIODO MES:** Jun-24

CONTRATO DE OBRA No.: 4267 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL GUALILO DEL MUNICIPIO FLORIAN DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUALILO

PLAZO INICIAL: 57 DIAS
FECHA DE INICIO: 21/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 21/04/2024
FECHA DE REANUDACIÓN: 27/05/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 17/09/2024
PLAZO ACUMULADO: 7,83 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200.963.321,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200.963.321,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 200.963.321,00
ANTICIPO AMORTIZADO: $

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Placa Huella	ML	
	Mejoramiento	N/A	
	Rehabilitación	N/A	
Estructuras	Alacantarillas	UND	
	Gavión	N/A	
	Pontones	N/A	
Mantenimiento		N/A	
Otros (Especificar cuales)	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	GB	

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Placa Huella	ML	0	0
	Mejoramiento	N/A		0
	Rehabilitación	N/A		0
Estructuras	Alacantarillas	UND	0	0
	Gavión	N/A		0
	Pontones	N/A		0
Mantenimiento		N/A		0
Otros (Especificar cuales)	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	GB	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 416.558.870,00	$ 0,00	$ 416.558.870,00
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 49.007.685,00	$ 0,00	$ 49.007.685,00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.396.766,00	$ 0,00	$ 4.396.766,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 469.963.321,00	$ 0,00	$ 469.963.321,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 0,00	$ 0,00	0,00	0,00
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 0,00	$ 0,00	0,00	0,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 0,00	$ 0,00	0,00	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 2.100.000,00	$ 0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 0,00	$ 0,00	0,00	0,00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 0,00	$ 0,00	0,00	0,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ 0,00	$ 0,00	0,00	0,00
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	$ 0,00	$ 0,00	0,00	0,00
VALOR EJECUTADO	$ 0,00	$ 0,00	0,00	0,00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 2.100.000,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 2.100.000,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 1,04%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 1
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

Indicar la localización y actividad.

Foto 2

Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

N/A

Firma

Nombre JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula
Profesional 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **SANTANDER**

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: jun-2024

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL GUALILO DEL MUNICIPIO FLORIAN DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.

CONTRATO No. 4267 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUALILO

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1631 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																														
			TOTAL ACTIVO																														
			TOTAL EN REPARACIÓN																														
			TOTAL INACTIVO																														

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	0	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre:
Residente de Obra Edwar Fajardo
Matrícula Profesional No.: 68202208886STD

Firma

Nombre:
Residente de Interventoría JORGE RICARDO CARDENAS GARCIA
Matrícula Profesional No.: 54202-303410 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 4267 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUALILO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 30/06/2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL GUALILO DEL MUNICIPIO FLORIAN DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

NOMBRE ARL: 0 **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** 0

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	Edwar Alfonso Fajardo Delgado	1.095.484.536	Residente de Obra	$ 3.500.000													X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Edwar Fajardo		$ 32.200	IV	Nueva eps	9470762506	165.100	PORVENIR	9470762506	$ 211.000	X	X	X	
2																																												
3																																												
4																																												
5																																												
6																																												
7																																												
8																																												
9																																												
10																																												
N																																												

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha . . . . . a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

N.A
Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 0

Firma
Nombre: Edwar Fajardo
Residente de Obra:
Matrícula Profesional No: 68202208886STD

Firma
Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

SISPRO
Sistema Integral de Información de la Protección Social

RUAF
Registro Único de Afiliados

Afiliaciones de una Persona en el Sistema

INFORMACIÓN BASICA

Fecha de Corte: 2024-08-09

Número de Identificación	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Sexo
CC 1095484536	EDWAR	ALFONSO	FAJARDO	DELGADO	M

AFILIACIÓN A SALUD

Fecha de Corte: 2024-08-09

Administradora	Régimen	Fecha Afiliacion	Estado de Afiliación	Tipo de Afiliado	Departamento -> Municipio
NUEVA EPS S.A.	Contributivo	31/12/2023	Retirado	COTIZANTE	BUCARAMANGA

AFILIACIÓN A PENSIONES

Fecha de Corte: 2024-08-09

Régimen	Administradora	Fecha de Afiliación	Estado de Afiliación
PENSIONES: AHORRO INDIVIDUAL	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR SA	2011-05-18	Inactivo

AFILIACIÓN A RIESGOS LABORALES

Fecha de Corte: 2024-08-09

Administradora	Fecha de Afiliación	Estado de Afiliación	Actividad Economica	Municipio Labora
Seguros de Vida Suramericana	2024-05-12	Activa		Santander- CHARALÁ

AFILIACIÓN A COMPENSACIÓN FAMILIAR

Fecha de Corte: 2024-08-09

Administradora CF	Fecha de Afiliación	Estado de Afiliación	Tipo de Miembro de la Población Cubierta	Tipo de Afiliado	Municipio Labora
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	2024-07-29	Activo	Afiliado	Trabajador afiliado dependiente	

CONFORME CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, LAS ADMINISTRADORAS SON LAS RESPONSABLE DEL CONTENIDO Y LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN REPORTADA AL RUAF, CUALQUIER INCONSISTENCIA DEBE SER INFORMADA A LA ADMINISTRADORA RESPECTIVA, QUIEN DEBE RESOLVERLA.

Ministerio de Salud y Protección Social.
Dirección: Cra. 13 # 32 - 76. Colombia, Bogotá D.C. PBX: (57-1) 330 5000, Fax: (57-1) 330 5050.

SISPRO
Sistema Integral de Información de la Protección Social

RUAF
Registro Único de Afiliados

Salud

Afiliaciones de una Persona en el Sistema

AFILIACIÓN A CESANTIAS

Fecha de Corte: 2024-08-09

No se han reportado afiliaciones para esta persona

PENSIONADOS

Fecha de Corte: 2024-08-09

No se han reportado pensiones para esta persona.

VINCULACIÓN A PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL

Fecha de Corte: 2024-08-09

No se han reportado vinculaciones para esta persona.

CONFORME CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, LAS ADMINISTRADORAS SON LAS RESPONSABLE DEL CONTENIDO Y LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN REPORTADA AL RUAF, CUALQUIER INCONSISTENCIA DEBE SER INFORMADA A LA ADMINISTRADORA RESPECTIVA, QUIEN DEBE RESOLVERLA.

Ministerio de Salud y Protección Social.
Dirección: Cra. 13 # 32 - 76. Colombia, Bogotá D.C. PBX: (57-1) 330 5000, Fax: (57-1) 330 5050.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1095484536		FAJARDO DELGADO EDWAR ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 110 No 22-24 APT 102	BUCARAMANGA-SANTANDER	6347375	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	25138011	9470762506	I	2024/07/10	2024/07/31	BANCO DE OCCIDENTE	21	$408,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1095484536	FAJARDO DELGADO EDWAR ALFONSO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$31,700	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			**$1,300,000**	**$208,000**			**$1,300,000**	**$162,500**			**$0**	**$0**			**$1,300,000**	**$31,700**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$3,300	$0	$211,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$3,300	$0	$211,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,700	$500	$0	$32,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$31,700	$500	$0	$32,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$2,600	$0	$165,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$2,600	$0	$165,100
TOTAL				**1**	**$402,200**	**$6,400**	**$0**	**$408,600**

2024/08/05 05:14 PM

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 4267 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUALILO

MES INFORME MENSUAL: JUNIO

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL GUALILO DEL MUNICIPIO FLORIAN DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1631 DE 2023

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2023	1390123	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	Nacion	Principal	$ 199.963.321
TOTAL						$ 199.963.321

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 199.963.321,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma: N.A
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: Edwar Fajardo
Residente de Obra:
Matricula Profesional No: 6820220886STD

Firma
Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 4267 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUALILO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL GUALILO DEL MUNICIPIO FLORIAN DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																													
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	8	0															6	8	4	8	9	14	14	16	12	8	10	12	10	10		
Lluvias moderadas	8	0															15	13	12	9	12	10	5	8	12	7	10	6	14	10		
Lluvias intensas	8	0															4	3	8	7	3	0	5	0	0	9	4	6	0	4		
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: Edwar Fajardo
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 68202208886STD

Firma
Nombre: JORGE RICARDO CARDENAS GARCIA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-303410 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.:	4267 DE 2023	**CONTRATISTA:**	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUALILO
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:	jun-2024	**PROYECTO:**	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL GUALILO DEL MUNICIPIO FLORIAN DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	1631 DE 2023	**INTERVENTOR:**	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma N.A
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: Edwar Fajardo
Residente de Obra:
Matricula Profesional No: 68202208886STD

Firma
Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional N25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 30/06/2024
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 4267 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUALILO

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL GUALILO DEL MUNICIPIO FLORIAN DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 21/12/2023

PLAZO INICIAL: 57 DIAS

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 17/09/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200.963.321,00

VALOR ACUMULADO: $ 200.963.321,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		40.192.664,20	29/11/2023	31/10/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		10.048.166,05	29/11/2023	31/12/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		60.288.996,30	31/12/2023	31/12/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100316381

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 27/10/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde Día	Desde Mes	Desde Año	VIGENCIA Hasta Día	Hasta Mes	Hasta Año
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)								
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
			Día	Mes	Año			
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO

Director de Interventoría

Matricula Profesional: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

FORMATOS CONVENIO 4367 DE 2023 GAITAL VELEZ

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No.	4367 DE 2023	**Contratista:**	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GAITAL
Contrato de Interventoría No.	1631 DE 2023	**Interventoría:**	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S


Objeto Contrato de Obra:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL GAITAL DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No.	2		**MES O PERIODO:**	jun-24	

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		
2.1	Localización		
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		
2.4	Características técnicas del proyecto		
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		
3.1	Información general del contrato		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1 MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1 MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
5.1	Información general del contrato		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1 MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: 

CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

RESOLUCION DE DESIGANCION N°1786 DEL 23 DE MAYO DE 2024

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/6/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** SANTANDER **PERIODO MES:** JUNIO

CONTRATO DE OBRA No.: 4367 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL GAITAL DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GAITAL

PLAZO INICIAL: 47 DIAS
FECHA DE INICIO: 15/11/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 27/5/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 27/9/2024
PLAZO ACUMULADO: 5.50 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201,016,649.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201,016,649.00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 201,016,649.00
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:** CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Placa Huella	ML	
	Mejoramiento	N/A	
	Rehabilitación	N/A	
Estructuras	Alacantarillas	UND	
	Gavión	N/A	
	Pontones	N/A	
Mantenimiento		N/A	
Otros (Especificar cuales)	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	GB	

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Placa Huella	ML	0	0
	Mejoramiento	N/A		0
	Rehabilitación	N/A		0
Estructuras	Alacantarillas	UND	0	0
	Gavión	N/A		0
	Pontones	N/A		0
Mantenimiento		N/A		0
Otros (Especificar cuales)	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	GB	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 146,610,444.00	$ 0.00	$ 146,610,444.00
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
#¡REF!	$ 49,007,892.00	$ 0.00	$ 49,007,892.00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4,398,313.00	$ 0.00	$ 4,398,313.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 200,016,649.00	$ 0.00	$ 200,016,649.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00
#¡REF!	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00
VALOR EJECUTADO	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0.00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

Indicar la localización y actividad.

Foto 2

Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

N/A

Firma

Nombre JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula
Profesional 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/6/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **SANTANDER**

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: JUNIO

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL GAITAL DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO No. 4367 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GAITAL

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1631 DE 2023

INTERVENTORÍA: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																	
TOTAL ACTIVO																																	
TOTAL EN REPARACION																																	
TOTAL INACTIVO																																	

RESUMEN PERIODO / MES	**No.**	**%**
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	0	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: Gustavo Vargas
Residente de Obra Matrícula
Profesional No.: 25202-422699 CND

Firma

Nombre:
Residente de Interventoría JORGE RICARDO CARDENAS GARCIA
Matrícula Profesional No.: 54202-303410 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/6/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 4367 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GAITAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 30/6/2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL GAITAL DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

NOMBRE ARL: 0 **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** 0

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	Gustavo Andres Vargas Gamboa	1.101.752.990	Residente de Obra																					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Gustavo Vargas		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2																																																	No se realizo pago por el contratista de planillas de seguridad
3																																																	
4																																																	
5																																																	
6																																																	
7																																																	
8																																																	
9																																																	
10																																																	
N																																																	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma N.A
Nombre: 0
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: Gustavo Vargas
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-422699 CND

Firma
Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

SISPRO
Sistema Integral de Información de la Protección Social

RUAF
Registro Único de Afiliados

Afiliaciones de una Persona en el Sistema

INFORMACIÓN BASICA

Fecha de Corte: 2024-08-09

Número de Identificación	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Sexo
CC 1101752990	GUSTAVO	ANDRES	VARGAS	GAMBOA	M

AFILIACIÓN A SALUD

Fecha de Corte: 2024-08-09

Administradora	Régimen	Fecha Afiliacion	Estado de Afiliación	Tipo de Afiliado	Departamento -> Municipio
CAJA DE COMPENSACIàN FAMILIAR COMPENSAR	Contributivo	01/06/2016	Activo	COTIZANTE	BOGOTA D.C.

AFILIACIÓN A PENSIONES

Fecha de Corte: 2024-08-09

Régimen	Administradora	Fecha de Afiliación	Estado de Afiliación
PENSIONES: AHORRO INDIVIDUAL	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIA PROTECCION SA	2011-05-17	Activo cotizante

AFILIACIÓN A RIESGOS LABORALES

Fecha de Corte: 2024-08-09

Administradora	Fecha de Afiliación	Estado de Afiliación	Actividad Economica	Municipio Labora
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	2014-11-29	Activa	EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE ASESORAMIENTO TECNICO INCLUYE SOLAMENTE EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN, DIRECCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y AGRIMESURA, EXPLOTACIÓN Y PROSPECCIÓN GEOLOGICAS, ASESORAMIENTO TÉCNICO CONEXO INCLUYE SOLAMENTE A EMPRESAS DEDICADAS A DISEÑO INDUSTRIAL Y DEMÁQUINAS CON INTERVENCIÓN DIRECTA EN LA OBRA	Bogotá, D.C.- BOGOTÁ

CONFORME CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, LAS ADMINISTRADORAS SON LAS RESPONSABLE DEL CONTENIDO Y LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN REPORTADA AL RUAF, CUALQUIER INCONSISTENCIA DEBE SER INFORMADA A LA ADMINISTRADORA RESPECTIVA, QUIEN DEBE RESOLVERLA.

Ministerio de Salud y Protección Social.
Dirección: Cra. 13 # 32 - 76. Colombia, Bogotá D.C. PBX: (57-1) 330 5000, Fax: (57-1) 330 5050.

Afiliaciones de una Persona en el Sistema

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	2024-07-06	Activa		Bogotá, D.C.- BOGOTÁ
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	2024-07-24	Activa		Bogotá, D.C.- BOGOTÁ

AFILIACIÓN A COMPENSACIÓN FAMILIAR

Fecha de Corte: 2024-08-09

Administradora CF	Fecha de Afiliación	Estado de Afiliación	Tipo de Miembro de la Población Cubierta	Tipo de Afiliado	Municipio Labora
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	2012-07-30	Activo	Cónyuge o Compañero (a) permanente		Bogotá, D.C.- BOGOTÁ

AFILIACIÓN A CESANTIAS

Fecha de Corte: 2024-08-09

No se han reportado afiliaciones para esta persona

PENSIONADOS

Fecha de Corte: 2024-08-09

No se han reportado pensiones para esta persona.

VINCULACIÓN A PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL

Fecha de Corte: 2024-08-09

No se han reportado vinculaciones para esta persona.

CONFORME CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, LAS ADMINISTRADORAS SON LAS RESPONSABLE DEL CONTENIDO Y LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN REPORTADA AL RUAF, CUALQUIER INCONSISTENCIA DEBE SER INFORMADA A LA ADMINISTRADORA RESPECTIVA, QUIEN DEBE RESOLVERLA.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/6/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 4367 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GAITAL

MES INFORME MENSUAL: JUNIO **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL GAITAL DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2023	1297823	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	Nacion	Principal	$ 200,016,649
			TOTAL			$ 200,016,649

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 200,016,649.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			


***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma N.A
Nombre: 0
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 0



Firma
Nombre: Gustavo Vargas
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-422699 CND



Firma
Nombe: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/6/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 4367 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GAITAL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 30/6/2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL GAITAL DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	8	24																													
Lluvias moderadas	8	0																													
Lluvias intensas	8	0																													
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NUMERO DE HORAS POR DIA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DIA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: Gustavo Vargas
Residente de Obra Matrícula
Profesional No.: 25202-422699 CND

Firma
Nombre: JORGE RICARDO CARDENAS GARCIA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-303410 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA 30/6/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.:	4367 DE 2023	**CONTRATISTA:**	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GAITAL
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:	30/6/2024	**PROYECTO:**	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL GAITAL DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	1631 DE 2023	**INTERVENTOR:**	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORIA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma N.A
Nombre:
Director de Obra Nombre:
Matrícula Profesional No.:

Firma 
Nombre: Gustavo Vargas
ResidentedeObra
MatrículaProfesional No.: 25202-422699 CND

Firma 
Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional N 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 30/6/2024
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 4367 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GAITAL

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL GAITAL DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 15/11/2023
PLAZO INICIAL: 47 DIAS
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/9/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 201,016,649.00
VALOR ACUMULADO: $ 201,016,649.00
(Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		40.203.330,00	14/11/2023	31/10/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		10.050.883,00	14/11/2023	31/12/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		60.304.995,00	31/12/2023	31/12/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3001991
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: LA PREVISORA S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 27/9/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde Día	Desde Mes	Desde Año	VIGENCIA Hasta Día	Hasta Mes	Hasta Año
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)								
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matricula Profesional: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

FORMATOS CONVENIO 4424 DE 2023 TEBAIDA VELEZ

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No.	4424 DE 2023	**Contratista:**	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TEBAIDA
Contrato de Interventoría No.	1631 DE 2023	**Interventoría:**	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S


Objeto Contrato de Obra:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE TEBAIDA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No.		2		**MES O PERIODO:**	jun-24	

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		
2.1	Localización		
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		
2.4	Características técnicas del proyecto		
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		
3.1	Información general del contrato		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1 MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1 MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
5.1	Información general del contrato		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1 MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: 

CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

RESOLUCION DE DESIGANCION N°1786 DEL 23 DE MAYO DE 2024

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/6/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **PERIODO MES:** jun-24

CONTRATO DE OBRA No.: 4424 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE TEBAIDA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TEBAIDA

PLAZO INICIAL: 46 DIAS
FECHA DE INICIO: 16/11/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 27/5/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 27/8/2024
PLAZO ACUMULADO: 5.47 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200,996,240.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200,996,240.00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 200,996,240.00
ANTICIPO AMORTIZADO: $

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Placa Huella	ML	115
	Mejoramiento	N/A	
	Rehabilitación	N/A	
Estructuras	Alacantarillas	UND	2
	Gavión	N/A	
	Pontones	N/A	
Mantenimiento		N/A	
Otros (Especificar cuales)	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	GB	

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Placa Huella	ML	0	0
	Mejoramiento	N/A		0
	Rehabilitación	N/A		0
Estructuras	Alacantarillas	UND	0	0
	Gavión	N/A		0
	Pontones	N/A		0
Mantenimiento		N/A		0
Otros (Especificar cuales)	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	GB	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 146,590,706.00	$ 0.00	$ 146,590,706.00
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 49,007,813.00	$ 0.00	$ 49,007,813.00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4,397,721.00	$ 0.00	$ 4,397,721.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199,996,240.00	$ 0.00	$ 199,996,240.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 1,456,000.00	$ 0.00	1,456,000.00	1,456,000.00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00
VALOR EJECUTADO	$ 1,456,000.00	$ 0.00	1,456,000.00	1,456,000.00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0.00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

Indicar la localización y actividad.

Foto 2

Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

N/A

Firma

Nombre JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula
Profesional 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/6/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **SANTANDER**

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: jun-2024

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE TEBAIDA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO No. 4424 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TEBAIDA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1631 DE 2023

INTERVENTORÍA: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**#**
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																															
			TOTAL ACTIVO																															
			TOTAL EN REPARACIÓN																															
			TOTAL INACTIVO																															

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	0	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): Para el periodo de este informe 2 el contratista se encuentra realizando vinculacion de personal, revision y/o ajustes a diseños y ajuste de presupuesto del convenio

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.



Firma

Nombre: MIGUEL ANGEL MASMELA ZAPATA
Residente de Obra:
Matrícula Profesional No.: 68202165983 STD

Firma

Nombre:
Residente de Interventoría JORGE RICARDO CARDENAS GARCIA
Matrícula Profesional No.: 54202-303410 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 30/6/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 4424 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TEBAIDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE TEBAIDA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

NOMBRE ARL: 0 **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** 0

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	MIGUEL ANGEL MASMELA	13542131	RESIDENTE	$ 3,500,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MIGUEL ANGEL MASMELA	$ 1,656,800.00			SURA	9467527386	$ 207,100	PROTECCION	9467527386	$ 265,100	$ -	$ -	$ -	INDEPENDIENTE
2	YANETH GONZALEZ	63436292	CONTADOR	$ 2,800,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	YANETH GONZALEZ	$ 1,300,000.00			NUEVA EPS	29808784	$ 162,500	PORVENIR	29808784	$ 208,000	$ -	$ -	$ -	INDEPENDIENTE
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
N																			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma N.A
Nombre: NA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: NA

Firma MIGUEL ANGEL MASMELA ZAPATA C.C. 13.542.131 de Bucaramanga
Nombre: MIGUEL ANGEL MASMELA ZAPATA
Residente de Obra:
Matrícula Profesional No.: 68202165983 STD

Firma
Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

SISPRO
Sistema Integral de Información de la Protección Social

RUAF
Registro Único de Afiliados

Afiliaciones de una Persona en el Sistema

INFORMACIÓN BASICA

Fecha de Corte: 2024-08-09

Número de Identificación	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Sexo
CC 13542131	MIGUEL	ANGEL	MASMELA	ZAPATA	M

AFILIACIÓN A SALUD

Fecha de Corte: 2024-08-09

Administradora	Régimen	Fecha Afiliacion	Estado de Afiliación	Tipo de Afiliado	Departamento -> Municipio
EPS SURAMERICANA S.A.	Contributivo	31/01/2024	Activo	COTIZANTE	TUNJA

AFILIACIÓN A PENSIONES

Fecha de Corte: 2024-08-09

Régimen	Administradora	Fecha de Afiliación	Estado de Afiliación
PENSIONES: AHORRO INDIVIDUAL	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIA PROTECCION SA	2003-05-01	Activo cotizante

AFILIACIÓN A RIESGOS LABORALES

Fecha de Corte: 2024-08-09

Administradora	Fecha de Afiliación	Estado de Afiliación	Actividad Economica	Municipio Labora
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	2020-03-20	Activa	FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL INCLUYE SOLAMENTE A EMPRESAS DEDICADAS A LA FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS EN HIERRO	Bogotá, D.C.- BOGOTÁ
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	2024-02-01	Activa		Bogotá, D.C.- BOGOTÁ
Seguros de Vida Suramericana	2024-07-30	Activa		Bogotá, D.C.- BOGOTÁ

AFILIACIÓN A COMPENSACIÓN FAMILIAR

Fecha de Corte: 2024-08-09

CONFORME CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, LAS ADMINISTRADORAS SON LAS RESPONSABLE DEL CONTENIDO Y LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN REPORTADA AL RUAF, CUALQUIER INCONSISTENCIA DEBE SER INFORMADA A LA ADMINISTRADORA RESPECTIVA, QUIEN DEBE RESOLVERLA.

Ministerio de Salud y Protección Social.
Dirección: Cra. 13 # 32 - 76. Colombia, Bogotá D.C. PBX: (57-1) 330 5000, Fax: (57-1) 330 5050.

SISPRO
Sistema Integral de Información de la Protección Social

RUAF
Registro Único de Afiliados

Afiliaciones de una Persona en el Sistema

Administradora CF	Fecha de Afiliación	Estado de Afiliación	Tipo de Miembro de la Población Cubierta	Tipo de Afiliado	Municipio Labora
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA	2020-07-15	Activo	Afiliado	Trabajador afiliado dependiente	
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	2015-09-04	Activo	Afiliado	Trabajador afiliado dependiente	

AFILIACIÓN A CESANTIAS

Fecha de Corte: 2024-08-09

Régimen	Administradora	Fecha de Afiliación	Estado de Afiliación	Municipio Labora
CESANTÍAS: ESPECIAL	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIA PROTECCION SA	2018-02-13	VIGENTE	Bogotá, D.C.- BOGOTÁ
CESANTÍAS: ESPECIAL	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIA PROTECCION SA	2021-02-18	VIGENTE	Bogotá, D.C.- BOGOTÁ

PENSIONADOS

Fecha de Corte: 2024-08-09

No se han reportado pensiones para esta persona.

VINCULACIÓN A PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL

Fecha de Corte: 2024-08-09

No se han reportado vinculaciones para esta persona.

CONFORME CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, LAS ADMINISTRADORAS SON LAS RESPONSABLE DEL CONTENIDO Y LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN REPORTADA AL RUAF, CUALQUIER INCONSISTENCIA DEBE SER INFORMADA A LA ADMINISTRADORA RESPECTIVA, QUIEN DEBE RESOLVERLA.

Ministerio de Salud y Protección Social.
Dirección: Cra. 13 # 32 - 76. Colombia, Bogotá D.C. PBX: (57-1) 330 5000, Fax: (57-1) 330 5050.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13542131		MASMELA ZAPATA MIGUEL ANGEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 77 SUR 35 A 71	MEDELLIN-ANTIOQUIA	2087997	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	49247686	9468969154	I	2024/07/09	2024/07/10	BANCO DE OCCIDENTE	1	$472,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,656,800	$265,100			$1,656,800	$207,100			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,656,800	$265,100			$1,656,800	$207,100			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					$1,656,800	$265,100			$1,656,800	$207,100			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	13542131	MASMELA MIGUEL	230201	30	$1,656,800	$265,100	EPS010	30	$1,656,800	$207,100		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,656,800	$265,100			$1,656,800	$207,100			$0	$0			$0	$0		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13542131		MASMELA ZAPATA MIGUEL ANGEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 77 SUR 35 A 71	MEDELLIN-ANTIOQUIA	2087997	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	49247686	9468969154	I	2024/07/09	2024/07/10	BANCO DE OCCIDENTE	1	$472,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$265,100	$200	$0	$265,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$265,100	$200	$0	$265,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$207,100	$200	$0	$207,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$207,100	$200	$0	$207,300
TOTAL				**1**	**$472,200**	**$400**	**$0**	**$472,600**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/6/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 4424 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TEBAIDA

MES INFORME MENSUAL: JUNIO **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE TEBAIDA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2023	1297023	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	Nacion	Principal	$ 199,996,240
				TOTAL		$ 199,996,240

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 199,996,240.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: NA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:



Firma
Nombre: MIGUEL ANGEL MASMELA ZAPATA
Residente de Obra:
Matrícula Profesional No.: 68202165983 STD



Firma
Nombe: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/6/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 4424 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TEBAIDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE TEBAIDA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	8	24	12	12	12	12	12	8	24	12	12	12	12	12	8	24	12	12	12	12	12	8	24	12	12	12	12	12	8	24		400
Lluvias moderadas	8	0	8	8	8	8	8	8	0	8	8	8	8	8	8	0	8	8	8	8	8	8	0	8	8	8	8	8	8	0		200
Lluvias intensas	8	0	4	4	4	4	4	8	0	4	4	4	4	4	8	0	4	4	4	4	4	8	0	4	4	4	4	4	8	0		120
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
MIGUEL ANGEL MASMELA ZAPATA
C.C. 13.542.131 de Bucaramanga
Nombre: MIGUEL ANGEL MASMELA ZAPATA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 68202165983 STD

Firma
Nombre: JORGE RICARDO CARDENAS GARCIA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-303410 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 30/6/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.:	4424 DE 2023	**CONTRATISTA:**	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TEBAIDA
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:	jun-2024	**PROYECTO:**	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE TEBAIDA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	1631 DE 2023	**INTERVENTOR:**	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NO SE REALIZAN ENSAYOS DE LABORATORIO PARA ESTE PERIODO DE INFORME

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma N.A
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:



Firma
Nombre: MIGUEL ANGEL MASMELA ZAPATA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 68202165983 STD

Firma
Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional N25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 30/6/2024
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 4424 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TEBAIDA

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE TEBAIDA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 16/11/2023
PLAZO INICIAL: 46 DIAS
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/9/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 200,996,240.00
VALOR ACUMULADO: $ 200,996,240.00
(Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		40.199.248,00	15/11/2023	31/10/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		10.049.812,00	15/11/2023	31/12/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		60.298.872,00	31/12/2023	31/12/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3001993
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: LA PREVISORA S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 27/9/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232,000,000.00	15	11	2023	31	12	2023
Otros	20	$ 40,199,248.00	15	11	2023	31	10	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 1014745 **OTRAS PÓLIZAS No.** 3001993
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: PREVISORA SEGUROS
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matricula Profesional: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

FORMATOS
CONVENIO 4478
DE 2023 GUAVATA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No.	4478 DE 2023	**Contratista:**	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNION
Contrato de Interventoría No.	1631 DE 2023	**Interventoría:**	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S


Objeto Contrato de Obra:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA UNION DEL MUNICIPIO DE GUAVATA SANTANDER EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No.		2		**MES O PERIODO:**	jun-2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		
2.1	Localización		
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		
2.4	Características técnicas del proyecto		
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		
3.1	Información general del contrato		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1 MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1 MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
5.1	Información general del contrato		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1 MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: 

CARLOS ALBERTO PARRA SILVA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
RESOLUCION DE DESIGANCION N°1786 DEL 23 DE MAYO DE 2024

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/6/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **PERIODO MES:** jun-2024

CONTRATO DE OBRA No.: 4478 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA UNION DEL MUNICIPIO DE GUAVATA -SANTANDER EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNION

PLAZO INICIAL:
FECHA DE INICIO: 17/11/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 27/5/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 27/9/2024
PLAZO ACUMULADO: 5.43 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200,981,336.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200,981,336.00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 200,981,336.00
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Placa Huella	ML	
	Mejoramiento	N/A	
	Rehabilitación	N/A	
Estructuras	Alacantarillas	UND	
	Gavión	N/A	
	Pontones	N/A	
Mantenimiento		N/A	
Otros (Especificar cuales)	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	GB	

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Placa Huella	ML	0	0
	Mejoramiento	N/A		0
	Rehabilitación	N/A		0
Estructuras	Alacantarillas	UND	0	0
	Gavión	N/A		0
	Pontones	N/A		0
Mantenimiento		N/A		0
Otros (Especificar cuales)	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	GB	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 146,623,790.00	$ 0.00	$ 146,623,790.00
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 49,007,945.00	$ 0.00	$ 49,007,945.00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4,398,714.00	$ 0.00	$ 4,398,714.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 200,981,336.00	$ 0.00	$ 200,981,336.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 2.905.000.00	$ 0.00	2.905.000.00	2.905.000.00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00
VALOR EJECUTADO	$ 2.905.000.00	$ 0.00	2.905.000.00	2.905.000.00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0.00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Comité con Contadora y Residente de obra temas varios de ejecución / Comité semanal por medio virtual con interventoría

Foto 2

Sitio de obra Vereda La Union - Seguimiento a elaboración de estudios y diseños base

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

N/A

Firma
Nombre JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula
Profesional 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/6/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **SANTANDER**

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: jun-2024

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA UNION DEL MUNICIPIO DE GUAVATA -SANTANDER EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO No. 4478 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNION

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1631 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																														
			TOTAL ACTIVO																														
			TOTAL EN REPARACIÓN																														
			TOTAL INACTIVO																														

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	0	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligació
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: JEISON LEANDRO CAMACHO AVILA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 01122-11237 CPITVC

Firma

Nombre:
Residente de Interventoría JORGE RICARDO CARDENAS GARCIA
Matrícula Profesional No.: 54202-303410 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/6/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 4478 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNION

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA UNIO DEL MUNICIPIO DE GUAVATA-SANTANDER EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

NOMBRE ARL: 0 **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** 0

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	JEISON LEANDRO CAMACHO	1.054.682.134	Residente de Obra	$ 3.500.000																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jeison Camacho			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	No se realizo pago por el contratista de la planilla de seguridad
2																																																
3																																																
4																																																
5																																																
6																																																
7																																																
8																																																
9																																																
10																																																
N																																																

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: NA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: NA

Firma
Nombre: JEISON LEANDRO CAMACHO AVILA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 01122-11237 CPITVC

Firma
Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

SISPRO
Sistema Integral de Información de la Protección Social

RUAF
Registro Único de Afiliados

Afiliaciones de una Persona en el Sistema

INFORMACIÓN BASICA

Fecha de Corte: 2024-08-09

Número de Identificación	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Sexo
CC 1054682134	JEISON	LEANDRO	CAMACHO	AVILA	M

AFILIACIÓN A SALUD

Fecha de Corte: 2024-08-09

Administradora	Régimen	Fecha Afiliacion	Estado de Afiliación	Tipo de Afiliado	Departamento -> Municipio
COOSALUD EPS S.A. -CM	Contributivo	15/10/2023	Activo	COTIZANTE	MONIQUIRA

AFILIACIÓN A PENSIONES

Fecha de Corte: 2024-08-09

Régimen	Administradora	Fecha de Afiliación	Estado de Afiliación
PENSIONES: AHORRO INDIVIDUAL	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR SA	2020-09-20	Inactivo

AFILIACIÓN A RIESGOS LABORALES

Fecha de Corte: 2024-08-09

Administradora	Fecha de Afiliación	Estado de Afiliación	Actividad Economica	Municipio Labora
RIESGOS PROFESIONALES COLMENA SA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA	2020-10-07	Activa	EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO INCLUYE ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AGRIMENSURA Y DE EXPLOTACIÓN Y PROSPECCIÓN GEOLÓGICAS ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE ASESORAMIENTO TÉCNICO CONEXO, EL DISEÑO INDUSTRIAL Y DE MÁQUINAS (SIN INTERVENCIÓN DIRECTA EN LAS OBRAS)	Santander- PUENTE NACIONAL
SEGUROS DE VIDA COLPATRIA SA	2023-09-15	Activa		Boyacá- MONIQUIRÁ

CONFORME CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, LAS ADMINISTRADORAS SON LAS RESPONSABLE DEL CONTENIDO Y LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN REPORTADA AL RUAF, CUALQUIER INCONSISTENCIA DEBE SER INFORMADA A LA ADMINISTRADORA RESPECTIVA, QUIEN DEBE RESOLVERLA.

SISPRO
Sistema Integral de Información de la Protección Social

RUAF
Registro Único de Afiliados

Afiliaciones de una Persona en el Sistema

AFILIACIÓN A COMPENSACIÓN FAMILIAR

Fecha de Corte: 2024-08-09

Administradora CF	Fecha de Afiliación	Estado de Afiliación	Tipo de Miembro de la Población Cubierta	Tipo de Afiliado	Municipio Labora
CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	2020-10-01	Activo	Afiliado	Trabajador afiliado dependiente	
CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	2021-05-01	Activo	Afiliado	Trabajador afiliado dependiente	
CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	2021-05-01	Activo	Afiliado	Trabajador afiliado dependiente	
CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	2021-05-01	Activo	Afiliado	Trabajador afiliado dependiente	
CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	2021-05-01	Activo	Afiliado	Trabajador afiliado dependiente	
CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	2021-05-01	Activo	Afiliado	Trabajador afiliado dependiente	
CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	2021-05-01	Activo	Afiliado	Trabajador afiliado dependiente	
CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	2021-05-01	Activo	Afiliado	Trabajador afiliado dependiente	
CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	2021-05-01	Activo	Afiliado	Trabajador afiliado dependiente	
CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	2021-05-01	Activo	Afiliado	Trabajador afiliado dependiente	

CONFORME CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, LAS ADMINISTRADORAS SON LAS RESPONSABLE DEL CONTENIDO Y LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN REPORTADA AL RUAF, CUALQUIER INCONSISTENCIA DEBE SER INFORMADA A LA ADMINISTRADORA RESPECTIVA, QUIEN DEBE RESOLVERLA.

Ministerio de Salud y Protección Social.
Dirección: Cra. 13 # 32 - 76. Colombia, Bogotá D.C. PBX: (57-1) 330 5000, Fax: (57-1) 330 5050.

Afiliaciones de una Persona en el Sistema

CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	2021-05-01	Activo	Afiliado	Trabajador afiliado dependiente	
CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	2021-05-01	Activo	Afiliado	Trabajador afiliado dependiente	
CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	2021-05-01	Activo	Afiliado	Trabajador afiliado dependiente	
CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	2021-05-01	Activo	Afiliado	Trabajador afiliado dependiente	
CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	2021-05-01	Activo	Afiliado	Trabajador afiliado dependiente	
CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	2021-05-01	Activo	Afiliado	Trabajador afiliado dependiente	
CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	2021-05-01	Activo	Afiliado	Trabajador afiliado dependiente	
CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	2021-05-01	Activo	Afiliado	Trabajador afiliado dependiente	
CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	2021-05-01	Activo	Afiliado	Trabajador afiliado dependiente	
CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	2021-05-01	Activo	Afiliado	Trabajador afiliado dependiente	
CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	2021-05-01	Activo	Afiliado	Trabajador afiliado dependiente	
CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	2021-05-01	Activo	Afiliado	Trabajador afiliado dependiente	
CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	2021-05-01	Activo	Afiliado	Trabajador afiliado dependiente	

CONFORME CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, LAS ADMINISTRADORAS SON LAS RESPONSABLE DEL CONTENIDO Y LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN REPORTADA AL RUAF, CUALQUIER INCONSISTENCIA DEBE SER INFORMADA A LA ADMINISTRADORA RESPECTIVA, QUIEN DEBE RESOLVERLA.

Afiliaciones de una Persona en el Sistema

CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	2021-05-01	Activo	Afiliado	Trabajador afiliado dependiente	
CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	2021-05-01	Activo	Afiliado	Trabajador afiliado dependiente	
CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	2021-05-01	Activo	Afiliado	Trabajador afiliado dependiente	
CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	2021-05-01	Activo	Afiliado	Trabajador afiliado dependiente	
CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	2021-05-01	Activo	Afiliado	Trabajador afiliado dependiente	
CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	2021-05-01	Activo	Afiliado	Trabajador afiliado dependiente	
CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	2021-05-01	Activo	Afiliado	Trabajador afiliado dependiente	
CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	2021-05-01	Activo	Afiliado	Trabajador afiliado dependiente	
CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	2021-05-01	Activo	Afiliado	Trabajador afiliado dependiente	
CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	2021-05-01	Activo	Afiliado	Trabajador afiliado dependiente	
CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	2021-05-01	Activo	Afiliado	Trabajador afiliado dependiente	
CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	2021-05-01	Activo	Afiliado	Trabajador afiliado dependiente	
CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	2021-05-01	Activo	Afiliado	Trabajador afiliado dependiente	

CONFORME CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, LAS ADMINISTRADORAS SON LAS RESPONSABLE DEL CONTENIDO Y LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN REPORTADA AL RUAF, CUALQUIER INCONSISTENCIA DEBE SER INFORMADA A LA ADMINISTRADORA RESPECTIVA, QUIEN DEBE RESOLVERLA.

Afiliaciones de una Persona en el Sistema

CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	2021-05-01	Activo	Afiliado	Trabajador afiliado dependiente	
CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	2021-05-01	Activo	Afiliado	Trabajador afiliado dependiente	
CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	2021-05-01	Activo	Afiliado	Trabajador afiliado dependiente	
CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	2021-05-01	Activo	Afiliado	Trabajador afiliado dependiente	
CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	2021-05-01	Activo	Afiliado	Trabajador afiliado dependiente	

AFILIACIÓN A CESANTIAS

Fecha de Corte: 2024-08-09

Régimen	Administradora	Fecha de Afiliación	Estado de Afiliación	Municipio Labora
CESANTÍAS: ESPECIAL	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIA PROTECCION SA	2021-02-16	VIGENTE	Santander- PUENTE NACIONAL

PENSIONADOS

Fecha de Corte: 2024-08-09

No se han reportado pensiones para esta persona.

VINCULACIÓN A PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL

Fecha de Corte: 2024-08-09

No se han reportado vinculaciones para esta persona.

CONFORME CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, LAS ADMINISTRADORAS SON LAS RESPONSABLE DEL CONTENIDO Y LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN REPORTADA AL RUAF, CUALQUIER INCONSISTENCIA DEBE SER INFORMADA A LA ADMINISTRADORA RESPECTIVA, QUIEN DEBE RESOLVERLA.

Afiliaciones de una Persona en el Sistema

CONFORME CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, LAS ADMINISTRADORAS SON LAS RESPONSABLE DEL CONTENIDO Y LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN REPORTADA AL RUAF, CUALQUIER INCONSISTENCIA DEBE SER INFORMADA A LA ADMINISTRADORA RESPECTIVA, QUIEN DEBE RESOLVERLA.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/6/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 4478 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNION

MES INFORME MENSUAL: JUNIO **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA UNION DEL MUNICIPIO DE GUAVATA - SANTANDER EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2023	1300423	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	Nacion	Principal	$ 200.981.336,0
			TOTAL			$ 200.981.336,0

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 200.981.336,0**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: NA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: NA

Firma
Nombre: JEISON LEANDRO CAMACHO AVILA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 01122-11237 CPITVC

Firma
Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/6/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 4478 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TUBAVITA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA UNION DEL MUNICIPIO DE GUAVATA-SANTANDER EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	8	24																													
Lluvias moderadas	8	0																													
Lluvias intensas	8	0																													
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: JEISON LEANDRO CAMACHO AVILA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 01122-11237 CPITVC

Firma
Nombre: JORGE RICARDO CARDENAS GARCIA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-303410 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 30/6/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.:	4478 DE 2023	**CONTRATISTA:**	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNION
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:	jun-2024	**PROYECTO:**	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA UNION DEL MUNICIPIO DE GUAVATA -SANTANDER EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	1631 DE 2023	**INTERVENTOR:**	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma: N.A
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: JEISON LEANDRO CAMACHO AVILA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 01122-11237 CPITVC

Firma
Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional N25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 30/6/2024
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 4478 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNION

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA UNION DEL MUNICIPIO DE GUAVATA - SANTANDER EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 17/11/2023

PLAZO INICIAL:

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/9/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200.981.336,00

VALOR ACUMULADO: $ 200.981.336,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		40.196.268,00	16/11/2023	31/10/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		10.049.067,00	16/11/2023	31/12/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		60.294.401,00	31/12/2023	31/12/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3001992

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: LA PREVISORA S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 27/10/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)								
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde Día	Mes	Año	Hasta Día	Mes	Año
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde Día	Mes	Año	Hasta Día	Mes	Año
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matricula Profesional: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

FORMATOS CONVENIO 4490 DE 2023 ORGANOS SUCRE

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No.	4490 DE 2023		**Contratista:**	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ORGANOS	
Contrato de Interventoría No.	1631 DE 2023		**Interventoría:**	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	

Objeto Contrato de Obra:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ORGANOS DEL MUNICIPIO DE SUCRE, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No.		2		**MES O PERIODO:**	jun-24	

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		
2.1	Localización		
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		
2.4	Características técnicas del proyecto		
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		
3.1	Información general del contrato		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1 MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1 MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
5.1	Información general del contrato		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1 MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

CARLOS ALBERTO PARRA SILVA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
RESOLUCION DE DESIGANCION N°1786 DEL 23 DE MAYO DE 2024

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/6/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **PERIODO MES:** jun-2024

CONTRATO DE OBRA No.: 4490 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ORGANOS DEL MUNICIPIO DE SUCRE, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ORGANOS

PLAZO INICIAL: 44 DIAS
FECHA DE INICIO: 17/11/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 27/5/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 27/9/2024
PLAZO ACUMULADO: 5.43 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200,785,769.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200,785,769.00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 200,785,769.00
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Placa Huella	ML	151
	Mejoramiento	N/A	0
	Rehabilitación	N/A	0
Estructuras	Alcantarillas	UND	1
	Gavión	N/A	0
	Pontones	N/A	0
Mantenimiento		N/A	0
Otros (Especificar cuales)	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	GB	0

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Placa Huella	ML	0	0
	Mejoramiento	N/A		0
	Rehabilitación	N/A		0
Estructuras	Alcantarillas	UND	0	0
	Gavión	N/A		0
	Pontones	N/A		0
Mantenimiento		N/A		0
Otros (Especificar cuales)	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	GB	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 152,028,677.00	$ 0.00	$ 152,028,677.00
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 43,196,232.00	$ 0.00	$ 43,196,232.00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4,560,860.00	$ 0.00	$ 4,560,860.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199,785,769.00	$ 0.00	$ 199,785,769.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 2,200,000.00	$ 0.00	2,200,000.00	2,200,000.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 2,520,000.00	$ 0.00	2,520,000.00	2,520,000.00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00
VALOR EJECUTADO	$ 4,720,000.00	$ 0.00	4,720,000.00	4,720,000.00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0.00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO



VEREDA ORGANOS SUCRE SANTANDER SECTRO LA PEÑA- TRABAJO DE CAMPO ESTUDIO DE SUELOS



VEREDA ORGANOS SUCRE SANTANDER SECTRO LA PEÑA- LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

N/A

Firma

Nombre JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula
Profesional 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/6/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **SANTANDER**

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: jun-2024

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ORGANOS DEL MUNICIPIO DE SUCRE, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO No. 4490 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ORGANOS

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1631 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																													
			TOTAL ACTIVO																													
			TOTAL EN REPARACIÓN																													
			TOTAL INACTIVO																													

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	0	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	100


CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: POR EL MOMENTO NO SE HAN INICIADO LABORES DE CAMPO, POR ENDE NO CONTAMOS CON LA PRECENSIA DE LA MAQUINARIA EN LA OBRA.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.



Firma
Nombre: CRISTIAN IVAN MARIN QUITIAN
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 151037-0508189 STD



Firma
Nombre: JORGE RICARDO CARDENAS GARCIA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-303410 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	30/6/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 4490 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ORGANOS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 31/5/2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ORGANOS DEL MUNICIPIO DE SUAPE, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

NOMBRE ARL: 0 **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** 0

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	Cristian ivan Marin Quitian *	1.101.178.503	Ing Residente	$ 3,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	INDEPENDIENTE		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	No se realizo pago por el
2	Leila Maria Resyes Mosquera*	63.438.463	Contador	$ 1,960,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	INDEPENDIENTE		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	contratista de planillas de seguridad
3																																																
4																																																
5																																																
6																																																
7																																																
8																																																
9																																																
10																																																
N																																																


OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma : N.A
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:



Firma
Nombre: CRISTIAN IVAN MARIN QUITIAN
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 151037-0508189 STD



Firma
Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

SISPRO
Sistema Integral de Información de la Protección Social

RUAF
Registro Único de Afiliados

Afiliaciones de una Persona en el Sistema

INFORMACIÓN BASICA

Fecha de Corte: 2024-08-09

Número de Identificación	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Sexo
CC 1101178503	CRISTIAN	IVAN	MARIN	QUITIAN	M

AFILIACIÓN A SALUD

Fecha de Corte: 2024-08-09

Administradora	Régimen	Fecha Afiliacion	Estado de Afiliación	Tipo de Afiliado	Departamento -> Municipio
EPS FAMISANAR S.A.S.	Contributivo	01/08/2021	Activo	COTIZANTE	MONIQUIRA

AFILIACIÓN A PENSIONES

Fecha de Corte: 2024-08-09

Régimen	Administradora	Fecha de Afiliación	Estado de Afiliación
PENSIONES: AHORRO INDIVIDUAL	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR SA	2015-12-12	Inactivo

AFILIACIÓN A RIESGOS LABORALES

Fecha de Corte: 2024-08-09

Administradora	Fecha de Afiliación	Estado de Afiliación	Actividad Economica	Municipio Labora
RIESGOS PROFESIONALES COLMENA SA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA	2018-08-01	Activa	CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES PARA USO RESIDENCIAL INCLUYE SOLAMENTE A EMPRESAS DEDICADAS A CONSTRUCCIÓN DE CASAS, EDIFICIOS, CAMINOS, FERROCARRILES, PRESAS, CALLES Y/O OLEODUCTOS.	Santander- FLORIDABLANCA

AFILIACIÓN A COMPENSACIÓN FAMILIAR

Fecha de Corte: 2024-08-09

CONFORME CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, LAS ADMINISTRADORAS SON LAS RESPONSABLE DEL CONTENIDO Y LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN REPORTADA AL RUAF, CUALQUIER INCONSISTENCIA DEBE SER INFORMADA A LA ADMINISTRADORA RESPECTIVA, QUIEN DEBE RESOLVERLA.

Ministerio de Salud y Protección Social.
Dirección: Cra. 13 # 32 - 76. Colombia, Bogotá D.C. PBX: (57-1) 330 5000, Fax: (57-1) 330 5050.

SISPRO
Sistema Integral de Información de la Protección Social

RUAF
Registro Único de Afiliados

Afiliaciones de una Persona en el Sistema

Administradora CF	Fecha de Afiliación	Estado de Afiliación	Tipo de Miembro de la Población Cubierta	Tipo de Afiliado	Municipio Labora
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	2022-05-13	Activo	Afiliado	Trabajador afiliado dependiente	

AFILIACIÓN A CESANTIAS

Fecha de Corte: 2024-08-09

No se han reportado afiliaciones para esta persona

PENSIONADOS

Fecha de Corte: 2024-08-09

No se han reportado pensiones para esta persona.

VINCULACIÓN A PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL

Fecha de Corte: 2024-08-09

Administradora	Programa	Fecha de Vinculación	Estado de la Vinculación	Estado del Beneficio	Fecha Ultimo Beneficio	Ubicación de Entrega del Beneficio
INSTITUTO COLOMBIANO DE ESTUDIOS TECNICOS Y CREDITO EN EL EXTERIOR ICETEX	Subsidio a la Matrìcula	2015-06-05	Activo	Entregado	2016-03-03	Santander- BUCARAMANGA

CONFORME CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, LAS ADMINISTRADORAS SON LAS RESPONSABLE DEL CONTENIDO Y LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN REPORTADA AL RUAF, CUALQUIER INCONSISTENCIA DEBE SER INFORMADA A LA ADMINISTRADORA RESPECTIVA, QUIEN DEBE RESOLVERLA.

Ministerio de Salud y Protección Social.
Dirección: Cra. 13 # 32 - 76. Colombia, Bogotá D.C. PBX: (57-1) 330 5000, Fax: (57-1) 330 5050.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/6/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 4490 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ORGANOS

MES INFORME MENSUAL: JUNIO **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ORGANOS DEL MUNICIPIO DE SUCRE, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2023	1312123	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	Nacion	Principal	$ 199,785,769
			TOTAL			$ 199,785,769

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 199,785,769.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	N/a	No se a Aprobado ningun acta
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*OBRAS	$ 152,028,677	$ -	**$ 152,028,677**
*GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 43,196,232	$ -	**$ 43,196,232**
*PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4,560,860	$ -	**$ 4,560,860**
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 199,785,769	$ -	**$ 199,785,769**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

N.A
Firma :
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:


Firma
Nombre: CRISTIAN IVAN MARIN QUITIAN
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 151037-0508189 STD


Firma
Nombe: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/6/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 4490 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ORGANOS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ORGANOS DEL MUNICIPIO DE SUCRE, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	19	20	23	23	24	24	15	17	20	23	20	13	16	18	20	18	21	22	20	22	20	15	14	15	15	16	18	20	19		574
Lluvias moderadas	0	3	2	1	1	0	0	6	4	1	1	2	6	4	4	3	3	2	1	3	0	1	6	4	3	5	5	4	2	2		79
Lluvias intensas	0	2	2	0	0	0	0	3	3	3	0	2	5	4	2	1	3	1	1	1	2	3	3	6	6	4	3	2	2	3		67
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma

Nombre: CRISTIAN IVAN MARIN QUITIAN
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 151037-0508189 STD

Firma

Nombre: JORGE RICARDO CARDENAS GARCIA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-303410 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 30/6/2024
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 4490 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ORGANOS

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ORGANOS DEL MUNICIPIO DE SUCRE, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 17/11/2023

PLAZO INICIAL: 44 DIAS

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/9/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200,785,769.00

VALOR ACUMULADO: $ 200,785,769.00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6,500,000.00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		40.157.154,00	17/11/2023	31/10/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		10.039.289,00	17/11/2023	31/12/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		60.235.731,00	31/12/2023	31/12/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3001994

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 4/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	100%	$ 232,000,000.00	17	11	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 1014746 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 4/12/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

Pendiente actualización de pólizas

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matricula Profesional: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

FORMATOS CONVENIO 4565 DE 2023 LA PALMERA VELEZ

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No.	4565 DE 2023	**Contratista:**	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PALMERA
Contrato de Interventoría No.	1631 DE 2023	**Interventoría:**	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

Objeto Contrato de Obra:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PALMERA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No.	2		**MES O PERIODO:**	jun-24	

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		
2.1	Localización		
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		
2.4	Características técnicas del proyecto		
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		
3.1	Información general del contrato		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
3.3	Seguimiento Items no previstos		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
5.1	Información general del contrato		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

CARLOS ALBERTO PARRA SILVA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
RESOLUCION DE DESIGANCION N°1786 DEL 23 DE MAYO DE 2024

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/6/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** SANTANDER **PERIODO MES:** Jun-24

CONTRATO DE OBRA No.: 4565 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PALMERA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PALMERA

PLAZO INICIAL: 40 DIAS
FECHA DE INICIO: 21/11/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 27/5/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 27/9/2024
PLAZO ACUMULADO: 5.30 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201,029,468.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201,029,468.00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 201,029,468.00
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:** CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Placa Huella	ML	
	Mejoramiento	N/A	
	Rehabilitación	N/A	
Estructuras	Alacantarillas	UND	
	Gavión	N/A	
	Pontones	N/A	
Mantenimiento		N/A	
Otros (Especificar cuales)	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	GB	

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Placa Huella	ML	0	0
	Mejoramiento	N/A		0
	Rehabilitación	N/A		0
Estructuras	Alacantarillas	UND	0	0
	Gavión	N/A		0
	Pontones	N/A		0
Mantenimiento		N/A		0
Otros (Especificar cuales)	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	GB	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 152,264,363.00	$ 0.00	$ 152,264,363.00
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
#¡REF!	$ 43,197,174.00	$ 0.00	$ 43,197,174.00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4,567,174.00	$ 0.00	$ 4,567,174.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 200,028,711.00	$ 0.00	$ 200,028,711.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00
#¡REF!	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00
VALOR EJECUTADO	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0.00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 1
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 3

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Indicar la localización y actividad. Ejemplo: Levantamiento topográfico en la zona del proyecto



Indicar la localización y actividad. Ejemplo: Foto antes - foto, demolición de cinta huella existente



Indicar la localización y actividad. Ejemplo: Toma de muestra de suelo para el estudio de suelos

Foto 4

Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

N/A

Firma

Nombre JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoria
Matricula
Profesional 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/6/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **SANTANDER**

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: jun/2024

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PALMERA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO No. 4565 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PALMERA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1631 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																	
TOTAL ACTIVO																																	
TOTAL EN REPARACION																																	
TOTAL INACTIVO																																	

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	0	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: El proyecto se encuentra en estudios y diseños, por lo cual, aún no hay presencia de maquinaria y equipo en la obra

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: JESÚS ALBERTO DÍAZ ARIZA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 68202-112197 STD

Firma
Nombre:
Residente de Interventoría JORGE RICARDO CARDENAS GARCIA
Matrícula Profesional No.: 54202-303410 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/6/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 4565 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PALMERA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun/2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PALMERA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

NOMBRE ARL: 0 **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** 0

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JESÚS ALBERTO DÍAZ ARIZA	1.3.957.231	Residente de Obra	$ 3.500.000																	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			JESÚS DÍAZ	1657000			Nueva eps	30136644	$ 207.000	Porvenir	30136644	$ 265.200	X	X	X	
2																																									
3																																									
4																																									
5																																									
6																																									
7																																									
8																																									
9																																									
10																																									
N																																									

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:
El proyecto se encuentra en estudios y diseños, por lo cual, aún no hay presencia de personal de mano de obra

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma: N.A
Nombre: 0
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 0

Firma:
Nombre: JESÚS ALBERTO DÍAZ ARIZA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 68202-112197 STD

Firma
Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matricula Profesional: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

SISPRO
Sistema Integral de Información de la Protección Social

RUAF
Registro Único de Afiliados

Afiliaciones de una Persona en el Sistema

INFORMACIÓN BASICA

Fecha de Corte: 2024-08-09

Número de Identificación	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Sexo
CC 13957231	JESUS	ALBERTO	DIAZ	ARIZA	M

AFILIACIÓN A SALUD

Fecha de Corte: 2024-08-09

Administradora	Régimen	Fecha Afiliacion	Estado de Afiliación	Tipo de Afiliado	Departamento -> Municipio
NUEVA EPS S.A.	Contributivo	01/07/2022	Activo	COTIZANTE	VELEZ

AFILIACIÓN A PENSIONES

Fecha de Corte: 2024-08-09

Régimen	Administradora	Fecha de Afiliación	Estado de Afiliación
PENSIONES: AHORRO INDIVIDUAL	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR SA	2005-10-29	Activo no cotizante

AFILIACIÓN A RIESGOS LABORALES

Fecha de Corte: 2024-08-09

Administradora	Fecha de Afiliación	Estado de Afiliación	Actividad Economica	Municipio Labora
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	2019-03-06	Activa	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL INCLUYE SOLAMENTE A EMPRESAS DEDICADAS A EL MONTAJE Y/O REPARACIÓN DE OLEODUCTOS	Santander- BUCARAMANGA
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	2024-02-01	Activa		Bogotá, D.C.- BOGOTÁ

AFILIACIÓN A COMPENSACIÓN FAMILIAR

Fecha de Corte: 2024-08-09

CONFORME CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, LAS ADMINISTRADORAS SON LAS RESPONSABLE DEL CONTENIDO Y LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN REPORTADA AL RUAF, CUALQUIER INCONSISTENCIA DEBE SER INFORMADA A LA ADMINISTRADORA RESPECTIVA, QUIEN DEBE RESOLVERLA.

Ministerio de Salud y Protección Social.
Dirección: Cra. 13 # 32 - 76. Colombia, Bogotá D.C. PBX: (57-1) 330 5000, Fax: (57-1) 330 5050.

SISPRO
Sistema Integral de Información de la Protección Social

RUAF
Registro Único de Afiliados

Afiliaciones de una Persona en el Sistema

Administradora CF	Fecha de Afiliación	Estado de Afiliación	Tipo de Miembro de la Población Cubierta	Tipo de Afiliado	Municipio Labora
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	2017-03-29	Inactivo	Afiliado	Trabajador afiliado facultativo	

AFILIACIÓN A CESANTIAS

Fecha de Corte: 2024-08-09

No se han reportado afiliaciones para esta persona

PENSIONADOS

Fecha de Corte: 2024-08-09

No se han reportado pensiones para esta persona.

VINCULACIÓN A PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL

Fecha de Corte: 2024-08-09

No se han reportado vinculaciones para esta persona.

CONFORME CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, LAS ADMINISTRADORAS SON LAS RESPONSABLE DEL CONTENIDO Y LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN REPORTADA AL RUAF, CUALQUIER INCONSISTENCIA DEBE SER INFORMADA A LA ADMINISTRADORA RESPECTIVA, QUIEN DEBE RESOLVERLA.

Ministerio de Salud y Protección Social.
Dirección: Cra. 13 # 32 - 76. Colombia, Bogotá D.C. PBX: (57-1) 330 5000, Fax: (57-1) 330 5050.

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JESUS ALBERTO DIAZ ARIZA
IDENTIFICACIÓN:	CC-13957231
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-07-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-07-09
FECHA DE PAGO:	2024-07-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-06
PERÍODO SALUD:	2024-06
NÚMERO PLANILLA:	30136644
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	30136644
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.657.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 207.200	$ 207.200
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.657.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 265.200	$ 265.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 472.400	$ 472.400

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/08/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/6/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 4565 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PALMERA

MES INFORME MENSUAL: JUNIO **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PALMERA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2023	1329523	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	Nacion	Principal	$ 200,029,468
			TOTAL			$ 200,029,468

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 200,029,468.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

N.A
Firma:
Nombre: 0
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 0


Firma:
Nombre: JESÚS ALBERTO DÍAZ ARIZA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 68202-112197 STD


Firma
Nombe: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/6/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 4565 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PALMERA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun/2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PALMERA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	8	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		356
Lluvias moderadas	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		240
Lluvias intensas	8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		124
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NUMERO DE HORAS POR DIA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DIA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: JESUS ALBERTO DIAZ ARIZA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 68202-112197 STD

Firma
Nombre: JORGE RICARDO CARDENAS GARCIA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-303410 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA 30/6/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.:	4565 DE 2023	**CONTRATISTA:**	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PALMERA
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:	jun/2024	**PROYECTO:**	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PALMERA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	1631 DE 2023	**INTERVENTOR:**	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORIA									

OBSERVACIONES:

Durante este mes no se realizaron ensayos, el proyecto está en etapa de estudios y diseños

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma: N.A
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: JESÚS ALBERTO DÍAZ ARIZA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 68202-112197 STD

Firma
Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 30/6/2024
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 4565 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PALMERA

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PALMERA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 21/11/2023
PLAZO INICIAL: 40 DIAS
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/9/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 201,029,468.00
VALOR ACUMULADO: $ 201,029,468.00
(Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ITEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -
VALOR ACUMULADO ITEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		40.205.893,60	21/11/2023	31/10/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		10.051.473,40	21/11/2023	31/12/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		60.308.840,40	31/12/2023	31/12/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100043087
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 20/9/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde Día	Desde Mes	Desde Año	VIGENCIA Hasta Día	Hasta Mes	Hasta Año
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)								
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matricula Profesional: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

FORMATOS CONVENIO 4357 DE 2023 TUBAVITA VELEZ

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No.	4357 DE 2023	**Contratista:**	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TUBAVITA
Contrato de Interventoría No.	1631 DE 2023	**Interventoría:**	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S


Objeto Contrato de Obra:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TUBAVITA DEL MUNICIPIO DE VELEZ-SANTANDER EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No.		2		**MES O PERIODO:**	jun-24

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		
2.1	Localización		
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		
2.4	Características técnicas del proyecto		
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		
3.1	Información general del contrato		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1 MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1 MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
5.1	Información general del contrato		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1 MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: 

CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

RESOLUCION DE DESIGANCION N°1786 DEL 23 DE MAYO DE 2024

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/6/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **PERIODO MES:** jun-24

CONTRATO DE OBRA No.: 4357 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TUBAVITA DEL MUNICIPIO DE VELEZ-SANTANDER EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TUBAVITA

PLAZO INICIAL: 46 DIAS
FECHA DE INICIO: 16/11/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 27/5/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 27/9/2024
PLAZO ACUMULADO: 5.47 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 201,030,449.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 201,030,449.00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 201,030,449.00
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Placa Huella	ML	151
	Mejoramiento	N/A	
	Rehabilitación	N/A	
Estructuras	Alacantarillas	UND	1
	Gavión	N/A	
	Pontones	N/A	
Mantenimiento		N/A	
Otros (Especificar cuales)	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	GB	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Placa Huella	ML	0	0
	Mejoramiento	N/A		0
	Rehabilitación	N/A		0
Estructuras	Alacantarillas	UND	0	0
	Gavión	N/A		0
	Pontones	N/A		0
Mantenimiento		N/A		0
Otros (Especificar cuales)	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	GB	50%	50%

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 146,623,790.00	$ 0.00	$ 146,623,790.00
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 49,007,945.00	$ 0.00	$ 49,007,945.00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4,398,714.00	$ 0.00	$ 4,398,714.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 200,030,449.00	$ 0.00	$ 200,030,449.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 5,240,000.00	$ 0.00	5,240,000.00	5,240,000.00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00
VALOR EJECUTADO	$ 5,240,000.00	$ 0.00	5,240,000.00	5,240,000.00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0.00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Comité con Contadora y Residente de obra temas varios de ejecución / Comité semanal por medio virtual con interventoría






Sitio de obra Vereda Tubavita - Seguimiento a elaboración de estudios y diseños base

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

N/A

Firma
Nombre JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula
Profesional 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/6/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **SANTANDER**

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: jun-2024

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TUBAVITA DEL MUNICIPIO DE VELEZ-SANTANDER EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO No. 4357 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TUBAVITA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1631 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																														
			TOTAL ACTIVO																														
			TOTAL EN REPARACIÓN																														
			TOTAL INACTIVO																														

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	0	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligació
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: MARIA CAMILA DIAZ CARRASCO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 151037-0513350 STD

Firma
Nombre:
Residente de Interventoria JORGE RICARDO CARDENAS GARCIA
Matrícula Profesional No.: 54202-303410 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/6/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 4357 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TUBAVITA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TUBAVITA DEL MUNICIPIO DE VELEZ-SANTANDER EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

NOMBRE ARL: 0 **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** 0

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	MARIA CAMILA DIAZ CARRASCO	1.101.758.682	Residente de Obra	$ 3.500.000																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Maria Camila Diaz	1713240	$ 9.000	1	Nueva eps	9469432258	$ 214.200	Porvenir	9469432258	$ 274.200	X	X	X	
2																																										
3																																										
4																																										
5																																										
6																																										
7																																										
8																																										
9																																										
10																																										
N																																										

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha . . . . . a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

N.A

Firma:
Nombre: 0
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 0

Firma:
Nombre: MARIA CAMILA DIAZ CARRASCO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 151037-0513350 STD

Firma
Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

SISPRO
Sistema Integral de Información de la Protección Social

RUAF
Registro Único de Afiliados

Afiliaciones de una Persona en el Sistema

INFORMACIÓN BASICA

Fecha de Corte: 2024-08-09

Número de Identificación	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Sexo
CC 1101758682	MARIA	CAMILA	DIAZ	CARRASCO	F

AFILIACIÓN A SALUD

Fecha de Corte: 2024-08-09

Administradora	Régimen	Fecha Afiliacion	Estado de Afiliación	Tipo de Afiliado	Departamento -> Municipio
NUEVA EPS S.A.	Contributivo	01/03/2016	Activo	COTIZANTE	VELEZ

AFILIACIÓN A PENSIONES

Fecha de Corte: 2024-08-09

Régimen	Administradora	Fecha de Afiliación	Estado de Afiliación
PENSIONES: AHORRO INDIVIDUAL	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR SA	2019-05-18	Activo cotizante

AFILIACIÓN A RIESGOS LABORALES

Fecha de Corte: 2024-08-09

Administradora	Fecha de Afiliación	Estado de Afiliación	Actividad Economica	Municipio Labora
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	2024-04-15	Activa		Bogotá, D.C.- BOGOTÁ
SEGUROS DE VIDA COLPATRIA SA	2014-12-17	Activa	EMPRESAS DEDICADAS AL COMERCIO AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR Y SUS ACCESORIOS	Santander- BUCARAMANGA

AFILIACIÓN A COMPENSACIÓN FAMILIAR

Fecha de Corte: 2024-08-09

CONFORME CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, LAS ADMINISTRADORAS SON LAS RESPONSABLE DEL CONTENIDO Y LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN REPORTADA AL RUAF, CUALQUIER INCONSISTENCIA DEBE SER INFORMADA A LA ADMINISTRADORA RESPECTIVA, QUIEN DEBE RESOLVERLA.

Ministerio de Salud y Protección Social.
Dirección: Cra. 13 # 32 - 76. Colombia, Bogotá D.C. PBX: (57-1) 330 5000, Fax: (57-1) 330 5050.

SISPRO
Sistema Integral de Información de la Protección Social

RUAF
Registro Único de Afiliados

Afiliaciones de una Persona en el Sistema

Administradora CF	Fecha de Afiliación	Estado de Afiliación	Tipo de Miembro de la Población Cubierta	Tipo de Afiliado	Municipio Labora
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	2024-07-10	Activo	Cónyuge o Compañero (a) permanente		Santander- FLORIDABLANCA

AFILIACIÓN A CESANTIAS

Fecha de Corte: 2024-08-09

No se han reportado afiliaciones para esta persona

PENSIONADOS

Fecha de Corte: 2024-08-09

No se han reportado pensiones para esta persona.

VINCULACIÓN A PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL

Fecha de Corte: 2024-08-09

No se han reportado vinculaciones para esta persona.

CONFORME CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, LAS ADMINISTRADORAS SON LAS RESPONSABLE DEL CONTENIDO Y LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN REPORTADA AL RUAF, CUALQUIER INCONSISTENCIA DEBE SER INFORMADA A LA ADMINISTRADORA RESPECTIVA, QUIEN DEBE RESOLVERLA.

Ministerio de Salud y Protección Social.
Dirección: Cra. 13 # 32 - 76. Colombia, Bogotá D.C. PBX: (57-1) 330 5000, Fax: (57-1) 330 5050.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1101758682		DIAZ CARRASCO MARIA CAMILA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 3 # 7- 83	VELEZ-SANTANDER	3219942418	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	777855227	9469432258	I	2024/07/19	2024/07/15	BANCO DAVIVIENDA	0	$497,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,713,240	$274,200			$1,713,240	$214,200			$0	$0			$1,713,240	$9,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,713,240	$274,200			$1,713,240	$214,200			$0	$0			$1,713,240	$9,000		$0	$0
Ciudad: VELEZ Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$1,713,240	$274,200			$1,713,240	$214,200			$0	$0			$1,713,240	$9,000		$0	$0
1	CC	1101758682	DIAZ MARIA	230301	30	$1,713,240	$274,200	EPS037	30	$1,713,240	$214,200		0	$0	$0	14-23	30	$1,713,240	$9,000	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,713,240	$274,200			$1,713,240	$214,200			$0	$0			$1,713,240	$9,000		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1101758682		DIAZ CARRASCO MARIA CAMILA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 3 # 7- 83	VELEZ-SANTANDER	3219942418	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	777855227	9469432258	I	2024/07/19	2024/07/15	BANCO DAVIVIENDA	0	$497,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$274,200	$0	$0	$274,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$274,200	$0	$0	$274,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,000	$0	$0	$9,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,000	$0	$0	$9,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$214,200	$0	$0	$214,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$214,200	$0	$0	$214,200
TOTAL				1	$497,400	$0	$0	$497,400

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/6/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 4357 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TUBAVITA

MES INFORME MENSUAL: JUNIO **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TUBAVITA DEL MUNICIPIO DE VELEZ-SANTANDER EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2023	1300423	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	Nacion	Principal	$ 200,030,449
		TOTAL				$ 200,030,449

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 200,030,449.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma: N.A
Nombre: 0
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 0

Firma:
Nombre: MARIA CAMILA DIAZ CARRASCO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 151037-0513350 STD

Firma
Nombe: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/6/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 4357 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TUBAVITA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TUBAVITA DEL MUNICIPIO DE VELEZ-SANTANDER EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	8	24																													
Lluvias moderadas	8	0																													
Lluvias intensas	8	0																													
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: MARIA CAMILA DIAZ CARRASCO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 151037-0513350 STD

Firma
Nombre: JORGE RICARDO CARDENAS GARCIA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-303410 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 30/6/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.:	4357 DE 2023	**CONTRATISTA:**	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TUBAVITA
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:	jun-2024	**PROYECTO:**	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TUBAVITA DEL MUNICIPIO DE VELEZ-SANTANDER EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	1631 DE 2023	**INTERVENTOR:**	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

N.A
Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:


Firma:
Nombre: MARIA CAMILA DIAZ CARRASCO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 151037-0513350 STD


Firma
Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional N25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 30/6/2024
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 4357 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TUBAVITA

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TUBAVITA DEL MUNICIPIO DE VELEZ-SANTANDER EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 16/11/2023
PLAZO INICIAL: 46 DIAS
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/9/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 201,030,449.00
VALOR ACUMULADO: $ 201,030,449.00
(Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		40.201.343,80	15/11/2023	31/10/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		10.050.335,95	15/11/2023	31/12/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		60.302.015,70	31/12/2023	31/12/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3001997
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: LA PREVISORA S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 27/10/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde Día	Desde Mes	Desde Año	VIGENCIA Hasta Día	Hasta Mes	Hasta Año
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)								
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde Día	Mes	Año	Hasta Día	Mes	Año
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde Día	Mes	Año	Hasta Día	Mes	Año
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matricula Profesional: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

FORMATOS CONVENIO 4767 DE 2023 POPOA GUAVATA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No.	4767 DE 2023	**Contratista:**	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA POPOA
Contrato de Interventoría No.	1631 DE 2023	**Interventoría:**	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S


Objeto Contrato de Obra:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA POPOA DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No.	2		**MES O PERIODO:**	jun-24	

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		
2.1	Localización		
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		
2.4	Características técnicas del proyecto		
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		
3.1	Información general del contrato		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
3.3	Seguimiento Items no previstos		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
5.1	Información general del contrato		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: 

CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

RESOLUCION DE DESIGANCION N°1786 DEL 23 DE MAYO DE 2024

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/6/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** SANTANDER **PERIODO MES:** Jun-24

CONTRATO DE OBRA No.: 4767 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA POPOA DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA POPOA

PLAZO INICIAL: 31 DIAS
FECHA DE INICIO: 30/11/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 27/5/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 27/9/2024
PLAZO ACUMULADO: 5.00 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200,995,632.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200,995,632.00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 200,995,632.00
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S. **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:** CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Placa Huella	ML	
	Mejoramiento	N/A	
	Rehabilitación	N/A	
Estructuras	Alacantarillas	UND	
	Gavión	N/A	
	Pontones	N/A	
Mantenimiento		N/A	
Otros (Especificar cuales)	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	GB	

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Placa Huella	ML	0	0
	Mejoramiento	N/A		0
	Rehabilitación	N/A		0
Estructuras	Alacantarillas	UND	0	0
	Gavión	N/A		0
	Pontones	N/A		0
Mantenimiento		N/A		0
Otros (Especificar cuales)	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	GB	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 152,264,363.00	$ 0.00	$ 152,264,363.00
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		$ 0.00	$ 0.00
#¡REF!	$ 43,197,174.00	$ 0.00	$ 43,197,174.00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4,567,931.00	$ 0.00	$ 4,567,931.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 200,029,468.00	$ 0.00	$ 200,029,468.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 3,000,000.00	$ 0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00
#¡REF!	$ 1,894,683.00	$ 0.00	1,894,683.00	1,894,683.00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00
VALOR EJECUTADO	$ 0.00	$ 0.00	0.00	0.00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0.00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 2

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1	Foto 2
Indicar la localización y actividad.	**Indicar la localización y actividad.**

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

N/A

Firma

Nombre JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula
Profesional 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/6/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **SANTANDER**

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: jun/2024

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA POPOA DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO No. 4767 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA POPOA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1631 DE 2023

INTERVENTORÍA: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																														
			TOTAL ACTIVO																														
			TOTAL EN REPARACION																														
			TOTAL INACTIVO																														

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	0	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: VIVIANA PAOLA RODRIGUEZ ARIZA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202215781CND

Firma

Nombre:
Residente de Interventoría JORGE RICARDO CARDENAS GARCIA
Matrícula Profesional No.: 54202-303410 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/6/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 4767 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA POPOA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun/2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA POPOA DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

NOMBRE ARL: 0 **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** 0

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	VIVIANA PAOLA RODRIGUEZ ARIZA	1.101.174.865	Ing Residente de Obra	$ 3.500.000																X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Viviana Rodriguez		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	No se realizo pago por el contratista de planillas de seguridad
2																																											
3																																										
4																																										
5																																										
6																																										
7																																										
8																																										
9																																										
10																																										
N																																										

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma N.A
Nombre: 0
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 0

Firma:
Nombre: VIVIANA PAOLA RODRIGUEZ ARIZA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202215781CND

Firma
Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matricula Profesional: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

SISPRO
Sistema Integral de Información de la Protección Social

RUAF
Registro Único de Afiliados

Afiliaciones de una Persona en el Sistema

INFORMACIÓN BASICA Fecha de Corte: 2024-08-09

Número de Identificación	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Sexo
CC 1101174865	VIVIANA	PAOLA	RODRIGUEZ	ARIZA	F

AFILIACIÓN A SALUD Fecha de Corte: 2024-08-09

Administradora	Régimen	Fecha Afiliacion	Estado de Afiliación	Tipo de Afiliado	Departamento -> Municipio
NUEVA EPS S.A.	Contributivo	01/05/2024	Activo	COTIZANTE	MONIQUIRA

AFILIACIÓN A PENSIONES Fecha de Corte: 2024-08-09

Régimen	Administradora	Fecha de Afiliación	Estado de Afiliación
PENSIONES: AHORRO INDIVIDUAL	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR SA	2012-05-23	Activo cotizante

AFILIACIÓN A RIESGOS LABORALES Fecha de Corte: 2024-08-09

Administradora	Fecha de Afiliación	Estado de Afiliación	Actividad Economica	Municipio Labora
RIESGOS PROFESIONALES COLMENA SA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA	2013-02-01	Activa	EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO INCLUYE ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AGRIMENSURA Y DE EXPLOTACIÓN Y PROSPECCIÓN GEOLÓGICAS ASÍ COMO LA PRESTACIÓN DE ASESORAMIENTO TÉCNICO CONEXO, EL DISEÑO INDUSTRIAL Y DE MÁQUINAS (SIN INTERVENCIÓN DIRECTA EN LAS OBRAS)	Bogotá, D.C.- BOGOTÁ

AFILIACIÓN A COMPENSACIÓN FAMILIAR Fecha de Corte: 2024-08-09

No se han reportado afiliaciones para esta persona

AFILIACIÓN A CESANTIAS Fecha de Corte: 2024-08-09

No se han reportado afiliaciones para esta persona

PENSIONADOS Fecha de Corte: 2024-08-09

No se han reportado pensiones para esta persona.

VINCULACIÓN A PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL Fecha de Corte: 2024-08-09

No se han reportado vinculaciones para esta persona.

CONFORME CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, LAS ADMINISTRADORAS SON LAS RESPONSABLE DEL CONTENIDO Y LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN REPORTADA AL RUAF, CUALQUIER INCONSISTENCIA DEBE SER INFORMADA A LA ADMINISTRADORA RESPECTIVA, QUIEN DEBE RESOLVERLA.

Ministerio de Salud y Protección Social.
Dirección: Cra. 13 # 32 - 76. Colombia, Bogotá D.C. PBX: (57-1) 330 5000, Fax: (57-1) 330 5050.

Conmutador: (57-1) 330 5000 - Central de fax: (57-1) 330 5050
Punto de atención presencial: Carrera 13 No. 32-76 piso 1, Bogotá, código postal 110311 Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua

Atención telefónica a través del Centro de Contacto:
En Bogotá: (57-1) 589 3750 Resto del pais: 018000960020
Horario de atención: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en jornada continua.
Versión 2.5
ISO 27001

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/6/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 4767 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA POPOA

MES INFORME MENSUAL: JUNIO **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA POPOA DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2023	1371023	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	Nacion	Principal	$ 199,995,632
			TOTAL			$ 199,995,632

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 199.995.632.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma N.A
Nombre: NA
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: VIVIANA PAOLA RODRIGUEZ ARIZA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202215781CND

Firma
Nombe: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/6/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 4767 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA POPOA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun/2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA POPOA DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco																																
Lluvias moderadas																																
Lluvias intensas																																
Total horas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NUMERO DE HORAS POR DIA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DIA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: VIVIANA PAOLA RODRIGUEZ ARIZA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202215781CND

Firma
Nombre: JORGE RICARDO CARDENAS GARCIA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-303410 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA 30/6/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.:	4767 DE 2023	**CONTRATISTA:**	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA POPOA
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:	jun/2024	**PROYECTO:**	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA POPOA DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	1631 DE 2023	**INTERVENTOR:**	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORIA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma:
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: VIVIANA PAOLA RODRIGUEZ ARIZA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202215781CND

Firma
Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional N25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 30/6/2024
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 4767 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA POPOA

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA POPOA DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 30/11/2023
PLAZO INICIAL: 31 DIAS
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/9/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 200,995,632.00
VALOR ACUMULADO: $ 200,995,632.00
(Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		40.199.127,00	30/11/2023	31/10/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		10.049,782,00	30/11/2023	31/12/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		60.298.690,00	31/12/2023	31/12/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3002003
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 0/1/1900

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde Día	Desde Mes	Desde Año	VIGENCIA Hasta Día	Hasta Mes	Hasta Año
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)								
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
			Día	Mes	Año			
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matricula Profesional: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

FORMATO CONVENIO 3753 DE 2023 BERLIN LA BELLEZA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No.	3753 DE 2023	**Contratista:**	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLIN
Contrato de Interventoría No.	1631 DE 2023	**Interventoría:**	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S


Objeto Contrato de Obra:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLIN DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INFORME MENSUAL No.		2		**MES O PERIODO:**	jun-24

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		
2.1	Localización		
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		
2.4	Características técnicas del proyecto		
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		
3.1	Información general del contrato		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
5.1	Información general del contrato		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: 

CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

RESOLUCION DE DESIGANCION N°1786 DEL 23 DE MAYO DE 2024

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **PERIODO MES:** jun-24

CONTRATO DE OBRA No.: 3753 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLIN DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLIN

PLAZO INICIAL: 86 DIAS
FECHA DE INICIO: 10/05/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 31/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 27/05/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 27/09/2024
PLAZO ACUMULADO: 11,93 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 200.108.139,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 200.108.139,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 200.108.139,00
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Placa Huella	ML	
	Mejoramiento	N/A	
	Rehabilitación	N/A	
Estructuras	Alacantarillas	UND	
	Gavión	N/A	
	Pontones	N/A	
Mantenimiento		N/A	
Otros (Especificar cuales)	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	GB	

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Placa Huella	ML	0	0
	Mejoramiento	N/A		0
	Rehabilitación	N/A		0
Estructuras	Alacantarillas	UND	0	0
	Gavión	N/A		0
	Pontones	N/A		0
Mantenimiento		N/A		0
Otros (Especificar cuales)	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	GB	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 151.373.329,00	$ 0,00	$ 151.373.329,00
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 43.193.610,00	$ 0,00	$ 43.193.610,00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 4.541.200,00	$ 0,00	$ 4.541.200,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 199.108.139,00	$ 0,00	$ 199.108.139,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 0,00	$ 0,00	0,00	0,00
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 0,00	$ 0,00	0,00	0,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 0,00	$ 0,00	0,00	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 0,00	$ 0,00	0,00	0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 0,00	$ 0,00	0,00	0,00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 0,00	$ 0,00	0,00	0,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ 0,00	$ 0,00	0,00	0,00
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	$ 0,00	$ 0,00	0,00	0,00
VALOR EJECUTADO	$ 0,00	$ 0,00	0,00	0,00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

Indicar la localización y actividad.

Foto 2

Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

N/A

Firma

Nombre JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula
Profesional 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **SANTANDER**

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: jun-2024

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLIN DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. 3753 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLIN

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1631 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

MAQUINARIA Y EQUIPO				**DÍAS DEL MES**																												
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																													
			TOTAL ACTIVO																													
			TOTAL EN REPARACIÓN																													
			TOTAL INACTIVO																													

RESUMEN PERIODO / MES	**No.**	**%**
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	0	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: JORGE ROMALDO FANDIÑO GOMEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-304584 NTS

Firma

Nombre:
Residente de Interventoría JORGE RICARDO CARDENAS GARCIA
Matrícula Profesional No.: 54202-303410 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 3753 DE 2023
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1631 DE 2023
NOMBRE ARL: 0

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLIN
PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLIN DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S
NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: 0

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	Jorge Romaldo Fandiño Gomez	1.097.665.332	Residente de Obra	$ 3.500.000																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Jorge Fandiño		$ 1.800	I	Famisanar	8631369584	$ 40.900	Porvenir	8631369584	$ 52.300	X	X	X	
2																																																	
3																																																	
4																																																	
5																																																	
6																																																	
7																																																	
8																																																	
9																																																	
10																																																	
N																																																	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma N.A
Nombre: 0
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 0

Firma:
Nombre: JORGE ROMALDO FANDIÑO GOMEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-304584 NTS

Firma
Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: I 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

SISPRO
Sistema Integral de Información de la Protección Social

RUAF
Registro Único de Afiliados

Salud

Afiliaciones de una Persona en el Sistema

INFORMACIÓN BASICA

Fecha de Corte: 2024-08-09

Número de Identificación	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Sexo
CC 1097665332	JORGE	ROMALDO	FANDIÑO	GOMEZ	M

AFILIACIÓN A SALUD

Fecha de Corte: 2024-08-09

Administradora	Régimen	Fecha Afiliacion	Estado de Afiliación	Tipo de Afiliado	Departamento -> Municipio
EPS FAMISANAR S.A.S.	Contributivo	30/06/2024	Activo	COTIZANTE	BOGOTA D.C.

AFILIACIÓN A PENSIONES

Fecha de Corte: 2024-08-09

Régimen	Administradora	Fecha de Afiliación	Estado de Afiliación
PENSIONES: AHORRO INDIVIDUAL	SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR SA	2016-09-01	Inactivo

AFILIACIÓN A RIESGOS LABORALES

Fecha de Corte: 2024-08-09

Administradora	Fecha de Afiliación	Estado de Afiliación	Actividad Economica	Municipio Labora
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	2024-07-03	Activa		Santander- LA BELLEZA
RIESGOS PROFESIONALES COLMENA SA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA	2021-08-06	Activa	CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES PARA USO RESIDENCIAL INCLUYE SOLAMENTE A EMPRESAS DEDICADAS A CONSTRUCCIÓN DE CASAS, EDIFICIOS, CAMINOS, FERROCARRILES, PRESAS, CALLES Y/O OLEODUCTOS.	Bogotá, D.C.- BOGOTÁ

AFILIACIÓN A COMPENSACIÓN FAMILIAR

Fecha de Corte: 2024-08-09

No se han reportado afiliaciones para esta persona

CONFORME CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, LAS ADMINISTRADORAS SON LAS RESPONSABLE DEL CONTENIDO Y LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN REPORTADA AL RUAF, CUALQUIER INCONSISTENCIA DEBE SER INFORMADA A LA ADMINISTRADORA RESPECTIVA, QUIEN DEBE RESOLVERLA.

Ministerio de Salud y Protección Social.
Dirección: Cra. 13 # 32 - 76. Colombia, Bogotá D.C. PBX: (57-1) 330 5000, Fax: (57-1) 330 5050.

Afiliaciones de una Persona en el Sistema

AFILIACIÓN A CESANTIAS

Fecha de Corte: 2024-08-09

No se han reportado afiliaciones para esta persona

PENSIONADOS

Fecha de Corte: 2024-08-09

No se han reportado pensiones para esta persona.

VINCULACIÓN A PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL

Fecha de Corte: 2024-08-09

No se han reportado vinculaciones para esta persona.

CONFORME CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, LAS ADMINISTRADORAS SON LAS RESPONSABLE DEL CONTENIDO Y LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN REPORTADA AL RUAF, CUALQUIER INCONSISTENCIA DEBE SER INFORMADA A LA ADMINISTRADORA RESPECTIVA, QUIEN DEBE RESOLVERLA.

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1097665332 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-06	230301	800224808	PORVENIR	1	0	52.300	0	52.300
Período salud:	2024-06	EPS017	830003564	FAMISANAR	1	0	40.900	0	40.900
Planilla Nro.:	8631369584 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	1.800	0	1.800
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2024-07-04	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 95.000

PAGADO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 3753 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLIN

MES INFORME MENSUAL: JUNIO **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLIN DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2023	1146623	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	Nacion	Principal	$ 199.108.139
TOTAL						$ 199.108.139

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 199.108.139,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

N.A

Firma
Nombre: 0
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 0

Firma:
Nombre: JORGE RONALDO FANDIÑO GOMEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-304584 NTS

Firma
Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 3753 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLIN

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: jun-2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLIN DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																													
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	8	24																														
Lluvias moderadas	8	0																														
Lluvias intensas	8	0																														
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: JORGE ROMALDO FANDIÑO GOMEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-304584 NTS

Firma
Nombre: JORGE RICARDO CARDENAS GARCIA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-303410 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.:	3753 DE 2023	**CONTRATISTA:**	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLIN
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:	jun-2024	**PROYECTO:**	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLIN DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	1631 DE 2023	**INTERVENTOR:**	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma: N.A
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: JORGE ROMALDO FANDIÑO GOMEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-304584 NTS

Firma
Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional N:25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 30/06/2024
(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 3753 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLIN

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLIN DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 10/05/2023
PLAZO INICIAL: 86 DIAS
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 200.108.139,00
VALOR ACUMULADO: $ 200.108.139,00
(Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1631 DE 2023 **INTERVENTOR:** TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		40.021.628,00	04/10/2023	31/10/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		10.005.407,00	04/10/2023	31/12/2026
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra		60.032.442,00	31/12/2023	31/12/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3001976
Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: POLIZAS – LA PREVISORA S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 08/08/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)								
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: JORGE HERNANDO FORERO FORERO

Director de Interventoría

Matricula Profesional: 25202-61517 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 6/17/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 4565 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PALMERA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PALMERA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1631 - 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

1) Revisar la localización del proyecto
2) Actualizar los APU del presupuesto
3) Analizar los estudios y diseños que se deben presentar para el proyecto

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1) El Ingeniero residente de obra junto con el PJAC estuvieron en el sitio de la obra y según los PR del anexo técnico, la localización del proyecto parece estar por fuera de la zona a intervenir
2) Como el proyecto fue formulado en el año 2023, se debe actualizar los precios del APU
3) Definir el alcance del ajuste de los estudios y diseños

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	6/17/2024

(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1) Para saber si la localización del proyecto se encuentra dentro de los PR establecidos en el anexo técnico, la interventoría manifiesta que el Residente de obra tome las respectivas coordenadas y presente un oficio informando su ubicación.

2) Debido a que el proyecto fue propuesto en el año 2023 se deben actualizar los precios del APU para el año 2024 para lo cual el Interventor le solicita al Ingeniero Residente de obra que haga esa actualización y ajuste de cantidades en lo admnistrativo y según ajuste de diseños.

3) Respecto a la revisión y ajuste de los diseños los puede firmar un Profesional que tenga mas de 5 años de experiencia, los estudios y diseños a presentar son los siguientes: estudio de suelos, levantamiento topográfico, diseño geométrico, estudio de tránsito, plan de manejo de tránsito, diseño estructural y estudio hidrológico e hidráulico.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 6/17/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
Tomar coordenadas del sitio del proyecto de placa huella	Tuesday, June 18, 2024	Jesús Alberto Díaz Ariza
Presentar oficio con las coordenadas del proyecto de placa huella	Tuesday, June 18, 2024	Jesús Alberto Díaz Ariza
Actualizar los precios del presupuesto	Monday, July 1, 2024	Jesús Alberto Díaz Ariza


FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 6/24/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
Jorge Ricardo Cárdenas García	Residente de Interventoria	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.	
Carlos Augusto Ariza Santamaría	PJAC Vereda La Palmera	JAC Vereda La Palmera	
Jesús Alberto Díaz Ariza	Residente de Obra	JAC Vereda La Palmera	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 6/20/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 4175 de 2023, 3753 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CACHIPAYAL MUNICIPIO LA BELLEZA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLIN MUNICIPIO LA BELLEZA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CACHIPAYAL DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BERLIN DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1631 - 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Esta reunion se realizo para dar a conocer a interventoria INVIAS los residentes de obra que van a estar en el proyecto de placa huellas en las veredas de cachipayal y berlin del municipio de la belleza santander.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Los temas que se trataron en la reunion fueron:contratacion, estudios y diseños, presupuesto y programacion se espera aprobacion de cotizacion para realizar estudios previos.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 6/20/2024
(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El dia 20 de junio del 2024 se realizo reunion en cabeza del profesional de interventoria por parte de (INVIAS) presidente de JAC Vereda Cachipayal con residente de obra y presidente de JAC Vereda Berlin con residente de obra del municipio de la belleza santander.Se realizo socializacion del proyecto de placa huellas donde se aclararon los temas de contratacion residnetes de obra, estudios y diseños previos, presupuesto y ejecucuion de la obra. por parte de interventoria se pidio de manera urgente la cotizacion de estudios y diseños para aprobacion y poder ejecutar la actividad lo mas pronto posible.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 6/20/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
entrega de acta	Friday, June 21, 2024	
Entrega cotizacion estudios y diseños	Thursday, June 20, 2024	



FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
Jorge Eduardo Hurtado Pedraza	Residente de obra	JAC Cachipayal	
Juan ´Pablo Ovalle	Presiente de Junta	JAC Cachipayal	
Jorge Romaldo Fandiño Gomez	Residente de obra	JAC Berlin	
Norbei Clavijo	Presidente de Junta	JAC Berlin	
Jorge Ricardo Cardenas Garcia	Residente de Interventoria	Terra Ingenieros Civiles S.A.S	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 25/06/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 2
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 4175 de 2023, 3753 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CACHIPAYAL MUNICIPIO LA BELLEZA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLIN MUNICIPIO LA BELLEZA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CACHIPAYAL DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BERLIN DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1631 - 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Aclarar las dudas de los informes semanales y mensuales.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Se hablo sobre los informes semanles de los mensuales los cuales se deben presentar:
Semanal: los dias martes.
Mensual: Dia 3 de cada mes.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	25/06/2024

(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El dia 25 de Junio del año 2024 se llevo acabo una reunion virtual con interventoria y residentes de obra para los proyectos de placa huellas.
En esta reunion se aclararon dudas de entrega de estudios,diseños ajuste de presupuestos y el tema de la reunion informes semanales y mensuale.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 25/06/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
Reunion con interventorias los dias martes 10am		
Revisar presupuesto parte administrativa.		



FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 2/07/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
Jorge Eduardo Hurtado Pedraza	Residente de obra	JAC Cachipayal	
Juan ´Pablo Ovalle	Presiente de Junta	JAC Cachipayal	
Jorge Romaldo Fandiño Gomez	Residente de obra	JAC Berlin	
Norbei Clavijo	Presidente de Junta	JAC Berlin	
Jorge Ricardo Cardenas Garcia	Residente de Interventoria	Terra Ingenieros Civiles S.A.S	
Karol Kristina Blanco Del Toro	Profesional Social	Terra Ingenieros Civiles S.A.S	
Stephany Rondano Gamboa	Tecnica Administrativa	Terra Ingenieros Civiles S.A.S	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **ROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORT** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 6/24/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 2
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 4565 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PALMERA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PALMERA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1631 - 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

1) Revisar la forma de pago a proveedores y contratistas
2) Revisar y analizar si la cinta huella existente en el sitio del proyecto, se puede dejar como base para la placa huella que se va a construir

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1) El Ingeniero residente de obra le pregunta al Interventor como va ser la forma de pago para proveedores, contratistas y transporte.

2) En reunión con la comunidad en el sitio del proyecto, existe cinta huellas y la comunidad me pregunta o me hace la sugerencia, si estas pueden servir como base para la placa huella que se va a construir.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **ROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORT** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 6/24/2024

(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1) El Interventor sobre la forma de pago me infroma que se pagará con cheque pero está a la espera de que el INVIAS comunique el manejo de la cuentas y la frecuencia de los pagos.

2) En cuanto si se pueden dejar las cinta huellas existentes como base para la placa huella que se va a construir, el Interventor me dice que eso lo debe decir los estudios y diseños

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **ROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORT** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 6/24/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Informe semanal	Wednesday, June 26, 2024	Jesús Alberto Díaz Ariza
Actualizar los precios del presupuesto	Monday, July 1, 2024	Jesús Alberto Díaz Ariza

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 7/2/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Jorge Ricardo Cárdenas García	Residente de Interventoria	Terra Ingenieros Civiles S.A.S	
Jesús Alberto Díaz Ariza	Residente de Obra	JAC Vereda La Palmera	
Karol Kristina Blanco Del Toro	Profesional Social	Terra Ingenieros Civiles S.A.S	
Stephany Rondano Gamboa	Tecnica Administrativa	Terra Ingenieros Civiles S.A.S	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 6/25/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 4267 de 2023,
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUALILO MUNICIPIO FLORIAN

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL GUALILO DEL MUNICIPIO FLORIAN DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1631 - 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Aclarar dudas sobre los formatos que se deben llevar en la obra y informes mensuales y semanales.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Se presento los formatos a tener en cuenta para el desarrollo de la obra, ademas se aclaro las fechas de entrega de informes:
Informe semanal: miercoles en la tarde.
Informe mensual: día 3 de cada mes.
Se hablo delalcance de los estudios y diseños que se deben prentar.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 6/25/2024
(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 10:00 a.m del dia 25 de junio de 2024 se reunieron virtualmente la interventoria y los ingenieros residentes de las obras de construccion de paca huella, donde impartieron pautas por partes de la interventoria para la optimizacion de los presupuestos de los convenios de tal manera que ayuden al mejor aprovechamientos de estos por parte de las juntas de accion comunal, se hablo de actualizacion de precios de materiales de cada zona, elaboracion de estudios y diseños, presentacion de informes, elaboracion y llenado de formatos necesarios para el control de las obras.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 6/25/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
Revizar y actualizar presupuesto administrativo		
Proxima reunion 02/07/2024		

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 7/2/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
Jorge Ricardo Cardenas Garcia	Residente de Interventoria	Terra Ingenieros Civiles S.A.S	
Karol Kristina Blanco Del Toro	Profesional Social	Terra Ingenieros Civiles S.A.S	
Stephany Rondano Gamboa	Tecnica Administrativa	Terra Ingenieros Civiles S.A.S	
Edwar Alfonso Fajardo Delgado	Residente de obra	JACL VEREDA GUALILO MUNICIPIO FLORIAN	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 24/06/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 4367 - 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL GAITAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL GAITAL DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1631 - 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

AVANCE DEL OBRA EN EL PROYECTO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL GAITAL DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

CONTRATACIÓN DE PERSONAL
REVISIÓN DEL SECTOR A INTERVENIR

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 24/06/2024
(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

EN LA REUNIÓN DEL DÍA 24 DE JUNIO DE AÑO 2024 SE PRESENTARON AL CONSIDERACIÓN DOS TEMAS FUNDAMENTALES, EL PRIMERO DE ELLOS FUE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO HASTA EL MOMENTO PARA EL PROYECTO EL CUAL TIENE COMO RESIDENTE DE OBRA AL INGENIERO GUSTAVO ANDRES VARGAS GAMBOA Y A LA CONTADOR JUAN HARVEY RAMÍREZ CAMACHO LOS CUALES HA VENIDO DESARROLLANDO ACTIVIDADES FINANCIERAS DE PRESUPUESTO, Y COMO SEGUNDO TEMA SE VERIFICO EL SECTOR A INTERVENIR EVIDENCIANDO UNA PROBLEMÁTICA LA CUAL TIENE COMO FUNDAMENTO LA EXPOSICIÓN DE LLUVIAS SUBTERRÁNEAS CON UNA LONGITUD EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE 7 METROS DE LA LAGO POR EL ACHO DE LA VÍA QUE ES DE 4,20 METROS, LO ACORDADO PARA DARLE SOLUCIÓN AL TEMA ES REALIZAR UN INFORME EJECUTIVO EXPONIENDO LA PROBLEMÁTICA Y PLATEAR POSIBLES ALTERNATIVAS QUE NOS PERMITAN DARLE MANEJO A LA DIFICULTAD PRESENTADA Y PRESENTARLO PARA APROBACIÓN DE LA INTERVENTORÍA.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 24/06/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
INFORME EJECUTIVO SOBRE INFILTRACION DE AGUAS	viernes, 28 de junio de 2024	ING Gustavo vargas


FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Gustavo Andres Vargas Gamboa	Ingeniero Residente de Obra	Junta de Accion Comunal	
Jorge Ricardo Cárdenas García	Residente de Interventoría	Terra Ingenieros Civiles S.A.S	
Karol Kristina Blanco Del Toro	Profesional Social	Terra Ingenieros Civiles S.A.S	
Stephany Rondano Gamboa	Tecnica Administrativa	Terra Ingenieros Civiles S.A.S	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 24/06/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. Convenio 4357 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TUBAVITA MUNICIPIO DE VELEZ SANTANDER

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA TUBAVITA DEL MUNICIPIO DE VELEZ-SANTANDER EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1631 - 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Se realiza comité de obra entre la interventoria y la presidenta de la junta de accion comunal de la vereda Tubavita del municipio de Vélez Santander en compañía de la ing residente de obra, el comite se realiza con el fin de presentar avances e inquietudes de la ejecucion del contrato especificacmente sobre lo relacionado a los estudios y diseños, asi como la elaboracion de los informes semanales que deben complementar ambas partes.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. Envio por parte de la junta de accion comunal de cotizaciones para la aprobacion de la interventoria sobre los estudios y diseños.
2. Actualizacion del presupuesto de obra con precios actualizados y verificacion del alcance real del contrato.
3. Elaboracion en conjunto de informe semanal y complemento por parte de la ing residente de obra.
4. Temas varios.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	24/06/2024

(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 10:30 de la mañana del dia de hoy se lleva a cabo comité para socializar los temas anteriormente mencionados, la presidenta de la Junta de accion comunal Gladys Chacon y la ing residente de obra Maria Camila Diaz informan que se tienen a disposicion dos cotizaciones para la realización de estudios y diseños y solicitan que la interventoria las verifique y apruebe con cual de ellas se va a trabajar para asi dar inicio a los trabajos y posteriormente iniciar la obra, de igual manera el ing Interventor Ricardo Cardenas solicita un oficio remisorio con la informacion para poder dar tramite.

Tambien el ing Interventor Ricardo Cardenas pide a la mayor brevedad la actualizaciones de precios en el presupuesto y la colaboracion para tener al dia los informes semanales que se deben realizar para el proyecto, a lo que la Ing residente de obra Maria Camila informa que se pondra al dia en tiempos plasmados como compromisos.

Sin mas temas que dialogar se da por finalizada la reunion y se generan compromisos.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 24/06/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Realizacion de oficio remisorio con las cotizaciones para estudios y diseños.	Martes 25/06/2024	Ing de obra Maria Diaz y Presidenta Gladys Chacon
Avance de actualizacion de presupuesto de obra.	Lunes 08/07/2024	Ing de obra Maria Diaz
Envio informe semanal pata complementacion.	Lunes 24/06/2024	Ing interventor Ricardo Cardenas

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 2/07/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Ing Maria Diaz	Ing Residente de Obra	Ing. Residente JAC Tubavita-Velez	
Jorge Ricardo Cardenas Garcia	Residente de Interventoria	Terra Ingenieros Civiles S.A.S	
Karol Kristina Blanco Del Toro	Profesional Social	Terra Ingenieros Civiles S.A.S	
Stephany Rondano Gamboa	Tecnica Administrativa	Terra Ingenieros Civiles S.A.S	Stephany Rondano

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 6/24/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. Convenio 4424 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TEBAIDA MUNICIPIO VELEZ

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA DE TEBAIDA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1631 - 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Esta reunion se realizo con el objetivo de presentar a la interventoria el residente de obra que forma parte del personal minimo que establece el convenio de asunto.
Solicitar por parte de la junta claridad en los aspectos de revision de los costos directos y administrativos del CONVENIO.
Solicitar a la interventoria claridad sobre el alcance de la revision de los estudios y diseños.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Los temas que se trataron en la reunion fueron:contratacion, estudios y diseños, presupuesto y programacion de obra se espera aprobacion de cotizacion de estudios y diseños y se inicia la revision de los precios unitarios para determinar el alcance fisico del CONVENIO.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	6/24/2024

(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El dia 24 de junio del 2024 se realizo reunion en cabeza del profesional de interventoria por parte de (INVIAS) presidente de JAC Vereda TEBAIDA con residente de obra y del municipio de la Velez, Santander. Se realiza socializacion del proyecto de placa huellas donde se aclararon los temas de contratacion del personal minimo , revision y/o ajuste a estudios y diseños, ajuste del presupuesto y ejecucuion de la obra. por parte de interventoria se pidio de manera urgente la cotizacion de estudios y diseños para aprobacion y poder ejecutar la actividad dentro del plazo establecido.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 6/24/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
Entrega de acta de reunion	Tuesday, June 25, 2024	
Entrega cotizacion estudios y diseños	Tuesday, July 2, 2024	
Ajuste presupuesto	Tuesday, July 2, 2024	

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 7/2/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
Jorge Ricardo Cardenas Garcia	Residente de Interventoria	Terra Ingenieros Civiles S.A.S	
Karol Kristina Blanco Del Toro	Profesional Social	Terra Ingenieros Civiles S.A.S	
Stephany Rondano Gamboa	Tecnica Administrativa	Terra Ingenieros Civiles S.A.S	
Miguel Angel Masmela Zapat	Residente de obra	JAC TEBAIDA	
Nestor Idelfonso Fontecha	Presiente de Junta	JAC TEBAIDA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 25/06/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 2
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. Convenio 4478 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNION MUNICIPIO GUAVATA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA UNION DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1631 - 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Resolver dudas respecto al desarrollo de los estudios y diseños necesarios para la iniciación de la obra.
Socializar formatos que se deben diligenciar semanal y mensualmente.
Abordar temas relacionados con la parte presupuestal del proyecto.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Presupuesto de obra, estudios y diseños, formatos de presentación de avances.

FECHA	25/06/2024

(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se hace socialización sobre cómo va el avance de los trabajos de formulación de estudios y diseños para la vereda la unión en el municipio de Guavatá
Se hace una explicación de cómo se deben diligenciar los formatos que se deben enviar semanal y mensualmente.
Se resuelven dudas del presupuesto y se enfatiza en que se deben radicar los estudios y diseños pronto ante la interventoría para poder realizar el presupuesto de obra ajustado.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 25/06/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Reunión el día 02 de julio de 2024 para revisar el avance del ajuste presupuestal por parte del residente de interventoría.	martes, 2 de julio de 2024	JEISON LEANDRO CAMACHO JORGE RICARDO CARDENAS

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 2/07/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Jorge Ricardo Cardenas Garcia	Residente de Interventoria	Terra Ingenieros Civiles S.A.S	
Karol Kristina Blanco Del Toro	Profesional Social	Terra Ingenieros Civiles S.A.S	
Stephany Rondano Gamboa	Tecnica Administrativa	Terra Ingenieros Civiles S.A.S	
Jeison Leandro Camacho	Residente de Obra	JAC VDA La Union	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 25/06/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. Convenio 4490 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ORGANOS MUNICIPIO SUCRE

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ORGANOS DEL MUNICIPIO DE SUCRE, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1631 - 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Revisar el avance del convenio y aclarar dudas para la revisión y Ajuste De Diseños así como para el reajuste presupuestal.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Presencentacion personal de apoyo de Interventoría

Socialización general estado del convenio

Revisión de Avances en la ejecución

Dudas y respuestas para adecuado desarrollo del convenio.

Revisión de formatos para entrega de informes semanales y mensuales de desarrollo del convenio.

Tema varios.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	25/06/2024

(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La reunión se Desarrolla de manera virtual donde se conectaron los participantes relacionados en la presente acta. Siendo las 10 de la mañana se inicia con el saludo de bienvenida y la presentación de los integrantes del equipo de trabajo por parte de la interventoría , De manera general se socializa por parte de la interventoría el avance actual en tiempo y en ejecución del convenio, se manifiesta se encuentra en proceso el cambio de firmas de la interventoría ante las entidades bancarias para el manejo de recursos. Por parte del residente de obra se expresa el avance en la cotización de insumos y el reajuste del precios para la actualización del presupuesto de obra , también se manifiesta el contrato realizado por la junta de acción comunal con la empresa Solenopsis Laboratorio de Suelos para el reajuste de estudios y diseños que ya se viene adelantando, por ultimo se presenta por parte del equipo de interventoría los formatos para el seguimiento y presentación semanal y mensual del avance del proyecto, el residente se componente a enviarlos en la fechas establecidas acorde al tipo de informe , Se define la fecha para la próxima reunión y se da por terminada la reunión dejando el compromiso para empezar con la entrega de los primeros informes semanales y mensuales.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 25/06/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Envió de informes semanales	27 de junio de 2024	Cristian Ivan Marin Quitian
Envió de informes Mensual	2 de julio de 2024	Cristian Ivan Marin Quitian

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 2/07/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Jorge Ricardo Cardenas Garcia	Residente de Interventoria	Terra Ingenieros Civiles S.A.S	
Karol Kristina Blanco Del Toro	Profesional Social	Terra Ingenieros Civiles S.A.S	
Stephany Rondano Gamboa	Tecnica Administrativa	Terra Ingenieros Civiles S.A.S	
Cristian Ivan Marin Quitian	Ing Residente de obra	Junta de Accion Comunal de Organos	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 25/06/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. Convenio 4767 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA POPOA MUNICIPIO GUAVATA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA POPOA DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1631 - 2024
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Resolver dudas respecto a los estudios y diseños del proyecto.
Socializar formatos que se deben diligenciar semanalmente y mensualmente.
Abordar temas con respecto al presupuesto y cómo la junta va a disponer de la plata para el proyecto.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Estudios y Diseños
Formatos
Presupuesto de obra
Dificultad de Presupuesto disponible para estudios y diseños

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	25/06/2024

(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza una presentación de cómo va el avance del proyecto. Vda Popoa, ya hizo ensayo CBR, levantamiento topográfico y está realizando estudio de Tránsito.

Se hace una explicación de cómo se deben diligenciar los formatos que se deben enviar semanalmente y mensualmente.

Se resuelven dudas del presupuesto y se enfatiza en que se deben radicar los estudios y diseños pronto ante la interventoría para poder realizar el presupuesto de obra ajustado.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 25/06/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
Enviar informe semana 5	miércoles, 26 de junio de 2024	Ing Residente de obra

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 02/07/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
Jorge Ricardo Cardenas Garcia	Residente de Interventoria	Terra Ingenieros Civiles S.A.S	
Karol Kristina Blanco Del Toro	Profesional Social	Terra Ingenieros Civiles S.A.S	
Stephany Rondano Gamboa	Tecnica Administrativa	Terra Ingenieros Civiles S.A.S	
Viviana Paola Rodriguez Ariza	Residente de Obra	Junta de Acción Comunal Popoa	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Bogotá, Junio 01 de 2024

TIC-INVIAS-1631-009

Doctora
Nelcy Téllez Marín
Alcalde Municipio de Sucre
correo: contactenos@sucre-santander.gov.co
Sucre -Santander

REF: **Contrato No. 1631 DE 2024 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.".**

ASUNTO: Invitación socialización de inicio de Convenios Solidarios para el mejoramiento y mantenimiento vial de las Juntas de Acción Comunal del municipio de Sucre en el Departamento de Santander, en el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, Convenio 4490.

Respetada Doctora

El Instituto Nacional de Vías – INVIAS se encuentra implementando el Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, el cual busca contribuir a la transformación de los territorios y economía popular de las comunidades rurales del país, a través del mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de vías terciarias con la participación directa de Organismos de Acción Comunal.

En este contexto, la Dirección Territorial de Santander del INVIAS tiene el gusto de invitarla a las Socializaciones de Inicio de los Convenios Solidarios que se desarrollarán en el municipio de Sucre, los cuales se llevarán a cabo de la siguiente manera:

Convenio No. 4490-2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ORGANOS

Lugar: Concentración Rural Sergio Ariza sede J – Vereda Órganos

Fecha: 05 de Junio de 2024

Hora: 09:00 am

En este espacio se informarán las diferentes actividades a realizar, por lo cual se espera contar con su valiosa participación.

Para mayor información, comunicarse con la Profesional Social Karol Kristina Blanco del Toro, al teléfono: 3008812882 o con el Ingeniero Jorge Cárdenas al número 3046500495.

Cordialmente,



JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría

Proyectó: Karol Kristina Blanco del Toro – Profesional Social Interventoría

Copia: DEISY CORREA JAIMES – Profesional Social DT Santander (dcorrea@invias.gov.co)
CLAUDIA GOMEZ – Profesional Social DT Santander – (crgomez@invias.gov.co)

TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

Bogotá, Junio 01 de 2024

TIC-INVIAS-1631-010

Doctor
Herison Burgos
Personero Municipio de Sucre
correo: personeria@sucre-santander.gov.co
Sucre -Santander

REF: **Contrato No. 1631 DE 2024 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.".**

ASUNTO: Invitación socialización de inicio de Convenios Solidarios para el mejoramiento y mantenimiento vial de las Juntas de Acción Comunal del municipio de Sucre en el Departamento de Santander, en el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, Convenio 4490.

Respetado Doctor

El Instituto Nacional de Vías – INVIAS se encuentra implementando el Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, el cual busca contribuir a la transformación de los territorios y economía popular de las comunidades rurales del país, a través del mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de vías terciarias con la participación directa de Organismos de Acción Comunal.

En este contexto, la Dirección Territorial de Santander del INVIAS tiene el gusto de invitarla a las Socializaciones de Inicio de los Convenios Solidarios que se desarrollarán en el municipio de Sucre, los cuales se llevarán a cabo de la siguiente manera:

Convenio No. 4490-2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ORGANOS

Lugar: Concentración Rural Sergio Ariza sede J – Vereda Órganos

Fecha: 05 de Junio de 2024

Hora: 09:00 am

En este espacio se informarán las diferentes actividades a realizar, por lo cual se espera contar con su valiosa participación.

Para mayor información, comunicarse con la Profesional Social Karol Kristina Blanco del Toro, al teléfono: 3008812882 o con el Ingeniero Jorge Cárdenas al número 3046500495.

Cordialmente,



JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría

Proyectó: Karol Kristina Blanco del Toro

Copia: DEISY CORREA JAIMES – Profesional Social DT Santander (dcorrea@invias.gov.co)
CLAUDIA GOMEZ – Profesional Social DT Santander – (crgomez@invias.gov.co)

TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

Bogotá, Junio 01 de 2024

TIC-INVIAS-1631-011

Doctor
Roniver Raúl Pérez Galeano
Alcalde Municipio de Bolívar
correo: alcaldia@bolivar-santander.gov.co
Bolívar -Santander

REF: **Contrato No. 1631 DE 2024 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.".**

ASUNTO: Invitación socialización de inicio de Convenios Solidarios para el mejoramiento y mantenimiento vial de las Juntas de Acción Comunal del municipio de Bolívar en el Departamento de Santander, en el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, Convenio 3951.

Respetado Doctor

El Instituto Nacional de Vías – INVIAS se encuentra implementando el Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, el cual busca contribuir a la transformación de los territorios y economía popular de las comunidades rurales del país, a través del mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de vías terciarias con la participación directa de Organismos de Acción Comunal.

En este contexto, la Dirección Territorial de Santander del INVIAS tiene el gusto de invitarlo a las Socializaciones de Inicio de los Convenios Solidarios que se desarrollarán en el municipio de Bolívar, los cuales se llevarán a cabo de la siguiente manera:

Convenio No. 3951-2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL GUAMAL

Lugar: Residencia de la Sra Hilda Quiroga Vereda Guamal

Fecha: 05 de Junio de 2024

Hora: 11: 30 am

En este espacio se informarán las diferentes actividades a realizar, por lo cual se espera contar con su valiosa participación.

Para mayor información, comunicarse con la Profesional Social Karol Kristina Blanco del Toro, al teléfono: 3008812882 o con el Ingeniero Jorge Cárdenas al número 3046500495.

Cordialmente,

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría

Proyectó: Karol Kristina Blanco del Toro

Copia: DEISY CORREA JAIMES – Profesional Social DT Santander (dcorrea@invias.gov.co)
CLAUDIA GOMEZ – Profesional Social DT Santander – (crgomez@invias.gov.co)

TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

Bogotá, Junio 01 de 2024

TIC-INVIAS-1631-012

Doctora
Nubia Cruz
Personería Municipio de Bolívar
correo: notificacionjudicial@bolivar-santander.gov.co
Bolívar -Santander

REF: **Contrato No. 1631 DE 2024 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.".**

ASUNTO: Invitación socialización de inicio de Convenios Solidarios para el mejoramiento y mantenimiento vial de las Juntas de Acción Comunal del municipio de Bolívar en el Departamento de Santander, en el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, Convenio 3951.

Respetada Doctora

El Instituto Nacional de Vías – INVIAS se encuentra implementando el Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, el cual busca contribuir a la transformación de los territorios y economía popular de las comunidades rurales del país, a través del mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de vías terciarias con la participación directa de Organismos de Acción Comunal.

En este contexto, la Dirección Territorial de Santander del INVIAS tiene el gusto de invitarla a las Socializaciones de Inicio de los Convenios Solidarios que se desarrollarán en el municipio de Bolívar, los cuales se llevarán a cabo de la siguiente manera:

Convenio No. 3951-2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL GUAMAL

Lugar: Residencia de la Sra Hilda Quiroga Vereda Guamal

Fecha: 05 de Junio de 2024

Hora: 11: 30 am

En este espacio se informarán las diferentes actividades a realizar, por lo cual se espera contar con su valiosa participación.

Para mayor información, comunicarse con la Profesional Social Karol Kristina Blanco del Toro, al teléfono: 3008812882 o con el Ingeniero Jorge Cárdenas al número 3046500495.

Cordialmente,

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría

Proyectó: Karol Kristina Blanco del Toro

Copia: DEISY CORREA JAIMES – Profesional Social DT Santander (dcorrea@invias.gov.co)
CLAUDIA GOMEZ – Profesional Social DT Santander – (crgomez@invias.gov.co)

TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

Bogotá, Junio 01 de 2024

TIC-INVIAS-1631-013

Doctor
José Joaquín Cubides Ariza
Alcalde Municipio de Guavatá
correo: alcaldia@guavata-santander.gov.co
Guavatá -Santander

REF: **Contrato No. 1631 DE 2024 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.".**

ASUNTO: Invitación socialización de inicio de Convenios Solidarios para el mejoramiento y mantenimiento vial de las Juntas de Acción Comunal del municipio de Guavatá en el Departamento de Santander, en el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, Convenios 4767 y 4478.

Respetado Doctor

El Instituto Nacional de Vías – INVIAS se encuentra implementando el Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, el cual busca contribuir a la transformación de los territorios y economía popular de las comunidades rurales del país, a través del mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de vías terciarias con la participación directa de Organismos de Acción Comunal.

En este contexto, la Dirección Territorial de Santander del INVIAS tiene el gusto de invitarlo a las Socializaciones de Inicio de los Convenios Solidarios que se desarrollarán en el municipio de Guavatá, los cuales se llevarán a cabo de la siguiente manera:

Convenio No. 4478-2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA UNIÓN

Lugar: Plan de Parras – Vereda la Unión

Fecha: 05 de Junio de 2024

Hora: 02:00 pm

Convenio No. 4767-2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL POPOA

Lugar: Biblioteca Municipal - Guavatá

Fecha: 05 de Junio de 2024

Hora: 04:00 Pm

En este espacio se informarán las diferentes actividades a realizar, por lo cual se espera contar con su valiosa participación.

Para mayor información, comunicarse con la Profesional Social Karol Kristina Blanco del Toro, al teléfono: 3008812882 o con el Ingeniero Jorge Cárdenas al número 3046500495.

Cordialmente,

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría

Proyectó: Karol Kristina Blanco del Toro

Copia: DEISY CORREA JAIMES – Profesional Social DT Santander (dcorrea@invias.gov.co)
CLAUDIA GOMEZ – Profesional Social DT Santander – (crgomez@invias.gov.co)

TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

Bogotá, Junio 01 de 2024

TIC-INVIAS-1631-014

Doctora
Daniela Bello Ariza
Personera Municipio de Guavatá
correo: personeriaguavata2022@gmail.com
Guavatá -Santander

REF: **Contrato No. 1631 DE 2024 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.".**

ASUNTO: Invitación socialización de inicio de Convenios Solidarios para el mejoramiento y mantenimiento vial de las Juntas de Acción Comunal del municipio de Guavatá en el Departamento de Santander, en el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, Convenios 4767 y 4478.

Respetada Doctora

El Instituto Nacional de Vías – INVIAS se encuentra implementando el Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, el cual busca contribuir a la transformación de los territorios y economía popular de las comunidades rurales del país, a través del mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de vías terciarias con la participación directa de Organismos de Acción Comunal.

En este contexto, la Dirección Territorial de Santander del INVIAS tiene el gusto de invitarla a las Socializaciones de Inicio de los Convenios Solidarios que se desarrollarán en el municipio de Guavatá, los cuales se llevarán a cabo de la siguiente manera:

Convenio No. 4478-2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA UNIÓN

Lugar: Plan de Parras – Vereda la Unión

Fecha: 05 de Junio de 2024

Hora: 02:00 pm

Convenio No. 4767-2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL POPOA

Lugar: Biblioteca Municipal - Guavatá

Fecha: 05 de Junio de 2024

Hora: 04:00 Pm

En este espacio se informarán las diferentes actividades a realizar, por lo cual se espera contar con su valiosa participación.

Para mayor información, comunicarse con la Profesional Social Karol Kristina Blanco del Toro, al teléfono: 3008812882 o con el Ingeniero Jorge Cárdenas al número 3046500495.

Cordialmente,

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría

Proyectó: Karol Kristina Blanco del Toro

Copia: DEISY CORREA JAIMES – Profesional Social DT Santander (dcorrea@invias.gov.co)
CLAUDIA GOMEZ – Profesional Social DT Santander – (crgomez@invias.gov.co)

TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

Bogotá, Junio 01 de 2024

TIC-INVIAS-1631-015

Doctora
Deisy Yasmid Correa Jaimes
Profesional Social DT Santander
correo: dcorrea@invias.gov.co)
Floridablanca -Santander

REF: **Contrato No. 1631 DE 2024 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.".**

ASUNTO: Cronograma de Socialización de Programa Camino Comunitarios de la Paz de Total

Respetada Doctora

En el marco de inicio de contrato de interventoría se establece cronograma de las Socializaciones de Inicio de los Convenios Solidarios que se desarrollarán en los municipios de Bolívar, Sucre, Florián, La Belleza, Vélez, y Guavatá los cuales se llevarán a cabo de la siguiente manera:

Municipio: Sucre

Convenio No. 4490-2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL ORGANOS

Lugar: Concentración Rural Sergio Ariza sede J – Vereda Órganos

Fecha: 05 de Junio de 2024

Hora: 09:00 am

Municipio: Bolívar

Convenio No. 3951-2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL GUAMAL

Lugar: Residencia de la Sra Hilda Quiroga Vereda Guamal

Fecha: 05 de Junio de 2024

Hora: 11: 30 am

Municipio: Guavatá

Convenio No. 4478-2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA UNIÓN

Lugar: Plan de Parras – Vereda la Unión

Fecha: 05 de Junio de 2024

Hora: 02:00 pm

Convenio No. 4767-2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL POPOA

Lugar: Biblioteca Municipal - Guavatá

Fecha: 05 de Junio de 2024

Hora: 04:00 Pm

Municipio: Vélez

Convenio No. 4565-2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA PALMERA

Lugar: Escuela rural Vereda la Palmera

Fecha: 06 de Junio de 2024

Hora: 08:00 a

Convenio No. 4357-2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL TUBAVITA

Lugar: Residencia de la Profesora Oliva de Vanegas – Sector San Victorino

Fecha: 06 de Junio de 2024

Hora: 10:00 am

Convenio No. 4424-2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL TEBAIDA

Lugar: Escuela rural Vereda Tebaida

Fecha: 06 de Junio de 2024

Hora: 11: 30 am

Convenio No. 4367-2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL GAITAL

Lugar: Escuela rural el Gaital

Fecha: 06 de Junio de 2024

Hora: 02:00 pm

Cordialmente,

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría

Proyectó: KAROL KRISTINA BLANCO DEL TORO

Copia: CLAUDIA GOMEZ – Profesional Social DT Santander – (crgomez@invias.gov.co)

TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

Bogotá, Junio 01 de 2024

TIC-INVIAS-1631-016

Doctor
Orlando Ariza Ariza
Alcalde Municipio de Vélez
correo: alcaldia@velez-santander.gov.co, contactenos@velez-santander.gov.co
Vélez-Santander

REF: **Contrato No. 1631 DE 2024 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.".**

ASUNTO: Invitación socialización de inicio de Convenios Solidarios para el mejoramiento y mantenimiento vial de las Juntas de Acción Comunal del municipio de Vélez en el Departamento de Santander, en el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, Convenios 4357- 4565- 4367- 4424.

Respetado Doctor

El Instituto Nacional de Vías – INVIAS se encuentra implementando el Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, el cual busca contribuir a la transformación de los territorios y economía popular de las comunidades rurales del país, a través del mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de vías terciarias con la participación directa de Organismos de Acción Comunal.

En este contexto, la Dirección Territorial de Santander del INVIAS tiene el gusto de invitarlo a las Socializaciones de Inicio de los Convenios Solidarios que se desarrollarán en el municipio de Vélez, los cuales se llevarán a cabo de la siguiente manera:

Convenio No. 4565-2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA PALMERA

Lugar: Escuela rural Vereda la Palmera

Fecha: 06 de Junio de 2024

Hora: 08:00 am

Convenio No. 4357-2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL TUBAVITA

Lugar: Residencia de la Profesora Oliva de Vanegas – Sector San Victorino

Fecha: 06 de Junio de 2024

Hora: 10:00 am

Convenio No. 4424-2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL TEBAIDA

Lugar: Escuela rural Vereda Tebaida

Fecha: 06 de Junio de 2024

Hora: 11: 30 am

Convenio No. 4367-2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL GAITAL

Lugar: Escuela rural Vereda el Gaital

Fecha: 06 de Junio de 2024

Hora: 02:00 pm

En este espacio se informarán las diferentes actividades a realizar, por lo cual se espera contar con su valiosa participación.

Para mayor información, comunicarse con la Profesional Social Karol Kristina Blanco del Toro, al teléfono: 3008812882 o con el Ingeniero Jorge Cárdenas al número 3046500495.

Cordialmente,

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría

Proyectó: Karol Kristina Blanco del Toro

Copia: DEISY CORREA JAIMES – Profesional Social DT Santander (dcorrea@invias.gov.co)
CLAUDIA GOMEZ – Profesional Social DT Santander – (crgomez@invias.gov.co)

Bogotá, Junio 01 de 2024

TIC-INVIAS-1631-017

Doctor
Nelson Fernando Muñoz Ayala
Personero Municipio de Vélez
correo: personeria@velez-santander.gov.co
Vélez-Santander

REF: **Contrato No. 1631 DE 2024 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.".**

ASUNTO: Invitación socialización de inicio de Convenios Solidarios para el mejoramiento y mantenimiento vial de las Juntas de Acción Comunal del municipio de Vélez en el Departamento de Santander, en el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, Convenios 4357- 4565- 4367- 4424.

Respetado Doctor

El Instituto Nacional de Vías – INVIAS se encuentra implementando el Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, el cual busca contribuir a la transformación de los territorios y economía popular de las comunidades rurales del país, a través del mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de vías terciarias con la participación directa de Organismos de Acción Comunal.

En este contexto, la Dirección Territorial de Santander del INVIAS tiene el gusto de invitarlo a las Socializaciones de Inicio de los Convenios Solidarios que se desarrollarán en el municipio de Vélez, los cuales se llevarán a cabo de la siguiente manera:

Convenio No. 4565-2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA PALMERA

Lugar: Escuela rural Vereda la Palmera

Fecha: 06 de Junio de 2024

Hora: 08:00 am

Convenio No. 4357-2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL TUBAVITA

Lugar: Residencia de la Profesora Oliva de Vanegas – Sector San Victorino

Fecha: 06 de Junio de 2024

Hora: 10:00 am

Convenio No. 4424-2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL TEBAIDA

Lugar: Escuela rural Vereda Tebaida

Fecha: 06 de Junio de 2024

Hora: 11: 30 am

Convenio No. 4367-2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL EL GAITAL

Lugar: Escuela rural Vereda el Gaital

Fecha: 06 de Junio de 2024

Hora: 02:00 pm

En este espacio se informarán las diferentes actividades a realizar, por lo cual se espera contar con su valiosa participación.

Para mayor información, comunicarse con la Profesional Social Karol Kristina Blanco del Toro, al teléfono: 3008812882 o con el Ingeniero Jorge Cárdenas al número 3046500495.

Cordialmente,



JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría

Proyectó: Karol Kristina Blanco del Toro

Copia: DEISY CORREA JAIMES – Profesional Social DT Santander (dcorrea@invias.gov.co)
CLAUDIA GOMEZ – Profesional Social DT Santander – (crgomez@invias.gov.co)

Bogotá, Junio 01 de 2024

TIC-INVIAS-1631-018

Doctor
Néstor Orlando Delgado Pardo
Alcalde Municipio de Florián
correo: alcaldia@florian-santander.gov.co
Florián -Santander

REF: **Contrato No. 1631 DE 2024 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.".**

ASUNTO: Invitación socialización de inicio de Convenios Solidarios para el mejoramiento y mantenimiento vial de las Juntas de Acción Comunal del municipio de Florián en el Departamento de Santander, en el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, Convenio 4267.

Respetado Doctor

El Instituto Nacional de Vías – INVIAS se encuentra implementando el Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, el cual busca contribuir a la transformación de los territorios y economía popular de las comunidades rurales del país, a través del mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de vías terciarias con la participación directa de Organismos de Acción Comunal.

En este contexto, la Dirección Territorial de Santander del INVIAS tiene el gusto de invitarlo a las Socializaciones de Inicio de los Convenios Solidarios que se desarrollarán en el municipio de Florián, los cuales se llevarán a cabo de la siguiente manera:

Convenio No. 4267-2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL GUALILO

Lugar: Salón Comunal Vereda el Gualilo

Fecha: 07 de Junio de 2024

Hora: 1:30 pm

En este espacio se informarán las diferentes actividades a realizar, por lo cual se espera contar con su valiosa participación.

Para mayor información, comunicarse con la Profesional Social Karol Kristina Blanco del Toro, al teléfono: 3008812882 o con el Ingeniero Jorge Cárdenas al número 3046500495.

Cordialmente,



JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría

Proyectó: Karol Kristina Blanco del Toro

Copia: DEISY CORREA JAIMES – Profesional Social DT Santander (dcorrea@invias.gov.co)
CLAUDIA GOMEZ – Profesional Social DT Santander – (crgomez@invias.gov.co)

TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

Bogotá, Junio 01 de 2024

TIC-INVIAS-1631-019

Doctora
Yineth Narioth Tellez Perez
Alcalde Municipio de la Belleza
correo: alcaldia@labelleza-santander.gov.co
La Belleza -Santander

REF: **Contrato No. 1631 DE 2024 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.".**

ASUNTO: Invitación socialización de inicio de Convenios Solidarios para el mejoramiento y mantenimiento vial de las Juntas de Acción Comunal del municipio de Guavatá en el Departamento de Santander, en el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, Convenios 3753 y 4175.

Respetada Doctora

El Instituto Nacional de Vías – INVIAS se encuentra implementando el Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, el cual busca contribuir a la transformación de los territorios y economía popular de las comunidades rurales del país, a través del mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de vías terciarias con la participación directa de Organismos de Acción Comunal.

En este contexto, la Dirección Territorial de Santander del INVIAS tiene el gusto de invitarla a las Socializaciones de Inicio de los Convenios Solidarios que se desarrollarán en el municipio de la Belleza, los cuales se llevarán a cabo de la siguiente manera:

Convenio No. 3753 -2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CACHIPAYAL

Lugar: Kiosco Salón Comunal vereda Cachipayal

Fecha: 07 de Junio de 2024

Hora: 10:00 am

Convenio No. 3753-2023 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLIN

Lugar: Escuela de la Vereda Berlín

Fecha: 07 de Junio de 2024

Hora: 11: 30 am

En este espacio se informarán las diferentes actividades a realizar, por lo cual se espera contar con su valiosa participación.

Para mayor información, comunicarse con la Profesional Social Karol Kristina Blanco del Toro, al teléfono: 3008812882 o con el Ingeniero Jorge Cárdenas al número 3046500495.

Cordialmente,

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría

Proyectó: Karol Kristina Blanco del Toro

Copia: DEISY CORREA JAIMES – Profesional Social DT Santander (dcorrea@invias.gov.co)
CLAUDIA GOMEZ – Profesional Social DT Santander – (crgomez@invias.gov.co)

TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

Bogotá, junio 07 de 2024

TIC-INVIAS-1631-020

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS
Att: Ing. CARLOS ALBERTO PARRA SILVA.
Supervisor Contrato de Interventoría

REF: **Contrato No. 1631 DE 2024 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.".**

ASUNTO: Hoja de Vida Técnico Administrativo

Respetado Ingeniero:

De manera atenta me permito remitir la hoja de vida de STEPHANY RONDANO GAMBOA, para el cargo como técnico administrativo de esta interventoría, lo anterior para su revisión y fines pertinentes.

Atentamente,

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría

Anexo: Un (1) archivo tipo PDF

Copia: PEDRO JOSÉ BARÓN ÁVILA – APOYO A LA SUPERVISIÓN INVIAS – (pbaron@invias.gov.co)

Stephany Rondano Gamboa
Tecnólogo en Gestión Empresarial

DATOS PERSONALES

NOMBRE: Stephany Rondano Gamboa
IDENTIFICACIÓN: C.C 1002583483 de Moniquirá (Boyacá)
FECHA DE NACIMIENTO: 05 de julio del 2001
LUGAR DE NACIMIENTO: Moniquirá (Boyacá)
DIRECCIÓN: calle 18 # 11-5
TELÉFONO CELULAR: 3208920444 - 3143468185
E-MAIL: stephanyrondanogamboa@gmail.com

PERFIL PROFESIONAL

Tecnólogo en Gestión Empresarial con formación en: manejo de Excel intermedio, organización de archivos de gestión, servicio al cliente, talento humano y control de inventarios, lista para para utilizar mis habilidades técnicas como también mis habilidades blandas entre las que se encuentran mi gran capacidad de trabajo en equipo, adaptabilidad a las diferentes actividades que se realizan en el cargo asignado, creatividad y resolución de conflictos para así lograr el objetivo deseado.

Stephany Rondano Gamboa
Tecnólogo en Gestión Empresarial

ESTUDIOS REALIZADOS

TÉCNICO Y PROFESIONAL

Institución: SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje)
Titulo obtenido: Tecnólogo en Gestión Empresarial
Duración: 24 meses
Fecha de terminación: 3 de octubre del 2023

FORMACION COMPLEMENTARIA

Institución: CONDUSEF
Titulo obtenido: Diplomado en Educación Financiera
Duración: 150 horas
Fecha de terminación: Abril 2024

Institución: SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje)
Titulo obtenido: Manejo básico de la herramienta de hojas de cálculo Excel
Duración: 40 horas
Fecha de terminación: 16 de abril 2023

Institución: SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje)
Titulo obtenido: Elaborar cálculos y tablas financieras con Microsoft Excel
Duración: 50 hora
Fecha de terminación: 22 de noviembre del 2022

Institución: SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje)
Titulo obtenido: Organización de archivos de gestión
Duración: 48 horas
Fecha de terminación: 30 de junio de 2022

Institución: SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje)
Titulo obtenido: Administrativo para jefes de área trabajo seguro en alturas
Duración: 10 horas
Fecha de terminación: 9 de marzo del 2022

Institución:	SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje)
Titulo obtenido:	Fundamentos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
Duración:	40 horas
Fecha de terminación:	20 de noviembre del 2021

REFERENCIAS PERSONALES

NOMBRE:	Lina María Rondano Gamboa
OCUPACIÓN:	Inspector de Seguridad y Salud en el Trabajo
TELÉFONO:	3209023591

NOMBRE:	Faver Johan Guerrero Reyes
OCUPACIÓN:	Topógrafo
TELÉFONO:	3144710234

Stephany Rondano Gamboa

C.C. 1002582483 de Moniquirá (Boyacá)

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En Cumplimiento de la Ley 119 de 1994 y en atención a que

STEPHANY RONDANO GAMBOA

Con Cédula de Ciudadanía No. 1002582483

Cursó y aprobó el programa de Formación Profesional Integral y cumplió con las condiciones requeridas por la entidad. le confiere el

Título de

TECNÓLOGO EN

GESTIÓN EMPRESARIAL

En testimonio de lo anterior. se firma el presente Titulo en Vélez. a los doce (12) dias del mes de diciembre de dos mil veintitres (2023)

Firmado Digitalmente por

JAVIER GONZALEZ FRANCO
Subdirector (E) CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE
REGIONAL SANTANDER

79088696 - 12/12/2023
No y FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 9546002397056CC1002582483C.

HACIENDA

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN FINANCIERA

LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA
DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS OTORGA EL PRESENTE

DIPLOMA

A

STEPHANY RONDANO GAMBOA

MzY3NDQ3fDEwfDIwMjQtMDQtMDU=

POR HABER ACREDITADO CON UN PROMEDIO DE 10 LA GENERACIÓN 46 DEL
DIPLOMADO EN EDUCACIÓN FINANCIERA EN LÍNEA, CON UNA DURACIÓN DE 160 HORAS
FEBRERO - ABRIL 2024

OSCAR ROSADO JIMENEZ
PRESIDENTE DE LA CONDUSEF

CIUDAD DE MÉXICO, ABRIL 2024

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

STEPHANY RONDANO GAMBOA

Con Cédula de Ciudadanía No. 1002582483

Cursó y aprobó la acción de Formación

MANEJO BASICO DE LA HERRAMIENTA DE HOJAS DE CALCULO EXCEL

con una duración de 40 horas

En testimonio de lo anterior. se firma el presente en Vélez. a los dieciocho (18) dias del mes de abril de dos mil veintitres (2023)

Firmado Digitalmente por



ERNESTO ACEVEDO SOTO
Subdirector (E)
CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE
REGIONAL SANTANDER

90300307 - 18/04/2023
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 9546002746267CC1002582483C.

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

STEPHANY RONDANO GAMBOA

Con Cédula de Ciudadanía No. 1002582483


Cursó y aprobó la acción de Formación

ELABORAR CALCULOS Y TABLAS FINANCIERAS CON MICROSOFT EXCEL

con una duración de 50 horas

En testimonio de lo anterior. se firma el presente en Vélez. a los veintitres (23) dias del mes de noviembre de dos mil veintidos (2022)

Firmado Digitalmente por



MIGUEL ANDRE PARDO CEPEDA
Subdirector
CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE
REGIONAL SANTANDER

88035474 - 23/11/2022
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 9546002678030CC1002582483C.

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

STEPHANY RONDANO GAMBOA

Con Cedula de Ciudadania No. 1002582483

Cursó y aprobó la acción de Formación

ORGANIZACION DE ARCHIVOS DE GESTION.

con una duración de 48 horas

En testimonio de lo anterior. se firma el presente en Vélez. a los veintiocho (28) dias del mes de julio de dos mil veintidos (2022)

Firmado Digitalmente por

MIGUEL ANDRE PARDO CEPEDA
Subdirector
CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE
REGIONAL SANTANDER

84777811 - 28/07/2022
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 9546002585058CC1002582483C.

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

STEPHANY RONDANO GAMBOA

Con Cedula de Ciudadania No. 1002582483

Cursó y aprobó la acción de Formación

ADMINISTRATIVO PARA JEFES DE AREA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS

con una duración de 10 horas

En testimonio de lo anterior. se firma el presente en Barbosa. a los treinta (30) dias del mes de marzo de dos mil veintidos (2022)

Firmado Digitalmente por



MIGUEL ANDRE PARDO CEPEDA
Subdirector
CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE
REGIONAL SANTANDER

82117938 - 30/03/2022
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 9546002509954CC1002582483C.

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace constar que

STEPHANY RONDANO GAMBOA

Con Cedula de Ciudadania No. 1002582483

Cursó y aprobó la acción de Formación

FUNDAMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

con una duración de 40 horas

En testimonio de lo anterior. se firma el presente en Vélez. a los veinticuatro (24) dias del mes de noviembre de dos mil veintiuno (2021)

Firmado Digitalmente por

MIGUEL ANDRE PARDO CEPEDA
Subdirector
CENTRO DE GESTION AGROEMPRESARIAL DEL ORIENTE
REGIONAL SANTANDER

80237554 - 24/11/2021
FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 9546002455145CC1002582483C.


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NÚMERO 1.002.582.483
RONDANO GAMBOA
APELLIDOS
STEPHANY
NOMBRES
Stephany Rondano
FIRMA
FECHA DE NACIMIENTO 05-JUL-2001
MONIQUIRA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.66
ESTATURA
A+
G.S. RH
F
SEXO
23-JUL-2019 MONIQUIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
P-0716000-01108416-F-1002582483-20191107
0068775823A 1
51621423

Bogotá, junio 11 de 2024

TIC-INVIAS-1631-021

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAMAL
Atn. VÍCTOR MANUEL GALEANO ARIZA.
Representante Legal
Vereda Guamal – Bolívar Santander

REF: **N° 3951 de 2023 Cuyo objeto es:** "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GUAMAL DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ASUNTO: APROBACIÓN HOJAS DE VIDA CONVENIO 3951 DE 2023

Cordial saludo,

En atención a la solicitud, y una vez revisadas las hojas de vida allegadas a esta interventoría, atendiendo el numeral 6.1. Requisitos del personal del ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS nos complace aprobar el personal siguiente:

1. **CARGO: INGENIERO RESIDENTE**
   NOMBRE: RODRIGO ALFONSO GOMEZ TORRES
   IDENTIFICACIÓN: 91.251.084 de Bucaramanga
   MATRICULA PROFESIONAL No. 68202 – 49903 STD

2 **CARGO: CONTADOR**
   NOMBRE: NANCY ANDREA DURÁN VALDIVIESO
   IDENTIFICACIÓN: 28.034.878 de Bolívar Santander
   MATRICULA PROFESIONAL No. 229734-T

Sin otro particular;

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría

Proyectó: Ing. Jorge Cárdenas
Revisó: Ing. Jorge Forero

Bogotá, junio 07 de 2024

TIC-INVIAS-1631-021

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS
Att: Ing. CARLOS ALBERTO PARRA SILVA.
Supervisor Contrato de Interventoría

Att: Ing. PEDRO JOSÉ BARÓN
Apoyo supervisión Interventoría

REF: **Contrato No. 1631 DE 2024 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.".**

ASUNTO: Póliza actualizada con orden de inicio

De manera atenta nos permitimos enviar la póliza de garantía de nuestro contrato de la referencia actualizada según orden de inicio, para su revisión y fines pertinentes.

Atentamente,

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría

Anexo: Archivo PDF (2 folios)

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**CALLE 100**	**33**	**33-44-101249469**	**3**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	**05**	**2024**	**27**	**05**	**2024**	**00:00**	**27**	**09**	**2029**	**23:59**	**ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	**NIT: 860.038.275-3**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AK 15 NRO. 100 - 69 OFICINA 306	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3122958359

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**NIT: 800.215.807-2**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 25 G NRO. 73 B - 90	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO, LA CALIDAD DEL SERVICIO, EL BUIEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMINAZACIONES LABORALES PARA EL CONTRATO NO.1631 - 2024 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL
MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL LOTE 2.
-
EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CUENTA CON UNA VIGENCIA DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**27/05/2024**	**29/03/2025**	**$39,409,349.00**	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	**27/05/2024**	**29/03/2025**	**$78,818,698.00**	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**27/05/2024**	**29/09/2027**	**$78,818,698.00**	
CALIDAD DEL SERVICIO	**27/09/2024**	**27/09/2029**	**$118,228,047.00**	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON ORDEN DE INICIO DE FECHA 27 DE MAYO DE 2024, SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,915,196.00	$ ******28,000.00	$ *****369,207.00	$ *********2,312,403.00	$ ******315,274,792.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DIEGO ALEJANDRO SANCHEZ HERRERA	230579	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.

33-44-101249469

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CALLE 100	33	33-44-101249469	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	05	2024	27	05	2024	00:00	27	09	2029	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S		**NIT: 860.038.275-3**
DIRECCIÓN: AK 15 NRO. 100 - 69 OFICINA 306	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3122958359

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		**NIT: 800.215.807-2**
DIRECCIÓN: CR 25 G NRO. 73 B - 90	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	7056000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.

33-44-101249469

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bogotá, junio 11 de 2024

TIC-INVIAS-1631-022

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA POPOA
Atn. ADRIANA GERENA GONZALES.
Representante Legal
Vereda Popoa – Guavata Santander

REF: **CONVENIO N° 4767 de 2023 Cuyo objeto es:** "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA POPOA DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ASUNTO: APROBACIÓN HOJAS DE VIDA CONVENIO 4767 DE 2023

Cordial saludo,

En atención a la solicitud, y una vez revisadas las hojas de vida allegadas a esta interventoría, atendiendo el numeral 6.1. Requisitos del personal del ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS nos complace aprobar el personal siguiente:

1. **CARGO: INGENIERO RESIDENTE**
   NOMBRE: VIVIANA PAOLA RODRIGUEZ ARIZA
   IDENTIFICACIÓN: 1.101.174.865 de Puente Nacional
   MATRICULA PROFESIONAL No. 25202215781 CND

Sin otro particular;

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría

Proyectó: Ing. Jorge Cárdenas
Revisó: Ing. Jorge Forero

Bogotá, junio 11 de 2024

TIC-INVIAS-1631-023

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ÓRGANOS
Atn. LEIDI JOHANA CARANTON CARANTON.
Representante Legal
Vereda Órganos – Sucre Santander

REF: **CONVENIO N° 4490 de 2023 Cuyo objeto es**: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ORGANOS DEL MUNICIPIO DE SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ASUNTO: APROBACION HOJAS DE VIDA CONVENIO 4490 DE 2023

Cordial saludo,

En atención a la solicitud, y una vez revisadas las hojas de vida allegadas a esta interventoría, atendiendo el numeral 6.1. Requisitos del personal del ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS nos complace aprobar el personal siguiente:

1. **CARGO: INGENIERO RESIDENTE**
   NOMBRE: CRISTIAN IVAN MARIN QUITIANA
   IDENTIFICACIÓN: 1.101.178.503 de Puente Nacional
   MATRICULA PROFESIONAL No. 151037-0508189 STD

2. **CARGO: CONTADOR**
   NOMBRE: LEILA MARÍA REYES MOSQUERA
   IDENTIFICACIÓN: 63.438.463 de Vélez
   MATRICULA PROFESIONAL No. 233326-T

Sin otro particular;

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Proyectó: Ing. Jorge Cárdenas
Revisó: Ing. Jorge Forero

Bogotá, junio 14 de 2024

TIC-INVIAS-1631-024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS
Att: Ing. CARLOS ALBERTO PARRA SILVA.
Supervisor Contrato de Interventoría

Att: Ing. PEDRO JOSÉ BARÓN
Apoyo supervisión Interventoría

REF: **Contrato No. 1631 DE 2024 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.".**

ASUNTO: INFORMES SEMANALES

De manera atenta nos permitimos enviar los siguientes informes semanales:

1. Informes semanales No 1 del 27 de mayo al 30 de mayo de 2024 de los 11 convenios
2. Informes semanales No 2 del 31 de mayo al 06 de junio de 2024 de los 11 convenios
3. Informes semanales No 3 del 07 de junio al 13 de junio de 2024 de los 11 convenios

Atentamente,

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría

Anexo: Archivo RAR (contiene 33 archivos tipo PDF)

Elaboró: LYAC

Bogotá, junio 13 de 2024

TIC-INVIAS-1631-025

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUALILO
Atn. YINED RODRIGUEZ TORRES
Representante Legal
Vereda Gualilo – Florian Santander

REF: **CONVENIO N° 4267 de 2023 Cuyo objeto es**: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL GUALILO DEL MUNICIPIO FLORIAN DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL."

ASUNTO: APROBACIÓN HOJAS DE VIDA CONVENIO 4267 DE 2023

Cordial saludo,

En atención a la solicitud, y una vez revisadas las hojas de vida allegadas a esta interventoría, atendiendo el numeral 6.1. Requisitos del personal del ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS nos complace aprobar el personal siguiente:

1. **CARGO: INGENIERO RESIDENTE**
   NOMBRE: EDWAR ALFONSO FAJARDO DELGADO
   IDENTIFICACIÓN: 1.095.484.536 de Florián - Santander
   MATRICULA PROFESIONAL No. 68202208886STD

2. **CARGO: CONTADOR**
   NOMBRE: SINDY TATIANA HERRERA FANDIÑO
   IDENTIFICACIÓN: 1.033.684.880 de Bogotá D.C
   MATRICULA PROFESIONAL No. 202865-T

Sin otro particular;

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Proyectó: Ing. Leidy Aparicio
Revisó: Ing. Jorge Forero

Bogotá, junio 17 de 2024

TIC-INVIAS-1631-026

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS
Att: Ing. CARLOS ALBERTO PARRA SILVA.
Supervisor Contrato de Interventoría

Att: Ing. PEDRO JOSÉ BARÓN
Apoyo supervisión Interventoría

REF: **Contrato No. 1631 DE 2024 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.".**

ASUNTO: Póliza actualizada con orden de inicio

De manera atenta nos permitimos enviar la póliza de garantía de nuestro contrato de la referencia actualizada según orden de inicio corregida conforme a las observaciones realizadas, para su revisión y fines pertinentes.

Atentamente,

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría

Anexo: Archivo PDF (2 folios)

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**CALLE 100**	**33**	**33-44-101249469**	**6**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	**06**	**2024**	**08**	**05**	**2024**	**00:00**	**08**	**09**	**2029**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S	**NIT: 860.038.275-3**

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AK 15 NRO. 100 - 69 OFICINA 306	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3122958359

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	**NIT: 800.215.807-2**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CR 25 G NRO. 73 B - 90	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7056000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO, LA CALIDAD DEL SERVICIO, EL BUIEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMINAZACIONES LABORALES PARA EL CONTRATO NO.1631 - 2024 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL
MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL LOTE 2.
-
EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CUENTA CON UNA VIGENCIA DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**08/05/2024**	**29/03/2025**	**$39,409,349.00**	**$39,409,349.00**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	**08/05/2024**	**29/03/2025**	**$78,818,698.00**	**$78,818,698.00**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**08/05/2024**	**29/09/2027**	**$78,818,698.00**	**$78,818,698.00**
CALIDAD DEL SERVICIO	**08/09/2024**	**08/09/2029**	**$118,228,047.00**	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE CONFORMIDAD CON ORDEN DE INICIO DE FECHA 27 DE MAYO DE 2024, SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA.

CALIDAD DEL SERVICIO.....DESDE 27/09/2024 HASTA 27/09/2029

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.
LA VIGENCIA DEL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.
CALIDAD DEL SERVICIO CON UNA VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD EN EL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA Y POR UNA CUANTIA EQUIVALENTE AL TREINTA POR CIENTO (30%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******315,274,792.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DIEGO ALEJANDRO SANCHEZ HERRERA	230579	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.

33-44-101249469

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CALLE 100	33	33-44-101249469	6

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	06	2024	08	05	2024	00:00	08	09	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S		**NIT: 860.038.275-3**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	AK 15 NRO. 100 - 69 OFICINA 306		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		3122958359

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS		**NIT: 800.215.807-2**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CR 25 G NRO. 73 B - 90		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		7056000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.

33-44-101249469

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bogotá, junio 18 de 2024

TIC-INVIAS-1631-027

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TEBAIDA
Atn. NESTOR ILDEFONSO FONTECHA SANDOVAL
Representante Legal
Vereda Tebaida– Vélez Santander

REF: **CONVENIO N° 4424 de 2023 Cuyo objeto es**: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TEBAIDA DEL MUNICIPIO VÉLEZ DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL."

ASUNTO: APROBACIÓN HOJAS DE VIDA CONVENIO 4424 DE 2023

Cordial saludo,

En atención a la solicitud, y una vez revisadas las hojas de vida allegadas a esta interventoría, atendiendo el numeral 6.1. Requisitos del personal del ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS nos complace aprobar el personal siguiente:

1. **CARGO: INGENIERO RESIDENTE**
   NOMBRE: MIGUEL ANGEL MASMELA ZAPATA
   IDENTIFICACIÓN: 13.542.131 Bucaramanga
   MATRICULA PROFESIONAL No. 68202165983 STD

1. **CARGO: CONTADOR**
   NOMBRE: YANETH GONZÁLEZ FONTECHA
   IDENTIFICACIÓN: 63.436.292 de Vélez Santander
   MATRICULA PROFESIONAL No. 210981-T

Sin otro particular;

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Proyectó: Ing. Jorge Cárdenas
Revisó: Ing. Jorge Forero

Bogotá, junio 18 de 2024

TIC-INVIAS-1631-028

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CACHIPAYAL
Atn. JUAN PABLO OVALLE PINEDA
Representante Legal
Vereda Cachipayal– La Belleza Santander

REF: **CONVENIO N° 4175 de 2023 Cuyo objeto es**: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CACHIPAYAL DEL MUNICIPIO LA BELLEZA DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL."

ASUNTO: APROBACIÓN HOJAS DE VIDA CONVENIO 4175 DE 2023

Cordial saludo,

En atención a la solicitud, y una vez revisadas las hojas de vida allegadas a esta interventoría, atendiendo el numeral 6.1. Requisitos del personal del ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS nos complace aprobar el personal siguiente:

1. **CARGO: INGENIERO RESIDENTE**
   NOMBRE: JORGE EDUARDO HURTADO PEDRAZA
   IDENTIFICACIÓN: 1.049.634.413 de Tunja - Boyacá
   MATRICULA PROFESIONAL No. 041037-0547416 BYC

2. **CARGO: CONTADOR**
   NOMBRE: DIANA MILENA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
   IDENTIFICACIÓN: 1.014.220.726 de Bogotá D.C
   MATRICULA PROFESIONAL No. 290783-T

Sin otro particular;

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Proyectó: Ing. Jorge Cárdenas
Revisó: Ing. Jorge Forero

Bogotá, junio 18 de 2024

TIC-INVIAS-1631-029

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PALMERA
Atn. CARLOS AUGUSTO ARIZA SANTAMARIA
Representante Legal
Vereda la Palmera– Vélez Santander

REF: **CONVENIO N° 4565 de 2023 Cuyo objeto es**: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PALMERA DEL MUNICIPIO VÉLEZ DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL."

ASUNTO: APROBACIÓN HOJAS DE VIDA CONVENIO 4565 DE 2023

Cordial saludo,

En atención a la solicitud, y una vez revisadas las hojas de vida allegadas a esta interventoría, atendiendo el numeral 6.1. Requisitos del personal del ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS nos complace aprobar el personal siguiente:

1. **CARGO: INGENIERO RESIDENTE**
   NOMBRE: JESÚS ALBERTO DÍAZ ARIZA
   IDENTIFICACIÓN: 13.957.231 de Vélez- Santander
   MATRICULA PROFESIONAL No. 68202-112197 STD

2. **CARGO: CONTADOR**
   NOMBRE: LAURA CAROLINA ARIZA NIEVES
   IDENTIFICACIÓN: 1.101.756.764 de Vélez Santander
   MATRICULA PROFESIONAL No. 248600-T

Sin otro particular;

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Proyectó: Ing. Jorge Cárdenas
Revisó: Ing. Jorge Forero

Bogotá, junio 19 de 2024

TIC-INVIAS-1631-030

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNIÓN
Atn. YAMID ARDILA MARÍN
Representante Legal
Vereda la Unión – Guavatá Santander

REF: **CONVENIO N° 4478 de 2023 Cuyo objeto es**: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA UNIÓN DEL MUNICIPIO GUAVATA DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL."

ASUNTO: APROBACIÓN HOJAS DE VIDA CONVENIO 4478 DE 2023

Cordial saludo,

En atención a la solicitud, y una vez revisadas las hojas de vida allegadas a esta interventoría, atendiendo el numeral 6.1. Requisitos del personal del ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS nos complace aprobar el personal siguiente:

1. **CARGO: INGENIERO RESIDENTE**
   NOMBRE: JEISON LEANDRO CAMACHO AVILA
   IDENTIFICACIÓN: 1.054.682.134 de Moniquirá – Boyacá
   MATRICULA PROFESIONAL No. 01122-11237 C.P.I.T.V.C

2. **CARGO: CONTADOR**
   NOMBRE: CLARA INES GARCIA MAHECHA
   IDENTIFICACIÓN: 41.506.897 de Bogotá D.C
   MATRICULA PROFESIONAL No. 4086 T

3. **CARGO: MAESTRO DE OBRA**
   NOMBRE: LUIS VICENTE QUIROGA QUIROGA
   IDENTIFICACIÓN: 5.658.431 de Guavatá

4. **CARGO: TOPÓGRAFO**
   NOMBRE: KATHERIN LUENGAS SANCHEZ
   IDENTIFICACIÓN: 1.097.332.824 de Guavatá

Sin otro particular;

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Proyectó: Ing. Jorge Cárdenas
Revisó: Ing. Jorge Forero

TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

Bogotá, junio 19 de 2024

TIC-INVIAS-1631-031

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TUBAVITA
Atn. GLADYS CHACON HERNANDEZ
Representante Legal
Vereda Tubavita– Vélez Santander

REF: **CONVENIO N° 4357 de 2023 Cuyo objeto es**: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TUBAVITA DEL MUNICIPIO VÉLEZ DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL."

ASUNTO: APROBACIÓN HOJAS DE VIDA CONVENIO 4357 DE 2023

Cordial saludo,

En atención a la solicitud, y una vez revisadas las hojas de vida allegadas a esta interventoría, atendiendo el numeral 6.1. Requisitos del personal del ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS nos complace aprobar el personal siguiente:

1. **CARGO: INGENIERO RESIDENTE**
   NOMBRE: MARÍA CAMILA DÍAZ CARRASCO
   IDENTIFICACIÓN: 1.101.758.682 de Vélez - Santander
   MATRICULA PROFESIONAL No. 151037-0513350 STD

2. **CARGO: CONTADOR**
   NOMBRE: ALBA RUTH SANTA MARÍA ARIZA
   IDENTIFICACIÓN: 63.437.843 de Vélez-Santander
   MATRICULA PROFESIONAL No. 269139-T

Sin otro particular;

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Proyectó: Ing. Jorge Cárdenas
Revisó: Ing. Jorge Forero

Bogotá, junio 19 de 2024

TIC-INVIAS-1631-032

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLÍN
Atn. CARLOS NORBEY CLAVIJO VELASCO
Representante Legal
Vereda Berlín– La Belleza Santander

REF: **CONVENIO N° 3753 de 2023 Cuyo objeto es**: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLIN DEL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ASUNTO: APROBACIÓN HOJAS DE VIDA CONVENIO 3753 DE 2023

Cordial saludo,

En atención a la solicitud, y una vez revisadas las hojas de vida allegadas a esta interventoría, atendiendo el numeral 6.1. Requisitos del personal del ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS nos complace aprobar el personal siguiente:

1. **CARGO: INGENIERO RESIDENTE**
   NOMBRE: JORGE RONALDO FANDIÑO GÓMEZ
   IDENTIFICACIÓN: 1.097.665.332 de la Belleza - Santander
   MATRICULA PROFESIONAL No. 54202-304584 NTS

2. **CARGO: CONTADOR**
   NOMBRE: MARÍA MAGDALENA ALBINO PILONIETA
   IDENTIFICACIÓN: 28.262.629 de Ocamonte - Santander
   MATRICULA PROFESIONAL No. 181841-T

Sin otro particular;

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Proyectó: Ing. Jorge Cárdenas
Revisó: Ing. Jorge Forero

Bogotá, junio 20 de 2024

TIC-INVIAS-1631-033

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GAITAL
Atn. JAIRO GONZALEZ PINZON
Representante Legal
Vereda Gaital – Vélez Santander

REF: **CONVENIO N° 4367 de 2023 Cuyo objeto es**: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL GAITAL DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ASUNTO: APROBACIÓN HOJAS DE VIDA CONVENIO 4367 DE 2023

Cordial saludo,

En atención a la solicitud, y una vez revisadas las hojas de vida allegadas a esta interventoría, atendiendo el numeral 6.1. Requisitos del personal del ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS nos complace aprobar el personal siguiente:

1. **CARGO: INGENIERO RESIDENTE**
   NOMBRE: GUSTAVO ANDRÉS VARGAS GAMBOA
   IDENTIFICACIÓN: 1.101.752.990 de Vélez - Santander
   MATRICULA PROFESIONAL No. 25202 – 422699 CND

2. **CARGO: CONTADOR**
   NOMBRE: JUAN HARVEY RAMIREZ CAMACHO
   IDENTIFICACIÓN: 91.245.968 de Bucaramanga - Santander
   MATRICULA PROFESIONAL No. 108384-T

3. **CARGO: TOPÓGRAFO**
   NOMBRE: ADRIAN LAGOS CUBIDES
   IDENTIFICACIÓN: 1.101.759.477 de Vélez - Santander
   MATRICULA PROFESIONAL No. 01-16675

Sin otro particular;

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Proyectó: Ing. Leidy Aparicio
Revisó: Ing. Jorge Forero

TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

Bogotá, junio 20 de 2024

TIC-INVIAS-1631-034

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA POPOA
Atn. ADRIANA GERENA GONZALES.
Representante Legal
Vereda Popoa – Guavata Santander

REF: **CONVENIO N° 4767 de 2023 Cuyo objeto es:** "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA POPOA DEL MUNICIPIO DE GUAVATA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ASUNTO: APROBACIÓN No 2 HOJAS DE VIDA CONVENIO 4767 DE 2023

Cordial saludo,

En atención a la solicitud, y una vez revisadas las hojas de vida allegadas a esta interventoría, atendiendo el numeral 6.1. Requisitos del personal del ANEXO 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS nos complace aprobar el personal siguiente:

1. **CARGO: CONTADORA**
   NOMBRE YEIMMY DIANITH GERENA ARDILA
   IDENTIFICACIÓN: 28.178.238 de Guavata - Santander
   MATRICULA PROFESIONAL No. 278096-T

2. **CARGO: MAESTRO DE OBRA**
   NOMBRE JAIVER IVAN RANGEL HERNANDEZ
   IDENTIFICACIÓN: 13.542.930 de Bucaramanga - Santander

Sin otro particular;

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría

Proyectó: Ing. Leidy Aparicio
Revisó: Ing. Jorge Forero

Bogotá, junio 20 de 2024

TIC-INVIAS-1631-035

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAMAL
Atn. VÍCTOR MANUEL GALEANO ARIZA
Representante Legal
Vereda Guamal – Bolívar Santander

REF: **CONVENIO N° 3951 de 2023 Cuyo objeto es**: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUAMAL DEL MUNICIPIO BOLÍVAR DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL."

ASUNTO: APROBACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS CONVENIO 3951 DE 2023

Cordial saludo,

De manera atenta, una vez revisadas las cotizaciones allegadas, se aprueba la presentada por SOLENOPSIS LABORATORIO DE SUELOS, por un valor de cinco millones de pesos m/cte ($5.000.000).

Nota: Para el pago del anticipo se solicita póliza de cumplimiento por el valor cotizado.

Sin otro particular;

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Proyectó: Ing. Jorge Cárdenas
Revisó: Ing. Jorge Forero

Adjunto: cotización

SOLENOPSIS
LABORATORIO DE SUELOS

COTIZACIÓN

Barbosa Santander
17/06/2024
SEÑORES: **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL MUNICIPIO DE BOLÍVAR**

REFERENCIA. Cotización estudios y diseños para mejoramiento de vía terciaria mediante la construcción de placa huellas e el sector rural del municipio de Bolívar, departamento de Santander.

CONDICIONES TÉCNICAS DE ENTREGA:

Estudios y diseños necesarios para la ejecución de mejoramiento de vía terciaria mediante la construcción de placa huellas (50 a 300 metros lineales) en el sector rural del municipio de Bolívar, departamento de Santander.

COMPONENTE	INCLUYE		VALOR
Estudio de transito	Informe (memorial de responsabilidad)	$	700,000.00
Estudio geotécnico y de suelos	Informe (memorial de responsabilidad)	$	1,200,000.00
Levantamiento Topográfico	Informe y planos (memorial de responsabilidad)	$	1,200,000.00
Diseño geométrico	Informe y planos (memorial de responsabilidad)	$	750,000.00
Diseño estructural	Informe y planos (memorial de responsabilidad)	$	400,000.00
Estudio Hidrológico e hidráulico	Informe (memorial de responsabilidad)	$	750,000.00
	TOTAL, VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$**	**5,000,000.00**

El entregable se radicará al correo dispuesto por el cliente 10 días hábiles después de la cancelación del correspondiente anticipo, el mismo constara de un archivo digital tipo RAR en el cual se encuentran cada uno de los componentes nombrados en la tabla anterior, los entregables están sujetos a correcciones y o subsanaciones generadas por la entidad revisora.

CONDICIONES COMERCIALES:

Forma de pago: 50% como anticipo, 40% al realizar la entrega a satisfacción del cliente y 10% con la aprobación por parte de interventoría o la entidad supervisora del proyecto.

Cordialmente,

JEFFERSON CAMILO AGUILAR
INGENIERO CIVIL

Bogotá, julio 02 de 2024

TIC-INVIAS-1631-036

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GAITAL
Atn. JAIRO GONZALEZ PINZON
Representante Legal
Vereda Gaital – Vélez Santander

REF: **CONVENIO N° 4367 de 2023 Cuyo objeto es**: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GAITAL DEL MUNICIPIO VÉLEZ DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL."

ASUNTO: RECHAZO DE OFERTA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CONVENIO 4367 DE 2023

Cordial saludo,

De manera atenta, una vez revisada la cotización allegada, se rechaza por no estar acorde con el precio del mercado actual, teniendo en cuenta las cotizaciones remitidas por las diferentes juntas de acción comunal de la zona.

Sin otro particular;

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Proyectó: Ing. Jorge Cardenas
Revisó: Ing. Jorge Forero

Adjunto: cotización

CONSTRUCCIONES BOZAR S.A.S
NIT: 900774661-4
VELEZ - SANTANDER

Vélez Santander, 26 de Junio de 2024

Señor:
JAIRO GONZALEZ PINZON
Presidente JAC Vereda El Gaital
Vélez Santander
La ciudad

REF: PROPUESTA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EN LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS VEREDAD EL GAITAL.

Por medio de la presente nos permitimos presentar propuesta para la elaboración de los estudios y los diseños según referencia.

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL GAITAL					
MUNICIPIO DE VELEZ SANTANDER					
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LA VEREDA EL GAITAL EN EL MUNICIPIO DE VELEZ - SANTANDER					
A. COSTOS DIRECTOS DISEÑO					
ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIOS	VALOR PARCIAL
1	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LA VEREDA EL GAITAL EN EL MUNICIPIO DE VELEZ - SANTANDER				
1.1	Levantamiento topografico incluye plano topografico, carteras topograficas, informe topografico, plano de ubicación y/o localizacion	GLB	1	$ 800,000	$ 800,000
1.2	Estudo de suelos y geotecnico	GLB	1	$ 1,000,000	$ 1,000,000
1.3	Diseño Geométrico	GLB	1	$ 1,000,000	$ 1,000,000
1.4	Fuente de Materiales	GLB	1	$ 250,000	$ 250,000
1.5	diseño estructural	GLB	1	$ 600,000	$ 600,000
1.7	presupuesto de obra incluye APU	GLB	1	$ 400,000	$ 400,000
1.8	programacion de obra y flujo de fondos	GLB	1	$ 700,000	$ 700,000
1.9	Estudio hidraulico e hidrologico	GLB	1	$ 850,000	$ 850,000
1.10	Estudio de Transito	GLB	1	$ 400,000	$ 400,000
	SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS ESTUDIOS CUBIERTAS				$ 6,000,000
	SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS.				$ 6,000,000.00

Los profesionales contemplados para esta propuesta son:

1. Ingeniero de vías especialista en infraestructura vial

Carrera 4 N° 3 - 10 Güepsa – Santander - Calle 76 # 28b 05 Bogotá
Cel. 318 221 70 30
bozarconstrucciones@gmail.com ing.williamariza01@gmail.com

Bogotá, junio 20 de 2024

TIC-INVIAS-1631-037

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNIÓN
Atn. YAMID ARDILA MARÍN
Representante Legal
Vereda La Unión – Guavatá Santander

REF: **CONVENIO N° 4478 de 2023 Cuyo objeto es**: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA UNIÓN DEL MUNICIPIO GUAVATA DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL."

ASUNTO: APROBACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS CONVENIO 4478 DE 2023

Cordial saludo,

De manera atenta, una vez revisada la cotización allegada de SOLENOPSIS LABORATORIO DE SUELOS, por un valor de tres millones setecientos mil pesos m/cte ($3.700.000). La misma se aprueba.

Nota: Para el pago del anticipo se solicita póliza de cumplimiento por el valor cotizado.

Sin otro particular;

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Proyectó: Ing. Jorge Cardenas
Revisó: Ing. Jorge Forero

Adjunto: cotización

SOLENOPSIS
LABORATORIO DE SUELOS

COTIZACIÓN

Barbosa Santander
17/06/2024
SEÑORES: **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VDA LA UNIÓN MUNICIPIO DE GUAVATÁ**

REFERENCIA. Cotización estudios y diseños para mejoramiento de vía terciaria mediante la construcción de placa huellas e el sector rural del municipio de Guavatá, departamento de Santander.

CONDICIONES TÉCNICAS DE ENTREGA:

Estudios y diseños necesarios para la ejecución de mejoramiento de vía terciaria mediante la construcción de placa huellas (50 a 300 metros lineales) en el sector rural del municipio de Guavatá, departamento de Santander.

COMPONENTE	INCLUYE		VALOR
Estudio geotécnico y de suelos	Informe (memorial de responsabilidad)	$	600,000.00
Levantamiento Topográfico	Informe y planos (memorial de responsabilidad)	$	1,200,000.00
Diseño geométrico	Informe y planos (memorial de responsabilidad)	$	750,000.00
Diseño estructural	Informe y planos (memorial de responsabilidad)	$	400,000.00
Estudio Hidrológico e hidráulico	Informe (memorial de responsabilidad)	$	750,000.00
	TOTAL, VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$**	**3,700,000.00**

El entregable se radicará al correo dispuesto por el cliente 10 días hábiles después de la cancelación del correspondiente anticipo, el mismo constara de un archivo digital tipo RAR en el cual se encuentran cada uno de los componentes nombrados en la tabla anterior, los entregables están sujetos a correcciones y o subsanaciones generadas por la entidad revisora.

CONDICIONES COMERCIALES:

Forma de pago: 50% como anticipo, 40% al realizar la entrega a satisfacción del cliente y 10% con la aprobación por parte de interventoria o la entidad supervisora del proyecto.

Cordialmente,

JEFFERSON CAMILO AGUILAR
INGENIERO CIVIL

Bogotá, junio 20 de 2024

TIC-INVIAS-1631-038

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA POPOA
Atn. ADRIANA GERENA GONZALEZ
Representante Legal
Vereda Popoa – Guavata Santander

REF: **CONVENIO N° 4767 de 2023 Cuyo objeto es**: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA POPOA DEL MUNICIPIO GUAVATA DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL."

ASUNTO: APROBACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS CONVENIO 4767 DE 2023

Cordial saludo,

De manera atenta, una vez revisada la cotización allegada de SOLENOPSIS LABORATORIO DE SUELOS, por un valor de cuatro millones cien mil pesos m/cte ($4.100.000). La misma se aprueba.

Nota: Para el pago del anticipo se solicita póliza de cumplimiento por el valor cotizado.

Sin otro particular;

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Proyectó: Ing. Jorge Cardenas
Revisó: Ing. Jorge Forero

Adjunto: cotización

SOLENOPSIS
LABORATORIO DE SUELOS

COTIZACIÓN

Barbosa Santander
17/06/2024
SEÑORES: **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VDA POPOA MUNICIPIO DE GUAVATÁ**

REFERENCIA. Cotización estudios y diseños para mejoramiento de vía terciaria mediante la construcción de placa huellas e el sector rural del municipio de Guavatá, departamento de Santander.

CONDICIONES TÉCNICAS DE ENTREGA:

Estudios y diseños necesarios para la ejecución de mejoramiento de vía terciaria mediante la construcción de placa huellas (50 a 300 metros lineales) en el sector rural del municipio de Guavatá, departamento de Santander.

COMPONENTE	INCLUYE
Estudio geotécnico y de suelos	Informe (memorial de responsabilidad)
Levantamiento Topográfico	Informe y planos (memorial de responsabilidad)
Diseño geométrico	Informe y planos (memorial de responsabilidad)
Diseño estructural	Informe y planos (memorial de responsabilidad)
Estudio Hidrológico e hidráulico	Informe (memorial de responsabilidad)
Estudios de Tránsito	Informe (memorial de responsabilidad)
	TOTAL, VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS $ 4,100,000.00

El entregable se radicará al correo dispuesto por el cliente 10 días hábiles después de la cancelación del correspondiente anticipo, el mismo constara de un archivo digital tipo RAR en el cual se encuentran cada uno de los componentes nombrados en la tabla anterior, los entregables están sujetos a correcciones y o subsanaciones generadas por la entidad revisora.

CONDICIONES COMERCIALES:

Forma de pago: 50% como anticipo, 40% al realizar la entrega a satisfacción del cliente y 10% con la aprobación por parte de interventoría o la entidad supervisora del proyecto.

Cordialmente,

JEFFERSON CAMILO AGUILAR
INGENIERO CIVIL

SEDE BARBOSA: Vía principal Barbosa-Bucaramanga, sector San Isidro km 1.5 Local 4
SEDE CHIQUINQUIRA: CRA 9 # 16-51 edificio La Viña, Oficina 106
CORREO: solenopsisltda@gmail.com
CELULAR: 3118508140-3156765219

Bogotá, junio 20 de 2024

TIC-INVIAS-1631-039

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLIN
Atn. CARLOS NORBEY CLAVIJO VELASCO
Representante Legal
Vereda Berlín – La Belleza Santander

REF: **CONVENIO N° 3753 de 2023 Cuyo objeto es**: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BERLÍN DEL MUNICIPIO LA BELLEZA DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL."

ASUNTO: APROBACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS CONVENIO 3753 DE 2023

Cordial saludo,

De manera atenta, una vez revisada la cotización allegada de SOLENOPSIS LABORATORIO DE SUELOS, por un valor de cuatro millones ochocientos mil pesos m/cte ($4.800.000). La misma se aprueba.

Nota: Para el pago del anticipo se solicita póliza de cumplimiento por el valor cotizado.

Sin otro particular;

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría

Proyectó: Ing. Jorge Cárdenas
Revisó: Ing. Jorge Forero

Adjunto: cotización

SOLENOPSIS
LABORATORIO DE SUELOS

COTIZACIÓN

Barbosa Santander
19/06/2024
SEÑORES: **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLIN MUNICIPIO DE LA BELLEZA**

REFERENCIA. Cotización estudios y diseños para mejoramiento de vía terciaria mediante la construcción de placa huellas en el sector rural del municipio de La Belleza, departamento de Santander.

CONDICIONES TÉCNICAS DE ENTREGA:

Estudios y diseños necesarios para la ejecución de mejoramiento de vía terciaria mediante la construcción de placa huellas (50 a 300 metros lineales) en el sector rural del municipio de La Belleza, departamento de Santander.

COMPONENTE	INCLUYE
Estudio geotécnico y de suelos	Informe (memorial de responsabilidad)
Levantamiento Topográfico	Informe y planos (memorial de responsabilidad)
Diseño geométrico	Informe y planos (memorial de responsabilidad)
Diseño estructural	Informe y planos (memorial de responsabilidad)
Estudio Hidrológico e hidráulico	Informe (memorial de responsabilidad)
Estudios de Tránsito	Informe (memorial de responsabilidad)
	TOTAL VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS $ 4,800,000

El entregable se radicará al correo dispuesto por el cliente 10 días hábiles después de la cancelación del correspondiente anticipo, el mismo constara de un archivo digital tipo RAR en el cual se encuentran cada uno de los componentes nombrados en la tabla anterior, los entregables están sujetos a correcciones y o subsanaciones generadas por la entidad revisora.

CONDICIONES COMERCIALES:

Forma de pago: 50% como anticipo, 40% al realizar la entrega a satisfacción del cliente y 10% con la aprobación por parte de interventoría o la entidad supervisora del proyecto.

Cordialmente,

JEFFERSON CAMILO AGUILAR
INGENIERO CIVIL

SEDE BARBOSA: Vía principal Barbosa-Bucaramanga, sector San Isidro km 1.5 Local 4
SEDE CHIQUINQUIRA: CRA 9 # 16-51 edificio La Viña, Oficina 106
CORREO: solenopsisltda@gmail.com
CELULAR: 3118508140-3156765219

Bogotá, junio 20 de 2024

TIC-INVIAS-1631-040

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CACHIPAYAL
Atn. JUAN PABLO OVALLE PINEDA
Representante Legal
Vereda Cachipayal – La Belleza Santander

REF: **CONVENIO N° 4175 de 2023 Cuyo objeto es**: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CACHIPAYAL DEL MUNICIPIO LA BELLEZA DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL."

ASUNTO: APROBACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS CONVENIO 4175 DE 2023

Cordial saludo,

De manera atenta, una vez revisada la cotización allegada de SOLENOPSIS LABORATORIO DE SUELOS, por un valor de cuatro millones ochocientos mil pesos m/cte ($4.800.000). La misma se aprueba.

Nota: Para el pago del anticipo se solicita póliza de cumplimiento por el valor cotizado.

Sin otro particular;

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría

Proyectó: Ing. Jorge Cardenas
Revisó: Ing. Jorge Forero

Adjunto: cotización

SOLENOPSIS
LABORATORIO DE SUELOS

COTIZACIÓN

Barbosa Santander
19/06/2024
SEÑORES: **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CACHIPAYAL MUNICIPIO DE LA BELLEZA**

REFERENCIA. Cotización estudios y diseños para mejoramiento de vía terciaria mediante la construcción de placa huellas en el sector rural del municipio de La Belleza, departamento de Santander.

CONDICIONES TÉCNICAS DE ENTREGA:

Estudios y diseños necesarios para la ejecución de mejoramiento de vía terciaria mediante la construcción de placa huellas (50 a 300 metros lineales) en el sector rural del municipio de La Belleza, departamento de Santander.

COMPONENTE	INCLUYE	
Estudio geotécnico y de suelos	Informe (memorial de responsabilidad)	
Levantamiento Topográfico	Informe y planos (memorial de responsabilidad)	
Diseño geométrico	Informe y planos (memorial de responsabilidad)	
Diseño estructural	Informe y planos (memorial de responsabilidad)	
Estudio Hidrológico e hidráulico	Informe (memorial de responsabilidad)	
Estudios de Tránsito	Informe (memorial de responsabilidad)	
	TOTAL VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 4,800,000**

El entregable se radicará al correo dispuesto por el cliente 10 días hábiles después de la cancelación del correspondiente anticipo, el mismo constara de un archivo digital tipo RAR en el cual se encuentran cada uno de los componentes nombrados en la tabla anterior, los entregables están sujetos a correcciones y o subsanaciones generadas por la entidad revisora.

CONDICIONES COMERCIALES:

Forma de pago: 50% como anticipo, 40% al realizar la entrega a satisfacción del cliente y 10% con la aprobación por parte de interventoría o la entidad supervisora del proyecto.

Cordialmente,

JEFFERSON CAMILO AGUILAR
INGENIERO CIVIL

Bogotá, junio 20 de 2024

TIC-INVIAS-1631-041

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ÓRGANOS
Atn. LEIDY JOHANA CARANTON CARANTON
Representante Legal
Vereda Órganos – Sucre Santander

REF: **CONVENIO N° 4490 de 2023 Cuyo objeto es**: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ÓRGANOS DEL MUNICIPIO SUCRE DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL."

ASUNTO: APROBACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS CONVENIO 4490 DE 2023

Cordial saludo,

De manera atenta, una vez revisada la cotización allegada de SOLENOPSIS LABORATORIO DE SUELOS, por un valor de cuatro millones setecientos mil pesos m/cte. ($4.700.000). La misma se aprueba.

Nota: Para el pago del anticipo se solicita póliza de cumplimiento por el valor cotizado.

Sin otro particular;

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría

Proyectó: Ing. Jorge Cárdenas
Revisó: Ing. Jorge Forero

Adjunto: cotización

SOLENOPSIS
LABORATORIO DE SUELOS

COTIZACIÓN

Barbosa Santander
17/06/2024
SEÑORES: **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VDA ÓRGANOS SUCRE SANTANDER**

REFERENCIA. Cotización estudios y diseños para mejoramiento de vía terciaria mediante la construcción de placa huellas e el sector rural del municipio de sucre, departamento de Santander.

CONDICIONES TÉCNICAS DE ENTREGA:

Estudios y diseños necesarios para la ejecución de mejoramiento de vía terciaria mediante la construcción de placa huellas (50 a 300 metros lineales) en el sector rural del municipio de sucre, departamento de Santander.

COMPONENTE	INCLUYE		VALOR
Estudio de transito	Informe (memorial de responsabilidad)	$	700,000.00
Estudio geotécnico y de suelos	Informe (memorial de responsabilidad)	$	600,000.00
Levantamiento Topográfico	Informe y planos (memorial de responsabilidad)	$	1,200,000.00
Diseño geométrico	Informe y planos (memorial de responsabilidad)	$	750,000.00
Diseño estructural	Informe y planos (memorial de responsabilidad)	$	400,000.00
Estudio Hidrológico e hidráulico	Informe (memorial de responsabilidad)	$	750,000.00
Transporte general	NA	$	300,000.00
	TOTAL, VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$**	**4,700,000.00**

El entregable se radicará al correo dispuesto por el cliente 10 días hábiles después de la cancelación del correspondiente anticipo, el mismo constara de un archivo digital tipo RAR en el cual se encuentran cada uno de los componentes nombrados en la tabla anterior, los entregables están sujetos a correcciones y o subsanaciones generadas por la entidad revisora.

CONDICIONES COMERCIALES:

Forma de pago: 50% como anticipo, 40% al realizar la entrega a satisfacción del cliente y 10% con la aprobación por parte de interventoría o la entidad supervisora del proyecto.

Cordialmente,

JEFFERSON CAMILO AGUILAR
INGENIERO CIVIL

SEDE BARBOSA: Vía principal Barbosa-Bucaramanga, sector San Isidro km 1.5 Local 4
SEDE CHIQUINQUIRA: CRA 9 # 16-51 edificio La Viña, Oficina 106
CORREO: solenopsisltda@gmail.com
CELULAR: 3118508140-3156765219

Bogotá, junio 28 de 2024

TIC-INVIAS-1631-042

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TUBAVITA
Atn. GLADYS CHACON HERNANDEZ
Representante Legal
Vereda Tubavita – Vélez Santander

REF: **CONVENIO N° 4357 de 2023 Cuyo objeto es**: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TUBAVITA DEL MUNICIPIO VÉLEZ DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL."

ASUNTO: APROBACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS CONVENIO 4357 DE 2023

Cordial saludo,

De manera atenta, una vez revisadas las tres (3) cotizaciones allegadas, se aprueba la cotización presentada por JOHANA EMIRA ANGULO VANEGAS INGENIERA CIVIL ESPECIALISTA EN VIAS, por un valor de cuatro millones seiscientos ochenta mil pesos m/cte. ($4.680.000).

Nota: Para el pago del anticipo se solicita póliza de cumplimiento por el valor cotizado.

Sin otro particular;

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría

Proyectó: Ing. Jorge Cárdenas
Revisó: Ing. Jorge Forero

Adjunto: cotización

COTIZACIÓN

Barbosa Santander
28/06/2024
SEÑORES: **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VDA TUBAVITA MUNICIPIO DE VELEZ**

REFERENCIA. Cotización estudios y diseños para mejoramiento de vía terciaria mediante la construcción de placa huellas en el sector rural del municipio de Vélez, departamento de Santander.

CONDICIONES TÉCNICAS DE ENTREGA:

Estudios y diseños necesarios para la ejecución de mejoramiento de vía terciaria mediante la construcción de placa huellas (de 50 a 400 metros lineales) en el sector rural del municipio de Vélez, departamento de Santander.

COMPONENTE	INCLUYE	VALOR
Estudio de transito	Informe (memorial de responsabilidad)	$ 420.000
Estudio geotécnico y de suelos	Informe (memorial de responsabilidad)	$ 1.500.000
Levantamiento Topográfico	Informe y planos (memorial de responsabilidad)	$ 1.500.000
Diseño geométrico	Informe y planos (memorial de responsabilidad)	$ 420.000
Diseño estructural	Informe y planos (memorial de responsabilidad)	$ 420.000
Estudio Hidrológico e hidráulico	Informe (memorial de responsabilidad)	$ 420.000
	TOTAL, VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 4.680.000**

El entregable se radicará al correo dispuesto por el cliente 10 días hábiles después de la cancelación del correspondiente anticipo, el mismo constara de un archivo digital tipo RAR en el cual se encuentran cada uno de los componentes nombrados en la tabla anterior, los entregables están sujetos a correcciones y o subsanaciones generadas por la entidad revisora.

CONDICIONES COMERCIALES:

Forma de pago: 50% como anticipo, 40% al realizar la entrega a satisfacción del cliente y 10% con la aprobación por parte de interventoría o la entidad supervisora del proyecto. Cordialmente,

Johanna E. Angulo

JOHANNA EMIRA ANGULO VANEGAS
INGENIERA CIVIL
ESPECIALISTA EN VIAS

CELULAR: 3102554611 - 3144710234

Bogotá, junio 26 de 2024

TIC-INVIAS-1631-043

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TEBAIDA
Atn. NESTOR ILDEFONSO FONTECHA SANDOVAL
Representante Legal
Vereda Tebaida – Vélez Santander

REF: **CONVENIO N° 4424 de 2023 Cuyo objeto es**: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TEBAIDA DEL MUNICIPIO VÉLEZ DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL."

ASUNTO: RECHAZO DE OFERTAS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CONVENIO 4424 DE 2023

Cordial saludo,

De manera atenta, una vez revisadas las dos (2) cotizaciones allegadas, se rechazan por no estar acorde con el precio del mercado actual, teniendo en cuenta las cotizaciones remitidas por las diferentes juntas de acción comunal de la zona.

Sin otro particular;

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría

Proyectó: Ing. Jorge Cárdenas
Revisó: Ing. Jorge Forero

Adjunto: cotizaciones

BOZAR S.A.S

CONSTRUCCIONES BOZAR S.A.S

NIT: 900774661-4

VELEZ - SANTANDER

Vélez Santander, 26 de Junio de 2024

Señor:
NESTOR IDELFONSO FONTECHA
Presidente JAC Vereda La Tebaida
Vélez Santander
La ciudad

REF: PROPUESTA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EN LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS VEREDA LA TEBAIDA.

Por medio de la presente nos permitimos presentar propuesta para la elaboración de los estudios y los diseños según referencia.

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA TEBAIDA					
MUNICIPIO DE VELEZ SANTANDER					
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LA VEREDA LA TEBAIDA EN EL MUNICIPIO DE VELEZ - SANTANDER					
A. COSTOS DIRECTOS DISEÑO					
ITEM	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIOS	VALOR PARCIAL
1	CUBIERTA PARA POLIDEPORTIVO BARRIO SANTA TERESITA Y VEREDA EL LIMON				
1.1	Levantamiento topografico incluye plano topografico, carteras topograficas, informe topografico, plano de ubicación y/o localizacion	GLB	1	$ 800,000	$ 800,000
1.2	Estudio de suelos y geotecnico	GLB	1	$ 1,000,000	$ 1,000,000
1.3	Diseño Geométrico	GLB	1	$ 1,000,000	$ 1,000,000
1.4	Fuente de Materiales	GLB	1	$ 250,000	$ 250,000
1.5	diseño estructural	GLB	1	$ 800,000	$ 800,000
1.7	presupuesto de obra incluye APU	GLB	1	$ 500,000	$ 500,000
1.8	programacion de obra y flujo de fondos	GLB	1	$ 700,000	$ 700,000
1.9	Estudio hidraulico e hidrologico	GLB	1	$ 850,000	$ 850,000
1.10	Estudio de Transito	GLB	1	$ 550,000	$ 550,000
	SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS ESTUDIOS CUBIERTAS				$ 6,450,000
	SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 6,450,000.00

Cordialmente,

WILLIAM ARIZA DIAZ
Representante Legal

Carrera 4 N° 3 - 10 Güepsa – Santander - Calle 76 # 28b 05 Bogotá
Cel. 318 221 70 30
bozarconstrucciones@gmail.com ing.williamariza01@gmail.com

SOLENOPSIS
LABORATORIO DE SUELOS

COTIZACIÓN

Barbosa Santander
25/06/2024
SEÑORES: **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL TEBAIDA MUNICIPIO DE VÉLEZ**

REFERENCIA. Cotización estudios y diseños para mejoramiento de vía terciaria mediante la construcción de placa huellas e el sector rural del municipio de Vélez, departamento de Santander.

CONDICIONES TÉCNICAS DE ENTREGA:

Estudios y diseños necesarios para la ejecución de mejoramiento de vía terciaria mediante la construcción de placa huellas (50 a 300 metros lineales) en el sector rural del municipio de Vélez, departamento de Santander.

COMPONENTE	INCLUYE	
Estudio de transito	Informe (memorial de responsabilidad)	
Estudio geotécnico y de suelos	Informe (memorial de responsabilidad)	
Levantamiento Topográfico	Informe y planos (memorial de responsabilidad)	
Posicionamiento Topográfico	Informe y anexos	
Diseño geométrico	Informe y planos (memorial de responsabilidad)	
Diseño estructural	Informe y planos (memorial de responsabilidad)	
Estudio Hidrológico e hidráulico	Informe (memorial de responsabilidad)	
	TOTAL, VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 5,500,000.00**

El entregable se radicará al correo dispuesto por el cliente 10 días hábiles después de la cancelación del correspondiente anticipo, el mismo constara de un archivo digital tipo RAR en el cual se encuentran cada uno de los componentes nombrados en la tabla anterior, los entregables están sujetos a correcciones y o subsanaciones generadas por la entidad revisora.

CONDICIONES COMERCIALES:

Forma de pago: 50% como anticipo, 40% al realizar la entrega a satisfacción del cliente y 10% con la aprobación por parte de interventoría o la entidad supervisora del proyecto.

Cordialmente,

JEFFERSON CAMILO AGUILAR
INGENIERO CIVIL

SEDE BARBOSA: Vía principal Barbosa-Bucaramanga, sector San Isidro km 1.5 Local 4
SEDE CHIQUINQUIRA: CRA 9 # 16-51 edificio La Viña, Oficina 106
CORREO: solenopsisltda@gmail.com
CELULAR: 3118508140-3156765219

Bogotá, julio 02 de 2024

TIC-INVIAS-1631-044

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUALILO
Atn. YINED RODRIGUEZ TORRES
Representante Legal
Vereda Gualilo – Florián Santander

REF: **CONVENIO N° 4267 de 2023 Cuyo objeto es**: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUALILO DEL MUNICIPIO FLORIÁN DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL."

ASUNTO: RECHAZO DE OFERTAS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CONVENIO 4267 DE 2023

Cordial saludo,

De manera atenta, una vez revisada la cotización allegada, se rechaza por no estar acorde con el precio del mercado actual, teniendo en cuenta las cotizaciones remitidas por las diferentes juntas de acción comunal de la zona.

Sin otro particular;

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría

Proyectó: Ing. Jorge Cárdenas
Revisó: Ing. Jorge Forero

Adjunto: cotización

D&J ENGINEERING

Tunja Boyacá, 02 de julio de 2024

SEÑORES: **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUALILO MUNICIPIO FLORIAN SANTANDER.**

Ref: Cotización estudios y diseños para mejoramiento de vía terciaria mediante la construcción de placa huellas en el sector rural del gualilo del municipio de Florián, departamento de Santander.

CONDICIONES TÉCNICAS DE ENTREGA:

DESCRIPCION	ENTREGABLE
Estudio geotécnico y de suelos	Informe
Levantamiento Topográfico	Informe, cartera y planos
Diseño geométrico	Informe y planos
Diseño estructural	Informe y planos
Estudio Hidrológico e hidráulico	Informe
Estudios de Tránsito	Informe

Valor cotización: SIETE MILLONES DE PESOS ($7.000.000)

Se hará entrega de los documentos mediante radicado a la junta de acción comunal de manera física y digital, para lo cual nos tomará 10 días hábiles a partir de la consignación del anticipo, la información entregada esta sujeta a correcciones y/o subsanaciones que considere la entidad revisora.

Forma de pago: 50% como anticipo, 35 % al realizar la entrega a satisfacción del cliente y 15% con la aprobación por parte de interventoría o la entidad supervisora del proyecto.

Cordialmente,

DANIEL RINCON PLAZAS
CEDULA DE CIUDADANÍA No: 1.049.636.909 de Tunja Boyacá.
MATRICULA PROFESIONAL No: 15202-388513 CND

Avenida universitaria # 35-142, Edificio Vivente Apto 715
Tunja Boyacá, tel: 317 8953649
Jose.rincon.plazas@gmail.com

Bogotá, junio 20 de 2024

TIC-INVIAS-1631-045

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PALMERA
Atn. CARLOS AUGUSTO ARIZA SANTAMARIA
Representante Legal
Vereda La Palmera – Vélez Santander

REF: **CONVENIO N° 4565 de 2023 Cuyo objeto es**: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PALMERA DEL MUNICIPIO VÉLEZ DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL."

ASUNTO: APROBACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS CONVENIO 4565 DE 2023

Cordial saludo,

De manera atenta, una vez revisada la cotización allegada de SOLENOPSIS LABORATORIO DE SUELOS, por un valor de cuatro millones trescientos mil pesos m/cte. ($4.300.000). La misma se aprueba.

Nota: Para el pago del anticipo se solicita póliza de cumplimiento por el valor cotizado.

Sin otro particular;

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría

Proyectó: Ing. Jorge Cárdenas
Revisó: Ing. Jorge Forero

Adjunto: cotización

SOLENOPSIS
LABORATORIO DE SUELOS

COTIZACIÓN

Barbosa Santander
17/06/2024
SEÑORES: **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VDA LA PALMERA MUNICIPIO DE VÉLEZ**

REFERENCIA. Cotización estudios y diseños para mejoramiento de vía terciaria mediante la construcción de placa huellas e el sector rural del municipio de Vélez, departamento de Santander.

CONDICIONES TÉCNICAS DE ENTREGA:

Estudios y diseños necesarios para la ejecución de mejoramiento de vía terciaria mediante la construcción de placa huellas (50 a 300 metros lineales) en el sector rural del municipio de Vélez, departamento de Santander.

COMPONENTE	INCLUYE
Estudio de tránsito	Informe (memorial de responsabilidad)
Estudio geotécnico y de suelos	Informe (memorial de responsabilidad)
Levantamiento Topográfico	Informe y planos (memorial de responsabilidad)
Diseño geométrico	Informe y planos (memorial de responsabilidad)
Diseño estructural	Informe y planos (memorial de responsabilidad)
Estudio Hidrológico e hidráulico	Informe (memorial de responsabilidad)
TOTAL, VALOR ESTUDIOS Y DISEÑOS	**$ 4,300,000.00**

El entregable se radicará al correo dispuesto por el cliente 10 días hábiles después de la cancelación del correspondiente anticipo, el mismo constara de un archivo digital tipo RAR en el cual se encuentran cada uno de los componentes nombrados en la tabla anterior, los entregables están sujetos a correcciones y o subsanaciones generadas por la entidad revisora.

CONDICIONES COMERCIALES:

Forma de pago: 50% como anticipo, 40% al realizar la entrega a satisfacción del cliente y 10% con la aprobación por parte de interventoría o la entidad supervisora del proyecto.

Cordialmente,

JEFFERSON CAMILO AGUILAR
INGENIERO CIVIL

SEDE BARBOSA: Vía principal Barbosa-Bucaramanga, sector San Isidro km 1,5 Local 4
SEDE CHIQUINQUIRA: CRA 9 # 16-51 edificio La Viña, Oficina 106
CORREO: solenopsisltda@gmail.com
CELULAR: 3118508140-3156765219

Bogotá, junio 21 de 2024

TIC-INVIAS-1631-046

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS
Att: Ing. CARLOS ALBERTO PARRA SILVA.
Supervisor Contrato de Interventoría

Att: Ing. PEDRO JOSÉ BARÓN
Apoyo supervisión Interventoría

REF: **Contrato No. 1631 DE 2024 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.".**

ASUNTO: INFORME SEMANAL No 4

De manera atenta nos permitimos enviar el siguiente informe semanal:

1. Informe semanal No 4 del 14 de junio al 20 de junio de 2024 de los 11 convenios

Atentamente,

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría

Anexo: Archivo RAR (contiene 11 archivos)

Elaboró: Ing. Jorge Cárdenas

Bogotá, junio 21 de 2024

TIC-INVIAS-1631-046

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS
Att: Ing. CARLOS ALBERTO PARRA SILVA.
Supervisor Contrato de Interventoría

Att: Ing. PEDRO JOSÉ BARÓN
Apoyo supervisión Interventoría

REF: **Contrato No. 1631 DE 2024 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.".**

ASUNTO: INFORMES SEMANALES No 4

De manera atenta nos permitimos enviar el siguiente informe semanal:

1. Informe semanal No 4 del 14 de junio al 20 de junio de 2024 de los 11 convenios

Atentamente,

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría

Anexo: Archivo RAR (contiene 11 archivos)

Elaboró: Ing. Jorge Cárdenas

Bogotá, junio 24 de 2024

TIC-INVIAS-1631-047

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS
Att: Ing. CARLOS ALBERTO PARRA SILVA.
Supervisor Contrato de Interventoría

Att: Ing. PEDRO JOSÉ BARÓN
Apoyo supervisión Interventoría

REF: **Contrato No. 1631 DE 2024 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.".**

ASUNTO: Solicitud aclaración forma de pago de convenios solidarios suscritos entre el INVIAS y los organismos de acción comunal.

Respetado Ingeniero:

De manera atenta nos permitimos solicitar aclaración de la forma de pago y manejo del dinero desembolsado en las cuentas. En el Anexo Técnico sólo menciona en el ítem "***11.8 Cantidades de Obra:*** *Para los fines de pago regirán las cantidades de obra realmente ejecutadas, pero el valor de las obras ejecutadas no podrá superar el valor determinado en el convenio.".* Sin embargo, no hay claridad sobre el tema de desembolsos. Todos los presidentes de las JAC manifiestan que no tienen la capacidad de financiar la obra, y los convenios no contemplan la entrega de anticipos. Agradecemos su atención a esta solicitud.

Atentamente,

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría

Bogotá, junio 24 de 2024

TIC-INVIAS-1631-048

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS
Att: Ing. CARLOS ALBERTO PARRA SILVA.
Supervisor Contrato de Interventoría

Att: Ing. PEDRO JOSÉ BARÓN
Apoyo Supervisión Interventoría

REF: **Contrato No. 1631 DE 2024 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.".**

ASUNTO: Solicitud aclaración zona a intervenir convenio N°4565 de 2023.

Respetados Ingenieros:

De manera atenta nos permitimos solicitar aclaración de la zona a intervenir del convenio N°4565 de 2023, dado que en el **ANEXO TECNICO** en la **DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y ZONA A INTERVENIR** manifiesta: "*El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Vélez del departamento de Santander, en la vereda La Palmera, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+00 Latitud: 6,0100299 Longitud: -73,6610768 y punto de referencia final el PR 0 + 701 Latitud: 6,0202302 Longitud: -73,6544321, de la vía Vereda Palmeras, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Santander del INVIAS."*

Al respecto, al localizar el proyecto en el campo, teniendo en cuenta las mencionadas coordenadas, encontramos una discrepancia en la nomenclatura de los puntos de referencia. Se muestra que el punto de referencia final no se ubica en el PR 0+701, como se esperaba, sino en el PR 1+597.

Atentamente,

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría

Anexo: oficio PHLP – 01 (2 folios)

Vélez, 18 de junio de 2024

PHLP – 01

Señor
JORGE HERNANDO FORERO FORERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TERRA C G S
e-mail: interventoriaccpt@gmail.com
Av Carrera 15 No. 100 – 69 Oficina 306
Bogotá D.C.

REFERENCIA: Convenio No. 4565 de 2023. Objeto "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PALMERA DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"


Asunto: localización del proyecto

Cordial saludo

Según la descripción y zona del proyecto estipulado en el anexo técnico que dice: "*El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Vélez del departamento de Santander, en la vereda La Palmera, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+00 Latitud: 6,0100299 Longitud: -73,6610768 y punto de referencia final el PR 0 + 701 Latitud: 6,0202302 Longitud: -73,6544321, de la vía Vereda Palmeras, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Santander del INVIAS",* me permito manifestar lo siguiente:

1. Que en visita conjunta con el Presidente de la JAC de la Vereda La Palmera al sitio de ejecución del proyecto, nos percatamos que este quedaría por fuera entre los PR mencionados en el Anexo.
2. Que lo anterior se le manifestó al Ingeniero Jorge Ricardo Cárdenas García en comité virtual del día 17 de junio de 2024, y se acordó que fuera el Residente de Obra al sitio del proyecto y tomara las coordenadas para establecer su localización.

3. Que las coordenadas mencionadas en el Anexo técnico ubicándolas en Google Earth Pro, muestran que el punto de referencia final no queda en el PR 0+701 sino en el PR 1+ 597, de acuerdo a la siguiente imagen de Google Earth Pro.

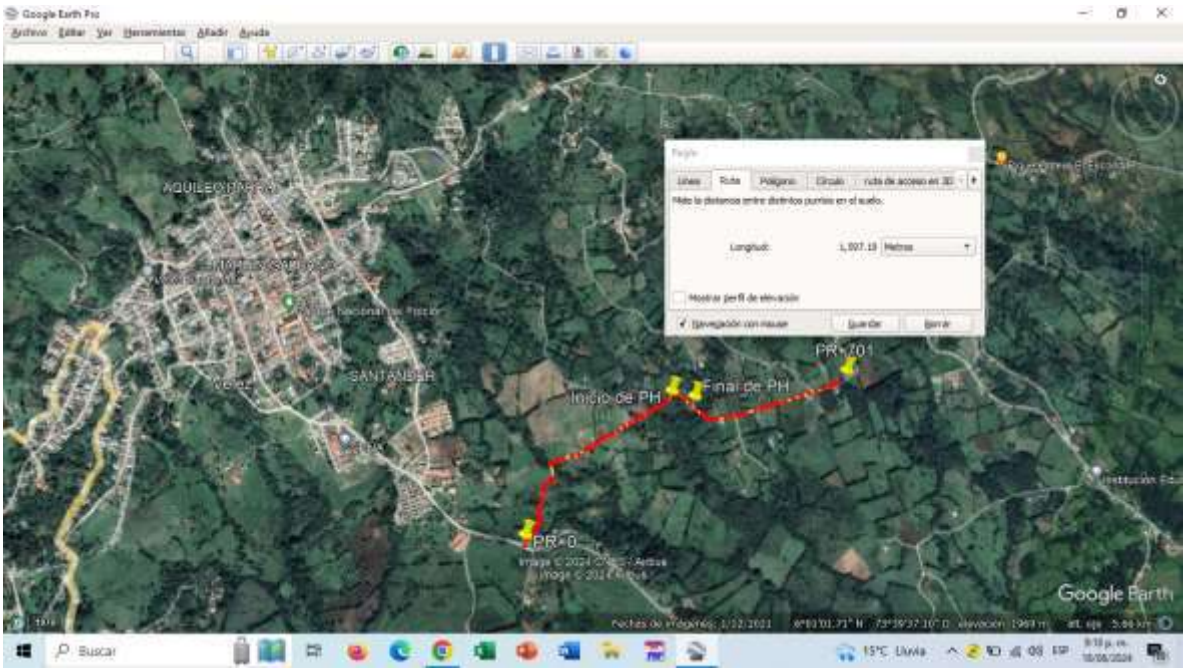

4. Que día 18 de junio el suscrito tomó las coordenadas del proyecto de placa huella que requiere la comunidad de la Vereda La Palmera, y tiene como punto de referencia inicial el PR 0+840 Latitud: 6,01665975 Longitud: -73,65927880 y punto de referencia final el PR 0 + 980 Latitud: 6,01691429 Longitud: -73,65851851, los cuales están dentro de la zona a intervenir levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Santander del INVIAS.

Atentamente,

Ing. JESÚS ALBERTO DÍAZ ARIZA
Residente de Obra

Bogotá, junio 26 de 2024

TIC-INVIAS-1631-049

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUAMAL
Atn. VÍCTOR MANUEL GALEANO ARIZA
Representante Legal
Vereda Guamal – Bolívar Santander

REF: **CONVENIO N° 3951 de 2023 Cuyo objeto es**: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUAMAL DEL MUNICIPIO BOLÍVAR DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL."

ASUNTO: NOTIFICACIÓN CORREO ELECTRÓNICO PQRS

Cordial saludo,

En el marco de ejecución del programa Caminos Comunitarios de La Paz Total, se establece el protocolo para el servicio de atención al Usuario con el fin de dar respuesta oportuna y eficaz a las PQRS generadas por las actividades relacionadas al convenio, es por esto que se dispone el siguiente correo electrónico:

- pqrscaminoscomunitarios@gmail.com

Para ser divulgado en la comunidad aledaña y conocer sus solicitudes de información sugerencias sobre el programa.

Sin otro particular;

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Proyectó: Karol blanco - profesional social
Revisó: Ing. Jorge Forero

Bogotá, junio 26 de 2024

TIC-INVIAS-1631-050

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUALILO
Atn. YINED RODRIGUEZ TORRES
Representante Legal
Vereda Gualilo – Florián Santander

REF: **CONVENIO N° 4267 de 2023 Cuyo objeto es**: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GUALILO DEL MUNICIPIO FLORIÁN DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL."

ASUNTO: NOTIFICACIÓN CORREO ELECTRÓNICO PQRS

Cordial saludo,

En el marco de ejecución del programa Caminos Comunitarios de La Paz Total, se establece el protocolo para el servicio de atención al Usuario con el fin de dar respuesta oportuna y eficaz a las PQRS generadas por las actividades relacionadas al convenio, es por esto que se dispone el siguiente correo electrónico:

- pqrscaminoscomunitarios@gmail.com

Para ser divulgado en la comunidad aledaña y conocer sus solicitudes de información sugerencias sobre el programa.

Sin otro particular;

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Proyectó: Karol blanco - profesional social
Revisó: Ing. Jorge Forero

Bogotá, junio 26 de 2024

TIC-INVIAS-1631-051

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA UNIÓN
Atn. YAMID ARDILA MARÍN
Representante Legal
Vereda La Unión – Guavatá Santander

REF: **CONVENIO N° 4478 de 2023 Cuyo objeto es**: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA UNIÓN DEL MUNICIPIO GUAVATA DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL."

ASUNTO: NOTIFICACIÓN CORREO ELECTRÓNICO PQRS

Cordial saludo,

En el marco de ejecución del programa Caminos Comunitarios de La Paz Total, se establece el protocolo para el servicio de atención al Usuario con el fin de dar respuesta oportuna y eficaz a las PQRS generadas por las actividades relacionadas al convenio, es por esto que se dispone el siguiente correo electrónico:

- pqrscaminoscomunitarios@gmail.com

Para ser divulgado en la comunidad aledaña y conocer sus solicitudes de información sugerencias sobre el programa.

Sin otro particular;

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Proyectó: Karol blanco - profesional social
Revisó: Ing. Jorge Forero

Bogotá, junio 26 de 2024

TIC-INVIAS-1631-052

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA POPOA
Atn. ADRIANA GERENA GONZALEZ
Representante Legal
Vereda Popoa – Guavatá Santander

REF: **CONVENIO N° 4767 de 2023 Cuyo objeto es**: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA POPOA DEL MUNICIPIO GUAVATA DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL."

ASUNTO: NOTIFICACIÓN CORREO ELECTRÓNICO PQRS

Cordial saludo,

En el marco de ejecución del programa Caminos Comunitarios de La Paz Total, se establece el protocolo para el servicio de atención al Usuario con el fin de dar respuesta oportuna y eficaz a las PQRS generadas por las actividades relacionadas al convenio, es por esto que se dispone el siguiente correo electrónico:

- pqrscaminoscomunitarios@gmail.com

Para ser divulgado en la comunidad aledaña y conocer sus solicitudes de información sugerencias sobre el programa.

Sin otro particular;

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Proyectó: Karol blanco - profesional social
Revisó: Ing. Jorge Forero

Bogotá, junio 26 de 2024

TIC-INVIAS-1631-053

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BERLIN
Atn. CARLOS NORBEY CLAVIJO VELASCO
Representante Legal
Vereda Berlín – La Belleza Santander

REF: **CONVENIO N° 3753 de 2023 Cuyo objeto es**: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BERLÍN DEL MUNICIPIO LA BELLEZA DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL."

ASUNTO: NOTIFICACIÓN CORREO ELECTRÓNICO PQRS

Cordial saludo,

En el marco de ejecución del programa Caminos Comunitarios de La Paz Total, se establece el protocolo para el servicio de atención al Usuario con el fin de dar respuesta oportuna y eficaz a las PQRS generadas por las actividades relacionadas al convenio, es por esto que se dispone el siguiente correo electrónico:

- pqrscaminoscomunitarios@gmail.com

Para ser divulgado en la comunidad aledaña y conocer sus solicitudes de información sugerencias sobre el programa.

Sin otro particular;

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Proyectó: Karol blanco - profesional social
Revisó: Ing. Jorge Forero

Bogotá, junio 26 de 2024

TIC-INVIAS-1631-054

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CACHIPAYAL
Atn. JUAN PABLO OVALLE PINEDA
Representante Legal
Vereda Cachipayal – La Belleza Santander

REF: **CONVENIO N° 4175 de 2023 Cuyo objeto es**: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CACHIPAYAL DEL MUNICIPIO LA BELLEZA DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL."

ASUNTO: NOTIFICACIÓN CORREO ELECTRÓNICO PQRS

Cordial saludo,

En el marco de ejecución del programa Caminos Comunitarios de La Paz Total, se establece el protocolo para el servicio de atención al Usuario con el fin de dar respuesta oportuna y eficaz a las PQRS generadas por las actividades relacionadas al convenio, es por esto que se dispone el siguiente correo electrónico:

- pqrscaminoscomunitarios@gmail.com

Para ser divulgado en la comunidad aledaña y conocer sus solicitudes de información sugerencias sobre el programa.

Sin otro particular;

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Proyectó: Karol blanco - profesional social
Revisó: Ing. Jorge Forero

Bogotá, junio 26 de 2024

TIC-INVIAS-1631-055

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ÓRGANOS
Atn. LEIDY JOHANA CARANTON CARANTON
Representante Legal
Vereda Órganos – Sucre Santander

REF: **CONVENIO N° 4490 de 2023 Cuyo objeto es**: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ÓRGANOS DEL MUNICIPIO SUCRE DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL."

ASUNTO: NOTIFICACIÓN CORREO ELECTRÓNICO PQRS

Cordial saludo,

En el marco de ejecución del programa Caminos Comunitarios de La Paz Total, se establece el protocolo para el servicio de atención al Usuario con el fin de dar respuesta oportuna y eficaz a las PQRS generadas por las actividades relacionadas al convenio, es por esto que se dispone el siguiente correo electrónico:

- pqrscaminoscomunitarios@gmail.com

Para ser divulgado en la comunidad aledaña y conocer sus solicitudes de información sugerencias sobre el programa.

Sin otro particular;

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Proyectó: Karol blanco - profesional social
Revisó: Ing. Jorge Forero

Bogotá, junio 26 de 2024

TIC-INVIAS-1631-056

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TUBAVITA
Atn. GLADYS CHACON HERNANDEZ
Representante Legal
Vereda Tubavita – Vélez Santander

REF: **CONVENIO N° 4357 de 2023 Cuyo objeto es**: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TUBAVITA DEL MUNICIPIO VÉLEZ DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL."

ASUNTO: NOTIFICACIÓN CORREO ELECTRÓNICO PQRS

Cordial saludo,

En el marco de ejecución del programa Caminos Comunitarios de La Paz Total, se establece el protocolo para el servicio de atención al Usuario con el fin de dar respuesta oportuna y eficaz a las PQRS generadas por las actividades relacionadas al convenio, es por esto que se dispone el siguiente correo electrónico:

- pqrscaminoscomunitarios@gmail.com

Para ser divulgado en la comunidad aledaña y conocer sus solicitudes de información sugerencias sobre el programa.

Sin otro particular;

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Proyectó: Karol blanco - profesional social
Revisó: Ing. Jorge Forero

Bogotá, junio 26 de 2024

TIC-INVIAS-1631-057

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GAITAL
Atn. JAIRO GONZALEZ PINZON
Representante Legal
Vereda Gaital – Vélez Santander

REF: **CONVENIO N° 4367 de 2023 Cuyo objeto es**: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA GAITAL DEL MUNICIPIO VÉLEZ DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL."

ASUNTO: NOTIFICACIÓN CORREO ELECTRÓNICO PQRS

Cordial saludo,

En el marco de ejecución del programa Caminos Comunitarios de La Paz Total, se establece el protocolo para el servicio de atención al Usuario con el fin de dar respuesta oportuna y eficaz a las PQRS generadas por las actividades relacionadas al convenio, es por esto que se dispone el siguiente correo electrónico:

- pqrscaminoscomunitarios@gmail.com

Para ser divulgado en la comunidad aledaña y conocer sus solicitudes de información sugerencias sobre el programa.

Sin otro particular;

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Proyectó: Karol blanco - profesional social
Revisó: Ing. Jorge Forero

Bogotá, junio 26 de 2024

TIC-INVIAS-1631-058

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA TEBAIDA
Atn. NESTOR ILDEFONSO FONTECHA SANDOVAL
Representante Legal
Vereda Tebaida – Vélez Santander

REF: **CONVENIO N° 4424 de 2023 Cuyo objeto es**: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA TEBAIDA DEL MUNICIPIO VÉLEZ DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL."

ASUNTO: NOTIFICACIÓN CORREO ELECTRÓNICO PQRS

Cordial saludo,

En el marco de ejecución del programa Caminos Comunitarios de La Paz Total, se establece el protocolo para el servicio de atención al Usuario con el fin de dar respuesta oportuna y eficaz a las PQRS generadas por las actividades relacionadas al convenio, es por esto que se dispone el siguiente correo electrónico:

- pqrscaminoscomunitarios@gmail.com

Para ser divulgado en la comunidad aledaña y conocer sus solicitudes de información sugerencias sobre el programa.

Sin otro particular;

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Proyectó: Karol blanco - profesional social
Revisó: Ing. Jorge Forero

Bogotá, junio 26 de 2024

TIC-INVIAS-1631-059

Señores
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA PALMERA
Atn. CARLOS AUGUSTO ARIZA SANTAMARIA
Representante Legal
Vereda La Palmera – Vélez Santander

REF: **CONVENIO N° 4565 de 2023 Cuyo objeto es**: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA PALMERA DEL MUNICIPIO VÉLEZ DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL."

ASUNTO: NOTIFICACIÓN CORREO ELECTRÓNICO PQRS

Cordial saludo,

En el marco de ejecución del programa Caminos Comunitarios de La Paz Total, se establece el protocolo para el servicio de atención al Usuario con el fin de dar respuesta oportuna y eficaz a las PQRS generadas por las actividades relacionadas al convenio, es por esto que se dispone el siguiente correo electrónico:

- pqrscaminoscomunitarios@gmail.com

Para ser divulgado en la comunidad aledaña y conocer sus solicitudes de información sugerencias sobre el programa.

Sin otro particular;

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Proyectó: Karol blanco - profesional social
Revisó: Ing. Jorge Forero

Bogotá, junio 28 de 2024

TIC-INVIAS-1631-061

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS
Att: Ing. CARLOS ALBERTO PARRA SILVA.
Supervisor Contrato de Interventoría

Att: Ing. PEDRO JOSÉ BARÓN
Apoyo supervisión Interventoría

REF: **Contrato No. 1631 DE 2024 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.".**

ASUNTO: INFORME SEMANAL

De manera atenta nos permitimos enviar el siguiente informe semanal:

1. Informe semanal No 5 del 21 de junio al 27 de junio de 2024 de los 11 convenios

Atentamente,

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría

Anexo: Archivo RAR (contiene 11 archivos)

Elaboró: Ing. Jorge Cárdenas

Bogotá, junio 28 de 2024

TIC-INVIAS-1631-062

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS
Att: Ing. MARY LORENA SAYAGO BOTELLO .
Subdirectora de vías regionales

REF: **Contrato No. 1631 DE 2024 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 2.".**

ASUNTO: Hojas de Vida Residente

De manera atenta me permito remitir la hoja de vida de nuestro residente de Interventoría ERWIN ESNEIDER CORREA MORENO, quien reemplaza al ingeniero JORGE RICARDO CARDENAS GARCIA, por lo que adjunto carta de renuncia, lo anterior para su revisión y fines pertinentes.

Atentamente,

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría

Anexo: Un (1) archivo tipo PDF

TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S

EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL

NOMBRE: ERWIN ESNEIDER CORREA MORENO PROFESIÓN: INGENIERO CIVIL

CARGO POR OCUPAR EN EL PROYECTO: RESIDENTE DE INTERVENTORIA

EDUCACIÓN SUPERIOR					
PREGRADO					
No. DE ORDEN	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	TITULO OBTENIDO	FECHA DE GRADO (mes - año)	DOCUMENTO PROFESIONAL [1] No.	Fecha
1	UNIVERSIDAD DE SANTANDER - UDES	INGENIERO CIVIL	30/03/2016	68202--328826 STD	15/04/2016
POSTGRADOS					
No. DE ORDEN	ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO	TÍTULO OBTENIDO (Especialización, Maestría o Doctorado)	FECHA DE GRADO (mes - año)	TIEMPO DE DEDICACIÓN Completo	Parcial
1					

EXPERIENCIA ESPECÍFICA					
No. DE ORDEN	RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD	CARGO DESEMPEÑADO	PERÍODO LABORADO INICIA	TERMINA	DURACIÓN (meses)
1	CONSORCIO PROCON	INGENIERO RESIDENTE para el Contrato de Obra N° 001 de 2015 "PAVIMENTACIÓN DE MALLA VÍAL EN PAVIMENTO RIGIDO Y FLEXIBLE DE 3,5 KM EN EL MUNICIPIO DE FLORIDA BLANCA - SANTANDER, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR SANITARIO SURATOQUE 2".	01-mar-16	30-ene-17	11,17
2	CONSORCIO LIMONCITO	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA para el Contrato de Obra Púplica N° 015 de 2017 cuyo objeto es "REPOSICIÓN DE REDES DE SERVICIOS PUBLICOS Y PAVIMENTACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL BARRIO JARDIN DE LIMONCITO DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA - FASE I"	09-feb-17	04-feb-18	12,00
3	LATINCO S.A	INGENIERO RESIDENTE para el Contrato N° 0696 DE 20120 cuyo objeto es "URGENCIA MANIFISTA PARA LA ATENCIÓN DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA ACAECIDAS ENTRE EL PR117+0700 AL PR22+0050 EN LA VÍA LOS CUROS - MÁLAGA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"	01-abr-20	10-dic-21	20,60
4	JH CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES Y CONCRETOS S.A.S	INGENIERO RESIDENTE en el proyecto CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INVIAS 1968 DE 2020 "GESTIÓN INTEGRAL DE LA CARRETERA ZIPAQUIRÁ - UBATÉ - PUENTE NACIONAL - SAN GIL-PALENQUE - SAN ALBERTO PR18+0000 AL PR93+0694"	17-dic-21	30-jun-22	6,50
TOTAL EN MESES					50,27
TOTAL EN AÑOS					4,19

FIRMA DEL PROFESIONAL: Esneider Correa

NOMBRE DEL PROFESIONAL: ERWIN ESNEIDER CORREA MORENO
IDENTIFICACION : 1.098.752.878 de Bucaramanga

HOJA DE VIDA

ERWIN ESNEIDER CORREA MORENO



PERFIL PROFESIONAL

Facilidad y disposición absoluta para aprender, cumpliendo de manera satisfactoria con puntualidad, honestidad, respeto y responsabilidad las distintas actividades que realizo. Se destaca en mi comportamiento la organización, entrega y la actitud positiva para enfrentar retos personales y laborales. Cualidades que se reflejan a la hora de trabajar en equipo y realizar trabajos bajo presión.

Ingeniero Civil egresado de la Universidad de Santander, capaz de supervisar y controlar obras de construcción, implementando técnicas, metodologías y procesos necesarios para obtener un trabajo exitoso.

Mi prospectiva se enmarca en la mejora continua con el fin de proponer ideas innovadoras que brinden valor agregado a la consecución de metas.

DATOS PERSONALES

NOMBRES	Erwin Esneider
APELLIDOS	Correa Moreno
FECHA DE NACIMIENTO	24 de Marzo de 1994
LUGAR DE NACIMIENTO	Bucaramanga-Santander
LIBRETA MILITAR	03257454
ESTADO CIVIL	Soltero
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1098752878 Bucaramanga
PROFESIÓN	Ingeniero Civil
MATRICULA PROFESIONAL	68202-328826
DIRECCIÓN	Calle 110ª No. 39-42
CELULAR	3154189188
E-MAIL	sneidercorrea17@gmail.com
CIUDAD	Bucaramanga – Santander

FORMACIÓN ACADEMICA

Estudios secundarios: Colegio Nuestra señora de Fátima, PONAL
Bucaramanga - Santander
2005 - 2010

Estudios Universitarios: Universidad de Santander (UDES)
Ingeniería Civil
Bucaramanga-Santander
2011-2016

Diplomado en dirección
de obras civiles (UDES)
Bucaramanga-Santander
2015

Idioma Extranjero: Ingles B1

REFERENCIAS PERSONALES

Mario Andrés Lozada Rincón	Ingeniero Civil, Especialista en gerencia de proyectos e Interventoría de Obras Civiles.
Empresa	Construvannex Ltda.
Lugar	Bucaramanga, Santander
Teléfono:	3014988868
Wilmer Alfonso Roa Rodríguez	Ingeniero Civil
Lugar	Bucaramanga-Santander
Teléfono:	3165364551

REFERENCIAS FAMILIARES

Luis Jesús Correa Sandoval	Pensionado policía, Escolta
Empresa	Invanca Ltda.
Lugar	Bucaramanga-Santander
Teléfono:	3103351912
Dayanni Katherine Correa M.	Ingeniera Ambiental
Lugar	Bucaramanga-Santander
Teléfono:	3157287441

EXPERIENCIA LABORAL

XIMENFER LTDA

CARGO DESEMPEÑADO:	**AUXILIAR DE INGENIERÍA**
PROYECTO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 203 DE 2015: RECUPERACIÓN DE ANDENES EN EL CENTRO Y DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
JEFE INMEDIATO:	MANUEL HERNANDO BECERRA ARAQUE
TELÉFONO:	3105510972
TIEMPO LABORADO:	7 MESES (11 DE AGOSTO DEL 2015 AL 29 DE FEBRERO DE 2016)
AÑO:	2015

CONSORCIO PROCON

CARGO DESEMPEÑADO:	**INGENIERO RESIDENTE**
PROYECTO:	CONTRATO DE OBRA No.001 DE 2015, PAVIMENTACION DE LA MALLA VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO Y FLEXIBLE DE 3.5 KM EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA-SANTANDER, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR SANITARIO SURATOQUE 2.
JEFE INMEDIATO:	MARIO ANDRÉS LOZADA RINCÓN
TELÉFONO:	3014988868
TIEMPO LABORADO:	11 MESES (01 DE MARZO DE 2016 AL 30 DE ENERO DE 2017)
AÑO:	2016

CONSORCIO LIMONCITO

CARGO DESEMPEÑADO:	**INGENIERO RESIDENTE**
PROYECTO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 015 DE 2017: REPOSICIÓN DE REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PAVIMENTACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL BARRIO JARDÍN DE LIMONCITO DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA - FASE 1.
JEFE INMEDIATO:	MANUEL HERNANDO BECERRA ARAQUE
TELÉFONO:	3105510972
TIEMPO LABORADO:	01 AÑO (09 DE FEBRERO DE 2017 AL 04 DE FEBRERO DE 2018)
AÑO:	2017

CONSORCIO INTERCONSA

CARGO DESEMPEÑADO:	**INGENIERO RESIDENTE**
PROYECTO:	CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 2299: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL - COSO DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA."
JEFE INMEDIATO:	HERACLIO PABÓN GELVES
TELÉFONO:	3156537100
TIEMPO LABORADO:	04 MESES (05 DE MARZO DEL 2018 AL 13 DE JULIO 2018)
AÑO:	2018

CONSORCIO XIVANNEX PTAP

CARGO DESEMPEÑADO:	**INGENIERO RESIDENTE**
PROYECTO:	CONTRATO DE OBRA NO. 122 DE 2018: CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA COLINA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER.
JEFE INMEDIATO:	JULIO CESAR MORA CÁCERES
TELÉFONO:	3104063197
TIEMPO LABORADO:	1 AÑO Y 06 MESES (11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 AL 14 DE MARZO DEL 2020)
AÑO:	2020

LATINCO

CARGO DESEMPEÑADO:	**INGENIERO RESIDENTE**
PROYECTO:	CONTRATO NO. 0696 DE 2020 “URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA ACAECIDAS ENTRE EL PR 117+0700 AL PR 122+0050 DE LA VÍA LOS CUROS -MÁLAGA, EN EL DEPARTAMENTO DE S/DER”
JEFE INMEDIATO:	SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ
TELÉFONO:	3103117914
TIEMPO LABORADO:	1 AÑO Y 8 MESES (01 DE ABRIL DEL 2020 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021)
AÑO:	2021

JH CONSTRUCCIONES

CARGO DESEMPEÑADO:	**INGENIERO RESIDENTE**
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, MURO DE CONTENCIÓN, PARA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INVIAS 1968 DE 2020 “GESTIÓN VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA ZIPAQUIRÁ - UBATÉ PUENTE NACIONAL – SAN GIL PALENQUE Y BUCARAMANGA SAN ALBERTO, RUTA 45A, TRAMO 08, SECTOR RIO NEGRO SAN ALBERTO PR18+0000 AL PR93+0694”.
JEFE INMEDIATO:	JAIRO HERNÁNDEZ
TELÉFONO:	3154436467
TIEMPO LABORADO:	6 MESES (17 DE DICIEMBRE 2021 AL 30 DE JUNIO DE 2022)
AÑO:	2022

CONSORCIO GESTIÓN VIAL

CARGO DESEMPEÑADO:	**INGENIERO AUXILIAR ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL**
PROYECTO:	CONTRATO NO 2327 DE 2020 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO GESTION VIAL Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS, CUYO OBJETO ES LA “INTERVENTORÍA PARA LA GESTIÓN VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA ZIPAQUIRÁ – UBATÉ - PUENTE NACIONAL - SAN GIL-PALENQUE Y BUCARAMANGA – SAN ALBERTO, RUTA 45A, TRAMO 08, SECTOR RIONEGRO – SAN ALBERTO PR18+0000 AL PR93+0694”
JEFE INMEDIATO:	ROBINSON ROMÁN SUAREZ
TELÉFONO:	3125779432
TIEMPO LABORADO:	1 AÑO (01 DE JULIO 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2023)
AÑO:	2023

CONSORCIO INUCPI VIAL

CARGO DESEMPEÑADO:	**INGENIERO RESIDENTE ADMINISTRADOR VIAL DE INTERVENTORIA**
PROYECTO:	CONTRATO NO 3797 DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO INUCPI VIAL Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS, CUYO OBJETO ES LA “INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA GESTIÓN VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA ZIPAQUIRÁ – UBATÉ - PUENTE NACIONAL - SAN GIL- PALENQUE Y BUCARAMANGA – SAN ALBERTO, RUTA 45A, TRAMO 08, SECTOR RIONEGRO – SAN ALBERTO PR18+0000 AL PR93+0694”
JEFE INMEDIATO:	HAROLD ALEXIS URREA URREA
TELÉFONO:	3125924272
TIEMPO LABORADO:	6 MESES (27 DE OCTUBRE 2023 AL 10 DE MAYO DE 2024)
AÑO:	2024

ANEXOS

Universidad de Santander
UDES

ACTA DE GRADO No 55834

En la ciudad de Bucaramanga, Departamento de Santander, República de Colombia a los ***TREINTA (30)*** *días del mes* ***MARZO*** *del año* ***DOS MIL DIECISÉIS (2016)*** *se reunió el Consejo Académico de la* ***UNIVERSIDAD DE SANTANDER***
Presidió la sesión JAIME RESTREPO CUARTAS y
obró como Secretario JOSÉ ASTHUL RANGEL CHACÓN
Consideranda el Consejo que ***ERWIN ESNEIDER CORREA MORENO***
Con cédula de ciudadanía número ***1098752878*** *Expedida* ***BUCARAMANGA***
y libreta militar número Expedida por
Cumplió con las disposiciones legales, reglamentarias, presentó el proyecto de grado con el título

PRÁCTICA EMPRESARIAL EN LA EMPRESA CONSTRUVANNEX LTDA, COMO AUXILIAR DE INGENIERÍA CIVIL DE OBRA, MEDIANTE EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO EN LA ZONA CÉNTRICA DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA.

y obtuvo un promedio ponderado en su carrera ***(4.04) CUATRO PUNTO CERO CUATRO*** *sobre cinco.*
En consideración a lo anterior y obrando en nombre de la República de Colombia se le otorgó el título de

INGENIERO CIVIL

Bajo la gravedad de juramento, el graduando prometió cumplir con los deberes propios del ejercicio de su profesión.

En constancia se extiende y firma la presente acta.

Rector, JAIME RESTREPO CUARTAS

Secretario General, JOSÉ ASTHUL RANGEL CHACÓN

Hay un sello que dice: REPUBLICA DE COLOMBIA, BUCARAMANGA, UNIVERSIDAD DE SANTANDER.
Es fiel copia de su original tomada el día ***TREINTA (30)*** *del mes de* ***MARZO*** *de* ***DOS MIL DIECISÉIS (2016).***

Registrado en el Folio No. ***54219,*** *Libro* ***D-3*** *Diploma No.* ***44504***

JOSÉ ASTHUL RANGEL CHACÓN
Secretario General



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional y en su nombre

La Universidad de Santander

UDES

Aprobada por el Ministerio de Educación Nacional de conformidad con la
Personería Jurídica No. 810 del 12 de marzo de 1996 y la Resolución No. 6216 del 22 de diciembre de 2005

Teniendo en cuenta que:

Erwin Esneider Correa Moreno

C.c No. 1098732878 Expedida en: Bucaramanga

Cursó y aprobó los estudios y cumplió con las exigencias legales y reglamentarias,
le confiere el título de:

Ingeniero Civil

En constancia de lo anterior se firma y sella este Diploma,
en la ciudad de Bucaramanga, el día 30 del mes Marzo del año 2016

Rector

Secretaria General

Director del Programa

Registrado en el folio 54210 Libro D-3 Nº de Acta 56834 Diploma No. 44504



República de Colombia

Universidad de Santander
UDES

Certifica Que

ERWIN ESNEIDER CORREA MORENO

CC. 1.098.752.878

Finalizó y aprobó sastifactoriamente el
"Diplomado en Dirección de Obras Civiles"
Con intensidad horaria de 80 horas, organizado por el Programa de Ingeniería Civil.

En constancia se firma en la ciudad de Bucaramanga el día 13 de Abril de 2015

UNIVERSIDAD DE SANTANDER

Ing. José Antimio Delgado Montoya
Decano Facultad de Ingenierías

Decanatura de Ingenierías

Ing. Hugo Alberto León Tellez
Coordinador Ingeniería Civil



XIMENFER LTDA

A QUIEN INTERESE

Por este medio informamos que el Señor **ERWIN ESNEIDER CORREA MORENO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.098.752.878 expedida en Bucaramanga (Santander), laboró en esta empresa, desde el 11 de Agosto de 2015 hasta el 29 de Febrero de 2016, con un contrato a término indefinido.

De la misma manera, el Señor CORREA, ocupó el cargo de **AUXILIAR DE INGENIERIA**, dentro del contrato de obra pública N° 203 de 2015, suscrito con el Municipio de Bucaramanga, cuyo objeto era la "RECUPERACION DE ANDENES EN EL CENTRO Y DIFERENTES SECTORES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA", con una dedicación del 100%, atendiendo siempre sus funciones con diligencia, responsabilidad y eficiencia.

Se expide, a solicitud del interesado, a los 6 días del mes de febrero de 2017.

Atentamente,

MANUEL HERNANDO BECERRA ARAQUE
Gerente General

XIMEMFER LTDA
Carrera 38 N° 48-59 Bucaramanga Pbx 6 578526 Móvil 310 551 0972

REPÚBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACIÓN PERSONAL

CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.098.752.878

CORREA MORENO

APELLIDOS

ERWIN ESNEIDER

NOMBRES



FIRMA

Powered by CamScanner



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-MAR-1994**

BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

16-ABR-2012 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

A-2708200-01197143-M-1098752878-20210106 **00730**12613A 1 9914249097

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Matrícula Profesional No.

68202-328826 STD

Fecha de Expedición: **15/04/2016**

Nombre:

ERWIN ESNEIDER

CORREA MORENO

Cédula:

C.C. 1098752878

Profesión:

INGENIERO CIVIL

Institución:

UNIVERSIDAD DE SANTANDER - UDES



Powered by CamScanner

150599/0915

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza al titular ejercer como Ingeniero en el Territorio Nacional.

PRESIDENTE DEL CONSEJO

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA. Calle 78 No. 9-57 primer piso
Línea Nacional: 01 8000 116590

Powered by CamScanner

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que ERWIN ESNEIDER CORREA MORENO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1098752878, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 68202-328826 desde el 15 de Abril de 2016, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 438.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintiocho (28) días del mes de Junio del año dos mil veinticuatro (2024).



Rubén Dario Ochoa Arbeláez

_____
Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CONSORCIO PROCON

NIT. 900.885.305-3

A QUIEN INTERESE

Por este medio informamos que el Señor **ERWIN ESNEIDER CORREA MORENO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.098.752.878 expedida en La Bucaramanga (Santander), laboró en esta empresa, en el periodo comprendido entre el 01 de marzo de 2016 y el 30 de enero de 2017, con un contrato laboral o término indefinido.

De la misma manera, el Señor CORREA, ocupó el cargo de **INGENIERO RESIDENTE** dentro del CONTRATO DE OBRA No.001 DE 2015, PAVIMENTACION DE LA MALLA VIAL EN PAVIMENTO RIGIDO Y FLEXIBLE DE 3.5 KM EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA- SANTANDER, INCLUYE LA CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR SANITARIO SURATOQUE 2, con una dedicación del 100%, atendiendo siempre sus funciones con diligencia, responsabilidad y eficiencia.

Se expide a solicitud del interesado, a los 06 días del mes de Febrero de 2017.

Atentamente,

WILLIAM ENRIQUE FLOREZ GARRIDO
Representante Legal

Carrera 38 No. 48-59 Altos de Cabecera – Bucaramanga
consorcioprocon@gmail.com
Teléfono 6 578526

Consorcio Limoncito
NIT. 901.075.904-3

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO LIMONCITO

Se permite certificar que el Señor **ERWIN ESNEIDER CORREA MORENO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.098.752.878 expedida en Bucaramanga (Santander), prestó sus servicios para el Consorcio Limoncito, durante el periodo comprendido entre el 09 de Febrero de 2017 y el 04 de Febrero de 2018, con un contrato por término o duración de la obra.

De la misma manera, el Señor **CORREA**, ocupó el cargo de **INGENIERO RESIDENTE DE OBRA**, dentro del contrato de obra pública No. 015 de 2017, suscrito con la Empresa Municipal de Aseo de Floridablanca EMAF, cuyo objeto es la "REPOSICIÓN DE REDES DE SERVICIOS PUBLICOS Y PAVIMENTACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL BARRIO JARDIN DE LIMONCITO DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA – FASE 1", con una dedicación del 100%, atendiendo siempre sus funciones con diligencia, responsabilidad y eficiencia.

Se expide, a solicitud del interesado, a los 23 días del mes de noviembre de 2018.

Atentamente,

MANUEL HERNANDO BECERRA ARAQUE
Representante Legal

Carrera 38 No. 48-59 Altos de Cabecera – Bucaramanga
Consorciolimoncito@gmail.com
Teléfono 657 85 26

CONSORCIO INTERCONSA

NIT. 901.142.268-4

CERTIFICA

Que el señor ERWIN ESNEIDER CORREA MORENO, identificado con cedula de ciudadanía 1.098.752.878 de Bucaramanga, laboró en nuestra compañía desempeñando el cargo de INGENIERO RESIDENTE con contrato a término fijo, correspondiente al Contrato de Interventoría No. 2299 **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL – COSO DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA".**

Desde el 05 de marzo del 2018 hasta el 13 de julio de 2018, cumpliendo con todas sus obligaciones y desempeñándose en el cargo de forma adecuada.

En constancia se firma en la ciudad de Bucaramanga el Veinticinco (25) de julio del año 2018.

HERACLIO PABON GELVES
RL CONSORCIO INTERCONSA
INTERVENTORIA
NIT. 901.142.168-4

Dirección: CRA 25 # 105-05 APARTAMENTO 301 BARRIO PROVENZA
Teléfono: 320 482 88 56
Correo Electrónico: INTERCONSA2017@gmail.com

CONSORCIO
XIVANNEX PTAP

EL REPRESENTANTE LEGAL DEL
CONSORCIO XIVANNEX PTAP

CERTIFICA A QUIEN LE INTERESE:

Que el señor ERWIN ESNEIDER CORREA MORENO, Identificado con cédula de ciudadanía No. 1098752878 de Bucaramanga, se desempeñó de forma eficaz, responsable, con disposición y compromiso en el cargo de INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, en el Contrato de Obra No. 122 de 2018: **"CONSTRUCCION DE LA AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA COLINA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER"** en un periodo correspondiente del 11 de septiembre de 2018 al 14 de marzo de 2020.

El presente documento se entrega a solicitud del interesado, el 03 de diciembre de 2020.

Cordialmente,

JULIO CESAR MORA CACERES
C.C. 1.098.610.255
RL CONSORCIO XIVANNEX PTAP
NIT.901204001-2

CONSORCIO XIVANNEX PTAP
OFICINA PTAP LA COLINA PIEDECUESTA SANTANDER
consorcioxivannexptap@gmail.com
Teléfono: 6578526

MEDELLÍN – COLOMBIA
CALLE 18 (AV. LAS PALMAS) N° 35 – 69
EDIFICIO PALMS AVENUE
OFICINA 424
PBX: +57 (4) 444 47 44

BOGOTÁ - COLOMBIA
CARRERA 7C N° 125-08
USAQUÉN-BOGOTÁ
PBX: +57 (1) 492 69

LATINCO
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.

El suscrito Representante legal de LATINCO S.A de LATINCO S.A

Que el señor **ERWIN ESNEIDER CORREA MORENO,** identificado con cedula de ciudadanía, 1.098.752.878, laboró para la empresa **LATINCO S.A.,** mediante contrato individual de trabajo por Duración de la Obra o Labor Contratada, desempeñando el cargo de **INGENIERO RESIDENTE** para el contrato **No. 0696 DE 2020 "URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA ACAECIDAS ENTRE EL PR117+0700 AL PR 122+0050 DE LA VÍA LOS CUROS - MÁLAGA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER",** en un periodo comprendido entre el 01 de abril de 2020 al 10 de diciembre de2021.

El ingeniero adelanto todas las actividades pertinentes a su cargo para la ejecución y supervisión del objeto del contrato.

La presente se expide a solicitud del interesado a los trece (13) días del mes de diciembre de 2021.

Cordialmente,

SERGIO HUMBERTO RAMÍREZ ARROYAVE
Representante Legal

JH CONSTRUCCIONES
DE OBRAS CIVILES Y CONCRETOS SAS
Especialistas en construcción y reparación de vías

Bucaramanga, julio 05 de 2022

A QUIEN INTERESE

JH CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES Y CONCRETOS SAS

NIT 901318327-8

CERTIFICA QUE

El señor **ERWIN ESNEIDER CORREA MORENO** identificado con **CC 1.098.752.878** de Bucaramanga, laboró desde el día 17 de diciembre de 2021 hasta el 30 de junio de 2022 para nuestra empresa con cargo de **INGENIERO RESIDENTE** en el proyecto *CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INVIAS 1968 DE 2020 "GESTIÓN VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA ZIPAQUIRÁ - UBATÉ - PUENTE NACIONAL - SAN GIL- PALENQUE Y BUCARAMANGA - SAN ALBERTO, RUTA 45A, TRAMO 08, SECTOR RIONEGRO - SAN ALBERTO PR18+0000 AL PR93+0694".*

Durante su permanencia el señor **CORREA** se ha destacado por ser una persona responsable, honesta y cumplida con sus labores asignadas.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 05 días del mes de julio del 2022.

CORDIALMENTE

Anaielizeth Hernandez

ANGGIE LIZETH HERNANDEZ
CC 1.095.837.382 de Floridablanca
REPRESENTANTE LEGAL
TEL 3184724361

CONSORCIO GESTIÓN VIAL

CONSORCIO GESTION VIAL

NIT 901442807-1

C E R T I F I C A

Que el señor(a), **ERWIN ESNEIDER CORREA MORENO,** identificado(a) con la cedula de ciudadanía No. 1.098.752.878 expedida en Bucaramanga (Santander) se desempeñó como **INGENIERO AUXILIAR ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL** desde el 01 de julio 2022 y hasta el 30 de junio del 2023, bajo un contrato de trabajo de Obra o Labor de fecha 19 mayo de 2022, en desarrollo del CONTRATO No 2327 de 2020 suscrito entre el CONSORCIO GESTION VIAL y las INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS, cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA PARA LA GESTIÓN VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA ZIPAQUIRÁ – UBATÉ - PUENTE NACIONAL - SAN GIL- PALENQUE Y BUCARAMANGA – SAN ALBERTO, RUTA 45A, TRAMO 08, SECTOR RIONEGRO – SAN ALBERTO PR18+0000 AL PR93+0694".

Para constancia se expide el presente a los cuatro (04) días del mes de julio de 2023.

Cordialmente,

MAYRON VERGEL ARMENTA
Representante Legal

C.I.V CONSORCIO INUCPI VIAL **CONSORCIO INUCPI VIAL**

INUCPI VIAL 3797-2024-283

LA SUSCRITA GERENTE ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN TALENTO HUMANO DEL CONSORCIO INUCPI VIAL. NIT. 901.756.896-5

CERTIFICA

Que el ingeniero **ERWIN ESNEIDER CORREA MORENO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.098.752.878 expedida en Bucaramanga, estuvo vinculado con el **CONSORCIO INUCPI VIAL**., **NIT**. **901.756.896-5** mediante contrato a término fijo inferior a un año desde el 27 de octubre de 2023 al 10 de mayo de 2024, con una dedicación de tiempo del 100%, en el desarrollo del Contrato No. 3797 DE 2023, cuyo objeto es la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA GESTIÓN VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA ZIPAQUIRÁ – UBATÉ – PUENTE NACIONAL – SAN GIL – PALENQUE Y BUCARAMANGA – SAN ALBERTO, RUTA 45ª, TRAMO 08, SECTOR RIONEGRO – SAN ALBERTO PR 18+0000 AL PR93+0694, en el cargo de **INGENIERO RESIDENTE ADMINISTRADOR VÍAL DE INTERVENTORÍA**, realizando las siguientes funciones:

- Llevar y mantener el archivo actualizado de la interventoría, de tal manera que se pueda constatar en cualquier momento el desarrollo de la ejecución del contrato de Interventoría. El archivo con la correspondencia enviada y recibida por los diferentes actores del proyecto al interventor deberá ser digitalizada en archivos PDF y actualizada diariamente para ser entregada al INVIAS en medio magnético junto con el informe mensual de actividades. El Interventor dispondrá de los equipos necesarios para este efecto.
- Verificar el cumplimiento por parte del Contratista de Obra de todas las obligaciones contractuales a su cargo e informar al Director de Interventoría, oportunamente, sobre los incumplimientos registrados durante la ejecución de las obligaciones del contratista.
- ACTIVIDADES PERMANENTES. **a)** Alertar oportunamente al INVÍAS sobre la necesidad de estudiar, diseñar y construir obras especiales para la mitigación de la inestabilidad en sitios críticos Alertar oportunamente al INVIAS sobre la necesidad de estudiar, diseñar y construir obras que permitan mitigar el impacto en la seguridad y operación de los corredores a cargo (incluyendo sitios críticos), de las necesidades encontradas deberán presentar la priorización respectiva, utilizando herramientas metodológicas que permitan identificar las variables evaluadas en los análisis de costo – beneficio. **b)** Siempre que en sus inspecciones viales y auditorias de seguridad vial a cargo, la Administración Vial detecte la presencia de sitios

corresponden a la gestión de la Administración Vial, la cual para cada indicador de mantenimiento rutinario será calificada con base en los puntajes descritos en el cuadro de descripción de indicadores, del numeral. **b)** Se realizará una evaluación de gestión a los Administradores Viales, cada seis (6) meses, siendo responsables de ella: El área ordenadora del gasto en INVIAS y el Coordinador del Grupo de Administradores Viales y Mantenimiento Rutinario, quienes le asignarán una calificación de 1 a 100, la media de estos resultados se promediará nuevamente con la calificación dada por el Supervisor del contrato de Interventoría, de obtener el indicador calificación por debajo de 70 puntos será considerada como deficiente y dará lugar a la aplicación de la forma de pago según los indicadores respectivos en el Acta mensual de Costos. **c)** Aquellos indicadores que obtengan calificaciones deficientes, además de los descuentos que ocasione darán lugar a efectuar llamados de atención escritos por parte del Supervisor del Contrato de Interventoría; de continuar el incumplimiento en una posterior evaluación, ocasionará el inicio de un Proceso Administrativo Sancionatorio. La calificación de cada indicador se dará a conocer a la Administración Vial, con el objeto de que tome las acciones correctivas que le permitan mejorar o corregir los aspectos que originaron las deficiencias.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en la ciudad de Bogotá D.C. a los 16 días del mes de mayo de 2024.

Atentamente,

CLAUDIA FRANCISCA URREA URREA
GERENTE ADMINISTRATIVA Y G. T. H.
CONSORCIO INUCPI VIAL
NIT. **901.756.896-5**

CC: Archivo.

ERWIN ESNEIDER CORREA MORENO

C.C. 1.098.752.878 de Bucaramanga

CARTA DE RENUNCIA

Puente Nacional, 28 de junio del 2024

Jorge Hernando Forero Forero
Director de Interventoría.
TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S.
AV.15 No.100-69 OFC.306 Bogotá D.C

Estimado Ingeniero Jorge:

Reciba un cordial y respetuoso saludo. Por la presente informo formalmente mi renuncia laboral, a partir del martes 2 de julio del 2024, al cargo de residente de interventoría en el cual ejercí durante el último mes,

Dicha decisión responde a motivos personales, por lo que agradezco todos los aprendizajes y experiencias que enriquecieron mi formación, producto del tiempo que aquí laboré.

Deseo siempre lo mejor para la empresa y para cada uno de mis compañeros de trabajo.

Sin más que agregar, esperando que sean comprendidas las razones antes expuestas.

Atentamente,



Jorge Ricardo Cárdenas García

CC. 13.275.235
