1346

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

3203- 2019043158

Bogotá D.C., 24 de diciembre de 2019

Doctor
FABIAN ORTIZ HURTADO
Coordinador Grupo Cuentas por Pagar
AERONAUTICA CIVIL
Ciudad

Asunto: Cuenta No. 2 CONSORCIO CRS

Cordial saludo:

Con el fin de que se realice el pago No. 02 del Contrato de Obra Pública N. 19001111 H4 de 2019, de la contratista **CONSORCIO CRS**, adjunto al presente los siguientes documentos:

- Certificación Coordinador
- Factura N. 3 de fecha 17 de diciembre de 2019
- Certificación bancaria
- Acta de recibo parcial de obra n. 2 de fecha 16 de diciembre de 2019
- Liquidación IVA
- Acta de aprobación de garantías
- Acta de Inicio
- Copia de los RP no estos
- Copia de los CDP
- Informe semanal N. 5 del 25 de noviembre al 1 de diciembre, N. 6 del 2 de diciembre al 8 de diciembre y N. 7 del 9 al 16 de diciembre de 2019
- Certificación de pagos de seguridad social y aportes legales CONSOCIO CRS y consorciados
- Planilla de pago seguridad social noviembre y diciembre de 2019
- Informe SST
- Copia del Contrato
- Inventario de recibo parcial de la totalidad de la obra civil
- Copia Formato 7 propuesta ítems a cotizar
- Acta de recibo parcial de obra N. 2
- Programa de actividades
- Actas de entrega (42 ítems)

CXP 1184819
0619 1075819

Atentamente,

ERIKA VIZCAINO HERRERA
Coordinadora de Grupo de Servicios Generales

Folios: Lo enunciado

REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

La suscrita supervisora del contrato de obra pública N. 19001111 H4 de 2019 para la ejecución del proyecto para realizar mantenimiento integral preventivo y correctivo bajo la modalidad outsourcing el sistema de precios unitarios incluyendo suministro materiales mano obra instalaciones administrativas Aerocivil NEAA y NAA (lote 1)

C E R T I F I C A:

Que el CONSORCIO CRS, identificado con el No. de NIT 901.329.793-4, prestó el mantenimiento integral preventivo y correctivo bajo la modalidad outsourcing el sistema de precios unitarios incluyendo suministro materiales, mano obra, instalaciones administrativas AEROCIVIL NEAA, CEA Y NAA (lote 1), de acuerdo al plan de trabajo, las actas parciales, precios unitarios, memorias 6 CD´s, informe de avance técnico de ejecución del 25 de noviembre al 16 de diciembre de 2019 y el informe de supervisión y ejecución contractual.

Dada en Bogotá, D.C. a los 19 días del mes de diciembre de 2019.

ERIKA PATRICIA VIZCAINO HERRERA
Coordinadora Grupo Servicios Generales

Elaboró: Ana María Ocampo E – Ingeniera Servicios Generales
Revisó: Yackeline Moreno- Contratista Grupo Servicios Generales

7

CONSORCIO CRS

NIT. 901.329.793-4 - RÉGIMEN COMÚN
No. de Formulario DIAN 18763001741974
Numeración Autorizada del 1 al 100
Fecha: 2019-11-16

FACTURA DE VENTA	**No. 3**
FECHA FACTURA	**17 | 12 | 19**
FECHA VENCIMIENTO	DD | MM | AA

Cliente: **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL**

Nit. C.C. No. **899.999.059-3** | Teléfono: **(571) 425 1000**

Dirección: **Av. El Dorado # 103-15** | Ciudad: **BOGOTA**

CONCEPTO	VR. UNIT	VR. TOTAL
PAGO CORRESPONDIENTE SEGÚN ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 2		$ 263.384.094
Periodo comprendido entre el 25 de noviembre de 2019 al 16 de diciembre de 2019.		
Contrato de obra pública 19001111 01 H4 de 2019 para la ejecución del proyecto para REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO SUMINISTRO MATERIALES MANO DE OBRA INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS AEROCIVIL NEAA Y NAA (LOTE 1)		
Participación consorciados: Carmelo Joaquín Rosales Amell C.C 19.374.007 (35%) Ingenieros Constructores SIGNA SAS NIT. 900.468.589-1 (35%) CENIT Ingeniería y Geología SAS NIT 900.992.209-2 (30%)		

Son: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**$ 261.428.526**
IVA	**$ 1.955.568**
TOTAL	**$ 263.384.094**

Favor hacer transferencia a nombre de **CONSORCIO CRS**
Cuenta de Ahorros No. 223820515 BANCO DE OCCIDENTE

FIRMA AUTORIZADA	NOMBRE QUIEN RECIBE	FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

Impreso por: APUNTARTE 2.0 DISEÑO Y PUBLICIDAD. NIT: 1019073613-8 Cel: 320 309 3365

Banco de Occidente
NIT. 890.300.279-4

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que **CONSORCIO CRS** identificado con NIT número **901329793-4** es cuentahabiente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día **16 de octubre de 2019** con la cuenta de Ahorros **223820515** la cual se encuentra activa y vigente.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de:
CONSORCIO CRS es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **16 de octubre de 2019** dirigida a:
AERONAUTICA CIVIL

ANGIE TATIANA HERNANDEZ
Asesor de Servicios
Oficina COUNTRY

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AERONÁUTICA CIVIL Unidad Administrativa Especial	**OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL -NEAA Y NAA.**	**VALOR INICIAL:** $ 641.209.910 INCLUIDO IVA SOBRE U. **VALOR ADICIONAL:**	**CONTRATISTA :** **CONSORCIO CRS**
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **AERONAUTICA CIVIL** **DIRECCION ADMINISTRATIVA**	**CONTRATO DE OBRA: 19001111 H4 de 2019** **FECHA INICIAL: DESDE 24 DE OCTUBRE DE 2019** **PLAZO FINAL: HASTA EL 20 DICIEMBRE DE 2019** **PLAZO ADICIONAL:**	INCLUIDO IVA SOBRE U. **VALOR FINAL :** **$ 641.209.910** INCLUIDO IVA SOBRE U.	**SUPERVISORA:** **ERIKA VIZCAINO HERRERA**

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 2

El día 16 de diciembre de 2019 en Bogotá, previa visita al sitio de ejecucíon de la obra en el NEAA de la ciudad de Bogotá, se reunieron: El Ingeniero CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL en representacion del CONSORCIO CRS como Contratista de las obras, y la Doctora ERIKA VIZCAINO HERRERA en su calidad de SUPERVISORA, con el objeto de medir y de recibir las cantidades de obra ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 25 de noviembre de 2019 al 16 de diciembre de 2019, determinando su valor de acuerdo a los precios unitarios estipulados en el contrato y segun se muestra en la cuenta, las cuales se recibieron a entera satisfaccion por parte de la SUPERVISION del contrato.

BALANCE FINACIERO DEL CONTRATO		**VALORES**
1. Valor Inicial Contrato		641.209.910,00
2.Valor Adicional		
3, Valor total del Contrato (1+2)		641.209.910,00
4, Valor Pagado por Antic	0%	0,00
5. Valor que resta por Pagar (3-4)		**641.209.909,00**
6, Valor Presente Acta No. 2 parcial		263.384.094,00
7. Amortización en esta ac	0%	0,00
8. Otras retenciones (Acumuladas)		
9,Valor a Pagar de la Presente Acta (6-8)		**263.384.094,00**
10, Pagos Actas Anteriores		275.465.816,00
11, Valor pagado a la Fecha		**538.849.910,00**
12, Saldo por pagar del presente Contrato		0,00
13, Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha		**100,00%**

$ 102.360.000

OBSERVACIONES: El Contratista y la Supervisión mediante el presente documento, hacen constar que las cantidades de obra consignadas en el formato de cantidades, que hace parte integral de la presente acta, corresponden a las medidas tomadas IN-SITU por el Contratista y verficadas por la Supervisión.

De igual manera dejan constancia que la ejecución de los diferentes ITEMS se han realizado atendiendo las mejores practicas constructivas actuales, con materiales de las mejores calidades y cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas en los términos de referencia del presente contrato. Que la Interventoria del presente contrato de obra actua de conformidad con el numeral 4.6 del manual de contratacion, adoptado mediante resolucion 3128 del 6 de octubre de 2017 y la resolucion 589 del 12 de febrero de 2007.

CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL
RL. CONSORCIO CRS
CONTRATISTA

ERIKA VIZCAINO HERRERA
SUPERVISORA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

LIQUIDACION IVA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 2

CONTRATO No. CONTRATO DE OBRA: 19001111 H4 de 2019

CONTRATISTA: **CONSORCIO CRS**

SUPERVISORA **ERIKA VIZCAINO HERRERA**

COSTO TOTAL BRUTO OBRA (Costo Directo + A.I.U.)	$	261.428.526
Porcentaje estimado para el A.I.U.	27,0%	
COSTO DIRECTO OBRA		
Costo Total Bruto	261.428.526	205.849.233
1 + 27,0 % A. I.U.	1,270%	
UTILIDAD OBRA		
Costo Directo X 5% estimado Utilidad		10.292.462
IVA OBRA		
Utilidad X 19% estimado para el IVA		**1.955.568,00**
TOTAL IVA ESTA ACTA		**1.955.568,00**

CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL
RL. CONSORCIO CRS
CONTRATISTA

ERIKA VIZCAINO HERRERA
SUPERVISORA

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 3203-092	FORMATO **ACTA DE INICIO** **CONTRATO DE OBRA No. 19001111 01 H4 DE 2019**

CONTRATO	19001111 01 H4 DE 2019
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	CONSORCIO CRS – NIT 901.329.793-4
OBJETO	REALIZAR MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO SUMINISTRO MATERIALES MANO OBRA INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS AEROCIVIL NEAA, CEA Y NAA (LOTE 1)
ALCANCE	Con el fin de mejorar y brindar instalaciones en adecuadas condiciones se asegura el mejoramiento de la infraestructura de las sedes NEAA, CEA y NAA, el mantenimiento de los espacios físicos y sistemas permitirá disponer de áreas amplias y flexibles acorde con las necesidades de las diferentes dependencias, para generar condiciones apropiadas de trabajo de funcionarios, colaboradores, usuarios y visitantes, como también efectuar el debido mantenimiento a los sistemas eléctrico, hidrosanitario, de seguridad, detección y extinción de incendios, climatización, CCTV, ascensores, mejorar las condiciones ambientales tales como ventilación y iluminación.
VALOR	SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($641.209.910,00) INCLUIDO IVA
PLAZO	HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2019
CDP SIIF	No 96319 DEL 19 DE JULIO DE 2019, POR VALOR DE $656.857. 407.oo
RP SIIF	No 318719 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2019
SUPERVISION	ERIKA PATRICIA VIZCAINO HERRERA

En la ciudad de Bogotá, a los 24 días del mes de Octubre de 2019, se reunieron con el fin de dar inicio a la ejecución del presente contrato: **CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL** identificado con cédula de ciudadanía número 19.374.007 de Bogotá D.C, como representante legal del **CONSORCIO CRS – NIT 901.329.793-4, ERIKA PATRICIA VIZCAINO HERRERA**, identificada con cédula de ciudadanía número 32.852.129 como Supervisor del contrato, **ADRIANA MARIA GOMEZ CARO,** identificada con cédula de ciudadanía número 43.091.120, en su calidad de Directora Administrativa y **JULIO CESAR FREYRE SANCHEZ** identificado con cédula de ciudadanía número 79.691.590, en su calidad de Secretario General.

12

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
INFORME SEMANAL

VERSIÓN: 1.0

UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	**FECHA:**	2-dic-19
DIRECCIÓN TERRITORIAL:			
Semana No	05	**Del :** 25/11/2019	**Al:** 1/12/2019
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:	38	dias	

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL -NEAA Y NAA.

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

NEAA y NAA

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	14,85%	56,89%	(%) Ejecutado	12,32%	55,28%
Valor programado ($)	$ 95.225.638,45	$ 364.752.346,72	Valor ejecutado ($)	$ 78.984.668,00	$ 354.450.483,87

Notas:
• Se suscribió el Acta de Inicio del contrato de obra 19001111 H4 de 2019 el día 24 de octubre de 2019

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	CONSORCIO CRS	**Contratista:**	
Contrato No:	19001111 H4 de 2019	**Contrato No:**	
Valor Inicial:	$ 641.209.910	**Valor Inicial:**	
Plazo inicial:	Seis (6) meses	**Plazo inicial:**	
Fecha de iniciación:	24-oct-19	**Fecha de iniciación:**	
Fecha de vencimiento:	20-dic-19	**Fecha de vencimiento:**	
Valor adición:	$ 0	**Valor adición:**	
Valor total contrato:	$ 641.209.910	**Valor total contrato:**	

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DESARROLLO DEL CONTRATO:

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades en diferentes áreas:

1. Cambio de luminarias:
   - Archivo (sótano)
   - Cuarto insumos de aseo (sótano)
   - Acceso del edificio
   - Escaleras de emergencia ala oriente y occidente
2. Pintura epóxica en las siguientes áreas:
   - Cuartos eléctricos, de telecomunicaciones y mecánicos, cuarto de insumos de aseo, cuarto de máquinas, cuarto de aire sótano.
3. Mantenimiento general de baterías de baño, incluyendo sanitarios, orinales y lavamanos de los pisos 1, 2 3, 4 y 5, hombres y mujeres.
4. Actividades de mantenimiento e impermeabilización de cubierta, limpieza de canales, impermeabilización de zona sobre bañod e mujeres piso 5
5. Mantenimiento de lámpara tipo espiral en la recepción del edificio, la lámpara se extiende hasta el cuarto piso.
6. Cambio de bizcochos de sanitarios que se encontraban en mal estado.
7. Limpieza de cajas de inspección del edificio y la tubería que las conecta.
8. Limpieza y mantenimiento de tubería de aguas lluvias colgada en sótano
9. Pintura general en pasillos del primer piso
10. Pintura de techos de baños de los pisos 4 y 5
11. Emboquillado de juntas de pisos de baños

SOCIALIZACIÓN Y VISITA DE CAMPO:
Se realizan recorridos con el administrador del edificio, la supervisión del contrato y su apoyo técnico, con el fin de establecer las zonas a intervenir y poder desarrollar el plan de trabajo.

METODOLOGÍA GENERAL:
Se establece que será necesario intervenir los fines de semana y festivos, así como también en el horario nocturno con el fin de no interferir en las actividades cotidianas del edificio, no obstante, se desarrollarán las actividades prioritarias y que no generen ruido que pueda molestar a los funcionarios.

13

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
INFORME SEMANAL

VERSIÓN 1.0

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA — FECHA: 2-dic-19

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

Semana No 05 — Del : 25/11/2019 — Al: 1/12/2019

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 38 días

RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO

FINANCIERO:

	CONDICIONES INICIALES					ACTUALIZACIÓN		EJECUTADO		ACUMULADO		%	%
ITEM	CAPITULO Y ACTIVIDADES	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	EJEC	X EJEC
1	**DEMARCACION**												
1.2	Suministro, instalación y demarcación de pintura epóxica (poliuretano)	M2	650	$ 25.000	$ 16.250.000	599,27	$ 16.250.000	73,09	$ 1.827.150	428,736	$ 10.718.400	71,54%	28,46%
1.3	Suministro, aplicación y demarcación de pintura para parqueadero	ML	320	$ 6.700	$ 2.144.000	1253,6	$ 8.399.120	0,00	$ -	1253,6	$ 8.399.120	100,00%	0,00%
1.4	Suministro e instalación de cinta antideslizante	ML	450	$ 10.000	$ 4.500.000	538,48	$ 5.204.800	0,00	$ -	538,48	$ 5.384.800	100,00%	0,00%
2	**IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS**												
2.1	Aplicación de sellante en uniones de flanches de tejado para evitar filtracion	ML	550	$ 60.000	$ 33.000.000	550	$ 33.000.000	165,00	$ 9.900.000	165	$ 9.900.000	30,00%	70,00%
2.2	Aplicación de producto impermeabilizante en pegues de flanches	ML	120	$ 60.000	$ 7.200.000	120	$ 7.200.000	36,00	$ 2.160.000	36	$ 2.160.000	30,00%	70,00%
2.3	Impermeabilización de acuerdo con las especificaciones técnicas en canales superiores	ML	155	$ 60.000	$ 9.300.000	167,8	$ 9.300.000	50,34	$ 3.020.400	50,34	$ 3.020.400	30,00%	70,00%
2.4	Limpieza y/o mantenimiento en canales y rejillas de bajantes retiro de material particulado	ML	155	$ 60.000	$ 9.300.000	155	$ 9.300.000	46,50	$ 2.790.000	46,5	$ 2.790.000	30,00%	70,00%
2.5	Revision y /o instalación de flanches en tejas sueltas	UN	150	$ 150.000	$ 22.500.000	150	$ 22.500.000	45,00	$ 6.750.000	45	$ 6.750.000	30,00%	70,00%
3	**MANTENIMIENTO DE PUERTAS (inlcuye en general el desmonte reposición e instalación de piezas para el correcto funcionamiento)**												
3.1	Desmonte de divisiones en vidrio y/o puertas	M2	245	$ 50.000	$ 12.250.000	0	$ 2.500.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
3.2	Desmonte y retiro de archivadores por cuerpos	UND	3	$ 120.000	$ 360.000	0	$ 360.000	0,00	$	3	$ 360.000	0,00%	0,00%
3.3	Mantenimiento del barandal de escaleras y hall del edificio	ML	145	$ 45.000	$ 6.525.000	346,71	$ 15.601.950	0,00	$ -	346,71	$ 15.601.950	100,00%	0,00%
3.4	suministro e instalacion de ventanas de inspeccion en fibrocemento. De 60 x 60	UND	260	$ 120.000	$ 31.200.000	338	$ 36.960.000	9,00	$ 1.080.000	317	$ 38.040.000	93,79%	6,21%
3.5	Mantenimiento a estaciones o páneles de emergencias en lamina y vidrio	UND	24	$ 100.000	$ 2.400.000	0	$ 2.400.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
3.6	Mantenimiento y / suministro e instalacion de chapas con manija en acero inxidable	UND	50	$ 140.000	$ 7.000.000	50	$ 7.000.000	15,00	$ 2.100.000	15	$ 2.100.000	30,00%	70,00%
3.7	Mantenimiento de puertas oficinas privadas	UND	25	$ 95.000	$ 2.375.000	8	$ 2.375.000	2,40	$ 228.000	2,4	$ 228.000	30,00%	70,00%
3.8	Suministro e instalación de chapa para puerta incluye dos llaves	UND	35	$ 130.000	$ 4.550.000	35	$ 4.550.000	10,50	$ 1.365.000	10,5	$ 1.365.000	30,00%	70,00%
3.9	Suministro e instalación de chapa para escritorio, archivadores verticales y horizontales incluye dos	UND	80	$ 65.000	$ 5.200.000	80	$ 5.200.000	24,00	$ 1.560.000	24	$ 1.560.000	30,00%	70,00%
3.10	Instalación puertas existentes en vidrio de 8mm con marco de aluminio	M2	12	$ 150.000	$ 1.800.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
4	**PINTURA EXTERNA E INTERNA**												
4.1	Limpieza e impermeabilizacion de muros de alta resistencia con suministro e instalación de pintura	M2	800	$ 20.000	$ 16.000.000	700,75	$ 16.000.000	102,66	$ 2.053.140	461,22	$ 9.224.340	65,82%	34,18%
4.2	Resane en filos y dilataciones y pintura si es el caso	ML	150	$ 8.100	$ 1.215.000	569,62	$ 5.636.635	132,14	$ 1.070.294	261,31	$ 2.116.571	45,87%	54,13%
4.3	Resane y pintura vinilo tipo 1 en muro de Superboard interno y externo	M2	120	$ 16.000	$ 1.920.000	584,98	$ 1.920.000	175,49	$ 2.807.904	175,494	$ 2.807.904	30,00%	70,00%
4.4	Suministro e instalación de pintura de muros exteriores con koraza dos manos, incluye rasqueteo	M2	120	$ 20.000	$ 2.400.000	129,02	$ 2.400.000	15,73	$ 314.580	92,32	$ 1.846.380	71,55%	28,45%
4.5	Suministro e instalacion Pintura cielo raso en vinilo, en baños	M2	150	$ 16.000	$ 2.400.000	480,1	$ 2.400.000	132,03	$ 2.112.480	172,03	$ 2.752.480	35,83%	64,17%
4.6	Suministro e instalacion de Pintura cielo raso en vinilo, en baños	ML	75	$ 14.000	$ 1.050.000	922,82	$ 1.050.000	276,85	$ 3.875.844	276,846	$ 3.875.844	30,00%	70,00%
5	**PISOS Y ZÓCALOS**												
5.1	Desmonte, suministro e instalación de piso cerámica 60x60 cm	M2	20	$ 65.000	$ 1.300.000	0	$ 1.300.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
5.2	Sellamiento de juntas y fisuras entre adoquines con sello de arena en sendero peatonal NEAA - CEA	M2	200	$ 19.000	$ 3.800.000	253,86	$ 4.823.340	0,00	$ -	253,86	$ 4.823.340	100,00%	0,00%
5.3	Sello y tratamiento de juntas de construccion o dilatacion en pisos	ML	100	$ 100.000	$ 10.000.000	0	$ 5.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
6	**PAÑETES Y ENCHAPES**												
6.1	Mantenimiento y/o aplicación de producto en juntas de dilatacion	M2	40	$ 25.000	$ 1.000.000	83,8	$ 1.000.000	23,11	$ 577.800	29,87	$ 746.800	35,65%	64,35%
6.2	Resane de muros en general	M2	40	$ 16.000	$ 640.000	0	$ 640.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
6.3	Retiro de enchape de piletas lavatraperos.	M2	20	$ 15.000	$ 300.000	22	$ 300.000	6,00	$ 90.000	8	$ 120.000	36,36%	63,64%
6.4	Suministro e instalación de enchape de piletas lavatraperos.	M2	20	$ 50.000	$ 1.000.000	20	$ 1.000.000	6,00	$ 300.000	6	$ 300.000	30,00%	70,00%
7	**CARPINTERIA**												
7.1	Suministro e instalacion de cerrojo y bisagras para divisiones de baños	UND	20	$ 60.000	$ 1.200.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
8	**MANTENIMIENTO VIDRIOS Y VENTANERIA**												
8.2	Revision y/o reparacion de paneles de encerramiento del balcon quinto piso incluye.	M2	40	$ 55.000	$ 2.200.000	0	$ 550.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
8.3	Suministro e instalación de pie de amigo para [illegible] y apliqué	UND	40	$ 48.000	$ 1.920.000	0	$ 1.920.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
8.4	Suministro e instalacion de Pelicula samblasteada con logo de la aerocivil para vidrios en zonas de	M2	30	$ 70.000	$ 2.100.000	65,74	$ 840.000	19,72	$ 1.380.540	19,722	$ 1.380.540	30,00%	70,00%
9	**INFRAESTRUCTURA GENERAL**												
9.1	Desmonte pared en superboard	M2	5	$ 10.000	$ 50.000	0	$ 50.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
9.2	Desmonte de divisiones en drywall	M2	10	$ 10.000	$ 100.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
9.3	Mantenimiento pintura de puertas metal madera que icluye: tableros lamina de acero inoxidable visagras	M2	12	$ 80.000	$ 960.000	31,57	$ 7.840.000	9,47	$ 757.680	9,471	$ 757.680	30,00%	70,00%
9.4	Suministro e instalación de guardaescobas en madera de acuerdo con las especificaciones	ML	50	$ 40.000	$ 2.000.000	0	$ 2.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
9.5	Suministro e intalación de pasamanos anclado al piso de cauerdo a lo normado en escalera principal	ML	16	$ 577.000	$ 9.232.000	13,39	$ 7.726.030	0,00	$ -	13,39	$ 7.726.030	100,00%	0,00%

14

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
INFORME SEMANAL

VERSIÓN 1.0

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **FECHA:** 2-dic-19

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

Semana No 05 **Del :** 25/11/2019 **Al:** 1/12/2019

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 38 días

10	**RED HIDRAULICA Y SANITARIA**															
10.1	Desmonte, Suministro e Instalacion de Conexión Superior Orinales (incluye desmonte, limpieza y	UND	8	$ 150.000	$ 1.200.000	0	$ 2.850.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.2	Desmonte, suministro e Instalacion de llave para pocetas	UND	12	$ 55.000	$ 660.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.3	Destape de puntos sanitarios y/o lavamanos con sonda electrica.	UND	14	$ 60.000	$ 840.000	0	$ 360.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.4	Destape de cañeria de punto sanitario, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato si	UND	4	$ 70.000	$ 280.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.5	Mantenimiento y reparacion de Shut de Basuras	UND	1	$ 3.000.000	$ 3.000.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.6	Mantenimiento de cajas de inspección en general de aguas lluvias y aguas hervidas incluye retiro de	UND	18	$ 250.000	$ 4.500.000	12	$ 4.500.000	4,00	$ 1.000.000	4	$ 1.000.000	33,33%	66,67%
10.7	Mantenimiento de sifones	UND	46	$ 30.000	$ 1.380.000	0	$ 420.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.8	Mantenimiento llaves tipo ganso para cafeterias y comedor institucional	UND	6	$ 80.000	$ 480.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.9	Mantenimiento y puesta a punto el sistema de riego de cuadros vivos de jardineria	UND	1	$ 900.000	$ 900.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.10	Mantenimiento divisiones y puertas de acero inxidable de baños	M2	8	$ 100.000	$ 800.000	97,77	$ 9.777.000	0,00	$ -	97,77	$ 9.777.000	100,00%	0,00%
10.11	Mantenimiento de válvula sanitaria	UND	16	$ 50.000	$ 800.000	0	$ 800.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.12	Mantenimiento de conexiones de pared a sanitario.	ML	14	$ 60.000	$ 840.000	0	$ 840.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.13	Mantenimiento de la tuberia y cajas de inspección	ML	40	$ 106.000	$ 4.240.000	28,43	$ 4.240.000	8,53	$ 904.074	8,529	$ 904.074	30,00%	70,00%
10.14	Mantenimiento de drenajes y disposición final certificado evacuación lodos con equipo adecuado	ML	40	$ 106.000	$ 4.240.000	0	$ 4.240.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.15	Mantenimiento de tuberia interna desde el contador avenida principal calle 26	ML	1	$ 4.500.000	$ 4.500.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.16	Mantenimiento de tuberia PVC de 2/1" de acometida al tanque	ML	28	$ 40.000	$ 1.120.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.17	Mantenimiento de tuberia colgante con limpieza y traslado de lodos hasta botadero certificado	ML	1	$ 5.500.000	$ 5.500.000	1	$ 5.500.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.18	Revision y/o fijacion de tuberia colgante con abrasadera metalica x golpe de ariete	ML	100	$ 40.000	$ 4.000.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.19	Retiro y /o adecuacion de ventanas de baños para ventilacion	UND	10	$ 70.000	$ 700.000	10	$ 700.000	0,00	$ -	10	$ 700.000	100,00%	0,00%
10.20	Suministro e instalacion de llave ahorradora de paso de agua en piletas y areas externas	UND	4	$ 200.000	$ 800.000	7	$ -	2,00	$ 400.000	2	$ 400.000	28,57%	71,43%
10.21	Suministro e instalacion de registro de paso de agua en PVC 1/2,-1/3,-1/4,-1/4	UND	12	$ 18.000	$ 216.000	0	$ 216.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.22	Suministro e Instalacion de bizcocho sanitario	UND	8	$ 80.000	$ 640.000	5	$ 640.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.23	Suministro e instalación de tuberia PVC de 2/1" de acometida al tanque	ML	12	$ 65.000	$ 780.000	0	$ 797.125	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.24	Suministro e instalación de sifones con retenedor de olores en baños	UND	14	$ 95.000	$ 1.330.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.25	Suministro e instalacion de dispensador de jabon para manos en baños	UND	12	$ 120.000	$ 1.440.000	0	$ 1.440.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.26	Suministro e instalación llaves tipo ganso para cafeterias y comedor institucional	UND	6	$ 170.000	$ 1.020.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.27	Suministro e instalación de tapa registros	UND	22	$ 20.000	$ 440.000	22	$ 440.000	0,00	$ -	22	$ 440.000	100,00%	0,00%
11	**RED DE AGUA POTABLE**												
11.1	Demolición regata lineal para instalar tuberia, en piso, y en pared	ML	20	$ 18.000	$ 360.000	0	$ 360.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
11.2	Mantenimiento correctivo de tuberia (incluye demolición de muro e instalación de tuberia y	UND	4	$ 200.000	$ 800.000	104,47	$ 800.000	0,00	$ -	124	$ 24.800.000	118,69%	-18,69%
11.3	Suministro e instalación de tuberia pvc 1/2 ", 3/4", 1 1/2 ", 1", 2"	ML	16	$ 19.000	$ 304.000	0	$ 304.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
12	**REDES DE AGUAS NEGRAS (hervidas)**												
12.1	Destape de cañeria de punto sanitario, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato si	UND	14	$ 150.000	$ 2.100.000	67	$ 9.300.000	2,00	$ 300.000	64	$ 9.600.000	95,52%	4,48%
12.2	Destape de cañeria de punto orinal, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato si	UND	10	$ 150.000	$ 1.500.000	21	$ 2.850.000	2,00	$ 300.000	21	$ 3.150.000	100,00%	0,00%
13	**BATERIAS SANITARIAS Y ACCESORIOS EN BAÑOS**												
13.1	Destape de cañeria de punto orinal, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato	UND	16	$ 150.000	$ 2.400.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
13.2	Mantenimiento de punto sanitarios	UND	16	$ 80.000	$ 1.280.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
13.3	Mantenimiento de piletas lavatraperos ubicadas en las baterias de los baños, incluyen reemboquillado,	UND	20	$ 90.000	$ 1.800.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
13.4	Mantenimiento general de las baterias sanitarias (incluye sanitarios, lavamanos, orinales,)	UND	85	$ 150.000	$ 12.750.000	105	$ 15.000.000	0,00	$ -	100	$ 15.000.000	95,24%	4,76%
13.5	Suministro e instalación de fluxometros de cauerdo con las especificaciones tecnicas de los existentes	UND	16	$ 800.000	$ 12.800.000	8	$ 4.000.000	0,00	$ -	6	$ 4.800.000	75,00%	25,00%
14	**SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACION**												
14.1	Mantenimiento tomas electricas de 110v y 220v	UND	120	$ 11.000	$ 1.320.000	19	$ 1.320.000	6,00	$ 66.000	6	$ 66.000	31,58%	68,42%
14.2	Revision y/o instalacion de puntos electricos con suministro de cableado conexiones, tomacorriente	UND	34	$ 100.000	$ 3.400.000	21	$ 3.400.000	5,00	$ 500.000	8	$ 800.000	38,10%	61,90%
14.3	Revisión y/o mantenimiento de calentadores electricos Gimnasio y Direccion General	UND	1	$ 300.000	$ 300.000	0	$ 1.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
14.4	Revisión y/o mantenimiento de hornos electricos semiindustriales	UND	6	$ 150.000	$ 900.000	0	$ 900.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
14.5	Revision y/o mantenimineto de sensores electricos de orinales,	UND	8	$ 120.000	$ 960.000	0	$ 960.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
14.6	Revision y /o mantenimiento de secadores de manos en baños	UND	6	$ 70.000	$ 420.000	0	$ 420.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
14.7	Revision y /o mantenimiento aspiral luminoso electrico del edificio -alturas	UND	1	$ 2.000.000	$ 2.000.000	1	$ 2.000.000	1,00	$ 2.000.000	1	$ 2.000.000	100,00%	0,00%
14.8	Revision y/o mantenimiento del sistema de luminarias del parqueadero por fotoceldas	UND	1	$ 3.000.000	$ 3.000.000	0	$ 3.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
14.9	Revision y /o mantenimiento al punto de iluminacion de la imagen de la aerocivil, plasmada en la	UND	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000	1	$ 1.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
14.10	Revision y /o mantenimiento a sensores de movimiento electricos de rutas de evacuacion	UND	36	$ 35.000	$ 1.260.000	0	$ 1.260.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
INFORME SEMANAL

VERSIÓN: 1.0

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **FECHA:** 2-dic-19


DIRECCIÓN TERRITORIAL:

Semana No 05 **Del :** 25/11/2019 **Al** 1/12/2019

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 38 días

14.11	Revision y/o mantenimiento al sistema panel electrico cincronizado de nego de jardines por reloj	UND	1	$ 2.000.000	$ 2.000.000	0	$ 2.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
14.12	Retiro y/o suministro e instalacion de luminarias tipo led de 60 x 60	UND	200	$ 160.000	$ 32.000.000	106	$ 16.000.000	0,00	$ -	103	$ 16.480.000	97,17%	2,83%
14.13	Retiro y/o suministro e instalacion de luminarias tipo led de circunferencia 18/ ml,	UND	70	$ 160.000	$ 11.200.000	170	$ 27.200.000	0,00	$ -	170	$ 27.200.000	100,00%	0,00%
14.14	Suministro e instalacion luminarias de emergencia tipo Mikey incluye retiro de las existentes que se	UND	30	$ 150.000	$ 4.500.000	30	$ 4.500.000	9,00	$ 1.350.000	10	$ 1.500.000	33,33%	66,67%
14.15	Suministro e instalación de lámparas tipo led acrilica de sobreponer de 1.20 m de acuerdo a	UND	20	$ 150.000	$ 3.000.000	130	$ 7.500.000	35,00	$ 5.250.000	48	$ 7.200.000	36,92%	63,08%
14.16	Suministro e instalación de bombillo ahorardores de rosca tipo led	UND	30	$ 30.000	$ 900.000	87	$ 2.610.000	3,00	$ 90.000	80	$ 2.400.000	91,95%	8,05%
14.17	Suminuistro e instalación luminaria tipo tubo de 1.20 m2, -archivo	UND	30	$ 150.000	$ 4.500.000	2	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
14.18	Suministro e instalación de canaleta PVC y cableado para punto electrico.	UND	30	$ 70.000	$ 2.100.000	3	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
14.19	Revision y /o suministro e instalacion de tomacorrientes que se encuentren en mal estado	UND	100	$ 50.000	$ 5.000.000	106	$ 5.000.000	29,00	$ 1.450.000	39	$ 1.950.000	36,79%	63,21%
15	**SISTEMA DE CONTRAINCENDIO**												
15.1	Realizar la prueba de desempeño de las unidades de bombeo y verificar frente a la curva de	UND	2	$ 9.000.000	$ 18.000.000	0	$ 18.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
16	**VARIOS**												
16.1	Diagnóstico general de la infraestructura del edificio NEEA (Pisos 6 y 1 sótano, areas comunes y parqueadero)	UND	1	$ 20.000.000	$ 20.000.000	1	$ 20.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
16.2	Diagnóstico general de la infraestructura del edificio NAA (Pisos 2 , bodegas y parqueadero	UND	1	$ 15.000.000	$ 15.000.000	1	$ 15.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
16.3	Diagnóstico general del sistema de red contraincendios	UND	2	$ 8.000.000	$ 16.000.000	2	$ 16.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
16.4	Diagnóstico general del sistema BMS Andover	UND	1	$ 8.000.000	$ 8.000.000	1	$ 8.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
16.5	Diagnóstico general del sistema de sonido ambiental y emergencia	UND	1	$ 6.000.000	$ 6.000.000	1	$ 6.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
16.6	Diagnóstico general del sistema de Control de Acceso	UND	1	$ 6.000.000	$ 6.000.000	1	$ 6.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
16.7	Diagnóstico general del sistema de climatización	UND	1	$ 6.000.000	$ 6.000.000	1	$ 6.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
16.8	Diagnóstico general de planta eléctrica	UND	1	$ 3.000.000	$ 3.000.000	1	$ 3.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
	SUBTOTAL				$ 501.141.000		$ 501.141.000		$ 61.730.886		$ 277.022.653	55,28%	44,72%
	ADMINSTRACION	21%			$ 105.239.610		$ 105.239.610		$ 12.963.486		$ 58.174.757	55,28%	44,72%
	IMPREVISTOS	1%			$ 5.011.410		$ 5.011.410		$ 617.309		$ 2.770.227	55,28%	44,72%
	UTILIDAD	5%			$ 25.057.050		$ 25.057.050		$ 3.086.544		$ 13.851.133	55,28%	44,72%
	AIU	27%			$ 135.308.070		$ 135.308.070		$ 16.667.339		$ 74.796.116	55,28%	44,72%
	IVA	19%			$ 4.760.840		$ 4.760.840		$ 586.443		$ 2.631.715	55,28%	44,72%
	TOTAL				**$ 641.209.910**		**$ 641.209.910**		**$ 78.984.668**		**$ 354.450.484**	**55,28%**	**44,72%**

AVANCE FINANCIERO

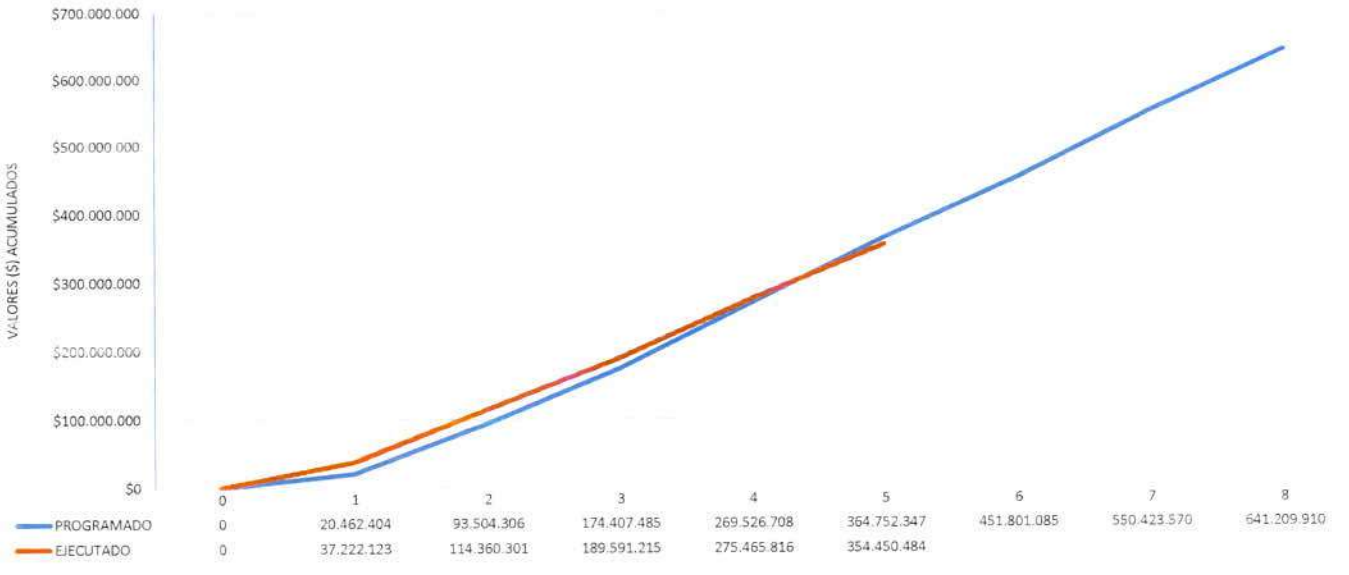

16

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
INFORME SEMANAL

VERSIÓN 1.0

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **FECHA:** 2-dic-19

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

Semana No 05 **Del :** 25/11/2019 **Al:** 1/12/2019

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 38 días

PERSONAL Y EQUIPO (CONTRATISTA)

OBRA:

Director de obra	1	Carmelo Joaquin Rosales Amell
Residente de obra	1	Manuel Ricardo Velasquez Rosales
SST	1	Luis Eduardo Gutierrez
Inspector de obra	1	Rafael Ricardo Garcia Mendez
Maestro de obra	1	Jhon Parra
Oficiales de construcción	3	
Ayudantes de contruccción	3	

AVANCE FINANCIERO

Acta Parcial No.	Periodo	Costo Total
1	24/10/2019 a 24/11/2019	$ 275.465.816
Total Acumulado	**$**	**275.465.816,00**

AVANCE FINANCIERO

Valor Total Contrato
$ 641.209.910,00
Valor facturado Contrato
$ 275.465.816,00
% Avance facturado Acumulado
42,96%

OBSERVACIONES

Los avances en las distintas actividades y consecuentemente en el contrato, se vieron afectados por los eventos de orden publico que se presentaron en la ciudad de Bogotá los dias 21, 22 y 23 de noviembre del presente año.
El dia 21 de noviembre se cancelaron trabajos nocturnos programados debido a que las condiciones de movilidad y seguridad en la ciudad, consecuencia del paro nacional y las movilizaciones sociales, no permitieron a los trabajadores movilizarse, llegar al sitio de trabajo y cumplir con el horario programado.
El dia 22 de noviembre, las actividades se vieron interrumpidas debido a la orden de desalojo que se dio en el edificio NEAA a partir de las 2:00 p.m, se cancelaron trabajos nocturnos programados para esa noche.
El dia 22 de noviembre, no se adelantaron actividades debido a que las condiciones de movilidad y seguridad en la ciudad, consecuencia del paro nacional y las movilizaciones sociales, no permitieron a los trabajadores movilizarse, llegar al sitio de trabajo y cumplir con el horario programado.
Todas las anteriores situaciones, afectaron el avance positivo que se habia logrado en las anteriores semanas, dejando al final una diferencia entre el avance programado contra el ejecutado de un 1,09%, el cual, si bien es cierto no es significativo, se deja claro que se dio por motivos de fuerza mayor y no es imputable al contratista.

DIRECTOR DE OBRA

ING. CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL

17

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	MINISTERIO DE TRANSPORTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL INFORME SEMANAL	VERSIÓN	1.0

UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			FECHA:	9-dic-19
DIRECCIÓN TERRITORIAL:					
Semana No	06	Del :	2/12/2019	Al:	8/12/2019
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		45	dias		

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL -NEAA Y NAA.

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

NEAA y NAA

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	13,58%	70,46%	(%) Ejecutado	12,46%	67,73%
Valor programado ($)	$ 87.048.737,80	$ 451.801.084,52	Valor ejecutado ($)	$ 79.867.523,00	$ 434.318.006,87

Notas:

• Se suscribió el Acta de Inicio del contrato de Consultoría 19001111 H4 de 2019 el día 24 de octubre de 2019

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	CONSORCIO CRS	Contratista:	
Contrato No:	19001111 H4 de 2019	Contrato No:	
Valor Inicial:	$ 641.209.910	Valor Inicial:	
Plazo inicial:	Seis (6) meses	Plazo inicial:	
Fecha de iniciación:	24-oct-19	Fecha de iniciación:	
Fecha de vencimiento:	20-dic-19	Fecha de vencimiento:	
Valor adición:	$ 0	Valor adición:	
Valor total contrato:	$ 641.209.910	Valor total contrato:	

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DESARROLLO DEL CONTRATO:

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades en diferentes áreas:

1. Cambio de luminarias:

   • Archivo (sótano)
   • Tercer piso ala oriental
   • Recepción
   • Cuarto de coordinación de vigilancia

2. Cambio de ventanas de fibrocemento:

   • Tercer piso ala oriental

3. Mantenimiento general de baterias de baño, incluyendo sanitarios, orinales y lavamanos de los pisos 1, 2 3, 4 y 5, hombres y mujeres.

4. Actividades de mantenimiento e impermeabilización de cubierta.

5. Mantenimiento y/o cambio de tomacorrientes que se encontraron en mal estado

6. Instalación de luminarias de emergencia

7. Mantenimiento de aviso con logo de la AEROCIVIL en la fachada

8. Limpieza de cajas de inspección del edificio y la tubería que las conecta.

9. Limpieza de cárcamo de aguas lluvias ubicado a la entrada del sótano por la entrada vehicular.

10. Limpieza y mantenimiento de tuberia de aguas lluvias colgada en sótano

11. Pintura general en pasillos del primer piso

12. Pintura de techos de baños de los pisos 2 y 3

13. Emboquillado de juntas de pisos de baños

SOCIALIZACIÓN Y VISITA DE CAMPO:
Se realizan recorridos con el administrador del edificio, la supervisión del contrato y su apoyo técnico, con el fin de establecer las zonas a intervenir y poder desarrollar el plan de trabajo

METODOLOGÍA GENERAL:
Se establece que será necesario intervenir los fines de semana y festivos, así como también en el horario nocturno con el fin de no interferir en las actividades cotidianas del edificio, no obstante, se desarrollarán las actividades prioritarias y que no generen ruido que pueda molestar a los funcionarios.

78

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
INFORME SEMANAL

VERSIÓN 1.0

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA — FECHA: 9-dic-19

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

Semana No 06 — Del: 2/12/2019 — Al: 8/12/2019

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 45 dias

RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO

FINANCIERO:

		CONDICIONES INICIALES				ACTUALIZACIÓN		EJECUTADO		ACUMULADO		%	%
ITEM	CAPITULO Y ACTIVIDADES	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	EJEC	X EJEC
1	**DEMARCACION**												
1.2	Suministro, instalación y demarcación de pintura epóxica (poliuretano)	M2	650	$ 25.000	$ 16.250.000	599,27	$ 16.250.000	73,09	$ 1.827.150	501,822	$ 12.545.550	83,74%	16,26%
1.3	Suministro, aplicación y demarcación de pintura para parqueadero	ML	320	$ 6.700	$ 2.144.000	1253,6	$ 8.399.120	0,00	$ -	1253,6	$ 8.399.120	100,00%	0,00%
1.4	Suministro e instalación de cinta antideslizante	ML	450	$ 10.000	$ 4.500.000	538,48	$ 5.204.800	0,00	$ -	538,48	$ 5.384.800	100,00%	0,00%
2	**IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS**												
2.1	Aplicación de sellante en uniones de flanches de tejado para evitar filtracion	ML	550	$ 60.000	$ 33.000.000	550	$ 33.000.000	165,00	$ 9.900.000	330	$ 19.800.000	60,00%	40,00%
2.2	Aplicación de producto impermeabilizante en pegues de flanches	ML	120	$ 60.000	$ 7.200.000	120	$ 7.200.000	36,00	$ 2.160.000	72	$ 4.320.000	60,00%	40,00%
2.3	Impermeabilización de acuerdo con las especificaciones técnicas en canales superiores	ML	155	$ 60.000	$ 9.300.000	167,8	$ 9.300.000	50,34	$ 3.020.400	100,68	$ 6.040.800	60,00%	40,00%
2.4	Limpieza y/o mantenimiento en canales y rejillas de bajantes retiro de material particulado	ML	155	$ 60.000	$ 9.300.000	155	$ 9.300.000	46,50	$ 2.790.000	93	$ 5.580.000	60,00%	40,00%
2.5	Revision y /o instalación de flanches en tejas sueltas	UN	150	$ 150.000	$ 22.500.000	150	$ 22.500.000	45,00	$ 6.750.000	90	$ 13.500.000	60,00%	40,00%
3	**MANTENIMIENTO DE PUERTAS (inlcuye en general el desmonte reposición e instalación de piezas para el correcto funcionamiento)**												
3.1	Desmonte de divisiones en vidrio y/o puertas	M2	245	$ 50.000	$ 12.250.000	0	$ 2.500.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
3.2	Desmonte y retiro de archivadores por cuerpos	UND	3	$ 120.000	$ 360.000	0	$ 360.000	0,00	$ -	3	$ 360.000	#¡DIV/0!	#¡DIV/0
3.3	Mantenimiento del barandal de escaleras y hall del edificio	ML	145	$ 45.000	$ 6.525.000	346,71	$ 15.601.950	0,00	$ -	346,71	$ 15.601.950	100,00%	0,00%
3.4	suministro e instalacion de ventanas de inspeccion en fibrocemento. De 60 x 60	UND	260	$ 120.000	$ 31.200.000	338	$ 36.960.000	9,00	$ 1.080.000	326	$ 39.120.000	96,45%	3,55%
3.5	Mantenimiento a estaciones o paneles de emergencias en lamina y vidrio	UND	24	$ 100.000	$ 2.400.000	0	$ 2.400.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
3.6	Mantenimiento y / suministro e instalacion de chapas con manija en acero inxidable	UND	50	$ 140.000	$ 7.000.000	50	$ 7.000.000	15,00	$ 2.100.000	30	$ 4.200.000	60,00%	40,00%
3.7	Mantenimiento de puertas oficinas privadas	UND	25	$ 95.000	$ 2.375.000	8	$ 2.375.000	2,40	$ 228.000	4,8	$ 456.000	60,00%	40,00%
3.8	Suministro e instalación de chapa para puerta incluye dos llaves	UND	35	$ 130.000	$ 4.550.000	35	$ 4.550.000	10,50	$ 1.365.000	21	$ 2.730.000	60,00%	40,00%
3.9	Suministro e instalación de chapa para escritorio, archivadores verticales y horizontales incluye dos	UND	80	$ 65.000	$ 5.200.000	80	$ 5.200.000	24,00	$ 1.560.000	48	$ 3.120.000	60,00%	40,00%
3.10	Instalación puertas existentes en vidrio de 8mm con marco de aluminio	M2	12	$ 150.000	$ 1.800.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
4	**PINTURA EXTERNA E INTERNA**												
4.1	Limpieza e impermeabilizacion de muros de alta resistencia con suministro e instalación de pintura	M2	800	$ 20.000	$ 16.000.000	700,75	$ 16.000.000	102,66	$ 2.053.140	563,87	$ 11.277.480	80,47%	19,53%
4.2	Resane en filos y dilataciones y pintura si es el caso	ML	150	$ 8.100	$ 1.215.000	569,62	$ 5.636.635	132,14	$ 1.070.294	393,44	$ 3.186.864	69,07%	30,93%
4.3	Resane y pintura vinilo tipo 1 en muro de Superboard interno y externo	M2	120	$ 16.000	$ 1.920.000	584,98	$ 1.920.000	175,49	$ 2.807.904	350,988	$ 5.615.808	60,00%	40,00%
4.4	Suminsitro e instalación de pintura de muros exteriores con koraza dos manos, incluye rasqueteo	M2	120	$ 20.000	$ 2.400.000	129,02	$ 2.400.000	15,73	$ 314.580	108,05	$ 2.160.960	83,75%	16,25%
4.5	Suministro e instalacion Pintura cielo raso en vinilo, en baños	M2	150	$ 16.000	$ 2.400.000	480,1	$ 2.400.000	132,03	$ 2.112.480	304,06	$ 4.864.960	63,33%	36,67%
4.6	Suministro e instalacion de Pintura cielo raso en vinilo, en baños	ML	75	$ 14.000	$ 1.050.000	922,82	$ 1.050.000	276,85	$ 3.875.844	553,692	$ 7.751.688	60,00%	40,00%
5	**PISOS Y ZÓCALOS**												
5.1	Desmonte, suministro e instalación de piso cerámica 60x60 cm	M2	20	$ 65.000	$ 1.300.000	0	$ 1.300.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
5.2	Sellamiento de juntas y fisuras entre adoquines con sello de arena en sendero peatonal NEAA - CEA	M2	200	$ 19.000	$ 3.800.000	253,86	$ 4.823.340	0,00	$ -	253,86	$ 4.823.340	100,00%	0,00%
5.3	Sello y tratamiento de juntas de construccion o dilatacion en pisos	ML	100	$ 100.000	$ 10.000.000	0	$ 5.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
6	**PAÑETES Y ENCHAPES**												
6.1	Mantenimiento y/o aplicación de producto en juntas de dilatacion	M2	40	$ 25.000	$ 1.000.000	83,8	$ 1.000.000	23,11	$ 577.800	52,98	$ 1.324.600	63,23%	36,77%
6.2	Resane de muros en general	M2	40	$ 16.000	$ 640.000	0	$ 640.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
6.3	Retiro de enchape de piletas lavatraperos.	M2	20	$ 15.000	$ 300.000	22	$ 300.000	6,00	$ 90.000	14	$ 210.000	63,64%	36,36%
6.4	Suministro e instalación de enchape de piletas lavatraperos.	M2	20	$ 50.000	$ 1.000.000	20	$ 1.000.000	6,00	$ 300.000	12	$ 600.000	60,00%	40,00%
7	**CARPINTERIA**												
7.1	Suministro e instalacion de cerrojo y bisagras para divisiones de baños	UND	20	$ 60.000	$ 1.200.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
8	**MANTENIMIENTO VIDRIOS Y VENTANERIA**												
8.2	Revision y/o reparacion de paneles de encerramiento del balcon quinto piso incluye	M2	40	$ 55.000	$ 2.200.000	0	$ 550.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
8.3	Suministro e instalación de pie de amigo para recepción y rejilla	UND	40	$ 48.000	$ 1.920.000	0	$ 1.920.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
8.4	Suministro e instalacion de Pelicula samblasteada con logo de la aerocivil para vidrios en zonas de	M2	30	$ 70.000	$ 2.100.000	65,74	$ 840.000	19,72	$ 1.380.540	39,444	$ 2.761.080	60,00%	40,00%
9	**INFRAESTRUCTURA GENERAL**												
9.1	Desmonte pared en superboard	M2	5	$ 10.000	$ 50.000	0	$ 50.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
9.2	Desmonte de divisiones en drywall	M2	10	$ 10.000	$ 100.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
9.3	Mantenimiento pintura de puertas metal madera que icluye: tableros lamina de acero inoxidable visagras	M2	12	$ 80.000	$ 960.000	31,57	$ 7.840.000	9,47	$ 757.680	18,942	$ 1.515.360	60,00%	40,00%
9.4	Suministro e instalación de guardaescobas en madera de acuerdo con las especificaciones	ML	50	$ 40.000	$ 2.000.000	0	$ 2.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
9.5	Suministro e intalación de pasamanos anclado al piso de cauerdo a lo normado en escalera principal	ML	16	$ 577.000	$ 9.232.000	13,39	$ 7.726.030	0,00	$ -	13,39	$ 7.726.030	100,00%	0,00%

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
INFORME SEMANAL

VERSIÓN 1.00

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **FECHA:** 9-dic-19

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

Semana No 06 **Del :** 2/12/2019 **Al:** 8/12/2019

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 45 días

10	**RED HIDRAULICA Y SANITARIA**														
10.1	Desmonte, Suministro e Instalacion de Conexión Superior Orinales (incluye desmonte, limpieza y	UND	8	$ 150.000	$ 1.200.000	0	$ 2.850.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.2	Desmonte, suministro e Instalacion de llave para pocetas	UND	12	$ 55.000	$ 660.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.3	Destape de puntos sanitarios y/o lavamanos con sonda electrica	UND	14	$ 60.000	$ 840.000	0	$ 360.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.4	Destape de cañeria de punto sanitario, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato si	UND	4	$ 70.000	$ 280.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.5	Mantenimiento y reparacion de Shut de Basuras	UND	1	$ 3.000.000	$ 3.000.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.6	Mantenimiento de cajas de inspección en general de aguas lluvias y aguas hervidas incluye retiro de	UND	18	$ 250.000	$ 4.500.000	12	$ 4.500.000	4,00	$ 1.000.000	8	$ 2.000.000	66,67%	33,33%
10.7	Mantenimiento de sifones	UND	46	$ 30.000	$ 1.380.000	0	$ 420.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.8	Mantenimiento llaves tipo ganso para cafeterias y comedor institucional	UND	6	$ 80.000	$ 480.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.9	Mantenimiento y puesta a punto el sistema de riego de cuadros vivos de jardineria	UND	1	$ 900.000	$ 900.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.10	Mantenimiento divisiones y puertas de acero inxidable de baños	M2	8	$ 100.000	$ 800.000	97,77	$ 9.777.000	0,00	$ -	97,77	$ 9.777.000	100,00%	0,00%
10.11	Mantenimiento de válvula sanitaria	UND	16	$ 50.000	$ 800.000	0	$ 800.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.12	Mantenimiento de conexiones de pared a sanitario.	ML	14	$ 60.000	$ 840.000	0	$ 840.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.13	Mantenimiento de la tuberia y cajas de inspección	ML	40	$ 106.000	$ 4.240.000	28,43	$ 4.240.000	8,53	$ 904.074	17,058	$ 1.808.148	60,00%	40,00%
10.14	Mantenimiento de drenajes y disposición final certificado evacuación lodos con equipo adecuado	ML	40	$ 106.000	$ 4.240.000	0	$ 4.240.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.15	Mantenimiento de tubería interna desde el contador avenida principal calle 26	ML	1	$ 4.500.000	$ 4.500.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.16	Mantenimiento de tuberia PVC de 2/1" de acometida al tanque	ML	28	$ 40.000	$ 1.120.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.17	Mantenimiento de tuberia colgante con limpieza y traslado de lodos hasta botadero certificado	ML	1	$ 5.500.000	$ 5.500.000	1	$ 5.500.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.18	Revision y/o fijacion de tuberia colgante con abrasadera metalica x golpe de ariete	ML	100	$ 40.000	$ 4.000.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.19	Retiro y /o adecuacion de ventanas de baños para ventilacion	UND	10	$ 70.000	$ 700.000	10	$ 700.000	0,00	$ -	10	$ 700.000	100,00%	0,00%
10.20	Suministro e instalacion de llave ahorradora de paso de agua en piletas y areas externas	UND	4	$ 200.000	$ 800.000	7	$ -	2,00	$ 400.000	4	$ 800.000	57,14%	42,86%
10.21	Suministro e instalacion de registro de paso de agua en PVC 1/2,-1/3,-1/4,-1/4	UND	12	$ 18.000	$ 216.000	0	$ 216.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.22	Suministro e Instalacion de bizcocho sanitario	UND	8	$ 80.000	$ 640.000	5	$ 640.000	5,00	$ 400.000	5	$ 400.000	100,00%	0,00%
10.23	Suministro e instalación de tuberia PVC de 2/1" de acometida al tanque	ML	12	$ 65.000	$ 780.000	0	$ 797.125	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.24	Suministro e instalación de sifones con retenedor de olores en baños	UND	14	$ 95.000	$ 1.330.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.25	Suministro e instalacion de dispensador de jabon para manos en baños	UND	12	$ 120.000	$ 1.440.000	0	$ 1.440.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.26	Suministro e instalación llaves tipo ganso para cafeterias y comedor institucional	UND	6	$ 170.000	$ 1.020.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.27	Suministro e instalación de tapa registros	UND	22	$ 20.000	$ 440.000	22	$ 440.000	0,00	$ -	22	$ 440.000	100,00%	0,00%
11	**RED DE AGUA POTABLE**												
11.1	Demolición regata lineal para instalar tuberia, en piso, y en pared	ML	20	$ 18.000	$ 360.000	0	$ 360.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
11.2	Mantenimiento correctivo de tuberia (incluye demolición de muro e instalación de tuberia y	UND	4	$ 200.000	$ 800.000	104,47	$ 800.000	0,00	$ -	124	$ 24.800.000	118,69%	-18,69%
11.3	Suministro e instalación de tuberia pvc 1/2 ", 3/4", 1 1/2 ", 1", 2"	ML	16	$ 19.000	$ 304.000	0	$ 304.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
12	**REDES DE AGUAS NEGRAS (hervidas)**												
12.1	Destape de cañeria de punto sanitario, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato si	UND	14	$ 150.000	$ 2.100.000	67	$ 9.300.000	3,00	$ 450.000	67	$ 10.050.000	100,00%	0,00%
12.2	Destape de cañeria de punto orinal, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato si	UND	10	$ 150.000	$ 1.500.000	21	$ 2.850.000	0,00	$ -	21	$ 3.150.000	100,00%	0,00%
13	**BATERIAS SANITARIAS Y ACCESORIOS EN BAÑOS**												
13.1	Destape de cañeria de punto orinal, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato	UND	16	$ 150.000	$ 2.400.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
13.2	Mantenimiento de punto sanitarios	UND	16	$ 80.000	$ 1.280.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
13.3	Mantenimiento de piletas lavatraperos ubicadas en las baterias de los baños, incluyen reemboquillado,	UND	20	$ 90.000	$ 1.800.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
13.4	Mantenimiento general de las baterias sanitarias (incluye sanitarios, lavamanos, orinales,)	UND	85	$ 150.000	$ 12.750.000	105	$ 15.000.000	5,00	$ 750.000	105	$ 15.750.000	100,00%	0,00%
13.5	Suministro e instalación de fluxometros de cauerdo con las especificaciones tecnicas de los existentes	UND	16	$ 800.000	$ 12.800.000	8	$ 4.000.000	0,00	$ -	6	$ 4.800.000	75,00%	25,00%
14	**SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACION**												
14.1	Mantenimiento tomas electricas de 110v y 220v	UND	120	$ 11.000	$ 1.320.000	19	$ 1.320.000	6,00	$ 66.000	12	$ 132.000	63,16%	36,84%
14.2	Revision y/o instalacion de puntos electricos con suministro de cableado conexiones, tomacorriente	UND	34	$ 100.000	$ 3.400.000	21	$ 3.400.000	5,00	$ 500.000	13	$ 1.300.000	61,90%	38,10%
14.3	Revisión y/o mantenimiento de calentadores electricos Gimnacio y Direccion General	UND	1	$ 300.000	$ 300.000	0	$ 1.200.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
14.4	Revision y/o mantenimiento de hornos eléctricos semiindustriales	UND	6	$ 150.000	$ 900.000	0	$ 900.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
14.5	Revision y/o mantenimineto de sensores eléctricos de orinales,	UND	8	$ 120.000	$ 960.000	0	$ 960.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
14.6	Revision y /o mantenimiento de secadores de manos en baños	UND	6	$ 70.000	$ 420.000	0	$ 420.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
14.7	Revision y /o mantenimiento aspiral luminoso electrico del edificio -alturas	UND	1	$ 2.000.000	$ 2.000.000	1	$ 2.000.000	0,00	$ -	1	$ 2.000.000	100,00%	0,00%
14.8	Revision y/o mantenimiento del sistema de luminarias del parqueadero por fotoceldas	UND	1	$ 3.000.000	$ 3.000.000	0	$ 3.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
14.9	Revision y /o mantenimiento al punto de iluminacion de la imagen de la aerocivil, plasmada en la	UND	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000	1	$ 1.000.000	1,00	$ 1.000.000	1	$ 1.000.000	100,00%	0,00%
14.10	Revision y /o mantenimiento a sensores de movimiento electricos de rutas de evacuacion	UND	36	$ 35.000	$ 1.260.000	0	$ 1.260.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
INFORME SEMANAL

VERSIÓN 1.0

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **FECHA:** 9-dic-19


DIRECCIÓN TERRITORIAL:

Semana No 06 **Del :** 2/12/2019 **AL** 8/12/2019

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 45 días

14.11	Revision y/o mantenimiento al sistema panel electrico cincronizado de riego de jardines por reloj	UND	1	$ 2.000.000	$ 2.000.000	0	$ 2.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
14.12	Retiro y/o suministro e instalacion de luminarias tipo led de 60 x 60	UND	200	$ 160.000	$ 32.000.000	106	$ 16.000.000	3,00	$ 480.000	106	$ 16.960.000	100,00%	0,00%
14.13	Retiro y/o suministro e instalacion de luminarias tipo led de circunferencia 18/ ml,	UND	70	$ 160.000	$ 11.200.000	170	$ 27.200.000	0,00	$ -	170	$ 27.200.000	100,00%	0,00%
14.14	Suministro e instalacion luminarias de emergencia tipo Mikey incluye retiro de las existentes que se	UND	30	$ 150.000	$ 4.500.000	30	$ 4.500.000	9,00	$ 1.350.000	19	$ 2.850.000	63,33%	36,67%
14.15	Suministro e instalación de lámparas tipo led acrilica de sobreponer de 1.20 m de acuerdo a	UND	20	$ 150.000	$ 3.000.000	130	$ 7.500.000	35,00	$ 5.250.000	83	$ 12.450.000	63,85%	36,15%
14.16	Suministro e instalación de bombillo ahorardores de rosca tipo led	UND	30	$ 30.000	$ 900.000	87	$ 2.610.000	3,00	$ 90.000	83	$ 2.490.000	95,40%	4,60%
14.17	Suminuistro e instalación luminaria tipo tubo de 1.20 m2, -archivo	UND	30	$ 150.000	$ 4.500.000	2	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
14.18	Suministro e instalación de canaleta PVC y cableado para punto electrico	UND	30	$ 70.000	$ 2.100.000	3	$ -	3,00	$ 210.000	3	$ 210.000	100,00%	0,00%
14.19	Revision y /o suministro e instalacion de tomacorientes que se encuentren en mal estado	UND	100	$ 50.000	$ 5.000.000	106	$ 5.000.000	29,00	$ 1.450.000	68	$ 3.400.000	64,15%	35,85%
15	**SISTEMA DE CONTRAINCENDIO**												
15.1	Realizar la prueba de desempeño de las unidades de bombeo y verificar frente a la curva de	UND	2	$ 9.000.000	$ 18.000.000	0	$ 18.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
16	**VARIOS**												
16.1	Diagnóstico general de la infraestructura del edificio NEEA (Pisos 6 y 1 sótano, areas comunes y parqueadero)	UND	1	$ 20.000.000	$ 20.000.000	1	$ 20.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
16.2	Diagnóstico general de la infraestructura del edificio NAA (Pisos 2 , bodegas y parqueadero	UND	1	$ 15.000.000	$ 15.000.000	1	$ 15.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
16.3	Diagnóstico general del sistema de red contraincendios	UND	2	$ 8.000.000	$ 16.000.000	2	$ 16.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
16.4	Diagnóstico general del sistema BMS Andover	UND	1	$ 8.000.000	$ 8.000.000	1	$ 8.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
16.5	Diagnóstico general del sistema de sonido ambiental y emergencia	UND	1	$ 6.000.000	$ 6.000.000	1	$ 6.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
16.6	Diagnóstico general del sistema de Control de Acceso	UND	1	$ 6.000.000	$ 6.000.000	1	$ 6.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
16.7	Diagnóstico general del sistema de climatización	UND	1	$ 6.000.000	$ 6.000.000	1	$ 6.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
16.8	Diagnóstico general de planta eléctrica	UND	1	$ 3.000.000	$ 3.000.000	1	$ 3.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
	SUBTOTAL				$ 501.141.000		$ 501.141.000		$ 62.420.886		$ 339.443.538	67,73%	32,27%
	ADMINSTRACION	21%			$ 105.239.610		$ 105.239.610		$ 13.108.386		$ 71.283.143	67,73%	32,27%
	IMPREVISTOS	1%			$ 5.011.410		$ 5.011.410		$ 624.209		$ 3.394.435	67,73%	32,27%
	UTILIDAD	5%			$ 25.057.050		$ 25.057.050		$ 3.121.044		$ 16.972.177	67,73%	32,27%
	AIU	27%			$ 135.308.070		$ 135.308.070		$ 16.853.639		$ 91.649.755	67,73%	32,27%
	IVA	19%			$ 4.760.840		$ 4.760.840		$ 592.998		$ 3.224.714	67,73%	32,27%
	TOTAL				**$ 641.209.910**		**$ 641.209.910**		**$ 79.867.523**		**$ 434.318.007**	**67,73%**	**32,27%**

AVANCE FINANCIERO

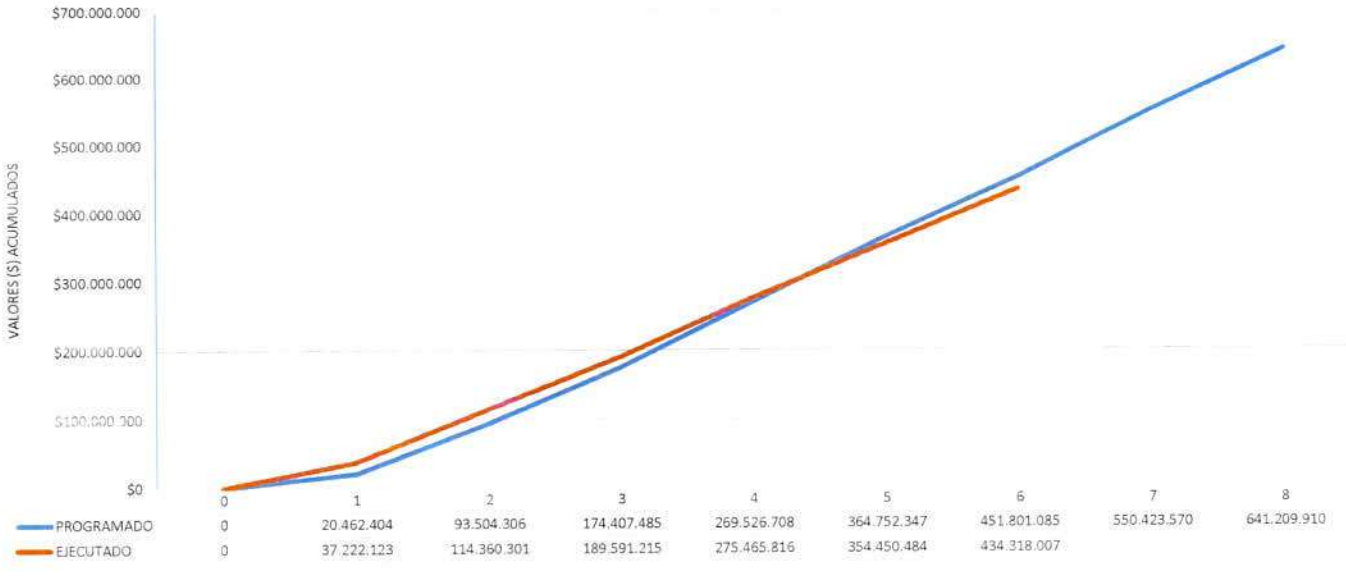

21

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
INFORME SEMANAL

VERSIÓN: no

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA: 09-dic-19
DIRECCIÓN TERRITORIAL:
Semana No 06 **Del :** 02/12/2019 **Al:** 08/12/2019
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 45 días

PERSONAL Y EQUIPO (CONTRATISTA)

OBRA:

Director de obra	1	Carmelo Joaquin Rosales Amell
Residente de obra.	1	Manuel Ricardo Velasquez Rosales
SST	1	Luis Eduardo Gutierrez
Inspector de obra	1	Rafael Ricardo Garcia Mendez
Maestro de obra	1	Jhon Parra
Oficiales de construcción	3	
Ayudantes de contruccción	3	

AVANCE FINANCIERO

Acta Parcial No.	Periodo	Costo Total
1	24/10/2019 a 24/11/2019	$ 275.465.816
Total Acumulado	**$**	**275.465.816,00**

AVANCE FINANCIERO

Valor Total Contrato
$ 641.209.910,00
Valor facturado Contrato
$ 275.465.816,00
% Avance facturado Acumulado
42,96%

OBSERVACIONES

Los avances en las distintas actividades y consecuentemente en el contrato, se vieron afectados por los eventos de orden publico que se presentaron en la ciudad de Bogotá los días 21, 22 y 23 de noviembre del presente año.
El día 21 de noviembre se cancelaron trabajos nocturnos programados debido a que las condiciones de movilidad y seguridad en la ciudad, consecuencia del paro nacional y las movilizaciones sociales, no permitieron a los trabajadores movilizarse, llegar al sitio de trabajo y cumplir con el horario programado.
El día 22 de noviembre, las actividades se vieron interrumpidas debido a la orden de desalojo que se dio en el edificio NEAA a partir de las 2:00 p.m, se cancelaron trabajos nocturnos programados para esa noche.
El día 22 de noviembre, no se adelantaron actividades debido a que las condiciones de movilidad y seguridad en la ciudad, consecuencia del paro nacional y las movilizaciones sociales, no permitieron a los trabajadores movilizarse, llegar al sitio de trabajo y cumplir con el horario programado.
Todas las anteriores situaciones, afectaron el avance positivo que se habia logrado en las anteriores semanas, dejando al final una diferencia entre el avance programado contra el ejecutado de un 1,09%, el cual, si bien es cierto no es significativo, se deja claro que se dio por motivos de fuerza mayor y no es imputable al contratista.

DIRECTOR DE OBRA

ING. CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL

22

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
INFORME SEMANAL

VERSIÓN 1.0

UNIDAD EJECUTORA:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			**FECHA:**	17-dic-19
DIRECCIÓN TERRITORIAL:					
Semana No	07	**Del :**	9/12/2019	**Al:**	16/12/2019
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		53	días		

OBJETO DE LOS CONTRATOS DE OBRA

REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL -NEAA Y NAA.

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

NEAA y NAA

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	15,38%	85,84%	(%) Ejecutado	16,30%	84,04%
Valor programado ($)	$ 98.622.485,50	$ 550.423.570,02	Valor ejecutado ($)	$ 104.531.902,63	$ 538.849.909,50

Notas:
- Se suscribió el Acta de Inicio del contrato de Consultoría 19001111 H4 de 2019 el día 24 de octubre de 2019

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	CONSORCIO CRS	**Contratista:**	
Contrato No:	19001111 H4 de 2019	**Contrato No:**	
Valor Inicial:	$ 641.209.910	**Valor Inicial:**	
Plazo inicial:	Seis (6) meses	**Plazo inicial:**	
Fecha de iniciación:	24-oct-19	**Fecha de iniciación:**	
Fecha de vencimiento:	20-dic-19	**Fecha de vencimiento:**	
Valor adición:	$ 0	**Valor adición:**	
Valor total contrato:	$ 641.209.910	**Valor total contrato:**	

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DESARROLLO DEL CONTRATO:

Durante la semana se realizaron las siguientes actividades en diferentes áreas:

1. Cambio de luminarias:

   • Recepción (mueble)

2. Mantenimiento general de baterías de baño, incluyendo sanitarios, orinales y lavamanos de los pisos 1, 2 3, 4 y 5, hombres y mujeres, en edificio NEAA y en el NAA.

3. Cambios de fluxómetros que se encontraron en mal estado.

4. Actividades de mantenimiento e impermeabilización de cubierta

5. Cambio de cerraduras de manija en acero inoxidable, poma de madera y de escritorios en todos los pisos

6. Mantenimiento y/o cambio de tomacorrientes que se encontraron en mal estado

7. Instalación de luminarias de emergencia

8. Mantenimiento de aviso con logo de la AEROCIVIL en la fachada

9. Instalación de película tipo sanblasting en la recepción del edificio, puertas de acceso y oficina 5to piso.

10. Limpieza de cajas de inspección del edificio y la tubería que las conecta.

11. Limpieza de cárcamo de aguas lluvias ubicado a la entrada del sótano por la entrada vehicular.

12. Limpieza y mantenimiento de tubería de aguas lluvias colgada en sótano

13. Arreglo de cielo raso en baño de mujeres piso 1

14. Pintura general en pasillos del primer piso

15. Pintura de techos de baños del piso 1

16. Emboquillado de juntas de pisos de baños

17. Instalación de nuevos puntos eléctricos

SOCIALIZACIÓN Y VISITA DE CAMPO:
Se realizan recorridos con el administrador del edificio, la supervisión del contrato y su apoyo técnico, con el fin de establecer las zonas a intervenir y poder desarrollar el plan de trabajo.

METODOLOGÍA GENERAL:
Se establece que será necesario intervenir los fines de semana y festivos, así como también en el horario nocturno con el fin de no interferir en las actividades cotidianas del edificio, no obstante se desarrollarán las actividades prioritarias y que no generen ruido que pueda molestar a los funcionarios

23

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
INFORME SEMANAL

VERSIÓN 1.0

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA: 17-dic-19
DIRECCIÓN TERRITORIAL:
Semana No 07 Del : 9/12/2019 Al: 16/12/2019
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 53 dias

RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO

FINANCIERO:

		CONDICIONES INICIALES				ACTUALIZACIÓN		EJECUTADO		ACUMULADO		%	%
ITEM	CAPITULO Y ACTIVIDADES	UN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	EJEC	X EJEC
1	**DEMARCACION**												
1.2	Suministro, instalación y demarcación de pintura epóxica (poliuretano)	M2	650	$ 25.000	$ 16.250.000	599,27	$ 16.250.000	97,45	$ 2.436.200	599,27	$ 14.981.750	100,00%	0,00%
1.3	Suministro, aplicación y demarcación de pintura para parqueadero	ML	320	$ 6.700	$ 2.144.000	1253,6	$ 8.399.120	0,00	$ -	1253,6	$ 8.399.120	100,00%	0,00%
1.4	Suministro e instalación de cinta antideslizante	ML	450	$ 10.000	$ 4.500.000	538,48	$ 5.204.800	0,00	$ -	538,48	$ 5.384.800	100,00%	0,00%
2	**IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS**												
2.1	Aplicación de sellante en uniones de flanches de tejado para evitar filtracion	ML	550	$ 60.000	$ 33.000.000	550	$ 33.000.000	220,00	$ 13.200.000	550	$ 33.000.000	100,00%	0,00%
2.2	Aplicación de producto impermeabilizante en pegues de flanches	ML	120	$ 60.000	$ 7.200.000	120	$ 7.200.000	48,00	$ 2.880.000	120	$ 7.200.000	100,00%	0,00%
2.3	Impermeabilización de acuerdo con las especificaciones técnicas en canales superiores	ML	155	$ 60.000	$ 9.300.000	167,8	$ 9.300.000	67,12	$ 4.027.200	167,8	$ 10.068.000	100,00%	0,00%
2.4	Limpieza y/o mantenimiento en canales y rejillas de bajantes retiro de material particulado	ML	155	$ 60.000	$ 9.300.000	155	$ 9.300.000	62,00	$ 3.720.000	155	$ 9.300.000	100,00%	0,00%
2.5	Revision y /o instalación de flanches en tejas sueltas	UN	150	$ 150.000	$ 22.500.000	150	$ 22.500.000	60,00	$ 9.000.000	150	$ 22.500.000	100,00%	0,00%
3	**MANTENIMIENTO DE PUERTAS (inlcuye en general el desmonte reposición e instalación de piezas para el correcto funcionamiento)**												
3.1	Desmonte de divisiones en vidrio y/o puertas	M2	245	$ 50.000	$ 12.250.000	0	$ 2.500.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
3.2	Desmonte y retiro de archivadores por cuerpos	UND	3	$ 120.000	$ 360.000	0	$ 360.000	-3,00	$ (360.000)	0	$	0,00%	0,00%
3.3	Mantenimiento del barandal de escaleras y hall del edificio	ML	145	$ 45.000	$ 6.525.000	346,71	$ 15.601.950	0,00	$ -	346,71	$ 15.601.950	100,00%	0,00%
3.4	suministro e instalacion de ventanas de inspeccion en fibrocemento. De 60 x 60	UND	260	$ 120.000	$ 31.200.000	338	$ 36.960.000	12,00	$ 1.440.000	338	$ 40.560.000	100,00%	0,00%
3.5	Mantenimiento a estaciones o paneles de emergencias en lamina y vidrio	UND	24	$ 100.000	$ 2.400.000	0	$ 2.400.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
3.6	Mantenimiento y / suministro e instalacion de chapas con manija en acero inxidable	UND	50	$ 140.000	$ 7.000.000	50	$ 7.000.000	20,00	$ 2.800.000	50	$ 7.000.000	100,00%	0,00%
3.7	Mantenimiento de puertas oficinas privadas	UND	25	$ 95.000	$ 2.375.000	8	$ 2.375.000	3,20	$ 304.000	8	$ 760.000	100,00%	0,00%
3.8	Suministro e instalación de chapa para puerta incluye dos llaves	UND	35	$ 130.000	$ 4.550.000	35	$ 4.550.000	14,00	$ 1.820.000	35	$ 4.550.000	100,00%	0,00%
3.9	Suministro e instalación de chapa para escritorio, archivadores verticales y horizontales incluye dos	UND	80	$ 65.000	$ 5.200.000	80	$ 5.200.000	32,00	$ 2.080.000	80	$ 5.200.000	100,00%	0,00%
3.10	Instalación puertas existentes en vidrio de 8mm con marco de aluminio	M2	12	$ 150.000	$ 1.800.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
4	**PINTURA EXTERNA E INTERNA**												
4.1	Limpieza e impermeabilizacion de muros de alta resistencia con suministro e instalación de pintura	M2	800	$ 20.000	$ 16.000.000	700,75	$ 16.000.000	136,88	$ 2.737.520	700,75	$ 14.015.000	100,00%	0,00%
4.2	Resane en filos y dilataciones y pintura si es el caso	ML	150	$ 8.100	$ 1.215.000	569,62	$ 5.636.635	176,18	$ 1.427.058	569,62	$ 4.613.922	100,00%	0,00%
4.3	Resane y pintura vinilo tipo 1 en muro de Superboard interno y externo	M2	120	$ 16.000	$ 1.920.000	584,98	$ 1.920.000	233,99	$ 3.743.872	584,98	$ 9.359.680	100,00%	0,00%
4.4	Suminsitro e instalación de pintura de muros exteriores con koraza dos manos, incluye rasqueteo	M2	120	$ 20.000	$ 2.400.000	129,02	$ 2.400.000	20,97	$ 419.440	129,02	$ 2.580.400	100,00%	0,00%
4.5	Suministro e instalacion Pintura cielo raso en vinilo, en baños	M2	150	$ 16.000	$ 2.400.000	480,1	$ 2.400.000	176,04	$ 2.816.640	480,1	$ 7.681.600	100,00%	0,00%
4.6	Suministro e instalacion de Pintura cielo raso en vinilo, en baños	ML	75	$ 14.000	$ 1.050.000	922,82	$ 1.050.000	369,13	$ 5.167.792	922,82	$ 12.919.480	100,00%	0,00%
5	**PISOS Y ZÓCALOS**												
5.1	Desmonte, suministro e instalación de piso cerámica 60x60 cm	M2	20	$ 65.000	$ 1.300.000	0	$ 1.300.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
5.2	Sellamiento de juntas y fisuras entre adoquines con sello de arena en sendero peatonal NEAA - CEA	M2	200	$ 19.000	$ 3.800.000	253,86	$ 4.823.340	0,00	$ -	253,86	$ 4.823.340	100,00%	0,00%
5.3	Sello y tratamiento de juntas de construccion o dilatacion en pisos	ML	100	$ 100.000	$ 10.000.000	0	$ 5.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
6	**PAÑETES Y ENCHAPES**												
6.1	Mantenimiento y/o aplicación de producto en juntas de dilatacion	M2	40	$ 25.000	$ 1.000.000	83,8	$ 1.000.000	30,82	$ 770.400	83,80	$ 2.095.000	100,00%	0,00%
6.2	Resane de muros en general	M2	40	$ 16.000	$ 640.000	0	$ 640.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
6.3	Retiro de enchape de piletas lavatraperos.	M2	20	$ 15.000	$ 300.000	22	$ 300.000	8,00	$ 120.000	22	$ 330.000	100,00%	0,00%
6.4	Suministro e instalación de enchape de piletas lavatraperos.	M2	20	$ 50.000	$ 1.000.000	20	$ 1.000.000	8,00	$ 400.000	20	$ 1.000.000	100,00%	0,00%
7	**CARPINTERIA**												
7.1	Suministro e instalacion de cerrojo y bisagras para divisiones de baños	UND	20	$ 60.000	$ 1.200.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
8	**MANTENIMIENTO VIDRIOS Y VENTANERIA**												
8.2	Revision y/o reparacion de paneles de encerramiento del balcon quinto piso incluye:	M2	40	$ 55.000	$ 2.200.000	0	$ 550.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
8.3	Suministro e instalación de pie de amigo para	UND	40	$ 48.000	$ 1.920.000	0	$ 1.920.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
8.4	Suministro e instalacion de Pelicula samblasteada con logo de la aerocivil para vidrios en zonas de	M2	30	$ 70.000	$ 2.100.000	65,74	$ 840.000	26,30	$ 1.840.720	65,74	$ 4.601.800	100,00%	0,00%
9	**INFRAESTRUCTURA GENERAL**												
9.1	Desmonte pared en superboard	M2	5	$ 10.000	$ 50.000	0	$ 50.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
9.2	Desmonte de divisiones en drywall	M2	10	$ 10.000	$ 100.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
9.3	Mantenimiento pintura de puertas metal madera que icluye: tableros lamina de acero inoxidable visagras	M2	12	$ 80.000	$ 960.000	31,57	$ 7.840.000	12,63	$ 1.010.240	31,57	$ 2.525.600	100,00%	0,00%
9.4	Suministro e instalación de guardaescobas en madera de acuerdo con las especificaciones	ML	50	$ 40.000	$ 2.000.000	0	$ 2.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
9.5	Suministro e intalación de pasamanos anclado al piso de cauerdo a lo normado en escalera principal	ML	16	$ 577.000	$ 9.232.000	13,39	$ 7.726.030	0,00	$ -	13,39	$ 7.726.030	100,00%	0,00%

24

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
INFORME SEMANAL

VERSIÓN 1.0

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA — FECHA: 17-dic-19

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

Semana No 07 — Del : 9/12/2019 — Al: 16/12/2019

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 53 dias

10	**RED HIDRAULICA Y SANITARIA**														
10.1	Desmonte, Suministro e Instalacion de Conexión Superior Orinales (incluye desmonte, limpieza y	UND	8	$ 150.000	$ 1.200.000	0	$ 2.850.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.2	Desmonte, suministro e Instalacion de llave para pocetas	UND	12	$ 55.000	$ 660.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.3	Destape de puntos sanitarios y/o lavamanos con sonda electrica.	UND	14	$ 60.000	$ 840.000	0	$ 360.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.4	Destape de cañeria de punto sanitario, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato si	UND	4	$ 70.000	$ 280.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.5	Mantenimiento y reparacion de Shut de Basuras	UND	1	$ 3.000.000	$ 3.000.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.6	Mantenimiento de cajas de inspección en general de aguas lluvias y aguas hervidas incluye retiro de	UND	18	$ 250.000	$ 4.500.000	12	$ 4.500.000	4,00	$ 1.000.000	12	$ 3.000.000	100,00%	0,00%
10.7	Mantenimiento de sifones	UND	46	$ 30.000	$ 1.380.000	0	$ 420.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.8	Mantenimiento llaves tipo ganso para cafeterias y comedor institucional	UND	6	$ 80.000	$ 480.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.9	Mantenimiento y puesta a punto el sistema de riego de cuadros vivos de jardineria	UND	1	$ 900.000	$ 900.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.10	Mantenimiento divisiones y puertas de acero inxidable de baños	M2	8	$ 100.000	$ 800.000	97,77	$ 9.777.000	0,00	$ -	97,77	$ 9.777.000	100,00%	0,00%
10.11	Mantenimiento de válvula sanitaria	UND	16	$ 50.000	$ 800.000	0	$ 800.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.12	Mantenimiento de conexiones de pared a sanitario.	ML	14	$ 60.000	$ 840.000	0	$ 840.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.13	Mantenimiento de la tuberia y cajas de inspección	ML	40	$ 106.000	$ 4.240.000	28,43	$ 4.240.000	11,37	$ 1.205.432	28,43	$ 3.013.580	100,00%	0,00%
10.14	Mantenimiento de drenajes y disposición final certificado evacuación lodos con equipo adecuado	ML	40	$ 106.000	$ 4.240.000	0	$ 4.240.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.15	Mantenimiento de tuberia interna desde el contador avenida principal calle 26	ML	1	$ 4.500.000	$ 4.500.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.16	Mantenimiento de tuberia PVC de 2/1" de acometida al tanque	ML	28	$ 40.000	$ 1.120.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.17	Mantenimiento de tuberia colgante con limpieza y traslado de lodos hasta botadero certificado	ML	1	$ 5.500.000	$ 5.500.000	1	$ 5.500.000	1,00	$ 5.500.000	1	$ 5.500.000	100,00%	0,00%
10.18	Revision y/o fijacion de tuberia colgante con abrasadera metalica x golpe de ariete	ML	100	$ 40.000	$ 4.000.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.19	Retiro y /o adecuacion de ventanas de baños para ventilacion	UND	10	$ 70.000	$ 700.000	10	$ 700.000	0,00	$ -	10	$ 700.000	100,00%	0,00%
10.20	Suministro e instalacion de llave ahorradora de paso de agua en piletas y areas externas	UND	4	$ 200.000	$ 800.000	7	$ -	3,00	$ 600.000	7	$ 1.400.000	100,00%	0,00%
10.21	Suministro e instalacion de registro de paso de agua en PVC 1/2,-1/3,-1/4,-1/4	UND	12	$ 18.000	$ 216.000	0	$ 216.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.22	Suministro e Instalacion de bizcocho sanitario	UND	8	$ 80.000	$ 640.000	5	$ 640.000	0,00	$ -	5	$ 400.000	100,00%	0,00%
10.23	Suministro e instalación de tuberia PVC de 2/1" de acometida al tanque	ML	12	$ 65.000	$ 780.000	0	$ 797.125	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.24	Suministro e instalación de sifones con retenedor de olores en baños	UND	14	$ 95.000	$ 1.330.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.25	Suministro e instalacion de dispensador de jabon para manos en baños	UND	12	$ 120.000	$ 1.440.000	0	$ 1.440.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.26	Suministro e instalación llaves tipo ganso para cafeterias y comedor institucional	UND	6	$ 170.000	$ 1.020.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
10.27	Suministro e instalación de tapa registros	UND	22	$ 20.000	$ 440.000	22	$ 440.000	0,00	$ -	22	$ 440.000	100,00%	0,00%
11	**RED DE AGUA POTABLE**												
11.1	Demolición regata lineal para instalar tuberia, en piso, y en pared	ML	20	$ 18.000	$ 360.000	0	$ 360.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
11.2	Mantenimiento correctivo de tuberia (incluye demolición de muro e instalación de tuberia y	UND	4	$ 200.000	$ 800.000	104,47	$ 800.000	-19,53	$ (3.906.052)	104,47	$ 20.893.948	100,00%	0,00%
11.3	Suministro e instalación de tuberia pvc 1/2 ", 3/4", 1 1/2 ", 1", 2"	ML	16	$ 19.000	$ 304.000	0	$ 304.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
12	**REDES DE AGUAS NEGRAS (hervidas)**												
12.1	Destape de cañeria de punto sanitario, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato si	UND	14	$ 150.000	$ 2.100.000	67	$ 9.300.000	0,00	$ -	67	$ 10.050.000	100,00%	0,00%
12.2	Destape de cañeria de punto orinal, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato si	UND	10	$ 150.000	$ 1.500.000	21	$ 2.850.000	0,00	$ -	21	$ 3.150.000	100,00%	0,00%
13	**BATERIAS SANITARIAS Y ACCESORIOS EN BAÑOS**												
13.1	Destape de cañeria de punto orinal, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato	UND	16	$ 150.000	$ 2.400.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
13.2	Mantenimiento de punto sanitarios	UND	16	$ 80.000	$ 1.280.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
13.3	Mantenimiento de piletas lavatraperos ubicadas en las baterias de los baños, incluyen reemboquillado,	UND	20	$ 90.000	$ 1.800.000	0	$ -	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
13.4	Mantenimiento general de las baterias sanitarias (incluye sanitarios, lavamanos, orinales,)	UND	85	$ 150.000	$ 12.750.000	105	$ 15.000.000	0,00	$ -	105	$ 15.750.000	100,00%	0,00%
13.5	Suministro e instalación de fluxometros de cauerdo con las especificaciones tecnicas de los existentes	UND	16	$ 800.000	$ 12.800.000	8	$ 4.000.000	2,00	$ 1.600.000	8	$ 6.400.000	100,00%	0,00%
14	**SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACION**												
14.1	Mantenimiento tomas electricas de 110v y 220v	UND	120	$ 11.000	$ 1.320.000	19	$ 1.320.000	7,00	$ 77.000	19	$ 209.000	100,00%	0,00%
14.2	Revision y/o instalacion de puntos electricos con suministro de cableado conexiones, tomacorriente	UND	34	$ 100.000	$ 3.400.000	21	$ 3.400.000	8,00	$ 800.000	21	$ 2.100.000	100,00%	0,00%
14.3	Revisión y/o mantenimiento de calentadores electricos -Gimnacio y Direccion General	UND	1	$ 200.000	$ 200.000	0	$ 1.200.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
14.4	Revision y/o mantenimiento de hornos electricos semiindustriales	UND	6	$ 150.000	$ 900.000	0	$ 900.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
14.5	Revision y/o mantenimineto de sensores eléctricos de orinales,	UND	8	$ 120.000	$ 960.000	0	$ 960.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
14.6	Revision y /o mantenimiento de secadores de manos en baños	UND	6	$ 70.000	$ 420.000	0	$ 420.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
14.7	Revision y /o mantenimiento aspiral luminoso electrico del edificio -alturas	UND	1	$ 2.000.000	$ 2.000.000	1	$ 2.000.000	0,00	$ -	1	$ 2.000.000	100,00%	0,00%
14.8	Revision y/o mantenimiento del sistema de luminarias del parqueadero por fotoceldas	UND	1	$ 3.000.000	$ 3.000.000	0	$ 3.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
14.9	Revision y /o mantenimiento al punto de iluminacion de la imagen de la aerocivil, plasmada en la	UND	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000	1	$ 1.000.000	0,00	$ -	1	$ 1.000.000	100,00%	0,00%
14.10	Revision y /o mantenimiento a sensores de movimiento electricos de rutas de evacuacion	UND	36	$ 35.000	$ 1.260.000	0	$ 1.260.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%

25

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
INFORME SEMANAL

VERSIÓN 1.0

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **FECHA:** 17-dic-19


DIRECCIÓN TERRITORIAL:

Semana No 07 **Del :** 9/12/2019 **Al:** 16/12/2019

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 53 dias

14.11	Revision y/o mantenimiento al sistema panel electrico cincronizado de riego de jardines por reloj	UND	1	$ 2.000.000	$ 2.000.000	0	$ 2.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
14.12	Retiro y/o suministro e instalacion de luminarias tipo led de 60 x 60	UND	200	$ 160.000	$ 32.000.000	106	$ 16.000.000	0,00	$ -	106	$ 16.960.000	100,00%	0,00%
14.13	Retiro y/o suministro e instalacion de luminarias tipo led de circunferencia 18/ ml,	UND	70	$ 160.000	$ 11.200.000	170	$ 27.200.000	0,00	$ -	170	$ 27.200.000	100,00%	0,00%
14.14	Suministro e instalacion luminarias de emergencia tipo Mikey incluye retiro de las existentes que se	UND	30	$ 150.000	$ 4.500.000	30	$ 4.500.000	11,00	$ 1.650.000	30	$ 4.500.000	100,00%	0,00%
14.15	Suministro e instalación de lámparas tipo led acrilica de sobreponer de 1.20 m de acuerdo a	UND	20	$ 150.000	$ 3.000.000	130	$ 7.500.000	47,00	$ 7.050.000	130	$ 19.500.000	100,00%	0,00%
14.16	Suministro e instalación de bombillo ahorardores de rosca tipo led	UND	30	$ 30.000	$ 900.000	87	$ 2.610.000	4,00	$ 120.000	87	$ 2.610.000	100,00%	0,00%
14.17	Suminuistro e instalación luminaria tipo tubo de 1.20 m2, -archivo	UND	30	$ 150.000	$ 4.500.000	2	$ -	2,00	$ 300.000	2	$ 300.000	100,00%	0,00%
14.18	Suministro e instalación de canaleta PVC y cableado para punto electrico	UND	30	$ 70.000	$ 2.100.000	3	$ -	0,00	$ -	3	$ 210.000	100,00%	0,00%
14.19	Revision y /o suministro e instalacion de tomacorrientes que se encuentren en mal estado	UND	100	$ 50.000	$ 5.000.000	106	$ 5.000.000	38,00	$ 1.900.000	106	$ 5.300.000	100,00%	0,00%
15	**SISTEMA DE CONTRAINCENDIO**												
15.1	Realizar la prueba de desempeño de las unidades de bombeo y verificar frente a la curva de	UND	2	$ 9.000.000	$ 18.000.000	0	$ 18.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
16	**VARIOS**												
16.1	Diagnóstico general de la infraestructura del edificio NEEA (Pisos 6 y 1 sótano, areas comunes y parqueadero)	UND	1	$ 20.000.000	$ 20.000.000	1	$ 20.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
16.2	Diagnóstico general de la infraestructura del edificio NAA (Pisos 2 , bodegas y parqueadero	UND	1	$ 15.000.000	$ 15.000.000	1	$ 15.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
16.3	Diagnóstico general del sistema de red contraincendios	UND	2	$ 8.000.000	$ 16.000.000	2	$ 16.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
16.4	Diagnóstico general del sistema BMS Andover	UND	1	$ 8.000.000	$ 8.000.000	1	$ 8.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
16.5	Diagnóstico general del sistema de sonido ambiental y emergencia	UND	1	$ 6.000.000	$ 6.000.000	1	$ 6.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
16.6	Diagnóstico general del sistema de Control de Acceso	UND	1	$ 6.000.000	$ 6.000.000	1	$ 6.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
16.7	Diagnóstico general del sistema de climatización	UND	1	$ 6.000.000	$ 6.000.000	1	$ 6.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
16.8	Diagnóstico general de planta eléctrica	UND	1	$ 3.000.000	$ 3.000.000	1	$ 3.000.000	0,00	$ -	0	$ -	0,00%	100,00%
	SUBTOTAL				$ 501.141.000		$ 501.141.000		$ 81.697.462		$ 421.141.000	84,04%	15,96%
	ADMINSTRACION	21%			$ 105.239.610		$ 105.239.610		$ 17.156.467		$ 88.439.610	84,04%	15,96%
	IMPREVISTOS	1%			$ 5.011.410		$ 5.011.410		$ 816.975		$ 4.211.410	84,04%	15,96%
	UTILIDAD	5%			$ 25.057.050		$ 25.057.050		$ 4.084.873		$ 21.057.050	84,04%	15,96%
	AIU	27%			$ 135.308.070		$ 135.308.070		$ 22.058.315		$ 113.708.070	84,04%	15,96%
	IVA	19%			$ 4.760.840		$ 4.760.840		$ 776.126		$ 4.000.840	84,04%	15,96%
	TOTAL				**$ 641.209.910**		**$ 641.209.910**		**$ 104.531.903**		**$ 538.849.910**	**84,04%**	**15,96%**

AVANCE FINANCIERO

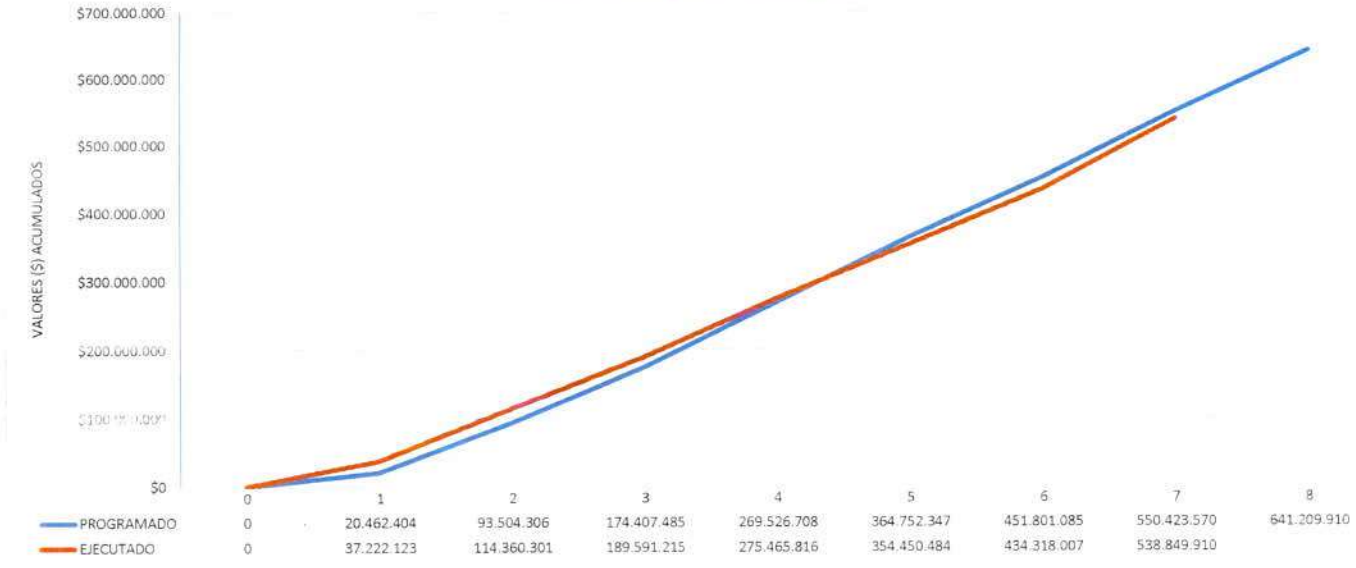

26

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
INFORME SEMANAL

VERSIÓN	1.0

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA **FECHA:** 17-dic-19

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

Semana No 07 **Del :** 09/12/2019 **Al:** 16/12/2019

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 53 dias

PERSONAL Y EQUIPO (CONTRATISTA)

OBRA:

Director de obra	1	Carmelo Joaquin Rosales Amell
Residente de obra.	1	Manuel Ricardo Velasquez Rosales
SST	1	Luis Eduardo Gutierrez
Inspector de obra	1	Rafael Ricardo Garcia Mendez
Maestro de obra	1	Jhon Parra
Oficiales de construcción	3	
Ayudantes de contruccción	3	

AVANCE FINANCIERO

Acta Parcial No.	Periodo	Costo Total
1	24/10/2019 a 24/11/2019	$ 275.465.816
Total Acumulado	**$**	**275.465.816,00**

AVANCE FINANCIERO

Valor Total Contrato
$ 641.209.910,00
Valor facturado Contrato
$ 275.465.816,00
% Avance facturado Acumulado
42,96%

OBSERVACIONES

Se aclara que el item "*3.2 Desmonte y retiro de archivadores por cuerpos*", se descuenta en el presente informe y se verá reflejado en el acta de recibo parcial de obra No. 2, debido a que el archivador de tres cuerpos que se desmontó no correspondia al solicitado por la supervisión, por lo cual el contratista asume los costos de esta actividad.

DIRECTOR DE OBRA

ING. CARMELO JOAQUÍN ROSALES AMELL

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL**, identificado con cedula de ciudadanía No. **19.374.007 de Bogotá,** en mi condición de Representante Legal de **CONSORCIO CRS,** identificada con Nit **901.329.793-4,** certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, *(Articulo 65 Ley 1819 de 2016)*, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de firma del presente documento. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en **BOGOTÁ**, a los diecisiete (**17**) días del mes de **DICIEMBRE** de **2019.**

Firma _____
Nombre **CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL**

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **ANGELICA MARIA ROSALES GARCIA**, identificado con cedula de ciudadanía No. **53.001.977 de Bogotá,** en mi condición de Representante Legal de **INGENIEROS CONSTRUCTORES SIGNA SAS,** (Razón social de la compañía) identificada con Nit **900.468.589-1,** certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, *(Articulo 65 Ley 1819 de 2016),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la firma del presente documento. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en **BOGOTÁ**, a los diecisiete (**17**) días del mes de **DICIEMBRE** de **2019.**

Firma _____

Nombre **ANGELICA MARIA ROSALES GARCIA**

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **MANUEL RICARDO VELASQUEZ ROSALES**, identificado con cedula de ciudadanía No. **80.871.449 de Bogotá,** en mi condición de Representante Legal de **CENIT INGENIERIA Y GEOLOGIA SAS,** (Razón social de la compañía) identificada con Nit **900.992.209-2,** certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, *(Articulo 65 Ley 1819 de 2016),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la firma del presente documento. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en **BOGOTÁ**, a los diecisiete (**17**) días del mes de **DICIEMBRE** de **2019.**

Firma _____

Nombre **MANUEL RICARDO VELASQUEZ ROSALES**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	19374007-5	CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL	CALLE 85 No. 19B -22	2369894	incra55@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				8	0
					TOTAL A PAGAR	
2019-12	2019-11	E	06/12/2019	38987141	$4.319.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	537.000	0		0		0	3	1.200	0	538.200	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	585.800	0		0		0	3	1.300	0	587.100	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	103.600	0		0		0	3	300	0	103.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	559.100	0	0	0	0	3	1.300	0	560.400	2
230301	Porvenir	800224808-8	393.100	0	0	0	0	3	900	0	394.000	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	617.000	0	0	0	0	3	1.400	0	618.400	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	629.800				629.800	3	1.400	631.200			6.298	631.200	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	392.800	3	900	393.700	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
196.500	3	500	197.000	8
ICBF				
294.600	3	700	295.300	8
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	1.226.400	1.229.200
Pensión	3	1.569.200	1.572.800
Riesgos Laborales	1	629.800	631.200
CCF	1	392.800	393.700
ESAP	0	0	0
ICBF	1	294.600	295.300
MEN	0	0	0
SENA	1	196.500	197.000
TOTALES	10	4.309.300	4.319.200

PAGADA
0987141

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	19374007-5	CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL	CALLE 85 No. 19B -22	2369894	incra55@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200			BOGOTÁ. D. C.	BOGOTÁ. D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				8	0
2019-12	2019-11	E	06/12/2019	38987141	TOTAL A PAGAR	
					$4.319.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1192735885	PEREZ GIL BRAYAN FELIPE	1	0			N	X																230301	800.513	128.100	0	0	0	0	EPS002	800.513	100.100	14-11	800.513	5	55.800	CCF24	800.513	32.100	800.513	16.100	24.100	0	0
2	CC	19374007	ROSALES AMELL CARMELO JOAQUIN	1	0			N																	230201	2.665.632	426.600	0	0	0	0	EPS002	2.665.632	333.300	14-11	2.665.632	5	185.600	CCF24	2.665.632	106.700	2.665.632	53.400	80.000	0	0
3	CC	3947244	CORDERO PEDROZO DIOMEDES	1	0			N																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS037	828.116	103.600	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	828.116	16.600	24.900	0	0
4	CC	52019625	CASTILLO VELA MIRIAM PATRICIA	1	0			N																	25-14	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS008	828.116	103.600	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	828.116	16.600	24.900	0	0
5	CC	52408141	TORRES MACHUCA NATALIA	1	0			N																	25-14	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS008	828.116	103.600	14-11	828.116	1	4.400	CCF24	828.116	33.200	828.116	16.600	24.900	0	0
6	CC	52959616	RAVELO TONCON OLGA PATRICIA	1	0			N																	25-14	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS008	2.200.000	275.000	14-11	2.200.000	5	153.200	CCF24	2.200.000	88.000	2.200.000	44.000	66.000	0	0
7	CC	79472280	MEDINA MORENO RUBEN DARIO	1	0			N	X																230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS008	828.116	103.600	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	828.116	16.600	24.900	0	0
8	CC	80408887	CHAVEZ FAJARDO RODRIGO	1	0			N	X																230201	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS002	828.116	103.600	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	828.116	16.600	24.900	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901242352-4	CONSORCIO CRS JUAN AMARILLO		CALLE 85 # 19B-22 OF 304	6426068	incra55@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ. D. C.	BOGOTÁ. D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-11	2019-10	E	18/11/2019	38355664	$3.923.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	395.800	0		0		0	3	900	0	396.700	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	112.500	0		0		0	3	300	0	112.800	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	187.500	0		0		0	3	500	0	188.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	450.000	0		0		0	3	1.000	0	451.000	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	144.000	0	0	0	0	3	400	0	144.400	1
230301	Porvenir	800224808-8	640.000	0	0	0	0	3	1.400	0	641.400	3
231001	Colfondos	800227940-6	346.600	0	0	0	0	3	800	0	347.400	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	336.000	0	0	0	0	3	800	0	336.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	477.300				477.300	3	1.100	478.400			4.773	478.400	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	366.700	3	800	367.500	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
183.400	3	400	183.800	6
ICBF				
275.000	3	600	275.600	6
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	1.145.800	1.148.500
Pensión	4	1.466.600	1.470.000
Riesgos Laborales	1	477.300	478.400
CCF	1	366.700	367.500
ESAP	0	0	0
ICBF	1	275.000	275.600
MEN	0	0	0
SENA	1	183.400	183.800
TOTALES	12	3.914.800	3.923.800

PAGADA 38355664

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901242352-4	CONSORCIO CRS JUAN AMARILLO	CALLE 85 # 19B-22 OF 304	6426068	incra55@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ. D. C.	BOGOTÁ. D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 6 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-11	2019-10	E	18/11/2019	38355664	$3.923.800

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1015411413	GARCIA MENDEZ RAFAEL RICARDO	1	0			N																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS008	1.500.000	187.500	14-11	1.500.000	5	104.400	CCF24	1.500.000	60.000	1.500.000	30.000	45.000	0	0
2	CC	1016089213	RODRIGUEZ RIAÑO KAROL VIVIANA	1	0			N																	230201	900.000	144.000	0	0	0	0	EPS005	900.000	112.500	14-11	900.000	5	62.700	CCF24	900.000	36.000	900.000	18.000	27.000	0	0
3	CC	1018433627	SUAREZ VASQUEZ LEIDY JOHANA	1	0			N																	231001	2.166.000	346.600	0	0	0	0	EPS002	2.166.000	270.800	14-11	2.166.000	5	150.800	CCF24	2.166.000	86.700	2.166.000	43.400	65.000	0	0
4	CC	1071165360	VENEGAS CIFUENTES CRISTIAN CAMILO	1	0			N																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS017	1.500.000	187.500	14-11	1.500.000	1	7.900	CCF24	1.500.000	60.000	1.500.000	30.000	45.000	0	0
5	CC	52473034	GARCIA TORRES SANDRA MILENA	1	0			N																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	125.000	14-11	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	1.000.000	20.000	30.000	0	0
6	CC	74323797	GUTIERREZ BENAVIDES LUIS FLORENCIO	1	0			N	X																25-14	2.100.000	336.000	0	0	0	0	EPS017	2.100.000	262.500	14-11	2.100.000	5	146.200	CCF24	2.100.000	84.000	2.100.000	42.000	63.000	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901139253-3	CONSORCIO RD PUENTE ARANDA		CALLE 85 # 19B-22 OF 304	2565540	consorciordpuentearanda@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ. D. C.	BOGOTÁ. D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				29	0
					TOTAL A PAGAR	
2019-11	2019-10	E		38359447	$14.914.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	623.300	0		0		0	0	0	0	623.300	5
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	250.000	0		0		0	0	0	0	250.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.379.400	0		0		0	0	0	0	1.379.400	6
EPS010	EPS Sura	800088702-2	103.600	0		0		0	0	0	0	103.600	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	1.032.400	0		0		0	0	0	0	1.032.400	8
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	518.000	0		0		0	0	0	0	518.000	5
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	103.600	0		0		0	0	0	0	103.600	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	103.600	0		0		0	0	0	0	103.600	1
EPSIC1	DUSAKAWI EPS	824001398-1	103.600	0		0		0	0	0	0	103.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.044.500	0	0	22.500	22.500	0	0		1.089.500	3
230301	Porvenir	800224808-8	2.563.000	0	0	0	0	0	0		2.563.000	14
231001	Colfondos	800227940-6	409.000	0	0	0	0	0	0		409.000	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.247.500	0	0	0	0	0	0		1.247.500	8

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	2.348.900				2.348.900	0	0	2.348.900			23.489	2.348.900	29

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.350.500	0	0	1.350.500	29

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901139253-3	CONSORCIO RD PUENTE ARANDA	CALLE 85 # 19B-22 OF 304	2565540	consorciordpuentearanda@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ. D. C.	BOGOTÁ. D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					29	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-11	2019-10	E		38359447	$14.914.200	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
675.300	0	0	675.300	29
ICBF				
1.013.000	0	0	1.013.000	29
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	9	4.217.500	4.217.500
Pensión	4	5.309.000	5.309.000
Riesgos Laborales	1	2.348.900	2.348.900
CCF	1	1.350.500	1.350.500
ESAP	0	0	0
ICBF	1	1.013.000	1.013.000
MEN	0	0	0
SENA	1	675.300	675.300
TOTALES	17	14.914.200	14.914.200

PAGA 521496987

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901139253-3	CONSORCIO RD PUENTE ARANDA		CALLE 85 # 19B-22 OF 304	2565540	consorciordpuentearanda@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 29 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-11	2019-10	E		38359447	$14.914.200

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	10166505	ULLOA VEGA LIBERTO	1	0			N																	25-14	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS008	828.116	103.600	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	828.116	16.600	24.900	0	0
2	CC	1022992692	VALLEJO SANCHEZ YULLY NATALIE	1	0			N																	230301	1.344.000	215.100	0	0	0	0	EPS017	1.344.000	168.000	14-11	1.344.000	5	93.600	CCF24	1.344.000	53.800	1.344.000	26.900	40.400	0	0
3	CC	1063309732	GUILLIN VERGARA SEBASTIAN ANDRES	1	0			N																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS017	828.116	103.600	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	828.116	16.600	24.900	0	0
4	CC	1065924338	VARGAS PALACIOS EDUAR HERNAN	1	0			N																	230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	250.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	80.000	2.000.000	40.000	60.000	0	0
5	CC	11431955	MALDONADO MARTINEZ JUAN	1	0			N																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
6	CC	12202595	CAPERA REINEL	1	0			N																	230201	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS002	1.200.000	150.000	14-11	1.200.000	5	83.600	CCF24	1.200.000	48.000	1.200.000	24.000	36.000	0	0
7	CC	16190381	CABALLERO ARPINO ELI	1	0			N																	25-14	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS037	828.116	103.600	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	828.116	16.600	24.900	0	0
8	CC	19208236	CARDONA JOSE SAMUEL	1	3			N																		0	0	0	0	0	0	EPS037	828.116	103.600	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	828.116	16.600	24.900	0	0
9	CC	19767442	CORRALES ANGULO RICARDO	1	0			N																	230301	1.577.000	252.400	0	0	0	0	EPS008	1.577.000	197.200	14-11	1.577.000	5	109.800	CCF24	1.577.000	63.100	1.577.000	31.600	47.400	0	0
10	CC	19855002	ARIAS BENAVIDES WILFRIDO	1	0			N																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPSIC1	828.116	103.600	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	828.116	16.600	24.900	0	0
11	CC	4286455	ESPITIA MORENO HECTOR ARISTOBULO	1	0			N																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS002	828.116	103.600	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	828.116	16.600	24.900	0	0
12	CC	4546448	BUENO BLANDON JOSE GILBERTO	1	0			N																	230201	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS037	828.116	103.600	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	828.116	16.600	24.900	0	0
13	CC	51656455	DIAZ SALEM BELINDA	1	0			N																	231001	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS010	828.116	103.600	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	828.116	16.600	24.900	0	0
14	CC	5969753	MELO CASTRO JAIME	1	0			N																	25-14	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS017	828.116	103.600	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	828.116	16.600	24.900	0	0
15	CC	72301051	NAJERA CERA GALDINO OSMAR	1	0			N																	230201	4.500.000	720.000	0	0	22.500	22.500	EPS008	4.500.000	562.500	14-11	4.500.000	5	313.200	CCF24	4.500.000	180.000	4.500.000	90.000	135.000	0	0
16	CC	78588486	SUAREZ ARCIA ENRIQUE MANUEL	1	0			N																	230301	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS017	1.200.000	150.000	14-11	1.200.000	5	83.600	CCF24	1.200.000	48.000	1.200.000	24.000	36.000	0	0
17	CC	79189615	SUAREZ AMADO IRALDO	1	0			N																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS002	1.300.000	162.500	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
18	CC	79252710	MENDIVELSO LEON AVELINO	1	0			N																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS017	1.500.000	187.500	14-11	1.500.000	5	104.400	CCF24	1.500.000	60.000	1.500.000	30.000	45.000	0	0
19	CC	79342941	FRANCO ALBERTO	1	0			N																	25-14	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS037	828.116	103.600	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	828.116	16.600	24.900	0	0
20	CC	79369723	ATARA GIL JOSE CLODOMIRO	1	0			N																	25-14	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS044	828.116	103.600	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	828.116	16.600	24.900	0	0
21	CC	79713905	NIÑO ESLAVA JOSELIN	1	0			N																	231001	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS017	828.116	103.600	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	828.116	16.600	24.900	0	0
22	CC	80438779	AREVALO VELOZA EDGAR OCTAVIO	1	0			N																	231001	900.000	144.000	0	0	0	0	EPS017	900.000	112.500	14-11	900.000	5	62.700	CCF24	900.000	36.000	900.000	18.000	27.000	0	0
23	CC	80871449	VELASQUEZ ROSALES MANUEL RICARDO	1	0			N																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	250.000	14-11	2.000.000	5	139.200	CCF24	2.000.000	80.000	2.000.000	40.000	60.000	0	0
24	CC	8353071	BEDOYA MEDINA SAMUEL	1	0			N																	25-14	828.116	132.500	0	0	0	0	EPSC34	828.116	103.600	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	828.116	16.600	24.900	0	0
25	CC	92185541	GONZALEZ ARRIETA jose DE JESUS	1	0			N																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS002	828.116	103.600	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	828.116	16.600	24.900	0	0
26	CC	93121479	ARIAS CORTES GUSTAVO	1	0			N																	25-14	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS037	828.116	103.600	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	828.116	16.600	24.900	0	0
27	CC	93127131	CALEÑO GUZMAN FERNEY	1	0			N																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS002	828.116	103.600	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	828.116	16.600	24.900	0	0
28	PA	140708608	MOSQUEDA ALFREDO JOSE	1	0			N																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS017	828.116	103.600	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	828.116	16.600	24.900	0	0
29	PE	824355501061967	MEDRANO JOSE GREGORIO	1	0			N																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS008	828.116	103.600	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	828.116	16.600	24.900	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901330073	1	ARAL ENERGIA Y COMUNICACIONES SAS	R	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	7110	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
11-1	CRA 69C 5A 22		7189194		ARALVEVE@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2019-11	2019-12	16851532	E	2019-11-22	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	813.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2 de 2	16851532	2019-12-17	Pagada							

EMPLEADO				NOVEDADES																														DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MEN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	ING	FECHA ING	RET	FECHA RET	TAE	TDP	TAP	VSP	FECHA VSP	VTE	VRT	SLN	FECHA INICIO SLN	FECHA FIN SLN	IGE	FECHA INICIO IGE	FECHA FIN IGE	LMA	FECHA INICIO LMA	FECHA FIN LMA	VAC	FECHA INICIO VAC	FECHA FIN VAC	LNR	SUS	FECHA INICIO SUS	FECHA FIN SUS	IRL	FECHA INICIO IRL	FECHA FIN IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FNDSL	FNDSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub.	Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales
1	CC 1018439208	VERGARA BOLAÑO CESAR MAURICIO	828.116	X	2019/11/01																									0				30	30	30	30	PROTECCION 230201	828.116	132.500	0		COMPENSAR-EPS-EPS005	828.116	103.600	COMPENSAR-CCF24	828.116	33.200	828.116	57.700	0,00960	828.116	16.600	24.900	0	0	01	0	368.500	N
2	CC 11310869	VERGARA VERGARA ARMANDO ALFONSO	1.000.000	X	2019/11/01																									0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0		COMPENSAR-EPS-EPS005	1.000.000	125.000	COMPENSAR-CCF24	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,00960	1.000.000	20.000	30.000	0	0	01	0	444.600	N

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA


ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901330073	1	ARAL ENERGIA Y COMUNICACIONES SAS	R	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7110	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
11-1	CRA 69C 5A 22		7189194		ARALVEVE@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2019-11	2019-12	16851532	E	2019-11-22	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	813.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2 de 2	16851532	2019-12-17	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.828.116	1.828.116	1.828.116	1.828.116	1.828.116

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				**2**	**292.500**	**0**	**0**	**0**	**292.500**
PORVENIR	230301	8002[illegible]908	8	1	160.000	0	0	0	160.000
PROTECCION	230201	800[illegible]9739	0	1	132.500	0	0	0	132.500
EPS(Administradoras: 1)				**2**	**228.600**	**0**	**0**	**0**	**228.600**
COMPENSAR-EPS	EPS008	8600[illegible]6942	7	2	228.600	0	0	0	228.600
ARP(Administradoras: 1)				**2**	**127.300**	**0**	**0**	**0**	**127.300**
POSITIVA	14-23	8600[illegible]1153	6	2	127.300	0	0	0	127.300
CCF(Administradoras: 1)				**2**	**73.200**	**0**	**0**	**0**	**73.200**
COMPENSAR-CCF	CCF24	8600[illegible]6942	7	2	73.200	0	0	0	73.200
SENA(Administradoras: 1)				**2**	**36.600**	**0**	**0**	**0**	**36.600**
SENA	PASENA	899[illegible]1034	1	2	36.600	0	0	0	36.600
ICBF(Administradoras: 1)				**2**	**54.900**	**0**	**0**	**0**	**54.900**
ICBF	PAICBF	8999[illegible]8239	2	2	54.900	0	0	0	54.900
Gran Total					813.100	0	0	0	813.100



compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900992209-2	CENIT Ingenieria y Geologia	CR 50 # 145 A 68	3102606397	cenit.ingeo@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-11	2019-10	E	28/11/2019	38212893	$206.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	33.200	0		0		0	22	600	0	33.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	132.500	0	0	0	0	22	2.200	0	134.700	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	4.400				4.400	22	100	4.500			44	4.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	33.200	22	600	33.800	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	33.200	33.800
Pensión	1	132.500	134.700
Riesgos Laborales	1	4.400	4.500
CCF	1	33.200	33.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	203.300	206.800

PAGADA
38212893

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900992209-2	CENIT Ingenieria y Geologia		CR 50 # 145 A 68	3102606397	cenit.ingeo@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ. D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-11	2019-10	E	28/11/2019	38212893	$206.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1015394348	VELASQUEZ ROSALES VERONICA MARIA	1	0			S																	25-14	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS017	828.116	33.200	14-11	828.116	1	4.400	CCF24	828.116	33.200	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	19374007-5	CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL	CALLE 85 No. 19B -22	2369894	incra55@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				5	0
2019-11	2019-10	E	15/11/2019	38358800	TOTAL A PAGAR	
					$3.239.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	333.300	0		0		0	10	2.500	0	335.800	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	482.200	0		0		0	10	3.500	0	485.700	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	103.600	0		0		0	10	800	0	104.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	426.600	0	0	0	0	10	3.100	0	429.700	1
230301	Porvenir	800224808-8	132.500	0	0	0	0	10	1.000	0	133.500	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	617.000	0	0	0	0	10	4.500	0	621.500	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	458.600				458.600	10	3.400	462.000			4.586	462.000	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	294.300	10	2.200	296.500	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
147.200	10	1.100	148.300	5
ICBF				
220.700	10	1.700	222.400	5
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	919.100	925.900
Pensión	3	1.176.100	1.184.700
Riesgos Laborales	1	458.600	462.000
CCF	1	294.300	296.500
ESAP	0	0	0
ICBF	1	220.700	222.400
MEN	0	0	0
SENA	1	147.200	148.300
TOTALES	10	3.216.000	3.239.800

PAGADA
38588

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	19374007-5	CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL	CALLE 85 No. 19B -22	2369894	incra55@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				5	0
2019-11	2019-10	E	15/11/2019	38358800	TOTAL A PAGAR	
					$3.239.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	19374007	ROSALES AMELL CARMELO JOAQUIN	1	0			N																	230201	2.665.632	426.600	0	0	0	0	EPS002	2.665.632	333.300	14-11	2.665.632	5	186.600	CCF24	2.665.632	106.700	2.665.632	53.400	80.000	0	0
2	CC	3947244	CORDERO PEDROZO DIOMEDES	1	0			N																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS037	828.116	103.600	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	828.116	16.600	24.900	0	0
3	CC	52019625	CASTILLO VELA MIRIAM PATRICIA	1	0			N																	25-14	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS008	828.116	103.600	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	828.116	16.600	24.900	0	0
4	CC	52408141	TORRES MACHUCA NATALIA	1	0			N																	25-14	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS008	828.116	103.600	14-11	828.116	1	4.400	CCF24	828.116	33.200	828.116	16.600	24.900	0	0
5	CC	52959616	RAVELO TONCON OLGA PATRICIA	1	0			N																	25-14	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS008	2.200.000	275.000	14-11	2.200.000	5	153.200	CCF24	2.200.000	88.000	2.200.000	44.000	66.000	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900468589-1	INGENIEROS CONSTRUCTORES SIGNA SAS	CALLE 85 # 19B-22 OF 304	3208382875	angelicarosalesgarcia@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	C – MIPYME		BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 4 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2019-11	2019-10	E		38354796	$2.616.300

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	100.000	0		0		0	0	0	0	100.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	260.000	0		0		0	0	0	0	260.000	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	33.200	0		0		0	0	0	0	33.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	132.500	0	0	0	0	0	0		132.500	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.440.000	0	0	22.500	22.500	0	0		1.485.000	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	212.400				212.400	0	0	212.400			2.124	212.400	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	393.200	0	0	393.200	4

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	393.200	393.200
Pensión	2	1.617.500	1.617.500
Riesgos Laborales	1	212.400	212.400
CCF	1	393.200	393.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	2.616.300	2.616.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900468589-1	INGENIEROS CONSTRUCTORES SIGNA SAS	CALLE 85 # 19B-22 OF 304	3208382875	angelicarosalesgarcia@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	C – MIPYME			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-11	2019-10	E		38354796	$2.616.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1057465879	ESPINOSA BARRERA LUIS HERNANDO	1	0			S																25-14	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	5	174.000	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
2	CC	52403655	CARDEÑO LIÑAN MARTINA	1	0			S																230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS017	828.116	33.200	14-11	828.116	1	4.400	CCF24	828.116	33.200	0	0	0	0	0
3	CC	53001977	ROSALES GARCIA ANGELICA MARIA	1	0			S																25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
4	CC	8729021	CERPA CASTILLO FREDY EDUARDO	1	0			S																25-14	4.500.000	720.000	0	0	22.500	22.500	EPS008	4.500.000	180.000	14-11	4.500.000	1	23.500	CCF24	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	19374007-5	CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL	CALLE 85 No. 19B -22	2369894	incra55@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				5	0
2019-11	2019-10	E	15/11/2019	38358800	TOTAL A PAGAR	
					$3.239.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	333.300	0		0		0	10	2.500	0	335.800	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	482.200	0		0		0	10	3.500	0	485.700	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	103.600	0		0		0	10	800	0	104.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	426.600	0	0	0	0	10	3.100	0	429.700	1
230301	Porvenir	800224808-8	132.500	0	0	0	0	10	1.000	0	133.500	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	617.000	0	0	0	0	10	4.500	0	621.500	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	458.600				458.600	10	3.400	462.000			4.586	462.000	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	294.300	10	2.200	296.500	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
147.200	10	1.100	148.300	5
ICBF				
220.700	10	1.700	222.400	5
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	919.100	925.900
Pensión	3	1.176.100	1.184.700
Riesgos Laborales	1	458.600	462.000
CCF	1	294.300	296.500
ESAP	0	0	0
ICBF	1	220.700	222.400
MEN	0	0	0
SENA	1	147.200	148.300
TOTALES	10	3.216.000	3.239.800

PAGADA
3588000

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	19374007-5	CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL	CALLE 85 No. 19B -22	2369894	incra55@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-11	2019-10	E	15/11/2019	38358800	$3.239.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Encontrado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	19374007	ROSALES AMELL CARMELO JOAQUIN	1	0			N																	230201	2.665.632	426.600	0	0	0	0	EPS002	2.665.632	333.300	14-11	2.665.632	5	185.600	CCF24	2.665.632	106.700	2.665.632	53.400	80.000	0	0
2	CC	3947244	CORDERO PEDROZO DIOMEDES	1	0			N																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS037	828.116	103.600	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	828.116	16.600	24.900	0	0
3	CC	52019625	CASTILLO VELA MIRIAM PATRICIA	1	0			N																	25-14	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS008	828.116	103.600	14-11	828.116	5	57.700	CCF24	828.116	33.200	828.116	16.600	24.900	0	0
4	CC	52408141	TORRES MACHUCA NATALIA	1	0			N																	25-14	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS008	828.116	103.600	14-11	828.116	1	4.400	CCF24	828.116	33.200	828.116	16.600	24.900	0	0
5	CC	52959616	RAVELO TONCON OLGA PATRICIA	1	0			N																	25-14	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS008	2.200.000	275.000	14-11	2.200.000	5	153.200	CCF24	2.200.000	88.000	2.200.000	44.000	66.000	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Salud Total EPS-S

No de Radicacion	Fecha de Radicación
4004363636	3|1|1|0|2|0|1|9

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al fromulario antes de diligenciarlo)

1.tipo de tramite	2.Tipo afiliacion	3.Regimen
A. Afiliación ☐ B.Reporte de Novedades ☒	B. Colectiva ☐ A. Individual: -Cotizante Cabeza de familia ☒ -Beneficiario afiliado adicional ☒ B. Institucional ☐ B. De oficio ☐	A.Contributivo ☒ B.Subsidiado ☐

4. Tipo de afiliado	5. Tipo de cotizante	Codigo (a registrar por la EPS)
A. Cotizante ☒ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐	A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐	1

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6.Apellidos y nombres			
CHAVEZ (Primer apellido)	FAJARDO (Segundo apellido)	RODRIGO (Primer nombre)	(Segundo nombre)
7.Tipo documento de Identidad	**8.Número del documento de Identidad**	**9.Sexo**	**10.Fecha de nacimiento**
CC	80408887	Femenino ☐ Masculino ☒	0|5|1|1|1|9|6|5

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11.Etnia	12.Discapacidad	13.Puntaje SISBEN	14.Grupo de poblacion especial
6	Tipo F N M Condicion T P		

15. Administradora de riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotizacion - IBC
SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA S.A.	PROTECCION	828116

18.Residencia

Dirección	Telefono fijo	Telefono celular	Correo electronico
CL 164B 4 42	6780596		INCRA55@YAHOO.COM

Municipio/Distrito	zona	Localidad / comuna	Departamento
BOGOTA	Urbana ☒ Rural ☐		BOGOTA

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
20. Tipo documento de identidad	**21. Número documento identidad**	**22. Sexo**	**23. Fecha de nacimiento**
		Femenino ☐ Masculino ☐	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres			
	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1	CHAVEZ	RIOS	DENNIS	PAOLA
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo documento de identidad	26. Número de identidad	27.Sexo		28.Fecha de nacimiento
			Femenino	Masculino	
B1	TI	1025526313	☒		0|1|0|8|2|0|0|5
B2					
B3					
B4					
B5					

Datos complementarios

	29.Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad				
			Tipo			Condición	
			F	N	M	T	P
B1	HI	6					
B2							
B3							
B4							
B5							

32. Datos de residencia

	Municipio/Distrito	Zona		Departamento	Teléfono Fijo y/o celular	33.Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
		Urbana	Rural			
B1	BOGOTA	☒		BOGOTA		
B2						
B3						
B4						
B5						

Seleccion de la IPS Primaria

		34. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS	Codigo de la IPS(a registrar por la EPS)
C		VS SANTA LUCIA - UOD CPO SANTA LUCIA	VSLUCIA - UODCPOSLUC
B	1	VS AMERICAS - UOD CPO AMERICAS	VSAMERICAS - UODCPOAMER
B		-	-
B		-	-

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA,INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de identificación	37. Numero de docuemnto de Identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones(a registrar por la EPS)
CARMELO ROSALES AMELL	CC	19374007	01

39.Ubicación				
CL 85 21 22 OF 304 (Dirección)	2369894 (Teleéfono)	INCRA55@YAHOO.COM (Correo electrónico)	GIRARDOT (Municipio/distrito)	CUNDINAMARCA (Departamento)

No de Radicacion
4004363636

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- ☐ 1. Modificación datos básicos de identificación
- ☐ 2. Corrección datos básicos de identificación
- ☐ 3. Actualización documento de identidad
- ☐ 4. Actualización y/o corrección datos complementarios
- ☐ 5. Terminación de la inscripcion en la EPS. Código: ☐
- ☐ 6. Reinscripción en la EPS
- ☒ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☒ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ 10. Terminación de la relacion laboral o perdida de las condiciones para seguir cotizando
- ☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 13. Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ 14. Traslado: ☐ A. Mismo régimen ☐ B. Diferente régimen
- ☐ 15. Reporte de fallecimiento
- ☐ 16. Reporte del tramite de protección al cesante
- ☐ 17. Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- ☐ 18. Reporte de la calidad del pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de la identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha
☐		Femenino ☐ Masculino ☐		0|1|1|1|2|0|1|9

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código:	45. Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones
	☐	

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- 46. ☐ Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- 47. ☐ Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributvo,Especial o de Excepción.
- 48. ☐ Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- 49. ☐ Declaración de no internación del cotizante,cabeza de familia ,beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud .
- 50. ☒ Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clinica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- 51. ☒ Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que poir sus funciones la requieran
- 52. ☒ Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decr eto 1377 de 2013
- 53. ☒ Autorización para que la EPS envie información al correo electronico o celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

54. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio
Pedro Chaves F	

IX. ANEXOS

- ☐ 56. Anexo Copia del documento de identidad: CN. ☐ RC. ☐ TI. ☐ CC. ☐ PA. ☐ CE. ☐ CD. ☐ SC. ☐ Cantidad: ☐☐☐☐☐☐☐☐ Total: 0
- ☐ 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- ☐ 58. Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la union marital.
- ☐ 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio ,sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la union marital.
- ☐ 60. Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor
- ☐ 61. Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.
- ☐ 62. Documento en que conste la perdida de la patria potestad, o el certificaco de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- ☐ 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- ☐ 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consiste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial Código del municipio	Código del Departamento	67. Datos del SISBEN Número ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación

70. Datos funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	71. Firma del funcionario

Observaciones

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, asi como la veracidad de las demás información registrada.

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.198.281

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **CHAVEZ FAJARDO RODRIGO** identificado(a) con **CC** número **80.408.887** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 20 de septiembre de 1994 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MODERADO**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 31 de octubre de 2019.

Cordialmente,

Laura Patricia Merchan Metaute
Dirección servicios transaccionales para clientes
Protección S.A.

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**
Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**
www.proteccion.com

51

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS
PORVENIR S.A.
NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) **ANDRES SANTIAGO CONEJO QUIÑONES**, identificado(a) con Cédula de Ciudadania **1,020,803,777**, se encuentra afiliado(a) al **AL FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 31 días del mes de Octubre de 2019.

Gerente de Clientes

ARL | sura

Medellín, 31 de octubre de 2019

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CENIT INGENIERÍA Y GEOLOGÍA S.A.S que se encuentra ACTIVA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificació	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000002 ESPIGON SUR	Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6,96 %
C1020803777	CONEJO QUIÑONES ANDRES SANTIAGO	01/11/2019		14744237	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación

Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 31/10/2019 17:01:53 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.28.217.122, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

53

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS
PORVENIR S.A.
NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) **RUBEN DARIO MEDINA MORENO**, identificado(a) con Cédula de Ciudadania **79,472,280**, se encuentra afiliado(a) al **AL FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 31 días del mes de Octubre de 2019.

Gerente de Clientes

54

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

compensar | eps salud

No. de Radicación | Fecha de Radicación

I. DATOS DEL TRÁMITE *(Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)*

1. Tipo de trámite: A. Afiliación [X] B. Reporte de Novedades [ ]
2. Tipo de Afiliación: A. Individual [ ] · Cotizante o cabeza de Familia [ ] · Beneficiario o afiliado adicional [ ]
3. B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ]
4. Régimen: A. Contributivo [ ] B. Subsidiado [ ]
5. Tipo de afiliado: A. Cotizante [X] B. Cabeza de familia [ ] C. Beneficiario [ ]
6. Tipo de cotizante: A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]
Código (a registrar por la EPS): 01

A. AFILIACIÓN II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres: Medina Moreno Ruben Dario
7. Tipo de documento de identidad: CC
8. Número de documento de identidad: 79.472.280
9. Sexo: Femenino [ ] Masculino [X]
10. Fecha de nacimiento: 29/11/1971/1961/8

III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

11. Etnia:
12. Discapacidad: Tipo [ ] Condición [ ]
13. Puntaje SISBÉN:
14. Grupo de población especial:
15. Administradora de riesgos laborales - ARL: SURA
16. Administradora de pensiones: Porvenir
17. Ingreso base de cotización - IBC: 828.116.
18. Residencia: Carrera 88 C/la 42 Sur #88A-18 6126068
Bogotá Zona Urbana [X] Rural [ ] BOSA D.C

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

19. Apellidos y nombres:
20. Tipo de documento de identidad:
21. Número de documento de identidad:
22. Sexo: Femenino [ ] Masculino [ ]
23. Fecha de nacimiento:

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres: Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	25. Tipo de documento de identidad	26. Número de documento de identidad	27. Sexo: Femenino	Masculino
B1								
B2								
B3								
B4								
B5								

	28. Fecha de nacimiento	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad: Tipo	Condición	32. Datos de residencia: Municipio / Distrito	Zona: Urbana	Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o celular	33. Valor de la UPC afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1											
B2											
B3											
B4											
B5											

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Institución prestadora de servicios de salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
Col.		
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social: Carmelo Rosales
36. Tipo de documento de identificación: NIT
37. Número del documento de identificación: 19.374.007-5
38. Tipo de aportante o pagador pensiones (a registrar por la EPS):
39. Ubicación: Cll 85 #19b 22 C 304 6126068 marasepulveda@hotmail.com Bogotá D.C.

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad
1. Modificación datos básicos de identificación [ ]
2. Corrección datos básicos de identificación [ ]
3. Actualización documento de identidad [ ]
4. Actualización y corrección de datos complementarios [ ]
5. Terminación de la inscripción en la EPS [ ] Código [ ]
6. Reinscripción en la EPS [ ]
7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ]
8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ]
9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar [X]
10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando [ ]
11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ]
12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ]
13. Movilidad: A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado [ ]
14. Traslado: A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen [ ]
15. Reporte por fallecimiento [ ]
16. Reporte del trámite de protección al cesante [ ]
17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado [ ]
18. Reporte de la calidad de Pensionado [ ]

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación:
Tipo de documento de identidad | Número de documento de identidad | Sexo: Femenino [ ] Masculino [ ] | Fecha de nacimiento | 42. Fecha
43. EPS anterior | 44. Motivo de traslado Código | 45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales. [ ]
47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción. [ ]
48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios. [ ]
49. Declaración de no inclusión del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud. [ ]
50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales. [ ]
51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran. [ ]
52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 [ ]
53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto. [ ]

VIII. FIRMAS

Ruben Dario M. | Carmelo Rosales

IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad: CN [ ] Cant. [ ] RC [ ] Cant. [ ] TI [ ] Cant. [ ] CC [ ] Cant. [ ] PA [ ] Cant. [ ] CE [ ] Cant. [ ] CD [ ] Cant. [ ] SC [ ] Cant. [ ] Total [ ]
57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente. [ ]
58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital. [ ]
59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que [illegible] que declare la terminación de la unión marital. [ ]
60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor. [ ]
61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia. [ ]
62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración jurada por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres. [ ]
63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud [illegible] [ ]
65. Copia del acto administrativo [illegible] la calidad de beneficiario o [illegible] [ ]

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la entidad Territorial: Código del municipio [ ] Código del departamento [ ]
67. Datos del SISBÉN: Número de la ficha [ ] Puntaje [ ] Nivel [ ]
68. Fecha de radicación: 31 OCT 2019 Fecha de inscripción [illegible]
70. Datos del funcionario que realiza la validación:
Tipo de documento de identidad [ ] Número de documento de identidad
71. Firma del funcionario
OBSERVACIONES: apertura 2019

Cód. 674 Rafael Esteban Florez R.
SUJETO A VERIFICACIÓN

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

VIGILADO Supersalud

VIGILADO SuperSubsidio

55

ARL sura

Medellín, 31 de octubre de 2019

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de ROSALES AMELL CARMELO JOAQUIN que se encuentra ACTIVA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificació	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL DC	Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6,96 %
C79472280	MEDINA MORENO RUBEN DARIO	01/11/2019		1923230A	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación

Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 31/10/2019 12:14:57 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.28.217.122, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

56

ARL | sura

Medellín, 31 de octubre de 2019

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CENIT INGENIERÍA Y GEOLOGÍA S.A.S que se encuentra ACTIVA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificació	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000002 ESPIGON SUR	Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6,96 %	
C80086257	PARRA QUIÑONES JHON INDALECIO	01/11/2019		ng131621	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 31/10/2019 16:55:11 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.28.217.122, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

57

Colpensiones
Ven por tu futuro ya

El futuro es de todos
Gobierno de Colombia

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de Afiliados, el Señor (a) **JHON INDALECIO PARRA QUIÑONES** identificado (a) con **Cédula de Ciudadanía** número **80086257,** estuvo afiliado (a) al Régimen de Prima Media con Prestación Definida - RPM, administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES** y su estado es *ASIGNADO AL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD – RAI POR DECRETO 3995/2008.*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

INFORMACIÓN HISTÓRICA DE AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES				
Novedad	Código Entidad	Entidad Definitiva	Fecha	MultivinculaciónDecreto 3995/2008
Vinculación Inicial	3	PORVENIR S.A.	14/03/2005	Afiliado sin cotizaciones entre 20070701 al 20071231 y con última cotización en el RAI

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 31 de octubre de 2019.

Rosa Mercedes Niño Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

58

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Salud Total EPS-S

No de Radicacion	Fecha de Radicación
4004368508	0|1|1|1|2|0|1|9

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al fromulario antes de diligenciarlo)

1.tipo de tramite	2.Tipo afiliacion	3.Regimen
A. Afiliación ☐ B.Reporte de Novedades ☒	B. Colectiva ☐ A. Individual: -Cotizante Cabeza de familia ☒ -Beneficiario afiliado adicional ☐ B. Institucional ☐ B. De oficio ☐	A.Contributivo ☒ B.Subsidiado ☐

4. Tipo de afiliado	5. Tipo de cotizante	Codigo (a registrar por la EPS)
A. Cotizante ☒ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐	A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐	1

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6.Apellidos y nombres			
PEREZ (Primer apellido)	GIL (Segundo apellido)	BRAYAN (Primer nombre)	FELIPE (Segundo nombre)
7.Tipo documento de Identidad	**8.Número del documento de Identidad**	**9.Sexo**	**10.Fecha de nacimiento**
CC	1192735885	Femenino ☐ Masculino ☒	1|5|0|8|1|9|9|3

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11.Etnia	12.Discapacidad	13.Puntaje SISBEN	14.Grupo de poblacion especial
6	Tipo F N M Condicion T P		

15. Administradora de riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotizacion - IBC
SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA S.A.	PORVENIR FPC	828116

18.Residencia

Dirección	Telefono fijo	Telefono celular	Correo electronico
CL 341 35 74	2369894		INCRA55@YAHOO.COM

Municipio/Distrito	zona	Localidad / comuna	Departamento
BOGOTA	Urbana ☒ Rural ☐		BOGOTA

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
20. Tipo documento de identidad	**21. Número documento identidad**	**22. Sexo**	**23. Fecha de nacimiento**
		Femenino ☐ Masculino ☐	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres			
	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo documento de identidad	26. Número de identidad	27.Sexo		28.Fecha de nacimiento
			Femenino	Masculino	
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					

Datos complementarios

	29.Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad				
			Tipo			Condición	
			F	N	M	T	P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

32. Datos de residencia

	Municipio/Distrito	Zona		Departamento	Teléfono Fijo y/o celular	33.Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
		Urbana	Rural			
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Seleccion de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS	Codigo de la IPS(a registrar por la EPS)
C	VS KENNEDY - VS KENNEDY	VSKENNED - VSKENNED
B	-	-
B	-	-
B	-	-

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA,INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de identificación	37. Numero de docuemnto de Identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones(a registrar por la EPS)
CARMELO ROSALES AMELL	CC	19374007	01

39.Ubicación

Dirección	Teleéfono	Correo electrónico	Municipio/distrito	Departamento
CL 85 21 22 OF 304	2369894	INCRA55@YAHOO.COM	GIRARDOT	CUNDINAMARCA

59

No de Radicacion
4004368508

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- ☐ 1. Modificación datos básicos de identificación
- ☐ 2. Corrección datos básicos de identificación
- ☐ 3. Actualización documento de identidad
- ☐ 4. Actualización y/o corrección datos complementarios
- ☐ 5. Terminación de la inscripcion en la EPS. Código: ☐
- ☐ 6. Reinscripción en la EPS
- ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☒ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ 10. Terminación de la relacion laboral o perdida de las condiciones para seguir cotizando
- ☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 13. Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ 14.Traslado: ☐ A. Mismo régimen ☐ B. Diferente régimen
- ☐ 15. Reporte de fallecimiento
- ☐ 16.Reporte del tramite de protección al cesante
- ☐ 17. Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- ☐ 18. Reporte de la calidad del pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de la identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42.Fecha
		Femenino ☐ Masculino ☐		0|2|1|1|2|0|1|9

43.EPS anterior	44.Motivo de traslado Código:	45.Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46 ☐ Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.

47 ☐ Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributvo,Especial o de Excepción.

48 ☐ Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.

49 ☐ Declaración de no internación del cotizante,cabeza de familia ,beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud .

50 ☒ Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clinica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.

51 ☒ Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que poir sus funciones la requieran

52 ☒ Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decr eto 1377 de 2013

53 ☒ Autorización para que la EPS envie información al correo electronico o celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

54. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio

IX.ANEXOS

☐ 56.Anexo Copia del documento de identidad: CN. ☐ RC. ☐ TI. ☐ CC. ☐ PA. ☐ CE. ☐ CD. ☐ SC. ☐

Cantidad: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Total: 0

- ☐ 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- ☐ 58. Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la union marital.
- ☐ 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio ,sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la union marital.
- ☐ 60. Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor
- ☐ 61.Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.
- ☐ 62.Documento en que conste la perdida de la patria potestad, o el certificaco de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- ☐ 63.Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- ☐ 64.Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ 65.Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consiste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial Código del municipio	Código del Departamento	67. Datos del SISBEN Número ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación

70. Datos funcionario que realiza la validacion

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	71.Firma del funcionario

Observaciones

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, asi como la veracidad de las demás información registrada.

60

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS
PORVENIR S.A.
NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) **BRAYAN FELIPE PEREZ GIL**, identificado(a) con Cédula de Ciudadania **1,192,735,885**, se encuentra afiliado(a) al **AL FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 01 días del mes de Noviembre de 2019.

Gerente de Clientes

61

Salud Total EPS

Bogotá, Noviembre 1 de 2019

Señor:
PEREZ GIL BRAYAN FELIPE
CC. 1192735885
CL 34I 35 74 - 2369894
Ciudad

Ref: M-PYGA-F065. SOLICITUD INFORMACIÓN - AFILIACIÓN SALUD TOTAL EPS S.A.

En relación con el asunto de la referencia, y atendiendo su solicitud, nos permitimos informarle que a la fecha de expedición de la presente comunicación consta en nuestra base de datos que su afiliación al régimen contributivo de Salud Total EPS S.A. se realizó a partir de Noviembre 1 de 2019. Los usuarios inscritos en su afiliación son:

Nombre	Documento	Tipo	Afiliacion	Sem cot	Sem Ant	Parentesco	Estado Afiliacion	Fecha de desafiliacion EPS	Estado Actual	Discapacidad
PEREZ GIL BRAYAN FELIPE	1192735885	C	C	0	26	COTIZANTE	COTIZANTE	COTIZANTE	Suspendido	Ninguna

De acuerdo con los registros de la base de datos, su grupo familiar presenta la siguiente relación laboral:

Razón social del aportante	Usuario en contrato	Tipo de contrato	Estado de contrato
CARMELO ROSALES AMELL	1192735885	Dependiente	VIGENTE

CARTA NO VALIDA PARA TRASLADO

En Salud Total apreciamos la confianza que usted ha depositado en nosotros y esperamos que usted y su familia continúen disfrutando de nuestros servicios de salud con Calidad total. Cualquier información adicional, con gusto será atendida por el personal de servicio al cliente de la sede administrativa de su ciudad, o puede comunicarse con nuestra línea gratuita 018000 1 14524 a nivel nacional o en Bogotá al teléfono 4854555.

Cordialmente,

CARLOS JAVIER CARREÑO SANCHEZ
Director de Recaudo y Compensación
SALUD TOTAL EPS S.A.

NOTA: En caso requerido, este certificado es válido para la atención a través del Régimen Subsidiado o como población vinculada, si el Estado Actual es afiliación cancelada, novedad de retiro de trabajo, afiliación no efectiva, exclusión o anulación de la afiliación, siempre y cuando al momento de retiro o exclusión no haya reportado mora. Si es mora, o cancelación por falta de pago, debe informar a su aportante que debe ponerse al día en los pagos

62

ARL | sura

Medellín, 01 de noviembre de 2019

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de ROSALES AMELL CARMELO JOAQUIN que se encuentra ACTIVA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificació	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL DC	Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6,96 %
C119273588 5	PEREZ GIL BRAYAN FELIPE	02/11/2019		20423147	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 01/11/2019 13:57:53 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.28.217.122, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Salud Total EPS-S

No de Radicacion	Fecha de Radicación
4004368508	0|1|1|1|2|0|1|9

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al fromulario antes de diligenciarlo) Página 1 de 2

1.tipo de tramite	2.Tipo afiliacion	3.Regimen
A. Afiliación ☐ B.Reporte de Novedades ☒	B. Colectiva ☐ A. Individual: -Cotizante Cabeza de familia ☒ -Beneficiario afiliado adicional ☐ B. Institucional ☐ B. De oficio ☐	A.Contributivo ☒ B.Subsidiado ☐

4. Tipo de afiliado	5. Tipo de cotizante	Codigo (a registrar por la EPS)
A. Cotizante ☒ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐	A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐	1

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6.Apellidos y nombres			
PEREZ (Primer apellido)	GIL (Segundo apellido)	BRAYAN (Primer nombre)	FELIPE (Segundo nombre)
7.Tipo documento de Identidad	**8.Número del documento de Identidad**	**9.Sexo**	**10.Fecha de nacimiento**
CC	1192735885	Femenino ☐ Masculino ☒	1|5|0|8|1|9|9|3

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11.Etnia	12.Discapacidad	13.Puntaje SISBEN	14.Grupo de poblacion especial
6	Tipo F N M Condicion T P		

15. Administradora de riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotizacion - IBC
SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA S.A.	PORVENIR FPC	828116

18.Residencia

Dirección	Telefono fijo	Telefono celular	Correo electronico
CL 34I 35 74	2369894		INCRA55@YAHOO.COM

Municipio/Distrito	zona	Localidad / comuna	Departamento
BOGOTA	Urbana ☒ Rural ☐		BOGOTA

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
20. Tipo documento de identidad	**21. Número documento identidad**	**22. Sexo**	**23. Fecha de nacimiento**
		Femenino ☐ Masculino ☐	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo documento de identidad	26. Número de identidad	27.Sexo Femenino	27.Sexo Masculino	28.Fecha de nacimiento
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					

Datos complementarios

	29.Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad Tipo F	Tipo N	Tipo M	Condición T	Condición P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

32. Datos de residencia

	Municipio/Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Teléfono Fijo y/o celular	33.Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Seleccion de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS	Codigo de la IPS(a registrar por la EPS)
C	VS KENNEDY - VS KENNEDY	VSKENNED - VSKENNED
B	-	-
B	-	-
B	-	-

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA,INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de identificación	37. Numero de docuemnto de Identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones(a registrar por la EPS)
CARMELO ROSALES AMELL	CC	19374007	01

39.Ubicación				
CL 85 21 22 OF 304 (Direccion)	2369894 (Teleéfono)	INCRA55@YAHOO.COM (Correo electrónico)	GIRARDOT (Municipio/distrito)	CUNDINAMARCA (Departamento)

64

No de Radicacion
4004368508

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- ☐ 1. Modificación datos básicos de identificación
- ☐ 2. Corrección datos básicos de identificación
- ☐ 3. Actualización documento de identidad
- ☐ 4. Actualización y/o corrección datos complementarios
- ☐ 5. Terminación de la inscripcion en la EPS.
  Código: ☐
- ☐ 6. Reinscripción en la EPS
- ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☒ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ 10. Terminación de la relacion laboral o perdida de las condiciones para seguir cotizando
- ☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 13. Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ 14.Traslado: ☐ A. Mismo régimen ☐ B. Diferente régimen
- ☐ 15. Reporte de fallecimiento
- ☐ 16.Reporte del tramite de protección al cesante
- ☐ 17. Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- ☐ 18. Reporte de la calidad del pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de la identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42.Fecha
		Femenino ☐ Masculino ☐		0|2|1|1|2|0|1|9

43.EPS anterior	44.Motivo de traslado Código:	45.Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. ☐ Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
47. ☐ Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributvo.Especial o de Excepción.
48. ☐ Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
49. ☐ Declaración de no internación del cotizante,cabeza de familia ,beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud .
50. ☒ Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
51. ☒ Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que poir sus funciones la requieran
52. ☒ Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decr eto 1377 de 2013
53. ☒ Autorización para que la EPS envie información al correo electronico o celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

54. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio

IX.ANEXOS

☐ 56.Anexo Copia del documento de identidad: CN. ☐ RC. ☐ TI. ☐ CC. ☐ PA. ☐ CE. ☐ CD. ☐ SC. ☐

Cantidad: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Total: 0

- ☐ 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- ☐ 58. Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la union marital.
- ☐ 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio ,sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escntura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la union marital.
- ☐ 60. Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor
- ☐ 61.Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.
- ☐ 62.Documento en que conste la perdida de la patria potestad, o el certificaco de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- ☐ 63.Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- ☐ 64.Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ 65.Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consiste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial Código del municipio	Código del Departamento	67. Datos del SISBEN Número ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación

70. Datos funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	71.Firma del funcionario

Observaciones

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, asi como la veracidad de las demás información registrada.

ARL | sura

65

Medellín, 31 de octubre de 2019

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CENIT INGENIERÍA Y GEOLOGÍA S.A.S que se encuentra ACTIVA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificació	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000002 ESPIGON SUR	Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6,96 %
C80503343	PINZON QUIÑONES HENRY	01/11/2019		T216Qf71	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación

Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 31/10/2019 17:06:40 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.28.217.122, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

66

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Famisanar EPS

NIT 830.003.564-7

9006224062

No. de Radicación: 18670535

Fecha de Radicación: 01 11 2019

Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

I. DATOS DEL TRÁMITE

1. Tipo de trámite	2. Tipo de Afiliación	3. Régimen	4. Tipo de afiliado	5. Tipo de cotizante	Código (a registrar por la EPS)
A. Afiliación [ ] B. Reporte de Novedades [X]	A. Individual: • Cotizante o cabeza de Familia [X] • Beneficiario o afiliado adicional [ ] B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ]	A. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]	A. Cotizante [X] B. Cabeza de familia [ ] C. Beneficiario [ ]	A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]	

A. AFILIACIÓN II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
Primer Apellido: PINZON	Segundo Apellido: QUIÑONES	Primer Nombre: HENRY	Segundo Nombre:

7. Tipo de documento de identidad	8. Número del documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
CC	80503343	Femenino [ ] Masculino [X]	D 03 M 10 A 1972

III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial	15. Administradora de riesgos laborales - ARL	16. Administradora de pensiones
	Tipo [ ] Condición [ ]			SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A	

17. Ingreso base de cotización - IBC	18. Residencia		
$828.116	Dirección:	Teléfono fijo:	Teléfono celular:
Correo electrónico:	Municipio / Distrito:	Zona Urbana [ ] Rural [ ]	Localidad / Comuna: Departamento:

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

19. Apellidos y nombres			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número del documento de identidad	27. Sexo Femenino	27. Sexo Masculino	28. Fecha de nacimiento (D D M M A A A A)	Datos complementarios: 29. Parentesco	Datos complementarios: 30. Etnia
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

	31. Discapacidad Tipo F	N	M	Condición T	P	32. Datos de residencia: Municipio / Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1											
B2											
B3											
B4											
B5											

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la institución prestadora de servicios de salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
CENIT INGENIERIA Y GEOLOGIA SAS	NIT	900992209	

39. Ubicación				
CR 50 145A 68 Dirección	NT Teléfono	Correo electrónico	BOGOTA Municipio / Distrito	DISTRITO CAPITAL Departamento

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

1. Modificación de datos básicos de identificación [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación [ ] 3. Actualización del documento de identidad [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS [ ] Código [ ] 6. Reinscripción en la EPS [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar [X] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 13. Movilidad: A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado [ ] 14. Traslado: A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen [ ] 15. Reporte de fallecimiento [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado [ ]

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha novedad
		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A	01 11 2019

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios o afiliados adicionales.
47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
52. Autorización para que la EPS manejo los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio

IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad: CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] PA [ ] CE [ ] CD [ ] SC [ ] Cantidad: [ ] Total [ ]
57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
58. Copia del registro civil de matrimonio o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
62. Copia del documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la entidad Territorial: Código del municipio	Código del departamento	67. Datos del SISBÉN: Número de la ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
					D D M M A A A A	D D M M A A A A

70. Datos del funcionario que realiza la validación			
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	OBSERVACIONES:	71. Firma del funcionario
		CARGO: OPERARIO DE SERVICIOS GENERALES	

USO EXCLUSIVO ENTIDAD TERRITORIAL

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

Cambio Empleo

INTERNET

05/2016

Colpensiones
Ven por tu futuro ya

El futuro es de todos
Gobierno de Colombia

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de Afiliados, el Señor (a) **HENRY PINZON QUIÑONES** identificado (a) con **Cédula de Ciudadanía** número **80503343,** se encuentra afiliado (a) desde **01/11/2008** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida - RPM, administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES** y su estado es *ACTIVO NO COTIZANTE.*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

INFORMACIÓN HISTÓRICA DE AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES				
Novedad	Código Entidad	Entidad Definitiva	Fecha	MultivinculaciónDecreto 3995/2008
Traslado Aprobado de COLPENSIONES o a un Fondo de Pensión	23	COLPENSIONES	01/03/1996	No Aplica
Traslado Aprobado de un Fondo de Pensión a COLPENSIONES	23	COLPENSIONES	01/11/2008	No Aplica

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 31 de octubre de 2019.

Rosa Mercedes Niño Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PERIODO: Octubre - Diciembre

CONTRATO DE OBRA No 19001111 01 H4 de 2019

OBJETO:

REALIZAR MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO SUMINISTRO DE MATERIALES MANO OBRA INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS AEROCIVIL NEAA Y NAA (LOTE 1).

BOGOTÁ D.C. OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2019

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN....4

2. OBJETIVOS....4

2.1 Objetivo General....4
2.2 Objetivos específicos....4

3. RESUMEN EJECUTIVO....5

4. RESPONSABLES:....5

5. CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO....5

5.1 Sistema general de seguridad social integral....5
5.2 Exámenes médicos ocupacionales de ingreso....5
5.3 Exámenes médicos ocupacionales de egreso....6
5.4 Inducciones al cargo en seguridad y salud en el trabajo....6
5.5 Notificaciones de riesgos en seguridad y salud en el trabajo....7
5.6 Dotación de elementos de protección personal....7
5.7 Inspecciones....7
5.8 Permisos de trabajo....7
5.9 Plan de trabajo....7
5.10 Charlas en seguridad y salud en el trabajo....7

6. CONTROL Y ACOMPAÑAMIENTO....8

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO....10

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN....4

2. OBJETIVOS....4

2.1 Objetivo General....4

2.2 Objetivos específicos....4

3. RESUMEN EJECUTIVO....5

4. RESPONSABLES:....5

5. CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO....5

5.1 Sistema general de seguridad social integral....5

5.2 Exámenes médicos ocupacionales de ingreso....5

5.3 Exámenes médicos ocupacionales de egreso....6

5.4 Inducciones al cargo en seguridad y salud en el trabajo....6

5.5 Notificaciones de riesgos en seguridad y salud en el trabajo....7

5.6 Dotación de elementos de protección personal....7

5.7 Inspecciones....7

5.8 Permisos de trabajo....7

5.9 Plan de trabajo....7

5.10 Charlas en seguridad y salud en el trabajo....7

5.16 Matriz de peligro....7

6. CONTROL Y ACOMPAÑAMIENTO....8

7. REGISTRO FOTOGRAFICO....10

71

1. INTRODUCCIÓN.

El consorcio CRS. ejecuta el contrato n° 19001111 01 h4 de 2019, cuyo objeto realizar mantenimiento integral preventivo y correctivo bajo la modalidad outsorcing el sistema de precios unitarios incluyendo suministro de materiales mano obra instalaciones administrativas aerocivil NEAA y NAA (lote 1), celebrado entre consorcio CRS y Aeronáutica Civil.

El presente informe contiene las actividades ejecutadas de gestión en seguridad y salud en el trabajo SG-SST, desarrolladas por el contratista, Consorcio CRS. Se desarrollaron actividades de supervisión, seguimiento, acompañamiento, verificación y cumplimiento de las actividades planteadas. En él se encontrarán los objetivos propuestos y la descripción de las actividades desarrolladas en el avance del contrato.

La seguridad y la salud en el trabajo (SST) es una disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo. La salud en el trabajo conlleva la promoción y el mantenimiento del más alto grado de salud física y mental y de bienestar de los trabajadores en todas las ocupaciones.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Vigilar, controlar y apoyar de manera eficaz y oportuna las acciones de seguridad y salud en el trabajo establecidas por el CONSORCIO CRS, según contrato de Obra No. **19001111 01 H4 de 2019** , durante el periodo comprendido entre Noviembre y Diciembre de 2019.

2.2 Objetivos Específicos

- Ejecutar la programación mensual de actividades de seguridad y salud en el trabajo programadas para el presente mes.
- Concientizar al personal en obra, sobre los peligros y riesgos presentes en sus actividades diarias e implementar los controles necesarios.

- Proveer información y datos sobre las acciones en Seguridad y Salud en el Trabajo desarrolladas por el Contratista a la interventoría y demás y otras entidades que lo requieran.

3. RESUMEN EJECUTIVO

La aeronáutica civil , celebro con el consorcio CRS, el contrato de trabajo N° **19001111 01 H4 de 2019 cuyo objeto es REALIZAR MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO SUMINISTRO DE MATERIALES MANO OBRA INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS AEROCIVIL NEAA, CEA Y NAA (LOTE 1).CELEBRADO ENTRE CONSORCIO CRS Y AERONÁUTICA CIVIL**

El contrato se divide en dos etapas; una etapa preliminar la cual incluye la entrega de los documentos necesarios para dar inicio a las obras y la etapa de obra.

4. Responsables.

A continuación, se relaciona el personal profesional encargado para el desarrollo de la obra por parte del CONSORCIO CRS. el cual cuenta con el siguiente grupo de profesionales para el desarrollo de las actividades objeto del contrato:

Tabla 1 Personal del Contratista.

N°	Nombres y apellidos	Cedula	Cargo
1	Carmelo Joaquín Rosales Amell	19.374.007	Director de Obra
2	Manuel Ricardo Velásquez Rosales	80.871.449	Residente técnico
3	Luis F. Gutiérrez Benavides	74.323.797	Residente SST
4	Rafael Ricardo García Méndez	1.015.411.413	Encargado

5. CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

El **CONSORCIO CRS.** realiza actividades con el personal administrativo del proyecto, con el fin de desarrollar las actividades propuestas de acuerdo al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST). Durante el periodo se desarrollaron las siguientes actividades:

5.1 Sistema general de seguridad social integral

Se revisa la seguridad la seguridad social del personal del subcontratista y los exámenes de ingreso, verificando las fechas de pago, nivel de cotización, actividad económica, identificación de los trabajadores entre otros.

5.2 Exámenes médicos ocupacionales de ingreso.

Dando cumplimiento al programa de medicina preventiva y del trabajo, resolución 2346 de 2007, el consorcio CRS, realiza la toma de exámenes medico ocupacionales a los colaboradores que ingresaron durante el periodo.

5.3 Exámenes médicos ocupacionales de egreso

Exámenes médicos de egreso. Examen médico previo a la terminación de la relación laboral o de egreso. Este tipo de examen médico tiene como objeto evaluar el estado de salud del trabajador al momento de finalizar la relación laboral con el consorcio.

En las inducciones de ingreso se le informa al personal que tienen derecho de realizarse el examen de egreso cuando se retira del proyecto.

5.4. Inducciones al cargo en Seguridad y Salud en el trabajo.

Se da inducción de **SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** al colaborador al momento de ingresar al proyecto. Donde se da a conocer a los trabajadores las Políticas, Normas, procedimientos y lineamientos en materia de Seguridad y salud en el trabajo, Reglamento de Higiene y trabajo, Medio Ambiente, que están estipulados en el consorcio CRS, generalidades del proyecto, sistemas de gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y sus subprogramas, definición de accidente laboral y enfermedad laboral, reporte de los incidentes y accidentes laborales, examen de egreso, Elementos de protección personal, actos y condiciones inseguras, inspecciones del área de trabajo, manejo de herramientas, comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, plan de emergencias, etc.

5.5. Notificación de riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo.

En las inducciones de seguridad y salud en el trabajo se le informa al personal sobre los riesgos que están expuestos durante la jornada laboral a continuación se relaciona:

Físico, Mecánico, Eléctrico, Químico, Biológico, Ergonómico, Psicosocial, Natural, Público, locativo, transito. Permisos de trabajo, Plan de emergencias y contingencias a todo el personal que ingresa.

5.6 Dotación Y elementos de protección personal.

Al personal del subcontratista se le hace entrega de las dotaciones y elementos de protección personal de acuerdo a la actividad que se vaya a ejecutar, esto con el fin evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales

5.7 Inspecciones

Se realiza inspección sobre uso de los elementos de protección, verificando estado físico, durabilidad, también se inspecciona los elementos de protección contra caídas.

Se ejecuta revisión de las herramientas y maquinarias menores, observando su estado, uso, conexiones, empalmes, entre otros.

Se revisa los andamios tubulares con todos sus componentes, crucetas, compatibilidad entre piezas, estado físico, rocas y tuercas para asegurar los marcos metálicos

Estos andamios fueron utilizados para el arreglo del logotipo de aerocivil. Ubicado en la fachada norte del edificio.

5.8 Permisos de trabajo

Durante el periodo de trabajo se realizaron trabajos en alturas, la cual se diligenciaron los permisos correspondientes para esta actividad.

5.9 Plan de trabajo.

Durante este periodo se formuló el plan de trabajo que se ejecutara por parte del Consorcio CRS durante el desarrollo del proyecto

Durante este periodo se ejecutaron las siguientes actividades.
Pintura: En baños, oficinas, cuartos de maquinaria, corredores, cafeterías entre otras.
Arreglos hidrosanitarios.
Arreglo de logotipo de Aerocivil.

Arreglo de instalaciones eléctricas.
Arreglo de zonas húmedas.
Impermeabilización de cubierta.
Cambios partes eléctricas entre otros.

5.10 Charlas en seguridad salud en el trabajo.

Las charlas de seguridad se programan de acuerdo a la necesidad

Las charlas de seguridad son enfocadas a los diferentes riesgos como: Riesgos Físicos, riesgos químicos, biomecánicos, uso de elementos de protección personal, trabajos en altura, riesgos locativos, reflexiones en seguridad, plan de emergencias, normas de tránsito, información sobre políticas de seguridad y salud en el trabajo, No consumo de alcohol y drogas,

Las charlas de seguridad y/o pre operacionales, se programan de acuerdo al requerimiento de la información que deba ser entregada a los colaboradores, diariamente surgen temas de interés general, divulgación de accidentes, planes de acción, inquietudes de los trabajadores, entre otros.

6. CONTROL Y ACOMPAÑAMIENTO SST

El profesional residente de Seguridad y Salud en el trabajo SST del Consorcio CRS. Realizo acompañamiento en la ejecución de trabajos críticos (Trabajos en altura).

INFORME TRABAJOS EN ALTURA.

Ubicación: Fachada norte Aero civil.
Actividad a ejecutar: Desmonte, arreglo eléctrico y montaje de aviso logotipo
Fecha: Diciembre 12 de 2019.
Días laborados en la actividad: 3.
Equipo a utilizar: Andamio tipo cruceta.

Descripción de evento: El consorcio CRS, realiza el arreglo del aviso logotipo de acuerdo a lo contemplado en el contrato con Aero civil. Esta actividad se realiza en el costado norte de la fachada del edificio.

La actividad consistía en la revisión en el sitio de trabajo de las instalaciones eléctricas, se ejecuta el desmonte de aviso para su arreglo, y de nuevo se hace la instalación del logotipo en su sitio definitivo.

Para esta actividad se emplea andamio reforzado tipo tubular con cruceta, esta armadura cuenta con aseguramiento en las crucetas con sistema tornillo, y se asegura con tuercas tipo mariposa, la cual evita desplazamientos durante la armada y el desarrollo de la actividad, la estructura es asegura en sus extremos y en la parte superior con líneas para evitar desplazamientos

Las partes del andamio son completamente compatibles entre sí evitando posibles movimientos bruscos a causa de alturas y factor climático.

Estos andamios cumplen con la resistencia requerida de acuerdo a la actividad.
Para garantizar mayor seguridad se asegura de forma monolítica para evitar posibles entre secciones.

Antes de realizar el armado de los andamios se inspecciona visualmente verificando soldaduras, cuerpo de la estructura, pasadores, puntos de acople entre secciones entre otros.

El andamio es armado de acuerdo a especificaciones del fabricante teniendo en cuenta la escalera de acceso para los trabajadores y el derecho de las crucetas estas debe quedar con el filo hacia el costado inferior.

El andamio siempre conservo su verticalidad, esto garantiza mayor seguridad al momento de realizar la actividad.

A continuación, se informan las diferentes medidas de protección que se emplearon para la actividad.

- **Puntos de Anclaje:** Las líneas de vida se instalaron en las estructuras del edificio, la cual garantiza la resistencia requerida de acuerdo a la resolución 1409 de 2012 por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas.
- **Líneas de vida vertical:** Se utilizó líneas de vida tipo portátil por ser una actividad **no rutinaria**, que garantiza la resistencia exigida de acuerdo a la resolución, cada uno de los trabajadores tiene su propia línea de vida, las líneas de vida que se utilizaron para esta actividad fue de 16mm de 100m de longitud.
- **Conectores:** Para esta actividad se utilizó eslingas con absolvedor de energía, esto con el fin de disminuir las fuerzas de impacto en el cuerpo del trabajador o en los puntos de anclaje en el momento de una caída
- **Arnés de cuerpo completo:** Los trabajadores utilizaron arnés de cuerpo completo de acuerdo al estándar nacional, garantizando la resistencia requerida de acuerdo a la legislación colombiana.

77

También se emplearon las siguientes medidas colectivas de prevención.

- **Delimitación de área:** Se delimito el área de trabajo por medio de cinta de seguridad de color negro y amarillo y colombianas de color naranja con cinta reflectiva, esto con el fin de evitar el ingreso del personal NO autorizado al área de trabajo.
- **Señalización del área:** La zona de trabajo se señaliza para evitar ingreso del personal al área de trabajo, para prevenir posibles accidentes por caída de material o herramienta.
- **Ayudante de seguridad:** Para realizar la actividad el consorcio CRS cuenta con el ayudante de seguridad. La cual ayuda a advertir y controlar los peligros y riesgos que se identifican en el sitio de trabajo.
- **Permisos de Trabajo:** Se realiza el permiso para ejecutar trabajos en alturas ya que es catalogado como actividad de alto riesgo, en este permiso se verifica la actividad que se va a realizar, los horarios de trabajo, estado de salud de los trabajadores, herramientas a utilizar entre otros.

ANEXOS

- Inducciones en seguridad y salud en el trabajo.
- Notificación de riesgo.
- Registros de entrega de elementos de protección personal.
- Entrega de dotaciones
- Permisos trabajos en altura
- Certificados del personal autorizado.
- Registro fotográfico.
- Certificados cursos trabajos en altura nivel avanzado


78

REGISTRO FOTOGRAFICO.

PUNTOS DE ANCLAJE






MEDIDAS DE PROTECCION.

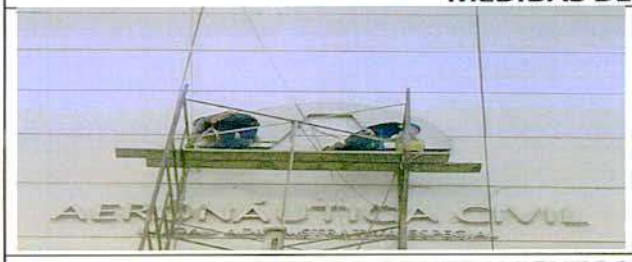



USO DE CONTRAVIENTOS - VERTICALIDAD ANDAMIO

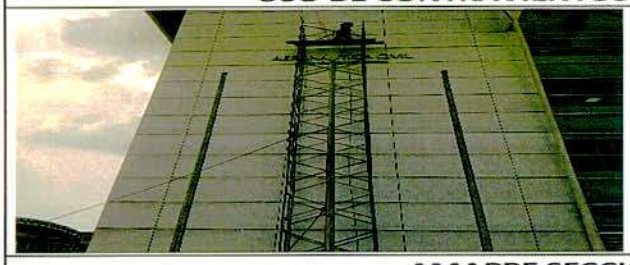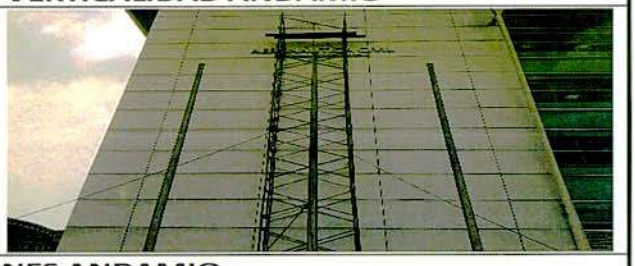
AMARRE SECCIONES ANDAMIO.




ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS




MEDIDAS DE PREVENCION

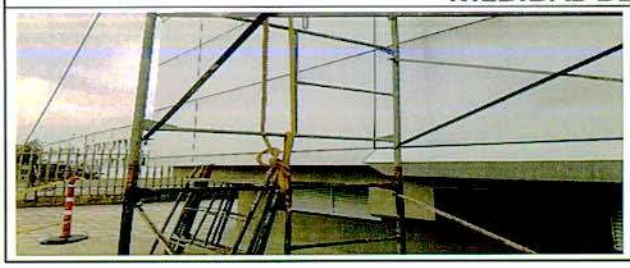


CONSORCIO CRS	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: CRSA-SST-F-059 VERSION: 00 FECHA: 27/08/2019
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA	

1.	FECHA DEL PERMISO:	Dic 10 / 2019	TIEMPO DE AUTORIZACION DEL PERMISO			
			HORA DE INICIO	12:00 m	HORA FINALIZACION	05:00 pm

2. TRABAJADORES AUTORIZADOS PARA TRABAJO EN ALTURA

#	CEDULA DE CIUDADANIA	NOMBRES	LOS TRABAJADORES ESTAN AFILIADOS AL SGSS	CARGO	FIRMA
1	1020803777	Santiago Conejo	Si	Oficial	SantiagoConejo
2	80086257	Jhon Parra	Si	Oficial	
3	80503343	Henry Pinzon	Si	Oficial	
4					
5					
6					

3. CONDICIONES DE SALUD DE LOS TRABAJADORES: Buenas

4. AREA Y/O LUGAR DONDE SE VA A REALIZAR EL TRABAJO EN ALTURA: Aeronautica Civil - Fachada Norte.

5. DESCRIPCION DE LA TAREA QUE SE ESTA REALIZANDO: Instalacion letrero logotipo aerocivil, instalaciones electricas

6. SISTEMAS DE ACCESO:

7. EQUIPO, MAQUINAS, HERRAMIENTAS A UTILIZAR:

MARQUE CON X EN EL RECUADRO: C: CUMPLE NC: NO CUMPLE NA: NO APLICA

N°	ASPECTO A EVALUAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
1	Todos los trabajadores cumplen con el concepto de aptitud, de acuerdo al perfil definio para el cargo	✓			
2	Las condiciones climáticas son las adecuadas?	✓			
3	Se dispone de estructura en buenas condiciones?		✓		
4	El lugar donde se ejecutará el trabajo en altura, cuenta con linea de advertencia y demás señalización requerida			✓	
5	Se han verificado los puntos de anclaje por persona?	✓			
6	Se cuenta con los elementos de protección personal adecuados para realizar actividades en altura y están en buen estado	✓			
7	Se cuenta con sistema de protección contra caidas y se ha verificado su estado	✓			
8	Se cuenta con sistemas de acceso adecuados y en buen estado	✓		✓	Dentro andamio
9	Las escaleras a utilizar cumplen son adecuadas para la actividad a realizar		✓		
10	Se han inspeccionado los equipos de protección individual a utilizar y se encuentran en buen estado	✓			
11	Se han instalado cinta para aislar la zona y restringir el paso de vehiculos y de personas	✓			
12	Se verificó e identificó en el sitio la existencia de líneas, ductos y redes (eléctricos, hidrosanitarios y/o de gas)			✓	
13	Las personas encargadas de realizar la actividad, han recibido instruccions claras y precisas sobre precauciones a seguir en la ejecución de la tarea	✓			
14	Se cuenta con un equipo de comunicaciones			✓	
15	Se garantiza que las personas que participan en el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo, conocen el equipo y los procedimientos requeridos para firmar el permiso	✓		✓	
16	Se requieren permisos de trabajo adicionales? Cuáles?			✓	
17	En el área hay solamente personal autorizado	✓			
18	El personal tiene claro qué hacer en caso de una emergencia y cómo usar los recursos disponibles durante el evento?	✓			

Suspendida la actividad		FECHA			HORA	CAUSA:	NOMBRE (QUIEN SUSPENDE)	
SI	NO	DD	MM	AAAA			FIRMA	

OBSERVACIONES GENERALES:

COORDINADOR DE ALTURAS	Luis Gutierrez Benavides	FIRMA	
RESIDENTE SST	Luis Gutierrez	FIRMA	
PROFESIONAL AREA TECNICA	Jhon Parra	FIRMA	

CONSORCIO CRS	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: GRSA-SST-F-059 VERSION: 00 FECHA: 27/08/2019
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA	

1.	FECHA DEL PERMISO:	Dic 11 | 2019	TIEMPO DE AUTORIZACION DEL PERMISO			
			HORA DE INICIO	08:00am	HORA FINALIZACION	05:00 p.m

2. TRABAJADORES AUTORIZADOS PARA TRABAJO EN ALTURA

#	CEDULA DE CIUDADANIA	NOMBRES	LOS TRABAJADORES ESTAN AFILIADOS AL SGSS	CARGO	FIRMA
1	80'503.343	Henry Pinzon Q.	Si	Oficial	
2	1020803777	Santiago Conejo Q.	Si	Oficial	Santiago Conejo Q.
3	80'086.257	Jhon Parra Q.	Si	Oficial	Jhon Parra Q
4					
5					
6					

3. CONDICIONES DE SALUD DE LOS TRABAJADORES: Se encuentran en buenas condiciones de Salud.

4. AREA Y/O LUGAR DONDE SE VA A REALIZAR EL TRABAJO EN ALTURA: Aeronautica Civil - Fachada Norte.

5. DESCRIPCION DE LA TAREA QUE SE ESTA REALIZANDO: Instalación Letrero Logotipo aerocivil, Instalaciones electricas.

6. SISTEMAS DE ACCESO: Escaleras Tipo I andamio Tubular

7. EQUIPO, MAQUINAS, HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Alicates, destornillador, Taladro, manilas.

MARQUE CON X EN EL RECUADRO: C: CUMPLE NC: NO CUMPLE NA: NO APLICA

N°	ASPECTO A EVALUAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
1	Todos los trabajadores cumplen con el concepto de aptitud, de acuerdo al perfil definio para el cargo	✓			
2	Las condiciones climàticas son las adecuadas?	✓			
3	Se dispone de estructura en buenas condiciones?		✓		
4	El lugar donde se ejecutará el trabajo en altura, cuenta con linea de advertencia y demás señalización requerida			✓	
5	Se han verificado los puntos de anclaje por persona?	✓			
6	Se cuenta con los elementos de protección personal adecuados para realizar actividades en altura y están en buen estado	✓			
7	Se cuenta con sistema de protección contra caídas y se ha verificado su estado	✓			
8	Se cuenta con sistemas de acceso adecuados y en buen estado	✓			Escalera Interna andamio
9	Las escaleras a utilizar cumplen son adecuadas para la actividad a realizar		✓		
10	Se han inspeccionado los equipos de protección individual a utilizar y se encuentran en buen estado	✓			
11	Se han instalado cinta para aislar la zona y restringir el paso de vehiculos y de personas	✓			
12	Se verificó e identificó en el sitio la existencia de líneas, ductos y redes (eléctricos, hidrosanitarios y/o de gas)			✓	
13	Las personas encargadas de realizar la actividad, han recibido instruccions claras y precisas sobre precauciones a seguir en la ejecución de la tarea	✓			
14	Se cuenta con un equipo de comunicaciones			✓	
15	Se garantiza que las personas que participan en el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo, conocen el equipo y los procedimientos requeridos para firmar el permiso	✓			
16	Se requieren permisos de trabajo adicionales? Cuáles?		✓		
17	En el área hay solamente personal autorizado	✓			
18	El personal tiene claro qué hacer en caso de una emergencia y cómo usar los recursos disponibles durante el evento?	✓			

Suspendida la actividad				FECHA			HORA	CAUSA:	NOMBRE (QUIEN SUSPENDE)	
SI		NO		DD	MM	AAAA			FIRMA	

OBSERVACIONES GENERALES:

COORDINADOR DE ALTURAS	Luis Gutiérrez Benavides	FIRMA	
RESIDENTE SST	Luis Gutiérrez Benavides	FIRMA	
PROFESIONAL AREA TECNICA	Manuel Ricardo Velasquez	FIRMA	

CONSORCIO CRS	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: CRSA-SST-F-059 VERSION: 00 FECHA: 27/08/2018
	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA	

1.	FECHA DEL PERMISO:	Dic 9 de 2019	TIEMPO DE AUTORIZACION DEL PERMISO			
			HORA DE INICIO	10:00am	HORA FINALIZACION	05:00pm

2. TRABAJADORES AUTORIZADOS PARA TRABAJO EN ALTURA

#	CEDULA DE CIUDADANIA	NOMBRES	LOS TRABAJADORES ESTAN AFILIADOS AL SGSS	CARGO	FIRMA
1	1020803777	Santiago Obregon	Si	Oficial	Santiago Obregon
2	80086257	Jhon Parra	Si	Oficial	
3	80503343	Henry Pinzon	Si	Oficial	
4					
5					
6					

3. CONDICIONES DE SALUD DE LOS TRABAJADORES: Los trabajadores se encuentran en buenas condiciones

4. AREA Y/O LUGAR DONDE SE VA A REALIZAR EL TRABAJO EN ALTURA: Aeronautica CN:) -Fachada norte.

5. DESCRIPCION DE LA TAREA QUE SE ESTA REALIZANDO: Revisar luz de letrero

6. SISTEMAS DE ACCESO: Andamio Tubular

7. EQUIPO, MAQUINAS, HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Alicates - destornilladores

MARQUE CON X EN EL RECUADRO: C: CUMPLE NC: NO CUMPLE NA: NO APLICA

N°	ASPECTO A EVALUAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
1	Todos los trabajadores cumplen con el concepto de aptitud, de acuerdo al perfil definio para el cargo	✓			
2	Las condiciones climàticas son las adecuadas?	✓			
3	Se dispone de estructura en buenas condiciones?		✓		
4	El lugar donde se ejecutará el trabajo en altura, cuenta con linea de advertencia y demás señalización requerida			✓	
5	Se han verificado los puntos de anclaje por persona?	✓			
6	Se cuenta con los elementos de protección personal adecuados para realizar actividades en altura y están en buen estado	✓			
7	Se cuenta con sistema de protección contra caidas y se ha verificado su estado	✓			
8	Se cuenta con sistemas de acceso adecuados y en buen estado	✓			
9	Las escaleras a utilizar cumplen son adecuadas para la actividad a realizar	✓			Son del andamio
10	Se han inspeccionado los equipos de protección individual a utilizar y se encuentran en buen estado				
11	Se han instalado cinta para aislar la zona y restringir el paso de vehiculos y de personas	✓			
12	Se verificó e identificó en el sitio la existencia de líneas, ductos y redes (eléctricos, hidrosanitarios y/o de gas)			✓	
13	Las personas encargadas de realizar la actividad, han recibido instruccions claras y precisas sobre precauciones a seguir en la ejecución de la tarea	✓			
14	Se cuenta con un equipo de comunicaciones			✓	
15	Se garantiza que las personas que participan en el diligenciamiento del permiso y las que ejecutarán el trabajo, conocen el equipo y los procedimientos requeridos para firmar el permiso	✓			
16	Se requieren permisos de trabajo adicionales? Cuáles?				
17	En el área hay solamente personal autorizado	✓			
18	El personal tiene claro qué hacer en caso de una emergencia y cómo usar los recursos disponibles durante el evento?	✓			

Suspendida la actividad				FECHA			HORA	CAUSA:	NOMBRE (QUIEN SUSPENDE)	
SI		NO		DD	MM	AAAA			FIRMA	

OBSERVACIONES GENERALES:

COORDINADOR DE ALTURAS	Luis Gutiérrez B	FIRMA	
RESIDENTE SST	Luis Gutierrez T	FIRMA	
PROFESIONAL AREA TECNICA	Jhon Parra	FIRMA	

INVENTARIO DE RECIBO PARCIAL
CONTROL TECNICO EN OBRA

CONTRATO DE OBRA: 19001111 H4 de 2019

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL NEAA Y NAA.

CONTRATISTA: CONSORCIO CRS

FECHA: 19 DE DICIEMBRE DE 2019

ACTIVIDAD A RECIBIR	unidad	CANT.	APROBADO SI	APROBADO NO	OBSERVACIONES	
			SI	NO	LOCALIZACION	DESCRIPCION
Suministro, instalación y demarcación de pintura epóxica (poliuretano)	M2	599,27	X		SOTANO	CUARTOS MECANICOS (2), CUARTOS ELECTRICOS (2), CUARTOS TELECOMUNICACIONES (2), VIGILANCIA PARQUEADERO (1), CUARTO DE BOMBAS (1), DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO (1), SALA TECNICA (1)
					PISO 1	CUARTOS MECANICOS (2), CUARTOS ELECTRICOS (2), CUARTOS TELECOMUNICACIONES (2)
					PISO 2	CUARTOS MECANICOS (2), CUARTOS ELECTRICOS (2), CUARTOS TELECOMUNICACIONES (2)
					PISO 3	CUARTOS MECANICOS (2), CUARTOS ELECTRICOS (2), CUARTOS TELECOMUNICACIONES (2)
					PISO 4	CUARTOS MECANICOS (2), CUARTOS ELECTRICOS (2), CUARTOS TELECOMUNICACIONES (2)
					PISO 5	CUARTOS MECANICOS (2), CUARTOS ELECTRICOS (2), CUARTOS TELECOMUNICACIONES (2)
Suministro, aplicación y demarcación de pintura para parqueadero	ML	1.253,60	X		PARQUEADERO	PASOS PEATONALES Y REMARCADO PARQUEADEROS DE DISCAPACITADOS
Suministro e instalación de cinta antideslizante	ML	538,48	X		ACCESO PRINCIPAL EDIFICIO NEAA	
					ESCALERAS DE EMERGENCIA	LADO ORIENTAL Y LADO OCCIDENTAL
IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS		-				
Aplicación de sellante en uniones de flanches de tejado para evitar filtracion	ML	550,00	X		CUBIERTA	EN EL LADO OCCIDENTAL, LA MEDIDA REAL ES DE 125 MT, LADO NORTE 150 MT, LADO ORIENTAL 125 MT Y LADO SUR 150 MT, LOS CUALES FUERON INTERVENIDOS EN SU TOTALIDAD.
Aplicación de producto impermeabiilizante en pegues de flanches	ML	120,00	X		CUBIERTA	EN EL LADO OCCIDENTAL, LA MEDIDA REAL ES DE 20 MT, LADO NORTE 40 MT, LADO ORIENTAL 20 MT Y LADO SUR 40 MT, LOS CUALES FUERON INTERVENIDOS EN SU TOTALIDAD.
Impermeabilización de acuerdo con las especificaciones técnicas en canales superiores	ML	167,80	X		CUBIERTA	LA CANTIDAD IMPERMEABILIZADA ES MAYOR A LA CONTRATADA, DEBIDO A QUE EXISTIA UNA FILTRACION DE AGUA QUE AFECTABA EL BAÑO DE MUJERES DEL 5TO PISO. DICHA GOTERA ESTABA EN LA PLACA DE CONCRETO DE LA CUBIERTA Y NO EN LA CUBIERTA METALICA. SE APROBÓ EL ARREGLO DE DICHA FILTRACION, YA QUE HACIA PARTE PARA LA ENTREGA A SATISFACCION DE LA BATERIA DE BAÑOS DEL 5TO PISO
Limpieza y/o mantenimiento en canales y rejillas de bajantes retiro de material particulado	ML	155,00	X		CUBIERTA	EN EL LADO OCCIDENTAL, LA MEDIDA REAL ES DE 30 MT, LADO NORTE 47 MT, LADO ORIENTAL 30 MT Y LADO SUR 48 MT, LOS CUALES FUERON INTERVENIDOS EN SU TOTALIDAD.
Revision y /o instalación de flanches en tejas sueltas	UN	150,00	X		CUBIERTA	EN EL LADO OCCIDENTAL, LA MEDIDA REAL ES DE 30 MT, LADO NORTE 45 MT, LADO ORIENTAL 30 MT Y LADO SUR 45 MT, LOS CUALES FUERON INTERVENIDOS EN SU TOTALIDAD.
MANTENIMIENTO DE PUERTAS (inlcuye en general el desmonte reposición e instalación de piezas para el correcto funcionamiento)		-				
Desmonte de divisiones en vidrio y/o puertas	M2	-				
Desmonte y retiro de archivadores por cuerpos	UND	-				
Mantenimiento del barandal de escaleras y hall del edificio	ML	346,71	X		ESCALERAS DEL PUNTO FIJO DEL EDIFICIO NEAA DEL PISO 1 AL PISO 5, RAMPA DE ACCESO PRINCIPAL AL EDIFICIO NEAA, BARANDALES COSTADO NORTE DEL PISO 2 AL PISO 4	
suministro e instalacion de ventanas de inspeccion en fibrocemento. De 60 x 60	UND	338,00	X		PISO 5	TODO EL PISO 5

INVENTARIO DE RECIBO PARCIAL
CONTROL TECNICO EN OBRA

CONTRATO DE OBRA: 19001111 H4 de 2019

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL - NEAA Y NAA.

CONTRATISTA: CONSORCIO CRS

FECHA: 19 DE DICIEMBRE DE 2019

PISOS Y ZÓCALOS		-				
Desmonte, suministro e instalación de piso cerámica 60x60 cm	M2	-				
Sellamiento de juntas y fisuras entre adoquines con sello de arena en sendero peatonal NEAA - CEA	M2	**253,86**	X		PARQUEADERO	SENDERO PEATONAL FRENTE AL EDIFICIO Y ACCESO A PORTERIA
Sello y tratamiento de juntas de construccion o dilatacion en pisos	ML	-				
PAÑETES Y ENCHAPES		-				
Mantenimiento y/o aplicación de producto en juntas de dilatacion	M2	**83,80**	X		PISO 1	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 2	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 3	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 4	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 5	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
Resane de muros en general	M2	-				
Retiro de enchape de piletas lavatraperos.	M2	**22,00**	X		PISO 1	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 2	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 3	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 4	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 5	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
Suministro e instalación de enchape de piletas lavatraperos.	M2	**20,00**	X		PISO 1	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 2	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 3	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 4	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 5	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
CARPINTERIA		-				
Suministro e instalacion de cerrojo y bisagras para divisiones de baños	**UND**	-				
MANTENIMIENTO VIDRIOS Y VENTANERIA		-				
Revision y/o reparacion de paneles de encerramiento del balcon quinto piso incluye: cambio de tornilleria de presion si se requiere	M2	-				
Suministro e instalación de pie de amigo para recepción y repisas	UND	-				
Suministro e instralacion de Pelicula samblasteada con logo de la aerocivil para vidrios en zonas de acceso	M2	**65,74**	X		PISO 1	PUERTAS PRINCIPALES DE ACCESO EDIFICIO NEAA, SALA DE CORRESPONDENCIA, CAFETERIA, SALA DE JUNTAS, ARCHIVO
					PISO 2	PUERTAS DE ACCESO PRINCIPAL
					PISO 3	PUERTAS DE ACCESO PRINCIPAL
					PISO 4	PUERTAS DE ACCESO PRINCIPAL
					PISO 5	PUERTAS DE ACCESO PRINCIPAL, SALA DE JUNTAS COSTADO ORIENTAL
INFRAESTRUCTURA GENERAL		-				
Desmonte pared en superboard	M2	-				
Desmonte de divisiones en drywall	M2	-				
Mantenimiento pintura de puertas metal madera que icluye: tableros lamina de acero inoxidable visagras y marco en lámina.	M2	**31,57**	X		PISO 1	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 2	BAÑO MUJERES
					PISO 3	BAÑO MUJERES
					PISO 4	BAÑO MUJERES
					PISO 5	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
Suministro e instalación de guardaescobas en madera de acuerdo con las especificaciones tecnicas	ML	-				
Suministro e intalación de pasamanos anclado al piso de cauerdo a lo normado en escalera principal de acceso edificio NEAA	ML	**13,39**	X		ESCALERAS ACCESO EDIFICIO PRINCIPAL NEAA	
RED HIDRAULICA Y SANITARIA		-				
Desmonte, Suministro e Instalacion de Conexión Superior Orinales (incluye desmonte, limpieza y reinstalación de accesorios y aparato si se requiere.)	UND	-				
Desmonte, suministro e Instalacion de llave para pocetas	**UND**	-				
Destape de puntos sanitarios y/o lavamanos con sonda electrica.	UND	-				
Destape de cañeria de punto sanitario, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato si se requiere.	UND	-				
Mantenimiento y reparacion de Shut de Basuras	UND	-				

INVENTARIO DE RECIBO PARCIAL
CONTROL TECNICO EN OBRA

CONTRATO DE OBRA: 19001111 H4 de 2019

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL - NEAA Y NAA.

CONTRATISTA: CONSORCIO CRS

FECHA: 19 DE DICIEMBRE DE 2019

Suministro e instalación de tubería pvc 1/2 ", 3/4", 1 1/2 ", 1", 2"	ML	-				
REDES DE AGUAS NEGRAS (hervidas)		-				
Destape de cañeria de punto sanitario, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato si se requiere.	UND	**67,00**	X		PISO 1	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 2	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 3	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 4	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 5	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
Destape de cañeria de punto orinal, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato si se requiere.	UND	**21,00**	X		PISO 1	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 2	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 3	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 4	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 5	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
BATERIAS SANITARIAS Y ACCESORIOS EN BAÑOS		-				
Destape de cañeria de punto orinal, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato sanitario si se requiere	UND	-				
Mantenimiento de punto sanitarios	UND	-				
Mantenimiento de piletas lavatraperos ubicadas en las baterias de los baños, incluyen reemboquillado, enchape , cabmio de empaques en las llaves de salida	UND	-				
Mantenimiento general de las baterias sanitarias (incluye sanitarios, lavamanos, orinales,)	UND	**105,00**	X		PISO 1	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 2	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 3	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 4	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 5	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					ALMACEN	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES PISOS 1 Y 2
Suministro e instalación de fluxometros de cauerdo con las especificaciones tecnicas de los existentes	UND	**8,00**	X		PISO 1	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 2	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 3	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 4	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 5	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACION		-				
Mantenimiento tomas electricas de 110v y 220v	UND	**19,00**	X		PISO 1	6
					PISO 2	3
					PISO 3	8
					PISO 4	2
Revision y/o instalacion de puntos electricos con suministro de cableado conexiones, tomacorriente hasta garantizar el correcto funcionamiento	UND	**21,00**	X		PISO 1	COORDINACION DE VIGILANCIA (11), HALL DE ESCALERAS (1)
					PISO 3	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA (6)
Revisión y/o mantenimiento de calentadores electricos -Gimnacio y Direccion General	UND	-				
Revisión y/o mantenimiento de hornos eléctricos semiindustriales	UND	-				
Revision y/o mantenimineto de sensores eléctricos de orinales,	UND	-				
Revision y /o mantenimiento de secadores de manos en baños	UND	-				
Revision y /o mantenimiento aspiral luminoso electrico del edificio -alturas	UND	**1,00**	X		HALL DE ACCESO EDIFICIO NEAA	
Revision y/o mantenimiento del sistema de luminarias del parqueadero por fotoceldas	UND	-				
Revision y /o mantenimiento al punto de iluminacion de la imagen de la aerocivil, plasmada en la fachada del edificio	UND	**1,00**	X		FACHADA NORTE EDIFICIO NEAA	
Revision y /o mantenimiento a sensores de movimiento electricos de rutas de evacuacion	UND	-				
Revision y/o mantenimiento al sistema panel electrico cincronizado de riego de jardines por reloj	UND	-				

LOTE 1: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL -NEAA Y NAA.

FORMATO 7 - PROPUESTA ITEMS A COTIZAR

ITEM	CAPITULO Y ACTIVIDADES	UNIDADES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**DEMARCACION**				
1.2	Suministro, instalación y demarcación de pintura epóxica (poliuretano)	M2	650	$ 25.000	$ 16.250.000
1.3	Suministro, aplicación y demarcación de pintura para parqueadero	ML	320	$ 6.700	$ 2.144.000
1.4	Suministro e instalación de cinta antideslizante	ML	450	$ 10.000	$ 4.500.000
2	**IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS**				
2.1	Aplicación de sellante en uniones de flanches de tejado para evitar filtracion	ML	550	$ 60.000	$ 33.000.000
2.2	Aplicación de producto impermeabilizante en pegues de flanches	ML	120	$ 60.000	$ 7.200.000
2.3	Impermeabilización de acuerdo con las especificaciones técnicas en canales superiores	ML	155	$ 60.000	$ 9.300.000
2.4	Limpieza y/o mantenimiento en canales y rejillas de bajantes retiro de material particulado	ML	155	$ 60.000	$ 9.300.000
2.5	Revision y /o instalación de flanches en tejas sueltas	UN	150	$ 150.000	$ 22.500.000
3	**MANTENIMIENTO DE PUERTAS (inlcuye en general el desmonte reposición e instalación de piezas para el correcto funcionamiento)**				
3.1	Desmonte de divisiones en vidrio y/o puertas	M2	245	$ 50.000	$ 12.250.000
3.2	Desmonte y retiro de archivadores por cuerpos	UND	3	$ 120.000	$ 360.000
3.3	Mantenimiento del barandal de escaleras y hall del edificio	ML	145	$ 45.000	$ 6.525.000
3.4	suministro e instalacion de ventanas de inspeccion en fibrocemento. De 60 x 60	UND	260	$ 120.000	$ 31.200.000
3.5	Mantenimiento a estaciones o páneles de emergencias en lamina y vidrio	UND	24	$ 100.000	$ 2.400.000
3.6	Mantenimiento y / suministro e instalacion de chapas con manija en acero inxidable	UND	50	$ 140.000	$ 7.000.000
3.7	Mantenimiento de puertas oficinas privadas	UND	25	$ 95.000	$ 2.375.000
3.8	Suministro e instalación de chapa para puerta incluye dos llaves	UND	35	$ 130.000	$ 4.550.000
3.9	Suministro e instalación de chapa para escritorio, archivadores verticales y horizontales incluye dos llaves	UND	80	$ 65.000	$ 5.200.000
3.10	Instalación puertas existentes en vidrio de 8mm con marco de aluminio	M2	12	$ 150.000	$ 1.800.000
4	**PINTURA EXTERNA E INTERNA**				
4.1	Limpieza e impermeabilizacion de muros de alta resistencia con suministro e instalación de pintura vinilo tipo 1-3 manos incluye resane, filos y dilataciones, incluye pintura obras de remodelacion.	M2	800	$ 20.000	$ 16.000.000
4.2	Resane en filos y dilataciones y pintura si es el caso	ML	150	$ 8.100	$ 1.215.000
4.3	Resane y pintura vinilo tipo 1 en muro de Superboard interno y externo	M2	120	$ 16.000	$ 1.920.000
4.4	Suminsitro e instalación de pintura de muros exteriores con koraza dos manos, incluye rasqueteo de puntos con humedad, sello y aplicación de pintura color similar al existente.	M2	120	$ 20.000	$ 2.400.000
4.5	Suministro e instalacion Pintura cielo raso en vinilo, en baños	M2	150	$ 16.000	$ 2.400.000
4.6	Suministro e instalacion de Pintura cielo raso en vinilo, en baños	ML	75	$ 14.000	$ 1.050.000
5	**PISOS Y ZÓCALOS**				
5.1	Desmonte, suministro e instalación de piso cerámica 60x60 cm	M2	20	$ 65.000	$ 1.300.000
5.2	Sellamiento de juntas y fisuras entre adoquines con sello de arena en sendero peatonal NEAA - CEA	M2	200	$ 19.000	$ 3.800.000
5.3	Sello y tratamiento de juntas de construccion o dilatacion en pisos	ML	100	$ 100.000	$ 10.000.000
6	**PAÑETES Y ENCHAPES**				
6.1	Mantenimiento y/o aplicación de producto en juntas de dilatacion	M2	40	$ 25.000	$ 1.000.000
6.2	Resane de muros en general	M2	40	$ 16.000	$ 640.000
6.3	Retiro de enchape de piletas lavatraperos.	M2	20	$ 15.000	$ 300.000
6.4	Suministro e instalación de enchape de piletas lavatraperos.	M2	20	$ 50.000	$ 1.000.000
7	**CARPINTERIA**				
7.1	Suministro e instalacion de cerrojo y bisagras para divisiones de baños	UND	20	$ 60.000	$ 1.200.000
8	**MANTENIMIENTO VIDRIOS Y VENTANERIA**				
8.2	Revision y/o reparacion de paneles de encerramiento del balcon quinto piso incluye cambio de tornilleria de presion si se requiere	M2	40	$ 55.000	$ 2.200.000
8.3	Suministro e instalación de pie de amigo para recepción y repisas	UND	40	$ 48.000	$ 1.920.000
8.4	Suministro e instralacion de Pelicula samblasteada con logo de la aerocivil para vidrios en zonas de acceso	M2	30	$ 70.000	$ 2.100.000
9	**INFRAESTRUCTURA GENERAL**				
9.1	Desmonte pared en superboard	M2	5	$ 10.000	$ 50.000
9.2	Desmonte de divisiones en drywall	M2	10	$ 10.000	$ 100.000
9.3	Mantenimiento pintura de puertas metal madera que icluye tableros lamina de acero inoxidable visagras y marco en lámina.	M2	12	$ 80.000	$ 960.000
9.4	Suministro e instalación de guardaescobas en madera de acuerdo con las especificaciones tecnicas	ML	50	$ 40.000	$ 2.000.000
9.5	Suministro e intalación de pasamanos anclado al piso de cauerdo a lo normado en escalera principal de acceso edificio NEAA	ML	16	$ 577.000	$ 9.232.000
10	**RED HIDRAULICA Y SANITARIA**				
10.1	Desmonte, Suministro e Instalacion de Conexión Superior Orinales (incluye desmonte, limpieza y reinstalación de accesorios y aparato si se requiere.)	UND	8	$ 150.000	$ 1.200.000
10.2	Desmonte, suministro e Instalacion de llave para pocetas	UND	12	$ 55.000	$ 660.000

LOTE 1: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL -NEAA Y NAA.

FORMATO 7 - PROPUESTA ITEMS A COTIZAR

ITEM	CAPITULO Y ACTIVIDADES	UNIDADES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10.3	Destape de puntos sanitarios y/o lavamanos con sonda electrica.	UND	14	$ 60.000	$ 840.000
10.4	Destape de cañeria de punto sanitario, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato si se requiere.	UND	4	$ 70.000	$ 280.000
10.5	Mantenimiento y reparacion de Shut de Basuras	UND	1	$ 3.000.000	$ 3.000.000
10.6	Mantenimiento de cajas de inspección en general de aguas lluvias y aguas hervidas incluye retiro de lodos hasta botadero certificado	UND	18	$ 250.000	$ 4.500.000
10.7	Mantenimiento de sifones	UND	46	$ 30.000	$ 1.380.000
10.8	Mantenimiento llaves tipo ganso para cafeterias y comedor institucional	UND	6	$ 80.000	$ 480.000
10.9	Mantenimiento y puesta a punto el sistema de riego de cuadros vivos de jardineria	UND	1	$ 900.000	$ 900.000
10.10	Mantenimiento divisiones y puertas de acero inxidable de baños	M2	8	$ 100.000	$ 800.000
10.11	Mantenimiento de válvula sanitaria	UND	16	$ 50.000	$ 800.000
10.12	Mantenimiento de conexiones de pared a sanitario.	ML	14	$ 60.000	$ 840.000
10.13	Mantenimiento de la tubería y cajas de inspección	ML	40	$ 106.000	$ 4.240.000
10.14	Mantenimiento de drenajes y disposición final certificado evacuación lodos con equipo adecuado para esta labor	ML	40	$ 106.000	$ 4.240.000
10.15	Mantenimiento de tuberia interna desde el contador avenida principal calle 26	ML	1	$ 4.500.000	$ 4.500.000
10.16	Mantenimiento de tuberia PVC de 2/1" de acometida al tanque	ML	28	$ 40.000	$ 1.120.000
10.17	Mantenimiento de tuberia colgante con limpieza y traslado de lodos hasta botadero certificado	ML	1	$ 5.500.000	$ 5.500.000
10.18	Revision y/o fijacion de tuberia colgante con abrasadera metalica x golpe de ariete	ML	100	$ 40.000	$ 4.000.000
10.19	Retiro y /o adecuacion de ventanas de baños para ventilacion	UND	10	$ 70.000	$ 700.000
10.20	Suministro e instalacion de llave ahorradora de paso de agua en piletas y areas externas	UND	4	$ 200.000	$ 800.000
10.21	Suministro e instalacion de registro de paso de agua en PVC 1/2,-1/3,-1/4,-1/4	UND	12	$ 18.000	$ 216.000
10.22	Suministro e Instalacion de bizcocho sanitario	UND	8	$ 80.000	$ 640.000
10.23	Suministro e instalación de tuberia PVC de 2/1" de acometida al tanque	ML	12	$ 65.000	$ 780.000
10.24	Suministro e instalación de sifones con retenedor de olores en baños	UND	14	$ 95.000	$ 1.330.000
10.25	Suministro e instalacion de dispensador de jabon para manos en baños	UND	12	$ 120.000	$ 1.440.000
10.26	Suministro e instalación llaves tipo ganso para cafeterias y comedor institucional	UND	6	$ 170.000	$ 1.020.000
10.27	Suministro e instalación de tapa registros	UND	22	$ 20.000	$ 440.000
11	**RED DE AGUA POTABLE**				
11.1	Demolición regata lineal para instalar tubería, en piso, y en pared	ML	20	$ 18.000	$ 360.000
11.2	Mantenimiento correctivo de tubería (incluye demolición de muro e instalación de tuberia y accesorios)	UND	4	$ 200.000	$ 800.000
11.3	Suministro e instalación de tubería pvc 1/2 ", 3/4", 1 1/2 ", 1", 2"	ML	16	$ 19.000	$ 304.000
12	**REDES DE AGUAS NEGRAS (hervidas)**				
12.1	Destape de cañeria de punto sanitario, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato si se requiere.	UND	14	$ 150.000	$ 2.100.000
12.2	Destape de cañeria de punto orinal, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato si se requiere.	UND	10	$ 150.000	$ 1.500.000
13	**BATERIAS SANITARIAS Y ACCESORIOS EN BAÑOS**				
13.1	Destape de cañeria de punto orinal, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato sanitario si se requiere	UND	16	$ 150.000	$ 2.400.000
13.2	Mantenimiento de punto sanitarios	UND	16	$ 80.000	$ 1.280.000
13.3	Mantenimiento de piletas lavatraperos ubicadas en las baterias de los baños, incluyen reemboquillado, enchape , cabmio de empaques en las llaves de salida	UND	20	$ 90.000	$ 1.800.000
13.4	Mantenimiento general de las baterias sanitarias (incluye sanitarios, lavamanos, orinales,)	UND	85	$ 150.000	$ 12.750.000
13.5	Suministro e instalación de fluxometros de cauerdo con las especificaciones tecnicas de los existentes	UND	16	$ 800.000	$ 12.800.000
14	**SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACION**				
14.1	Mantenimiento tomas electricas de 110v y 220v	UND	120	$ 11.000	$ 1.320.000
14.2	Revision y/o instalacion de puntos electricos con suministro de cableado conexiones, tomacorriente hasta garantizar el correcto funcionamiento	UND	34	$ 100.000	$ 3.400.000
14.3	Revisión y/o mantenimiento de calentadores electricos -Gimnacio y Direccion General	UND	1	$ 300.000	$ 300.000
14.4	Revisión y/o mantenimiento de hornos eléctricos semiindustriales	UND	6	$ 150.000	$ 900.000
14.5	Revision y/o mantenimineto de sensores eléctricos de orinales,	UND	8	$ 120.000	$ 960.000
14.6	Revision y /o mantenimiento de secadores de manos en baños	UND	6	$ 70.000	$ 420.000
14.7	Revision y /o mantenimiento aspiral luminoso electrico del edificio -alturas	UND	1	$ 2.000.000	$ 2.000.000
14.8	Revision y/o mantenimiento del sistema de luminarias del parqueadero por fotoceldas	UND	1	$ 3.000.000	$ 3.000.000
14.9	Revision y /o mantenimiento al punto de iluminacion de la imagen de la aerocivil, plasmada en la fachada del edificio	UND	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000
14.10	Revision y /o mantenimiento a sensores de movimiento electricos de rutas de evacuacion	UND	36	$ 35.000	$ 1.260.000
14.11	Revision y/o mantenimiento al sistema panel electrico cincronizado de riego de jardines por reloj	UND	1	$ 2.000.000	$ 2.000.000
14.12	Retiro y/o suministro e instalacion de luminarias tipo led de 60 x 60	UND	200	$ 160.000	$ 32.000.000
14.13	Retiro y/o suministro e instalacion de luminarias tipo led de circunferencia 18/ ml,	UND	70	$ 160.000	$ 11.200.000
14.14	Suministro e instalacion luminarias de emergencia tipo Mikey incluye retiro de las existentes que se encuentren fuera deservicio	UND	30	$ 150.000	$ 4.500.000

LOTE 1: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL -NEAA Y NAA.

FORMATO 7 - PROPUESTA ITEMS A COTIZAR

ITEM	CAPITULO Y ACTIVIDADES	UNIDADES	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
14.15	Suministro e instalación de lámparas tipo led acrilica de sobreponer de 1.20 m de acuerdo a nomra archivistica	UND	20	$ 150.000	$ 3.000.000
14.16	Suministro e instalación de bombillo ahorardores de rosca tipo led	UND	30	$ 30.000	$ 900.000
14.17	Suminuistro e instalación luminaria tipo tubo de 1.20 m2, -archivo	UND	30	$ 150.000	$ 4.500.000
14.18	Suministro e instalación de canaleta PVC y cableado para punto electrico.	UND	30	$ 70.000	$ 2.100.000
14.19	Revision y /o suministro e instalacion de tomacorrientes que se encuentren en mal estado	UND	100	$ 50.000	$ 5.000.000
15	**SISTEMA DE CONTRAINCENDIO**				
15.1	Realizar la prueba de desempeño de las unidades de bombeo y verificar frente a la curva de aceptación de la bomba si cumple con lo solicitado por la norma NFPA 20 en su edición vigente.	UND	2	$ 9.000.000	$ 18.000.000
16	**VARIOS**				
16.1	Diagnóstico general de la infraestructura del edificio NEEA (Pisos 6 y 1 sótano, areas comunes y parqueadero)	UND	1	$ 20.000.000	$ 20.000.000
16.2	Diagnóstico general de la infraestructura del edificio NAA (Pisos 2 , bodegas y parqueadero	UND	1	$ 15.000.000	$ 15.000.000
16.3	Diagnóstico general del sistema de red contraincendios	UND	2	$ 8.000.000	$ 16.000.000
16.4	Diagnóstico general del sistema BMS Andover	UND	1	$ 8.000.000	$ 8.000.000
16.5	Diagnóstico general del sistema de sonido ambiental y emergencia	UND	1	$ 6.000.000	$ 6.000.000
16.6	Diagnóstico general del sistema de Control de Acceso	UND	1	$ 6.000.000	$ 6.000.000
16.7	Diagnóstico general del sistema de climatización	UND	1	$ 6.000.000	$ 6.000.000
16.8	Diagnóstico general de planta eléctrica	UND	1	$ 3.000.000	$ 3.000.000
	SUBTOTAL				$ 501.141.000,0
	ADMINSTRACION	21%			$ 105.239.610,0
	IMPREVISTOS	1%			$ 5.011.410,0
	UTILIDAD	5%			$ 25.057.050,0
	AIU	27%			$ 135.308.070,0
	IVA	19%			$ 4.760.840,0
	TOTAL				**$ 641.209.910,0**

CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL
Representante Legal
CONSORCIO CRS

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL -NEAA Y NAA.

CONTRATO DE OBRA: 19001111 H4 de 2019

FECHA INICIAL: 24 DE OCTUBRE DE 2019

PLAZO FINAL: HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2019

PLAZO ADICIONAL:

VALOR INICIAL: $641.209.910,00 INCLUIDO IVA

VALOR ADICIONAL: INCLUIDO IVA

VALOR FINAL: $641.209.910,00 INCLUIDO IVA

ACTA PARCIAL DE OBRA No.1
(Periodo comprendido entre el 25 de noviembre de 2019 al 16 de diciembre de 2019)

CONTRATISTA:
CONSORCIO CRS

16/12/2019

ITEMS	DESCRIPCION	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS				CANTIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO ANTERIOR (No. 1)		CANTIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO ACTUAL No. 2		ACUMULADO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL	UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
1	**DEMARCACION**															
1.2	Suministro, instalación y demarcación de pintura epoxica (poliuretano)	M2	650	$ 25.000	$ 16.250.000	M2	536,49	$ 25.000	$ 13.412.125	355,65	8.891.250,00	243,62	6.090.500,00	599,27	$ 14.981.750,00	111,70%
1.3	Suministro, aplicacion y demarcación de pintura para parqueadero	ML	320	$ 6.700	$ 2.144.000	ML	1253,60	$ 6.700	$ 8.399.120	1.253,60	8.399.120,00		-	1.253,60	$ 8.399.120,00	100,00%
1.4	Suministro e instalación de cinta antideslizante	ML	450	$ 10.000	$ 4.500.000	ML	538,48	$ 10.000	$ 5.384.800	538,48	5.384.800,00		-	538,48	$ 5.384.800,00	100,00%
2	**IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS**														$ -	
2.1	Aplicación de sellante en uniones de flanches de tejas para evitar filtracion	ML	550	$ 60.000	$ 33.000.000	ML	550	$ 60.000	$ 33.000.000		-	550,00	33.000.000,00	550,00	$ 33.000.000,00	100,00%
2.2	Aplicación de producto impermeabilizante en pegue de flanches	ML	120	$ 60.000	$ 7.200.000	ML	120	$ 60.000	$ 7.200.000		-	120,00	7.200.000,00	120,00	$ 7.200.000,00	100,00%
2.3	Impermeabilización de acuerdo con las especificaciones técnicas en canales superiores	ML	155	$ 60.000	$ 9.300.000	ML	155	$ 60.000	$ 9.300.000		-	167,80	10.068.000,00	167,80	$ 10.068.000,00	108,26%
2.4	Limpieza y/o mantenimiento en canales y rejillas de bajantes retiro de material particulado	ML	155	$ 60.000	$ 9.300.000	ML	155	$ 60.000	$ 9.300.000		-	155,00	9.300.000,00	155,00	$ 9.300.000,00	100,00%
2.5	Revision y /o instalación de flanches en tejas sueltas	UN	150	$ 150.000	$ 22.500.000	UN	150	$ 150.000	$ 22.500.000		-	150,00	22.500.000,00	150,00	$ 22.500.000,00	100,00%
3	**MANTENIMIENTO DE PUERTAS (inlcuye en general desmonte reposición e instalación de piezas para el correcto funcionamiento)**														$ -	
3.1	Desmonte de divisiones en vidrio y/o puertas	M2	245	$ 50.000	$ 12.250.000	M2	0	$ 50.000	$ -		-		-	-	$ -	0,00%
3.2	Desmonte y retiro de archivadores por cuerpos	UND	3	$ 120.000	$ 360.000	UND	3	$ 120.000	$ 360.000	3,00	360.000,00	- 3,00	- 360.000,00	-	$ -	0,00%
3.3	Mantenimiento del barandal de escaleras y hall del edificio	ML	145	$ 45.000	$ 6.525.000	ML	346,71	$ 45.000	$ 15.601.950	346,71	15.601.950,00		-	346,71	$ 15.601.950,00	100,00%
3.4	suministro e instalacion de ventanas de inspeccion en fibrocemento, De 60 x 60	UND	260	$ 120.000	$ 31.200.000	UND	332	$ 120.000	$ 39.840.000	308,00	36.960.000,00	30,00	3.600.000,00	338,00	$ 40.560.000,00	101,81%
3.5	Mantenimiento a estaciones o paneles de emergencia en lamina y vidrio	UND	24	$ 100.000	$ 2.400.000	UND	24	$ 100.000	$ 2.400.000		-		-	-	$ -	0,00%
3.6	Mantenimiento y / suministro e instalacion de chapas con manija en acero inxidable	UND	50	$ 140.000	$ 7.000.000	UND	50	$ 140.000	$ 7.000.000		-	50,00	7.000.000,00	50,00	$ 7.000.000,00	100,00%
3.7	Mantenimiento de puertas oficinas privadas	UND	25	$ 95.000	$ 2.375.000	UND	25	$ 95.000	$ 2.375.000		-	8,00	760.000,00	8,00	$ 760.000,00	32,00%
3.8	Suministro e instalación de chapa para puerta incluye dos llaves	UND	35	$ 130.000	$ 4.550.000	UND	35	$ 130.000	$ 4.550.000		-	35,00	4.550.000,00	35,00	$ 4.550.000,00	100,00%
3.9	Suministro e instalación de chapa para escritorio, archivadores verticales y horizontales incluye dos llaves	UND	80	$ 65.000	$ 5.200.000	UND	80	$ 65.000	$ 5.200.000		-	80,00	5.200.000,00	80,00	$ 5.200.000,00	100,00%
3.10	Instalación puertas existentes en vidrio de 8mm con marco de aluminio	M2	12	$ 150.000	$ 1.800.000	M2	0	$ 150.000	$ -		-		-	-	$ -	0,00%
4	**PINTURA EXTERNA E INTERNA**														$ -	
4.1	Limpieza e impermeabilizacion de muros de alta resistencia con suministro e instalación de pintura vinilo tipo 1-3 manos incluye resane, filos y dilataciones, incluye pintura obras de remodelacion.	M2	800	$ 20.000	$ 16.000.000	M2	800	$ 20.000	$ 16.000.000	358,56	7.171.200,00	342,19	6.843.800,00	700,76	$ 14.015.000,00	87,59%
4.2	Resane en filos y dilataciones y pintura si es el caso	ML	150	$ 8.100	$ 1.215.000	ML	695,88	$ 8.100	$ 5.636.635	129,17	1.046.277,00	440,45	3.567.645,00	569,62	$ 4.613.922,00	81,86%
4.3	Resane y pintura vinilo tipo 1 en muro de Superboard interno y externo	M2	120	$ 16.000	$ 1.920.000	M2	120	$ 16.000	$ 1.920.000		-	584,98	9.359.680,00	584,98	$ 9.359.680,00	487,48%
4.4	Suministro e instalación de pintura de muros exteriores con koraza dos manos, incluye rasqueteo de puntos con humedad, sello y aplicación de pintura color similar al existente.	M2	120	$ 20.000	$ 2.400.000	M2	120	$ 20.000	$ 2.400.000	78,59	1.631.800,00	52,43	1.048.600,00	129,02	$ 2.580.400,00	107,52%
4.5	Suministro e instalacion Pintura cielo raso en vinilo, en baños	M2	150	$ 16.000	$ 2.400.000	M2	450	$ 16.000	$ 7.200.000	40,00	640.000,00	440,10	7.041.600,00	480,10	$ 7.681.600,00	106,69%
4.6	Suministro e instalacion de Pintura cielo raso en vinilo en baños	ML	75	$ 14.000	$ 1.050.000	ML	75	$ 14.000	$ 1.050.000		-	922,82	12.919.480,00	922,82	$ 12.919.480,00	1230,43%
5	**PISOS Y ZÓCALOS**														$ -	
5.1	Desmonte, suministro e instalación de piso cerámica 60x60 cm	M2	20	$ 65.000	$ 1.300.000	M2	5	$ 65.000	$ 325.000		-		-	-	$ -	0,00%
5.2	Sellamiento de juntas y fisuras entre adoquines con sello de arena en sendero peatonal NEAA - CEA	M2	200	$ 19.000	$ 3.800.000	M2	253,86	$ 19.000	$ 4.823.340	253,86	4.823.340,00		-	253,86	$ 4.823.340,00	100,00%
5.3	Sello y tratamiento de juntas de construccion o dilatacion en pisos	ML	100	$ 100.000	$ 10.000.000	ML	0	$ 100.000	$ -		-		-	-	$ -	0,00%
6	**PAÑETES Y ENCHAPES**														$ -	
6.1	Mantenimiento y/o aplicación de producto en juntas de dilatacion	M2	40	$ 25.000	$ 1.000.000	M2	40	$ 25.000	$ 1.000.000	6,76	169.000,00	77,04	1.926.000,00	83,80	$ 2.095.000,00	209,50%
6.2	Resane de muros en general	M2	40	$ 16.000	$ 640.000	M2	40	$ 16.000	$ 640.000		-		-	-	$ -	0,00%
6.3	Retiro de enchape de piletas lavatrapeiros	M2	20	$ 15.000	$ 300.000	M2	20	$ 15.000	$ 300.000	2,00	30.000,00	20,00	300.000,00	22,00	$ 330.000,00	110,00%
6.4	Suministro e instalación de enchape de piletas lavatrapeiros	M2	20	$ 50.000	$ 1.000.000	M2	20	$ 50.000	$ 1.000.000		-	20,00	1.000.000,00	20,00	$ 1.000.000,00	100,00%
7	**CARPINTERIA**														$ -	
7.1	Suministro e instalacion de cerrojo y bisagras para divisiones de baños	UND	20	$ 60.000	$ 1.200.000	UND	0	$ 60.000	$ -		-		-	-	$ -	0,00%
8	**MANTENIMIENTO VIDRIOS Y VENTANERIA**														$ -	
8.2	Revision y/o reparacion de paneles de encerramiento del balcon quinto piso incluye: cambio de tornilleria de presion si se requiere	M2	40	$ 55.000	$ 2.200.000	M2	0	$ 55.000	$ -		-		-	-	$ -	0,00%
8.3	Suministro e instalación de pie de amigo para recepción y rejillas	UND	40	$ 48.000	$ 1.920.000	UND	40	$ 48.000	$ 1.920.000		-		-	-	$ -	0,00%
8.4	Suministro e instalacion de Película samblasteada con logo de la aerocivil para vidrios en zonas de acceso	M2	80	$ 70.000	$ 2.100.000	M2	12	$ 70.000	$ 840.000		-	65,74	4.601.800,00	65,74	$ 4.601.800,00	547,83%
9	**INFRAESTRUCTURA GENERAL**														$ -	
9.1	Desmonte pared en superboard	M2	5	$ 10.000	$ 50.000	M2	5	$ 10.000	$ 50.000		-		-	-	$ -	0,00%
9.2	Desmonte de divisiones en drywall	M2	10	$ 10.000	$ 100.000	M2	0	$ 10.000	$ -		-		-	-	$ -	0,00%
9.3	Mantenimiento pintura de puertas metal madera que icluye: tableros lamina de acero inoxidable visagras y marco en lámina.	M2	12	$ 80.000	$ 960.000	M2	12	$ 80.000	$ 960.000		-	31,57	2.525.600,00	31,57	$ 2.525.600,00	263,08%
9.4	Suministro e instalación de guardaescobas en madera de acuerdo con las especificaciones tecnicas	ML	50	$ 40.000	$ 2.000.000	ML	50	$ 40.000	$ 2.000.000		-		-	-	$ -	0,00%
9.5	Suministro e instalacion de pasamanos anclado al piso de cauerdo a lo normado en escalera principal de acceso edificio NEAA	ML	16	$ 577.000	$ 9.232.000	ML	13,39	$ 577.000	$ 7.726.030	13,39	7.726.030,00		-	13,39	$ 7.726.030,00	100,00%
10	**RED HIDRAULICA Y SANITARIA**														$ -	
10.1	Desmonte, Suministro e Instalacion de Conexión Superior Orinales (incluye desmonte, limpieza y reinstalación de accesorios y aparato si se requiere.)	UND	8	$ 150.000	$ 1.200.000	UND	19	$ 150.000	$ 2.850.000		-		-	-	$ -	0,00%
10.2	Desmonte, suministro e Instalacion de llave para poceras	UND	12	$ 55.000	$ 660.000	UND	0	$ 55.000	$ -		-		-	-	$ -	0,00%
10.3	Destape de puntos sanitarios y/o lavamanos con sonda electrica.	UND	14	$ 60.000	$ 840.000	UND	6	$ 60.000	$ 360.000		-		-	-	$ -	0,00%
10.4	Destape de cañeria de punto sanitario, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato si se requiere.	UND	4	$ 70.000	$ 280.000	UND	0	$ 70.000	$ -		-		-	-	$ -	0,00%
10.5	Mantenimiento y reparacion de Shut de Basuras	UND	1	$ 3.000.000	$ 3.000.000	UND	0	$ 3.000.000	$ -		-		-	-	$ -	0,00%
10.6	Mantenimiento de cajas de inspección en general de aguas lluvias y aguas hervidas incluye retiro de lodos hasta botadero certificado	UND	18	$ 250.000	$ 4.500.000	UND	18	$ 250.000	$ 4.500.000	12,00	3.000.000,00		-	12,00	$ 3.000.000,00	66,67%
10.7	Mantenimiento de sifones	UND	46	$ 30.000	$ 1.380.000	UND	0	$ 30.000	$ -		-		-	-	$ -	0,00%
10.8	Mantenimiento llaves tipo ganso para cafeterias y comedor institucional	UND	6	$ 80.000	$ 480.000	UND	0	$ 80.000	$ -		-		-	-	$ -	0,00%
10.9	Mantenimiento y puesta a punto el sistema de riego en cuadros vivos de jardineria	UND	1	$ 900.000	$ 900.000	UND	0	$ 900.000	$ -		-		-	-	$ -	0,00%
10.10	Mantenimiento divisiones y puertas de acero inoxidable de baños	M2	8	$ 100.000	$ 800.000	M2	97,77	$ 100.000	$ 9.777.000	97,77	9.777.000,00		-	97,77	$ 9.777.000,00	100,00%
10.11	Mantenimiento de válvula sanitaria	UND	16	$ 50.000	$ 800.000	UND	0	$ 50.000	$ -		-		-	-	$ -	0,00%
10.12	Mantenimiento de conexiones de pared a sanitario	ML	14	$ 60.000	$ 840.000	ML	0	$ 60.000	$ -		-		-	-	$ -	0,00%
10.13	Mantenimiento de la tuberia y cajas de inspección	ML	40	$ 106.000	$ 4.240.000	ML	40	$ 106.000	$ 4.240.000		-	28,43	3.013.580,00	28,43	$ 3.013.580,00	71,08%

GRA

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL -NEAA Y NAA.

CONTRATO DE OBRA: 19001111 H4 de 2019

FECHA INICIAL: 24 DE OCTUBRE DE 2019
PLAZO FINAL: HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2019
PLAZO ADICIONAL:

VALOR INICIAL: $641.209.910,00 INCLUIDO IVA
VALOR ADICIONAL:
INCLUIDO IVA
VALOR FINAL: $641.209.910,00 INCLUIDO IVA

ACTA PARCIAL DE OBRA No.1
(Periodo comprendido entre el 25 de noviembre de 2019 al 16 de diciembre de 2019)
CONTRATISTA:
CONSORCIO CRS

16/12/2019

ITEMS	DESCRIPCION	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS				CANTIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO ANTERIOR (No. 1)		CANTIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO ACTUAL No. 2		ACUMULADO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL	UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
10.14	Mantenimiento de drenajes y disposición final certificado evacuación lodos con equipo adecuado para esta labor	ML	40	$ 106.000	$ 4.240.000	ML	40	$ 106.000	$ 4.240.000		-		-	-	$ -	0,00%
10.15	Mantenimiento de tuberia interna desde el contador avenida principal calle 26	ML	1	$ 4.500.000	$ 4.500.000	ML	0	$ 4.500.000	$ -		-		-	-	$ -	0,00%
10.16	Mantenimiento de tuberia PVC de 2/1" de acometida al tanque	ML	28	$ 40.000	$ 1.120.000	ML	0	$ 40.000	$ -		-		-	-	$ -	0,00%
10.17	Mantenimiento de tuberia colgante con limpieza y traslado de lodos hasta botadero certificado	ML	1	$ 5.500.000	$ 5.500.000	ML	1	$ 5.500.000	$ 5.500.000		-	1,00	5.500.000,00	1,00	$ 5.500.000,00	100,00%
10.18	Revision y/o fijacion de tuberia colgante con abrazadera metalica x golpe de ariete	ML	100	$ 40.000	$ 4.000.000	ML	0	$ 40.000	$ -		-		-	-	$ -	0,00%
10.19	Retiro y /o adecuacion de ventanas de baños para ventilacion	UND	10	$ 70.000	$ 700.000	UND	10	$ 70.000	$ 700.000	10,00	700.000,00		-	10,00	$ 700.000,00	100,00%
10.20	Suministro e instalacion de llave ahorradora de paso de agua en pileta y areas externas	UND	4	$ 200.000	$ 800.000	UND	0	$ 200.000	$ -		-	7,00	1.400.000,00	7,00	$ 1.400.000,00	0,00%
10.21	Suministro e instalacion de registro de paso de agua en PVC 1/2,-1/3,-1/4,-1/4	UND	12	$ 18.000	$ 216.000	UND	0	$ 18.000	$ -		-		-	-	$ -	0,00%
10.22	Suministro e instalacion de bizcocho sanitario	UND	8	$ 80.000	$ 640.000	UND	4	$ 80.000	$ 320.000		-	5,00	400.000,00	5,00	$ 400.000,00	125,00%
10.23	Suministro e instalación de tuberia PVC de 2/1" de acometida al tanque	ML	12	$ 65.000	$ 780.000	ML	0	$ 65.000	$ -		-		-	-	$ -	0,00%
10.24	Suministro e instalación de sifones con retenedor de olores en baños	UND	14	$ 95.000	$ 1.330.000	UND	0	$ 95.000	$ -		-		-	-	$ -	0,00%
10.25	Suministro e instalacion de dispensador de jabon para manos en baños	UND	12	$ 120.000	$ 1.440.000	UND	12	$ 120.000	$ 1.440.000		-		-	-	$ -	0,00%
10.26	Suministro e instalación llaves tipo ganso para cafeteras y comedor institucional	UND	6	$ 170.000	$ 1.020.000	UND	0	$ 170.000	$ -		-		-	-	$ -	0,00%
10.27	Suministro e instalación de tapa registros	UND	22	$ 20.000	$ 440.000	UND	22	$ 20.000	$ 440.000	22,00	440.000,00		-	22,00	$ 440.000,00	100,00%
11	**RED DE AGUA POTABLE**														$ -	
11.1	Demolición regata lineal para instalar tuberia, en piso y en pared	ML	20	$ 18.000	$ 360.000	ML	0	$ 18.000	$ -		-		-	-	$ -	0,00%
11.2	Mantenimiento correctivo de tuberia (incluye demolición de muro e instalación de tuberia y accesorios)	UND	4	$ 200.000	$ 800.000	UND	124	$ 200.000	$ 24.800.000	124,00	24.800.000,00	- 19,53	- 3.906.052,00	104,47	$ 20.893.948,00	84,25%
11.3	Suministro e instalación de tuberia pvc 1/2 ", 3/4", 1 1/2 ", 1", 2"	ML	16	$ 19.000	$ 304.000	ML	0	$ 19.000	$ -		-		-	-	$ -	0,00%
12	**REDES DE AGUAS NEGRAS (hervidas)**														$ -	
12.1	Destape de cañeria de punto sanitario, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato si se requiere.	UND	14	$ 150.000	$ 2.100.000	UND	62	$ 150.000	$ 9.300.000	62,00	9.300.000,00	5,00	750.000,00	67,00	$ 10.050.000,00	108,06%
12.2	Destape de cañeria de punto orinal, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato si se requiere	UND	10	$ 150.000	$ 1.500.000	UND	19	$ 150.000	$ 2.850.000	19,00	2.850.000,00	2,00	300.000,00	21,00	$ 3.150.000,00	110,53%
13	**BATERIAS SANITARIAS Y ACCESORIOS EN BAÑOS**														$ -	
13.1	Destape de cañeria de punto orinal, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato sanitario si se requiere	UND	16	$ 150.000	$ 2.400.000	UND	0	$ 150.000	$ -		-		-	-	$ -	0,00%
13.2	Mantenimiento de punto sanitarios	UND	16	$ 80.000	$ 1.280.000	UND	0	$ 80.000	$ -		-		-	-	$ -	0,00%
13.3	Mantenimiento de piletas lavatraperos ubicadas en las baterias de los baños, incluyen reemboquillado, enchape , cabmio de empaques en llaves de salida	UND	20	$ 90.000	$ 1.800.000	UND	0	$ 90.000	$ -		-		-	-	$ -	0,00%
13.4	Mantenimiento general de las baterias sanitarias (incluye sanitarios, lavamanos, orinales,)	UND	85	$ 150.000	$ 12.750.000	UND	100	$ 150.000	$ 15.000.000	100,00	15.000.000,00	5,00	750.000,00	105,00	$ 15.750.000,00	105,00%
13.5	Suministro e instalación de fluxometros de cambio con las especificaciones tecnicas de los existentes	UND	16	$ 800.000	$ 12.800.000	UND	6	$ 800.000	$ 4.800.000	6,00	4.800.000,00	2,00	1.600.000,00	8,00	$ 6.400.000,00	133,33%
14	**SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACION**														$ -	
14.1	Mantenimiento tomas electricas de 110v y 220v	UND	120	$ 11.000	$ 1.320.000	UND	120	$ 11.000	$ 1.320.000		-	19,00	209.000,00	19,00	$ 209.000,00	15,83%
14.2	Revision y/o instalacion de puntos electricos con suministro de cableado conexiones, tomacorriente hasta garantizar el correcto funcionamiento	UND	34	$ 100.000	$ 3.400.000	UND	34	$ 100.000	$ 3.400.000	3,00	300.000,00	18,00	1.800.000,00	21,00	$ 2.100.000,00	61,76%
14.3	Revisión y/o mantenimiento de calentadores electricos -Gimnacio y Direccion General	UND	1	$ 300.000	$ 300.000	UND	4	$ 300.000	$ 1.200.000		-		-	-	$ -	0,00%
14.4	Revisión y/o mantenimiento de hornos eléctricos semi industriales	UND	6	$ 150.000	$ 900.000	UND	6	$ 150.000	$ 900.000		-		-	-	$ -	0,00%
14.5	Revision y/o mantenimineto de sensores eléctricos de orinales,	UND	8	$ 120.000	$ 960.000	UND	8	$ 120.000	$ 960.000		-		-	-	$ -	0,00%
14.6	Revision y /o mantenimiento de secadores de manos baños	UND	6	$ 70.000	$ 420.000	UND	6	$ 70.000	$ 420.000		-		-	-	$ -	0,00%
14.7	Revision y /o mantenimiento aspiral luminoso electrico del edificio -alturas	UND	1	$ 2.000.000	$ 2.000.000	UND	1	$ 2.000.000	$ 2.000.000		-	1,00	2.000.000,00	1,00	$ 2.000.000,00	100,00%
14.8	Revision y/o mantenimiento del sistema de luminaria del parqueadero por fotoceldas	UND	1	$ 3.000.000	$ 3.000.000	UND	0	$ 3.000.000	$ -		-		-	-	$ -	0,00%
14.9	Revision y /o mantenimiento al punto de iluminacion de la imagen de la aerocivil, plasmada en la fachada del edificio	UND	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000	UND	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000		-	1,00	1.000.000,00	1,00	$ 1.000.000,00	100,00%
14.10	Revision y /o mantenimiento a sensores de movimiento electricos de rutas de evacuacion	UND	36	$ 35.000	$ 1.260.000	UND	0	$ 35.000	$ -		-		-	-	$ -	0,00%
14.11	Revision y/o mantenimiento al sistema panel electrico cinconzado de riego de jardines por reloj	UND	1	$ 2.000.000	$ 2.000.000	UND	0	$ 2.000.000	$ -		-		-	-	$ -	0,00%
14.12	Retiro y/o suministro e instalacion de luminarias tipo led de 60 x 60	UND	200	$ 160.000	$ 32.000.000	UND	115	$ 160.000	$ 18.400.000	103,00	16.480.000,00	3,00	480.000,00	106,00	$ 16.960.000,00	92,17%
14.13	Retiro y/o suministro e instalacion de luminarias tipo led de circunferencia 18/ ml.	UND	70	$ 160.000	$ 11.200.000	UND	170	$ 160.000	$ 27.200.000	170,00	27.200.000,00		-	170,00	$ 27.200.000,00	100,00%
14.14	Suministro e instalacion luminarias de emergencia tipo Mikey incluye retiro de las existentes que se encuentren fuera deservicio	UND	30	$ 150.000	$ 4.500.000	UND	30	$ 150.000	$ 4.500.000	1,00	150.000,00	29,00	4.350.000,00	30,00	$ 4.500.000,00	100,00%
14.15	Suministro e instalación de lámparas tipo led acrilico de sobreponer de 1.20 m de acuerdo a norma archivistica	UND	20	$ 150.000	$ 3.000.000	UND	130	$ 150.000	$ 19.500.000	13,00	1.950.000,00	117,00	17.550.000,00	130,00	$ 19.500.000,00	100,00%
14.16	Suministro e instalación de bombillo ahorradores de rosca tipo led	UND	30	$ 30.000	$ 900.000	UND	87	$ 30.000	$ 2.610.000	77,00	2.310.000,00	10,00	300.000,00	87,00	$ 2.610.000,00	100,00%
14.17	Suminuistro e instalacion luminaria tipo tubo de 1.2 mts2, -archivo	UND	30	$ 150.000	$ 4.500.000	UND	0	$ 150.000	$ -		-	2,00	300.000,00	2,00	$ 300.000,00	0,00%
14.18	Suministro e instalación de canaleta PVC y cableado para punto electrico.	UND	30	$ 70.000	$ 2.100.000	UND	0	$ 70.000	$ -		-	3,00	210.000,00	3,00	$ 210.000,00	0,00%
14.19	Revision y /o suministro e instalacion de tomacorrientes que se encuentren en mal estado	UND	100	$ 50.000	$ 5.000.000	UND	100	$ 50.000	$ 5.000.000	10,00	500.000,00	96,00	4.800.000,00	106,00	$ 5.300.000,00	106,00%
15	**SISTEMA DE CONTRAINCENDIO**														$ -	
15.1	Realizar la prueba de desempeño de las unidades de bombeo y verificar frente a la curva de aceptación de la bomba si cumple con lo solicitado por la norma NFPA 20 en su edición vigente.	UND	2	$ 9.000.000	$ 18.000.000	UND	0	$ 9.000.000	$ -	-	-	-	-	-	$ -	0,00%

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL -NEAA Y NAA.

CONTRATO DE OBRA: 19001111 H4 de 2019

FECHA INICIAL: 24 DE OCTUBRE DE 2019

PLAZO FINAL: HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2019

PLAZO ADICIONAL:

VALOR INICIAL: $641.209.910,00 INCLUIDO IVA

VALOR ADICIONAL: INCLUIDO IVA

VALOR FINAL: $641.209.910,00 INCLUIDO IVA

ACTA PARCIAL DE OBRA No.1
(Periodo comprendido entre el 25 de noviembre de 2019 al 16 de diciembre de 2019)

CONTRATISTA:
CONSORCIO CRS

16/12/2019


ITEMS	DESCRIPCION	CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS				CANTIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO ANTERIOR (No. 1)		CANTIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO ACTUAL No. 2		ACUMULADO		
		UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR TOTAL	UND.	CANT.	Vr. UNIT.	VALOR	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	VALOR	%
16	VARIOS														$ -	
16.1	Diagnóstico general de la infraestructura del edificio NEEA (Pisos 6 y 1 sótano, areas comunes y parqueadero)	UND	1	$ 20.000.000	$ 20.000.000	UND	1	$ 20.000.000	$ 20.000.000		-	-	-	-	$ -	0,00%
16.2	Diagnóstico general de la infraestructura del edificio NAA (Pisos 2 , bodegas y parqueadero	UND	1	$ 15.000.000	$ 15.000.000	UND	1	$ 15.000.000	$ 15.000.000		-	-	-	-	$ -	0,00%
16.3	Diagnóstico general del sistema de red contraincendios	UND	2	$ 8.000.000	$ 16.000.000	UND	2	$ 8.000.000	$ 16.000.000		-	-	-	-	$ -	0,00%
16.4	Diagnóstico general del sistema BMS Andover	UND	1	$ 8.000.000	$ 8.000.000	UND	1	$ 8.000.000	$ 8.000.000		-	-	-	-	$ -	0,00%
16.5	Diagnóstico general del sistema de sonido ambiental y emergencia	UND	1	$ 6.000.000	$ 6.000.000	UND	1	$ 6.000.000	$ 6.000.000		-	-	-	-	$ -	0,00%
16.6	Diagnóstico general del sistema de Control de Acceso	UND	1	$ 6.000.000	$ 6.000.000	UND	1	$ 6.000.000	$ 6.000.000		-	-	-	-	$ -	0,00%
16.7	Diagnóstico general del sistema de climatización	UND	1	$ 6.000.000	$ 6.000.000	UND	1	$ 6.000.000	$ 6.000.000		-	-	-	-	$ -	0,00%
16.8	Diagnóstico general de planta eléctrica	UND	1	$ 3.000.000	$ 3.000.000	UND	1	$ 3.000.000	$ 3.000.000		-	-	-	-	$ -	0,00%
	COSTOS TOTALES DEL PROYECTO															
	COSTO DIRECTO				501.141.000				501.141.000		215.291.767		205.849.233		$ 421.141.000,00	
	ADMINISTRACIÓN			21%	105.239.610			21%	105.239.610	21%	45.211.271	21%	43.228.339	21%	$ 88.439.610,00	
	IMPREVISTOS			1%	5.011.410			1%	5.011.410	1%	2.152.918	1%	2.058.492	1%	$ 4.211.410,00	
	UTILIDAD			5%	25.057.050			5%	25.057.050	5%	10.764.588	5%	10.292.462	5%	$ 21.057.050,00	
	IVA SOBRE LA UTILIDAD			19%	4.760.840			19%	4.760.840	19%	2.045.272	19%	1.955.568	19%	$ 4.000.840,00	
	TOTAL PRESENTE ACTA				641.209.910				641.209.910		275.465.816		263.384.094		$ 538.849.910,00	84,04%

VALOR TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL
RL. CONSORCIO CRS
CONTRATISTA

ERIKA VIZCAINO HERRERA
SUPERVISORA


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**PROGRAMA CONTRATO No 19001111 H4 de 2019**	**42 días**	**jue 24/10/19**	**vie 20/12/19**
2	Acta de Inicio	0 días	jue 24/10/19	jue 24/10/19
3	**DEMARCACION**	**10 días**	**jue 14/11/19**	**mié 27/11/19**
4	Suministro, instalación y demarcación de pintura epóxica (poliuretano)	10 días	jue 14/11/19	mié 27/11/19
5	Suministro, aplicación y demarcación de pintura para parqueadero	10 días	jue 14/11/19	mié 27/11/19
6	Suministro e instalación de cinta antideslizante	10 días	jue 14/11/19	mié 27/11/19
7	**IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS**	**25 días**	**lun 18/11/19**	**vie 20/12/19**
8	Aplicación de sellante en uniones de flanches de tejado para evitar filtracion	25 días	lun 18/11/19	vie 20/12/19
9	Aplicación de producto impermeabiilizante en pegues de flanches	25 días	lun 18/11/19	vie 20/12/19
10	Impermeabilización de acuerdo con las especificaciones técnicas en canales superiores	25 días	lun 18/11/19	vie 20/12/19
11	Limpieza y/o mantenimiento en canales y rejillas de bajantes retiro de material particulado	25 días	lun 18/11/19	vie 20/12/19
12	Revision y /o instalación de flanches en tejas sueltas	25 días	lun 18/11/19	vie 20/12/19
13	**MANTENIMIENTO DE PUERTAS (inlcuye en general el desmonte reposición e instalación de piezas para el correcto funcionamiento)**	**32 días**	**lun 4/11/19**	**mar 17/12/19**
14	Desmonte de divisiones en vidrio y/o puertas	20 días	lun 4/11/19	vie 29/11/19
15	Desmonte y retiro de archivadores por cuerpos	5 días	lun 4/11/19	vie 8/11/19
16	Mantenimiento del barandal de escaleras y hall del edificio	30 días	lun 4/11/19	vie 13/12/19
17	suministro e instalacion de ventanas de inspeccion en fibrocemento. De 60 x 60	30 días	mié 6/11/19	mar 17/12/19
18	Mantenimiento a estaciones o páneles de emergencias en lamina y vidrio	30 días	lun 4/11/19	vie 13/12/19
19	Mantenimiento y / suministro e instalacion de chapas con manija en acero inxidable	30 días	mié 6/11/19	mar 17/12/19
20	Mantenimiento de puertas oficinas privadas	30 días	mié 6/11/19	mar 17/12/19
21	Suministro e instalación de chapa para puerta incluye dos llaves	30 días	mié 6/11/19	mar 17/12/19
22	Suministro e instalación de chapa para escritorio, archivadores verticales y horizontales incluye c	30 días	mié 6/11/19	mar 17/12/19
23	Instalación puertas existentes en vidrio de 8mm con marco de aluminio	30 días	mié 6/11/19	mar 17/12/19
24	**PINTURA EXTERNA E INTERNA**	**38 días**	**mié 30/10/19**	**vie 20/12/19**
25	Limpieza e impermeabilizacion de muros de alta resistencia con suministro e instalación de pintura vinilo tipo 1-3 manos incluye resane, filos y dilataciones, incluye pintura obras de remodelacion.	38 días	mié 30/10/19	vie 20/12/19
26	Resane en filos y dilataciones y pintura si es el caso	38 días	mié 30/10/19	vie 20/12/19
27	Resane y pintura vinilo tipo 1 en muro de Superboard interno y externo	38 días	mié 30/10/19	vie 20/12/19
28	Suminsitro e instalación de pintura de muros exteriores con koraza dos manos, incluye rasqueteo de puntos con humedad, sello y aplicación de pintura color similar al existente.	38 días	mié 30/10/19	vie 20/12/19
29	Suministro e instalacion Pintura cielo raso en vinilo, en baños	38 días	mié 30/10/19	vie 20/12/19
30	Suministro e instalacion de Pintura cielo raso en vinilo, en baños	38 días	mié 30/10/19	vie 20/12/19
31	**PISOS Y ZÓCALOS**	**30 días**	**mié 6/11/19**	**mar 17/12/19**
32	Desmonte, suministro e instalación de piso cerámica 60x60 cm	25 días	mié 6/11/19	mar 10/12/19
33	Sellamiento de juntas y fisuras entre adoquines con sello de arena en sendero peatonal NEAA -	25 días	mié 6/11/19	mar 10/12/19
34	Sello y tratamiento de juntas de construccion o dilatacion en pisos	30 días	mié 6/11/19	mar 17/12/19
35	**PAÑETES Y ENCHAPES**	**30 días**	**lun 11/11/19**	**vie 20/12/19**
36	Mantenimiento y/o aplicación de producto en juntas de dilatacion	5 días	lun 16/12/19	vie 20/12/19
37	Resane de muros en general	30 días	lun 11/11/19	vie 20/12/19
38	Retiro de enchape de piletas lavatraperos.	15 días	mié 13/11/19	mar 3/12/19
39	Suministro e instalación de enchape de piletas lavatraperos.	15 días	lun 25/11/19	vie 13/12/19
40	**CARPINTERIA**	**30 días**	**mié 6/11/19**	**mar 17/12/19**
41	Suministro e instalacion de cerrojo y bisagras para divisiones de baños	30 días	mié 6/11/19	mar 17/12/19
42	**MANTENIMIENTO VIDRIOS Y VENTANERIA**	**20 días**	**lun 25/11/19**	**vie 20/12/19**
43	Revision y/o reparacion de paneles de encerramiento del balcon quinto piso incluye: cambio de tornilleria de presion si se requiere	20 días	lun 25/11/19	vie 20/12/19
44	Suministro e instalación de pie de amigo para recepción y repisas	20 días	lun 25/11/19	vie 20/12/19
45	Suministro e instralacion de Pelicula samblasteada con logo de la aerocivil para vidrios en zonas de acceso	20 días	lun 25/11/19	vie 20/12/19
46	**INFRAESTRUCTURA GENERAL**	**37 días**	**jue 31/10/19**	**vie 20/12/19**
47	Desmonte pared en superboard	15 días	jue 31/10/19	mié 20/11/19
48	Desmonte de divisiones en drywall	15 días	jue 31/10/19	mié 20/11/19
49	Mantenimiento pintura de puertas metal madera que icluye: tableros lamina de acero inoxidable visagras y marco en lámina.	22 días	jue 21/11/19	vie 20/12/19
50	Suministro e instalación de guardaescobas en madera de acuerdo con las especificaciones tecn	22 días	jue 21/11/19	vie 20/12/19
51	Suministro e intalación de pasamanos anclado al piso de acuerdo a lo normado en escalera principal de acceso edificio NEAA	3 días	jue 12/12/19	lun 16/12/19
52	**RED HIDRAULICA Y SANITARIA**	**27 días**	**jue 14/11/19**	**vie 20/12/19**
53	Desmonte, Suministro e Instalacion de Conexión Superior Orinales (incluye desmonte, limpieza y reinstalación de accesorios y aparato si se requiere.)	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
54	Desmonte, suministro e Instalacion de llave para pocetas	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
55	Destape de puntos sanitarios y/o lavamanos con sonda electrica.	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
56	Destape de cañeria de punto sanitario, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato si se requiere.	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
57	Mantenimiento y reparacion de Shut de Basuras	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
58	Mantenimiento de cajas de inspección en general de aguas lluvias y aguas negras incluye retiro de lodos hasta botadero certificado	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
59	Mantenimiento de sifones	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
60	Mantenimiento llaves tipo ganso para cafeterias y comedor institucional	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
61	Mantenimiento y puesta a punto el sistema de riego de cuadros vivos de jardineria	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
62	Mantenimiento divisiones y puertas de acero inxidable de baños	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
63	Mantenimiento de válvula sanitaria	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19

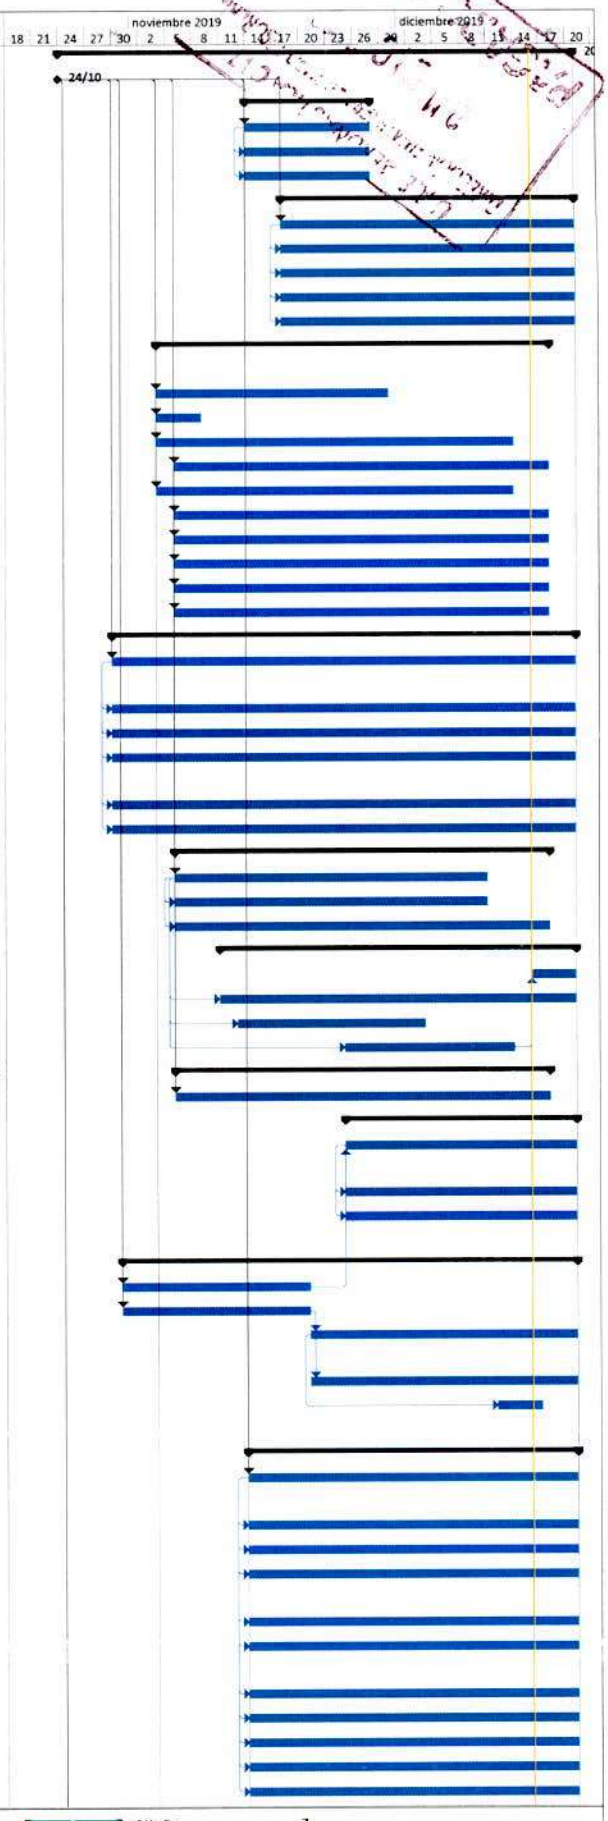

Proyecto: Programa NEAA y NAA
Fecha: lun 16/12/19

Tarea | Tareas externas | Tarea manual | Sólo fin
División | Hito externo | Sólo duración | Fecha límite
Hito | Tarea inactiva | Informe de resumen manual | Progreso
Resumen | Hito inactivo | Resumen manual
Resumen del proyecto | Resumen inactivo | Sólo el comienzo

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
64	Mantenimiento de conexiones de pared a sanitario.	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
65	Mantenimiento de la tuberia y cajas de inspección	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
66	Mantenimiento de drenajes y disposición final certificado evacuación lodos con equipo adecuado para esta labor	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
67	Mantenimiento de tuberia interna desde el contador avenida principal calle 26	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
68	Mantenimiento de tuberia PVC de 2/1" de acometida al tanque	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
69	Mantenimiento de tuberia colgante con limpieza y traslado de lodos hasta botadero certificado	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
70	Revision y/o fijacion de tuberia colgante con abrasadera metalica x golpe de ariete	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
71	Retiro y /o adecuacion de ventanas de baños para ventilacion	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
72	Suministro e instalacion de llave ahorradora de paso de agua en piletas y areas externas	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
73	Suministro e instalacion de registro de paso de agua en PVC 1/2,-1/3,-1/4,-1/4	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
74	Suministro e Instalacion de bizcocho sanitario	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
75	Suministro e instalación de tuberia PVC de 2/1" de acometida al tanque	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
76	Suministro e instalación de sifones con retenedor de olores en baños	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
77	Suministro e instalacion de dispensador de jabon para manos en baños	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
78	Suministro e instalación llaves tipo ganso para cafeterias y comedor institucional	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
79	Suministro e instalación de tapa registros	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
80	**RED DE AGUA POTABLE**	**27 días**	**jue 14/11/19**	**vie 20/12/19**
81	Demolición regata lineal para instalar tubería, en piso, y en pared	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
82	Mantenimiento correctivo de tubería (incluye demolición de muro e instalación de tuberia y acces	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
83	Suministro e instalación de tubería pvc 1/2 ", 3/4", 1 1/2 ", 1", 2"	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
84	**REDES DE AGUAS NEGRAS (servidas)**	**27 días**	**jue 14/11/19**	**vie 20/12/19**
85	Destape de cañeria de punto sanitario, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato si se requiere.	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
86	Destape de cañeria de punto orinal, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato si se requiere.	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
87	**BATERIAS SANITARIAS Y ACCESORIOS EN BAÑOS**	**27 días**	**jue 14/11/19**	**vie 20/12/19**
88	Destape de cañeria de punto orinal, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato sanitario si se requiere	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
89	Mantenimiento de punto sanitarios	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
90	Mantenimiento de piletas lavatraperos ubicadas en las baterias de los baños, incluyen reemboquillado, enchape , cabmio de empaques en las llaves de salida	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
91	Mantenimiento general de las baterias sanitarias (incluye sanitarios, lavamanos, orinales,)	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
92	Suministro e instalación de fluxometros de cauerdo con las especificaciones tecnicas de los exis	27 días	jue 14/11/19	vie 20/12/19
93	**SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACION**	**35 días**	**lun 4/11/19**	**vie 20/12/19**
94	Mantenimiento tomas electricas de 110v y 220v	35 días	lun 4/11/19	vie 20/12/19
95	Revision y/o instalacion de puntos electricos con suministro de cableado conexiones, tomacorriente hasta garantizar el correcto funcionamiento	35 días	lun 4/11/19	vie 20/12/19
96	Revisión y/o mantenimiento de calentadores electricos -Gimnacio y Direccion General	35 días	lun 4/11/19	vie 20/12/19
97	Revisión y/o mantenimiento de hornos eléctricos semiindustriales	35 días	lun 4/11/19	vie 20/12/19
98	Revision y/o mantenimineto de sensores eléctricos de orinales,	35 días	lun 4/11/19	vie 20/12/19
99	Revision y /o mantenimiento de secadores de manos en baños	35 días	lun 4/11/19	vie 20/12/19
100	Revision y /o mantenimiento aspiral luminoso electrico del edificio -alturas	35 días	lun 4/11/19	vie 20/12/19
101	Revision y/o mantenimiento del sistema de luminarias del parqueadero por fotoceldas	35 días	lun 4/11/19	vie 20/12/19
102	Revision y /o mantenimiento al punto de iluminacion de la imagen de la aerocivil, plasmada en la fachada del edificio	35 días	lun 4/11/19	vie 20/12/19
103	Revision y /o mantenimiento a sensores de movimiento electricos de rutas de evacuacion	35 días	lun 4/11/19	vie 20/12/19
104	Revision y/o mantenimiento al sistema panel electrico cincronizado de riego de jardines por reloj	35 días	lun 4/11/19	vie 20/12/19
105	Retiro y/o suministro e instalacion de luminarias tipo led de 60 x 60	35 días	lun 4/11/19	vie 20/12/19
106	Retiro y/o suministro e instalacion de luminarias tipo led de circunferencia 18/ ml,	35 días	lun 4/11/19	vie 20/12/19
107	Suministro e instalacion luminarias de emergencia tipo Mikey incluye retiro de las existentes que se encuentren fuera deservicio	35 días	lun 4/11/19	vie 20/12/19
108	Suministro e instalación de lámparas tipo led acrilica de sobreponer de 1.20 m de acuerdo a norma archivistica	35 días	lun 4/11/19	vie 20/12/19
109	Suministro e instalación de bombillo ahorardores de rosca tipo led	35 días	lun 4/11/19	vie 20/12/19
110	Suminuistro e instalación luminaria tipo tubo de 1.20 m2, -archivo	35 días	lun 4/11/19	vie 20/12/19
111	Suministro e instalación de canaleta PVC y cableado para punto electrico.	35 días	lun 4/11/19	vie 20/12/19
112	Revision y /o suministro e instalacion de tomacorrientes que se encuentren en mal estado	35 días	lun 4/11/19	vie 20/12/19
113	**SISTEMA DE CONTRAINCENDIO**	**2 días**	**jue 19/12/19**	**vie 20/12/19**
114	Realizar la prueba de desempeño de las unidades de bombeo y verificar frente a la curva de aceptación de la bomba si cumple con lo solicitado por la norma NFPA 20 en su edición vigente.	2 días	jue 19/12/19	vie 20/12/19
115	**VARIOS**	**40 días**	**jue 24/10/19**	**mié 18/12/19**
116	Diagnóstico general de la infraestructura del edificio NEEA (Pisos 6 y 1 sótano, areas comunes y parqueadero)	40 días	jue 24/10/19	mié 18/12/19
117	Diagnóstico general de la infraestructura del edificio NAA (Pisos 2 , bodegas y parqueadero	40 días	jue 24/10/19	mié 18/12/19
118	Diagnóstico general del sistema de red contraincendios	35 días	jue 24/10/19	mié 11/12/19
119	Diagnóstico general del sistema BMS Andover	35 días	jue 24/10/19	mié 11/12/19
120	Diagnóstico general del sistema de sonido ambiental y emergencia	35 días	jue 24/10/19	mié 11/12/19
121	Diagnóstico general del sistema de Control de Acceso	35 días	jue 24/10/19	mié 11/12/19
122	Diagnóstico general del sistema de climatización	35 días	jue 24/10/19	mié 11/12/19
123	Diagnóstico general de planta eléctrica	35 días	jue 24/10/19	mié 11/12/19

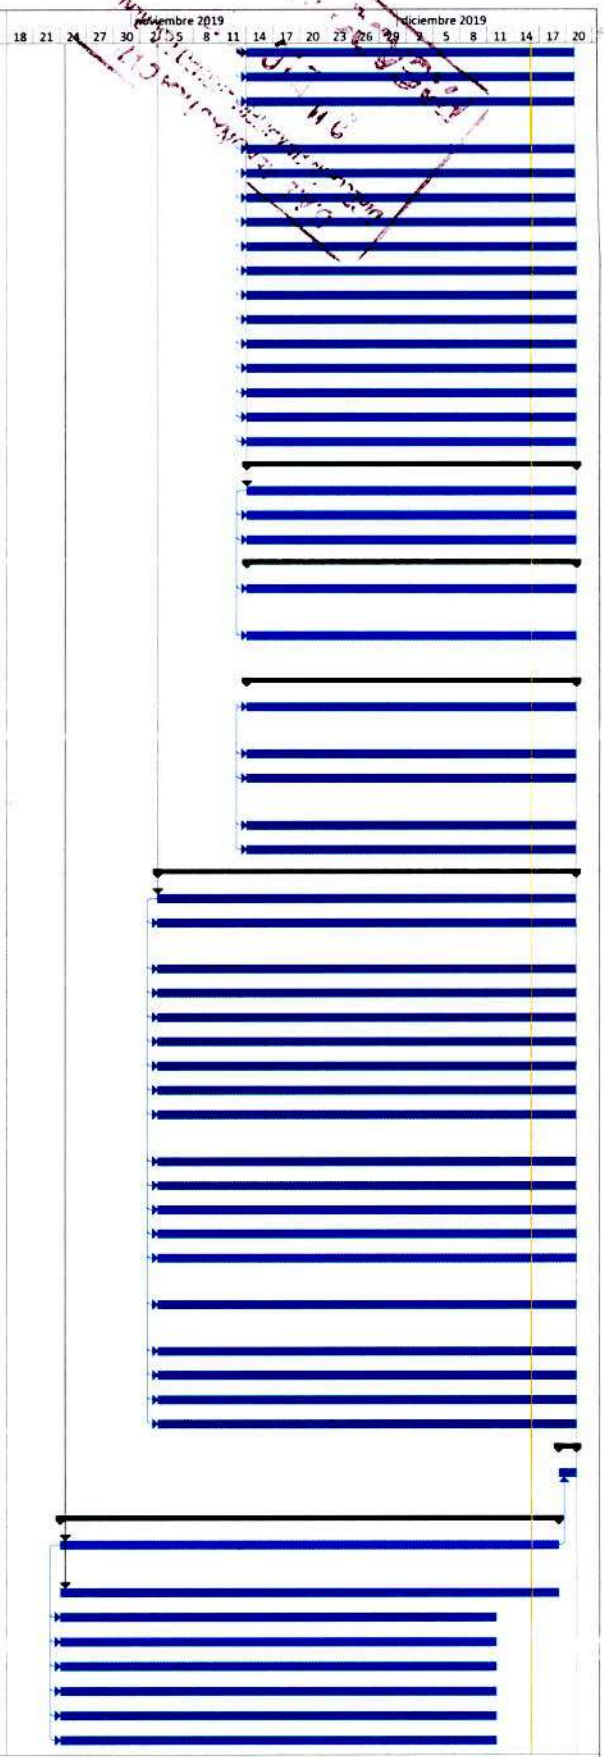

Proyecto: Programa NEAA y NAA
Fecha: lun 16/12/19

Tarea	Tareas externas	Tarea manual	Sólo fin		
División	Hito externo	Sólo duración	Fecha limite		
Hito	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Progreso		
Resumen	Hito inactivo	Resumen manual			
Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Sólo el comienzo			

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
CONTRATO DE OBRA: 19001111 H4 de 2019

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL -NEAA Y NAA.

ACTA DE ENTREGA


16	Diciembre	2019

CONTRATISTA :
CONSORCIO CRS
SUPERVISORA:
ERIKA VIZCAINO HERRERA
FECHA INICIAL: DESDE 24/10/2019
PLAZO FINAL: HASTA EL 20/12/2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
1.2	Suministro, instalación y demarcación de pintura epóxica (poliuretano)	M2	243,62

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES

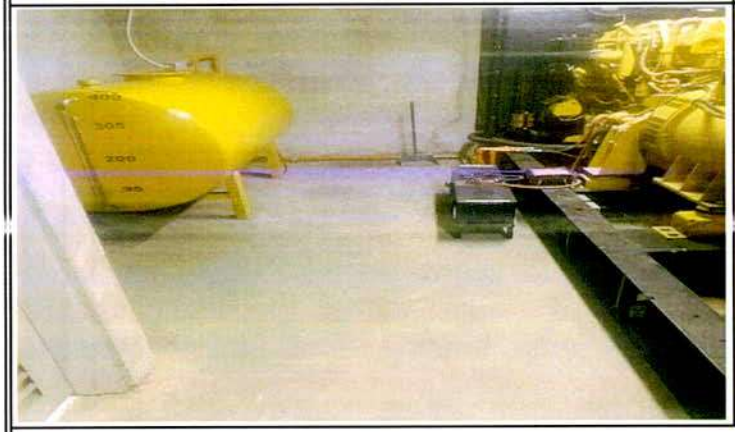

DESPUES



Largo	Alto	Area	Lugar		Observaciones
3,70	2,53	9,36	Sala técnica (sótano)	SÓTANO	Piso
11,08	2,61	28,92	Sala técnica (sótano)		Piso
7,03	5,23	36,77	Cuarto bombas 1 (sótano)		Piso
1,94	0,93	-1,80	Cuarto bombas 1 (sótano)		Descuento equipo
0,38	0,30	-0,11	Cuarto bombas 1 (sótano)		Descuento equipo
0,99	0,63	-0,62	Cuarto bombas 1 (sótano)		Descuento equipo
0,93	0,66	-0,61	Cuarto bombas 1 (sótano)		Descuento equipo
0,68	0,35	-0,24	Cuarto bombas 1 (sótano)		Descuento equipo
4,93	3,60	17,75	Cuarto mecánico 1 (sótano)		Piso
0,98	0,75	-0,74	Cuarto mecánico 1 (sótano)		Piso
3,40	2,07	7,04	Cuarto mecánico 3 (piso 1)	PISO 1	Piso
3,00	3,23	9,69	Cuarto mecánico 3 (piso 1)		Piso
1,77	0,76	1,35	Cuarto mecánico 3 (piso 1)		Piso
1,02	0,90	0,92	Cuarto mecánico 3 (piso 1)		Descuento equipo
4,13	2,14	8,84	Cuarto mecánico 4 (piso 1)		Descuento equipo
4,92	2,50	12,30	Cuarto mecánico 5 (piso 2)	PISO 2	Piso
0,51	0,46	-0,23	Cuarto mecánico 5 (piso 2)		Descuento equipo
0,68	0,41	-0,28	Cuarto mecánico 5 (piso 2)		Descuento equipo
0,40	0,20	-0,08	Cuarto mecánico 5 (piso 2)		Descuento equipo
4,92	2,50	12,30	Cuarto mecánico 6 (piso 2)		Descuento equipo
0,50	0,91	-0,46	Cuarto mecánico 6 (piso 2)		Piso
4,95	2,50	12,38	Cuarto mecánico 7 (piso 3)	PISO 3	Piso
0,51	0,46	-0,23	Cuarto mecánico 7 (piso 3)		Descuento equipo
0,68	0,41	-0,28	Cuarto mecánico 7 (piso 3)		Descuento equipo
0,40	0,20	-0,08	Cuarto mecánico 7 (piso 3)		Descuento equipo
4,95	2,51	12,42	Cuarto mecánico 8 (piso 3)		Descuento equipo
0,51	0,38	-0,19	Cuarto mecánico 8 (piso 3)		Piso
0,40	0,20	-0,08	Cuarto mecánico 8 (piso 3)		Descuento equipo

0,40	0,20	-0,08	Cuarto mecánico 8 (piso 3)		Descuento equipo
4,95	2,53	12,52	Cuarto mecánico 9 (piso 4)	PISO 4	Piso
0,51	0,46	-0,23	Cuarto mecánico 9 (piso 4)		Descuento equipo
0,68	0,41	-0,28	Cuarto mecánico 9 (piso 4)		Descuento equipo
0,40	0,20	-0,08	Cuarto mecánico 9 (piso 4)		Descuento equipo
4,95	2,52	12,47	Cuarto mecánico 10 (piso 4)		Piso
0,68	0,41	-0,28	Cuarto mecánico 10 (piso 4)		Descuento equipo
0,40	0,20	-0,08	Cuarto mecánico 10 (piso 4)		Descuento equipo
4,00	3,40	13,60	Cuarto mecánico 11 (piso 5)	PISO 5	Piso
0,51	0,46	-0,23	Cuarto mecánico 11 (piso 5)		Descuento equipo
0,68	0,41	-0,28	Cuarto mecánico 11 (piso 5)		Descuento equipo
0,40	0,20	-0,08	Cuarto mecánico 11 (piso 5)		Descuento equipo
4,92	2,50	12,30	Cuarto mecánico 12 (piso 5)		Piso
0,99	0,41	-0,41	Cuarto mecánico 12 (piso 5)		Descuento equipo
2,36	2,40	5,66	cafeteria (piso 5)		muros
2,06	2,40	4,94	cafeteria (piso 5)		muros
4,00	2,40	9,60	cafeteria (piso 5)		muros
0,86	2,40	2,06	cafeteria (piso 5)		muros
0,68	2,40	1,63	cafeteria (piso 5)		muros
1,22	2,40	2,93	cafeteria (piso 5)		muros
3,23	0,60	-1,94	cafeteria (piso 5)		Descuento muro
1,60	0,89	-1,42	cafeteria (piso 5)		Descuento muro
2,07	3,33	6,89	cafeteria (piso 5)		techo
0,86	0,68	0,58	cafeteria (piso 5)		techo
0,30	0,20	-0,06	cafeteria (piso 5)		Descuento techo
1,35	0,15	-0,20	cafeteria (piso 5)		Descuento techo

TOTAL **243,62**

CONTRATISTA	**SUPERVISION**
CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL CONSORCIO CRS	ERIKA VIZCAINO HERRERA

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
CONTRATO DE OBRA: 19001111 H4 de 2019

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL -NEAA Y NAA.

ACTA DE ENTREGA


16	Diciembre	2019

CONTRATISTA :
CONSORCIO CRS
SUPERVISORA:
ERIKA VIZCAINO HERRERA
FECHA INICIAL: DESDE 24/10/2019
PLAZO FINAL: HASTA EL 20/12/2019


ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
2.1	Aplicación de sellante en uniones de flanches de tejado para evitar filtracion	ML	550

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES

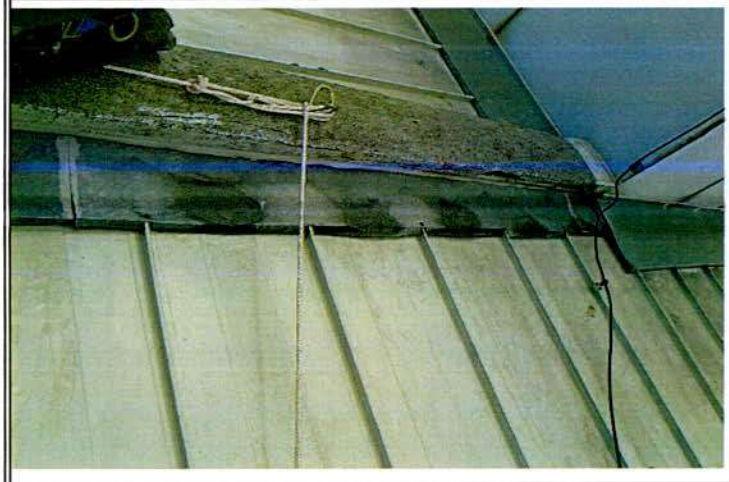

DESPUES

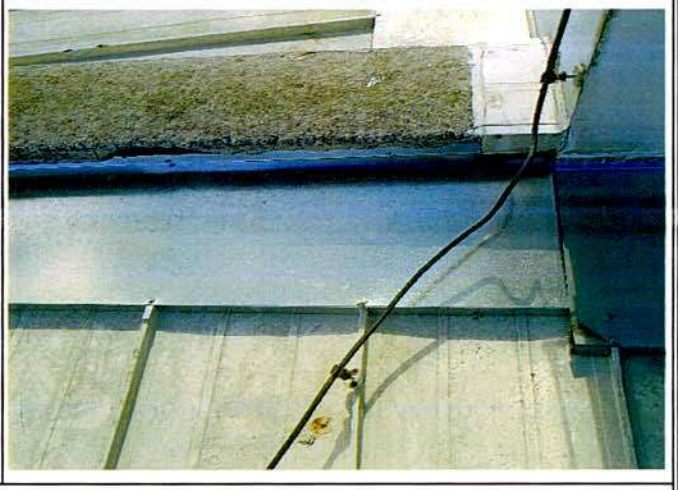

Largo	Alto	Area	Lugar		Observaciones
125,00			Costado occidental		Cubierta
150,00			Costado norte		Cubierta
125,00			Costado oriental		Cubierta
150,00			Costado sur		Cubierta

TOTAL **550,00**

CONTRATISTA	SUPERVISION
CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL CONSORCIO CRS	ERIKA VIZCAINO HERRERA

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
CONTRATO DE OBRA: 19001111 H4 de 2019

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL -NEAA Y NAA.

ACTA DE ENTREGA

16	Diciembre	2019

CONTRATISTA :
CONSORCIO CRS
SUPERVISORA:
ERIKA VIZCAINO HERRERA
FECHA INICIAL: DESDE 24/10/2019
PLAZO FINAL: HASTA EL 20/12/2019


ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
2.2	Aplicación de producto impermeabiilizante en pegues de flanches	ML	120

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES

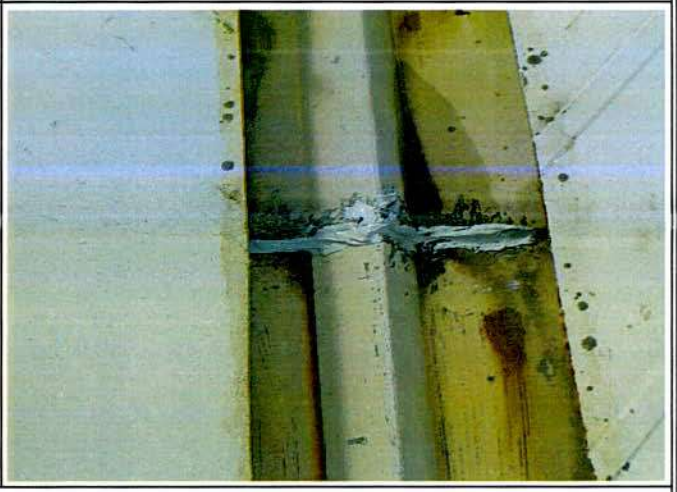

Largo	Alto	Area	Lugar		Observaciones		
20,00			Costado occidental		Cubierta		
40,00			Costado norte		Cubierta		
20,00			Costado oriental		Cubierta		
40,00			Costado sur		Cubierta		

TOTAL **120,00**

CONTRATISTA	SUPERVISION
CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL CONSORCIO CRS	ERIKA VIZCAINO HERRERA

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
CONTRATO DE OBRA: 19001111 H4 de 2019

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL -NEAA Y NAA.

ACTA DE ENTREGA

16	Diciembre	2019

CONTRATISTA:
CONSORCIO CRS
SUPERVISORA:
ERIKA VIZCAINO HERRERA
FECHA INICIAL: DESDE 24/10/2019
PLAZO FINAL: HASTA EL 20/12/2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
2.3	Impermeabilización de acuerdo con las especificaciones técnicas en canales superiores	ML	167,8

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES



Largo	Alto	Area	Lugar	Observaciones
30,00			Costado occidental	Cubierta
47,00			Costado norte	Cubierta
30,00			Costado oriental	Cubierta
48,00			Costado sur	Cubierta
12,80			Placa sobre baño mujeres piso 5	Impermeabilización sobre placa

TOTAL **167,80**

CONTRATISTA	SUPERVISION
CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL CONSORCIO CRS	ERIKA VIZCAINO HERRERA

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
CONTRATO DE OBRA: 19001111 H4 de 2019

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL -NEAA Y NAA.

ACTA DE ENTREGA

16	Diciembre	2019

CONTRATISTA : CONSORCIO CRS
SUPERVISORA: ERIKA VIZCAINO HERRERA
FECHA INICIAL: DESDE 24/10/2019
PLAZO FINAL: HASTA EL 20/12/2019


ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
2.4	Limpieza y/o mantenimiento en canales y rejillas de bajantes retiro de material particulado	ML	155

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES

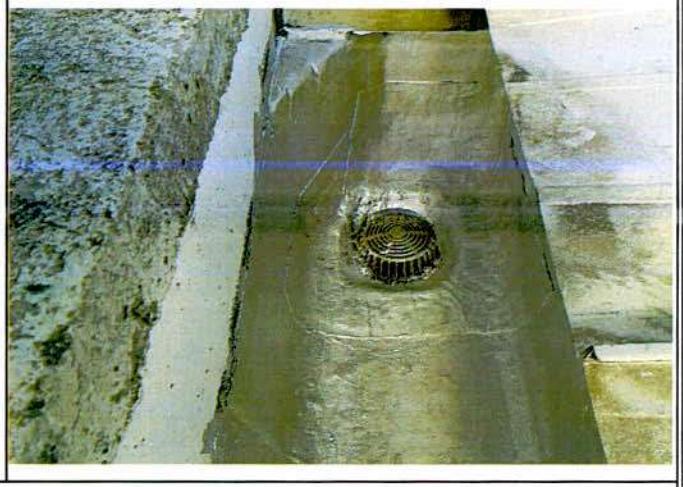

Largo	Alto	Area	Lugar		Observaciones
30,00			Costado occidental		Cubierta
47,00			Costado norte		Cubierta
30,00			Costado oriental		Cubierta
48,00			Costado sur		Cubierta

TOTAL **155,00**

CONTRATISTA	SUPERVISION
CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL CONSORCIO CRS	ERIKA VIZCAINO HERRERA

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
CONTRATO DE OBRA: 19001111 H4 de 2019

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL -NEAA Y NAA.



ACTA DE ENTREGA

16	Diciembre	2019

CONTRATISTA : CONSORCIO CRS
SUPERVISORA: ERIKA VIZCAINO HERRERA
FECHA INICIAL: DESDE 24/10/2019
PLAZO FINAL: HASTA EL 20/12/2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
2.4	Revision y /o instalación de flanches en tejas sueltas	UND	150

REGISTRO FOTOGRAFICO

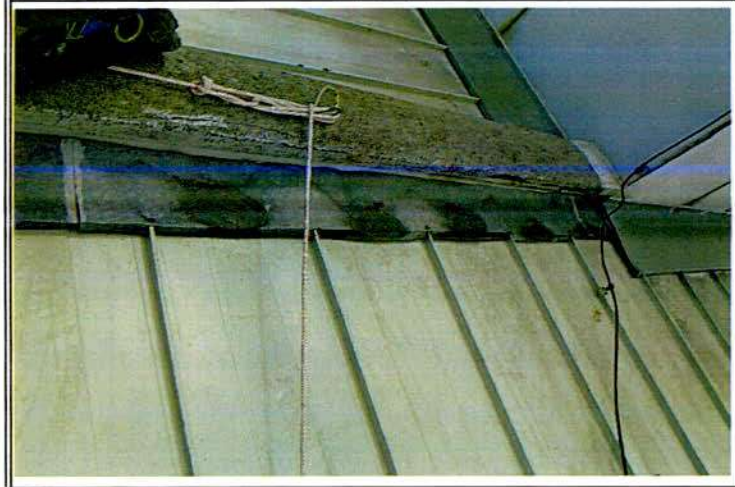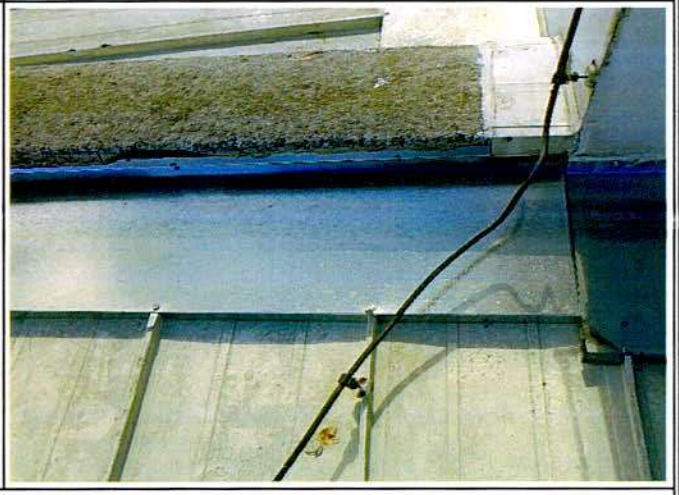ANTES	DESPUES
	

Cantidad	Alto	Area	Lugar		Observaciones
30,00			Costado occidental		Cubierta
45,00			Costado norte		Cubierta
30,00			Costado oriental		Cubierta
45,00			Costado sur		Cubierta

TOTAL **150,00**

CONTRATISTA	SUPERVISION
CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL CONSORCIO CRS	ERIKA VIZCAINO HERRERA

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
CONTRATO DE OBRA: 19001111 H4 de 2019

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL -NEAA Y NAA.

ACTA DE ENTREGA

16	Diciembre	2019

CONTRATISTA : CONSORCIO CRS
SUPERVISORA: ERIKA VIZCAINO HERRERA
FECHA INICIAL: DESDE 24/10/2019
PLAZO FINAL: HASTA EL 20/12/2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
3.4	suministro e instalacion de ventanas de inspeccion en fibrocemento. De 60 x 60	UND	30

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES



Cantidad	Alto	Area	Lugar		Observaciones
30,00			Piso 3 oriente		Cambio

TOTAL 30.00

CONTRATISTA	SUPERVISION
CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL CONSORCIO CRS	ERIKA VIZCAINO HERRERA

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
CONTRATO DE OBRA: 19001111 H4 de 2019

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL -NEAA Y NAA.

ACTA DE ENTREGA

16	Diciembre	2019

CONTRATISTA :
CONSORCIO CRS
SUPERVISORA:
ERIKA VIZCAINO HERRERA
FECHA INICIAL: DESDE 24/10/2019
PLAZO FINAL: HASTA EL 20/12/2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
3.6	Mantenimiento y / suministro e instalacion de chapas con manija en acero inxidable	UND	50

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES



Cantidad	Lugar	Observaciones
50,00	Edificio NEAA	Cambio (ver relación de entrega adjunta)

TOTAL 50,00

CONTRATISTA

CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL
CONSORCIO CRS

SUPERVISION

ERIKA VIZCAINO HERRERA

CONTRATO 19001111 H4 de 2019
OBJETO REALIZAR MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO BAJO LA MODALIDAD OUTSOURCING EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO SUMINISTRO MATERIALES MANO DE OBRA INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS AEROCIVIL NEAA, CEA Y NAA (LOTE 1)
CONTRATISTA CONSORCIO CRS
SUPERVISION ERIKA PATRICIA VIZCAINO HERRERA

NOS PERMITIMOS HACER ENTREGA DE LA RELACION DE CHAPAS INSTALADAS EN ACERO INOXIDABLE, INDICANDO UBICACIÓN POR PISO. SE ENTREGAN 3 LLAVES POR CHAPA.

ACTA DE ENTREGA DE CHAPAS Y TRES (3) LLAVES DE ACERO INOXIDABLE

	CHAPAS DE ACERO INOXIDABLE	
	N° DE LLAVE	UBICACIÓN
PISO 1	1	BAÑO HOMBRES
	2	CUARTO ELECTRICO 4
	3	CUARTO COMUNICACIONES 4
	4	BAÑO MUJERES
	5	CUARTO COMUNICACIONES 7
	6	CUARTO ELECTRICO 3
	7	CUARTO MECANICO 3 COSTADO ORIENTAL
	8	CUARTO MECANICO 4
	9	CUARTO MECANICO 3 COSTADO OCCIDENTAL
	45	BAÑO HOMBRES DISCAPACITADOS
	46	BAÑO MUJERES DISCAPACITADOS
PISO 2	10	BAÑO HOMBRES
	11	CUARTO ELECTRICO 6
	12	CUARTO COMUNICACIONES 6
	13	CUARTO MECANICO 5
	14	BAÑO MUJERES
	15	CUARTO COMUNICACIONES 5
	16	CUARTO ELECTRICO 5
	17	CUARTO MECANICO 6
	47	BAÑO MUJERES DISCAPACITADOS
PISO3	18	BAÑO HOMBRES
	19	CUARTO ELECTRICO 10
	20	BAÑO MUJERES
	21	CUARTO COMUNICACIONES 10
	22	CUARTO MECANICO 7
	23	CUARTO ELECTRICO 7
	24	CUARTO COMUNICACIONES 11
	25	CUARTO MECANICO 8

CJRA

	49	BAÑO MUJERES DISCAPACITADOS

PISO 4	26	BAÑO HOMBRES
	27	BAÑO MUJERES
	28	CUARTO ELECTRICO 9
	29	CUARTO ELECTRICO 8
	30	CUARTO COMUNICACIONES 8
	31	CUARTO MECANICO 9
	32	CUARTO MECANICO 10
	33	CUARTO COMUNICACIONES 9
	48	BAÑO HOMBRES DISCAPACITADOS

PISO 5	34	BAÑO MUJERES
	35	CUARTO COMUNICACIONES 11
	36	CUARTO MECANICO 12
	37	CUARTO ELECTRICO 11
	38	BAÑO HOMBRES
	39	CUARTO ELECTRICO 12
	40	CUARTO MECANICO 11

SOTANO	41	CUARTO ELECTRICO 2
	42	CUARTO COMUNICACIONES 2
	43	CUARTO COMUNICACIONES 1
	44	CUARTO ELECTRICO 1
		CUARTO DE CAMARAS

ENTREGA:
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CRS

RECIBE:
ERIKA PATRICIA VIZCAINO HERRERA
SUPERVISORA DEL CONTRATO

ING. ANA MARIA OCAMPO E.
INGENIERO DE APOYO

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
CONTRATO DE OBRA: 19001111 H4 de 2019

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL -NEAA Y NAA.

ACTA DE ENTREGA

16	Diciembre	2019

CONTRATISTA :
CONSORCIO CRS
SUPERVISORA:
ERIKA VIZCAINO HERRERA
FECHA INICIAL: DESDE 24/10/2019
PLAZO FINAL: HASTA EL 20/12/2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
3.7	Mantenimiento de puertas oficinas privadas	UND	8

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES



Cantidad	Lugar	Observaciones
1,00	Piso 5 sala de juntas secretaría general	Mantenimiento
1,00	Piso 5 oficina secretaría general	Mantenimiento
1,00	Piso 5 sala VIP (banderas)	Mantenimiento
1,00	Piso 3 puertas y cerradura archivador	Mantenimiento
1,00	Piso 5 dirección general sala privada	Mantenimiento cerradura y hacer llaves
1,00	Cambio de pines (2 escritorios)	Mantenimiento
1,00	Cambio de pines (2 escritorios)	Mantenimiento
1,00	Cambio de pines (2 escritorios)	Mantenimiento

TOTAL 8,00

CONTRATISTA	SUPERVISION
CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL CONSORCIO CRS	ERIKA VIZCAINO HERRERA

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
CONTRATO DE OBRA: 19001111 H4 de 2019

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL -NEAA Y NAA.

ACTA DE ENTREGA

16	Diciembre	2019

CONTRATISTA :
CONSORCIO CRS
SUPERVISORA:
ERIKA VIZCAINO HERRERA
FECHA INICIAL: DESDE 24/10/2019
PLAZO FINAL: HASTA EL 20/12/2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
3.8	Suministro e instalación de chapa para puerta incluye dos llaves	UND	35

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES



Cantidad	Lugar	Observaciones
35,00	Piso 1	Cambio (ver relación de entrega adjunta firmada por cada funcionario)

TOTAL 35,00

CONTRATISTA	SUPERVISION
CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL CONSORCIO CRS	ERIKA VIZCAINO HERRERA

105

CONTRATO 19001111 H4 de 2019
OBJETO REALIZAR MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO BAJO LA MODALIDAD OUTSOURCING EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO SUMINISTRO MATERIALES MANO DE OBRA INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS AEROCIVIL NEAA, CEA Y NAA (LOTE 1)

CONTRATISTA CONSORCIO CRS
SUPERVISION ERIKA PATRICIA VIZCAINO HERRERA

NOS PERMITIMOS HACER ENTREGA DE LA RELACION DE CHAPAS INSTALADAS DE POMA EN MADERA, INDICANDO UBICACIÓN POR DEPENDENCIA. SE ENTREGAN 2 LLAVES POR CHAPA. UNA LLAVE QUEDO DIRECTAMENTE UBICADA EN LA DEPENDENCIA RESPECTIVA.

ACTA DE ENTREGA DE CHAPAS Y DOS (2) LLAVES DE POMA (UNA COPIA DE LA LLAVE SE DEJO PUESTA EN LA CHAPA Y SE RECIBIÓ COMO SE INDICA EN EL FORMATO ANEXO)

	CHAPAS DE POMA	
	N° DE LLAVE	UBICACIÓN DEPENDENCIA
PISO 5	50	JEFATURA GRUPO DE SERVICIO AEROCOMERCIAL
	51	JEFATURA GRUPO DE VIGILANCIA AEROCOMERCIAL
	52	JEFATURA GRUPO DE NORMAS AERONAUTICAS
	53	OFICINAS ACESORES DIRECCION GENERAL
	54	OFICINAS ACESORES DIRECCION GENERAL
	70	JEFATURA GRUPO ESTUDIOS SECTORIALES
PISO 4	55	JEFATURA GRUPOASISTENCIA LEGAL
	56	SALA ESRNESTO SAMPER M.
	57	ACESORES OFICINA DE COMERCIALIZACION
	58	JEFATURA DE OFICINA COMERCIALIZACION E INVERSION
PISO 3	59	JEFATURA GRUPO PLANES MAESTROS AEROPURTOS NO CONCESIONADOS
PISO 2	60	DIRECCION CARRERA TALENTO HOMANO
	61	COORDINACION GESTION SOCIAL
	62	JEFATURA GRUPO SUPERVISION AEROPORTUARIA
	63	JEFATURA GRUPO DE CONTABILIDAD
	68	TESORERIA
	69	JEFATURA GRUPO DE PRESUPUESTO
PISO 1	64	JEFATURA GRUPO OFICINA DE REGISTRO
	65	REGISTRO
	66	REGISTRO
	67	JEFATURA ATENCION AL CIUDADANO

ENTREGA:
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CRS

RECIBE:
ERIKA PATRICIA VIZCAINO HERRERA
SUPERVISORA DEL CONTRATO

ING. ANA MARIA OCAMPO E.
INGENIERO DE APOYO

FECHA DE IDENTIFICACION DE LA MANIJA

RESPONSABLES:

CARLOS AMAYA

MANUEL VELASQUEZ

ERIKA VIZCAINO

ANA MARIA OCAMPO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
3,6	MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPAS CON MANIJA EN ACERO INOXIDABLE	50
✓ 3,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA PARA PUERTA INCLUYE DOS LLAVES	35
3,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA PARA ESCRITORIO, ARCHIVADORES VERTICALES Y HORIZONTALES INCLUYE DOS LLAVES	80

PISO	DEPENDENCIA	NOMBRE FUNCIONARIO	FIRMA FECHA DE IDENTIFICACION	FIRMA FECHA DE CAMBIO
5	J. Aerocomercial	Gladis Bustamante	(1) llave 39521449	09/12/19
5	J.V. Aerocomercial	Carmen Helena Hernandez	(1) llave 5233.570	09/12/19
5	J.N. Aeronauticas	Soley Sanjuanelo	(1) llave 39786975	09/12/19
5	J.E sectoriales	Jorge A. Quintana	(1) llave 4242858	09/12/19
5	O.A Direccion General	Camilo Ramirez	(1) llave	09/12/19
5	O.A Direccion General	Miguel A. Gomez	(1) llave 3223739	09/12/19
4	J.Asistencia legal	Juan M. V. Borzon	(1) llave	09/12/19
4	S. Ernesto Sanler	Vaneza Boutista	(1) llave	09/12/19
4	A.O. Comercializacion	Estefani Martinez	(1) llave	09/12/19
4	J.O Comercializacion e inversion	Estefani Martinez	(1) llave	09/12/19
3	J.E Planes maestros Aeropuertos no concesionados	Liz Sanchez	(1) llave 2246761	09/12/19
2	O. Talento Humano	Amparo osorio	(1) llave 39688750	09/12/19
2	coordinacion Gestion Social	Beth Calderon	(1) llave	09/12/19
2	J.G supervision Aeropuertuaria		(1) llave 52.025.415	09/12/19
2	J.G contabilidad	Boris ortiz	(1) llave 79045089	09/12/19
2	Tesoreria	Judith sotomonte	(1) llave 51565327	09/12/19
	J.G de Presupuesto	Armando Robiro	(1) llave 79905253	9/12-19
1	J.O registro	Claudia Martinez	(1) llave	09/12/19 52787734
1	Registro	Leticia Cotoño	(1) llave	09/12/19 51906336
1	registro	leticia Cotoño	(1) llave	09/12/19 51906336
1	J.G Atencion al ciudadano	Gloria Jimenez	(1) llave	09/12/19 41735012

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
CONTRATO DE OBRA: 19001111 H4 de 2019

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL -NEAA Y NAA.

ACTA DE ENTREGA


16	Diciembre	2019

CONTRATISTA
CONSORCIO CRS
SUPERVISORA:
ERIKA VIZCAINO HERRERA
FECHA INICIAL: DESDE 24/10/2019
PLAZO FINAL: HASTA EL 20/12/2019


ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
3.9	Suministro e instalación de chapa para escritorio, archivadores verticales y horizontales incluye dos llaves	UND	80

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES

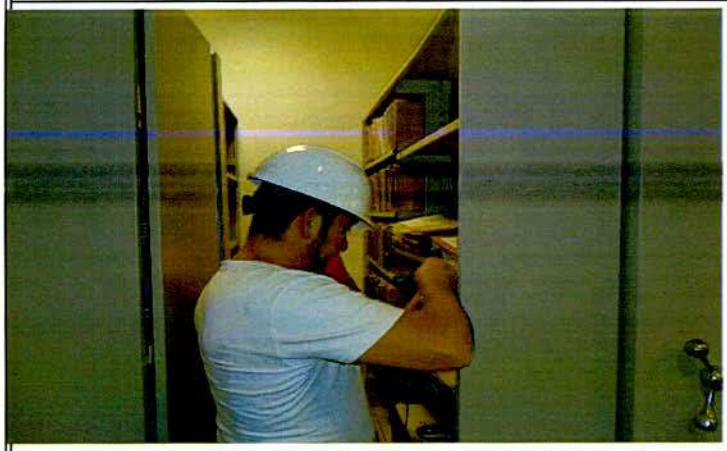

DESPUES

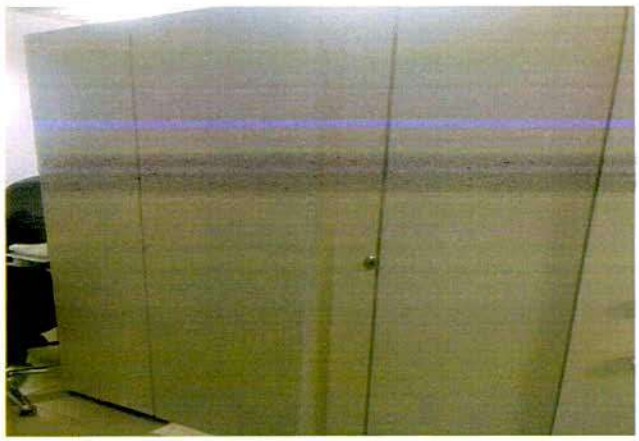

Cantidad	Lugar	Observaciones
80,00	Pisos 1, 2, 3, 4 y 5	Cambio (ver relación de entrega adjunta)

TOTAL 80,00

CONTRATISTA	SUPERVISION
CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL CONSORCIO CRS	ERIKA VIZCAINO HERRERA

CONTRATO	19001111 H4 de 2019
OBJETO	REALIZAR MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO BAJO LA MODALIDAD OUTSOURCING EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO SUMINISTRO MATERIALES MANO DE OBRA INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS AEROCIVIL NEAA, CEA Y NAA (LOTE 1)
CONTRATISTA	CONSORCIO CRS
SUPERVISION	ERIKA PATRICIA VIZCAINO HERRERA

NOS PERMITIMOS HACER ENTREGA DE LA RELACION DE CHAPAS INSTALADAS EN ESCRITORIOS SEGÚN LA RELACION DE LA NECESIDAD INDICADA POR EL ADMINISTRADOR. SE ANEXA FORMATO EN DONDE SE RELACIONAEL PISO, LA DEPENDENCIA, EL NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y LA FECHA DE CAMBIO DE LAS MISMAS.

ENTREGA:
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CRS

RECIBE:
ERIKA PATRICIA VIZCAINO HERRERA
SUPERVISORA DEL CONTRATO

ING. ANA MARIA OCAMPO E.
INGENIERO DE APOYO

FECHA DE IDENTIFICACION DE LA MANIJA _____

RESPONSABLES:

CARLOS AMAYA

MANUEL VELASQUEZ

ERIKA VIZCAINO

ANA MARIA OCAMPO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
3,6	MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPAS CON MANIJA EN ACERO INOXIDABLE	50
3,8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA PARA PUERTA INCLUYE DOS LLAVES	35
3,9	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA PARA ESCRITORIO, ARCHIVADORES VERTICALES Y HORIZONTALES INCLUYE DOS LLAVES	80 ✓

PISO	DEPENDENCIA	NOMBRE FUNCIONARIO	FIRMA FECHA DE IDENTIFICACION	FIRMA FECHA DE CAMBIO
5	G.S Aerocomer	Ruby de la Espriella	F-4 Pines.	09/12/19
5	O.N. Aerocomer	Juan Carlos Tarazona		09/12/19
5	Of. Trans. Aereo	Cristhan Camilo Arévalo		09/12/19
5	Of. transp Aereo	Maritza Gomez T	1 Pin	09/12/2019.
5	Of. transporte Aero	Elsa Salazar Cruz		09-12-2019
5	Of transporte A	Ely Herrera S.		09-12-2019 + 3 Cerraduras
5	Dirección General	Tatiana Bernal	Fieles.	09-12-2019 2 Cerraduras.
5	Dir. Gral.	Jaide Acevedo D		09-12-2019 2 Cerraduras
5	Subdirección	Miguel Angel Gomez		09-12-2019 2 Cerraduras.
3	Ctas x Pagar	Adriana Bonilla Guzman		09-12-2019
3	Cartera	Viviana P. Viloria		10-12-2019 2 Cerraduras
3	CARTERA	Alberto CARDONA	Falta Pin Fun Pin	10-12-2019
3	Cartera	Angela Bonilla		10-12-2019 (2 Cerraduras
3	CxP	Johanna Morales		10-12-2019 3.
3	CxP.	Soletibardo Rodriguez Moreno.		10-12-2019 (2 cerraduras
3	CxP	Fabian Ortiz Hurtado		10-12-2019 (1 cerradura
3	CxP.	Fabiola Elena Acosta Dominguez.		10-12-2019 (2 cerraduras Bronce
3	SEI	Jorge Alvarado	Falta pines.	F10-12-19
3	SEI	Humberto Romero	~~1 pin~~	" "
3	SEI	Adriana Estrada	3 Pines.	" "
3	SEI	Hernan Reyes.		" "
3	SEI	Henry Gamboa.		" "
3	SEI.	— — —	— — —	" "
3	D. Adm.	Demetrio Gonzalez Anaya	Falta 2 Pines	10/12/2019 2 cerraduras.
3	DA-656.	Erika Vizcaino		10/12/2019 * 2 Cerraduras
1	Regist	Claudia M		10-12-19
1	Registro.	Juan David Mora Pinzon	~~Falta Pin~~	10/12/2019.
1	REGISTRO	Pedro Cortes	Falta 1 Pin	DIC-10/19

110

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
CONTRATO DE OBRA: 19001111 H4 de 2019

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL -NEAA Y NAA.

ACTA DE ENTREGA

16	Diciembre	2019

CONTRATISTA :
CONSORCIO CRS
SUPERVISORA:
ERIKA VIZCAINO HERRERA
FECHA INICIAL: DESDE 24/10/2019
PLAZO FINAL: HASTA EL 20/12/2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
4.1	Limpieza e impermeabilizacion de muros de alta resistencia con suministro e instalación de pintura vinilo tipo 1-3 manos incluye resane, filos y dilataciones, incluye pintura obras de remodelacion.	M2	342,19

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES



Largo	Alto	Area	Lugar	Observaciones
23,58	3,05	71,92	Pasillo primer piso oriente	Cielo raso
23,67	2,91	68,88	Pasillo primer piso oriente	Muros
2,83	2,91	8,23	Pasillo primer piso oriente	Muros
0,12	2,91	0,35	Pasillo primer piso oriente	Muros
0,73	0,65	0,47	Pasillo primer piso oriente	Muros
0,73	0,65	0,47	Pasillo primer piso oriente	Muros
0,60	2,91	1,75	Pasillo primer piso oriente	Muros
0,74	2,32	-1,72	Pasillo primer piso oriente	Descuento puerta
0,95	2,32	-2,20	Pasillo primer piso oriente	Descuento puerta
0,95	2,32	-2,20	Pasillo primer piso oriente	Descuento puerta
0,94	2,32	-2,18	Pasillo primer piso oriente	Descuento puerta
1,04	2,32	-2,41	Pasillo primer piso oriente	Descuento puerta
1,80	2,31	-4,16	Pasillo primer piso oriente	Descuento puerta
1,81	2,31	-4,18	Pasillo primer piso oriente	Descuento puerta
7,90	9,57	75,60	pasillo primer piso centro	Cielo raso
0,60	1,15	-0,69	pasillo primer piso centro	Descuento techo
0,62	1,07	-0,66	pasillo primer piso centro	Descuento techo
5,83	4,62	-26,93	pasillo primer piso centro	Descuento techo
4,40	2,95	12,98	pasillo primer piso occidente	Cielo raso
4,28	2,26	9,67	pasillo primer piso occidente	Cielo raso
10,76	3,24	34,86	pasillo primer piso occidente	Cielo raso
13,02	1,64	21,35	pasillo primer piso occidente	Cielo raso
2,00	0,30	-0,60	pasillo primer piso occidente	Descuento techo
0,28	0,78	-0,22	pasillo primer piso occidente	Descuento techo
0,60	0,60	-0,36	pasillo primer piso occidente	Descuento techo

C/PA

0,60	0,60	-0,36	pasillo primer piso occidente	Descuento techo
0,60	0,60	-0,36	pasillo primer piso occidente	Descuento techo
0,60	0,60	-0,36	pasillo primer piso occidente	Descuento techo
0,60	0,60	-0,36	pasillo primer piso occidente	Descuento techo
0,60	0,60	-0,36	pasillo primer piso occidente	Descuento techo
0,60	0,60	-0,36	pasillo primer piso occidente	Descuento techo
0,60	0,60	-0,36	pasillo primer piso occidente	Descuento techo
0,60	0,60	-0,36	pasillo primer piso occidente	Descuento techo
0,60	0,60	-0,36	pasillo primer piso occidente	Descuento techo
0,60	0,60	-0,36	pasillo primer piso occidente	Descuento techo
0,60	0,60	-0,36	pasillo primer piso occidente	Descuento techo
0,60	0,60	-0,36	pasillo primer piso occidente	Descuento techo
0,60	0,60	-0,36	pasillo primer piso occidente	Descuento techo
0,60	0,30	-0,18	pasillo primer piso occidente	Descuento techo
1,20	0,30	-0,36	pasillo primer piso occidente	Descuento techo
0,60	0,60	-0,36	pasillo primer piso occidente	Descuento techo
0,60	0,60	-0,36	pasillo primer piso occidente	Descuento techo
4,40	2,91	12,80	pasillo primer piso occidente	Muros
4,40	2,91	12,80	pasillo primer piso occidente	Muros
3,01	2,91	8,76	pasillo primer piso occidente	Muros
2,26	0,61	1,38	pasillo primer piso occidente	Muros
4,28	2,91	12,45	pasillo primer piso occidente	Muros
4,28	2,91	12,45	pasillo primer piso occidente	Muros
10,76	2,91	31,31	pasillo primer piso occidente	Muros
0,65	0,72	0,47	pasillo primer piso occidente	Muros
0,65	0,75	0,49	pasillo primer piso occidente	Muros
2,00	0,96	-1,92	pasillo primer piso occidente	Descuento muro
3,26	2,32	-7,56	pasillo primer piso occidente	Descuento muro
2,00	2,30	-4,60	pasillo primer piso occidente	Descuento muro
1,98	2,34	-4,63	pasillo primer piso occidente	Descuento muro
0,94	2,34	-2,20	pasillo primer piso occidente	Descuento muro
0,94	2,34	-2,20	pasillo primer piso occidente	Descuento muro
1,89	2,51	-4,74	pasillo primer piso occidente	Descuento muro
0,90	2,00	-1,80	pasillo primer piso occidente	Descuento muro
4,05	2,51	-10,17	pasillo primer piso occidente	Descuento muro
1,97	2,91	5,73	pasillo primer piso occidente	Muros
2,14	2,91	6,23	pasillo primer piso occidente	Muros
5,38	2,91	15,66	pasillo primer piso occidente	Muros
0,78	2,91	2,27	pasillo primer piso occidente	Muros
2,45	2,91	7,13	pasillo primer piso occidente	Muros

PISO 1

TOTAL 342,19

CONTRATISTA	SUPERVISION
CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL CONSORCIO CRS	ERIKA VIZCAINO HERRERA

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
CONTRATO DE OBRA: 19001111 H4 de 2019

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL -NEAA Y NAA.

ACTA DE ENTREGA


16	Diciembre	2019

CONTRATISTA :
CONSORCIO CRS
SUPERVISORA:
ERIKA VIZCAINO HERRERA
FECHA INICIAL: DESDE 24/10/2019
PLAZO FINAL: HASTA EL 20/12/2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
4.2	Resane en filos y dilataciones y pintura si es el caso	ML	440,45

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES

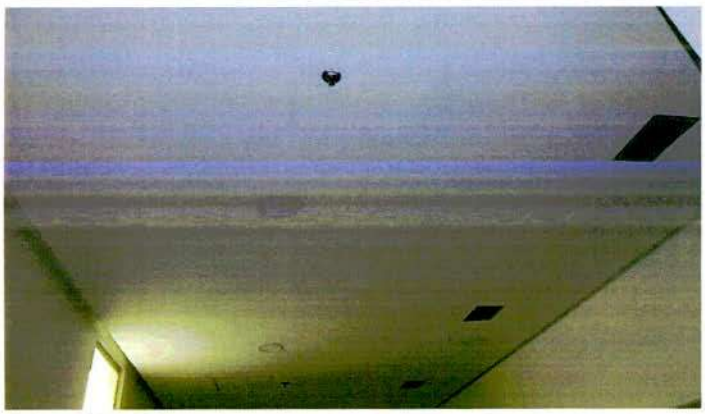

DESPUES



Largo	Cantidad	Subtotal	Lugar	Observaciones
87,88	1,00	87,88	Baño mujeres piso 5	Muros
92,16	1,00	92,16	Baño hombres piso 5	Muros
45,72	1,00	45,72	Pasillo primer piso oriente	Guarda escoba
34,98	1,00	34,98	Pasillo primer piso oriente	Techo
27,72	1,00	27,72	Pasillo primer piso oriente	Techo
2,60	1,00	2,60	Pasillo primer piso ocidente	Techo
67,67	1,00	67,67	Pasillo primer piso ocidente	Muros
40,92	1,00	40,92	Pasillo primer piso ocidente	Guarda escoba
0,80	2,00	1,60	Recepción	Mueble
0,80	3,00	2,40	Recepción	Mueble
0,80	2,00	1,60	Recepción	Mueble
0,80	4,00	3,20	Recepción	Mueble
1,10	3,00	3,30	Recepción	Mueble
0,80	2,00	1,60	Recepción	Mueble
0,80	3,00	2,40	Recepción	Mueble
2,76	3,00	8,28	Recepción	Mueble
2,44	3,00	7,32	Recepción	Mueble
2,66	3,00	7,98	Recepción	Mueble
0,30	1,00	0,30	Recepción	Mueble
0,82	1,00	0,82	Recepción	Mueble

TOTAL **440,45**

CONTRATISTA	SUPERVISION
CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL CONSORCIO CRS	ERIKA VIZCAINO HERRERA

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
CONTRATO DE OBRA: 19001111 H4 de 2019

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL -NEAA Y NAA.

ACTA DE ENTREGA


16	Diciembre	2019

CONTRATISTA :
CONSORCIO CRS
SUPERVISORA:
ERIKA VIZCAINO HERRERA
FECHA INICIAL: DESDE 24/10/2019
PLAZO FINAL: HASTA EL 20/12/2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
4.3	Resane y pintura vinilo tipo 1 en muro de Superboard interno y externo	M2	584,98

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES

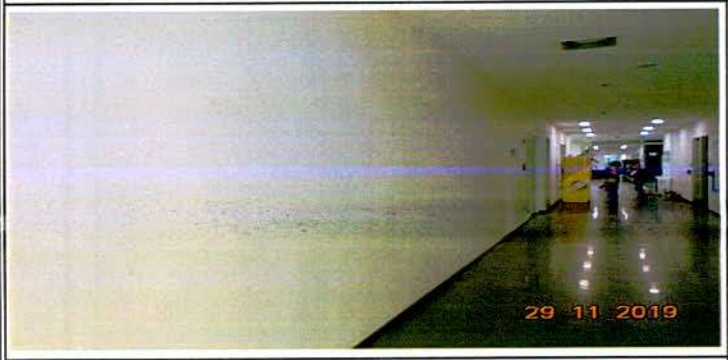



DESPUES





Largo	Alto	Area	Lugar	Observaciones
0,76	2,91	2,21	Piso 3 oocidente (nuevos puestos de trabajo)	Muros
4,93	2,91	14,35	Piso 3 oocidente (nuevos puestos de trabajo)	Muros
6,72	2,91	19,56	Piso 3 oocidente (nuevos puestos de trabajo)	Muros
46,37	1,15	53,33	Baño mujeres piso 5	Muros
46,12	1,15	53,04	Baño mujeres piso 4	Muros
46,12	1,15	53,04	Baño mujeres piso 3	Muros
46,12	1,15	53,04	Baño mujeres piso 2	Muros
46,12	1,15	53,04	Baño mujeres piso 1	Muros
46,08	1,15	52,99	Baño hombres piso 5	Muros
46,12	1,15	53,04	Baño hombres piso 4	Muros
46,12	1,15	53,04	Baño hombres piso 3	Muros
46,12	1,15	53,04	Baño hombres piso 2	Muros
46,12	1,15	53,04	Baño hombres piso 1	Muros
6,50	0,80	5,20	Piso 1 recepción	Mueble recepción
6,50	0,80	5,20	Piso 1 recepción	Mueble recepción
0,60	0,80	0,48	Piso 1 recepción	Mueble recepción
0,80	0,82	0,66	Piso 1 recepción	Mueble recepción
0,80	0,70	0,56	Piso 1 recepción	Mueble recepción
0,80	0,70	0,56	Piso 1 recepción	Mueble recepción

OJRA

0,80	0,82	0,66	Piso 1 recepción	Mueble recepción
0,80	0,82	0,66	Piso 1 recepción	Mueble recepción
0,80	0,70	0,56	Piso 1 recepción	Mueble recepción
0,83	1,00	0,83	Piso 1 recepción	Mueble recepción
0,83	1,00	0,83	Piso 1 recepción	Mueble recepción
2,66	0,76	2,02	Piso 1 recepción	Mueble recepción

TOTAL **584,98**

CONTRATISTA	**SUPERVISION**
CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL CONSORCIO CRS	ERIKA VIZCAINO HERRERA

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
CONTRATO DE OBRA: 19001111 H4 de 2019

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL -NEAA Y NAA.

ACTA DE ENTREGA

16	Diciembre	2019

CONTRATISTA :
CONSORCIO CRS
SUPERVISORA:
ERIKA VIZCAINO HERRERA
FECHA INICIAL: DESDE 24/10/2019
PLAZO FINAL: HASTA EL 20/12/2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
4.4	Suminsitro e instalación de pintura de muros exteriores con koraza dos manos, incluye rasqueteo de puntos con humedad, sello y aplicación de pintura color similar al existente.	M2	52,43

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES



Largo	Alto	Area	Lugar	Observaciones
90,40	0,58	52,43	Reja cerramiento y sardinel	Antepecho base costado sur acceso parqueadero sotano

TOTAL 52,43

CONTRATISTA	SUPERVISION
CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL CONSORCIO CRS	ERIKA VIZCAINO HERRERA

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
CONTRATO DE OBRA: 19001111 H4 de 2019

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL -NEAA Y NAA.

ACTA DE ENTREGA

16	Diciembre	2019

CONTRATISTA :
CONSORCIO CRS
SUPERVISORA:
ERIKA VIZCAINO HERRERA
FECHA INICIAL: DESDE 24/10/2019
PLAZO FINAL: HASTA EL 20/12/2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
4.5	Suministro e instalacion Pintura cielo raso en vinilo, en baños	M2	440,1

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES



Largo	Alto	Area	Lugar		Observaciones
0,35	0,99	0,35	Baño hombres	PISO 1	Cielo raso
2,25	2,83	6,37	Baño hombres		Cielo raso
1,99	2,30	4,58	Baño hombres		Cielo raso
0,13	1,08	-0,14	Baño hombres		Cielo raso
3,93	7,37	28,96	Baño hombres		Cielo raso
1,71	1,50	2,57	Baño hombres		Cielo raso
1,40	0,94	1,32	Baño hombres		Cielo raso
0,35	0,99	0,35	Baño mujeres		Cielo raso
2,25	2,83	6,37	Baño mujeres		Cielo raso
1,99	2,30	4,58	Baño mujeres		Cielo raso
0,13	1,08	-0,14	Baño mujeres		Cielo raso
3,93	7,37	28,96	Baño mujeres		Cielo raso
1,71	1,50	2,57	Baño mujeres		Cielo raso
1,40	0,94	1,32	Baño mujeres		Cielo raso
0,35	0,99	0,35	Baño hombres	PISO 2	Cielo raso
2,25	2,83	6,37	Baño hombres		Cielo raso
1,99	2,30	4,58	Baño hombres		Cielo raso
0,13	1,08	-0,14	Baño hombres		Cielo raso
3,93	7,37	28,96	Baño hombres		Cielo raso
1,71	1,50	2,57	Baño hombres		Cielo raso
1,40	0,94	1,32	Baño hombres		Cielo raso
0,35	0,99	0,35	Baño mujeres		Cielo raso
2,25	2,83	6,37	Baño mujeres		Cielo raso
1,99	2,30	4,58	Baño mujeres		Cielo raso
0,13	1,08	-0,14	Baño mujeres		Cielo raso
3,93	7,37	28,96	Baño mujeres		Cielo raso
1,71	1,50	2,57	Baño mujeres		Cielo raso

1,40	0,94	1,32	Baño mujeres		Cielo raso
0,35	0,99	0,35	Baño hombres		Cielo raso
2,25	2,83	6,37	Baño hombres		Cielo raso
1,99	2,30	4,58	Baño hombres		Cielo raso
0,13	1,08	-0,14	Baño hombres		Cielo raso
3,93	7,37	28,96	Baño hombres		Cielo raso
1,71	1,50	2,57	Baño hombres		Cielo raso
1,40	0,94	1,32	Baño hombres		Cielo raso
0,35	0,99	0,35	Baño mujeres		Cielo raso
2,25	2,83	6,37	Baño mujeres		Cielo raso
1,99	2,30	4,58	Baño mujeres		Cielo raso
0,13	1,08	-0,14	Baño mujeres		Cielo raso
3,93	7,37	28,96	Baño mujeres		Cielo raso
1,71	1,50	2,57	Baño mujeres		Cielo raso
1,40	0,94	1,32	Baño mujeres	PISO 3	Cielo raso
0,35	0,99	0,35	Baño hombres		Cielo raso
2,25	2,83	6,37	Baño hombres		Cielo raso
1,99	2,30	4,58	Baño hombres		Cielo raso
0,13	1,08	-0,14	Baño hombres		Cielo raso
3,93	7,37	28,96	Baño hombres		Cielo raso
1,71	1,50	2,57	Baño hombres		Cielo raso
1,40	0,94	1,32	Baño hombres		Cielo raso
0,35	0,99	0,35	Baño mujeres		Cielo raso
2,25	2,83	6,37	Baño mujeres		Cielo raso
1,99	2,30	4,58	Baño mujeres		Cielo raso
0,13	1,08	-0,14	Baño mujeres		Cielo raso
3,93	7,37	28,96	Baño mujeres		Cielo raso
1,71	1,50	2,57	Baño mujeres		Cielo raso
1,40	0,94	1,32	Baño mujeres	PISO 4	Cielo raso
0,35	0,99	0,35	Baño hombres		Cielo raso
2,25	2,83	6,37	Baño hombres		Cielo raso
1,99	2,30	4,58	Baño hombres		Cielo raso
0,13	1,08	-0,14	Baño hombres		Cielo raso
3,93	7,37	28,96	Baño hombres		Cielo raso
1,71	1,50	2,57	Baño hombres		Cielo raso
1,40	0,94	1,32	Baño hombres		Cielo raso
0,35	0,99	0,35	Baño mujeres		Cielo raso
2,25	2,83	6,37	Baño mujeres		Cielo raso
1,99	2,30	4,58	Baño mujeres		Cielo raso
0,13	1,08	-0,14	Baño mujeres		Cielo raso
3,93	7,37	28,96	Baño mujeres		Cielo raso
1,71	1,50	2,57	Baño mujeres		Cielo raso
1,40	0,94	1,32	Baño mujeres		Cielo raso
0,35	0,99	0,35	Baño hombres		Cielo raso
2,25	2,83	6,37	Baño hombres		Cielo raso
1,99	2,30	4,58	Baño hombres		Cielo raso
0,13	1,08	-0,14	Baño hombres		Cielo raso
3,93	7,37	28,96	Baño hombres		Cielo raso
1,71	1,50	2,57	Baño hombres		Cielo raso
1,40	0,94	1,32	Baño hombres		Cielo raso
0,35	0,99	0,35	Baño mujeres		Cielo raso
2,25	2,83	6,37	Baño mujeres		Cielo raso
1,99	2,30	4,58	Baño mujeres		Cielo raso
0,13	1,08	-0,14	Baño mujeres		Cielo raso
3,93	7,37	28,96	Baño mujeres		Cielo raso
1,71	1,50	2,57	Baño mujeres		Cielo raso
1,40	0,94	1,32	Baño mujeres	PISO 5	Cielo raso

TOTAL **440,10**

CONTRATISTA

CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL
CONSORCIO CRS

SUPERVISION

ERIKA VIZCAINO HERRERA

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
CONTRATO DE OBRA: 19001111 H4 de 2019

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL -NEAA Y NAA.

ACTA DE ENTREGA

16	Diciembre	2019

CONTRATISTA :
CONSORCIO CRS
SUPERVISORA:
ERIKA VIZCAINO HERRERA
FECHA INICIAL: DESDE 24/10/2019
PLAZO FINAL: HASTA EL 20/12/2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
4.6	Suministro e instalacion de Pintura cielo raso en vinilo, en baños	ML	922,82

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES



Largo	Cantidad	Subtotal	Lugar	Observaciones
46,37	2,00	92,74	Baño mujeres piso 5	Cielo raso
46,12	2,00	92,24	Baño mujeres piso 4	Cielo raso
46,12	2,00	92,24	Baño mujeres piso 3	Cielo raso
46,12	2,00	92,24	Baño mujeres piso 2	Cielo raso
46,12	2,00	92,24	Baño mujeres piso 1	Cielo raso
46,08	2,00	92,16	Baño hombres piso 5	Cielo raso
46,12	2,00	92,24	Baño hombres piso 4	Cielo raso
46,12	2,00	92,24	Baño hombres piso 3	Cielo raso
46,12	2,00	92,24	Baño hombres piso 2	Cielo raso
46,12	2,00	92,24	Baño hombres piso 1	Cielo raso
TOTAL		922,82		

CONTRATISTA	SUPERVISION
CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL CONSORCIO CRS	ERIKA VIZCAINO HERRERA

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
CONTRATO DE OBRA: 19001111 H4 de 2019

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL -NEAA Y NAA.

ACTA DE ENTREGA

16	Diciembre	2019

CONTRATISTA :
CONSORCIO CRS
SUPERVISORA:
ERIKA VIZCAINO HERRERA
FECHA INICIAL: DESDE 24/10/2019
PLAZO FINAL: HASTA EL 20/12/2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
6.1	Mantenimiento y/o aplicación de producto en juntas de dilatacion	M2	77,04

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES



Largo	Ancho	Area	Lugar	Observaciones
50,68	0,15	7,60	Baño mujeres piso 5	Piso
53,41	0,15	8,01	Baño mujeres piso 4	Piso
53,41	0,15	8,01	Baño mujeres piso 3	Piso
53,41	0,15	8,01	Baño mujeres piso 2	Piso
53,41	0,15	8,01	Baño mujeres piso 1	Piso
53,05	0,15	7,96	Baño hombres piso 5	Piso
49,04	0,15	7,36	Baño hombres piso 4	Piso
49,04	0,15	7,36	Baño hombres piso 3	Piso
49,04	0,15	7,36	Baño hombres piso 2	Piso
49,04	0,15	7,36	Baño hombres piso 1	Piso

TOTAL 77,04

CONTRATISTA	SUPERVISION
CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL CONSORCIO CRS	ERIKA VIZCAINO HERRERA

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
CONTRATO DE OBRA: 19001111 H4 de 2019

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL -NEAA Y NAA.

ACTA DE ENTREGA

16	Diciembre	2019

CONTRATISTA :
CONSORCIO CRS.
SUPERVISORA:
ERIKA VIZCAINO HERRERA
FECHA INICIAL: DESDE 24/10/2019
PLAZO FINAL: HASTA EL 20/12/2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
6.3	Retiro de enchape de piletas lavatraperos.	M2	20

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES



Largo	Alto	Area	Lugar	Observaciones
2,04	0,98	2,00	Baño mujeres piso 5	Enchape pileta
2,04	0,98	2,00	Baño mujeres piso 4	Enchape pileta
2,04	0,98	2,00	Baño mujeres piso 3	Enchape pileta
2,04	0,98	2,00	Baño mujeres piso 2	Enchape pileta
2,04	0,98	2,00	Baño mujeres piso 1	Enchape pileta
2,04	0,98	2,00	Baño hombres piso 5	Enchape pileta
2,04	0,98	2,00	Baño hombres piso 4	Enchape pileta
2,04	0,98	2,00	Baño hombres piso 3	Enchape pileta
2,04	0,98	2,00	Baño hombres piso 2	Enchape pileta
2,04	0,98	2,00	Baño hombres piso 1	Enchape pileta

TOTAL 20,00

CONTRATISTA	SUPERVISION
CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL CONSORCIO CRS	ERIKA VIZCAINO HERRERA

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
CONTRATO DE OBRA: 19001111 H4 de 2019

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL -NEAA Y NAA.

ACTA DE ENTREGA

16	Diciembre	2019

CONTRATISTA :
CONSORCIO CRS
SUPERVISORA:
ERIKA VIZCAINO HERRERA
FECHA INICIAL: DESDE 24/10/2019
PLAZO FINAL: HASTA EL 20/12/2019


ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
6.4	Suministro e instalación de enchape de piletas lavatraperos.	M2	20

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES

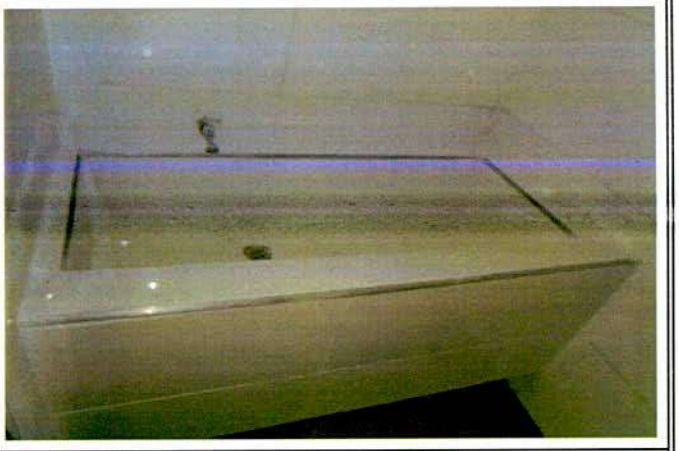

Largo	Alto	Area	Lugar	Observaciones
2,04	0,98	2,00	Baño mujeres piso 5	Enchape pileta
2,04	0,98	2,00	Baño mujeres piso 4	Enchape pileta
2,04	0,98	2,00	Baño mujeres piso 3	Enchape pileta
2,04	0,98	2,00	Baño mujeres piso 2	Enchape pileta
2,04	0,98	2,00	Baño mujeres piso 1	Enchape pileta
2,04	0,98	2,00	Baño hombres piso 5	Enchape pileta
2,04	0,98	2,00	Baño hombres piso 4	Enchape pileta
2,04	0,98	2,00	Baño hombres piso 3	Enchape pileta
2,04	0,98	2,00	Baño hombres piso 2	Enchape pileta
2,04	0,98	2,00	Baño hombres piso 1	Enchape pileta

TOTAL 20,00

CONTRATISTA	SUPERVISION
CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL CONSORCIO CRS	ERIKA VIZCAINO HERRERA

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
CONTRATO DE OBRA: 19001111 H4 de 2019

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL -NEAA Y NAA.

ACTA DE ENTREGA

16	Diciembre	2019

CONTRATISTA :
CONSORCIO CRS
SUPERVISORA:
ERIKA VIZCAINO HERRERA
FECHA INICIAL: DESDE 24/10/2019
PLAZO FINAL: HASTA EL 20/12/2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
8.4	Suministro e instralacion de Pelicula samblasteada con logo de la aerocivil para vidrios en zonas de acceso	M2	65,74

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES



Largo	Alto	Area	Lugar	Observaciones
7,16	1,00	7,16	Puerta principal piso 1	Logo sanblasting sobre vidrio (frost)
13,92	1,00	13,92	Puerta principal 2 piso 1	Logo sanblasting sobre vidrio (frost)
5,84	1,00	5,84	Torniquetes de entrada piso 1	Logo sanblasting sobre vidrio (frost)
4,92	1,00	4,92	Puerta en vidrio correspondencia piso 1	Logo sanblasting sobre vidrio (frost)
2,88	1,00	2,88	Puertas piso 2 oriente	Logo sanblasting sobre vidrio (frost)
2,88	1,00	2,88	Puertas piso 2 occidente	Logo sanblasting sobre vidrio (frost)
2,88	1,00	2,88	Puertas piso 3 oriente	Logo sanblasting sobre vidrio (frost)
2,88	1,00	2,88	Puertas piso 3 occidente	Logo sanblasting sobre vidrio (frost)
2,88	1,00	2,88	Puertas piso 4 oriente	Logo sanblasting sobre vidrio (frost)
2,88	1,00	2,88	Puertas piso 4 occidente	Logo sanblasting sobre vidrio (frost)
3,02	1,00	3,02	Puertas piso 5 oriente	Logo sanblasting sobre vidrio (frost)
3,02	1,00	3,02	Puertas piso 5 occidente	Logo sanblasting sobre vidrio (frost)
1,75	1,00	1,75	Puerta piso 1 occidente	Logo sanblasting sobre vidrio (frost)
1,75	1,00	1,75	Puertas cafeteria piso 1	Logo sanblasting sobre vidrio (frost)
0,58	1,00	0,58	Puerta sala de juntas piso 1 (frente a urna de cristal)	Logo sanblasting sobre vidrio (frost)
0,58	1,00	0,58	Puerta archivo piso 1 (frente a urna de cristal)	Logo sanblasting sobre vidrio (frost)
5,92	1,00	5,92	Vidrios sala de juntas piso 5	Logo sanblasting sobre vidrio (frost)

TOTAL **65,74**

CONTRATISTA	SUPERVISION
CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL CONSORCIO CRS	ERIKA VIZCAINO HERRERA

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
CONTRATO DE OBRA: 19001111 H4 de 2019

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL -NEAA Y NAA.

ACTA DE ENTREGA

16	Diciembre	2019

CONTRATISTA:
CONSORCIO CRS
SUPERVISORA:
ERIKA VIZCAINO HERRERA
FECHA INICIAL: DESDE 24/10/2019
PLAZO FINAL: HASTA EL 20/12/2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
9.3	Mantenimiento pintura de puertas metal madera que icluye: tableros lamina de acero inoxidable visagras y marco en lámina.	M2	31,57

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES



Largo	Alto	Lados	Area	Lugar	Observaciones
0,94	2,40	2,00	4,51	Baño hombres piso 1	Puerta
0,94	2,40	2,00	4,51	Baño hombres piso 2	Puerta
0,94	2,40	2,00	4,51	Baño hombres piso 3	Puerta
0,94	2,40	2,00	4,51	Baño hombres piso 4	Puerta
0,94	2,40	2,00	4,51	Baño hombres piso 5	Puerta
0,94	2,40	2,00	4,51	Baño hombres piso 6	Puerta
0,94	2,40	2,00	4,51	Baño hombres piso 7	Puerta

TOTAL **31,57**

CONTRATISTA	SUPERVISION
CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL CONSORCIO CRS	ERIKA VIZCAINO HERRERA

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
CONTRATO DE OBRA: 19001111 H4 de 2019

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL -NEAA Y NAA.

ACTA DE ENTREGA

16	Diciembre	2019

CONTRATISTA:
CONSORCIO CRS
SUPERVISORA:
ERIKA VIZCAINO HERRERA
FECHA INICIAL: DESDE 24/10/2019
PLAZO FINAL: HASTA EL 20/12/2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
10.6	Mantenimiento de cajas de inspección en general de aguas lluvias y aguas hervidas incluye retiro de lodos hasta botadero certificado	UND	12

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES



Cantidad	Lugar	Observaciones
1,00	Exterior del edificio costado sur	Caja de inspección
1,00	Exterior del edificio costado sur	Caja de inspección
1,00	Exterior del edificio costado sur	Caja de inspección
1,00	Exterior del edificio costado sur	Caja de inspección
1,00	Exterior del edificio costado sur	Caja de inspección
1,00	Exterior del edificio costado sur	Trampa de grasas
1,00	Exterior del edificio costado sur	Trampa de grasas
1,00	Exterior del edificio costado sur	Trampa de grasas
1,00	Exterior del edificio costado ocidental	Caja de inspección
1,00	Exterior del edificio costado ocidental	Caja de inspección
1,00	Exterior del edificio costado ocidental	Caja de inspección
1,00	Sotano parqueadero	Caja de inspección

TOTAL 12,00

CONTRATISTA	SUPERVISION
CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL CONSORCIO CRS	ERIKA VIZCAINO HERRERA

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
CONTRATO DE OBRA: 19001111 H4 de 2019

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL -NEAA Y NAA.

ACTA DE ENTREGA

16	Diciembre	2019

CONTRATISTA : CONSORCIO CRS
SUPERVISORA: ERIKA VIZCAINO HERRERA
FECHA INICIAL: DESDE 24/10/2019
PLAZO FINAL: HASTA EL 20/12/2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
10.13	Mantenimiento de la tubería y cajas de inspección	ML	28,43

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES	DESPUES
	

Longitud	Lugar	Observaciones
3,00	Exterior del edificio costado oriental	Caja de inspección
2,50	Exterior del edificio costado ocidental	Caja de inspección
3,00	Exterior del edificio costado oriental	Caja de inspección
4,00	Exterior del edificio costado oriental	Caja de inspección
6,00	Exterior del edificio costado oriental	Caja de inspección
2,00	Exterior del edificio costado oriental	Caja de inspección
3,00	Exterior del edificio costado oriental	Caja de inspección
4,93	Carcamo entrada sotano parqueaderos	Carcamo

TOTAL 28,43

CONTRATISTA	SUPERVISION
CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL CONSORCIO CRS	ERIKA VIZCAINO HERRERA

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
CONTRATO DE OBRA: 19001111 H4 de 2019

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL -NEAA Y NAA.

ACTA DE ENTREGA

16	Diciembre	2019

CONTRATISTA : CONSORCIO CRS
SUPERVISORA: ERIKA VIZCAINO HERRERA
FECHA INICIAL: DESDE 24/10/2019
PLAZO FINAL: HASTA EL 20/12/2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
10.17	Mantenimiento de tuberia colgante con limpieza y traslado de lodos hasta botadero certificado	ML	1

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES



Longitud	Lugar	Observaciones
1,00	Sotano	Tuberia azul

TOTAL 1,00

CONTRATISTA	SUPERVISION
CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL CONSORCIO CRS	ERIKA VIZCAINO HERRERA

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
CONTRATO DE OBRA: 19001111 H4 de 2019

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL -NEAA Y NAA.

ACTA DE ENTREGA

16	Diciembre	2019

CONTRATISTA :
CONSORCIO CRS
SUPERVISORA:
ERIKA VIZCAINO HERRERA
FECHA INICIAL: DESDE 24/10/2019
PLAZO FINAL: HASTA EL 20/12/2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
10.20	Suministro e instalacion de llave ahorradora de paso de agua en piletas y areas externas	UND	7

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES



Cantidad	Lugar	Observaciones
7,00	Baños gimnasio y baño discapacitados hombres piso 3	Remplazo por deterioro

TOTAL **7,00**

CONTRATISTA	SUPERVISION
CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL CONSORCIO CRS	ERIKA VIZCAINO HERRERA

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
CONTRATO DE OBRA: 19001111 H4 de 2019

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL -NEAA Y NAA.

ACTA DE ENTREGA

16	Diciembre	2019

CONTRATISTA :
CONSORCIO CRS
SUPERVISORA:
ERIKA VIZCAINO HERRERA
FECHA INICIAL: DESDE 24/10/2019
PLAZO FINAL: HASTA EL 20/12/2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
10.22	Suministro e Instalacion de bizcocho sanitario	UND	5

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES



Cantidad	Lugar	Observaciones
5,00	Baño	Remplazo por deterioro

TOTAL 5,00

CONTRATISTA	SUPERVISION
CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL CONSORCIO CRS	ERIKA VIZCAINO HERRERA

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
CONTRATO DE OBRA: 19001111 H4 de 2019

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL -NEAA Y NAA.

ACTA DE ENTREGA

16	Diciembre	2019

CONTRATISTA :
CONSORCIO CRS
SUPERVISORA:
ERIKA VIZCAINO HERRERA
FECHA INICIAL: DESDE 24/10/2019
PLAZO FINAL: HASTA EL 20/12/2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
12.1	Destape de cañeria de punto sanitario, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato si se requiere.	UND	5

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES



Cantidad	Lugar	Observaciones
5,00	Baños almacen	

TOTAL 5,00

CONTRATISTA	SUPERVISION
CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL CONSORCIO CRS	ERIKA VIZCAINO HERRERA

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
CONTRATO DE OBRA: 19001111 H4 de 2019

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL -NEAA Y NAA.

ACTA DE ENTREGA

16	Diciembre	2019

CONTRATISTA :
CONSORCIO CRS
SUPERVISORA:
ERIKA VIZCAINO HERRERA
FECHA INICIAL: DESDE 24/10/2019
PLAZO FINAL: HASTA EL 20/12/2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
12.2	Destape de cañeria de punto orinal, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato si se requiere.	UND	2

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES



Cantidad	Lugar	Observaciones
2,00	Baños almacen	

TOTAL 2,00

CONTRATISTA	SUPERVISION
CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL CONSORCIO CRS	ERIKA VIZCAINO HERRERA

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
CONTRATO DE OBRA: 19001111 H4 de 2019

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL -NEAA Y NAA.

ACTA DE ENTREGA

16	Diciembre	2019

CONTRATISTA : CONSORCIO CRS
SUPERVISORA: ERIKA VIZCAINO HERRERA
FECHA INICIAL: DESDE 24/10/2019
PLAZO FINAL: HASTA EL 20/12/2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
13.4	Mantenimiento general de las baterias sanitarias (incluye sanitarios, lavamanos, orinales,)	UND	5

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES



Cantidad	Lugar	Observaciones
5,00	Baños almacen	Lavamanos

TOTAL 5,00

CONTRATISTA	SUPERVISION
CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL CONSORCIO CRS	ERIKA VIZCAINO HERRERA

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
CONTRATO DE OBRA: 19001111 H4 de 2019

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL -NEAA Y NAA.

ACTA DE ENTREGA

16	Diciembre	2019

CONTRATISTA :
CONSORCIO CRS
SUPERVISORA:
ERIKA VIZCAINO HERRERA
FECHA INICIAL: DESDE 24/10/2019
PLAZO FINAL: HASTA EL 20/12/2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
13.5	Suministro e instalación de fluxometros de cauerdo con las especificaciones tecnicas de los existentes	UND	2

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES



Cantidad	Lugar	Observaciones
1,00	Baño hombres piso 1	Reemplazo por deterioro
1,00	Baño mujeres piso 1	Reemplazo por deterioro

TOTAL 2,00

CONTRATISTA	SUPERVISION
CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL CONSORCIO CRS	ERIKA VIZCAINO HERRERA

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
CONTRATO DE OBRA: 19001111 H4 de 2019

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL -NEAA Y NAA.

ACTA DE ENTREGA


16	Diciembre	2019

CONTRATISTA :
CONSORCIO CRS
SUPERVISORA:
ERIKA VIZCAINO HERRERA
FECHA INICIAL: DESDE 24/10/2019
PLAZO FINAL: HASTA EL 20/12/2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
14.1	Mantenimiento tomas electricas de 110v y 220v	UND	19

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES

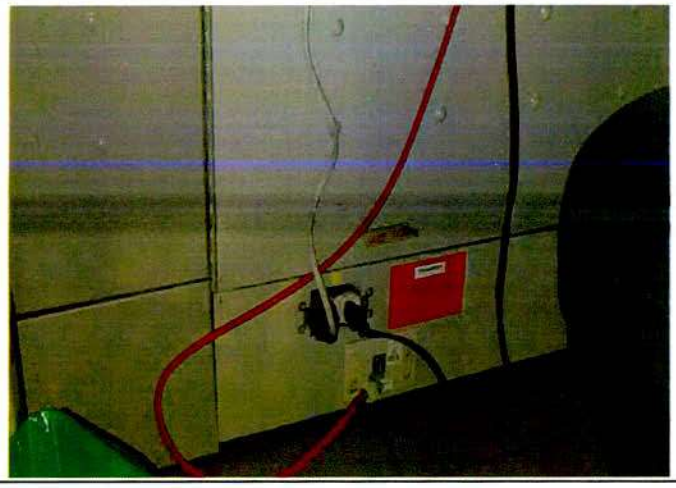

DESPUES



Cantidad	Lugar		Observaciones
1,00	Reservación judicial	Piso 4	Mantenimiento y cambio de tapa
8,00	Servicios generales	Piso 3	Mantenimiento y cambio de tapa
2,00	Grupo nomina	Piso 2	Mantenimiento y cambio de tapa
1,00	Facturación	Piso 2	Mantenimiento y cambio de tapa
1,00	Gimnasio	Piso 1	Mantenimiento y cambio de tapa
4,00	Jefatura grupo bienestar social	Piso 1	Mantenimiento y cambio de tapa
1,00	Cuarto comunicaciones	Piso 4	Mantenimiento y cambio de tapa
1,00	Cuarto comunicaciones	Piso 1	Mantenimiento y cambio de tapa

TOTAL 19,00

CONTRATISTA	SUPERVISION
CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL CONSORCIO CRS	ERIKA VIZCAINO HERRERA

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
CONTRATO DE OBRA: 19001111 H4 de 2019

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL -NEAA Y NAA.

ACTA DE ENTREGA


16	Diciembre	2019

CONTRATISTA :
CONSORCIO CRS
SUPERVISORA:
ERIKA VIZCAINO HERRERA
FECHA INICIAL: DESDE 24/10/2019
PLAZO FINAL: HASTA EL 20/12/2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
14.2	Revision y/o instalacion de puntos electricos con suministro de cableado conexiones, tomacorriente hasta garantizar el correcto funcionamiento	UND	18

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES

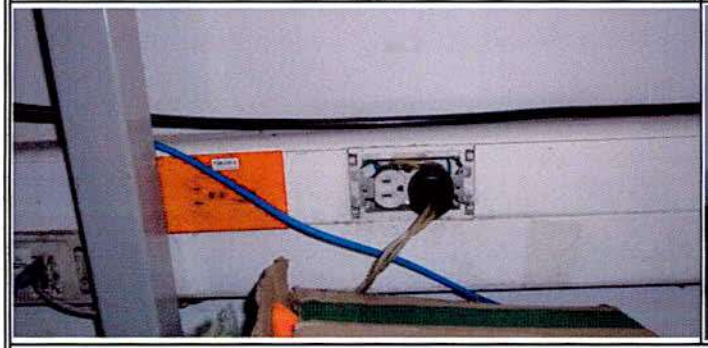

DESPUES



Cantidad	Lugar	Observaciones
6,00	Piso 3 costado occidental, nuevos puestos de trabajo	Punto nuevo
11,00	Cuarto coordinación de vigilancia (sotano)	Punto nuevo
1,00	Piso 1 arbol de navidad	Punto nuevo



TOTAL 18,00

CONTRATISTA	SUPERVISION
CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL CONSORCIO CRS	ERIKA VIZCAINO HERRERA

AERONÁUTICA CIVIL Unidad Administrativa Especial	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL CONTRATO DE OBRA: 19001111 H4 de 2019 OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL -NEAA Y NAA. **ACTA DE ENTREGA**	16 Diciembre 2019 CONTRATISTA : CONSORCIO CRS SUPERVISORA: ERIKA VIZCAINO HERRERA FECHA INICIAL: DESDE 24/10/2019 PLAZO FINAL: HASTA EL 20/12/2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
14.7	Revision y /o mantenimiento aspiral luminoso electrico del edificio -alturas	UND	1

REGISTRO FOTOGRAFICO

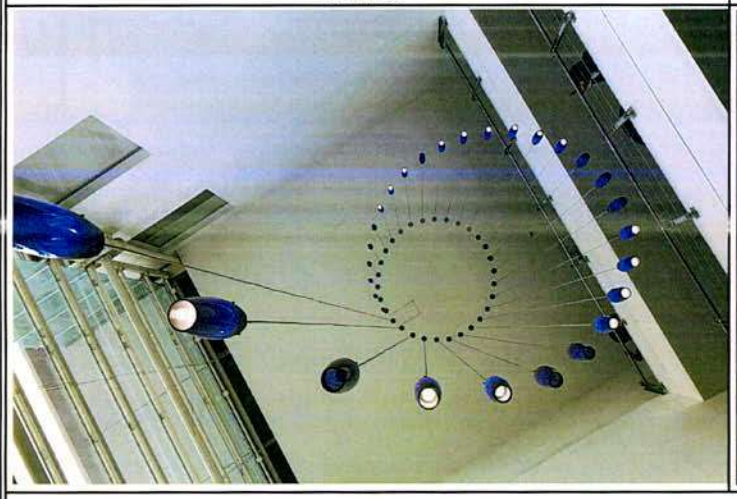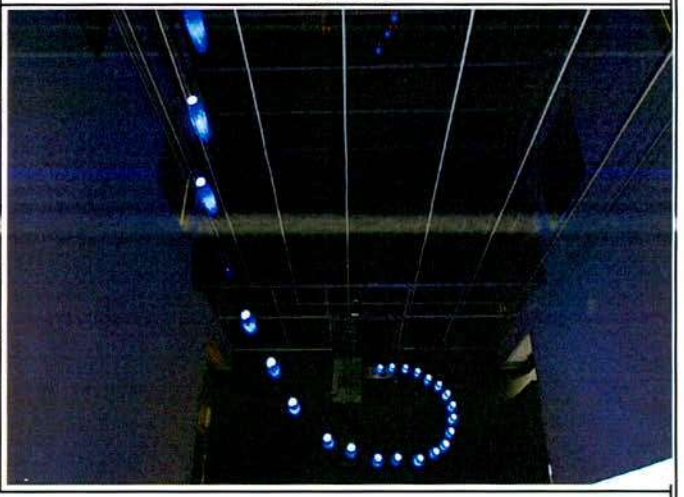ANTES	DESPUES
	

Cantidad	Lugar	Observaciones
1,00	Recepción del edifico	Mantenimiento de instalación eléctrica y bombilleria LED

TOTAL 1,00

CONTRATISTA	SUPERVISION
CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELI. CONSORCIO CRS	ERIKA VIZCAINO HERRERA

136

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
CONTRATO DE OBRA: 19001111 H4 de 2019

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL -NEAA Y NAA.

ACTA DE ENTREGA

16	Diciembre	2019

CONTRATISTA :
CONSORCIO CRS
SUPERVISORA:
ERIKA VIZCAINO HERRERA
FECHA INICIAL: DESDE 24/10/2019
PLAZO FINAL: HASTA EL 20/12/2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
14.9	Revision y /o mantenimiento al punto de iluminacion de la imagen de la aerocivil, plasmada en la fachada del edificio	UND	1

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES





Cantidad	Lugar	Observaciones
1,00	Facha del edificio	Cambio de instalacion electrica y bombilleria LED

TOTAL 1,00

CONTRATISTA	SUPERVISION
CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL CONSORCIO CRS	ERIKA VIZCAINO HERRERA

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
CONTRATO DE OBRA: 19001111 H4 de 2019

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL -NEAA Y NAA.

ACTA DE ENTREGA

16	Diciembre	2019

CONTRATISTA :
CONSORCIO CRS
SUPERVISORA:
ERIKA VIZCAINO HERRERA
FECHA INICIAL: DESDE 24/10/2019
PLAZO FINAL: HASTA EL 20/12/2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
14.12	Retiro y/o suministro e instalacion de luminarias tipo led de 60 x 60	UND	3

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES



Cantidad	Lugar	Observaciones
3,00	Piso 3 costado oriental	Cambio

TOTAL 3,00

CONTRATISTA	SUPERVISION
CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL CONSORCIO CRS	ERIKA VIZCAINO HERRERA

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
CONTRATO DE OBRA: 19001111 H4 de 2019

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL -NEAA Y NAA.

ACTA DE ENTREGA

16	Diciembre	2019

CONTRATISTA :
CONSORCIO CRS
SUPERVISORA:
ERIKA VIZCAINO HERRERA
FECHA INICIAL: DESDE 24/10/2019
PLAZO FINAL: HASTA EL 20/12/2019


ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
14.14	Suministro e instalacion luminarias de emergencia tipo Mikey incluye retiro de las existentes que se encuentren fuera deservicio	UND	29

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES

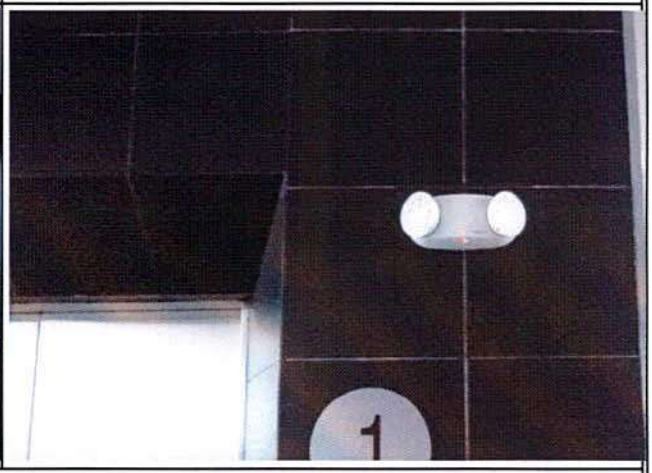

Cantidad	Lugar	Observaciones
1,00	Piso 5 oriente	Reemplazo por deterioro
1,00	Piso 5 pasillo ascensor	Reemplazo por deterioro
2,00	Piso 5 occidente	Reemplazo por deterioro
1,00	Piso 4 oriente	Reemplazo por deterioro
2,00	Piso 4 occidente	Reemplazo por deterioro
1,00	Piso 3 oriente	Reemplazo por deterioro
1,00	Piso 3 occidente	Reemplazo por deterioro
1,00	Piso 2 oriente	Reemplazo por deterioro
1,00	Piso 2 occidente	Reemplazo por deterioro
3,00	Piso 1 pasillo occidente	Reemplazo por deterioro
2,00	Piso 1 pasillo oriente	Reemplazo por deterioro
3,00	Piso 1 pasillo ascensores	Reemplazo por deterioro
5,00	Escaleras de emergencia costado oriente	Reemplazo por deterioro
5,00	Escaleras de emergencia costado occidente	Reemplazo por deterioro

TOTAL 29,00

CONTRATISTA	SUPERVISIÓN
CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL CONSORCIO CRS	ERIKA VIZCAINO HERRERA

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
CONTRATO DE OBRA: 19001111 H4 de 2019

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL -NEAA Y NAA.

ACTA DE ENTREGA

16	Diciembre	2019

CONTRATISTA :
CONSORCIO CRS
SUPERVISORA:
ERIKA VIZCAINO HERRERA
FECHA INICIAL: DESDE 24/10/2019
PLAZO FINAL: HASTA EL 20/12/2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
14.15	Suministro e instalación de lámparas tipo led acrilica de sobreponer de 1.20 m de acuerdo a nomra archivística	UND	117

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES



Cantidad	Lugar	Observaciones
112,00	Archivo (sotano)	Reemplazo por deterioro
3,00	Cuarto coordinacion vigilancia (sotano)	Reemplazo por deterioro
2,00	Cuarto insumos (sotano)	Reemplazo por deterioro

TOTAL 117,00

CONTRATISTA	SUPERVISION
CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL CONSORCIO CRS	ERIKA VIZCAINO HERRERA

2,00	Cuarto de cámaras	Sotano	Cambio por deterioro
3,00	Coordinación vigilancia	Sotano	Cambio por deterioro
1,00	Oficina director	Piso 5	Cambio por deterioro
1,00	Recepción dirección	Piso 5	Cambio por deterioro
1,00	Recepción	Piso 1	Cambio por deterioro
3,00	Secretaría general	Piso 5	Cambio por deterioro
1,00	Grupo vigilancia aerocomerciales	Piso 5	Cambio por deterioro
2,00	Toma jefatura transporte aéreo	Piso 5	Cambio por deterioro
1,00	Jefatura grupo asuntos internacionales	Piso 5	Cambio por deterioro
1,00	Administración inmuebles	Piso 4	Cambio por deterioro
4,00	Coordinador línea 3000	Piso 4	Cambio por deterioro
2,00	Cuarto comunicaciones	Piso 1	Cambio por deterioro
1,00	Cuarto eléctrico	Piso 1	Cambio por deterioro
1,00	Dispensador alimentos	Piso 1	Cambio por deterioro
1,00	Cuarto eléctrico	Piso 3	Cambio por deterioro
3,00	Tomas externas en fachada de edificio	Piso 1	Cambio por deterioro

TOTAL 96,00

CONTRATISTA	**SUPERVISION**
CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL CONSORCIO CRS	ERIKA VIZCAINO HERRERA

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
CONTRATO DE OBRA: 19001111 H4 de 2019

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL -NEAA Y NAA.

ACTA DE ENTREGA


16	Diciembre	2019

CONTRATISTA : CONSORCIO CRS
SUPERVISORA: ERIKA VIZCAINO HERRERA
FECHA INICIAL: DESDE 24/10/2019
PLAZO FINAL: HASTA EL 20/12/2019

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
14.16	Suministro e instalación de bombillo ahorardores de rosca tipo led	UND	10

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES

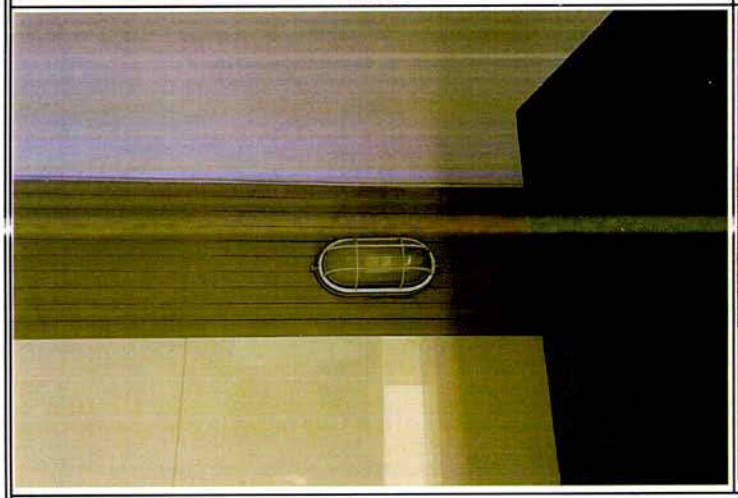

DESPUES



Cantidad	Lugar	Observaciones
10,00	Piletas de los baños de hombre y mujeres pisos 1 a 5	Todas las piletas

TOTAL 10,00

CONTRATISTA	SUPERVISION
CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL CONSORCIO CRS	ERIKA VIZCAINO HERRERA

142

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
CONTRATO DE OBRA: 19001111 H4 de 2019

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL -NEAA Y NAA.

ACTA DE ENTREGA

16	Diciembre	2019

CONTRATISTA :
CONSORCIO CRS
SUPERVISORA:
ERIKA VIZCAINO HERRERA
FECHA INICIAL: DESDE 24/10/2019
PLAZO FINAL: HASTA EL 20/12/2019

UAE AERONAUTICA CIVIL DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 30 DIC. 2019 PAGADO SAI SIIF


ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
14.17	Suminuistro e instalación luminaria tipo tubo de 1.20 m2, -archivo	UND	2

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES

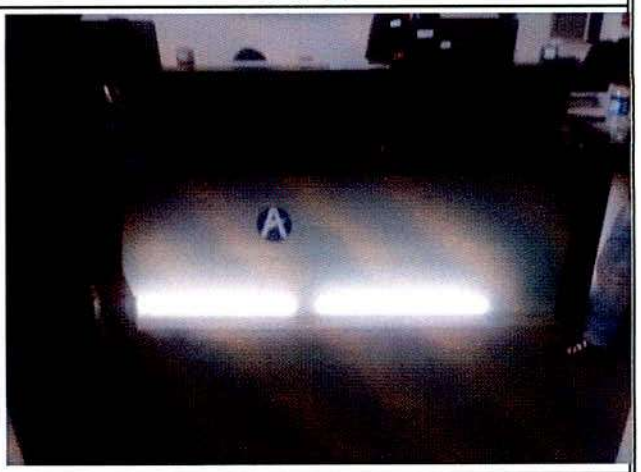

Cantidad	Lugar	Observaciones
1,00	Lamparas en mueble de recepción	Reemplazo juego de 3 lamparas
1,00	Lamparas en logotipo aerocivil en recepción	Reemplazo juego de 2 lamparas

TOTAL 2,00

CONTRATISTA	SUPERVISION
CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL CONSORCIO CRS	ERIKA VIZCAINO HERRERA

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
CONTRATO DE OBRA: 19001111 H4 de 2019

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL -NEAA Y NAA.

ACTA DE ENTREGA

16	Diciembre	2019

CONTRATISTA :
CONSORCIO CRS
SUPERVISORA:
ERIKA VIZCAINO HERRERA
FECHA INICIAL: DESDE 23/10/2019
PLAZO FINAL: HASTA EL 20/12/2019


ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
14.18	Suministro e instalación de canaleta PVC y cableado para punto electrico.	UND	3

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES



DESPUES

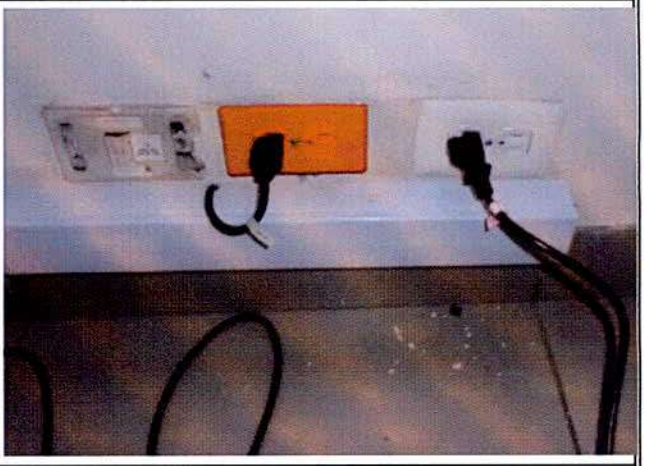

Cantidad	Lugar	Observaciones
3,00	Piso 3 costado occidental	Nuevos puestos de trabajo

TOTAL 3,00

CONTRATISTA	SUPERVISION
CARMELO JOAQUIN ROSALES AMELL CONSORCIO CRS	ERIKA VIZCAINO HERRERA

AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL
CONTRATO DE OBRA: 19001111 H4 de 2019

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL -NEAA Y NAA.

ACTA DE ENTREGA


16	Diciembre	2019

CONTRATISTA :
CONSORCIO CRS
SUPERVISORA:
ERIKA VIZCAINO HERRERA
FECHA INICIAL: DESDE 24/10/2019
PLAZO FINAL: HASTA EL 20/12/2019


ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
14.19	Revision y /o suministro e instalacion de tomacorrientes que se encuentren en mal estado	UND	96

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES

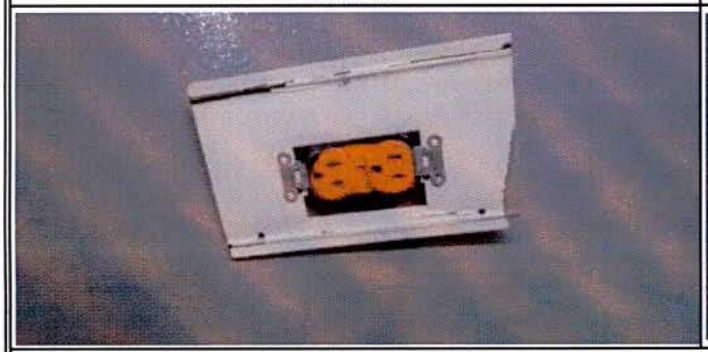

DESPUES

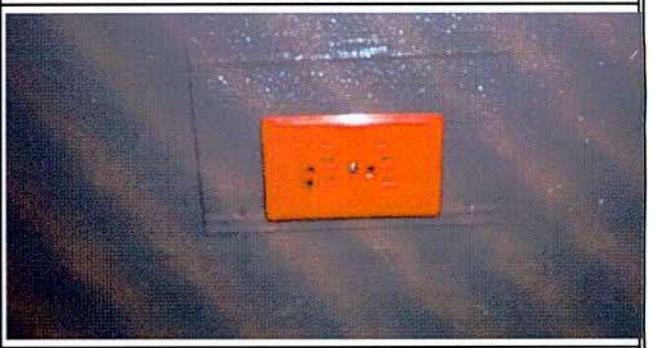

Cantidad	Lugar		Observaciones
4,00	Cafetería	Piso 2	Cambio por deterioro
4,00	Cafetería	Piso 3	Cambio por deterioro
4,00	Cafetería	Piso 4	Cambio por deterioro
4,00	Cafetería	Piso 5	Cambio por deterioro
1,00	Maquina dispensadora	Piso 1	Cambio por deterioro
1,00	Oficina asesora planeación	Piso 4	Cambio por deterioro
2,00	Sala William Knox	Piso 4	Cambio por deterioro
1,00	Recepción occidente	Piso 4	Cambio por deterioro
2,00	Reservación judicial	Piso 4	Cambio por deterioro
2,00	Infraestructura	Piso 3	Cambio por deterioro
1,00	Jefatura grupo planes maestros no concesiona	Piso 3	Cambio por deterioro
1,00	Secretaria de sistemas operacionales	Piso 3	Cambio por deterioro
1,00	Impresoras	Piso 3	Cambio por deterioro
1,00	Grupo cuentas por pagar	Piso 3	Cambio por deterioro
8,00	Servicios generales	Piso 3	Cambio por deterioro
1,00	Grupo nomina	Piso 2	Cambio por deterioro
1,00	Ventanilla hoja de vida	Piso 2	Cambio por deterioro
1,00	Grupo sanidad aeroportuaria	Piso 2	Cambio por deterioro
3,00	Contabilidad	Piso 2	Cambio por deterioro
4,00	Tesorería	Piso 2	Cambio por deterioro
1,00	Sala Abrahán	Piso 2	Cambio por deterioro
1,00	Facturación	Piso 2	Cambio por deterioro
6,00	Atención al ciudadano	Piso 1	Cambio por deterioro
3,00	Disciplinaria	Piso 1	Cambio por deterioro
2,00	Comedor	Piso 1	Cambio por deterioro
3,00	Pasillos	Piso 1	Cambio por deterioro
1,00	Gimnasio	Piso 1	Cambio por deterioro
1,00	Jefatura grupo bienestar social	Piso 1	Cambio por deterioro
2,00	Consultorio 1	Piso 1	Cambio por deterioro
1,00	Consultorio 2	Piso 1	Cambio por deterioro

CJRA

INVENTARIO DE RECIBO PARCIAL
CONTROL TECNICO EN OBRA

CONTRATO DE OBRA: 19001111 H4 de 2019

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL - NEAA Y NAA.

CONTRATISTA: CONSORCIO CRS

FECHA: 19 DE DICIEMBRE DE 2019

ACTIVIDAD A RECIBIR	unidad	CANT.	APROBADO SI	APROBADO NO	OBSERVACIONES	
			SI	NO	LOCALIZACION	DESCRIPCION
Suministro, instalación y demarcación de pintura epóxica (poliuretano)	M2	599,27	X		SOTANO	CUARTOS MECANICOS (2), CUARTOS ELECTRICOS (2), CUARTOS TELECOMUNICACIONES (2), VIGILANCIA PARQUEADERO (1), CUARTO DE BOMBAS (1), DEPOSITO ELEMENTOS DE ASEO (1), SALA TECNICA (1)
					PISO 1	CUARTOS MECANICOS (2), CUARTOS ELECTRICOS (2), CUARTOS TELECOMUNICACIONES (2)
					PISO 2	CUARTOS MECANICOS (2), CUARTOS ELECTRICOS (2), CUARTOS TELECOMUNICACIONES (2)
					PISO 3	CUARTOS MECANICOS (2), CUARTOS ELECTRICOS (2), CUARTOS TELECOMUNICACIONES (2)
					PISO 4	CUARTOS MECANICOS (2), CUARTOS ELECTRICOS (2), CUARTOS TELECOMUNICACIONES (2)
					PISO 5	CUARTOS MECANICOS (2), CUARTOS ELECTRICOS (2), CUARTOS TELECOMUNICACIONES (2)
Suministro, aplicación y demarcación de pintura para parqueadero	ML	1.253,60	X		PARQUEADERO	PASOS PEATONALES Y REMARCADO PARQUEADEROS DE DISCAPACITADOS
Suministro e instalación de cinta antideslizante	ML	538,48	X		ACCESO PRINCIPAL EDIFICIO NEAA	
					ESCALERAS DE EMERGENCIA	LADO ORIENTAL Y LADO OCCIDENTAL
IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS		-				
Aplicación de sellante en uniones de flanches de tejado para evitar filtracion	ML	550,00	X		CUBIERTA	EN EL LADO OCCIDENTAL, LA MEDIDA REAL ES DE 125 MT, LADO NORTE 150 MT, LADO ORIENTAL 125 MT Y LADO SUR 150 MT, LOS CUALES FUERON INTERVENIDOS EN SU TOTALIDAD.
Aplicación de producto impermeabiilizante en pegues de flanches	ML	120,00	X		CUBIERTA	EN EL LADO OCCIDENTAL, LA MEDIDA REAL ES DE 20 MT, LADO NORTE 40 MT, LADO ORIENTAL 20 MT Y LADO SUR 40 MT, LOS CUALES FUERON INTERVENIDOS EN SU TOTALIDAD.
Impermeabilización de acuerdo con las especificaciones técnicas en canales superiores	ML	167,80	X		CUBIERTA	LA CANTIDAD IMPERMEABILIZADA ES MAYOR A LA CONTRATADA, DEBIDO A QUE EXISTIA UNA FILTRACION DE AGUA QUE AFECTABA EL BAÑO DE MUJERES DEL 5TO PISO. DICHA GOTERA ESTABA EN LA PLACA DE CONCRETO DE LA CUBIERTA Y NO EN LA CUBIERTA METALICA. SE APROBÓ EL ARREGLO DE DICHA FILTRACION, YA QUE HACIA PARTE PARA LA ENTREGA A SATISFACCION DE LA BATERIA DE BAÑOS DEL 5TO PISO.
Limpieza y/o mantenimiento en canales y rejillas de bajantes retiro de material particulado	ML	155,00	X		CUBIERTA	EN EL LADO OCCIDENTAL, LA MEDIDA REAL ES DE 30 MT, LADO NORTE 47 MT, LADO ORIENTAL 30 MT Y LADO SUR 48 MT, LOS CUALES FUERON INTERVENIDOS EN SU TOTALIDAD.
Revision y /o instalación de flanches en tejas sueltas	UN	150,00	X		CUBIERTA	EN EL LADO OCCIDENTAL, LA MEDIDA REAL ES DE 30 MT, LADO NORTE 45 MT, LADO ORIENTAL 30 MT Y LADO SUR 45 MT, LOS CUALES FUERON INTERVENIDOS EN SU TOTALIDAD.
MANTENIMIENTO DE PUERTAS (inlcuye en general el desmonte reposición e instalación de piezas para el correcto funcionamiento)		-				
Desmonte de divisiones en vidrio y/o puertas	M2	-				
Desmonte y retiro de archivadores por cuerpos	UND	-				
Mantenimiento del barandal de escaleras y hall del edificio	ML	346,71	X		ESCALERAS DEL PUNTO FIJO DEL EDIFICIO NEAA DEL PISO 1 AL PISO 5, RAMPA DE ACCESO PRINCIPAL AL EDIFICIO NEAA, BARANDALES COSTADO NORTE DEL PISO 2 AL PISO 4	
suministro e instalacion de ventanas de inspeccion en fibrocemento. De 60 x 60	UND	338,00	X		PISO 5	TODO EL PISO 5

INVENTARIO DE RECIBO PARCIAL
CONTROL TECNICO EN OBRA

CONTRATO DE OBRA: 19001111 H4 de 2019

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL - NEAA Y NAA.

CONTRATISTA: CONSORCIO CRS

FECHA: 19 DE DICIEMBRE DE 2019

					PISO 3	COSTADO ORIENTAL
Mantenimiento a estaciones o páneles de emergencias en lamina y vidrio	UND	-				
Mantenimiento y / suministro e instalacion de chapas con manija en acero inxidable	UND	50,00	X		PISO 1	EL CONTRATISTA ADJUNTA EL ACTA DE ENTREGA EN EL ACTA PARCIAL DE OBRA N. 2
					PISO 2	
					PISO 3	
					PISO 4	
					PISO 5	
Mantenimiento de puertas oficinas privadas	UND	8,00	X		PISO 1	EL CONTRATISTA ADJUNTA EL ACTA DE ENTREGA EN EL ACTA PARCIAL DE OBRA N. 2
					PISO 2	
					PISO 3	
					PISO 4	
					PISO 5	
Suministro e instalación de chapa para puerta incluye dos llaves	UND	35,00	X		PISO 1	EL CONTRATISTA ADJUNTA EL ACTA DE ENTREGA EN EL ACTA PARCIAL DE OBRA N. 2
					PISO 2	
					PISO 3	
					PISO 4	
					PISO 5	
Suministro e instalación de chapa para escritorio, archivadores verticales y horizontales incluye dos llaves	UND	80,00	X		PISO 1	EL CONTRATISTA ADJUNTA EL ACTA DE ENTREGA EN EL ACTA PARCIAL DE OBRA N. 2
					PISO 2	
					PISO 3	
					PISO 4	
					PISO 5	
Instalación puertas existentes en vidrio de 8mm con marco de aluminio	M2	-				
PINTURA EXTERNA E INTERNA		-				
Limpieza e impermeabilizacion de muros de alta resistencia con suministro e instalación de pintura vinilo tipo 1-3 manos incluye resane, filos y dilataciones, incluye pintura obras de remodelacion.	M2	700,75	X		PISO 1	RECEPCION Y CORREDORES ORIENTAL Y OCCIDENTAL (TECHO, PAREDES Y GUARDAESCOBAS)
					PISO 3	PARED DE ACCESO A OFICINA DE SERVICIOS GENERALES, PARED POSTERIOR A LA OFICINA DEL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, PARED POSTERIOR A LA OFICINA DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA
					PISO 5	TERRAZA DIRECTOR GENERAL, OFICINA SECRETARIO GENERAL, SALA VIP
Resane en filos y dilataciones y pintura si es el caso	ML	569,62	X		PISO 1	RECEPCION Y CORREDORES ORIENTAL Y OCCIDENTAL (TECHO, PAREDES Y GUARDAESCOBAS)
					PISO 3	PARED DE ACCESO A OFICINA DE SERVICIOS GENERALES, PARED POSTERIOR A LA OFICINA DEL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, PARED POSTERIOR A LA OFICINA DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA
					PISO 5	TERRAZA DIRECTOR GENERAL, OFICINA SECRETARIO GENERAL, SALA VIP
Resane y pintura vinilo tipo 1 en muro de Superboard interno y externo	M2	584,98	X		PISO 1	PAREDES DE BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 2	PAREDES DE BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 3	PAREDES DE BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 4	PAREDES DE BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 5	PAREDES DE BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
Suminsitro e instalación de pintura de muros exteriores con koraza dos manos, incluye rasqueteo de puntos con humedad, sello y aplicación de pintura color similar al existente.	M2	129,02	X		PARQUEADERO	ANTEPECHO CERRAMIENTO COSTADO OCCIDENTAL Y EXTERIOR DE LA GARITA DE PORTERIA
Suministro e instalacion Pintura cielo raso en vinilo, en baños	M2	480,10	X		PISO 1	TECHOS DE BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 2	TECHOS DE BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 3	TECHOS DE BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 4	TECHOS DE BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 5	TECHOS DE BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
Suministro e instalacion de Pintura cielo raso en vinilo, en baños	ML	922,82	X		PISO 1	TECHOS DE BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 2	TECHOS DE BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 3	TECHOS DE BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 4	TECHOS DE BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 5	TECHOS DE BAÑOS HOMBRES Y MUJERES

INVENTARIO DE RECIBO PARCIAL
CONTROL TECNICO EN OBRA

CONTRATO DE OBRA: 19001111 H4 de 2019

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL - NEAA Y NAA.

CONTRATISTA: CONSORCIO CRS

FECHA: 19 DE DICIEMBRE DE 2019

PISOS Y ZÓCALOS		-				
Desmonte, suministro e instalación de piso cerámica 60x60 cm	M2	-				
Sellamiento de juntas y fisuras entre adoquines con sello de arena en sendero peatonal NEAA - CEA	M2	**253,86**	X		PARQUEADERO	SENDERO PEATONAL FRENTE AL EDIFICIO Y ACCESO A PORTERIA
Sello y tratamiento de juntas de construccion o dilatacion en pisos	ML	-				
PAÑETES Y ENCHAPES		-				
Mantenimiento y/o aplicación de producto en juntas de dilatacion	M2	**83,80**	X		PISO 1	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 2	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 3	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 4	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 5	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
Resane de muros en general	M2	-				
Retiro de enchape de piletas lavatraperos.	M2	**22,00**	X		PISO 1	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 2	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 3	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 4	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 5	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
Suministro e instalación de enchape de piletas lavatraperos.	M2	**20,00**	X		PISO 1	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 2	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 3	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 4	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 5	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
CARPINTERIA		-				
Suministro e instalacion de cerrojo y bisagras para divisiones de baños	**UND**	-				
MANTENIMIENTO VIDRIOS Y VENTANERIA		-				
Revision y/o reparacion de paneles de encerramiento del balcon quinto piso incluye: cambio de tornilleria de presion si se requiere	M2	-				
Suministro e instalación de pie de amigo para recepción y repisas	UND	-				
Suministro e instralacion de Pelicula samblasteada con logo de la aerocivil para vidrios en zonas de acceso	M2	**65,74**	X		PISO 1	PUERTAS PRINCIPALES DE ACCESO EDIFICIO NEAA, SALA DE CORRESPONDENCIA, CAFETERIA, SALA DE JUNTAS, ARCHIVO
					PISO 2	PUERTAS DE ACCESO PRINCIPAL
					PISO 3	PUERTAS DE ACCESO PRINCIPAL
					PISO 4	PUERTAS DE ACCESO PRINCIPAL
					PISO 5	PUERTAS DE ACCESO PRINCIPAL, SALA DE JUNTAS COSTADO ORIENTAL
INFRAESTRUCTURA GENERAL		-				
Desmonte pared en superboard	M2	-				
Desmonte de divisiones en drywall	M2	-				
Mantenimiento pintura de puertas metal madera que icluye: tableros lamina de acero inoxidable visagras y marco en lámina.	M2	**31,57**	X		PISO 1	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 2	BAÑO MUJERES
					PISO 3	BAÑO MUJERES
					PISO 4	BAÑO MUJERES
					PISO 5	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
Suministro e instalación de guardaescobas en madera de acuerdo con las especificaciones tecnicas	ML	-				
Suministro e intalación de pasamanos anclado al piso de cauerdo a lo normado en escalera principal de acceso edificio NEAA	ML	**13,39**	X		ESCALERAS ACCESO EDIFICIO PRINCIPAL NEAA	
RED HIDRAULICA Y SANITARIA		-				
Desmonte, Suministro e Instalacion de Conexión Superior Orinales (incluye desmonte, limpieza y reinstalación de accesorios y aparato si se requiere.)	UND	-				
Desmonte, suministro e Instalacion de llave para pocetas	**UND**	-				
Destape de puntos sanitarios y/o lavamanos con sonda electrica.	UND	-				
Destape de cañeria de punto sanitario, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato si se requiere.	UND	-				
Mantenimiento y reparacion de Shut de Basuras	UND	-				

INVENTARIO DE RECIBO PARCIAL
CONTROL TECNICO EN OBRA

CONTRATO DE OBRA: 19001111 H4 de 2019

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL - NEAA Y NAA.

CONTRATISTA: CONSORCIO CRS

FECHA: 19 DE DICIEMBRE DE 2019

Mantenimiento de cajas de inspección en general de aguas lluvias y aguas hervidas incluye retiro de lodos hasta botadero certificado	UND	12,00	X		EXTERIOR EDIFICIO	COSTADO SUR (8), COSTADO OCCIDENTAL (3),
					SOTANO	PARQUEADERO DISCAPACITADOS 81)
Mantenimiento de sifones	UND	-				
Mantenimiento llaves tipo ganso para cafeterias y comedor institucional	UND	-				
Mantenimiento y puesta a punto el sistema de riego de cuadros vivos de jardineria	UND	-				
Mantenimiento divisiones y puertas de acero	M2	97,77	X		PISO 1	DADAS LAS CARACTERISTICAS DE MONTAJE DE LAS PUERTAS DE ACERO INOXIDABLE Y LAS CONDICIONES DE LIMPIEZA A LAS QUE SE SOMETEN, ESTAS PUERTAS SON SUSCEPTIBLES DE DESAJUSTARTE DEL EJE DE MANERA
					PISO 2	
					PISO 3	
					PISO 4	
					PISO 5	
Mantenimiento de válvula sanitaria	UND	-				
Mantenimiento de conexiones de pared a sanitario.	ML	-				
Mantenimiento de la tuberia y cajas de inspección	ML	28,43	X		EXTERIOR EDIFICIO	COSTADO SUR (8), COSTADO OCCIDENTAL (3),
					SOTANO	PARQUEADERO DISCAPACITADOS 81)
Mantenimiento de drenajes y disposición final certificado evacuación lodos con equipo adecuado para esta labor	ML	-				
Mantenimiento de tuberia interna desde el contador avenida principal calle 26	ML	-				
Mantenimiento de tuberia PVC de 2/1" de acometida al tanque	ML	-				
Mantenimiento de tuberia colgante con limpieza y traslado de lodos hasta botadero certificado	ML	1,00	X		SOTANO	
Revision y/o fijacion de tuberia colgante con abrasadera metalica x golpe de ariete	ML	-				
Retiro y /o adecuacion de ventanas de baños para	UND	10,00	X		PISO 1	SE DESMONTARON LOS VIDRIOS Y SE UBICARON SEGÚN INDICO EL ADMINISTRADOR DEBAJO DE LAS ESCALERAS DE EMERGENCIA COSTAQDO OCCIDENTAL
					PISO 2	
					PISO 3	
					PISO 4	
					PISO 5	
Suministro e instalacion de llave ahorradora de paso de agua en piletas y areas externas	UND	7,00	X		PISO 1	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 2	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 3	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 4	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 5	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
Suministro e instalacion de registro de paso de agua en PVC 1/2,-1/3,-1/4,-1/4	UND	-				
Suministro e instalacion de bizcocho sanitario	UND	5,00	X		PISO 1	BAÑO HOMBRES
					PISO 2	BAÑO MUJERES
					PISO 3	BAÑO DIRECTORA ADMINISTRATIVA
					PISO 4	BAÑO MUJERES
Suministro e instalación de tuberia PVC de 2/1" de acometida al tanque	ML	-				
Suministro e instalación de sifones con retenedor de olores en baños	UND	-				
Suministro e instalacion de dispensador de jabon para manos en baños	UND	-				
Suministro e instalación llaves tipo ganso para cafeterias y comedor institucional	UND	-				
Suministro e instalación de tapa registros	UND	22,00	X		PISO 1	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 2	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 3	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 4	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 5	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
RED DE AGUA POTABLE		-				
Demolición regata lineal para instalar tuberia, en piso, y en pared	ML	-				
Mantenimiento correctivo de tubería (incluye demolición de muro e instalación de tuberia y accesorios)	UND	104,47	X		PISO 1	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 2	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 3	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 4	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 5	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES

INVENTARIO DE RECIBO PARCIAL
CONTROL TECNICO EN OBRA

CONTRATO DE OBRA: 19001111 H4 de 2019

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL - NEAA Y NAA.

CONTRATISTA: CONSORCIO CRS

FECHA: 19 DE DICIEMBRE DE 2019

Suministro e instalación de tuberia pvc 1/2 ", 3/4", 1 1/2 ", 1", 2"	ML	-				
REDES DE AGUAS NEGRAS (hervidas)		-				
Destape de cañeria de punto sanitario, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato si se requiere.	UND	**67,00**	X		PISO 1	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 2	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 3	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 4	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 5	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
Destape de cañeria de punto orinal, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato si se requiere.	UND	**21,00**	X		PISO 1	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 2	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 3	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 4	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 5	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
BATERIAS SANITARIAS Y ACCESORIOS EN BAÑOS		-				
Destape de cañeria de punto orinal, incluye desmonte y reinstalación de accesorios y aparato sanitario si se requiere	UND	-				
Mantenimiento de punto sanitarios	UND	-				
Mantenimiento de piletas lavatraperos ubicadas en las baterias de los baños, incluyen reemboquillado, enchape , cabmio de empaques en las llaves de salida	UND	-				
Mantenimiento general de las baterias sanitarias (incluye sanitarios, lavamanos, orinales,)	UND	**105,00**	X		PISO 1	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 2	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 3	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 4	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 5	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					ALMACEN	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES PISOS 1 Y 2
Suministro e instalación de fluxometros de cauerdo con las especificaciones tecnicas de los existentes	UND	**8,00**	X		PISO 1	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 2	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 3	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 4	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 5	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACION		-				
Mantenimiento tomas electricas de 110v y 220v	UND	**19,00**	X		PISO 1	6
					PISO 2	3
					PISO 3	8
					PISO 4	2
Revision y/o instalacion de puntos electricos con suministro de cableado conexiones, tomacorriente hasta garantizar el correcto funcionamiento	UND	**21,00**	X		PISO 1	COORDINACION DE VIGILANCIA (11), HALL DE ESCALERAS (1)
					PISO 3	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA (6)
Revisión y/o mantenimiento de calentadores electricos -Gimnacio y Direccion General	UND	-				
Revisión y/o mantenimiento de hornos eléctricos semiindustriales	UND	-				
Revision y/o mantenimineto de sensores eléctricos de orinales,	UND	-				
Revision y /o mantenimiento de secadores de manos en baños	UND	-				
Revision y /o mantenimiento aspiral luminoso electrico del edificio -alturas	UND	**1,00**	X		HALL DE ACCESO EDIFICIO NEAA	
Revision y/o mantenimiento del sistema de luminarias del parqueadero por fotoceldas	UND	-				
Revision y /o mantenimiento al punto de iluminacion de la imagen de la aerocivil, plasmada en la fachada del edificio	UND	**1,00**	X		FACHADA NORTE EDIFICIO NEAA	
Revision y /o mantenimiento a sensores de movimiento electricos de rutas de evacuacion	UND	-				
Revision y/o mantenimiento al sistema panel electrico cincronizado de riego de jardines por reloj	UND	-				

INVENTARIO DE RECIBO PARCIAL
CONTROL TECNICO EN OBRA

CONTRATO DE OBRA: 19001111 H4 de 2019

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL - PREVENTIVO Y CORRECTIVO - BAJO LA MODALIDAD OUTSORCING POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA AEROCIVIL - NEAA Y NAA.

CONTRATISTA: CONSORCIO CRS

FECHA: 19 DE DICIEMBRE DE 2019

Retiro y/o suministro e instalacion de luminarias tipo led de 60 x 60	UND	106,00	X		PISO 5	TODO EL PISO 5
					PISO 3	COSTADO ORIENTAL
Retiro y/o suministro e instalacion de luminarias tipo led de circunferencia 18/ ml,	UND	170,00	X		PISO 1	ACCESO EDIFICIO NEAA, CORREDOR ALA ORIENTAL Y ALA OCCIDENTAL, BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 2	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 3	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES, BAÑO DIRECCION ADMINISTRATIVA
					PISO 4	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 5	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES, OFICINA ALA ORIENTAL Y ALA OCCIDENTAL
Suministro e instalacion luminarias de emergencia tipo Mikey incluye retiro de las existentes que se encuentren fuera deservicio	UND	30,00	X		PISO 1	CORREDOR ALA ORIENTAL Y ALA OCCIDENTAL
					PISO 5	CORREDOR ALA ORIENTAL Y ALA OCCIDENTAL
					ESCALERAS DE EMERGENCIA	
Suministro e instalación de lámparas tipo led acrilica de sobreponer de 1.20 m de acuerdo a nomra archivistica	UND	130,00	X		ARCHIVO	FALTAN 17 PARA COMPLETAR EL AREA TOTAL DEL ARCHIVO
Suministro e instalación de bombillo ahorardores de rosca tipo led	UND	87,00	X		PISO 1	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 2	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 3	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 4	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					PISO 5	BAÑOS HOMBRES Y MUJERES
					ESPIRAL DE LUZ	30
					OFICINA DIRECCION GENERAL	12
					SALA JUNTAS DIRECCION GENERAL	14
					SALON DIRECCION GENERAL	18
					SALA VIP	3
Suminuistro e instalación luminaria tipo tubo de 1.20 m2, -archivo	UND	2,00	X		RECEPCION	MUEBLE DE RECEPCION
Suministro e instalación de canaleta PVC y cableado para punto electrico.	UND	3,00	X			
Revision y /o suministro e instalacion de tomacorrientes que se encuentren en mal estado	UND	106,00	X		PISO 1	28
					PISO 2	16
					PISO 3	19
					PISO 4	15
					PISO 5	13
					SOTANO	5
					GARITA	10
SISTEMA DE CONTRAINCENDIO		-				
Realizar la prueba de desempeño de las unidades de bombeo y verificar frente a la curva de aceptación de la bomba si cumple con lo solicitado por la norma NFPA 20 en su edición vigente.	UND	-				
VARIOS						
Diagnóstico general de la infraestructura del edificio NEEA (Pisos 6 y 1 sótano, areas comunes y parqueadero)					PENDIENTE ENTREGA Y REVISION	
Diagnóstico general de la infraestructura del edificio NAA (Pisos 2 , bodegas y parqueadero					PENDIENTE ENTREGA Y REVISION	
Diagnóstico general del sistema de red contraincendios					PENDIENTE ENTREGA Y REVISION	
Diagnóstico general del sistema BMS Andover					PENDIENTE ENTREGA Y REVISION	
Diagnóstico general del sistema de sonido ambiental y emergencia					PENDIENTE ENTREGA Y REVISION	
Diagnóstico general del sistema de Control de Acceso					PENDIENTE ENTREGA Y REVISION	
Diagnóstico general del sistema de climatización					PENDIENTE ENTREGA Y REVISION	
Diagnóstico general de planta eléctrica					PENDIENTE ENTREGA Y REVISION	

FIRMAS CONTRATISTA

NOMBRE

FIRMA INGENIERO DE APOYO

ANA MARIA OCAMPO.

NOMBRE

D:\Ana Ocampo\Documentos\SUPERVISION CONTRATO 19001111\Inventario de Recibo Final CONTRATO 19001111
