Fecha	Nombre de la Reunión	Hora Inicio	Hora Fin
26/11/2024	[SIM] Sesión de seguimiento	09:00 am	10:00 am

URL Sesión:	Acta N°	Nombre de quien elabora:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWQzYmE5YTktZTY5Yi00ZTAzLWE4NWEtNWM2NjEzMWIzMGVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d239009e-8fbd-445b-9cb0-2b37507f6006%22%2c%22Oid%22%3a%22189e6896-0ca7-447b-89f8-b8d541e7a0e0%22%7d	7	Juan Bernal - Gerente de proyectos HIGH TECH SOFTWARE

1. Objetivo de la Reunión

Revisar los puntos que están afectando el avance del proyecto

2. Temas a Tratar


Seguimiento de Actividades: Monitorear actividades específicas del cronograma del proyecto.

3. Desarrollo

Con las entregas parciales realizadas por la entidad , se alcanza un avance de 39%, con este avance se define la ruta de entregable y presentaciones para llegar a los compromisos de entrega y facturación. Se revisa el avance en tres grupos de actividades para poder llevar un control más específico de acuerdo a los límites en los compromisos de entregas y facturación;

Task Name	% comp	Task Name	% comp	Task Name	% comp
Recolección de información	83%	STAGE Transformación a Parquete	0%	Documentación	23%
Fuentes	100%	STAGE Homologación de datos	66%	Entregable 1: Documento "Plan de Trabajo y Gestión del Proyecto"	100%
SharePoint	100%	STAGE Transformación de datos	52%	Entregable 2: "Documento de Arquitectura de Software para la Plataforma Web SIM Hábitat con el Casode Uso de Catastro de Redes	0%
Proceso de Homologación	75%	STAGE Geocodificación	0%	Entregable 3: "Documento de despliegue y desarrollo del Caso de Uso Catastro de Redes	0%
Proceso de Transformación de datos	77%	STAGE Georeferenciación	0%	Capacitaciones	0%
Procesos de Georreferenciación	0%	Maps Analytics Desarrollo del componente Maps Analytics	0%		
Definición de indicadores	86%	Carga en RedShift	0%		
Definición de plan de trabajo	100%	Power BI	7%		
Ingestión de datos	100%	Disponibilización en plataforma Houndoc	0%		

con esta nueva proyección de las actividades se ajusta el plan de trabajo se ajuste para contar con fechas reales de entrega que les permita a la entidad proyectar los hitos de facturación de los productos para el año en curso así como entregar el caso de uso para su aplicación desde el mes de diciembre como se proyectó al inicio del contrato.

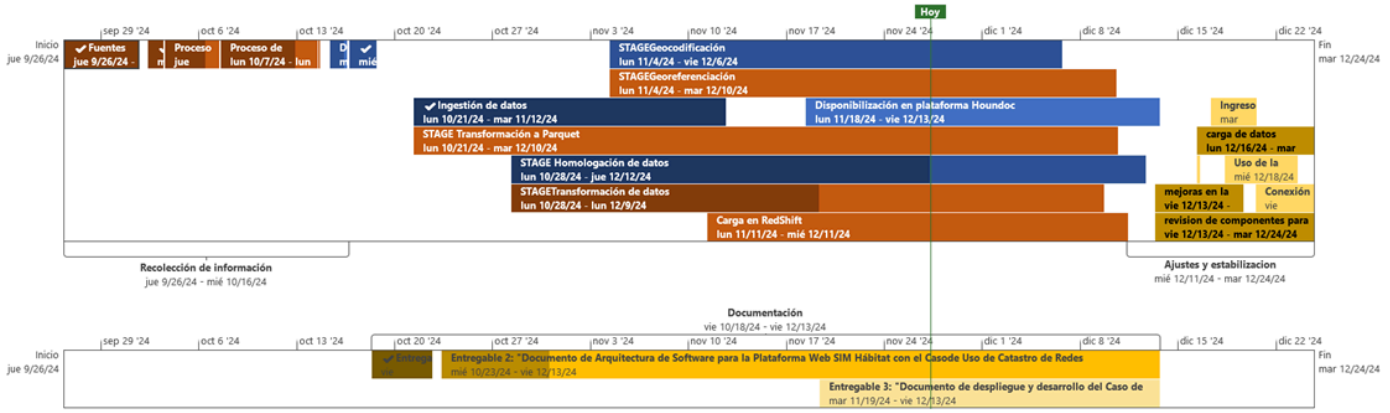

4. Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha
Facturación operación noviembre	Juan Bernal	05/12/2024

5. Asistentes

Nombre	Cargo	Firmas	Entidad
Juan Camilo Bernal	Gerente de proyectos		HTS
Estefania Vergara	Líder de analitica	Estefania vergara	HTS
Jairo Salas	Líder de analitica		HTS
German Baquiro	Equipo técnico		SDHT
Leonardo Neira	Gerente de proyectos	leonardo fabio neira	SDHT

revisión:

Supervisor 1:

Supervisor 2: MARIA PAULA SALCEDO PORRAS
Subdirectora de Información Sectorial
