

EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
0	**piscina olimpica +NP + cubierta**	**182 días?**	**lun 4/05/20**	**sáb 31/10/20**
1	**PRELIMINARES**	**68 días?**	**lun 4/05/20**	**jue 9/07/20**
1.1	CAMPAMENTO DE 18 M2	5 días	lun 4/05/20	jue 7/05/20
1.2	CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H= 2,00 MTS	3,25 días	vie 8/05/20	lun 11/05/20
1.3	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON TOPOGRAFÍA.	60 días	lun 11/05/20	jue 9/07/20
1.4	DESMONTE DE BARANDAS (ESCALERA PISCINA). INCLUYE POSTERIOR REINSTALACIÓN.	10 días	lun 11/05/20	vie 19/06/20
1.5	DESMONTE DE PARTIDORES (PISCINA). INCLUYE POSTERIOR REINSTALACIÓN DE 08 UNIDADES	10 días	lun 11/05/20	mié 3/06/20
1.6	RETIRO AZULEJOS PISCINA (PAREDES LATERALES Y FONDO) INCLUYE RETIRO DE BOQUILLAS Y REISNTALACION	29 días	lun 11/05/20	lun 8/06/20
1.7	RETIRO PISO CAUCHO (CIRCULACIÓN PERIMETRAL A LA PISCINA)	8 días	lun 11/05/20	lun 18/05/20
6	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**	**116,25 días**	**lun 1/06/20**	**jue 24/09/20**
6.1	**SISTEMA DE INYECCION**	**93 días**	**lun 1/06/20**	**mar 1/09/20**
6.1.1	DESMONTE TUBERÍA HIDRÁULICA DE Ø 3 " A Ø 6 "	20 días	lun 1/06/20	vie 19/06/20
6.1.2	DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS 0,30	20 días	lun 1/06/20	vie 19/06/20
6.1.3	DESMONTE Y RETIRO DE EQUIPOS Y FILTRO DE ARENA EXISTENTE	15 días	lun 1/06/20	lun 15/06/20

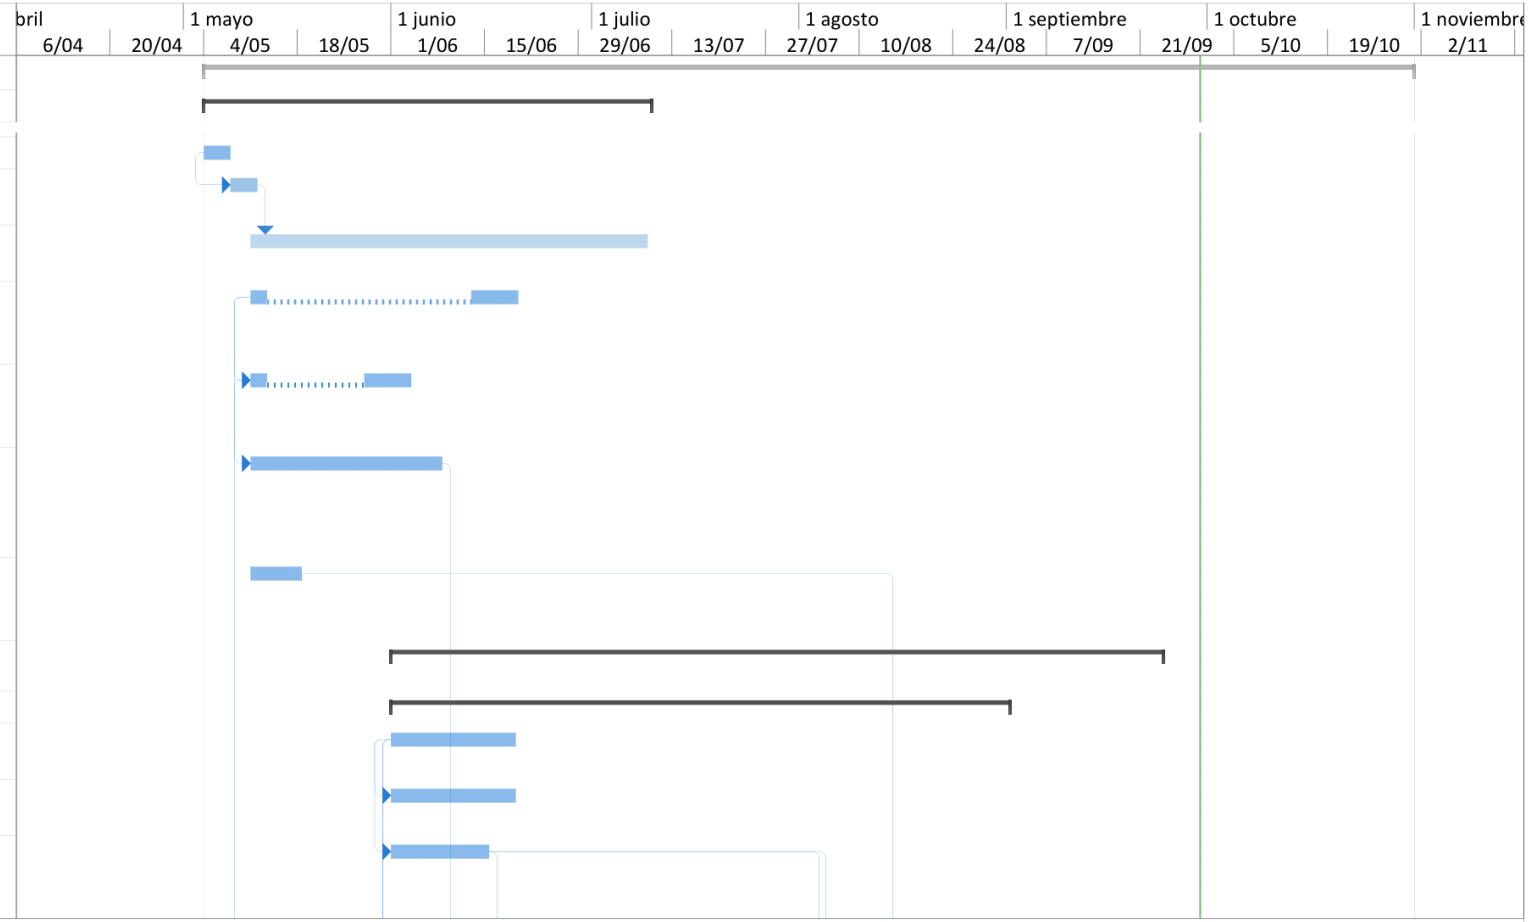

Proyecto: piscina olimpica +NP + c
Fecha: mié 30/09/20

Tarea	Hito externo	Informe de resumen manual	División crítica
División	Tarea inactiva	Resumen manual	Progreso
Hito	Hito inactivo	Sólo el comienzo	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Sólo fin	
Resumen del proyecto	Tarea manual	Fecha límite	
Tareas externas	Sólo duración	Tareas críticas	


EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
6.1.4	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 4 "	3 días	lun 15/06/20	jue 18/06/20
6.1.5	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 6 "	3 días	vie 28/08/20	lun 31/08/20
6.1.6	SOPORTE TUBERÍA COLGANTE Ø 6 "	5 días	lun 24/08/20	jue 27/08/20
6.1.7	LIMPIEZA MECÁNICA TUBERÍ	3 días	mar 23/06/20	jue 25/06/20
6.1.8	VÁLVULA PVC UNA VÍA CON DOBLE UNIVERSAL CONEXIÓN LISA Ø 4 "	0 días	jue 18/06/20	jue 18/06/20
6.1.9	VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN Ø 6 " CON MANOMETROS	2 días	mié 26/08/20	jue 27/08/20
6.1.10	VALVULA DE CHEQUE Ø 4 "	3 días	mié 26/08/20	vie 28/08/20
6.1.11	CONEXIÓN A RED HIDRÁULICA EXISTENTE Ø 6 " CON BRIDAS	3 días	mié 26/08/20	vie 28/08/20
6.1.12	DESINFECCIÓN RED HIDRÁUL	3 días	lun 19/10/20	mie 21/10/20
6.1.13	PRUEBA HIDRÁULICA	2 días	jue 22/10/20	vie 23/10/20
6.2	**SISTEMA DE ASPIRADO**	**79,25 días**	**mar 7/07/20**	**jue 24/09/20**
6.2.1	DESMONTE TUBERÍA HIDRÁULICA DE Ø 3 " A Ø 6 "	12 días	mar 7/07/20	sáb 18/07/20
6.2.2	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 3 "	3 días	mar 1/09/20	jue 3/09/20
6.2.3	SOPORTE TUBERÍA COLGANTE Ø 3 "	5 días	mar 1/09/20	vie 4/09/20
6.2.4	LIMPIEZA MECÁNICA TUBERÍ	0 días	mar 7/07/20	mar 7/07/20
6.2.5	VÁLVULA PVC UNA VÍA CON DOBLE UNIVERSAL CONEXIÓN LISA Ø 3 "	2 días	mié 2/09/20	jue 3/09/20
6.2.6	TRAMPA DE CABELLO EN PLÁSTICO ABS DE Ø 4 "	8 días	lun 7/09/20	lun 14/09/20

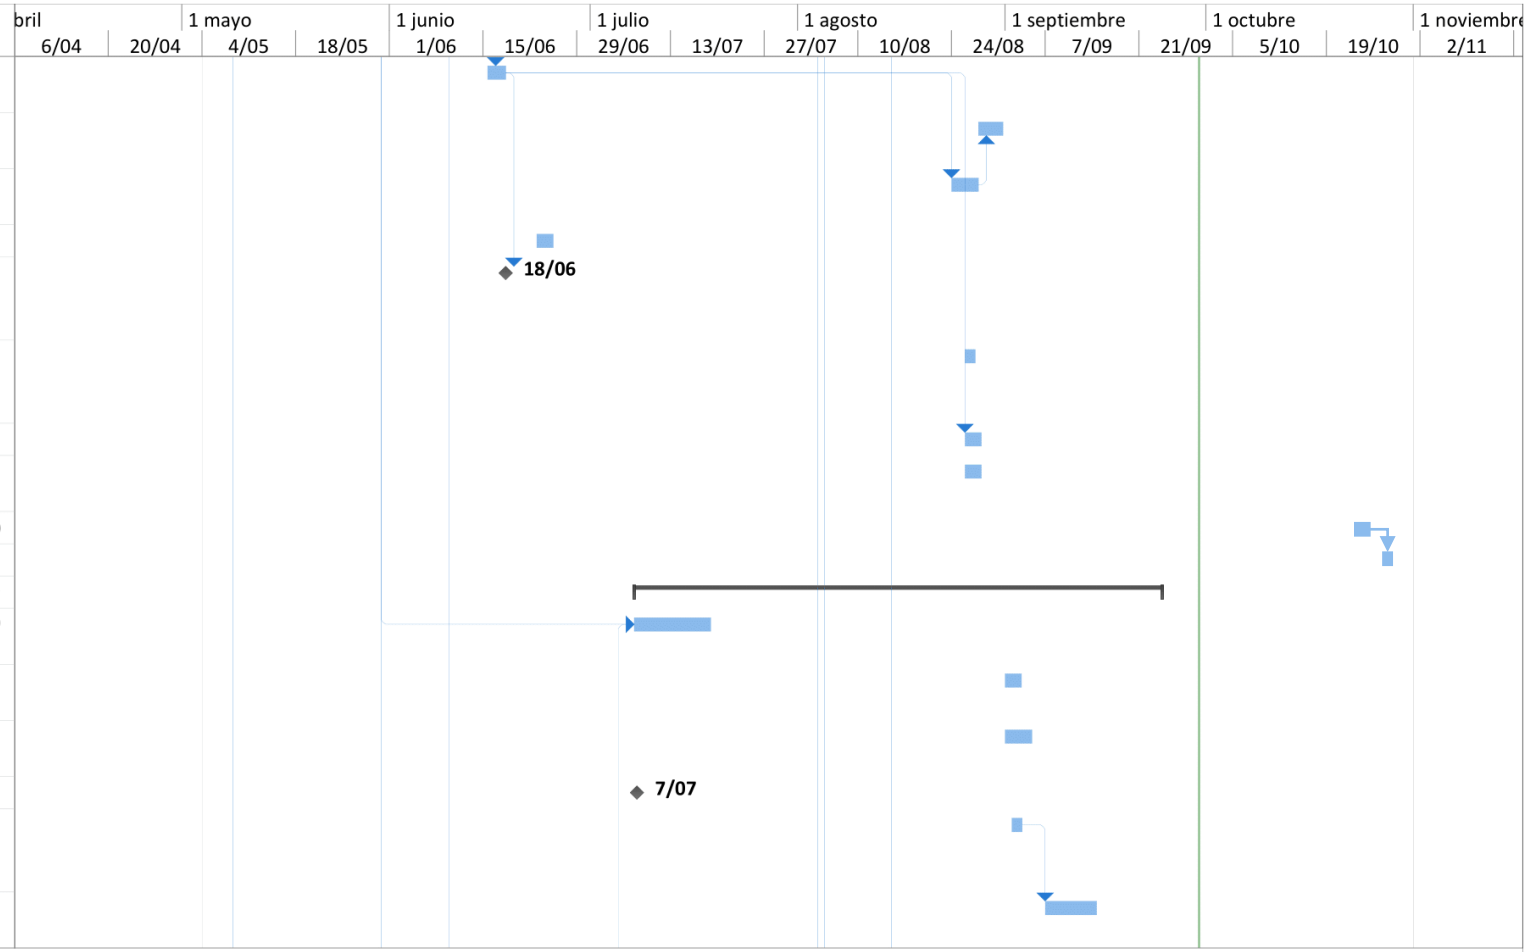

Proyecto: piscina olimpica +NP + c
Fecha: mié 30/09/20

Tarea	Hito externo	Informe de resumen manual	División crítica
División	Tarea inactiva	Resumen manual	Progreso
Hito	Hito inactivo	Sólo el comienzo	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Sólo fin	
Resumen del proyecto	Tarea manual	Fecha límite	
Tareas externas	Sólo duración	Tareas críticas	


EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
6.2.7	CONEXIÓN A RED HIDRÁULICA EXISTENTE Ø 3 "	14 días	lun 7/09/20	sáb 19/09/20
6.2.8	DESINFECCIÓN RED HIDRÁUL	3 días	lun 19/10/20	míe 21/10/20
6.2.9	PRUEBA HIDRÁULICA	3 días	jue 22/10/20	Sáb 24/10/20
6.3	**SISTEMA DE DRENAJE**	**79,25 días**	**mar 7/07/20**	**jue 24/09/20**
6.3.1	REJILLA DE FONDO ANTIATRAPAMIENTO DE 12 " EN PLÁSTICO ABS DE ALTA DENSIDAD	3 días	mar 13/10/20	jue 15/10/20
6.3.2	DESMONTE TUBERÍA HIDRÁULICA DE Ø 3 " A Ø 6 "	20 días	mar 7/07/20	lun 27/07/20
6.3.3	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 2 1/2 "	8 días	vie 11/09/20	vie 18/09/20
6.3.4	SOPORTE TUBERÍA COLGANTE Ø 3 "	8 días	vie 11/09/20	vie 18/09/20
6.3.5	VÁLVULA PVC UNA VÍA CON DOBLE UNIVERSAL CONEXIÓN LISA Ø 2 1/2 "	5 días	vie 11/09/20	mié 16/09/20
6.3.6	CONEXIÓN A RED DE ALCANTARILLADO EXISTENTE	6 días	vie 11/09/20	jue 17/09/20
6.3.7	PRUEBA HIDRÁULICA	2 días	mié 16/09/20	jue 17/09/20
6.4	**LLENADO DE PISCINA**	**94 días**	**jue 18/06/20**	**sáb 19/09/20**
6.4.1	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 2 "	10 días	mar 1/09/20	jue 10/09/20
6.4.2	DESMONTE TUBERÍA HIDRÁULICA DE Ø 3 " A Ø 6 "	37 días	jue 18/06/20	vie 24/07/20
6.4.3	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 2 "	3 días	mar 1/09/20	jue 3/09/20
6.4.4	REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 2 "	2 días	jue 3/09/20	vie 4/09/20
6.4.5	VALVULA DE CHEQUE Ø 2 "	2 días	vie 4/09/20	sáb 5/09/20
6.4.6	CONEXIÓN A RED HIDRÁULICA EXISTENTE Ø 3 "	4 días	sáb 5/09/20	mié 9/09/20

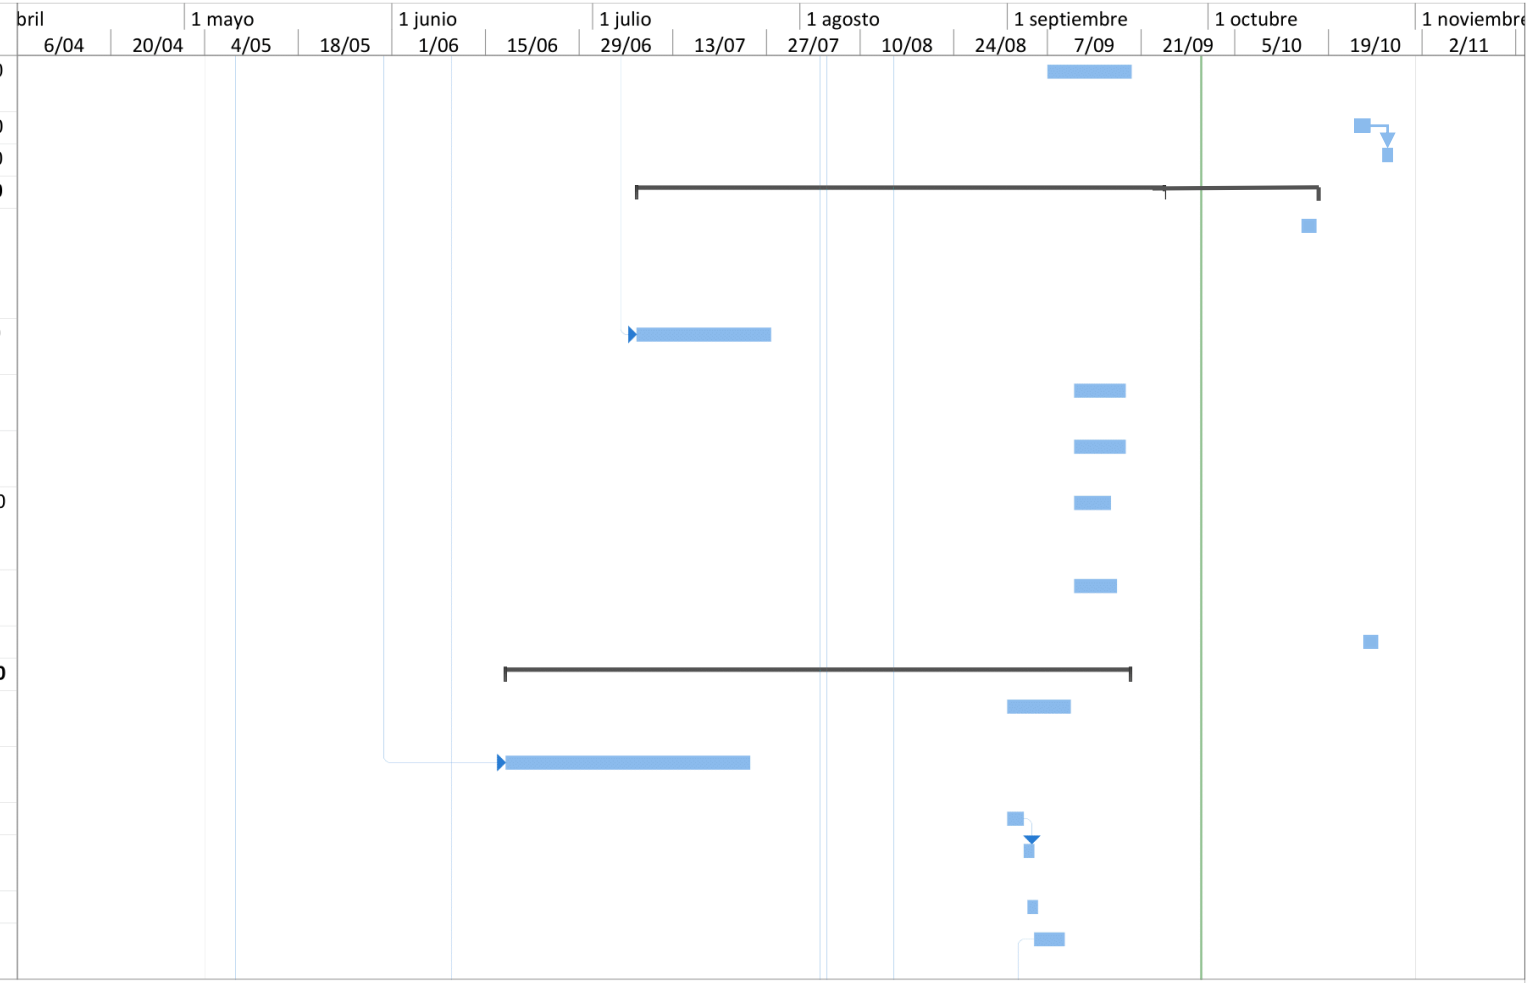

Proyecto: piscina olimpica +NP + c
Fecha: mié 30/09/20

Tarea	Hito externo	Informe de resumen manual	División crítica
División	Tarea inactiva	Resumen manual	Progreso
Hito	Hito inactivo	Sólo el comienzo	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Sólo fin	
Resumen del proyecto	Tarea manual	Fecha límite	
Tareas externas	Sólo duración	Tareas críticas	

EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
6.4.7	LLENADO DE PISCINA	10 días	Jue 15/10/20	lun 26/10/20
6.4.8	PRUEBA ESTANQUEIDAD	8 días	Jue 15/10/20	vie 23/10/20
6.5	**SISTEMA DE CLORACIO**	**14 días**	**sáb 22/08/20**	**vie 4/09/20**
6.5.1	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 1 "	3 días	sáb 22/08/20	mar 25/08/20
6.5.2	REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 1 "	3 días	mar 25/08/20	vie 28/08/20
6.5.3	CONEXIÓN A RED HIDRÁULICA EXISTENTE Ø 1 "	8 días	vie 28/08/20	vie 4/09/20
6.6	**TANQUE DE ALMACENAMIENTO**	**33,5 días**	**sáb 15/08/20**	**jue 17/09/20**
6.6.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN SEGÚN PLANOS. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO DE 0 - 2,00 MTS.	9 días	sáb 15/08/20	lun 24/08/20
6.6.2	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	14 días	sáb 22/08/20	vie 4/09/20
6.6.3	CIMENTACION Y ATRAQUE DE TUBERIA.	28 días	sáb 15/08/20	vie 11/09/20
6.6.4	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 2 "	4 días	sáb 22/08/20	mié 26/08/20
6.6.5	REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 2 "	3 días	mié 26/08/20	vie 28/08/20
6.6.6	VALVULA DE CHEQUE Ø 2 "	2 días	sáb 29/08/20	lun 31/08/20
6.6.7	VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN Ø 2 "	3 días	sáb 29/08/20	mar 1/09/20

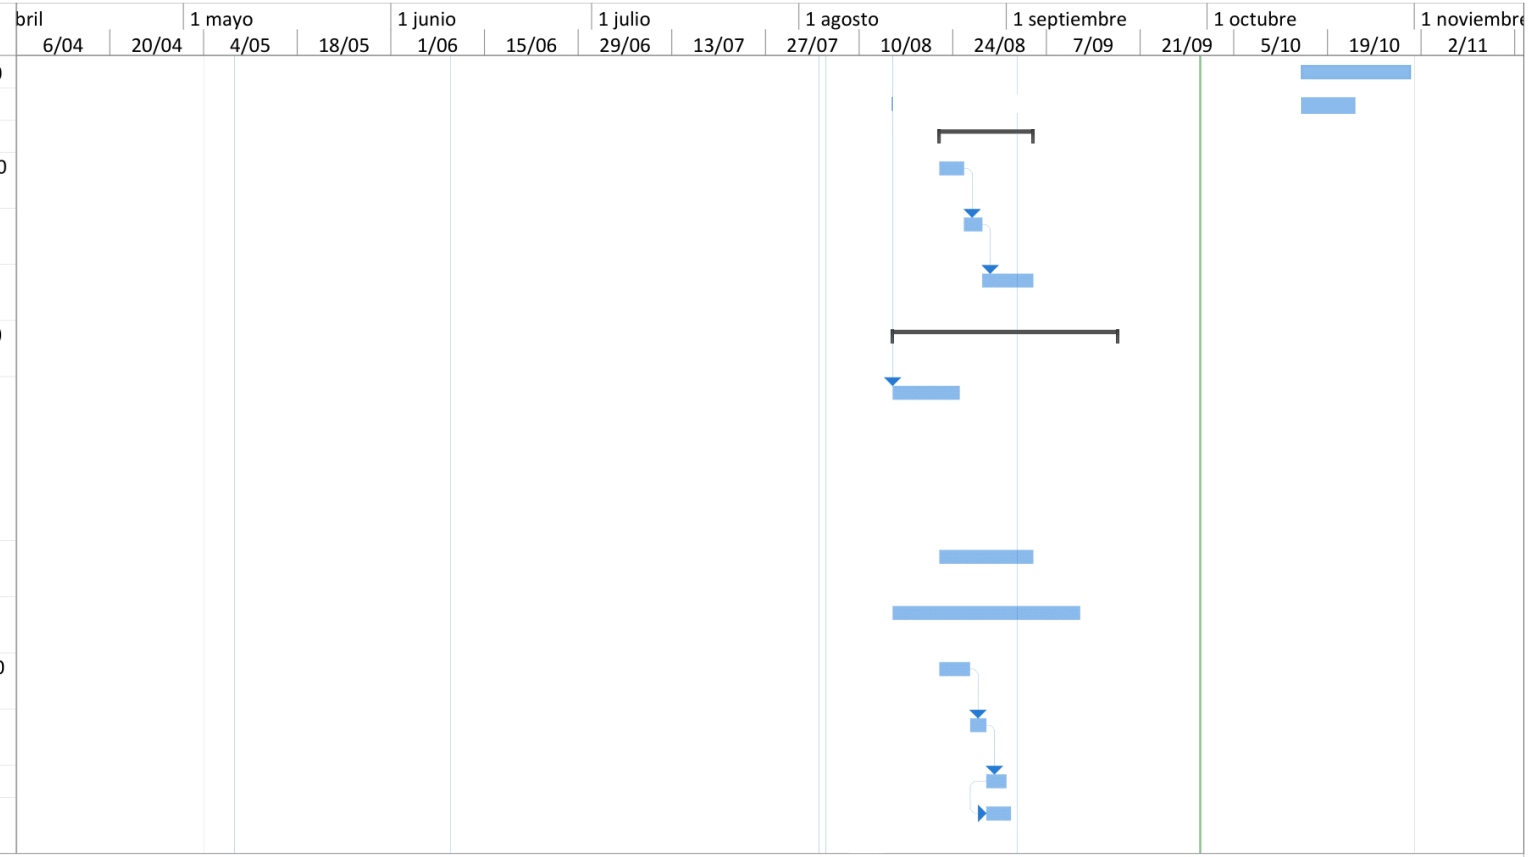

Proyecto: piscina olimpica +NP + c
Fecha: mié 30/09/20

Tarea	Hito externo	Informe de resumen manual	División crítica
División	Tarea inactiva	Resumen manual	Progreso
Hito	Hito inactivo	Sólo el comienzo	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Sólo fin	
Resumen del proyecto	Tarea manual	Fecha límite	
Tareas externas	Sólo duración	Tareas críticas	


EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
6.6.8	PASO PLÁSTICO PARA TANQUE EN FLUORESCENTE TRÁFICO PESADO HOMOLOGADO POR EAAB. ANTIDESLIZANTE CON ALMA DE ACERO. RESISTENTE A QUÍMICOS, ÁCIDOS, CLOROX, DEBE CUMPLIR CON NORMA CÁMARA SALINA NTC 1156	4 días	lun 19/10/20	jue 22/10/20
6.6.9	TAPA EN LÁMINA ALFAJOR CALIBRE 18 DE 1,00 X 1,00 M	4 días	jue 10/09/20	lun 14/09/20
6.6.10	SISTEMA VENTILACIÓN TANQUE SUBTERRÁNEO	4 días	jue 10/09/20	lun 14/09/20
6.6.11	CONEXIÓN A RED HIDRÁULICA EXISTENTE Ø 3 "	4 días	lun 14/09/20	jue 17/09/20
6.6.12	PRUEBA HIDRÁULICA	3 días	mar 15/09/20	jue 17/09/20
7	**INSTALACIONES ELECTRIC**	**115 días**	**lun 4/05/20**	**mié 26/08/20**
7.1	**INFRAESTRUCTURA ELECTRICA,COMUNICACIC Y OBRAS CIVILES**	**7 días**	**lun 11/05/20**	**sáb 16/05/20**
7.1.1	RETIRO DE ILUMINACIÓN SUBACUÁTICA DE LA PISCINA DE CADETES, INCLUYE RETIRO DE LUMINARIAS, RETIRO DE ALAMBRADO, RETIRO DE DUCTERIA, RETIRO DE TRANSFORMADORES DE BAJA TENSIÓN 110 V A 12 V Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN DICHO SISTEMA, LOS ELEMENTOS RETIR	7 días	lun 11/05/20	sáb 16/05/20



Proyecto: piscina olimpica +NP + c
Fecha: mié 30/09/20

Tarea	Hito externo	Informe de resumen manual	División crítica
División	Tarea inactiva	Resumen manual	Progreso
Hito	Hito inactivo	Sólo el comienzo	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Sólo fin	
Resumen del proyecto	Tarea manual	Fecha límite	
Tareas externas	Sólo duración	Tareas críticas	


EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
7.2	**BANCO DE DUCTERIAS INTERNAS-EXTERNAS TIPO CONDUIT PVC, EMT, IMC, CAJAS DE**	**115 días**	**lun 4/05/20**	**mié 26/08/20**
7.2.1	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE BANCO DE DUCTOS SUBTERRÁNEO SCH 40 DE 1XØ1 1/2 " ., INCLUYE CAJAS DE PASO CON TAPA, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO, ESTA SERA LA DUCTERIA D	0 días	lun 4/05/20	lun 4/05/20
7.2.2	CAJA PLÁSTICA INDUSTRIAL PLEXO WEATHERPROOF BOXES DE LEGRAND, DE DIMENSIONES 220 X 170 X 140 MM, LIBRE DE HALÓGENOS IP 55, IK 07.	2 días	mar 18/08/20	mié 19/08/20
7.2.3	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE BANCO DE DUCTOS SUBTERRÁNEO PVC - TDP DE 1XØ1 " . INCLUYE TERMINALES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	26 días	lun 4/05/20	jue 28/05/20

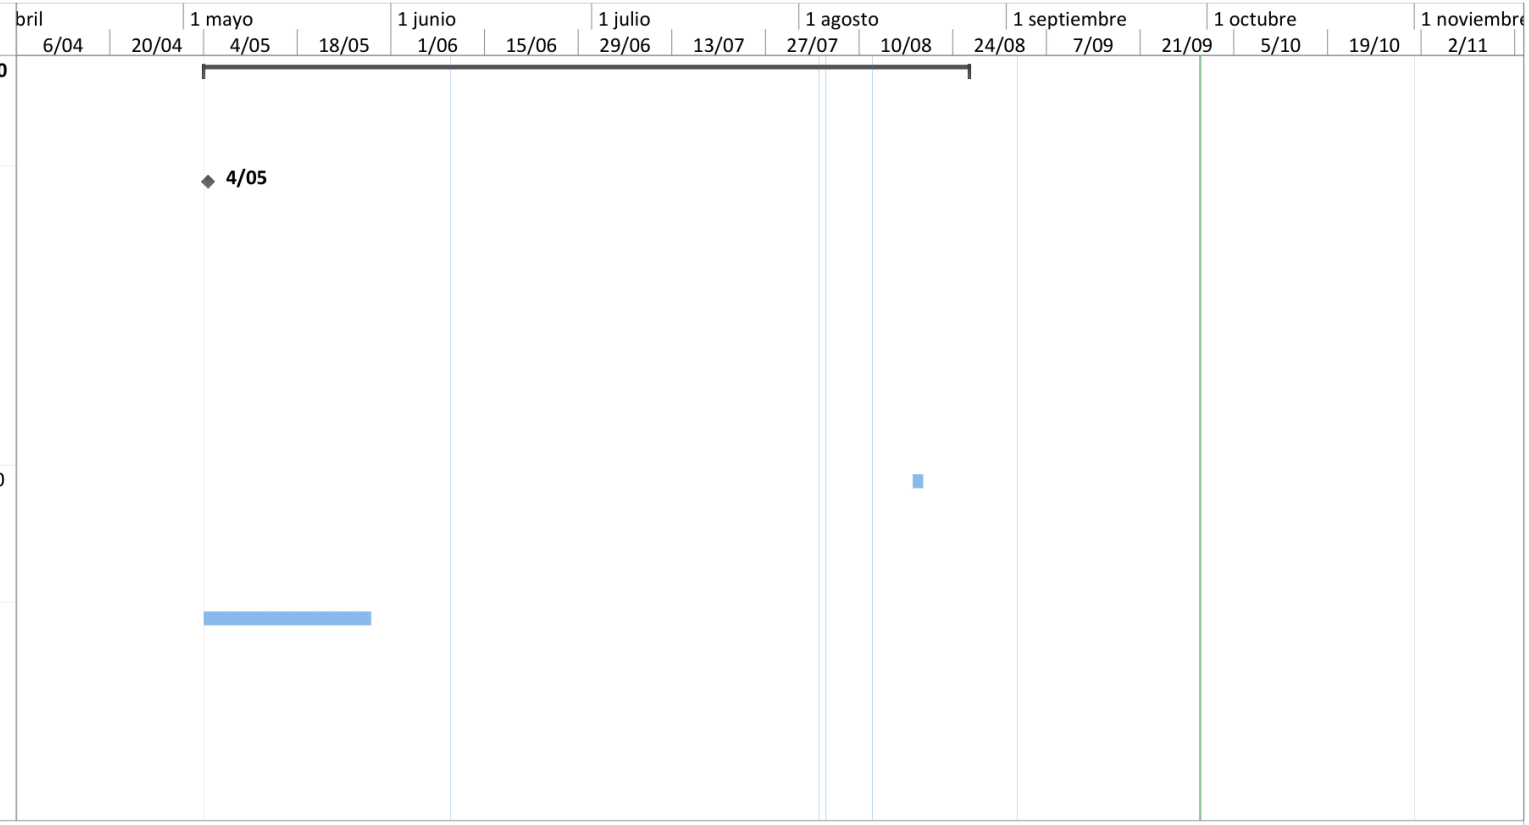

Proyecto: piscina olimpica +NP + c
Fecha: mié 30/09/20

Tarea	Hito externo	Informe de resumen manual	División crítica
División	Tarea inactiva	Resumen manual	Progreso
Hito	Hito inactivo	Sólo el comienzo	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Sólo fin	
Resumen del proyecto	Tarea manual	Fecha límite	
Tareas externas	Sólo duración	Tareas críticas	


EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
7.2.4	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA EN CABLE 3 X(NO. 8 CUXAWG FASES) + 1 X NO.8 CUXAWG NEUTRO + 1 X NO. 8 CUXDESNXAWG TIERRA, EN CABLEADO THWN, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	15 días	lun 10/08/20	lun 24/08/20
7.2.5	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA TRIFÁSICA ENTRE 15 Y 65 A, 10KA, 230V, DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR O CUADRO DE CARGAS	17 días	lun 10/08/20	mié 26/08/20
7.2.6	EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN EN ZONA VERDE, NORMA CODENSA CS207 MEDIDAS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS), INCLUYE RELLENO CON EL MISMO MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA ZONA VERDE.	15 días	lun 10/08/20	lun 24/08/20
12	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**	**78,25 días**	**lun 22/06/20**	**lun 7/09/20**

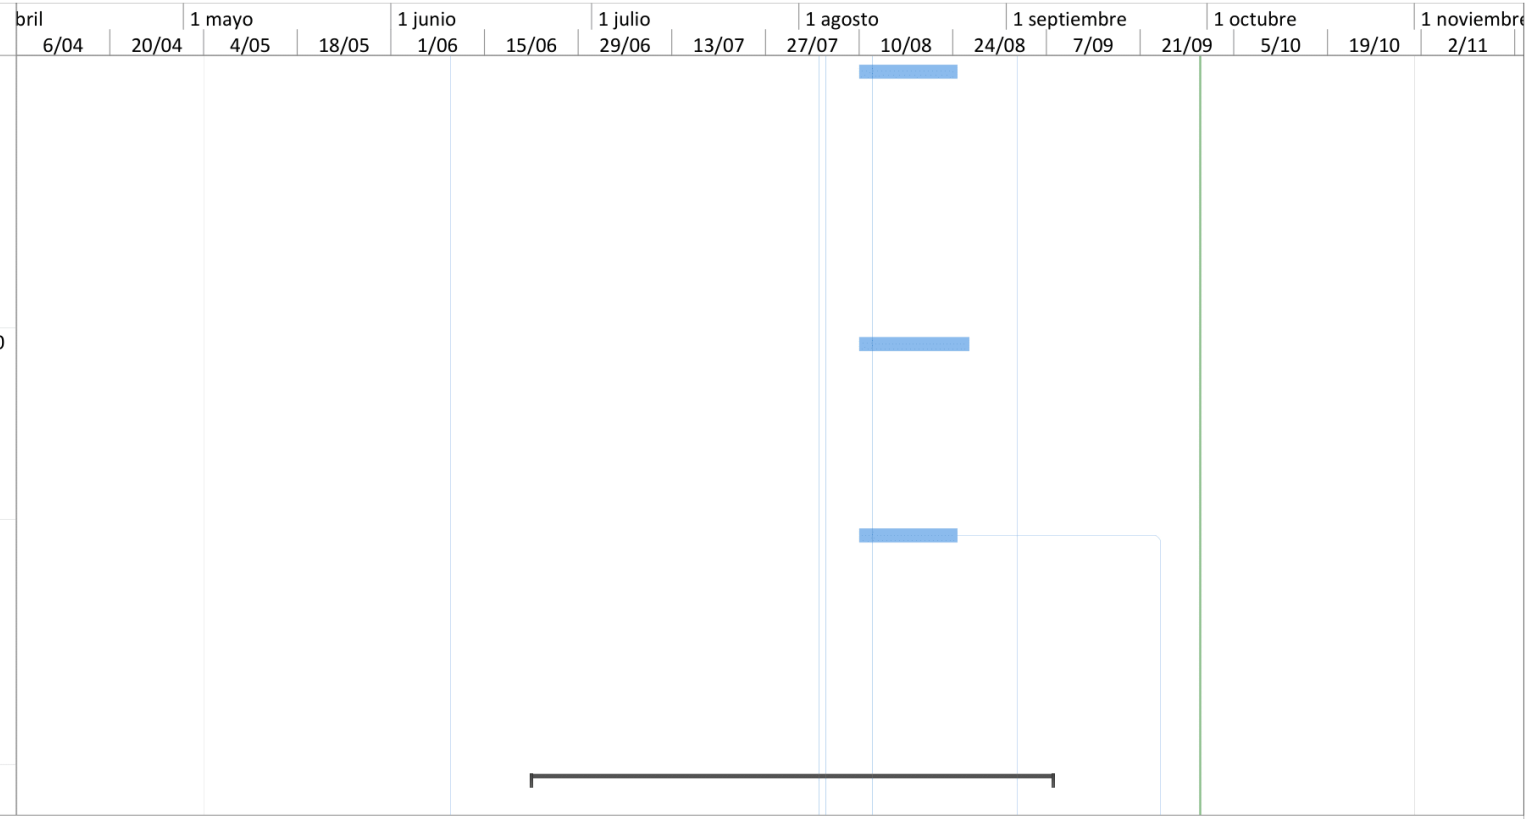

Proyecto: piscina olimpica +NP + c
Fecha: mié 30/09/20

Tarea	Hito externo	Informe de resumen manual	División crítica
División	Tarea inactiva	Resumen manual	Progreso
Hito	Hito inactivo	Sólo el comienzo	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Sólo fin	
Resumen del proyecto	Tarea manual	Fecha límite	
Tareas externas	Sólo duración	Tareas críticas	


EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
12.1	IMPERMEABILIZACIÓN PISCINA. INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRATAMIENTO DE FISURAS, TRATAMIENTO DE JUNTAS PERIMETRALES, LIMPIEZA DE JUNTAS, INSTALACIÓN DE MEMBRANA EN CAMBIOS DE PLANO, ÁREAS DE JUNTAS Y ELEMENTOS DE DRENAJE. ESPESOR FINAL: 1,8 MM /	8 días	lun 22/06/20	lun 29/06/20
12.2	IMPERMEABILIZACIÓN EN MEMBRANA SINTÉTICA TPO PARA TANQUE	10 días	lun 05/10/20	jue 15/10/20
12.3	ENCHAPE PISCINA 0,25 X 0,25 MTS INCLUYE MARCAS DE LINEAS EN FONDO DE LA PISCINA Y MARCAS DE TARGETS EN LA LLEGADA DE LOS CARRILES DE ACUERDO A NORMAS FINA. REF. TICINO AZUL Y BLANCO CORONA O SIMILAR	14 días	sáb 4/07/20	vie 17/07/20
12.4	PISO BORDE PISCINA MEDITERRÁNEA 40 X 40 CMS COLOR BEIGE. REFERENCIA DECORCERÁMICA O SIMILAR	19 días	mar 4/08/20	vie 21/08/20
12.5	PISO PARA CIRCULACIÓN PERIMETRAL A LA PISCINA MEDITERRÁNEA ADZ 30 X 50 CMS COLOR BEIGE. REFERENCIA DECORCERÁMICA O SIMILAR	28 días	mar 11/08/20	lun 7/09/20
12.6	MANTENIMIENTO PISO EXTERIORES PISCINA (TABLÓN GRES 0,10 X 0,10 MTS)	22 días	sáb 18/07/20	lun 10/08/20

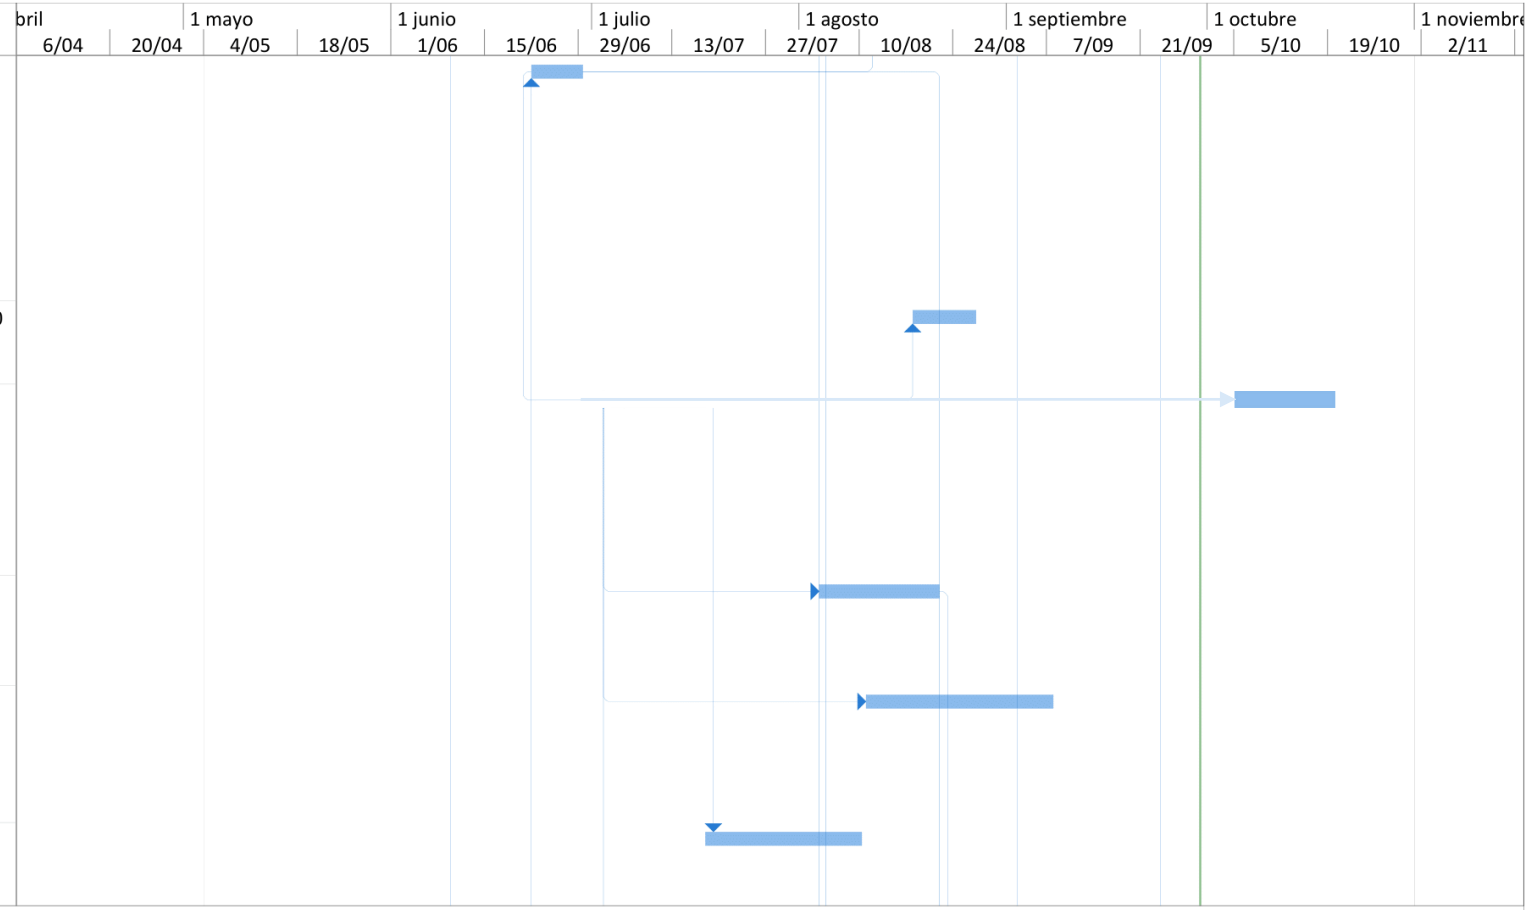

Proyecto: piscina olimpica +NP + c
Fecha: mié 30/09/20

Tarea	Hito externo	Informe de resumen manual	División crítica
División	Tarea inactiva	Resumen manual	Progreso
Hito	Hito inactivo	Sólo el comienzo	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Sólo fin	
Resumen del proyecto	Tarea manual	Fecha límite	
Tareas externas	Sólo duración	Tareas críticas	


EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
12.7	PISO EN GRANITO FUNDIDO Y LAVADO EN SITIO. INCLUYE JUNTAS DE DILATACIÓN BRONCE. INCLUYE PISO DUCHAS EXTERIORES, Y REMATE (BORDILLO) EN FONDO PISCINA (VIGA PERIMETRAL). INCLUYE RECUPERACIÓN ÁREA CIRCULACIÓN PERIMETRAL PISCINA	30 días	lun 13/07/20	mar 11/08/20
24	**ASEO GENERAL**	**175 días**	**lun 11/05/20**	**sáb 31/10/20**
24.1	LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR	175 días	lun 11/05/20	sáb 31/10/20
24.2	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	143 días	jue 11/06/20	sáb 31/10/20
26	**EQUIPOS HIDRAULICOS**	**44,25 días**	**sáb 25/07/20**	**mar 8/09/20**
26.1	ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA QMAX= 2300LPM	0 días	sáb 25/07/20	sáb 25/07/20
26.2	UNIDAD DE FILTRACIÓN EN FIBRA DE VIDRIO DE ALTA PRESIÓN	5 días	lun 27/07/20	vie 31/07/20
26.3	SIPS DE CLORACIÓN (INCLUYE BOMBA PERISTÁLTICA, TANQUE Y CONEXIONES)	14 días	sáb 22/08/20	vie 4/09/20
26.4	SIPS EQUIPO HIDRONEUMÁTICO 6,0 HP(INCLUYE: TANQUE HIDROACUMULADOR 300 LTS, 2 BOMBAS, TABLERO Y CONEXIONES ELÉCTRICAS, ACCESORIOS, TUBERÍA DE CONEXIÓN GALVANIZADA, PEDESTALES, FLOTADOR ETC.)	3 días	sáb 5/09/20	mar 8/09/20
26	**EQUIPOS ELECTRICOS**	**6 días**	**lun 19/10/20**	**sáb 24/10/20**

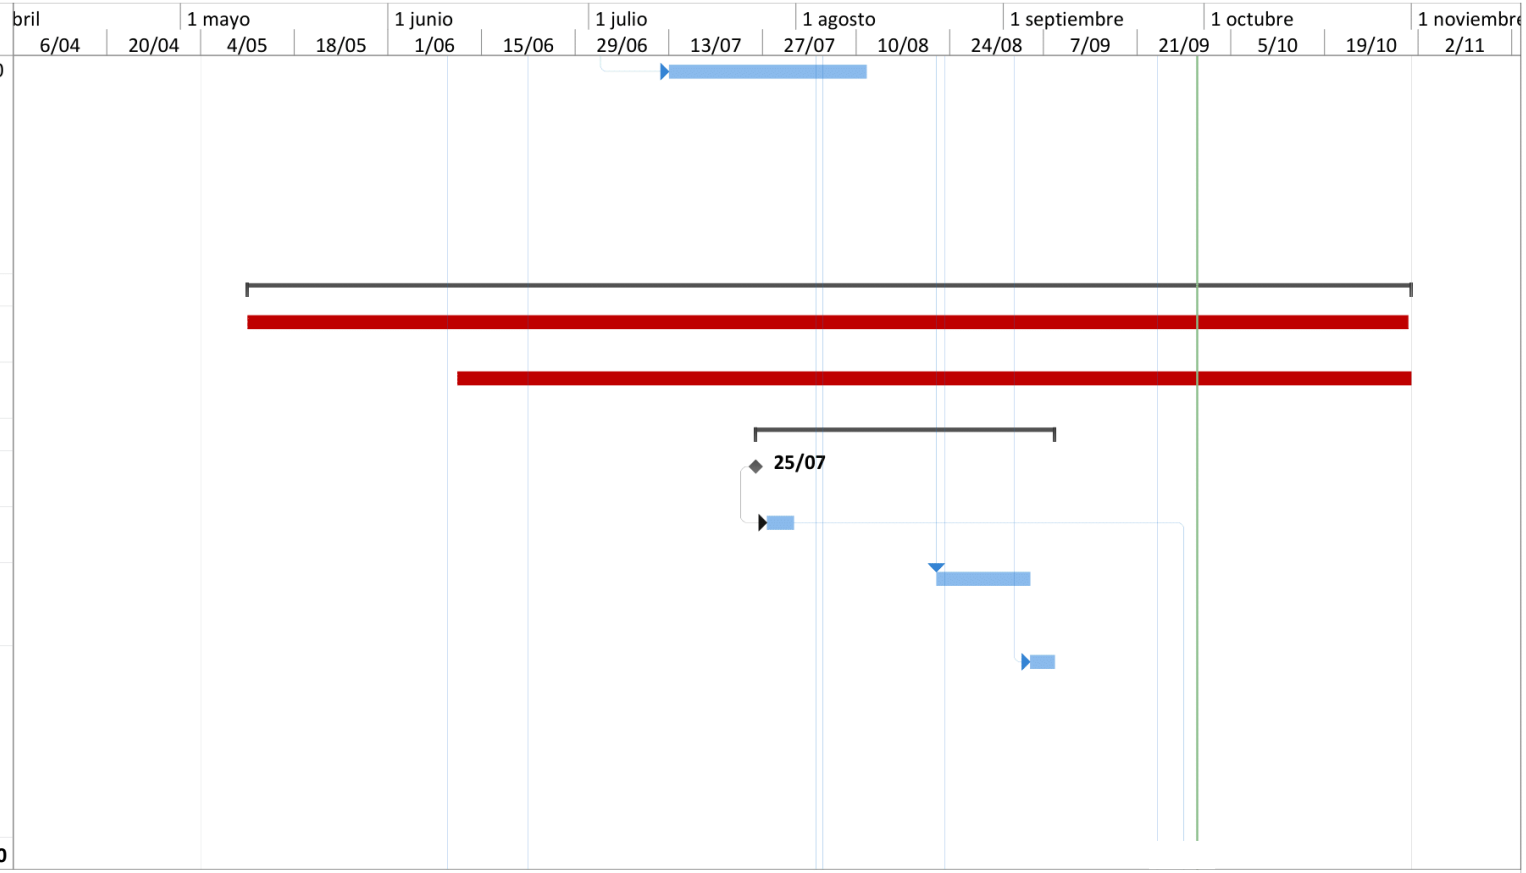

Proyecto: piscina olimpica +NP + c
Fecha: mié 30/09/20

Tarea	Hito externo	Informe de resumen manual	División crítica
División	Tarea inactiva	Resumen manual	Progreso
Hito	Hito inactivo	Sólo el comienzo	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Sólo fin	
Resumen del proyecto	Tarea manual	Fecha límite	
Tareas externas	Sólo duración	Tareas críticas	


EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
26.5	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SISTEMA DE ALARMA DE DETECCIÓN DE PRESENCIA MEDIANTE SENSORES FOTOELÉCTRICOS, INCLUYE 4 PARES DE DETECTORES FOTOELÉCTRICOS ABT100, POSTE EN ACERO INOXIDABLE DE 60 CM DE ALTURA ÚTIL CON SU BASE PARA INSTALACI	6 días	lun 19/10/20	sab 24/10/20
12	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**	**7 días**	**lun 19/10/20**	**sáb 24/10/20**
12.8	PINTURA EPÓXICA AZUL - AMARILLA CON DEMARCACIÓN DE SEGURIDAD, PARA TRÁFICO PESADO - BODEGA. PINTURA EPÓXICA EN 3 CAPAS EN EL PRIMER NIVEL DE LA SUPERFICIE PREVIAMENTE ALISTADA, (INCLUYE APLICACIÓN DE DESINCRUSTANTE DEMARCACIÓN DE ZONAS DE ACUERDO A LA DIS	7 días	lun 19/10/20	sáb 24/10/20
13	**PINTURAS**	**11 días**	**sáb 19/09/20**	**mié 30/09/20**
13.1	ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	11 días	jue 15/10/20	mar 27/10/20
18	**CUBIERTAS**	**32 días**	**mie 30/09/20**	**sáb 31/10/20**

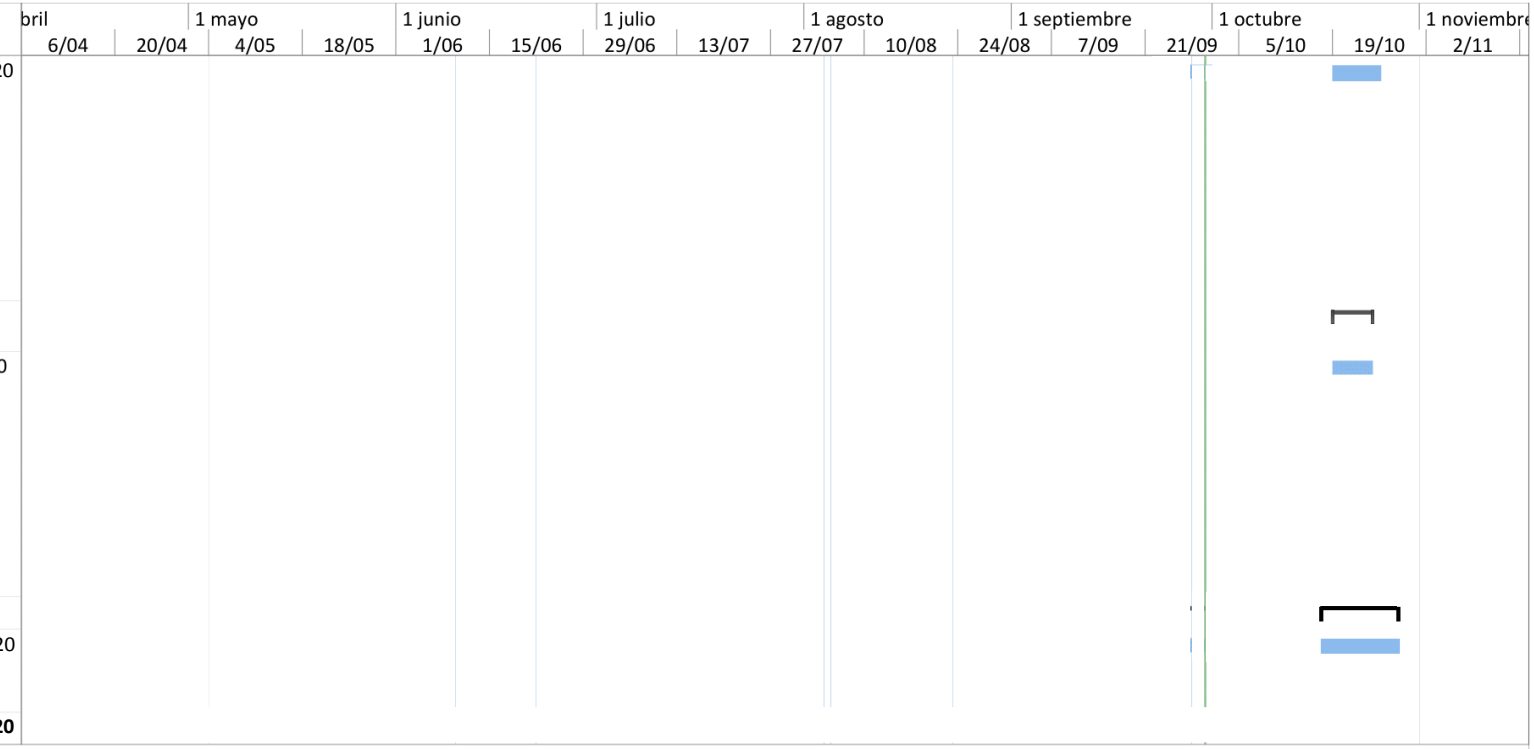

Proyecto: piscina olimpica +NP + c
Fecha: mié 30/09/20

Tarea	Hito externo	Informe de resumen manual	División crítica
División	Tarea inactiva	Resumen manual	Progreso
Hito	Hito inactivo	Sólo el comienzo	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Sólo fin	
Resumen del proyecto	Tarea manual	Fecha límite	
Tareas externas	Sólo duración	Tareas críticas	


EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
18.1	LIMPIEZA MANUAL-MECÁNICA TIPO SSPC SP2 Y SSPC SP3 PARA ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA DE CONSTRUCCIÓN EXISTENTE. INLCUYE SISTEMA DE RECUBRIMIENTO PARA LA ESTRUCTURA METÁLICA MEDIANTE IMPRIMANTE EPÓXICO FOSTATO DE CINC TIPO SIKA O SIMILAR Y/O BARNIZ QDS T	7 días	lun 5/10/20	sáb 10/10/20
18.2	ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFIL PHR METALICO TIPO ACESCO O SIMILAR SEGUN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TEMPLETES, CONTRAVIENTOS Y OTROS ACCESORIOS, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y	7 días	lun 19/10/20	sáb 24/10/20
18.3	TEJA EN LAMINA SIN TRASLAPO COLOR (SEGÚN UMA) EXTERIOR Y BLANCO INTERIOR TIPO SANDWICH PANEL 2" ANCHO 45CM CAL 24 (INCLUYE STANDING S 0,61XML 26 V/B, CLIP PRIMER PISO TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4)	0 días	lun 4/05/20	lun 4/05/20
NP	**NO PREVISTOS**	**181,25 d**	**lun 4/05/20**	**vie 30/10/20**

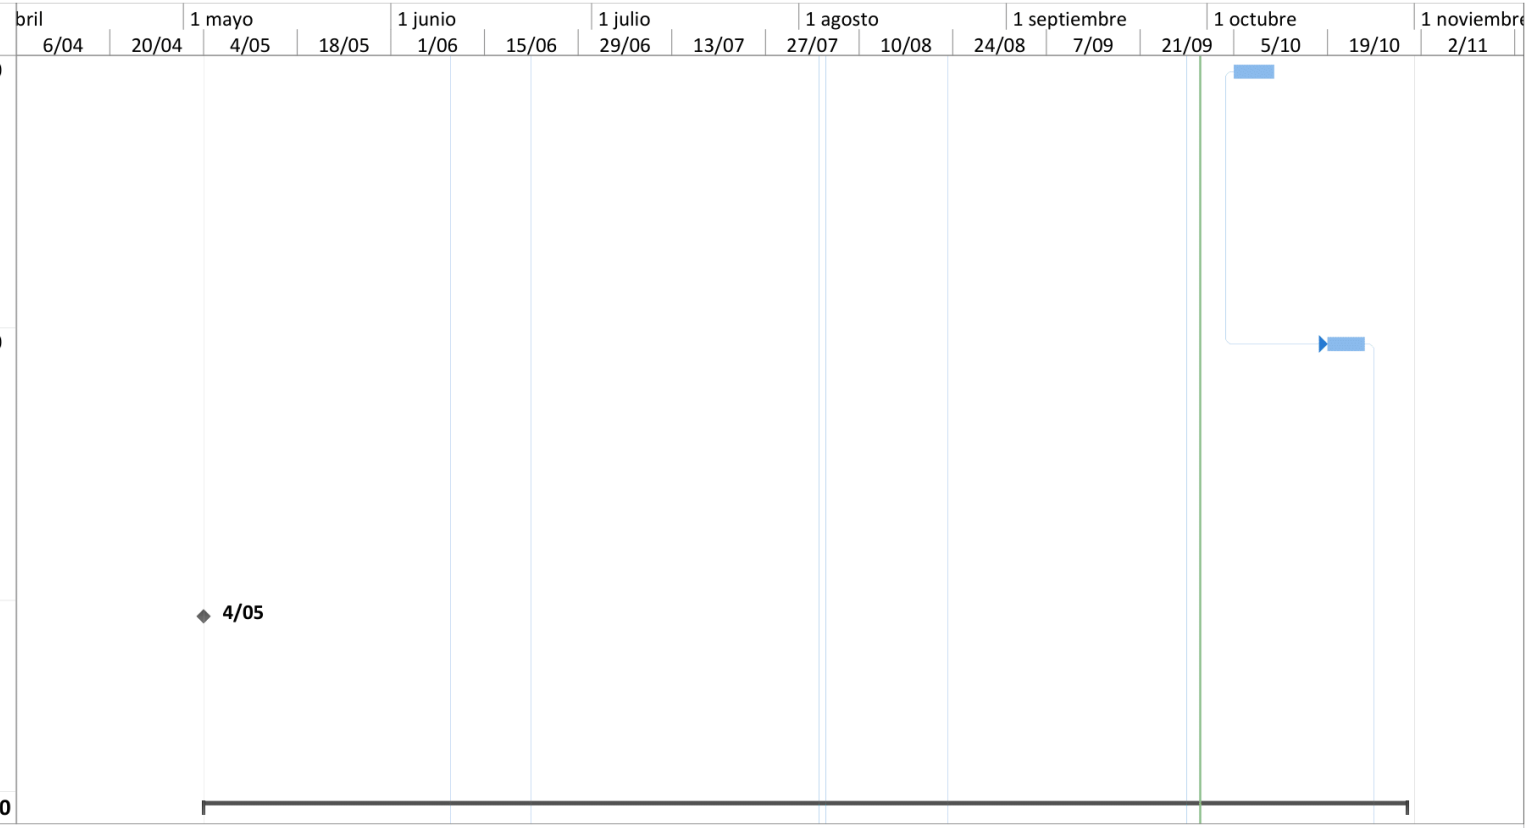

Proyecto: piscina olimpica +NP + c
Fecha: mié 30/09/20

Tarea	Hito externo	Informe de resumen manual	División crítica
División	Tarea inactiva	Resumen manual	Progreso
Hito	Hito inactivo	Sólo el comienzo	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Sólo fin	
Resumen del proyecto	Tarea manual	Fecha límite	
Tareas externas	Sólo duración	Tareas críticas	


EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
NP1	REPARACION Y NIVELACION DE SUPERFICIE PARA INSTALACION DE ENCHAPE, INCLUYE, DEMOLICION DE REBOSDERO Y BORDE DE GRANITO, PAÑETE DE SUPERFICIE, RELLENO PUNTOS DE ILUMINACION SUBACUATICOS EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO Y CONSTRUCCION DE CINTA EN CONCRETO, LAVA	8 días	lun 8/06/20	mar 16/06/20
NP2	IMPERMEABILIZACION PLACA SOBRE SOTANO, INCLUYE DEMOLICION BALDOSA GRES, DEMOLICION ALISTADO DE PISO, DEMOLICION MEDIA CAÑA EN GRANO LAVADO, RETIRO DE MANTO, IMPERMEABILIZACION EN MANTO TEXSA O SIMILAR, INCLUYE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA, ALISTADO	10 días	sáb 1/08/20	mar 11/08/20
NP3	ADECUACION CUARTO, TANQUE SUBTERRANEO Y CONEXIONES EQUIPOS DE PRESION INCLUYE DESMONTE DE BOMBAS EXISTENTES, REPARACION EN PASAMUROS TANQUE, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT Ø2" PARA ACOMETIDA EN CABLE 3 X(NO. 8 CUXAWG FASES) + 1 X NO.8 CUXAWG NE	15 días	mar 4/08/20	mar 18/08/20

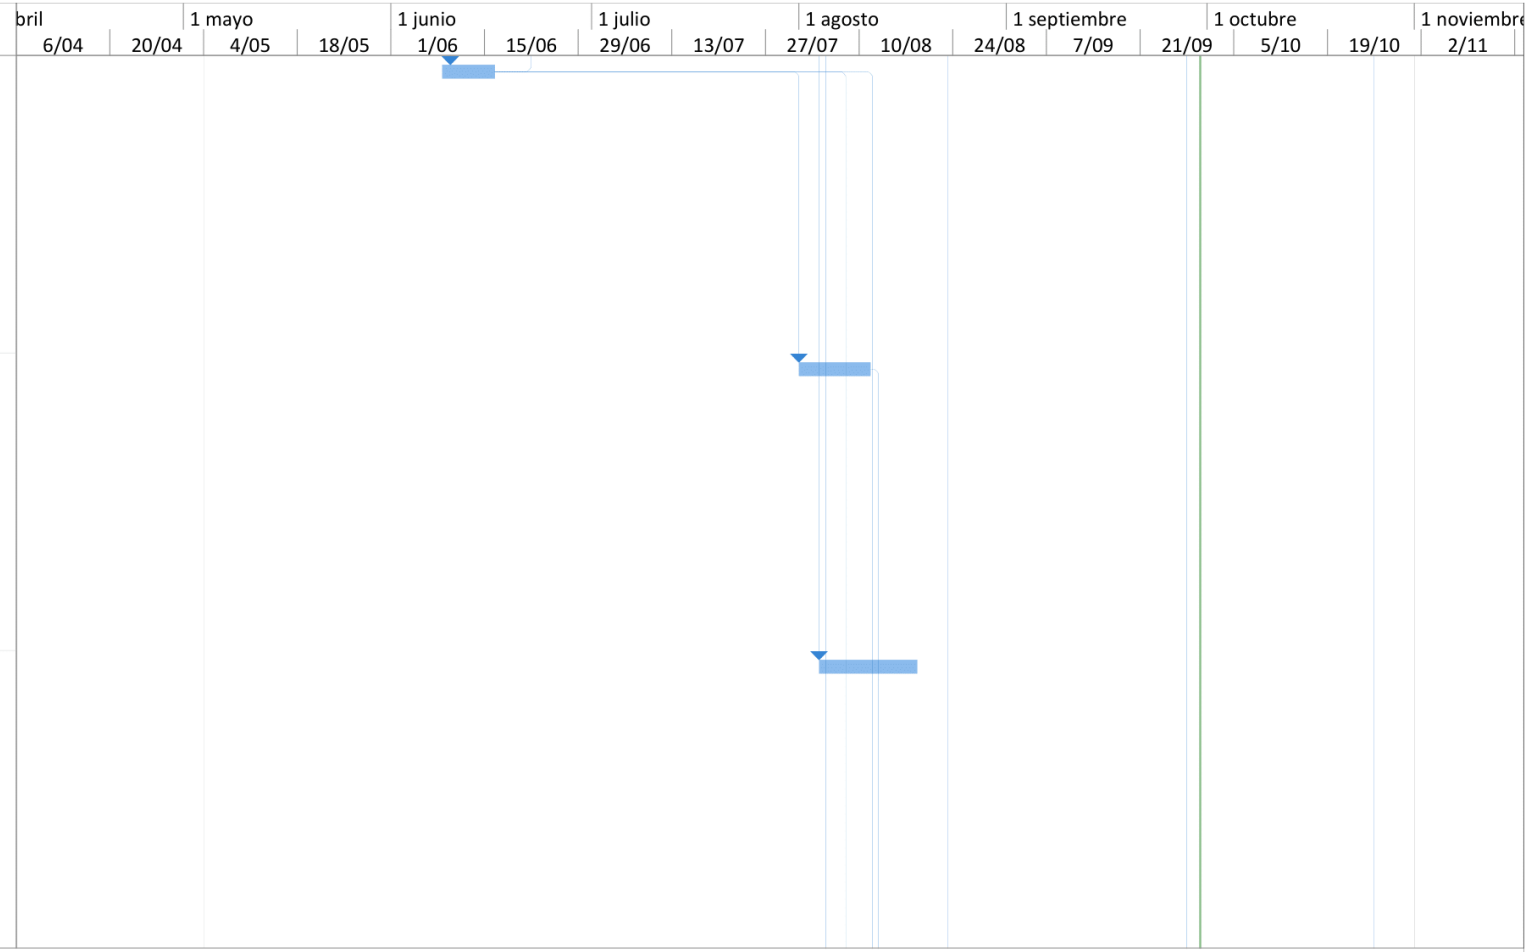

Proyecto: piscina olimpica +NP + c
Fecha: mié 30/09/20

Tarea	Hito externo	Informe de resumen manual	División crítica
División	Tarea inactiva	Resumen manual	Progreso
Hito	Hito inactivo	Sólo el comienzo	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Sólo fin	
Resumen del proyecto	Tarea manual	Fecha límite	
Tareas externas	Sólo duración	Tareas críticas	


EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
NP4	ADECUACION CUARTO DE EQUIPOS PISCINA, INCLUYE, CONSTRUCCION DE DADOS EN CONCRETO, ALISTADO DE PISO EN MORTERO, SUMINSTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA TABLERO A BOMBAS CENTRIFUGAS PISCINA EN CABLE No 2 AWG 600 V 3FASES 1 NEUTRO 1 TIERRA, BREAKER BIFASICO	23 días	mié 5/08/20	jue 27/08/20
NP5	CAMBIO DE TUBERIA SISTEMA DE INYECCION INCLUYE, CORTE CON DISCO DIAMANTADO SOBRE CONCRETO, DEMOLICION PLACA Y ALISTADO DE PISO, CORTE TUBERIA 6" ACERO AL CARBONO, CONEXIÓN BRIDA A PASAMUROS EXISTENTE, TEE Ø 6" CON REDUCCION A Ø 4", BUJE SOLDADO PVCP 4"	13 días	sáb 8/08/20	vie 21/08/20
NP6	ADECUACION SUPERFICIES TANQUE DE EQUILIBRIO INCLUYE, DEMOLICION DE MUROS EN CONCRETO, LAVADO CON RINSE, REPARACION EN MUROS, MANTENIMIENTO TUBERIA 8"	9 días	mié 12/08/20	jue 20/08/20

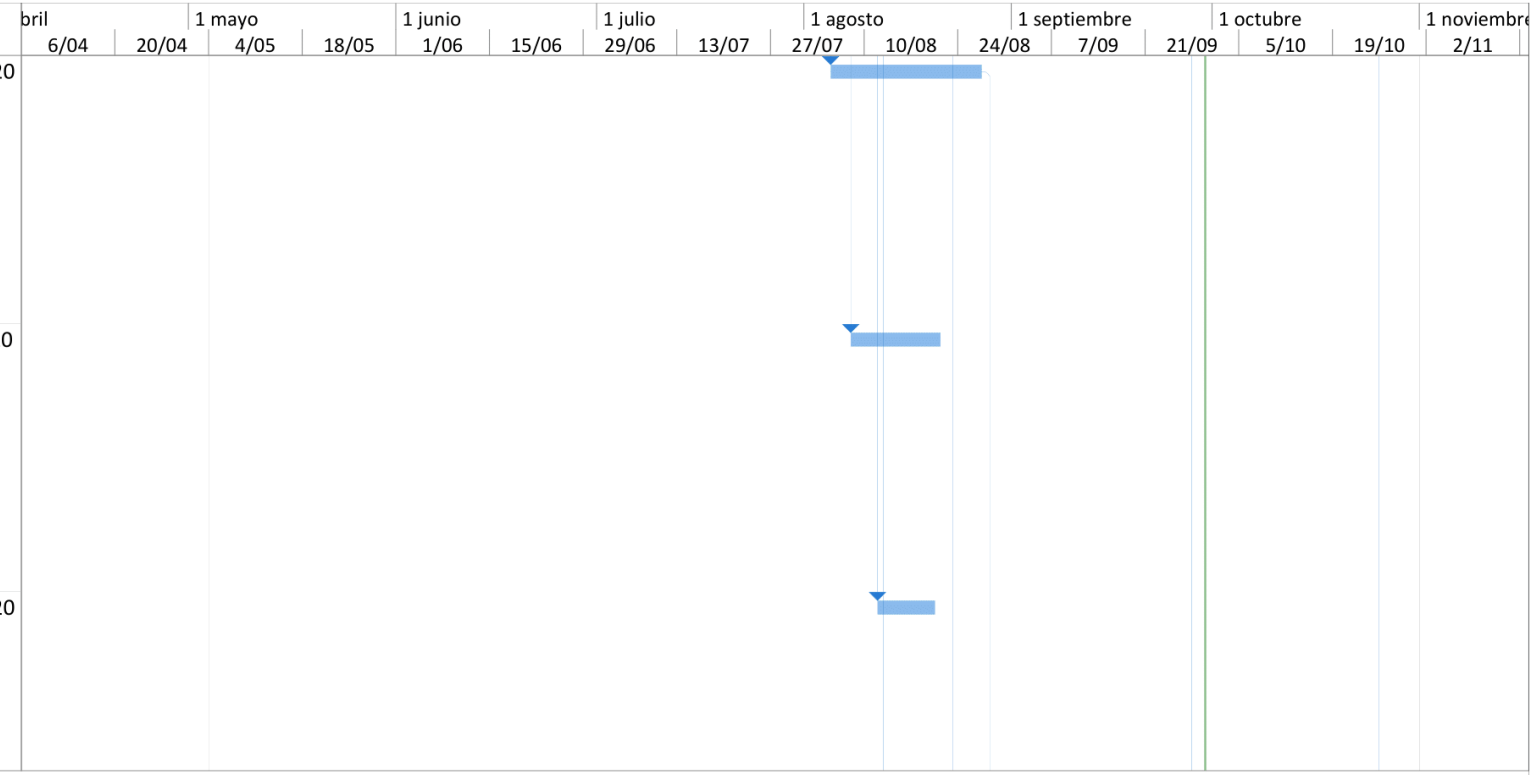

Proyecto: piscina olimpica +NP + c
Fecha: mié 30/09/20

Tarea	Hito externo	Informe de resumen manual	División crítica		
División	Tarea inactiva	Resumen manual	Progreso		
Hito	Hito inactivo	Sólo el comienzo	Progreso manual		
Resumen	Resumen inactivo	Sólo fin			
Resumen del proyecto	Tarea manual	Fecha límite			
Tareas externas	Sólo duración	Tareas críticas			


EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
NP7	ADECUACION PARA INSTALACION DE DUCTERIA DE RESERVA PARA EL CABLEADO DEL SISTEMA DE LOS CRONOMETROS DE COMPETENCIA. INCLUYE, NUCLEOS PARA PASAMUROS, CORTE DE PLACA PARA CAJAS, REGATA EN MURO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC CONDUIT DB DIAM 3", SUMI	9 días	mar 11/08/20	jue 20/08/20
NP8	REMOCION DE PINTURA Y REPARACIÓN DE BORDE EN CANAL	12 días	sáb 22/08/20	jue 3/09/20
NP9	TRAMPA DE CABELLO EN ACERO INOXIDABLE DE 10" CON CONEXIONES BRIDADAS DE ENTRADA 8" Y SALIDA 6" + FILTRO MALLA	4 días	jue 27/08/20	mar 1/09/20
NP10	Excavación, relleno y compactación en andén de concreto, norma CODENSA CS207 (0.84mx0.40m) corte (d-d'), incluye relleno con el mismo material de la Excavación y recuperación del andén en concreto.	6 días	mar 1/09/20	lun 7/09/20
NP11	Excavación, relleno y compactación en zona verde, norma CODENSA CS207 (0.84mx0.40m) corte (a-a'), (b-b'), (c-c'), incluye relleno con el mismo material de la Excavación y recuperación de la zona verde.	6 días	lun 7/09/20	vie 11/09/20

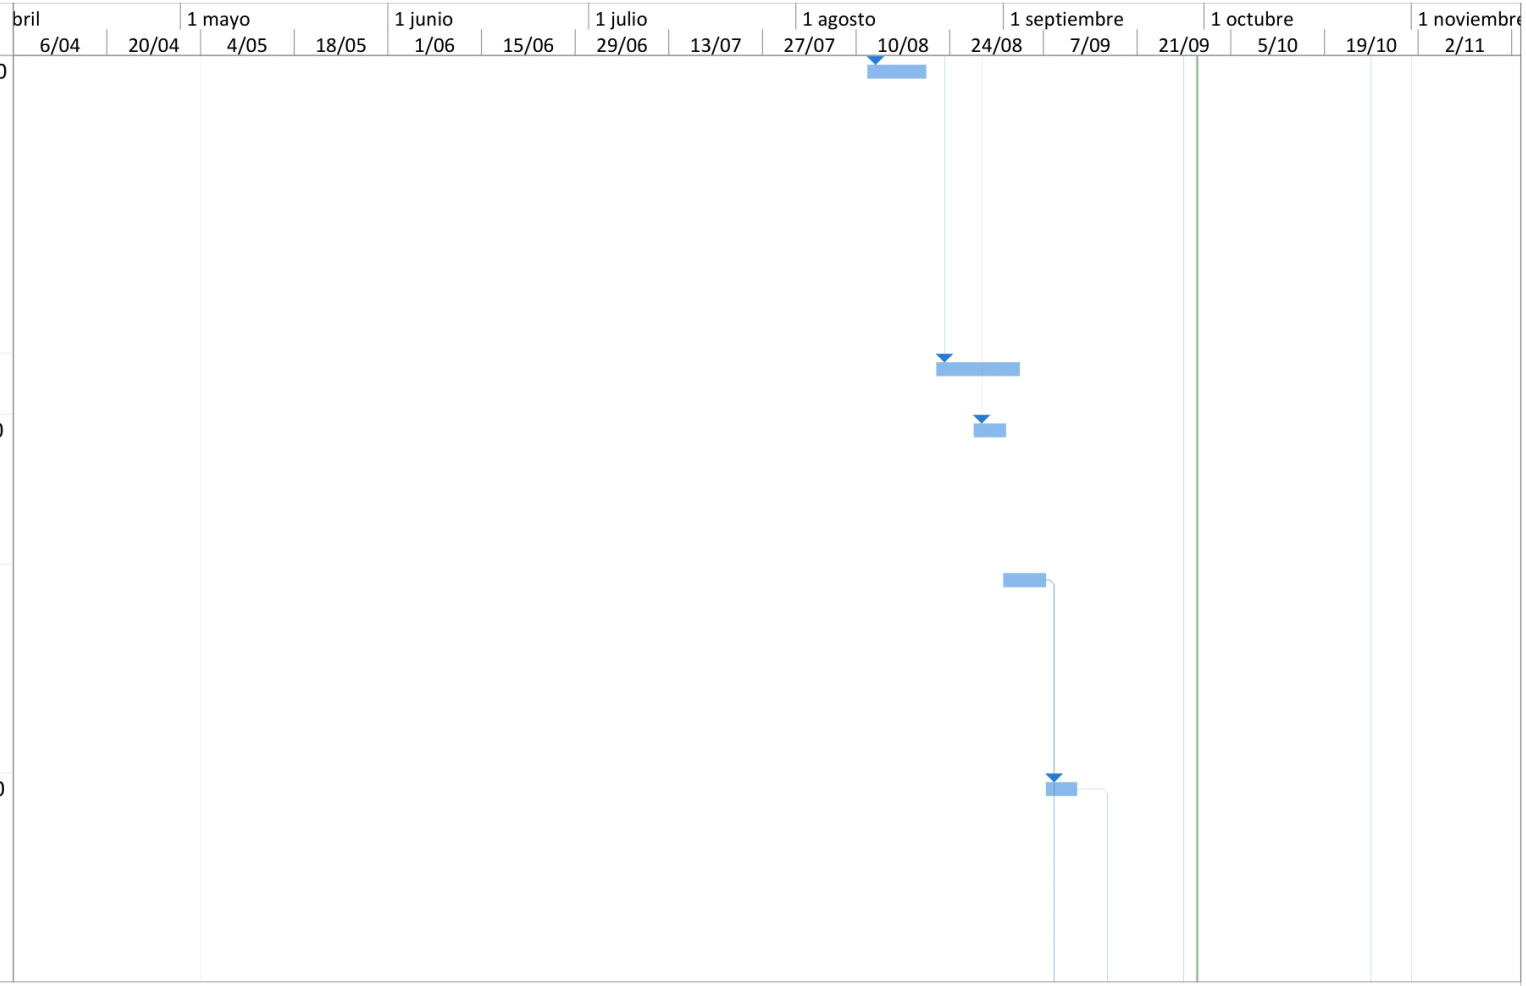

Proyecto: piscina olimpica +NP + c
Fecha: mié 30/09/20

Tarea	Hito externo	Informe de resumen manual	División crítica		
División	Tarea inactiva	Resumen manual	Progreso		
Hito	Hito inactivo	Sólo el comienzo	Progreso manual		
Resumen	Resumen inactivo	Sólo fin			
Resumen del proyecto	Tarea manual	Fecha límite			
Tareas externas	Sólo duración	Tareas críticas			


EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
NP12	Suministro instalación y puesta en servicio de caja de inspección, según norma CODENSA CS274, incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y puesta en servicio.	9 días	lun 7/09/20	mar 15/09/20
NP13	Retiro de Reflectores en postes de concreto de iluminación exterior de la piscina de cadetes, incluye desvestido de la estructura existente, retiro de alambrado, retiro de poste, retiro sistemas de anclaje, ductos y todos los elementos que componen dicho	2 días	lun 7/09/20	mar 8/09/20
NP14	Suministro instalación y puesta en servicio de banco de ductos subterráneo PVC - DB de 3XØ2". (corte B-B´), incluye terminales, uniones, soportes y todo lo necesario para su correcta instalación y puesta en servicio.	7 días	mié 16/09/20	mié 23/09/20
NP15	Suministro, instalación y puesta en servicio de 2 luminarias Proyector LED Sylveo Pro 800 W, 5000 K, flujo luminoso 80000 lm, eficacia 100 lm/W, IP 65, IK 08, incluye cableado en calibre 8 AWG THWN, bornas, poste de fibra de 12 metros capacidad de rotura	3 días	mié 23/09/20	vie 25/09/20

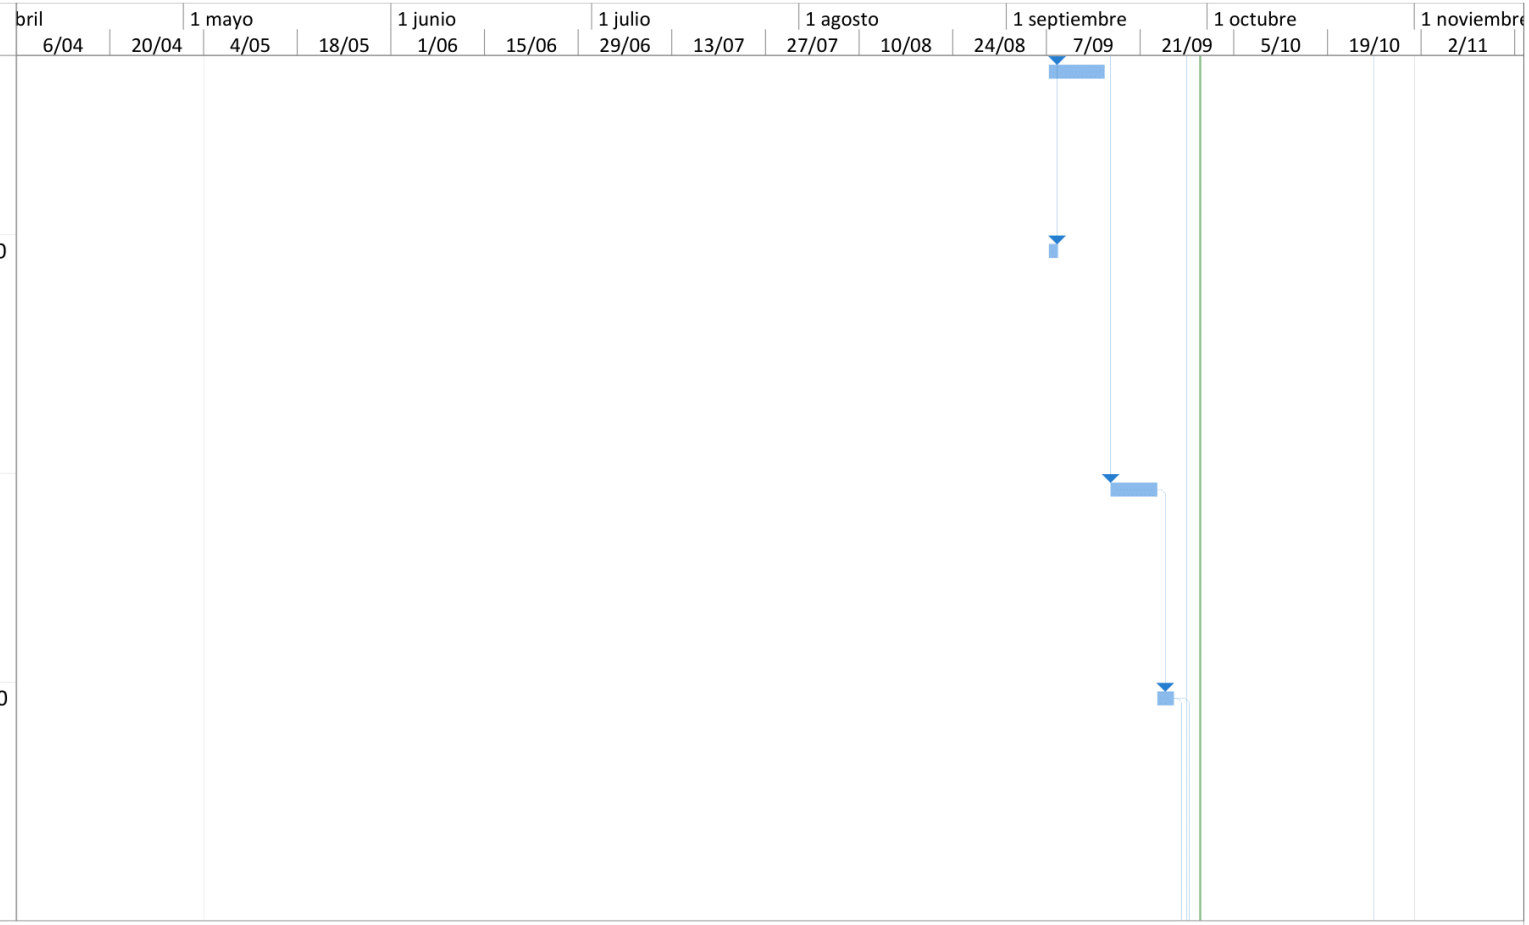

Proyecto: piscina olimpica +NP + c
Fecha: mié 30/09/20

Tarea	Hito externo	Informe de resumen manual	División crítica
División	Tarea inactiva	Resumen manual	Progreso
Hito	Hito inactivo	Sólo el comienzo	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Sólo fin	
Resumen del proyecto	Tarea manual	Fecha límite	
Tareas externas	Sólo duración	Tareas críticas	

EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
NP16	Suministro instalación y puesta en servicio de sistema de puesta tierra para apantallamiento de postes de iluminación, incluye varilla CW 5/8" x 2,4m cobre-99%, punto de soldadura exotérmica, FAVIGEL bolsa 25kg, cable CU desnudo no. 2/0 AWG para anillo p	3 días	lun 28/09/20	mié 30/09/20
NP17	Suministro, instalación y puesta en servicio de sistema de apantallamiento contra descargas atmosféricas, mediante punta captadora de 2000 mm en aluminio de 1xø 1/2" con aislador y base para fijación, incluye bajante en conductor de cobre aislado 1/0 A	4 días	sáb 26/09/20	mié 30/09/20
NP18	Teja Roof sin tras. Blanca según UMA cal. 26 *0,49 ml + clips de fijación más tornillo de fijación.	5 días	lun 26/10/20	jue 29/10/20
NP19	DESMONTE TEJAS DE CUBIERTA	7,63 días	lun 12/10/20	lun 19/10/20
NP20	DESMONTE CERCHAS EXISTENTES	7,63 días	lun 12/10/20	lun 19/10/20
NP21	DESMONTE Y REINSTALACION REDES ELECTRICASY	21,63 días	vie 9/10/20	vie 30/10/20
NP	EQUIPOS HIDRAULICOS	**5,75 días**	**mie 30/09/20**	**lun 5/10/20**
NP22	BOMBA CENTRIFUGA, POTENCIA 20 hp	5,75 días	mie 30/09/20	lun 5/10/20

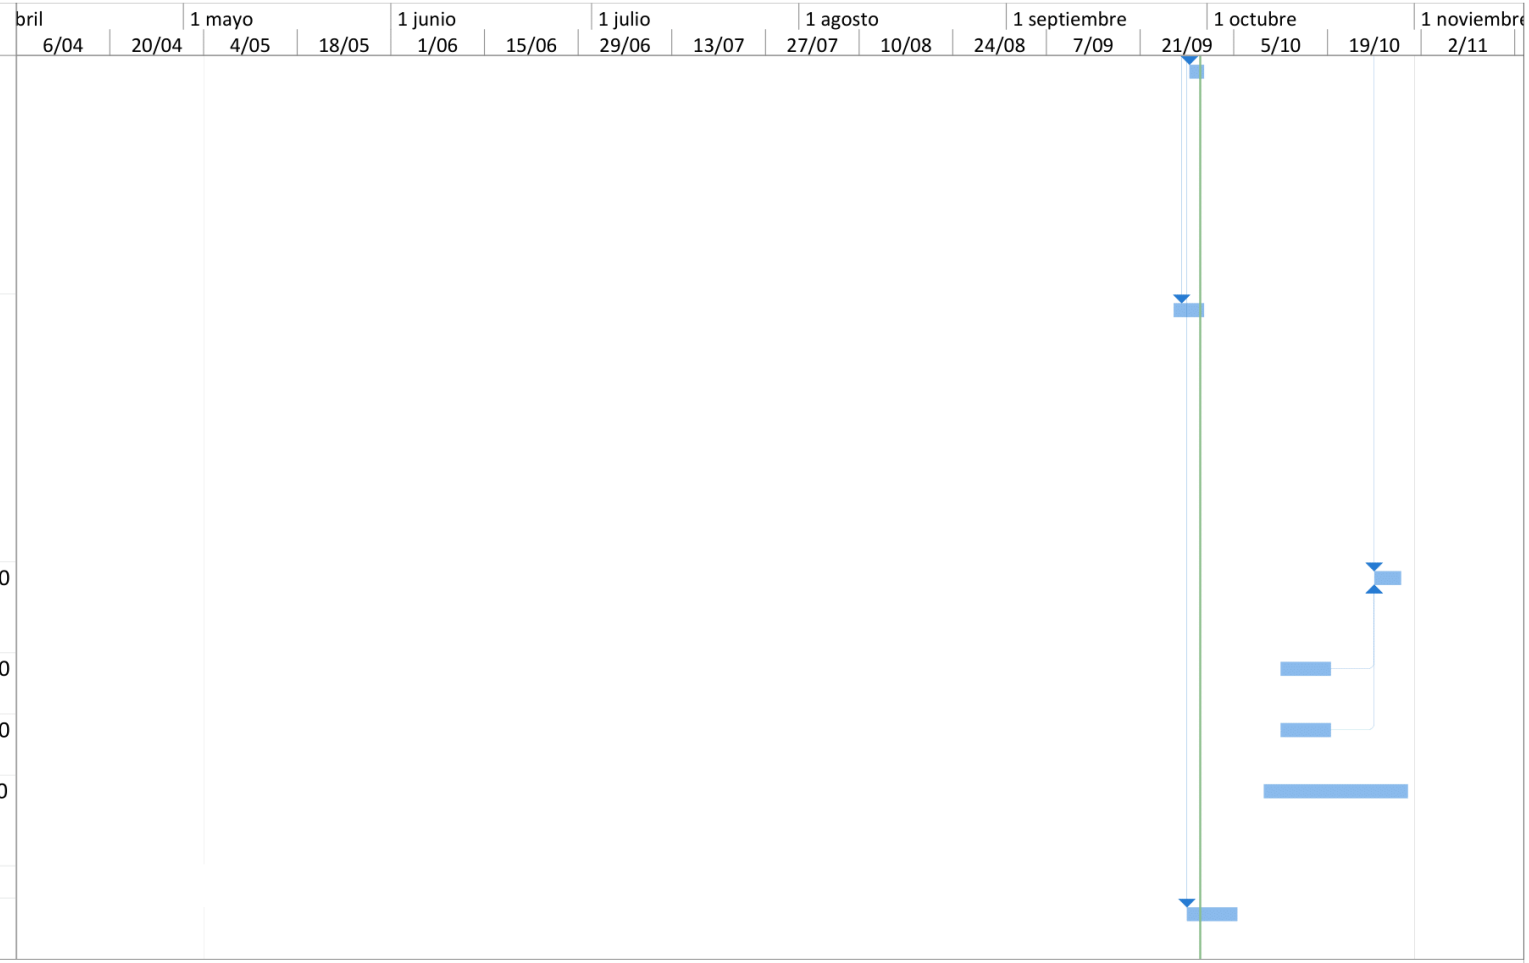

Proyecto: piscina olimpica +NP + c
Fecha: mié 30/09/20

Tarea	Hito externo	Informe de resumen manual	División crítica
División	Tarea inactiva	Resumen manual	Progreso
Hito	Hito inactivo	Sólo el comienzo	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Sólo fin	
Resumen del proyecto	Tarea manual	Fecha límite	
Tareas externas	Sólo duración	Tareas críticas	
