

Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
1		**CRONOGRAMA PRELIMINAR COP-552-2024(120683)**	**248 días**	**mié 22/01/25**	**mié 21/01/26**	**$ 8.130.760.612,00**
2		**ETAPA DE DIAGNÓSTICO**	**23 días**	**mié 22/01/25**	**vie 21/02/25**	**$ 68.822.694,00**
13		**ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS**	**33 días**	**mié 5/02/25**	**vie 21/03/25**	**$ 125.110.127,00**
27		**ETAPA DE MANTENIMIENTO Y**	**231 días**	**vie 14/02/25**	**mié 21/01/26**	**$ 7.936.827.791,00**
28		Actas de vecindad	147 días	vie 14/02/25	vie 19/09/25	$ 0,00
29		Implementación plan de gestión social	143 días	mié 19/02/25	vie 19/09/25	$ 0,00
30		Componente social y SST	122 días	vie 21/03/25	vie 19/09/25	$ 38.556.131,00
31		Componente ambiental	122 días	vie 21/03/25	vie 19/09/25	$ 77.112.263,00
32		componente plan de manejo de transito	122 días	vie 21/03/25	vie 19/09/25	$ 77.112.263,00
33		**Calzada**	**168 días**	**mar 25/02/25**	**mié 29/10/2**	**$ 3.760.306.329...**
34		**CIV 13000343**	**70 días**	**mar 25/02/25**	**vie 6/06/25**	**$ 389.533.683,00**
55		**CIV 13002498**	**55 días**	**lun 28/07/25**	**mié 15/10/2**	**$ 65.330.006,00**
73		**CIV 13000284**	**85 días**	**jue 12/06/25**	**mié 15/10/2**	**$ 861.689.475,00**
91		**CIV 13000864**	**42 días**	**lun 14/04/25**	**vie 13/06/25**	**$ 540.640.794,00**
109		**CIV 13000476**	**44 días**	**lun 21/04/25**	**vie 20/06/25**	**$ 373.942.496,00**
130		**CIV 13001165**	**63 días**	**lun 9/06/25**	**mar 9/09/25**	**$ 648.303.764,00**
153		**CIV 13000875**	**49 días**	**vie 11/07/25**	**vie 19/09/25**	**$ 370.490.236,00**
172		**CIV 13000336**	**50 días**	**mié 20/08/25**	**mié 29/10/2**	**$ 510.375.875,00**
193		**Andenes**	**30 días**	**mar 19/08/25**	**lun 29/09/25**	**$ 118.842.985,00**

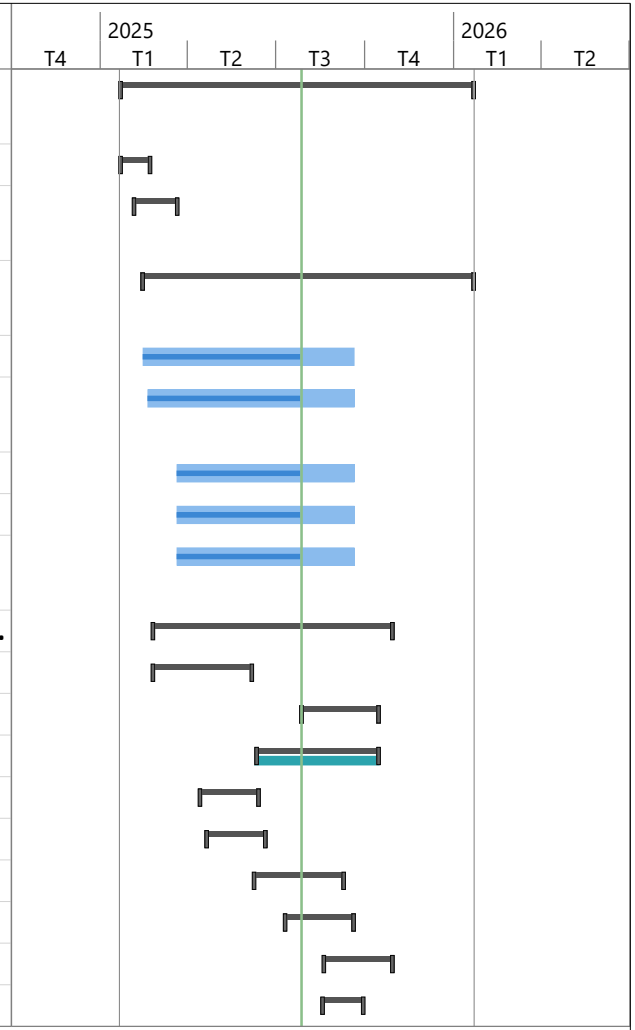

Proyecto: CRONOGRAMA 552-
Fecha: lun 28/07/25

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo
217		**Acciones de movilidad**	**87 días**	**vie 16/05/25**	**vie 19/09/25**	**$ 1.191.564.820...**
233		**Calzada ADICIÓN**	**80 días**	**jue 25/09/25**	**mié 21/01/2(**	**$ 2.673.333.000...**



Proyecto: CRONOGRAMA 552-
Fecha: lun 28/07/25

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	
