enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	**INFORME DE DESPLAZAMIENTO CONTRATISTAS**	CÓDIGO:	**F-GG-40**
		VERSIÓN:	**03**
		VIGENCIA:	**2024-05-24**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	**IP**

FECHA:	**AÑO**	**MES**	**DIA**	**N° Solicitud aplicativo de tiquetes:**	**268533**
	2025	05	22		

GRUPO DE TRABAJO:	DESARROLLO DE PROYECTOS 3					
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Luz Stella Puerto Baracaldo					
N° CONTRATO:	2240185					
LUGAR DEL DESPLAZAMIENTO:	NUQUI					
NOMBRE DEL PROYECTO VISITADO:	*"EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE MEDIA TENSIÓN EJECUTADA BAJO EL CONTRATO DE OBRA NO 2141407 CON EL FIN DE PONER EN FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES ELÉCTRICAS EXISTENTES DEL TRAMO ARUSI, PARTADO Y TERMALES Y DEL TRAMO DE LA "Y" Y AL PUNTO DENOMINADO " CASA DE MÁQUINAS" EN EL MUNICIPIO DE NUQUI DEPARTAMENTO DE CHOCO"*						
FECHA DEL DESPLAZAMIENTO:	**Desde**			**Hasta**		
	AAAA	**MM**	**DD**	**AAAA**	**MM**	**DD**
	2025	05	14	2025	05	16
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	ALVARO VILORIA ROMERO			**Rol o cargo**	Gerente Grupo de Desarrollo Proyectos 3	
OBJETO DE LA VISITA:	Realizar la revisión técnica del proyecto, Realizar visita técnica, recorrido de obra, mesas de trabajo con contratista, interventoría y municipio.					

INFORME

OBJETO DE LA VISITA:

Se realizó desplazamiento a Choco - Nuqui (DPS3), los días 14, 15 y 16 de mayo de 2025, con el fin de Realizar visita técnica, recorrido de obra, mesas de trabajo con contratista, interventoría y municipio de Nuqui para el proyecto: *"Ejecución de Actividades para la Puesta en Funcionamiento de la Red De Media Tensión Ejecutada Bajo el Contrato de Obra No 2141407 con el fin de poner en funcionamiento de las Redes Eléctricas Existentes del Tramo Arusi, Partado y Termales y Del Tramo de La "Y" Y Al Punto denominado "Casa De Máquinas" En el municipio de Nuqui departamento de Choco"*

En el marco del contrato de obra No. 2141407 termino el 15 de diciembre de 2015 con una ejecución de obra del 55,6%, desde la casa de máquinas hasta el corregimiento Arusí, y de Arusí a los corregimientos de Partadó y Termales, faltando certificación RETIE, por lo cual surge la necesidad de **terminar las obras inconclusas** y se realizó la consultoría que permitiera la actualización, verificación y ajustes a los diseños existentes de la red de media tensión ejecutadas, desde la casa de máquinas hasta el corregimiento de Arusi, y de Arusi a los corregimientos de Partado y Termales, por lo cual se deben poner en marcha las obras ejecutadas y servicio a la comunidad.


Se efectuó desplazamiento aéreo el **14 de mayo de 2025**, Bogotá – Medellín y Medellín - Nuqui. Horario 7 am a 1.30 p.m. Conexiones. Se arribó am municipio de Nuqui- Choco, destino alcaldía, mesas técnicas contratista e interventoría.

Día **15 de mayo de 2025**. Desplazamiento pluvial Nuqui – Arusi, a las 8 a.m. para verificación sitio de obra y estado de obra ejecutadas (avance eléctrico y obra civil). Igualmente se realizó desplazamiento pluvial a Termales, Partado y regreso Arusi a mesa de reunión entre las partes. Regreso vía pluvial de Arusi a Nuqui Choco. 7 p.m.

INFORME

Día **16 de mayo de 2025**. Se continuo y cerro mesa técnica y presentación resultado de la visita. Posterior a las 11:30 a.m. Desplazamiento aéreo Nuqui – Medellín y Medellín - Bogotá entre las 11 am y 4 pm, Conexiones.

Localización del Proyecto

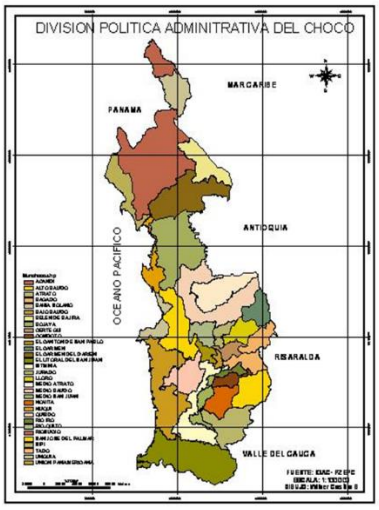



Localización especifica: sur de Nuquí Corregimientos de Arusí, Partadó, Termales

Día 14 de mayo de 2025, se inició mesa de trabajo con contratista, interventoría y ENTerritorio S.A en la cual se revisaron temas de avance de radicación en Planeación Contractual de cambio de especificación de Poste Metálico, por poste PRFV para el proyecto, se informa por la supervisión de ENTerritorio S.A que este fue aprobado y se debe legalizar en contrato de obra, igualmente se informó que se realizó mesa de trabajo de Ítems No Previstos Redes Eléctricas de Distribución del día 06 de mayo de 2025, la interventoría soporto adecuadamente y expuso presentación con justificación de los mismos, por lo cual se remitió a planeación contractual radicada el acta firmada y soportes documentales el día 13 de mayo de 2025, para tramite pertinente.

Además, se informó a la interventoría Proinges S.A.S que se remitieron los dos desembolsos por concepto de fijos al área financiera del convenio 212080, y se solicitan ajustes para tramitar y radicar, el cual se soluciona en mesa de trabajo.

El contratista informa que los materiales se encuentran en su mayoría en sitio de obra, que faltan dos transformadores que llegaran el día sábado a Arusi, sitio donde se ubica oficina de contratista de obra e interventoría y bodega de almacenamiento.

Igualmente, el contratista informa que existen inconvenientes con habitantes de predios, que no permiten ingreso de trabajadores a realizar trabajo de postes y paso de materiales, que se solicita apoyo a los presidentes de juntas para acercamiento a la comunidad.

Se solicita presentar formato de Actas de vecindad, ya que, por levantamiento de aprox. 450 beneficiarios, es muy dispendioso y demasiado gasto papel, siendo un proyecto ecológico y por la ley *"cero papel",* se solicita lineamiento, ENTerritorio S.A indica que el levantamiento de lo existente beneficia a contratista ante futuras reclamaciones, pero en aras de dar una solución que beneficie la

INFORME

gestión adelantada, se indica suscribir el Acta de Vecindad, con formato de la entidad, a las casas que se encuentran aledañas a las obras de infraestructura que se adelantaran (Casetas), para poder identificar estado de casa que podrían afectarse a la ejecución de obras.
Para las actas de obras que se adelantan para energización de los corregimientos, se realiza muestra de modelo (base) donde se identifica casa, electrodomésticos que se encuentran, marca y estado que se halla, foto y firma, que son más apropiadas para seguimiento de estado de elementos de cada casa.

Posterior se realiza desplazamiento a alcaldía de Nuqui, siendo las 3:30 a.m. se inició la reunión, con los siguientes asistentes:

Municipio de NUQUI
- Alcalde Rubén Prado Asprilla

Contratista PRODYM SAS
- Ingeniero DARWIN VALENCIA

Interventoría PROINGES S.A.S.
- Ingeniero Gustavo Cantillo

ENTerritorio S.A
- Arquitecta Luz Stella Puerto

Se revisa estado de proyecto, se informa al señor alcalde que se realizara desplazamiento el día siguiente a revisar avance del proyecto a los corregimientos de Arusi, Partado y Termales, para seguimiento de actividades ejecutadas en cada corregimiento, por lo cual se realizara el recorrido en cada lugar de ejecución.
Se solicita apoyo con las comunidades que presentan inconvenientes del avance, por no avalar transitar predios e hincar postes de línea de media tensión.
El señor alcalde solicita le estén informando las actividades y avance del proyecto, el cual indica la mayor disposición de colaboración por parte del municipio, igual se informa próxima visita a proyecto para sociabilización con IPSE, por lo cual se le estará informando por comunicado oportunamente.

Estado de Proyecto:

Se indica un avance del 16,20% del proyecto, en el presente periodo el contratista presenta un atraso general de 8.28 % asociado al capítulo eléctrico, debido al retraso de los materiales eléctricos. A pesar del hincado de postes de media, baja tensión y la instalación del cable trenzado de baja tensión, el atraso se incrementa.

Se debe pensar en aumentar el número de cuadrillas para trabajar en dos corregimientos al tiempo.

Actividades Ejecutadas:

- Hincado de postes de baja tensión
- Hincado de postes de media tensión
- Tendido de cable trenzado.
- Armado de baja tensión

Se indica los inconvenientes presentados:

INFORME

- El señor Juan Pablo Cogollo solicita al contratista que se le muestre el Trazado de red e hincado de
postes que va a pasar por sus predios.
- El replanteo eléctrico en Partado, se encontraron problemas con la ubicación de poste primario No 7, cerca del predio del señor Sergio Murillo, que se opone al paso de la línea de media tensión afectando a 5 usuarios. Por lo cual se propone reubicar línea de media tensión.
- Se indica que durante periodo se logró hincar 3 postes de media tensión, 9 cajas de polimérica de distribución, 23 retenidas, 4 armados en baja tensión y cable trenzado No 2 distribuidos de la siguiente manera: En BT Arusi los postes 4-5-10, en Partado y Termales no se instalaron postes, en MT en Arusi los postes 22-23-24, adicional a lo anterior en Arusi se instalaron 18 retenidas y en Termales 4.
- En estructura de BT (suspensión) se instalaron 4 en Arusi, y 9 cajas de poliméricas de distribución con 710 metros de cable trenzado No 2.


REGISTRO FOTOGRAFICO ARUSI




Observese la actividad hincada de postes



Instlacion de linea trenzada

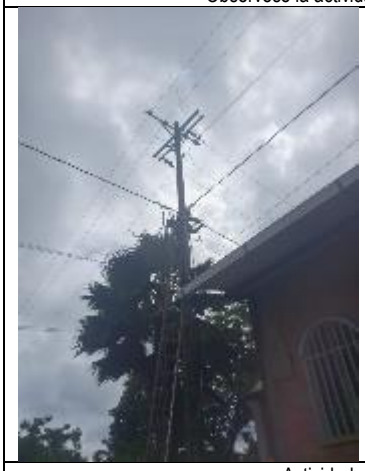


Actividades Electricas



Observese la actividad de instalacion de Red

INFORME



Valla del Proyecto



Instalaciones Electricas



Area construccion de cuarto de maquinas



Ubicación de red de distrbucion









Nótese en almacén stock de materiales almacenados para ejecución de obras

REGISTRO FOTOGRAFICO TERMALES

INFORME



Postes Hincados – Red MT



Observase Red Instalada



Dos Transformadores



Instalacion de Red MT



Recorrido de obras ejecutadas



Revision Red e Hincamientpos de postes

INFORME

REGISTRO FOTOGRAFICO TERMALES



Postes Hincados – Red MT



Observase Red Instalada



Recorrido a Red extendidad



Postes Hincados



Actividades en obra



Actividades en obra, observese la zona de selva

INFORME



Reunión en Nuqui con alcalde de municipio

CONCLUSIONES

Se cumplió con el objeto de la visita en sitio de obra, se revisaron actividades ejecutadas, se realizaron observaciones al alcance del proyecto, se realizó reunión con alcalde de municipio de Nuqui.

De acuerdo con lo verificado en sitio de obra se encuentran las siguientes conclusiones y recomendaciones:

1. Se indica un avance del 16,20% del proyecto, en el presente periodo el contratista presenta un atraso general de 8.28 % asociado al capítulo eléctrico, debido al retraso de los materiales eléctricos en Buenaventura, presentaba retrasos por orden público.
2. En reunión posterior con la interventoría se reitera que **el objeto del contrato** indica que este corresponde a intervenir obras desde la casa de máquinas hasta el corregimiento Arusí, y de Arusí a los corregimientos de Partadó y Termales, faltando certificación RETIE, **por lo cual surge la necesidad de terminar las obras inconclusas** y se realizó la consultoría que permitiera la actualización, verificación y ajustes a los diseños existentes de la red de media tensión ejecutadas, desde la casa de máquinas hasta el corregimiento de Arusi, y de Arusi a los corregimientos de Partado y Termales, por lo cual se deben poner en marcha las obras ejecutadas y servicio a la comunidad. Debe realizar las actividades que correspondan a contratos suscritos.
3. ENTerritorio S.A. dentro de su alcance como gerencia integral revisara todos los entregables técnicos, presentados por la interventoría debidamente soportados, y analizara las posibles soluciones técnicas para presentar a Prosperidad Social, de igual forma tomara los correctivos jurídicos a que haya lugar, todo esto con el objetivo de entregar una obra funcional.
4. Se reitera realizar la verificación delos 10,30 km de obra realizada en anterior contrato y ejecutar las adecuaciones que correspondan.

ANEXOS

Acta de visita de Técnica
Lista de asistencia de las reuniones realizadas
Registro fotográfico.

Firma del contratista:		**Firma del supervisor:**	

ver instrucciones de diligenciamiento al respaldo

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

Fecha: fecha de presentación del *F-GG-40 Informe de Desplazamiento Contratistas*.
No. Solicitud aplicativo de tiquetes: diligencie el número de solicitud del aplicativo de tiquetes.
Grupo de Trabajo: *Grupo al cual pertenece el contratista que realizó el desplazamiento*
N° Contrato*: Número del contrato del contratista*
Nombre del contratista: nombre y apellidos del contratista.
Lugar de desplazamiento: se registran los diferentes lugares visitados según el objeto del desplazamiento. Es preciso que se registren todos los sitios, especificando vereda, barrio, sector corregimiento, municipio y departamento.
Fecha del desplazamiento: se registra la fecha de inicial y la fecha final del desplazamiento.
Nombre del supervisor: se registra los nombres y apellidos del supervisor del contratista que reporta el viaje y su rol o cargo, ejemplo: Gerente de Convenio No. #### / Gerente de Grupo XXXX / Subgerente (Desarrollo de Proyectos, Administrativo, Contratación o Financiero).
Objeto de la visita: descripción clara del objeto de la visita.
Informe:
1. El informe de desplazamiento recogerá los aspectos más relevantes y conclusiones que queden plasmadas en las actas que se suscriban producto de la(s) visita(s).
2. El informe debe relacionar de forma cronológica todas las actividades o visitas realizadas.
3. Transcribir las siglas que se relacionen en el contenido del informe.
4. El informe de desplazamiento debe relacionar los cargos y los nombres de los acompañantes en las actividades de la comisión o desplazamiento.
5. Los registros fotográficos se deben reportar a la par con el contenido del informe y deberán llevar nota al pie con la fecha, lugar y asunto relacionado de la fotografía.
6. Las fotografías no pueden sobrepasar en ninguna de sus dimensiones los 6 cm.
7. El informe de desplazamiento debe radicarse al supervisor del contrato, con máximo tres días hábiles luego de la finalización de la visita, con el fin de reaccionar a tiempo frente a recomendaciones o hallazgos críticos en la(s) visita(s).
8. El informe de desplazamiento se debe transferir al expediente documental del contrato derivado, contrato o convenio interadministrativo objeto de la visita.
9. Cuando se trate de una visita de seguimiento a la ejecución de una obra, los supervisores deben incluir como anexo obligatorio al F-GG-40 Informe de Desplazamiento Contratistas, el formato F-GG-09 Acta de Seguimiento de Contrato. Estos formatos harán parte del informe de pago de los supervisores.

et territorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	CONTROL DE ASISTENCIA	CÓDIGO:	F-TH-02
		VERSIÓN:	04
		VIGENCIA:	2024-04-30
	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	CLASIFICACIÓN:	IPC

FECHA: 2025 | 05 | 14

LUGAR: Municipio de Nuqui - Alcaldia

HORA DE INICIO: 3:30 pm

HORA DE FINALIZACIÓN: 5 pm

TEMA: Proyecto: "Funcionamiento de las Redes electricas existentes del tramo Arusi Partado y Termales y del tramo de la "Y" al Punto denominado "Casa de Maquinas".

EXPOSITOR:

FIRMA:

No DE CEDULA	NOMBRE Y APELLIDOS	DEPENDENCIA / ENTIDAD	MARQUE CON UNA X			TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
			PLANTA	CONTRATISTA	EXTERNO			
51935.099	luz stella Rueda	ETterritorio SA		X		3124438595	lrueda@etter...	
1124558052	Gustavo Cantillo	Proinges		X		3148873990	interterritorio noqui@gmail.com	
71774865	Darwin Valencia	PRODyM ESP SAS		X		3127486042	gerencia@prodym...	
1079358583	RUBEN PRADO A	ALCALDIA-NUQUI	X			3138723626	lessa0325@gmail.com	

Ver aviso de privacidad para recolección de datos al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La **Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – ENTerritorio S.A**. con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.enterritorio.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio S.A. sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

Se realiza la presentación de la Supervisión d Enterritorio S.A se informa actividades realizadas del proyecto, igual se indica la visita de seguimiento a Arusi, Dartado y Termales a realizar el dia Jueves 15 para revisar avance de obras a la fecha.
El municipio indica estar con la mayor disponibilidad del avance y colaboración del proyecto.
Se informa que se programara visita a proyecto por IPSE, la cual se informara oportunamente a las partes para agendamiento oportuno.
El señor alcalde, solicita le esten informando el avance del proyecto, por lo cual el contratista posterior a visita indica pasara a alcaldia a ponerlo en contexto de visita.

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	CONTROL DE ASISTENCIA	CÓDIGO:	F-TH-02
		VERSIÓN:	04
		VIGENCIA:	2024-04-30
	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	CLASIFICACIÓN:	IPC

FECHA: 2025 | 05 | 15-16

LUGAR: Arusi - Nuqui

HORA DE INICIO: 8:30 am

HORA DE FINALIZACIÓN: 6:30 pm

TEMA: Estado proyecto Nuqui

EXPOSITOR: ENTerritorio S.A

FIRMA:

No DE CEDULA	NOMBRE Y APELLIDOS	DEPENDENCIA / ENTIDAD	MARQUE CON UNA X			TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
			PLANTA	CONTRATISTA	EXTERNO			
1129568052	Gustavo Cantillo	Proinges		X		3178873990	interterritorio nuqui@gmail.com	
85434063	Carlos Prada	Proinges		X		3145364717	aceros3065@gmail.com	
91430752	Guillermo Rodriguez	Prodym		X		3113580857	g.barranco@gmail.com	
43830413	Colonia López	Prodym		X		3146986599	gestorsst@G	
71744805	Dasuris Valencia	Prodym	X			3124786862	gerencia@prodym.com	
1077470827	Yenifer Moreno B.	prodym		X		3218850937	yenifer_60@hotmail.	
51935999	Luz Stella Puerto	ENTerritorio S.A		X		3124438595	lpuerto@enterritorio.com	

Ver aviso de privacidad para recolección de datos al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La **Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – ENTerritorio S.A**. con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.enterritorio.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio S.A. sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

Se realiza desplazamiento a corregimiento de Arusi (8:30 am), para revisar avance de obras electricas, ubicación de casa de maquinas (Cementerio) y la instalación de postes de baja y media tensión, el tendido de cable trenzado, se revisa almacen de materiales electricos, y se revisa la ubicación de planta de trasiego.
Igual se realiza desplazamiento a corregimientos de Portado y Termales, se revisa ubicación y verificación de hincado de postes, se evidencia en diferentes tramos, inconformidad de dueños de predios, por localización de postes. se observa que han instalado varios tramos postes para tendido de cableado de media tensión.
Ademas se realiza recorrido hacia las cabañas entre portado - Arusi, identificando la linea que se realizara los tramos a seguir.
Enterritorio realiza reunión con interventoria, reiterando el compromiso del cumplimiento del objeto del proyecto que es terminar las obras inconclusas, revisar, ajustar y Puesta en marcha (certificación Retie) de la linea existente de contrato 2141407. Lo cual es la justificación del proyecto.
