
REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LA APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, TRÁMITE DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA SEDE DE SALÓN COMUNAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO 2173: KENNEDY FORTALECE LA PARTICIPACION CIUDADANA

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**FASE 1. APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS**	**72 días**	**lun 22/01/24**	**lun 6/05/24**
2		Inicio	0 días	lun 29/01/24	lun 29/01/24
3		**Etapa 1 . Preliminares**	**5 días**	**lun 22/01/24**	**vie 26/01/24**
4		Entrega de documentación previa	5 días	lun 22/01/24	vie 26/01/24
5		**Etapa 2. Revisión y Actualización de Estudios y Diseños.**	**60 días**	**lun 29/01/24**	**mié 24/04/24**
6		**I. Estudio de Títulos y Normativa**	**10 días**	**lun 29/01/24**	**vie 9/02/24**
7		Estudio Normativo, Urbanístico y Legal	10 días	lun 29/01/24	vie 9/02/24
8		Consulta de norma aplicable al predio, ante la Curaduría Urbana.	5 días	lun 5/02/24	vie 9/02/24
9		***II. Revisión y actualización de Estud***	**10 días**	**lun 5/02/24**	**vie 16/02/24**
10		Estudio Topográfico	10 días	lun 5/02/24	vie 16/02/24
11		Estudio de Suelos	10 días	lun 12/02/24	vie 23/02/24
12		***IIII. Revisión y actualización de Diseños.***	**37 días**	**lun 19/02/24**	**vie 12/04/24**
13		Diseño Arquitectónico	15 días	lun 19/02/24	vie 8/03/24
14		Diseño y Cálculo Estructural	15 días	lun 26/02/24	vie 15/03/24
15		Diseño Hidrosanitario	15 días	lun 4/03/24	vie 22/03/24
16		Diseño Eléctrico	17 días	lun 18/03/24	vie 12/04/24
17		***IV. Estudios Complementarios***	**30 días**	**lun 11/03/24**	**mié 24/04/24**
18		Plan de Manejo Ambiental.	30 días	lun 11/03/24	mié 24/04/24
19		**Etapa 3. Trámite de licencia de construcción y gestiones con Empresas de Servicios Públicos.**	**15 días**	**lun 15/04/24**	**lun 6/05/24**
20		Trámite de Licencia de Construcción	15 días	lun 15/04/24	lun 6/05/24
21		Gestiones ante empresas de Servicios Públicos	15 días	lun 15/04/24	lun 6/05/24
22		fin	0 días	lun 6/05/24	lun 6/05/24

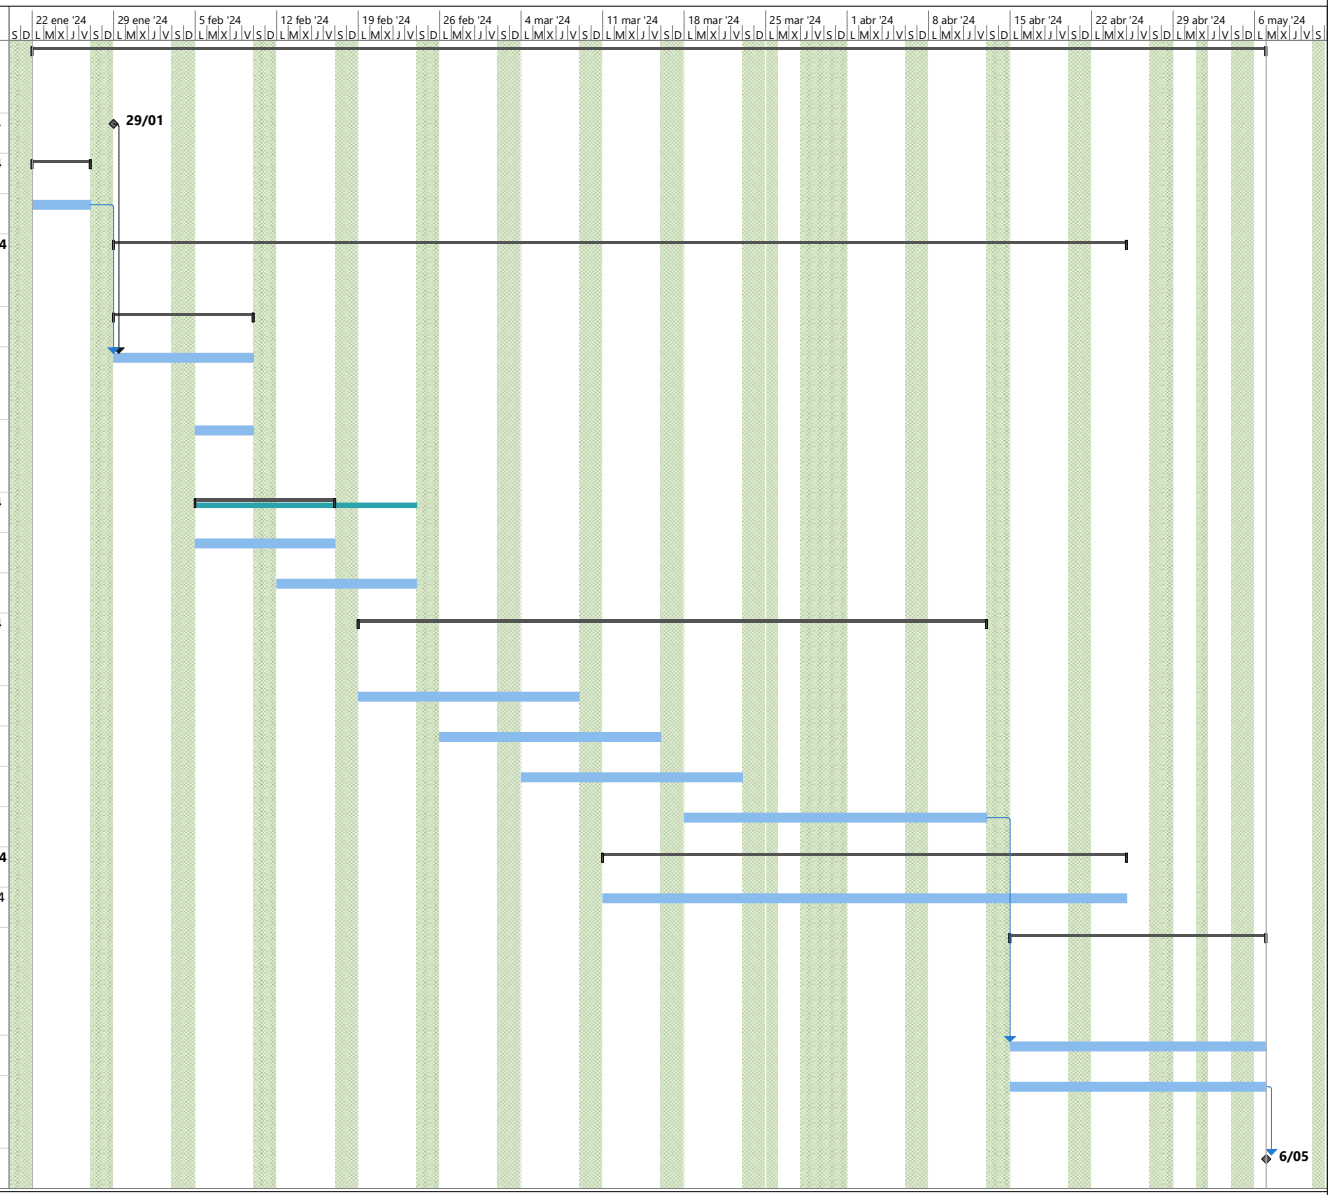

Proyecto: Cronograma Kennedy
Fecha: jue 18/01/24

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite			
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso			
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual			
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo				
