UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Contrato de Interventoría N° CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia. Obligación N° 25

Programa de Formación Especializada para la Economía Campesina - Convocatoria DSNFT – 0001 – FEEC – 2024

Informe final

FEDERACIÓN BALUARTE CAMPESINO VALLE DEL CAUCA – BALUARTE VALLE

UNIVERSIDAD® DE ANTIOQUIA 1803

CO1.PCCNTR.6916065

Contenido

1. Datos generales del convenio 2
2. Aspectos técnicos 2
2.1. Proyecto aprobado 2
2.2. Cumplimiento Técnico 2
2.3. Impacto regional 4
2.4. Indicadores del proyecto 6
3. Aspectos financieros 10
3.1. Ejecución presupuestal por fuente de financiación 10
3.2. Reconocimiento final 12
4. Aspectos transversales 13
4.1. Aspectos jurídicos 13
4.2. Aspectos administrativos 13
4.3. Aspectos relevantes 15
4.3.1. Fortalezas 15
4.3.2. Puntos a mejorar 16
4.3.3. Caso de éxito 16

1. Datos generales del convenio

- Fecha de suscripción del convenio: 24 de octubre de 2024
- Fecha de inicio del convenio: 07 de noviembre de 2024
- Fecha de inicio de actividades académicas: 30 de noviembre de 2024
- Fecha de finalización de actividades académicas: 21 de mayo de 2025

2. Aspectos técnicos

2.1. Proyecto aprobado

El proyecto presentado por BALUARTE VALLE se resume en las siguientes tablas:

N°	Nombre de la acción de formación	Horas de la acción de formación			Total, horas	Evento de aprendizaje
		Presencial	Virtuales	N. grupos		
1	Mecanismos de participación ciudadana en el contexto del campesinado como sujeto especial de derechos y el cumplimiento del acuerdo de paz de la habana.	16	0	5	80	Campamento de Formación
2	Historia, desarrollo y perspectivas de la implementación de la reforma agraria integral en Colombia y el valle del cauca.	16	0	5	80	Campamento de Formación
3	Organización y fortalecimiento de los procesos asociativos para la construcción de una territorialidad campesina en el valle del cauca	16	0	5	80	Campamento de Formación
4	Cambio climático, extinción de las especies y la supervivencia de la especie humana.	2	0	1	2	Conferencia
5	El Conflicto por la tierra en Colombia y Reforma Agraria para crear la paz.	2	0	1	2	Conferencia
	TOTALES	**52**	**0**	**17**	**244**	

N° AF	Nombre de la acción de formación	Costo AF
1	Mecanismos de participación ciudadana en el contexto del campesinado como sujeto especial de derechos y el cumplimiento del acuerdo de paz de la habana.	$88.305.343,00
2	Historia, desarrollo y perspectivas de la implementación de la reforma agraria integral en Colombia y el valle del cauca.	$86.805.343,00
3	Organización y fortalecimiento de los procesos asociativos para la construcción de una territorialidad campesina en el valle del cauca	$83.722.023,00
4	Cambio climático, extinción de las especies y la supervivencia de la especie humana.	$10.354.888,00
5	El Conflicto por la tierra en Colombia y Reforma Agraria para crear la paz.	$10.354.888,00
	TOTALES	$279.542.485,00

2.2. Cumplimiento Técnico

La ejecución académica del proyecto se cumplió de la siguiente manera:

AF	COFINANCIACIÓN	CONTRAPARTIDA	TOTAL	PESO AF	BENEFICIARIOS INICIALES	Indice de deserción X%	BENEFICIARIOS RECONOCIDOS
AF1	$ 76.742.703,00	$11.562.640,00	88.305.343,00	31,59%	125	0	125
AF2	$ 76.742.703,00	$10.062.640,00	86.805.343,00	31,05%	125	0	125
AF3	$ 72.159.383,00	$11.562.640,00	83.722.023,00	29,95%	125	0	125
AF4	$ 9.956.712,00	$398.176,00	10.354.888,00	3,70%	100	0	100
AF5	$ 9.956.712,00	$398.176,00	10.354.888,00	3,70%	100	0	100

Total	**$245.558.213,00**	**$33.984.272,00**	**$279.542.485,00**	**100,00%**	**575**		**575**

AF	VALOR RECONOCIDO COFINANCIACIÓN	% RECONOCIDO COFINANCIACIÓN	VALOR RECONOCIDO CONTRAPARTIDA	% RECONOCIDO CONTRAPARTIDA	VALOR RECONOCIDO TOTAL	% RECONOCIDO TOTAL
AF1	76.742.703,00	31,25%	11.562.640,00	34,0%	88.305.343,00	31,59%
AF2	76.742.703,00	31,25%	10.062.640,00	29,6%	86.805.343,00	31,05%
AF3	72.159.383,00	29,39%	11.562.640,00	34,0%	83.722.023,00	29,95%
AF4	9.956.712,00	4,05%	398.176,00	1,2%	10.354.888,00	3,70%
AF5	9.956.712,00	4,05%	398.176,00	1,2%	10.354.888,00	3,70%
Total	**$245.558.213,00**	**100,00%**	**$33.984.272,00**	**100,0%**	**279.542.485,00**	**100,00%**

Además, se presentó una certificación firmada por el Director del Proyecto, en la que se relacionan los beneficiarios de cada acción de formación, número de cédula y porcentaje de asistencia de cada uno, de acuerdo con:

N. AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	N. DE BENEFICIARIOS CERTIFICADOS	FECHA DE CERTIFICACIÓN
AF 1	Mecanismos de participación ciudadana en el contexto del campesinado como sujeto especial de derechos y el cumplimiento del acuerdo de paz de la habana.	129	31/05/2025
AF2	Historia, desarrollo y perspectivas de la implementación de la reforma agraria integral en Colombia y el valle del cauca.	129	31/05/2025
AF 3	Organización y fortalecimiento de los procesos asociativos para la construcción de una territorialidad campesina en el valle del cauca	134	31/05/2025
AF 4	Cambio climático, extinción de las especies y la supervivencia de la especie humana.	0	
AF 5	El Conflicto por la tierra en Colombia y Reforma Agraria para crear la paz.	0	

En el aplicativo dispuesto por el SENA, el conviniente evidencia el registro de beneficiarios cumpliendo con el numeral 9 de la cláusula sexta del convenio, así:

N°	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN EL SEP	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS ASISTENCIA 85%
1	Mecanismos de participación ciudadana en el contexto del campesinado como sujeto especial de derechos y el cumplimiento del acuerdo de paz de la habana.	1	Rio Frio	25	24	24
		2	Dagua	25	26	26
		3	Darién	25	27	27
		4	Darién	25	25	25
		5	El Dovio	25	27	27
2	Historia, desarrollo y perspectivas de la implementación de la reforma agraria integral en Colombia y el valle del cauca.	1	Rio Frio	25	26	26
		2	Dagua	25	25	25
		3	Darién	25	26	26
		4	Darién	25	26	26
		5	El Dovio	25	26	26
3	Organización y fortalecimiento de los procesos asociativos para la construcción de una territorialidad campesina en el valle del cauca	1	Rio Frio	25	28	28
		2	Dagua	25	25	25
		3	Darién	25	26	26
		4	Darién	25	27	26
		5	El Dovio	25	28	28

N°	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN EL SEP	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS ASISTENCIA 85%
4	Cambio climático, extinción de las especies y la supervivencia de la especie humana.	1	Palmira	100	109	109
5	El Conflicto por la tierra en Colombia y Reforma Agraria para crear la paz.	1	Darién	100	104	104
TOTAL				**575**	**605**	**604**

- Beneficiarios esperados: 575
- Beneficiarios certificados: 604

2.3. Impacto regional

El programa de formación especializada para la economía campesina busca la adquisición y actualización de conocimientos, habilidades, técnicas, prácticas y la mejora de las competencias de las campesinas y campesinos, la generación de capacidades, incentivo de la asociatividad, la participación y la integración comercial entre los actores de la economía campesina, así como la transformación productiva, protección del ambiente, los recursos hídricos y la agroecología, a través de la cofinanciación de los proyectos avalados, en la convocatoria DSNFT – 0001 – FEEC – 2024, entre otros aspectos, promovió y estimuló desde la formulación la implementación de acciones de formación en zonas rurales, especialmente para los beneficiarios que residen en (municipios PDET, ZOMAC o zonas aledañas a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, zonas rurales).


BALUARTE VALLE alineado con este enfoque ejecutó algunos eventos formativos para la población ubicada en estas localidades así:

N°	NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN	COBERTURA GEOGRÁFICA INICIAL	COBERTURA GEOGRÁFICA MODIFICADA
AF01	Mecanismos de participación ciudadana en el contexto del campesinado como sujeto especial de derechos y el cumplimiento del acuerdo de paz de la habana.	DAGUA - VALLE DEL CAUCA CALIMA - VALLE DEL CAUCA RIOFRÍO - VALLE DEL CAUCA GUADALAJARA DE BUGA - VALLE DEL CAUCA EL DOVIO - VALLE DEL CAUCA	DAGUA - VALLE DEL CAUCA CALIMA - VALLE DEL CAUCA RIOFRÍO - VALLE DEL CAUCA CALIMA - VALLE DEL CAUCA EL DOVIO - VALLE DEL CAUCA
AF02	Historia, desarrollo y perspectivas de la implementación de la reforma agraria integral en Colombia y el valle del cauca.	DAGUA - VALLE DEL CAUCA CALIMA - VALLE DEL CAUCA GUADALAJARA DE BUGA - VALLE DEL CAUCA RIOFRÍO - VALLE DEL CAUCA EL DOVIO - VALLE DEL CAUCA	DAGUA - VALLE DEL CAUCA CALIMA - VALLE DEL CAUCA CALIMA - VALLE DEL CAUCA RIOFRÍO - VALLE DEL CAUCA EL DOVIO - VALLE DEL CAUCA
AF03	Organización y fortalecimiento de los procesos asociativos para la construcción de una territorialidad campesina en el valle del cauca	DAGUA - VALLE DEL CAUCA CALIMA - VALLE DEL CAUCA GUADALAJARA DE BUGA - VALLE DEL CAUCA RIOFRÍO - VALLE DEL CAUCA EL DOVIO - VALLE DEL CAUCA	DAGUA - VALLE DEL CAUCA CALIMA - VALLE DEL CAUCA CALIMA - VALLE DEL CAUCA


			RIOFRÍO - VALLE DEL CAUCA EL DOVIO - VALLE DEL CAUCA
AF04	Cambio climático, extinción de las especies y la supervivencia de la especie humana.	GUADALAJARA DE BUGA - VALLE DEL CAUCA	PALMIRA - VALLE DEL CAUCA
AF05	El Conflicto por la tierra en Colombia y Reforma Agraria para crear la paz	PALMIRA - VALLE DEL CAUCA	N/A

Como se indicó anteriormente el total de beneficiarios certificados bajo el convenio fue de 604, a continuación, se presentan algunas graficas que detallan el nivel ocupacional, el impacto sectorial de las acciones de formación implementadas y la desagregación etaria y por genero de los participantes que culminaron satisfactoriamente la formación.


Nivel ocupacional

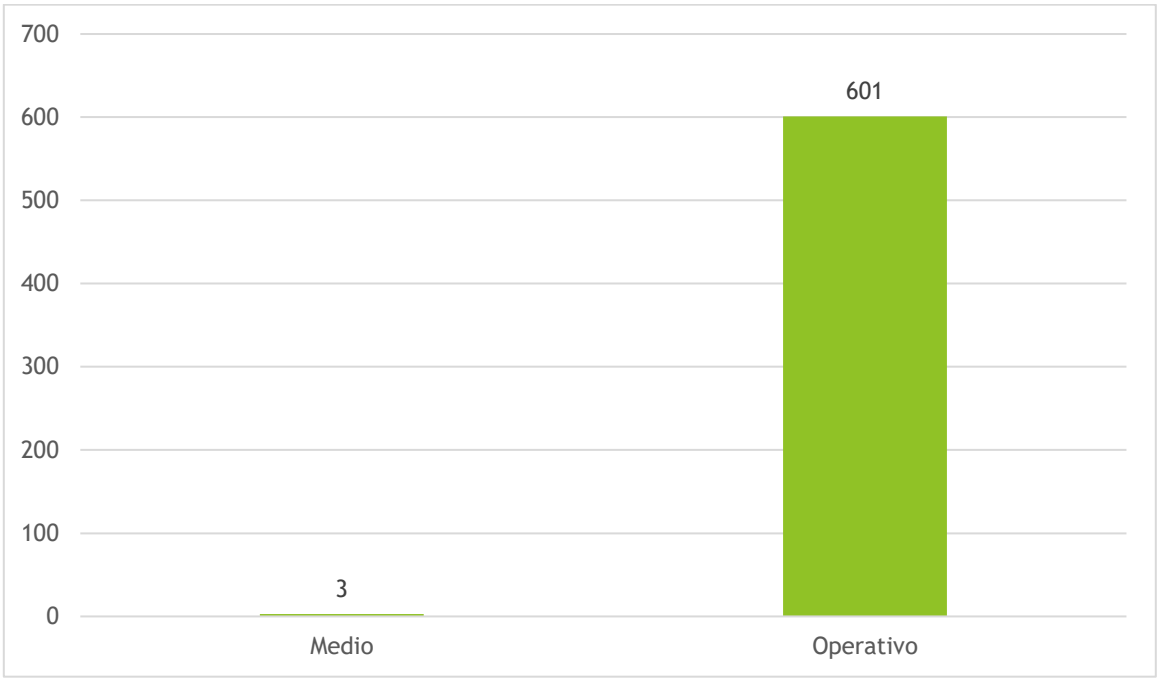

Género

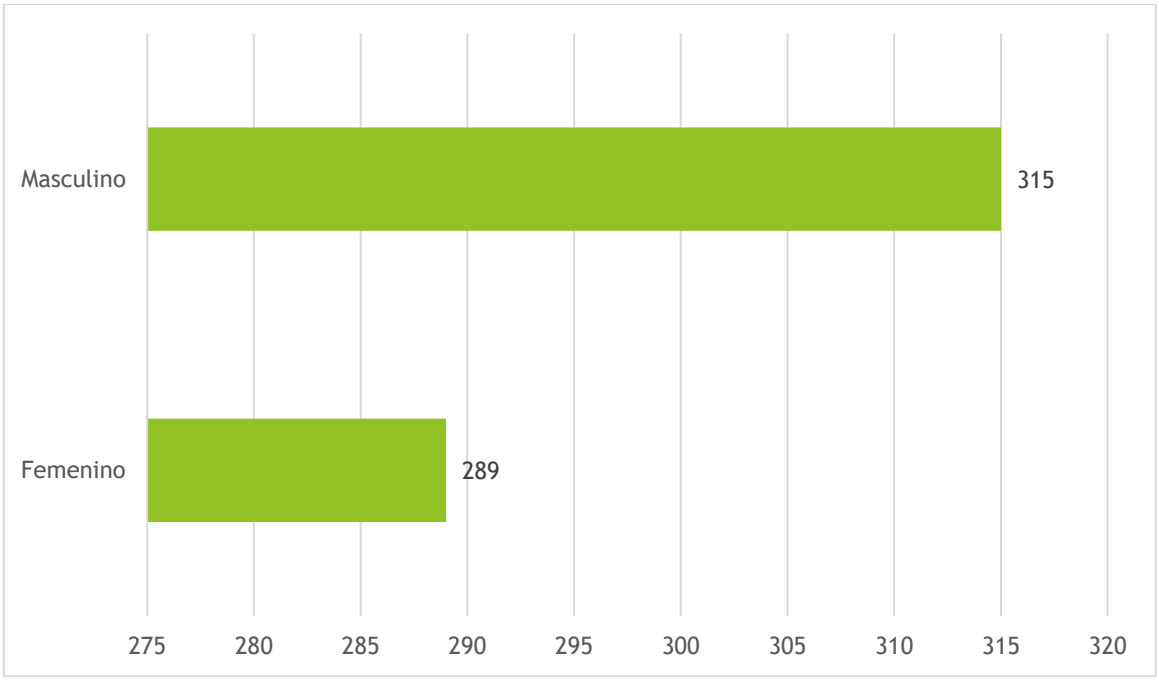

Desagregación etaria

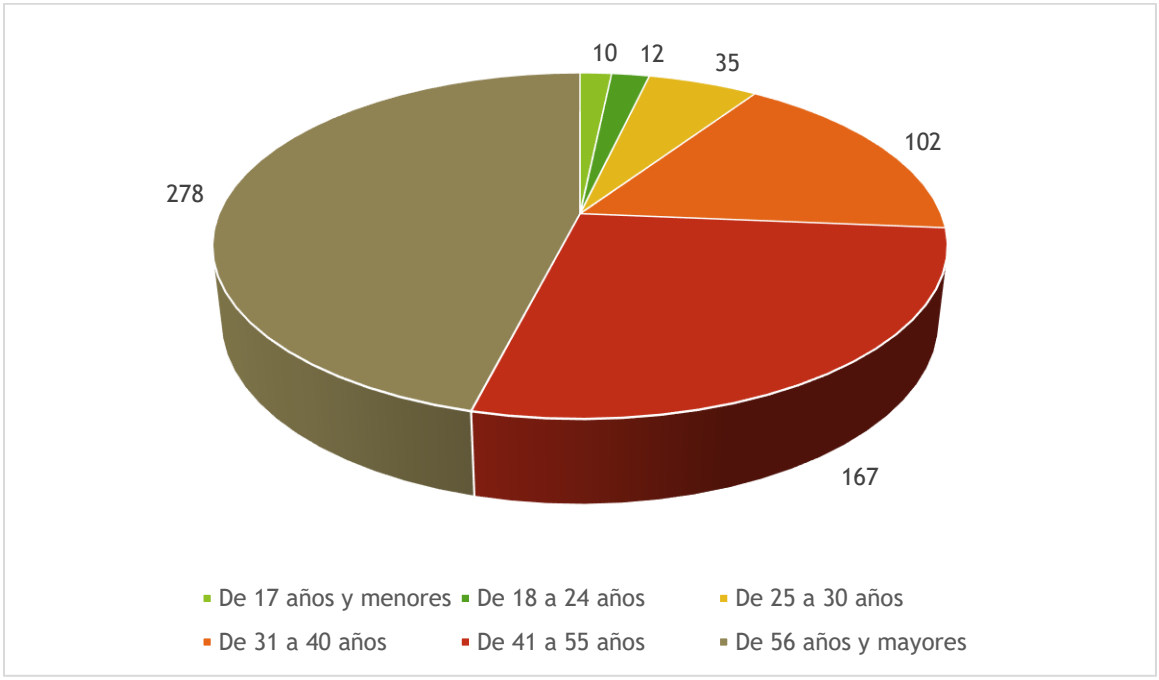

2.4. Indicadores del proyecto

Tasa de incremento del conocimiento

AF	Promedio tasa incremento del conocimiento
AF1	47%
AF2	29%

AF3	30%
AF4	N/A
AF5	N/A
PROMEDIO	**35%**

Las Acciones de Formación No. 4 y 5 se ejecutaron bajo modalidad conferencia, por esta razón la Tasa de Incremento del Conocimiento no aplica para ellas.

Impacto

- **Número total de campesinas y campesinos beneficiados**

Este indicador mide la cantidad de campesinas y campesinos que participan en los programas o que reciben beneficios de la formación o apoyo brindado por el proyecto

Fórmula

$$\frac{\text{Número de Campesinas y Campesinos beneficiados por el Proyecto}}{\text{Número total de Campesinas y Campesinos afiliados a las organizaciones}} \text{ X100}$$

Resultado

$$\frac{603}{1700} \text{ X100} = 35\%$$

- **Número de asociaciones campesinas, agropecuarias, cooperativas campesinas u otras organizaciones campesinas a beneficiar.**

Este indicador mide la cantidad de organizaciones campesinas (asociaciones agropecuarias, cooperativas, entre otras) que reciben formación, capacitación o participación en el programa.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de Organizaciones beneficiadas con el Proyecto}}{\text{Número total de Organizaciones afiliadas al conveniente}} \text{ X100}$$

Resultado

$$\frac{32}{41} \text{ X100} = 78\%$$

- **Incremento de la formación**

Este indicador mide el aumento en el nivel de conocimientos y habilidades adquiridos por los participantes tras recibir la formación.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas que por primera vez reciben formación especializada}}{\text{Número total de campesinos que conforman la asociación u organización}} \text{ X100}$$

Resultado

$$\frac{603}{1700} \text{ X100} = 35\%$$

- **Indicador incremento de gestión – Técnico**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento técnico}}{\text{Número de beneficiarios totales del Proyecto}} \text{ X100}$$

Resultado

$$\frac{0}{575} \text{ X100} = 0\%$$

- **Indicador incremento de gestión – Administrativo**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento administrativo}}{\text{Número de beneficiarios totales del Proyecto}} \text{ X100}$$

Resultado

$$\frac{0}{575} \text{ X100} = 0\%$$

- **Indicador incremento de gestión – Financiero**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento financiero}}{\text{Número de beneficiarios totales del Proyecto}} \text{ X100}$$

Resultado

$$\frac{0}{575} \text{ X100} = 0\%$$

- **Indicador incremento de gestión - TICS**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento TICS}}{\text{Número de beneficiarios totales del Proyecto}} \text{ X100}$$

Resultado

$$\frac{0}{575} \text{ X100} = 0\%$$

- **Indicador incremento de gestión – Desarrollo Tecnológico**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento de desarrollo tecnológico}}{\text{Número de beneficiarios totales del Proyecto}} \text{ X100}$$

Resultado

$$\frac{0}{} \text{ X100} = 0\%$$

575

- **Indicador incremento de gestión – Habilidades Transversales**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento de habilidades transversales}}{\text{Número de beneficiarios totales del Proyecto}} X100$$

Resultado

$$\frac{603}{575} X100 = 105\%$$

3. Aspectos financieros

3.1. Ejecución presupuestal por fuente de financiación

Aportes SENA

BALUARTE VALLE presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de cofinanciación de acuerdo con el siguiente detalle:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R1. 1.4	Capacitador Promotor de comunidad (PC)	$ 5.946.630,00	$5.946.630,00	$ 5.153.746,00	$792.884,00	$ 0,00	$5.946.630,00	100,00%
R1.2.1.2	Profesional titulado con experiencia relacionada comprobada, mínimo de tres (3) años. (Nacional)	$ 10.433.320,00	$10.433.320,00	$6.259.992,00	$4.173.328,00	$ 0,00	$10.433.320,00	100,00%
R1. 2.1.3	Profesional con título de especialización y experiencia relacionada comprobada, mínimo de tres (3) años	$ 38.058.840,00	$38.058.840,00	$32.984.328,00	$5.074.512,00	$ 0,00	$38.058.840,00	100,00%
R1. 2.1.4	Profesional con título de maestría y experiencia relacionada comprobada, mínimo de tres (3) años.	$ 30.033.280,00	$30.033.280,00	$27.029.952,00	$3.003.328,00	$ 0,00	$30.033.280,00	100,00%

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R1.2.3 - R1.2.3.1	Lider Mundial y Nacional	$ 9.000.000,00	$9.000.000,00	$9.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$9.000.000,00	100,00%
R2.1	Alojamiento, manutención y transporte local Nacional	$ 56.382.800,00	$56.382.800,00	$56.382.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$56.382.800,00	100,00%
R4.	Tiquetes Aéreos, terrestres intermunicipales y/o fluvial (Ida y vuelta) Naciona e internacional.	$ 4.200.000,00	$4.200.000,00	$4.200.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$4.200.000,00	100,00%
R5.1.2.1.1	Impresión de Cartillas De 10 a 150 unidades	$ 13.471.500,00	$13.471.498,00	$13.471.498,00	$ 0,00	$ 0,00	$13.471.498,00	100,00%
R5.1.2.1.2	Impresión de Cartillas 151 unidades en adelante	$ 829.800,00	$829.800,00	$829.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$829.800,00	100,00%
R5.1.3	Diagramación Cartillas y Folletos	$ 8.823.904,00	$ 8.823.904,00	$8.823.904,00	$ 0,00	$ 0,00	$8.823.904,00	100,00%
R5.2.1	Cuadernos tamaño Media carta de 100 hojas, anillado, con carátula con Diseño SENA y pasta dura	$ 9.266.700,00	$9.266.700,00	$9.266.700,00	$ 0,00	$ 0,86	$9.266.699,14	99,999991%
R5.2.2	Esferos retráctil de tinta negra por beneficiario	$ 1.580.675,00	$1.580.665,00	$1.580.665,00	$ 0,00	$ 0,00	$1.580.665,00	100,00%
R5.2.3	Papelógrafos por grupo de formación	$ 49.440,00	$49.440,00	$36.256,00	$13.184,00	$ 0,00	$49.440,00	100,00%
R5.2.4	Marcadores por grupo de formación	$ 500.700,00	$500.700,00	$500.700,00	$0,00	$ 0,00	$500.700,00	100,00%
R7.	Gastos de operación del proyecto.	$ 55.898.999,00	$55.899.011,00	$36.399.011,00	$19.500.000,00	$12,00	$55.898.999,00	100,00%
R8.1	Elaboración de Video	$ 1.614.999,00	$1.614.999,00	$1.614.999,00	$ 0,00	$ 0,00	$1.614.999,00	100,00%
R10.	Garantías - Pólizas	$ 1.164.450,00	$1.164.450,00	$1.164.450,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.164.450,00	100,00%
R11.1	Gastos de transporte para formación de 2 horas	$ 4.000.000,00	$4.000.000,00	$4.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$4.000.000,00	100,00%
R11.4	Gastos de Alojamiento, manutención y transporte para Evento de formación Campamento (Cuando la formación sea de 8 horas diarias y en 2 diás seguidos)	$ 51.365.625,00	$51.365.625,00	$51.365.625,00	$ 0,00	$ 0,00	$51.365.625,00	100,00%
R12.	Transferencia de conocimiento	$ 3.322.206,00	$3.322.206,00	$3.322.206,00	$ 0,00	$ 0,00	$3.322.206,00	100,00%
TOTALES		**$305.943.868,00**	**$305.943.868,00**	**$273.386.632,00**	**$32.557.236,00**	**$ 12,86**	**$305.943.855,14**	**99,99999580%**

Aportes contrapartida

Según el convenio suscrito, el conviniente debe aportar recursos por valor de 33.993.770,00 en especie.

Recursos de contrapartida en efectivo

El conviniente no tiene contemplado un valor por esta fuente de recursos.

Recursos de contrapartida en especie

El conviniente presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de contrapartida en especie de acuerdo con el siguiente detalle:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R6.1.1	Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.(Incluido video beam y conectividad)	$ 30.187.920,00	$30.187.920,00	$0,00	$30.187.920,00	100,00%
R6. 1.2	Ambiente de formación de 31 a 150 beneficiarios (incluido video Beam y conectividad)	$796.352,00	$796.352,00	$0,00	$796.352,00	100,00%
R6.3	Equipos especializados	$3.000.000,00	$3.000.000,00	$0,00	$3.000.000,00	100,00%
R7.	Gastos de operación del proyecto.	$9.498,00	$9.498,00	$0,00	$9.498,00	100,00%
TOTALES		**$ 33.993.770,00**	**$ 33.993.770,00**	**$ 0,00**	**$ 33.993.770,00**	100,00%

Resumen de la ejecución financiera

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No reconocido	Valor reconocido	% Ejecución
Cofinanciación	$ 305.943.868,00	$ 305.943.868,00	$ 12,86	$ 305.943.855,14	99,9999958%
Contrapartida en dinero	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	0,00%
Contrapartida en especie	$ 33.993.770,00	$ 33.993.770,00	$0,00	$ 33.993.770,00	100,00%
Contrapartida total	$ 33.993.770,00	$ 33.993.770,00	$0,00	$ 33.993.770,00	100,00%
Total	**$ 339.937.638,00**	**$ 339.937.638,00**	**$ 12,86**	**$ 339.937.625,14**	**99,999996%**

El porcentaje final de reconocimiento financiero corresponde al 99,99%, siendo el menor entre la ejecución entre los recursos de cofinanciación y contrapartida.

3.2. Reconocimiento final

Los siguientes son los resultados de ejecución del proyecto:

Fuente de Financiación	Valor Aprobado	% cumplimiento técnico	valor a reconocer cumplimiento técnico	Ejecución financiera	% Ejecución financiera	% reconocido Ejecución para liquidar	Valor reconocido por la Interventoría
Cofinanciación	305.943.868,00	100,00%	305.943.868,00	305.943.855,14	99,99999580%	99,99999579661460%	305.943.855,14
Contrapartida	33.993.770,00		33.993.770,00	33.993.770,00	100,00%		33.993.768,57

Total	339.937.638,00		339.937.638,00				339.937.623,71

Nota: Para efectos del cálculo el % corresponde a 99,99999579661460%

4. Aspectos transversales

4.1. Aspectos jurídicos

Modificaciones

El conviniente solicitó las siguientes modificaciones:

Modificación	Concepto de Interventoría	Viabilidad	Radicado SENA	Fecha
Cambio de ciudad o municipio de ejecución	CM_051224_22	Viable	72024316199	5/12/2024
Cronograma	CM_040425_153	Viable	72025140377	04/04/2025
Cronograma	CM_100525_195	Viable	72025181380	10/05/2025

Además, se tramitó modificaciones que requieren aval del SENA así:

Modificación	Concepto de Interventoría	Viabilidad	Radicado SENA	Fecha	Respuesta SENA	Fecha
Traslado de recursos	CM_130525_201	Viable	72025184112	13/05/2025	Sin respuesta	Sin respuesta

Acciones de Interventoría

Durante la Ejecución la interventoría realizó las siguientes acciones:

TIPO DE ACCIÓN	MOTIVO	RADICADO INTERVENTORÍA	RADICADO SENA	FECHA RADICADO	CIERRE
Solicitud de información	Reporte mensual	ASI_120025_185	72025057691	12/02/2025	CIM_270325_275
Solicitud de información	Reporte mensual	ASÍ_080425_266	72025143271	08/04/2025	IM_030525_314
Solicitud de información	segundo desembolso.	ASI_300425_283	72025169409	30/04/2025	IM_030525_314
Solicitud de información	Registro de beneficiarios	ASI_160525_317	72025143271	16/05/2025	CIN_260525_4067

4.2. Aspectos administrativos

Garantías

Pólizas de seguro aprobadas:

Póliza de Cumplimiento n. 33-44-101255387 del 31 de octubre de 2024

Responsabilidad Civil extracontractual n. 33-40-101082161 del 31 de octubre de 2024

Fecha aprobación garantías: 6 de noviembre de 2024

Pólizas de seguro aprobadas prorroga otrosí 1:

Póliza de Cumplimiento n. 33-44-101255387 anexo 1 del 26 de diciembre de 2024

Responsabilidad Civil extracontractual n. 33-40-101082161 anexo 1 del 26 de diciembre de 2024

Fecha aprobación garantías prórroga otrosí 1: 23 de febrero de 2025 y 20 de marzo de 2025

Pólizas de seguro aprobadas prorroga otrosí 2:

Póliza de Cumplimiento n. 33-44-101255387 anexo 2 del 14 de marzo de 2025.

Responsabilidad Civil extracontractual n. 33-40-101082161 anexo 2 del 14 de marzo de 2025
Fecha aprobación garantías prórroga otrosí 2: 20 de marzo de 2025

Fecha de inicio: 7 de noviembre de 2024

Contratos

El Conviniente suscribió los siguientes contratos con el fin de cumplir con las obligaciones establecidas en el convenio y ejecutar el proyecto aprobado:

Contrato No.	Proveedor	NIT o cédula	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
1/2024	Mayerlin Arévalo Osorio	29.182.139	Directora de proyecto	$21.000.000	Mensual	05/07/2025	16/11/2024
2/2024	Sandra Patricia Sinisterra	66.923.394	Abogada	$5.000.000	Mensual	05/07/2025	16/11/2024
3/2024	Eddie Alfonso Molina Calero	79.151.842	Conductor	$5.000.000	Mensual	05/07/2025	16/11/2024
4/2024	Shadai Rincón Arévalo	1.126.626.817	Apoyo administrativo	$3.000.000	Mensual	05/07/2025	16/11/2024
5/2024	Juan Camilo Escobar Vega	1.005.981.416	Creador de contenidos	$3.000.000	Mensual	05/07/2025	16/12/2024
6/2024	Univital	805.025.072-9	Proveedor	$108.703.365	Mensual	05/07/2025	16/11/2024
7/2024	Luis Alfonso Burbano Cadavid	12.225.379	Capacitador	$12.686.280	Mensual	05/07/2025	29/11/2025
8/2024	Eddie Alfonso Molina Calero	79.151.842	Capacitador promotor	$1.982.210	Mensual	05/07/2025	29/11/2024
9/2024	Diego Fernando Oviedo Medina	1.018.417.285	Capacitador	$15.016.640	Mensual	05/07/2025	29/11/2025
10/2024	Luis Carlos Estupiñán Obando	1.004.541.734	Auxiliar contable	$1.000.000	Mensual	28/01/2025	01/12/2024
1/2025	Diego Fernando Oviedo Medina	1.018.417.285	Capacitador	$15.016.640	Mensual	05/07/2025	15/03/2025
2/2025	Luis Alfonso Burbano Cadavid	12.225.379	Capacitador	$12.686.280	Mensual	05/07/2025	15/03/2025
3/2025	Luis Alfonso Burbano Cadavid	12.225.379	Capacitador	$12.686.280	Mensual	05/07/2025	15/03/2025
4/2025	Eddie Alfonso Molina Calero	79.151.842	Capacitador promotor	$1.982.210	Mensual	05/07/2025	15/03/2025
5/2025	Eddie Alfonso Molina Calero	79.151.842	Capacitador promotor	$1.982.210	Mensual	05/07/2025	15/03/2025
6/2025	Ángel Alberto Aguirre Toro	16.781.215	Capacitador	$10.433.320	Mensual	05/07/2025	15/03/2025
7/2025	Luz Adriana Valencia Castaño	29.362.708	Contadora	$4.000.000	Mensual	05/07/2025	27/03/2025

4.3. Aspectos relevantes

La ejecución del convenio entre el SENA y BALUARTE VALLE, en el marco del Programa de Formación Especializada para la Economía Campesina – FEEC, permitió capacitar a 575 campesinos y campesinas del Valle del Cauca, mediante cinco Acciones de Formación, enfocadas en los temas de participación ciudadana y el campesino como sujeto de derechos; la reforma agraria y ordenamiento territorial rural y la asociatividad comunitaria desde un enfoque de gobernanza local, la historia del conflicto por la tierra, el cambio climático y el cuidado del medio ambiente, permitiendo a los beneficiarios herramientas teóricas, conceptuales, metodológicas y actitudinales para gestionar y participar en el desarrollo agroproductivo en los territorios.

4.3.1. Fortalezas

Las acciones de formación permitieron a los beneficiarios fortalecer sus capacidades y adquirir herramientas clave para mejorar la gestión de sus actividades. A continuación, se presentan las principales fortalezas alcanzadas en cada acción de formación.

AF1 - Mecanismos de participación ciudadana en el contexto del campesinado como sujeto especial de derechos y el cumplimiento del acuerdo de paz de la habana

La acción de formación demostró ser una herramienta eficaz para fortalecer las capacidades organizativas y de participación de las comunidades campesinas del municipio de Río Frío. La mejora en los niveles de conocimiento evidencia el compromiso de los participantes y la pertinencia temática del contenido impartido. Este proceso se alinea con los objetivos del Acuerdo de Paz, al promover el empoderamiento del campesinado como actor fundamental del desarrollo territorial.

AF2 - Historia, desarrollo y perspectivas de la implementación de la reforma agraria integral en Colombia y el Valle del Cauca

La acción de formación permitió capacitar a los participantes para el análisis, comprensión del desarrollo e implementación de la reforma agraria en el Valle del Cauca, planteando alternativas de gestión, organización, participación y movilización que permitieran el desarrollo agro productivo hacia el logro de una paz territorial y paz total.

AF3 - Organización y fortalecimiento de los procesos asociativos para la construcción de una territorialidad campesina en el Valle del Cauca

Permitió la capacitación de 125 beneficiarios, a partir del diálogo de saberes y otras actividades pedagógicas, en el manejo de herramientas teórico prácticas que les permitan realizar adecuadamente los trámites de conformación y funcionamiento de las figuras organizativas y el manejo de herramientas e instrumentos tecnológicos para acceder a los planes programas y proyectos de las entidades públicas y/o privadas.

AF4 - Cambio climático, extinción de las especies y la supervivencia de la especie humana

La acción de formación permitió capacitar a los beneficiarios en temas como las causas y efectos del cambio climático; cómo presentar alternativas para la mitigación del mismo y la manera cómo se puede fortalecer las capacidades locales para enfrentar los retos ambientales.

AF5 - El Conflicto por la tierra en Colombia y Reforma Agraria para crear la paz

Cuyo principal objetivo fue intercambiar saberes sobre el problema agrario y los conflictos de tierras, en clave de derechos humanos, legislación agraria y procesos organizativos campesinos.

4.3.2. Puntos a mejorar

Se identifica la necesidad de fortalecer el seguimiento posterior a los procesos formativos mediante programas de actualización y acompañamiento técnico continuos, ya que la ausencia de estos mecanismos puede limitar la consolidación de los conocimientos adquiridos y afectar la sostenibilidad de los resultados obtenidos. De igual forma, se pudo detectar falencias puntuales como las enunciadas a continuación:

• Desconocimiento general de la normativa agraria.

• Dificultades para acceder a rutas institucionales que permitan resolver conflictos sobre la tenencia de tierras.

• Desarticulación comunitaria: necesidad urgente de cohesionar a la comunidad en torno a los temas agrarios.

4.3.3. Caso de éxito

Se considera que todo el proceso en su integralidad ha sido un éxito, ya que se lograron los objetivos trazados y se superaron las expectativas iniciales. Más de 600 campesinos fueron impactados con atención integral y personalizada que les garantizó su comodidad y bienestar durante todo el proceso de formación. La participación activa de los beneficiarios y el esfuerzo logístico que se realizó en los diferentes territorios permitieron que se sintieran valorados y atendidos.
Todos los contenidos desarrollados en las acciones de formación impartidas permitieron que los beneficiarios mejoraran su gestión organizativa y fortalecieran sus capacidades como líderes y lideresas en sus comunidades. El proyecto de formación no sólo cumplió con el objetivo de trabajar por el campesino vallecaucano y sus organizaciones, sino que también dinamizó la economía local de los municipios donde se llevó a cabo. De igual forma, se generó un impacto económico y social significativo, reactivando la economía rural y promoviendo el desarrollo comunitario.
