
INFORME FINANCIERO

Contrato prestación de servicios N° PS-001-2025

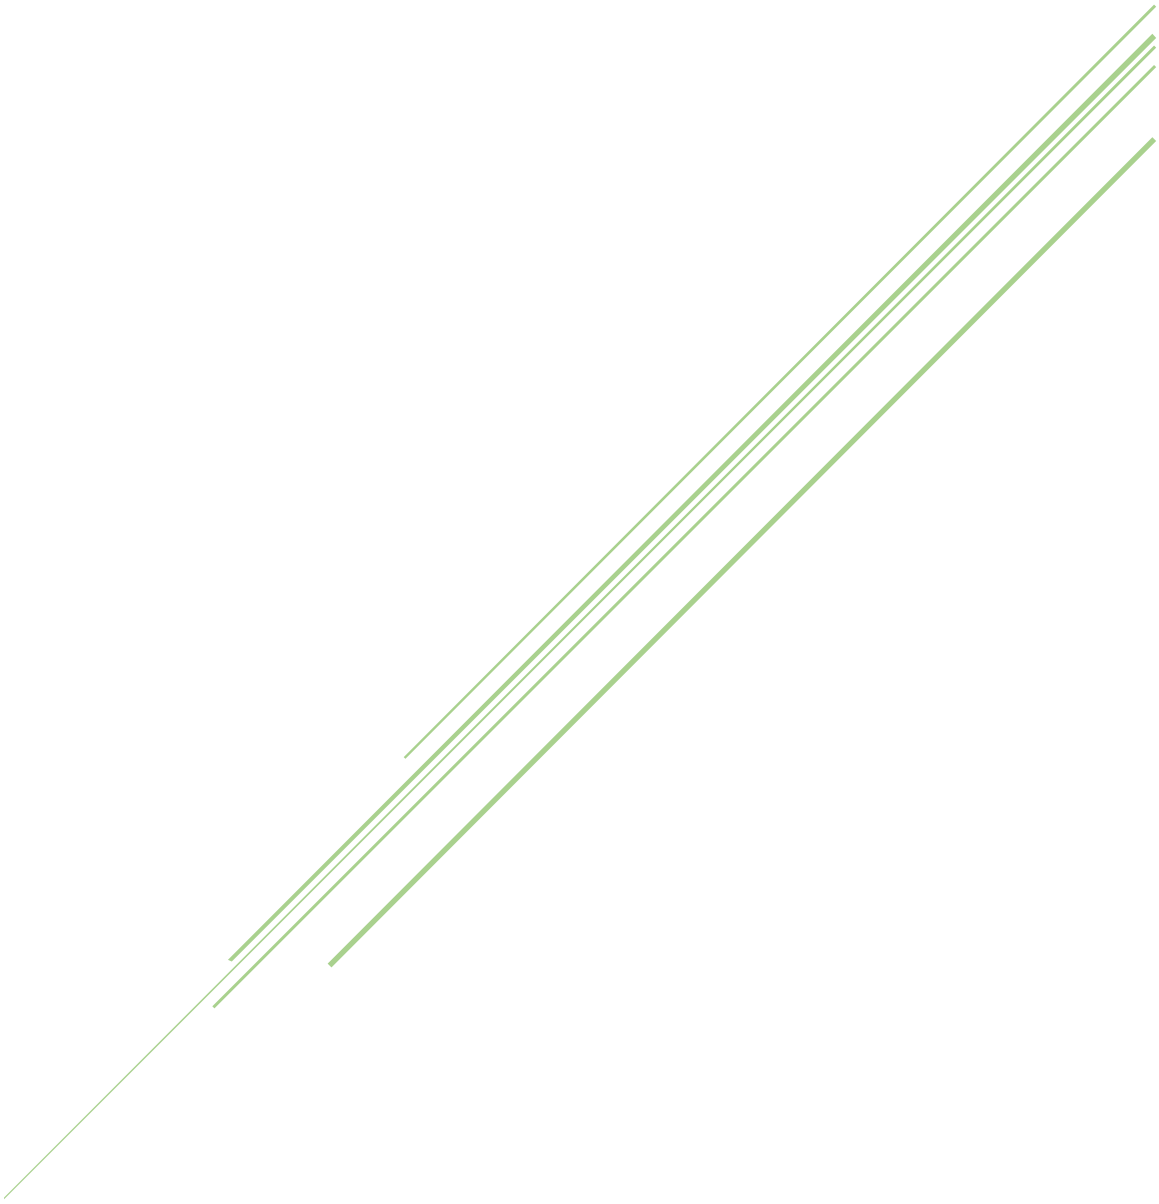

SOLTAM S.A.S

NIT 900674214-6

INFORME FINANCIERO FINAL.

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° PS-001-2025.

NOMBRE DE PROYECTO:

“IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA CON BPIN 20243218000001”

PRESENTADO POR:

SOLTAM S.A.S

NIT 900674214-6

PARA:

INTERVENTORÍA: ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA – CORPOGUAJIRA,

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

FECHA DEL INFORME DEL 17 DE FEBRERO DE AL 16 DE AGOSTO DE 2025.

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Ejemplares de este documento que han sido enviados a las siguientes dependencias:

VERSIÓN	DEPENDENCIAS	No. COPIAS
Original	Educación Ambiental	1

CUADRO DE CONTROL

VERSIÓN	PERIODO	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Versión Inicial	17 de febrero del 2025 al 16 de agosto del 2025.	Ing. Carlos Alberto Bonilla Sánchez Profesional De Ingeniería - Especialista Firma	Ing. Edwin Enrique Cerchar Borrego Director De Proyecto Firma	Enrique Manuel Zimmerman Ortiz. Interventoría Firma

INTRODUCCIÓN

El presente informe financiero tiene como objetivo principal presentar un análisis detallado de la situación financiera del proyecto denominado “IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA” suscrito entre la corporación autónoma regional de La Guajira – CORPOGUAJIRA y la empresa SOLTAM S.A.S, bajo el contrato de prestación de servicios No. PS-001-2025.

A través de la revisión de los avances financieros e inversiones realizadas durante la ejecución del proyecto, se busca proporcionar una visión clara y precisa del desempeño financiero de la empresa, en la ejecución del contrato en mención.

El presente informe financiero no solo refleja el desempeño económico durante la ejecución del proyecto, sino que también documenta las actividades y las inversiones estratégicas que permitieron el cumplimiento puntual de las obligaciones contractuales, asegurando la continuidad y el éxito del proyecto.


AVANCE FINANCIERO.

Tabla 1. Avance Financiero

NOMBRE	VALOR
INVERSIÓN INICIAL CONTRATADA	$ 1.711.921.999
ANTICIPO ENTREGADO	$ 855.960.999
PORCENTAJE ANTICIPO ENTREGADO	50%
INVERSIÓN TOTAL EJECUTADA	$1.711.921.999
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	100,00%
INVERSIÓN TOTAL FACTURADA	$ 1.034.265.668
PORCENTAJE TOTAL FACTURADO	60,42%
INVERSIÓN TOTAL POR FACTURAR	$ 677.656.331,00
PORCENTAJE TOTAL POR FACTURAR	39,58%

Fuente: Propia

Grafica 1. Avance financiero

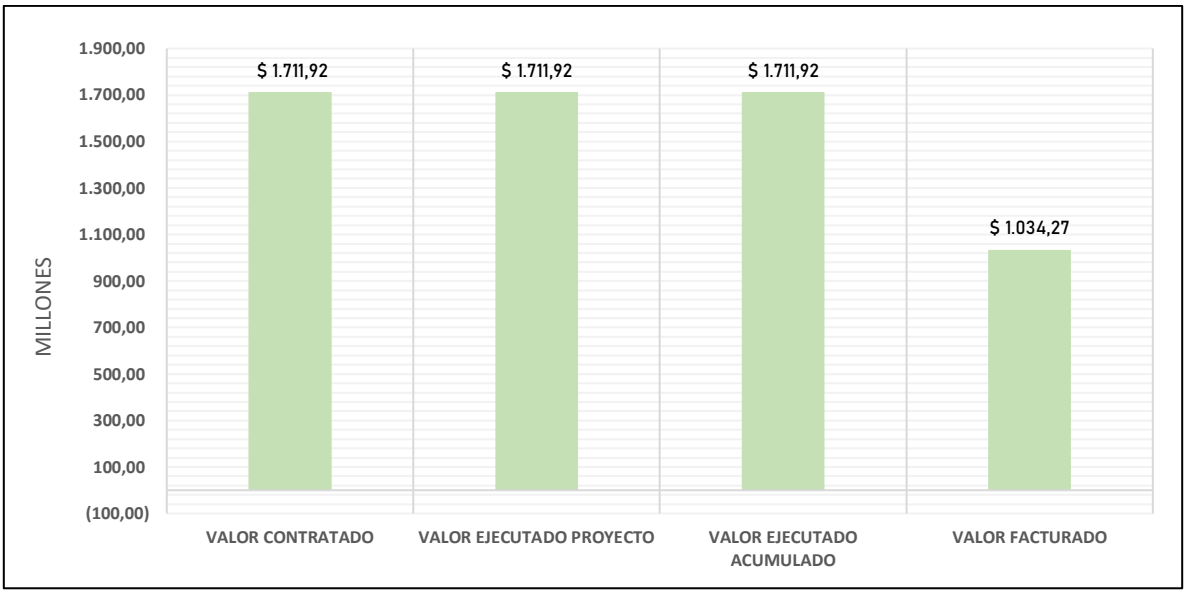

Fuente: Propia.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO.

Tabla 2. Presupuesto del proyecto.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

CONTRATO: PS-001-2025		IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA.	FECHA
CONTRATISTA: SOLTAM S.A.S			16/08/2025
INTERVENTORÍA: ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ			

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	CANT REQUERIDA	VR UNIT.	VR TOTAL	CANT. EJECUTADA	VR EJECUTADO	%
1	**Mejorar acciones de cultura ambiental en las escuelas públicas del Departamento de La Guajira.**						
1,1	Realizar socialización del Proyecto	30	$ 1.267.458,33	$ 38.023.750,00	30	$38.023.750,00	100,00%
1,2	Implementar un plan de medios y divulgación del proyecto	1	$ 27.239.100,00	$ 27.239.100,00	1	$27.239.100,00	100,00%
1,3	Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales.	30	$ 15.655.306,00	$ 469.659.180,00	30	$469.659.180,00	100,00%
2	**Fortalecer los procesos de participación comunitaria en la Gestión Ambiental del departamento de La Guajira.**						
2,1	Realizar talleres de sensibilización en las instituciones Educativas.	181	$ 1.123.384,42	$ 203.332.580,00	181	$203.332.580,00	100,00%
2,2	Instalar puntos ecológicos (capacidad de 55lt) .	362	$ 1.871.068,82	$ 677.326.912,00	362	$677.326.912,00	100,00%
2,3	Ilustrar la conservación de los recursos naturales en sitios específicos de las instituciones públicas del departamento de La Guajira	15	$ 6.203.656,40	$ 93.054.846,00	15	$93.054.846,00	100,00%
2,4	Fortalecer las bibliotecas de Educación Ambiental en el Departamento de La Guajira	1475	$ 137.820,77	$ 203.285.631,00	1475	$203.285.631,00	100,00%
TOTAL COSTOS				**$ 1.711.921.999,0**		**$1.711.921.999,0**	**100,00%**
PORCENTAJE DE AVANCE							**100,00%**

Fuente: Propia

INVERSIONES REALIZADAS

Tabla 3. Inversiones realizadas por periodos.

Item	Descripción	UNIDAD	CANT	VALOR UNIT.	PERIODOS 1	2	3	4	5	6	7	TOTAL		%	
1	Mejorar acciones de cultura ambiental en las escuelas públicas del Departamento de La Guajira.														
1,1	Realizar socialización del Proyecto	Numero	30	$ 1.267.458,33	6	9				8	7	30		2,22%	2,22%
					$ 7.604.750,00	$ 11.407.125,00	$ -	$ -	$ -	$ 10.139.666,67	$ 8.872.208,33		$ 38.023.750,00		
1,2	Implementar un plan de medios y divulgación del proyecto	Cuñas radiales	30	$ 350.217,00			12	3		7	8	30		0,61%	1,59%
					$ -	$ -	$ 4.202.604,00	$ 1.050.651,00	$ -	$ 2.451.519,00	$ 2.801.736,00		$ 10.506.510,00		
		Periodicos y redes sociales	30	$ 486.412,50	2	10	3			7	8	30		0,85%	
					$ 972.825,00	$ 4.864.125,00	$ 1.459.237,50	$ -	$ -	$ 3.404.887,50	$ 3.891.300,00		$ 14.592.375,00		
		Pendon	6	$ 356.702,50	2	1		1			2	6		0,13%	
					$ 713.405,00	$ 356.702,50	$ -	$ 356.702,50	$ -	$ -	$ 713.405,00		$ 2.140.215,00		
1,3	Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales.	Numero	30	$ 15.655.306,00		1	14			7	8	30		27,4%	27,4%
					$ -	$ 15.655.306,00	$ 219.174.284,00	$ -	$ -	$ 109.587.142,00	$ 125.242.448,00		$ 469.659.180,00		
2	Fortalecer los procesos de participación comunitaria en la Gestión Ambiental del departamento de La Guajira.														
2,1	Realizar talleres de sensibilización en las instituciones Educativas.	Numero	181	$ 1.123.384,42				78	43	24	36	181		11,88%	11,88%
					$ -	$ -	$ -	$ 87.623.984,75	$ 48.305.530,06	$ 26.961.226,08	$ 40.441.839,12		$ 203.332.580,00		
2,2	Instalar puntos ecológicos (capacidad de 55lt)	Numero	362	$ 1.871.068,82				156	86	48	72	362		39,57%	39,57%
					$ -	$ -	$ -	$ 291.886.735,56	$ 160.911.918,32	$ 89.811.303,25	$ 134.716.954,87		$ 677.326.912,00		
2,3	Ilustrar la conservación de los recursos naturales en sitios	Numero	15	$ 6.203.656,40			5	5		3	2	15		5,44%	5,44%
					$ -	$ -	$ 31.018.282,00	$ 31.018.282,00	$ -	$ 18.610.969,20	$ 12.407.312,80		$ 93.054.846,00		
2,4	Fortalecer las bibliotecas de Educación Ambiental en el Departamento de La Guajira	I.E URBANAS	1045	$ 137.820,77				528	154	66	297	1045		8,41%	11,87%
					$ -	$ -	$ -	$ 72.769.364,86	$ 21.224.398,08	$ 9.096.170,61	$ 40.932.767,73		$ 144.022.701,28		
		I.E RURALES	430	$ 137.820,77				150	145	90	45	430		3,46%	
					$ -	$ -	$ -	$ 20.673.115,02	$ 19.984.011,18	$ 12.403.869,01	$ 6.201.934,51		$ 59.262.929,72		
TOTAL					$ 9.290.990,00	$ 32.283.279,50	$ 255.854.441,50	$ 505.379.756,69	$ 250.426.285,64	$ 282.467.013,31	$ 376.222.391,36		$ 1.711.921.999,00	100,00%	100,00%

Fuente: Propia

Durante la ejecución del proyecto comprendido del 17 de febrero al 16 de agosto del presente año, se realizaron las siguientes actividades:

Actividad 1.1 Realizar socialización del Proyecto: se ha ejecutado en un 100%, realizando la primera socialización del proyecto en los 15 municipios, una por cada municipio intervenido, y 15 socializaciones en la segunda socialización del proyecto, representados en un costo de $38.023.750,00 pesos, correspondiente al 2,22% del total del presupuesto.

Actividad 1.2 Implementar un plan de medios y divulgación del proyecto: Esta actividad ha presentado un avance del 100% de ejecución, representados en un costo total entre Cuñas radiales, Periódicos y redes sociales, y Pendones, de $27.239.100,00 pesos, correspondiente al 1,59% del total del presupuesto.

Actividad 1.3 Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales: Para esta actividad se reporta un avance del 100%, representado en el valor de $469.659.180,00 pesos, correspondiente al 27,4% del total del presupuesto.

Actividad 2.1 Realizar talleres de sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente: Esta actividad ha presentado un avance del 100% de ejecución, representados en un costo de $203.332.580,00 pesos, en la sensibilización de 181 Instituciones Educativas, correspondiente al 11,88% del total del presupuesto.

Actividad 2.2 Instalar puntos ecológicos (capacidad de 55lt) para el adecuado manejo de los residuos sólidos: Esta actividad ha presentado un avance del 100% de ejecución, representados en un costo de $677.326.912,00 pesos, en la entrega de 362 puntos ecológicos, correspondiente al 39,57% del total del presupuesto.

Actividad 2.3 Ilustrar la conservación de los recursos naturales en sitios específicos de las instituciones públicas del departamento de La Guajira: Esta actividad se ha ejecutado en un 100%, con la ejecución hasta la fecha de 15 murales realizados, representados en un costo $93.054.846,00 pesos, correspondiente al 5,44% del total del presupuesto.

Actividad 2.4 Fortalecer las bibliotecas de Educación Ambiental en el Departamento de La Guajira, se realizó una inversión de $203.285.631,00 entre los libros entregados a las instituciones educativas urbanas y rurales, correspondiente al 11,87% del total del presupuesto, lo que representa un avance del 100% de la actividad en cuestión.

INVERSIONES ACUMULADAS.

Tabla 4. Inversión Acumulada de las actividades ejecutadas hasta la fecha

ítem	Descripción	UNIDAD	CANT	VALOR UNIT.	PERIODOS						
					1	2	3	4	5	6	7
1	Mejorar acciones de cultura ambiental en las escuelas públicas del Departamento de La Guajira.										
1,1	Realizar socialización del Proyecto	Numero	30	$ 1.267.458,33	6	15	15	15	15	23	30
					$ 7.604.750,00	$ 19.011.875,00	$ 19.011.875,00	$ 19.011.875,00	$ 19.011.875,00	$ 29.151.541,67	$ 38.023.750,00
1,2	Implementar un plan de medios y divulgación del proyecto	Cuñas radiales	30	$ 350.217,00	0	0	12	15	15	22	30
					$ -	$ -	$ 4.202.604,00	$ 5.253.255,00	$ 5.253.255,00	$ 7.704.774,00	$ 10.506.510,00
		Periodicos y redes sociales	30	$ 486.412,50	2	12	15	15	15	22	30
					$ 972.825,00	$ 5.836.950,00	$ 7.296.187,50	$ 7.296.187,50	$ 7.296.187,50	$ 10.701.075,00	$ 14.592.375,00
		Pendon	6	$ 356.702,50	2	3	3	4	4	4	6
					$ 713.405,00	$ 1.070.107,50	$ 1.070.107,50	$ 1.426.810,00	$ 1.426.810,00	$ 1.426.810,00	$ 2.140.215,00
1,3	Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales.	Numero	30	$ 15.655.306,00	0	1	15	15	15	22	30
					$ -	$ 15.655.306,00	$ 234.829.590,00	$ 234.829.590,00	$ 234.829.590,00	$ 344.416.732,00	$ 469.659.180,00
2	Fortalecer los procesos de participación comunitaria en la Gestión Ambiental del departamento de La Guajira.										
2,1	Realizar talleres de sensibilización en las instituciones Educativas.	Numero	181	$ 1.123.384,42	0	0	0	78	121	145	181
					$ -	$ -	$ -	$ 87.623.984,75	$ 135.929.514,81	$ 162.890.740,88	$ 203.332.580,00
2,2	Instalar puntos ecológicos (capacidad de 55lt)	Numero	362	$ 1.871.068,82	0	0	0	156	242	290	362
					$ -	$ -	$ -	$ 291.886.735,56	$ 452.798.653,88	$ 542.609.957,13	$ 677.326.912,00
2,3	Ilustrar la conservación de los recursos naturales en sitios	Numero	15	$ 6.203.656,40	0	0	5	10	10	13	15
					$ -	$ -	$ 31.018.282,00	$ 62.036.564,00	$ 62.036.564,00	$ 80.647.533,20	$ 93.054.846,00
2,4	Fortalecer las bibliotecas de Educación Ambiental en el Departamento de La Guajira	I.E URBANAS	1045	$ 137.820,77	0	0	0	528	682	748	1045
					$ -	$ -	$ -	$ 72.769.364,86	$ 93.993.762,94	$ 103.089.933,55	$ 144.022.701,28
		I.E RURALES	430	$ 137.820,77	0	0	0	150	295	385	430
					$ -	$ -	$ -	$ 20.673.115,02	$ 40.657.126,20	$ 53.060.995,21	$ 59.262.929,72
TOTAL					**$ 9.290.990,00**	**$ 41.574.269,50**	**$ 297.428.711,00**	**$ 802.808.467,69**	**$ 1.053.234.753,33**	**$ 1.335.701.766,64**	**$ 1.711.921.999,00**

Fuente: Propia

Lo anterior nos permite observar que el contrato de presentación de servicios No. PS – 001-2025, presenta un avance acumulado del total del presupuesto establecido para el desarrollo de cada una de las actividades comprendidas a partir de la fecha de inicio del contrato (17 de febrero del 2025) hasta la fecha de corte del séptimo periodo de ejecución (16 de agosto del 2025).

De esta manera, se ha realizado la inversión de $1.711.921.999,00 pesos, durante la ejecución del proyecto.

MANEJO DE ANTICIPO

Según Cláusula sexta del Contrato N° PS-001-2025, el anticipo al contrato es del 50% del presupuesto oficial. Para el primer periodo se radicó el plan de inversión de anticipo ante la entidad contratante, el cual fue aprobado por la interventoría y el supervisor del contrato. El plan de inversión se anexa al presente informe y se resume a continuación:

Tabla 5. Manejo de Anticipo.

DATOS ESPECIFICOS									
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID	DURACION / EVENTO			VR. UNITARIO	VR. TOTAL	%
				FEBRERO	MARZO	ABRIL			
1.0 Mejorar acciones de cultura ambiental en las escuelas públicas del Departamento de La Guajira.									
1.1	Realizar socialización del Proyecto	15	Número	X	X		$ 1.267.458	$ 19.011.875	50%
1.2	Implementar un plan de medios y divulgación del proyecto	0,32	Número				$ 27.239.100	$ 8.618.108	32%
1.3	Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales.	15	Número		X	X	$ 15.655.306	$ 234.829.590	50%
SUBTOTAL								**$ 262.459.574**	
2.0 Fortalecer los procesos de participación comunitaria en la Gestión Ambiental del departamento de La Guajira.									
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID	DURACION			VR. UNITARIO	VR. TOTAL	%
2.1	Realizar talleres de sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente.	70	Número		X	X	$ 1.123.384	$ 78.636.909	38,7%
2.2	Instalar puntos ecológicos (capacidad de 55lt) para el adecuado manejo de los residuos sólidos	140	Número		X	X	$ 1.871.069	$ 261.949.635	38,7%
2.3	Ilustrar la conservación de los recursos naturales en sitios específicos de las instituciones públicas del departamento de La Guajira	8	Número		x	x	$ 6.203.656	$ 49.629.251	53,3%
2.4	Fortalecer las bibliotecas de Educación Ambiental en el Departamento de La Guajira	1	Número			X	$ 203.285.631	$ 203.285.631	100%
TOTAL ACTIVIDAD								**$ 593.501.426**	
Valor total del Anticipo 50%								**$ 855.960.999**	

Fuente: Propia

AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL

- **Periodo No. 1** - Comprendido entre el 17 al 28 de febrero del 2025, para este periodo no se generó facturación.

Sin embargo, se cuantifica las cantidades ejecutadas para este corte quedando de la siguiente manera: se ejecutaron actividades por un valor de $10.523.225 pesos, lo que equivale a un porcentaje del 0.91%.

- **Periodo No. 2 -** Comprendido entre el 1 al 31 de marzo del 2025, para este periodo se generó el cobro del anticipo del contrato el cual corresponde al 50% del valor total del contrato.

Para este corte se ejecutaron actividades por un valor de $32.540.251, lo que corresponde a un porcentaje del 1,90%.

- **Periodo No. 3** - Comprendido entre el 01 al 30 de abril del 2025, para este periodo no se generó facturación.

Sin embargo, se cuantifica las cantidades ejecutadas para este corte quedando de la siguiente manera: se ejecutaron actividades por un valor de $255.670.386 pesos, lo que equivale a un porcentaje del 14.93%.

- **Periodo No. 4** - Comprendido entre el 01 al 31 de mayo del 2025, para este periodo no se generó facturación.

Sin embargo, se cuantifica las cantidades ejecutadas para este corte quedando de la siguiente manera: se ejecutaron actividades por un valor de $499.002.500,97 pesos, lo que equivale a un porcentaje del 29.15%.

- **Periodo No. 5** - Comprendido entre el 1 al 13 de junio del 2025, para este periodo no se generó facturación.

Sin embargo, se cuantifica las cantidades ejecutadas para este corte quedando de la siguiente manera: se ejecutaron actividades por un valor de $250.425.857,64 pesos, lo que equivale a un porcentaje del 14.63%.


- **Periodo No. 6** - Comprendido entre el 14 al 31 de julio del 2025, para este periodo no se generó facturación.

Sin embargo, se cuantifica las cantidades ejecutadas para este corte quedando de la siguiente manera: se ejecutaron actividades por un valor de $282.466.753,31 pesos, lo que equivale a un porcentaje del 16.50%.

- **Periodo No. 7** - Comprendido entre el 1 al 16 de agosto del 2025, para este periodo no se generó facturación.

Sin embargo, se cuantifica las cantidades ejecutadas para este corte quedando de la siguiente manera: se ejecutaron actividades por un valor de $376.221.906,36 pesos, lo que equivale a un porcentaje del 21,98%.


Grafica 2. Porcentaje de Actividades.

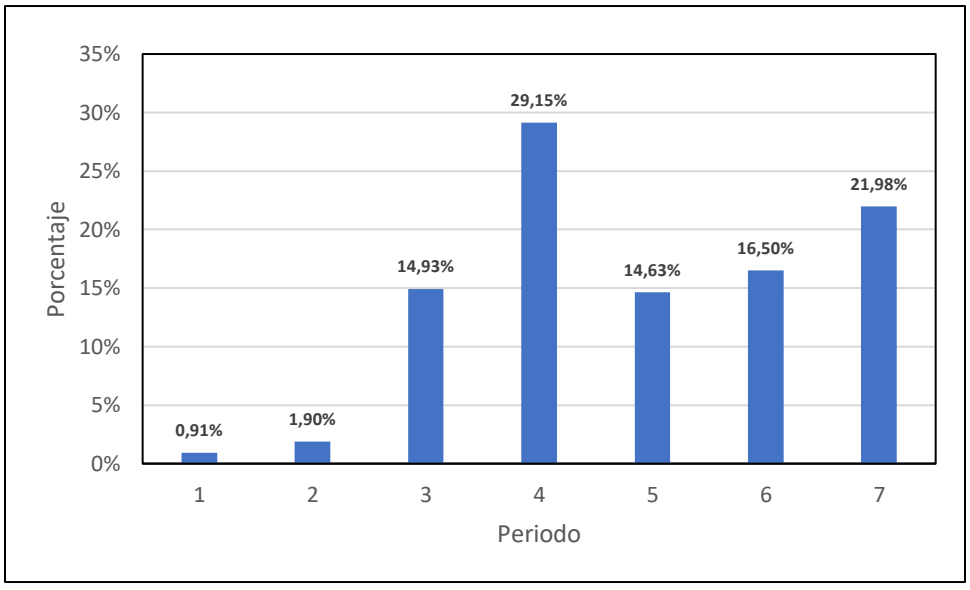

Fuente: Propia

ESTADO ACTUAL DE FACTURACIÓN

Grafica 3. Estado Actual de Facturación

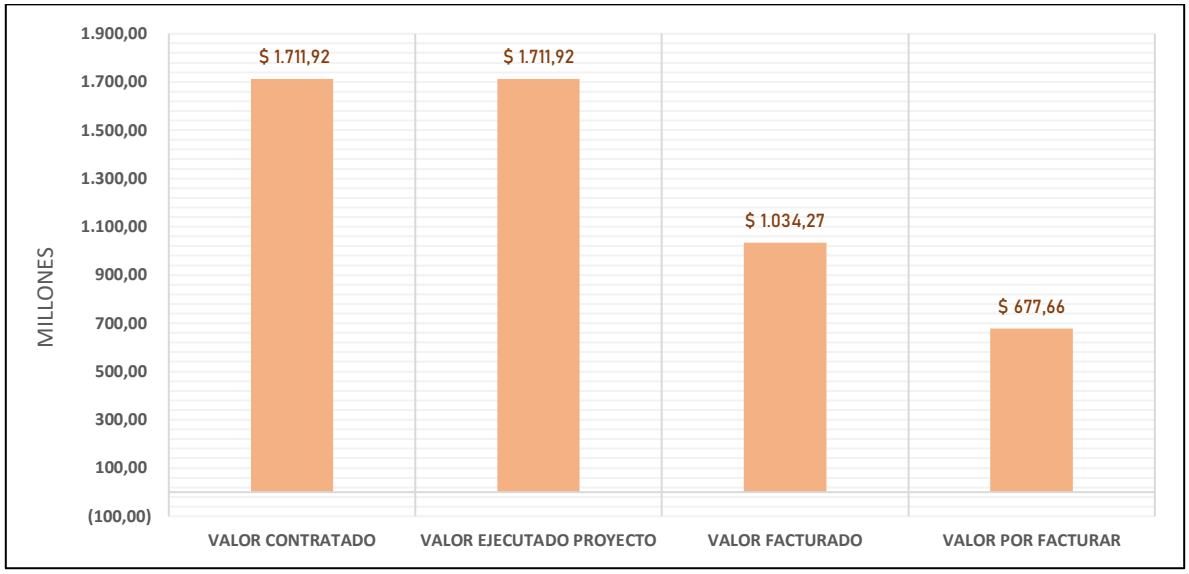

Fuente: Propia

Tabla 6. Balance del contrato de obra

VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO EN EL PROYECTO	VALOR FACTURADO	VALOR POR FACTURAR
$ 1.711.921.999	$ 1.711.921.999,00	$ 1.034.265.668,00	$ 677.656.331,00

Fuente: Propia

Tabla 7. Control financiero del contrato

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA.

VALOR DEL CONTRATO:	**$ 1.711.921.999,00**
ANTICIPO 50%:	**$ 855.960.999,50**
ANTICIPO NETO GIRADO AL CONTRATISTA	**$ 855.960.999,50**

DESCUENTOS					
ACTA Nº	**VALOR ACTA TOTAL**	**AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO**			**NETO ACTA**
		%	**VALOR**	**SALDO**	
1	$ 1.034.265.668,00	50%	$ 517.132.834,00	$ 338.828.165,50	$ 517.132.834,00
VR. FACTURADO	**$ 1.034.265.668,00**	**60,42%**	**$ 517.132.834,00**		
VR. X FACTURAR	**$ 677.656.331,00**	**39,58%**	**$ 338.828.165,50**		**$ 338.828.165,50**

SALDOS Y PORCENTAJES					
ACTA Nº	**VALOR ACTA TOTAL**	**SALDO ANTICIPO**	**SALDO CONTRATO**	**PORCENTAJE EJECUTADO ***	**PORCENTAJE POR EJECUTAR ***
1	$ 1.034.265.668,00	$ 338.828.165,50	$ 677.656.331,00	60,42%	**39,58%**
Final	$ 677.656.331,00			39,58%	**0,00%**

Fuente: Propia

CONCLUSIONES

A fecha de corte de entrega del presente informe financiero podemos concluir que el contratista ha culminado la totalidad de las actividades programadas durante el proyecto, representando el 100% de cumplimiento de las actividades, y realizando una inversión total de $1.711.921.999,00 pesos durante los siete periodos de ejecución, demostrando de esta manera que se cumplió de manera satisfactoria en el desarrollo del proyecto cuyo objetivo es la “IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA”

Además, el contratista ha ejecutado una facturación equivalente al 60,42% del valor presupuestado, correspondiente a $1.034.265.668. Por lo tanto, el valor por facturar es de $677.656.331, que representa el 39,58% restante del presupuesto total.

ANEXOS
