ACTA No. 4133.010.14.12.38	FECHA:	19/09/2025
	HORA INICIAL:	11:00 AM
OBJETIVO: Reunión Seguimiento # 2 - Proyecto Migración CMUA - DAGMA	HORA FINAL:	11:45 AM
	LUGAR: Seguimiento - Migración CMUA-DAGMA-IDEV Viernes, Septiembre 19 · 11:00 – 11:45am link: https://meet.google.com/rkq-miyo-giw	

ASISTENTES:
Fabio Orejuela - Contratista, Fabián Chavarriaga - Contratista, Claudia Escobar - Contratista, Leidy Penagos - Contratista, Juliana Toro - IDEV SOFTWARE.

AUSENTES: N/A

INVITADO: N/A

ORDEN DEL DÍA:

1. Avances - Fases de dirección del proyecto
2. Avances - Estructura de desagregación del trabajo (EDT-Entregables)
3. Control de Entregables
4. Control de Actas
5. Compromisos


DESARROLLO:

1. Se presenta el diagrama de fases de la dirección del proyecto. Se emplea un sistema de semáforo con textura para indicar el estado de avance de cada componente:
    a. Sistema semáforo:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Color	Descripción
	Rojo: No iniciado
	Amarillo: Con avances
	Verde: Terminado

b. Diagrama de fases de la dirección del proyecto a la fecha:

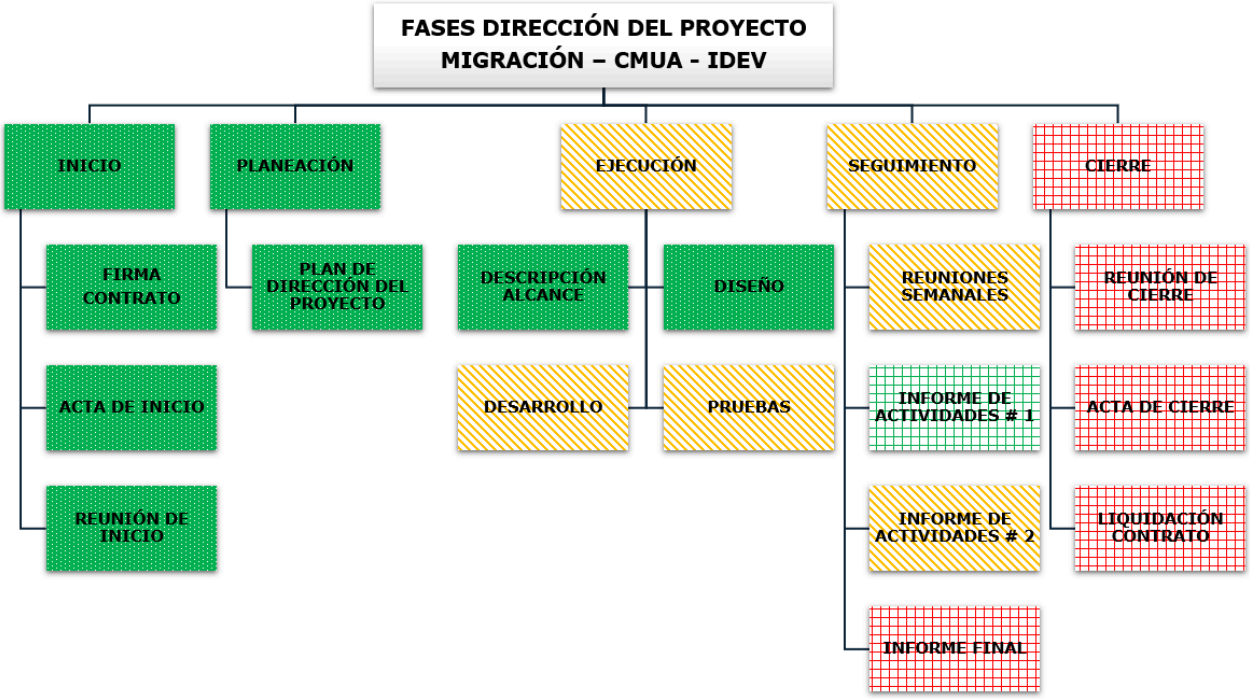


Conclusiones del avance:

- Se han aprobado al 100% las las fases de INICIO y PLANEACIÓN del proyecto.
- La Fase conceptual de la ejecución del proyecto tiene concluido al 100% los siguientes entregables:
    - La descripción del alcance de la migración.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

- El diseño de la unificación de la base de datos, la preparación de las máquinas y la estrategia de la migración de los servidores de bases de datos y aplicaciones.

2. Se presenta el avance de los entregables por medio de la Estructura de desagregación del trabajo (EDT) y empleando también, el sistema semáforo:

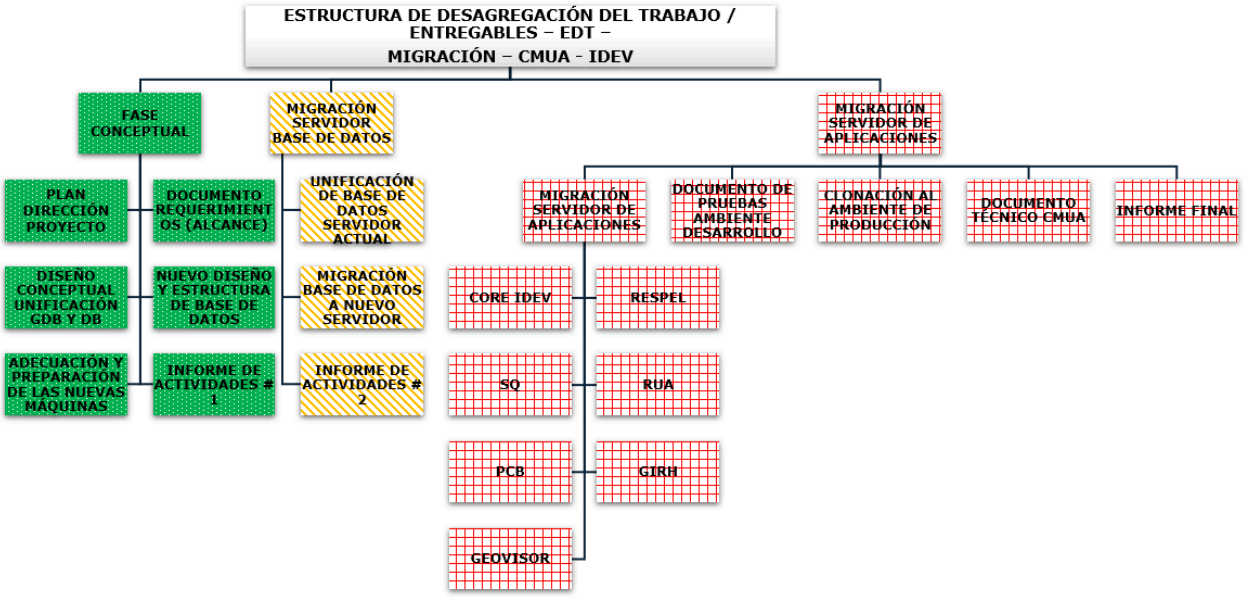

Conclusiones del avance:

- Se finalizaron al 100% los entregables de la fase conceptual, los cuales fueron revisados y aprobados por el equipo técnico y las personas de apoyo a la supervisión por parte del DAGMA.
- La migración del servidor de base de datos ya se ejecutó, en el momento se están realizando pruebas unitarias y consolidando las evidencias en el Documento técnico # 2.
- Se estima que la próxima semana se hará entrega del documento técnico # 2 para su revisión detallada por parte del equipo técnico del DAGMA.

3. Se socializa nuevamente la herramienta en Excel llamada “Control_Entregables_Proyecto-Migración-CMUA-DAGMA” para hacer seguimiento en el día a día de los entregables de todo el proyecto y su estado de avance y aprobación:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/154G7LVsC5i1E8KEzgsJvy7mt9l0iIydeK2dvgEf5zcs/edit?usp=drive_link

						Aprobaciones			
Hito	**#**	**Fase**	**Entregable**	**Fecha estimada Entrega**	**Versión Documento**	**Fabián**	**Claudia**	**Desarrolladores**	**Estado**
Primer pago	1	**Conceptual**	Plan de dirección del proyecto	12/09/2025	V2.0	OK	OK	N/A	APROBADO
	2	**Conceptual**	Documento de requerimientos	15/09/2025	V1.0	OK	OK	OK	APROBADO
	3	**Conceptual**	Diseño conceptual unificación de la base de datos: Modelo de datos y diccionario de datos.	15/09/2025	V2.0	OK	OK	OK	APROBADO
	4	**Conceptual**	Creación de nuevo diseño y estructura de base de datos en el nuevo servidor.	15/09/2025	V2.0	OK	OK	OK	APROBADO
	5	**Conceptual**	Adecuación y preparación de las máquinas entregadas por DATIC.	15/09/2025	V2.0	OK	OK	OK	APROBADO
	6	**Conceptual**	***Informe de actividades #1***	15/09/2025	V1.0	OK	OK	N/A	APROBADO
Segundo pago	7	**Base de datos**	Unificación de Base de datos en servidor actual (GDB y DB)	02/10/2025	V1.0				EN PROCESO
	8	**Base de datos**	Migración de base de datos unificada a nuevo servidor (Actualización del MER y Dicicionario)	09/10/2025	V1.0				EN PROCESO
	9	**Base de datos**	***Informe de actividades #2***	10/10/2025	V1.0				EN PROCESO
Tercer pago	10	**Aplicaciones**	Migración servidor de aplicaciones - IDEV y Aplicaciones: GIRH, RESPEL, RUA, PCB y Sustancias Químicas.	06/11/2025					NO INICIADO
	11	**Aplicaciones**	Documento de pruebas ambiente de desarrollo.	20/11/2025					NO INICIADO
	12	**Aplicaciones**	Migración a servidores del ambiente de producción.	27/11/2025					NO INICIADO
	13	**Aplicaciones**	Documento técnico de las nuevas conexiones e infraestructura del CMUA y sus pruebas de conexión entre los servidores de Desarrollo, Producción, APP de IDEV y ArcGIS - (Actualización del MER y Dicicionario)	04/12/2025					NO INICIADO
	14	**Aplicaciones**	***Informe de actividades Final.***	05/12/2025					NO INICIADO

43%

- En el momento ya se están trabajando en los entregables asociados al segundo pago, de los cuales los entregables # 7 y 8 se consolidarán en un solo documento: “Documento técnico # 2”.

4. Se presenta el control de Actas de las reuniones administrativas programadas para todo el proyecto:

Fecha	Acta #	Tipo Acta	Objetivo Reunión	Estado Acta	Estado Asistencia	PPT
8/09/2025	01	Inicio	Acta 01 - Reunión Inicio - Proyecto Migración CMUA - DAGMA	APROBADA	APROBADA	NA
11/09/2025	02	Seguimiento	Acta 02 - Reunión Seguimiento # 1 - Proyecto Migración CMUA - DAGMA	APROBADA	APROBADA	NA
16/09/2025	03	Entrega oficial	Acta 03 - Reunión de entregables fase conceptual	APROBADA	APROBADA	Carpeta de entregables / Control de entregables DAGMA
19/09/2025	04	Seguimiento	Acta 04 - Reunión Seguimiento # 2 - Proyecto Migración CMUA - DAGMA	EN PROCESO	EN PROCESO	Reunión Seguimiento # 02
25/09/2025	05	Seguimiento		NO INICIADO	NO INICIADO	
2/10/2025	06	Seguimiento		NO INICIADO	NO INICIADO	
9/10/2025	07	Seguimiento		NO INICIADO	NO INICIADO	
16/10/2025	08	Seguimiento		NO INICIADO	NO INICIADO	
23/10/2025	09	Seguimiento		NO INICIADO	NO INICIADO	
30/10/2025	10	Seguimiento		NO INICIADO	NO INICIADO	
6/11/2025	11	Seguimiento		NO INICIADO	NO INICIADO	
13/11/2025	12	Seguimiento		NO INICIADO	NO INICIADO	
20/11/2025	13	Seguimiento		NO INICIADO	NO INICIADO	
27/11/2025	14	Seguimiento		NO INICIADO	NO INICIADO	
4/12/2025	15	Seguimiento		NO INICIADO	NO INICIADO	
11/12/2025	16	Seguimiento		NO INICIADO	NO INICIADO	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

- Las reuniones administrativas programadas en la tabla anterior son para los hitos de inicio y cierre del proyecto, así como para las reuniones semanales de seguimiento y/o socialización de entregables oficiales.
- Hasta el momento se han realizado 4 reuniones:
  - La primera reunión con el objetivo de dar inicio y revisar insumos de la planeación del proyecto.
  - 2 Reuniones de seguimiento de avances semanales
  - 1 Reunión para la socialización oficial de los entregables de la primera fase del proyecto.
- Se aclara que la programación de las reuniones con los usuarios finales para ejecutar las pruebas del sistema se enviará dentro del documento de pruebas del ambiente de desarrollo.

5. Se revisaron las tareas y compromisos resultantes de reuniones anteriores y nuevas tareas solicitadas durante la semana:

COMPROMISOS:

Revisión de tareas y compromisos pendientes de la última acta y otros no incluidos:

Qué hacer?	Responsable	Fecha compromiso	Estado
Corregir documento técnico # 1 y generar la versión # 2.0	Juliana Toro	16/09/2025	OK
Generar la primera factura con fecha del 16 de Septiembre de 2025.	Juliana Toro	16/09/2025	OK
Listado de los usuarios que se van a asignar a las validaciones de cada uno de los equipos técnicos del DAGMA.	Claudia Escobar	25/09/2025	PROCESO
Subdominio público para el ambiente de desarrollo con certificado SSL (HTTPS	Fabián Chavarriaga	25/09/2025	PROCESO

- Se informa que la generación de la versión # 2.0 del documento técnico # 1 se realizó el 16 de septiembre posterior a la reunión de entrega teniendo en cuenta las correcciones solicitadas.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

- Se informa que la primera factura del proyecto se generó el 16 de septiembre con la aprobación de todos los entregables de la fase conceptual.
- Se recuerdan 2 compromisos aún pendientes por concluir:
    - Listado de usuarios para la ejecución de pruebas: Se posterga la fecha de entrega de este compromiso para la próxima reunión de seguimiento.
    - Subdominio público para el ambiente de desarrollo con certificado SSL (HTTPS): Del cual informa Leidy Penagos ya fue solicitado por medio de un orfeo a DATIC.

Link de grabación de la reunión:
https://drive.google.com/file/d/1ytaBu79k28rW3CNDJfIu-7LbHCip36oh/view

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones): N/A

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN

QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Listado de los usuarios que se van a asignar a las validaciones de cada uno de los equipos técnicos del DAGMA.	Claudia Escobar	25/09/2025 Pendiente
Solicitar a DATIC subdominio público para el ambiente de desarrollo con certificado SSL (HTTPS)	Fabián Chavarriaga	25/09/2025
Definir espacios de socialización para Dora y Jader con los desarrolladores de IDEV para explicar los procesos de migración.	Juliana Toro	25/09/2025
Crear nueva cita para las reuniones de seguimiento administradas por el DAGMA	Leidy Penagos	25/09/2025

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Firmas (responsables)



JULIANA TORO
Gerente de proyectos
IDEV SOFTWARE

CLAUDIA ESCOBAR
Tecnología informática
DAGMA

FABIÁN CHAVARRIAGA
Tecnología informática
DAGMA

LEIDY PENAGOS
Tecnología informática
DAGMA

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un (1) folio(s)

Elaboró: Juliana Toro - Gerente de proyectos IDEV SOFTWARE.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
