INFORME No. 007

NÚMERO DE CONTRATO: 001 DE 2025		**VALOR DEL CONTRATO:** $ 1.711.921.999.00	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLTAM S.A.S		PERSONA NATURAL [ ] PERSONA JURÍDICA [X]	
IDENTIFICACIÓN:	NIT: 900.674.214-6	CEDULA DE CIUDADANÍA: NO APLICA	
OBJETO DEL CONTRATO: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA CON BPIN 20243218000001			
FECHA DE INICIO: 17 de febrero de 2025		**FECHA DE VENCIMIENTO:** 16 de agosto de 2025	
PÓLIZA – GARANTÍA ÚNICA No.: 47-44-101029951 Seguros del Estado		**FECHA DE CONSTITUCIÓN**: 17-02-2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:** 17-01-2025
ADICIONES O PRÓRROGAS:		HASTA EL 50 % DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	EN EL TIEMPO:
CONVINIENTES		CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA – SOLTAM S.A.S.	
VALOR INICIAL		MIL SETECIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($1.711.921.999.00)	
PLAZO		CINCO (05) MESES.	
FECHA DE INICIO		17 DE FEBRERO DE 2025	
FECHA DE FINALIZACIÓN:		16 DE AGOSTO DE 2025	
FECHA DE SUSPENSION		14 DE JUNIO DE 2025	
FECHA DE REINICIO		14 DE JULIO DE 2025	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS: (Ley 1474 de 2011)

Administrativas:

1.1. Administrativas:

En virtud de las funciones de seguimiento y control concedidas en oficio con radicado 20250210330003033 como supervisor del contrato, se desarrolló actividades como:

Se realizo seguimiento a las diferentes actividades realizadas por el contratista enmarcado en la implementación del proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAGUAJIRA CON BPIN 20243218000001" durante el periodo comprendido del 01 de agosto hasta el 16 de agosto de 2025 dichas actividades fueron las siguiente, cabe resaltar que durante este mes solo se trabajaran 16 días calendario.

Durante este periodo el contratista reporta las siguientes actividades.

Acompañamiento a los talleres en los siguientes municipios:

Según las actividades realizadas por el contratista y avalada por la interventoría se informan las siguientes:

PERIODO DEL 01 AL 16 DE AGOSTO DE 2025.

En cumplimiento con los objetivos establecidos en el proyecto denominado: "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA" se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Realizar socialización del Proyecto.
- Implementar Plan de Medio y Divulgación
- Realizar Talleres de Cultura y Gestión Ambiental.
- Realizar Talleres de Sensibilización en las Instituciones Educativas.
- Instalar Puntos Ecológicos (Capacidad de 55 Lt).
- Realizar Murales.
- Fortalecer las Bibliotecas de Educación Ambiental

Realizar socialización del Proyecto.

En el marco del desarrollo del presente contrato se ha llevado a cabo la socialización del proyecto cuyo objeto es la: “IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA.”.

Teniendo en cuenta que la socialización de un proyecto a la comunidad y a las administraciones de cada municipio es de suma importancia, puesto que esto ayuda a que las actividades que se desarrollan o ejecutan en sus territorios se realicen de manera satisfactoria, involucrando a todas las partes, trabajando mancomunadamente para llevar a feliz término los objetivos establecidos, de igual manera el socializar con las dependencias de las alcaldías municipales ayuda a reforzar el proyecto, puesto que ellos son de gran ayuda a la hora a aportar la información pertinente para que la ejecución correcta de las actividades.

Para la ejecución de esta actividad se realizó una convocatoria previa, a los representantes o delegados de las dependencias en las que tiene influencia el presente proyecto tales como (secretaria de ambiente, planeación, educación y/o gobierno, referentes ambientales de los municipios, rectores de las instituciones educativas y comunidad en general).

Los municipios en donde se ha realizado la actividad son los siguientes:

▪ Maicao

▪ Albania

▪ Manaure

▪ Hatonuevo

▪ Riohacha

▪ Dibulla

▪ Uribía

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.

- **Municipio de Maicao, La Guajira**

El día 4 de agosto del 2025 a las 5:00 pm, se llevó a cabo en la Casa de la Cultura del municipio de Maicao, La Guajira, la socialización del proyecto denominado “IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA”, esta socialización conto con la participación de los

representantes de la secretaria de planeación, secretaria de educación, docentes de algunas instituciones educativas, supervisor e interventoría del contrato.

La socialización conto con una participación de 25 personas.

- **Municipio de Manaure, La Guajira**

El día 12 de agosto del 2025 a las 11:00 am, se llevó a cabo en la Casa de la Cultura en el municipio de Manaure, La Guajira, la socialización del proyecto denominado “IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA”, esta socialización conto con la participación de los representantes de la secretaria de planeación, secretaria de educación, docentes de algunas instituciones educativas, supervisor e interventoría del contrato.

La socialización conto con una participación de 28 personas.

- **Municipio de Hatonuevo, La Guajira**

El día 13 de agosto del 2025 a las 11:00 am, se llevó a cabo en la Auditorio de la Institucion Educativa del Carmen del Municipio Hatonuevo, La Guajira, la socialización del proyecto denominado “IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA”, esta socialización conto con la participación de los representantes de la secretaria de planeación, secretaria de educación, docentes de algunas instituciones educativas, supervisor e interventoría del contrato.

La socialización contó con una participación de 28 personas.

- **Municipio de Riohacha, La Guajira**

El día 14 de agosto del 2025 a las 11:00 am, se llevó a cabo en la Casa de la Cultura en el municipio de Riohacha, La Guajira, la socialización del proyecto denominado “IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA”, esta socialización conto con la participación de los representantes de la secretaria de planeación, secretaria de educación, docentes de algunas instituciones educativas, supervisor e interventoría del contrato.

La socialización contó con una participación de 28 personas.

- **Municipio de Dibulla, La Guajira**

El día 14 de agosto del 2025 a las 5:00 pm, se llevó a cabo en el Auditorio de la alcaldía del municipio de Dibulla, La Guajira, la socialización del proyecto denominado "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA", esta socialización conto con la participación de los representantes de la secretaria de planeación, secretaria de educación, docentes de algunas instituciones educativas, supervisor e interventoría del contrato.

La socialización contó con una participación de 28 personas.

- **Municipio de Uribía, La Guajira**

El día 15 de agosto del 2025 a las 11:00 am, se llevó a cabo en el Centro Cultural del municipio de Uribía, La Guajira, la socialización del proyecto denominado "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA", esta socialización contó con la participación de los representantes de la secretaria de planeación, secretaria de educación, docentes de algunas instituciones educativas, supervisor e interventoría del contrato.

La socialización conto con una participación de 28 personas.

Implementar un plan de medios y divulgación del proyecto.

Con el fin de que el proyecto tuviera un impacto significativo en la comunidad, en la ejecución de cada actividad programada, se realizó la divulgación para cada una de las actividades que se ejecutaban en su momento, mediante diferentes herramientas de divulgación masiva, tales como publicación en redes sociales, elaboración de flyers, cuñas radiales y redes sociales de las alcaldías; llegando así a todos los grupos poblacionales.

Cabe mencionar que se ha articulado con la oficina de comunicaciones de la corporación quien ha tenido un rol importante a la hora de la implementación de esta estrategia, puesto que ha sido la encargada de la publicación de las diferentes actividades en la página web de la corporación autónoma regional de La Guajira.

Así mismo se ha contado con el apoyo de las diferentes oficinas de comunicaciones de los municipios donde se ha realizado las actividades, generando un impacto positivo a la divulgación del presente proyecto, así mismo se ha articulado también con los medios de comunicaciones locales, logrando llevar el mensaje a todos los espacios posibles.

Para el inicio de la socialización del proyecto se elaboraron unos flyer publicitario, para invitación a la actividad.

Se anexa documento “Plan de Medios”, donde se relacionan el desarrollo y las evidencias de las estrategias implementadas en cada municipio.

Realizar Talleres de Gestión y Cultura Ambiental para la conservación de los recursos naturales.

Esta actividad tiene como objetivo dinamizar a lideres veedores, promotores ambientales, personal de instituciones públicas, que promuevan la importancia del medio ambiente y se vuelvan multiplicadores de este proceso.

De acuerdo con el presupuesto oficial del contrato en ejecución ha de realizarse 2 talleres por municipio intervenido, para un total de 30 talleres a realizar; por lo tanto, se ha programado la ejecución de 15 talleres entre los dos primeros meses y otros 15 talleres para el último mes de ejecución del contrato en cuestión.

Por tal motivo, para el sexto mes de desarrollo del presente proyecto comprendido desde el 1 al 16 de agosto del 2025, se ha programado la ejecución de 8 Talleres de Gestión y Cultura Ambiental para la Conservación de los Recursos Naturales.

Estos talleres constan de 4 temáticas fundamentales:

- Pedagogía del Ambiente.
- Manejo de Residuos Sólidos.
- Cambio Climático.
- Uso Eficiente y Ahorro del Agua y Energía.

Con una duración de 3 horas, para desarrollar las temáticas antes mencionadas. En la ejecución de los talleres se realizará la entrega de un (1) Kit de sensibilización ambiental a cada participante del evento, el cual contiene los siguientes elementos:

- Bolsa biodegradable.
- Lapicero ecológico
- Agenda
- Gorras con el nombre del programa de sensibilización.
- Cartilla con la información respectiva a las temáticas.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.

- **Municipio de Barrancas, La Guajira**

El día 1 de agosto de 2025, a las 8:00 am, se realizó el Taller de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales, en la Casa de la Cultura, del municipio de Barrancas, La Guajira con una asistencia de 98 participantes, entre los que se encontraban, docentes y/o rectores de las instituciones educativas, estudiantes, vigías ambientales, presidentes de junta de acción comunal, cuerpos de bombero, policía, representante de la empresa de aseo del municipio y comunidad en general.

- **Municipio Maicao, La Guajira**

El día 4 de agosto de 2025, a las 2:00 pm, se realizó el Taller de Gestión y Cultura Ambiental para la conservación de los recursos naturales, en la Casa de la Cultura, del municipio de Maicao, La Guajira con una asistencia de 106 participantes, entre los que se encontraban, docentes y/o rectores de las instituciones educativas, estudiantes, vigías ambientales, presidentes de junta de acción comunal, cuerpos de bombero, policía y comunidad en general.

- **Municipio de Albania, La Guajira**

El día 5 de agosto de 2025, a las 8:00 am, se realizó el Taller de Gestión y Cultura Ambiental para la conservación de los recursos naturales, en la Institución Educativa San Rafael del municipio de Albania, La Guajira con una asistencia de 126 participantes, entre los que se encontraban, docentes y/o rectores de las instituciones educativas, estudiantes, vigías ambientales, presidentes de junta de acción comunal, cuerpos de bombero, policía y comunidad en general.

- **Municipio de Manaure, La Guajira**

El día 12 de agosto de 2025, a las 8:00 am, se realizó el Taller de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales, en la Casa de Cultura, del municipio de Manaure, La Guajira con una asistencia de 84 participantes, entre los que se encontraban, docentes y/o rectores de las instituciones educativas, estudiantes, vigías ambientales, presidentes de junta de acción comunal, cuerpos de bombero, policía y comunidad en general.

- **Municipio de Hatonuevo, La Guajira**

El día 13 de agosto de 2025, a las 8:00 am, se realizó el Taller de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales, en la Auditorio de la Institucion Educativa del Carmen del municipio de Hatonuevo, La Guajira con una asistencia de 100 participantes, entre los que se encontraban, docentes y/o rectores de las instituciones educativas, estudiantes, vigías

ambientales, presidentes de junta de acción comunal, cuerpos de bombero, policía y comunidad en general.

- **Municipio de Riohacha, La Guajira**

El día 14 de agosto de 2025, a las 8:00 am, se realizó el Taller de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales, en la Casa de la Cultura del municipio de Riohacha, La Guajira con una asistencia de 76 participantes, entre los que se encontraban, docentes y/o rectores de las instituciones educativas, estudiantes, vigías ambientales, presidentes de junta de acción comunal, asociación de cabildo indígena y comunidad en general.

- **Municipio de Dibulla, La Guajira**

El día 14 de agosto de 2025, a las 2:00 pm, se realizó el Taller de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales, en el Auditorio de la alcaldía del municipio de Dibulla, La Guajira con una asistencia de 100 participantes, entre los que se encontraban, docentes y/o rectores de las instituciones educativas, estudiantes, vigías ambientales, presidentes de junta de acción comunal, cuerpos de bombero, policía y comunidad en general.

- **Municipio de Uribia, La Guajira**

El día 15 de agosto de 2025, a las 8:00 am, se realizó el Taller de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales, en el Centro Cultural del municipio de Uribia, La Guajira con una asistencia de 112 participantes, entre los que se encontraban, docentes y/o rectores de las instituciones educativas, estudiantes, vigías ambientales, presidentes de junta de acción comunal, cuerpos de bombero, policía y comunidad en general.

Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales.

Se realizó la entrega de Kit´s de sensibilización ambiental el cual contenía los siguientes elementos:

▪ Gorra marcada con eslogan.
▪ Agenda ecológica
▪ Cartilla con contenido relacionado a las temáticas tratadas.
▪ Lapicero ecológico
▪ Bolsa biodegradable.

Estos Kits fueron entregados a cada uno de los asistentes a los talleres de Gestión y Cultura

Ambiental.

MUNICIPIO	FECHA – 2do TALLER	No. DE ASISTENTES	KIT´S ENTEGADOS
Barrancas	1 de agosto	98	92
Maicao	4 de agosto	110	106
Albania	5 de agosto	126	106
Manaure	12 de agosto	84	84
Hatonuevo	13 de agosto	100	100
Riohacha	14 de agosto	76	60
Dibulla	14 de agosto	100	100
Uribia	15 de agosto	112	95
Total		**806**	**743**

En este periodo comprendido desde 1 de agosto hasta el 16 de agosto de 2025, se entregaron 743 KITS a los asistentes de los talleres.

Hasta la fecha de entrega del presente informe, se relaciona la entrega de 3075 KITS de sensibilización ambiental.

A partir de los datos presentados en la tabla anterior, se sintetiza que con el desarrollo del proyecto se alcanzó la meta de capacitar a 3.000 personas a través del taller de gestión y cultura orientado a la conservación de los recursos naturales.

6.1.2.3 Realizar Talleres de Gestión y Cultura Ambiental para la conservación de los recursos naturales.

Esta actividad tiene como objetivo dinamizar a líderes veedores, promotores ambientales, personal de instituciones públicas, que promuevan la importancia del medio ambiente y se vuelvan multiplicadores de este proceso. De acuerdo con el presupuesto oficial del contrato en ejecución ha de realizarse 2 talleres por municipio intervenido, para un total de 30 talleres a realizar; por lo tanto, se ha programado la ejecución de 15 talleres entre los dos primeros meses y otros 15 talleres para el último mes de ejecución del contrato en cuestión.

Por tal motivo, para el quinto mes de desarrollo del presente proyecto comprendido desde el 14 al 31 de julio del 2025, se ha programado la ejecución de 10 Talleres de Gestión y Cultura Ambiental para la Conservación de los Recursos Naturales.

Realizar Talleres de Sensibilización en las Instituciones Educativas.

Para la ejecución de esta actividad, se realizará una capacitación por institución educativa sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos y separación en la fuente en donde se harán la instalación de los puntos ecológicos, por consiguiente, se llevará a cabo un total de 181 capacitaciones.

Es necesario capacitar al personal administrativo, al cuerpo estudiantil y cuerpo docente de estas instituciones educativas para que hagan buen uso de los insumos suministrados, que en este caso serán los puntos ecológicos, puesto que la finalidad de esta actividad es disminuir la contaminación a causa del mal manejo de los residuos sólidos, así mismo se pretende aprovechar al máximo los residuos sólidos aprovechables, contribuyendo a la economía circular mediante el reciclaje de estos productos.

Los temas tratados en estos talleres son los siguientes:

▪ Separación en la Fuente.
▪ Que es un residuo solido
▪ Clasificación de los residuos sólidos.
▪ Nuevo código de colores.
▪ Manejo de los residuos sólidos Aprovechables y no Aprovechables.

Para el sexto mes de desarrollo del presente proyecto comprendido entre el 1 al 16 de agosto del 2025, se ha programado la ejecución de 36 talleres sensibilización en las Instituciones Educativas en relación con los procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente; de los 181 programados en el presupuesto oficial del proyecto en cuestión.

Los municipios en donde se ha realizado la actividad son los siguientes:

▪ Dibulla
▪ Maicao
▪ Manaure
▪ Riohacha
▪ Uribía

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

- **Municipio de Dibulla, La Guajira**

Se realizó el Taller denominado Sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación

en la fuente, en las Instituciones Educativas públicas ubicadas en la cabecera municipal y corregimiento del municipio de Dibulla, La Guajira, seleccionadas para la ejecución de la actividad.

Las instituciones sensibilizadas en el municipio fueron las siguientes:

Municipio De Dibulla						
I.E Sensibilizada	**Zona**	**Dirección**	**Rector (A)**	**Fecha De Ejecución**	**Hora Inicial**	**Hora Final**
Institución Etnoeducativo Indígena Kogi	Rural	Sierra Nevada	Silvestre Gil Sarabata	8 De agosto	7:00:00 a. m.	8:30:00 a. m.
Institucion Educativa Nuestra Señora Del Pilar	Urbana	Calle 8 No 8 36 (Dibulla)	Enrique Orozco	8 De agosto	10:00:00 a. m.	11:30:00 a. m.

- **Municipio de Maicao, La Guajira**

Se realizó el Taller denominado Sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente, en las Instituciones Educativas públicas ubicadas en la cabecera municipal y corregimiento del municipio de Maicao, La Guajira, seleccionadas para la ejecución de la actividad.

Las instituciones sensibilizadas en el municipio fueron las siguientes:

Municipio De Maicao						
I.E Sensibilizada	**Zona**	**Dirección**	**Rector (A)**	**Fecha de Ejecución**	**Hora Inicial**	**Hora Final**
IEI No 8	Rural	-	Dagoberto Pana	1 De agosto	7:00:00 a. m.	8:30:00 a. m.
IEI No 6	Rural	-	Nellys Pushaina	1 De agosto	9:00:00 a. m.	10:30:00 a. m.
IEI No 2	Rural	-	Vicenta Arpuchaina	1 De agosto	11:10:00 a. m.	12:50:00 p. m.
I.E.I #5	Rural	-	Yenis Fernandez	4 De agosto	7:00:00 a. m.	8:30:00 a. m.
I.E.I #13	Rural	-	Diana Fernandez	4 De agosto	9:10:00 a. m.	10:40:00 a. m.
I.E.I. #11	Rural	-	Hayeth Palacio	4 De agosto	11:20:00 a. m.	12:50:00 p. m.
CEI #2 (I.E.I. #9)	Rural	-	Benilda Urbay	5 De agosto	10:00:00 a. m.	11:30:00 a. m.
CEI No 3 - IEI 7	Rural	-	Ana Arinda Iguaran	14 De agosto	12:00:00 p. m.	1:30:00 p. m.

- **Municipio de Manaure, La Guajira**

Se realizó el Taller denominado Sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente, en las Instituciones Educativas públicas ubicadas en la cabecera municipal y corregimiento del municipio de Manaure, La Guajira, seleccionadas para la ejecución de la

actividad.

Las instituciones sensibilizadas en el municipio fueron las siguientes:

Municipio De Manaure						
I.E Sensibilizada	**Zona**	**Dirección**	**Rector (A)**	**Fecha De Ejecución**	**Hora Inicial**	**Hora Final**
Institución Etnoducativo Rural La Paz	Rural	Km 40 Vía Riohacha Maicao	Gabina Maria Berty Arevalo	15 De agosto	6:00:00 A. M.	7:30:00 A. M.
Centro Etnoeducativo Rural Anoui	Rural	-	Nayelis Maribeth Avellaneda Chavez	15 De agosto	8:10:00 A. M.	9:40:00 A. M.
C.E. Kalatanshumana	Rural	Cgto De La Paz	Reyes Maria Lindao Uriana	15 De agosto	9:50:00 A. M.	11:20:00 A. M.
Centro Etnoeducativo Ashajaa Akuaipa	Rural	-	-	15 De agosto	12:00:00 P. M.	1:30:00 P. M.

- **Municipio de Riohacha, La Guajira**

Se realizó el Taller denominado Sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente, en las Instituciones Educativas públicas ubicadas en la cabecera municipal y corregimiento del municipio de Riohacha, La Guajira, seleccionadas para la ejecución de la actividad.

Las instituciones sensibilizadas en el municipio fueron las siguientes:

Municipio De Riohacha						
I.E Sensibilizada	**Zona**	**Dirección**	**Rector (A)**	**Fecha De Ejecución**	**Hora Inicial**	**Hora Final**
Institucion Educativa Técnica Rural Agricola De Tomarrazon	Rural	Tomarrazon	Dencil Jose Barros Solano	6 De agosto	7:20:00 a. m.	9:01:00 a. m.
Centro Etnoducativo Nº 13	Rural	Km 17 Vía A Maicao	Rosmery Camargo	6 De agosto	9:30:00 a. m.	11:00:00 a. m.
Centro Etnoeducativo Indígena #16	Rural	Resguardo Una' Aputchon	Nayibe Bonivento	7 De agosto	7:59:00 a. m.	9:28:00 a. m.
Institucion Educativa Sagrada Familia De Nazaret	Rural	Cl. 14e #46-2	-	8 De agosto	7:01:00 a. m.	8:32:00 a. m.
Institucion Educativa Sagrada Familia	Rural	Kra 6 # 1-21	Maria Eugenia Frias Solano	14 De agosto	7:00:00 a. m.	8:30:00 a. m.

- **Municipio de Uribia, La Guajira**

Se realizó el Taller denominado Sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente, en las Instituciones Educativas públicas ubicadas en la cabecera municipal y

corregimiento del municipio de Uribia, La Guajira, seleccionadas para la ejecución de la actividad.

Las instituciones sensibilizadas en el municipio fueron las siguientes:

Municipio De Uribia						
I.E Sensibilizada	**Zona**	**Dirección**	**Rector (A)**	**Fecha De Ejecución**	**Hora Inicial**	**Hora Final**
Centro Etnoeducativo Integral Rural Puay	Rural	Puay	-	11 De Agosto	6:30:00 A. M.	8:00:00 A. M.
Centro Etnoeducativo Integral Rural Jurura	Rural	Katanamana	-	11 De Agosto	8:30:00 A. M.	10:00:00 A. M.
Centro Etnoeducativo Integral Rural Uru	Rural	Uru	-	11 De Agosto	10:40:00 A. M.	12:10:00 P. M.
Centro Etnoeducativo Integral Rural Katanamana	Rural	Jurura	-	11 De Agosto	1:40:00 P. M.	3:10:00 P. M.
I.E. Etnoeducativa Internado Indigena De Kamushiwou (I. El Eden)	Rural	Rancheria Cerro De La Teta	-	12 De Agosto	6:30:00 A. M.	8:00:00 A. M.
Centro Etnoeducativo Integral Rural Puerto Nuevo	Rural	Jawou	-	12 De Agosto	8:30:00 A. M.	10:00:00 A. M.
Centro Etnoeducativo Integral Rural Flor De Patajatamana	Rural	Rancheria Media Luna	-	12 De Agosto	10:45:00 A. M.	12:15:00 P. M.
Centro Etnoeducativo Integral No.5 Bahia Hondita	Rural	Puerto Nuevo	-	12 De Agosto	1:00:00 P. M.	2:30:00 P. M.
Centro Etnoeducativo Integral Rural Villa Fatima	Rural	Patajatamana	-	12 De Agosto	3:20:00 P. M.	4:50:00 P. M.
Institución Etnoeducativa Integral Rural Puerto Estrella	Rural	Rancheria Bahia Hondita-Alta Guajira	-	13 De Agosto	6:30:00 A. M.	8:00:00 A. M.
Centro Etnoeducativo Integral Rural Nuestra Seðora De Fatima De Nazareth	Rural	Kasutalain	-	13 De Agosto	9:00:00 A. M.	10:30:00 A. M.

Municipio De Uribia						
I.E Sensibilizada	**Zona**	**Dirección**	**Rector (A)**	**Fecha De Ejecución**	**Hora Inicial**	**Hora Final**
Institución Etnoeducativa Rural Internado De Nazareth	Rural	Cgto De Nazareth-Alta Guajira	-	13 De agosto	10:35:00 A. M.	12:05:00 P. M.
Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado De Siapana	Rural	Rancheria Villa Fatima	-	13 De agosto	2:05:00 P. M.	3:35:00 P. M.
Centro Etnoeducativo Integral No.4 Flor Del Paraiso	Rural	Cgto De Nazareth-Alta Guajira	-	14 De agosto	6:30:00 A. M.	8:00:00 A. M.
Centro Etnoeducativo Integral No.3 Cerro De La Teta	Rural	Cgto De Puerto Estrella-Alta Guajira	-	14 De agosto	10:00:00 A. M.	11:30:00 A. M.
Centro Etnoeducativo Integral Rural Media Luna- Jawou	Rural	Cgto De Siapana-Alta Guajira	-	14 De agosto	2:30:00 P. M.	4:00:00 P. M.
Centro Etnoeducativo Integral Rural Kasutalain	Rural	Rancheria Flor Del Paraiso	-	15 De agosto	10:30:00 A. M.	12:00:00 P. M.

En este periodo se han sensibilizado 17 Instituciones para el cumplimiento de las 22 Instituciones Educativas públicas objeto de intervención, en la cabecera municipal y en el corregimiento del municipio, seleccionadas para la implementación de esta actividad, ejecutando un 100% de la actividad en el municipio.

MUNICIPIO	NO. INSTITUCIONES SENSIBILIZACIONES
Dibulla	2
Maicao	8
Manaure	4
Riohacha	5
Uribia	17
TOTAL	**36**

Instalar Puntos Ecológicos (Capacidad de 55 Lt).

Esta actividad se realiza con el objetivo de facilitar la separación de los residuos sólidos, para ello se realizará la instalación de trescientos sesenta y dos (362) Puntos Ecológicos. Estos se distribuirán en una entrega con dos puntos ecológicos por cada una de las 181 Institución Educativa objeto de intervención.

Cumpliendo con lo establecido en el documento técnico del proyecto en cuestión, a las instituciones educativas sensibilizadas se les realizó la entrega de 2 puntos ecológicos, cuya actividad se encuentra de la mano con la actividad 2.1.

La entrega se realizó a los diferentes entes administrativos de las instituciones intervenidas, quienes una vez entregado los puntos ecológicos serán los responsables del cuidado y uso

adecuado de estos insumos.

Teniendo en cuenta lo anterior, en este periodo se han entregado un total de 48 puntos ecológicos relacionados así:

Puntos Ecológicos Entregados		
Municipio	**Institución Educativa**	**Cantidad**
Dibulla	Institución Etnoeducativo Indigena Kogi	2
	Institucion Educativa Nuestra Señora Del Pilar	2
Maicao	IEI No 8	2
	IEI No 6	2
	IEI No 2	2
	I.E.I #5	2
	I.E.I #13	2
	I.E.I. #11	2
	Cei #2 (I.E.I. #9)	2
	Cei No 3 - Iei 7	2
Manaure	Centro Etnoeducativo Rural Anoui	2
	Centro Etnoeducativo Ashajaa Akuaipa	2
	Institución Etnoducativo Rural La Paz	2
	C.E. Kalatanshumana	2
Riohacha	Institucion Educativa Tecnica Rural Agricola De Tomarrazon	2
	Centro Etnoducativo Nº 13	2
	Centro Etnoeducativo Indigena #16	2
	Institucion Educativa Sagrada Familia De Nazaret	2
	Institucion Educativa Sagrada Familia	2
Uribia	Centro Etnoeducativo Integral Rural Puay	2
	Centro Etnoeducativo Integral Rural Katanamana	2
	Centro Etnoeducativo Integral Rural Uru	2
	Centro Etnoeducativo Integral Rural Jurura	2
	Centro Etnoeducativo Integral No.3 Cerro De La Teta	2
	Centro Etnoeducativo Integral Rural Media Luna- Jawou	2
	I.E. Etnoeducativa Internado Indigena De Kamushiwou	2
	Centro Etnoeducativo Integral Rural Puerto Nuevo	2
	Centro Etnoeducativo Integral Rural Flor De Patajatamana	2
	Centro Etnoeducativo Integral No.5 Bahia Hondita	2
	Centro Etnoeducativo Integral Rural Kasutalain	2
	Centro Etnoeducativo Integral Rural Nuestra Seðora De Fatima De Nazareth	2
	Centro Etnoeducativo Integral Rural Villa Fatima	2
	Institución Etnoeducativa Rural Internado De Nazareth	2
	Institución Etnoeducativa Integral Rural Puerto Estrella	2
	Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado De Siapana	2
	Centro Etnoeducativo Integral No.4 Flor Del Paraiso	**2**
TOTAL		**72**

La instalación de los puntos ecológicos consistió en el transporte hacia la Institución Educativa, armado del punto ecológico, entrega al representante de la Institución Educativa y ubicación en el punto ecológico.

Asimismo, en el momento de la entrega al responsable designado por la institución educativa y al personal presente, se le realiza una charla orientativa en la que se explica el uso y manejo adecuado de los puntos ecológicos, con el fin de garantizar la correcta separación de los residuos

sólidos en la práctica.

Ilustrar la conservación de los recursos naturales en sitios específicos de las instituciones públicas del departamento de La Guajira.

Para la ejecución de esta actividad se realizarán 15 murales alusivos a la protección del ambiente, uno en cada municipio a intervenir, por ello se debe definió en cada municipio un punto estratégico para la elaboración e implementación de esta actividad.

En el sexto mes de ejecución, la Actividad de 2.3 Ilustrar la conservación de los recursos naturales en sitios específicos de las instituciones públicas del departamento de La Guajira, se superó las expectativas; puesto que se programaron y se completaron satisfactoriamente la ejecución de 2 murales, lo que representa un cumplimiento del 100% en esta actividad.

Asimismo, este informe se presenta la ejecución del mural en el municipio de Albania, realizado durante el periodo correspondiente al Informe No. 6. Sin embargo, debido a circunstancias externas al proyecto, la evidencia no pudo ser recolectada oportunamente, lo que impidió su inclusión en dicho informe para su presentación y reporte.

Murales realizados.

▪ Municipio de Albania

Registro fotográfico Mural realizado en el Municipio de Albania	
	
Antes	Después

▪ Municipio Hatonuevo

Registro fotográfico Mural realizado en el Municipio Hatonuevo	
	
Antes	Después

- **Municipio de Uribia**

Registro fotográfico Mural realizado en el Municipio de Uribia


- **Fortalecer las Bibliotecas de Educación Ambiental.**

Con el fin de promover la educación ambiental en los diferentes municipios del departamento de La Guajira, se realizó la entrega de un libro con temática ambiental, destinados a enriquecer y fortalecer las bibliotecas en las instituciones educativas públicas del departamento seleccionadas para la implementación de este proyecto, buscando preparar y motivar a los estudiantes a participar activamente en la gestión ambiental y el desarrollo sostenible de su región. A continuación, se relaciona el contenido del libro entregado.

Tabla 32. Libros entregados – Periodo 7

Municipio	Institución Educativa	Zona	Cantidad
Dibulla	Institución Etnoeducativo Indígena Kogi	Rural	5
	Institucion Educativa Nuestra Señora del Pilar	Urbana	11
Maicao	IEI No 8	Rural	5
	IEI No 6	Rural	5
	IEI No 2	Rural	5
	I.E.I #5	Rural	5
	I.E.I #13	Rural	5
	I.E.I. #11	Rural	5
	Cei #2 (I.E.I. #9)	Rural	5
	Cei No 3 - IEI 7	Rural	5
Manaure	Centro Etnoeducativo Rural Anoui	Rural	5
	Centro Etnoeducativo Ashajaa Akuaipa	Rural	5
	Institución Etnoducativo Rural La Paz	Rural	5
	C.E. Kalatanshumana	Rural	5
Riohacha	Institucion Educativa Tecnica Rural Agricola de Tomarrazon	Rural	5
	Centro Etnoducativo N° 13	Rural	5
	Centro Etnoeducativo Indigena #16	Rural	5
	Institucion Educativa Sagrada Familia De Nazaret	Urbana	11
	Institucion Educativa Sagrada Familia	Urbana	11
Uribia	Centro Etnoeducativo Integral Rural Puay	Rural	5
	Centro Etnoeducativo Integral Rural Katanamana	Rural	5
	Centro Etnoeducativo Integral Rural Uru	Rural	5
	Centro Etnoeducativo Integral Rural Jurura	Rural	5
	Centro Etnoeducativo Integral No.3 Cerro De La Teta	Rural	5
	Centro Etnoeducativo Integral Rural Media Luna-Jawou	Rural	5
	I.E. Etnoeducativa Internado Indígena De Kamushiwou	Rural	5
	Centro Etnoeducativo Integral Rural Puerto Nuevo	Rural	5
	Centro Etnoeducativo Integral Rural Flor De Patajatamana	Rural	5
	Centro Etnoeducativo Integral No.5 Bahia Hondita	Rural	5
	Centro Etnoeducativo Integral Rural Kasutalain	Rural	5
	Centro Etnoeducativo Integral Rural Nuestra Señora De Fatima De Nazareth	Rural	5
	Centro Etnoeducativo Integral Rural Villa Fatima	Rural	5
	Institución Etnoeducativa Rural Internado De Nazareth	Rural	5
	Institución Etnoeducativa Integral Rural Puerto Estrella	Rural	5
	Institución Etnoeducativa Integral Rural Internado De Siapana	Rural	5
	Centro Etnoeducativo Integral No.4 Flor Del Paraiso	Rural	5
Total			198

1.2. Técnicas

1.2.1. Localización

Las sedes de realización del proyecto serán las 181 instituciones educativas de carácter público que se encuentran distribuidos en los 15 municipios del departamento de La Guajira:

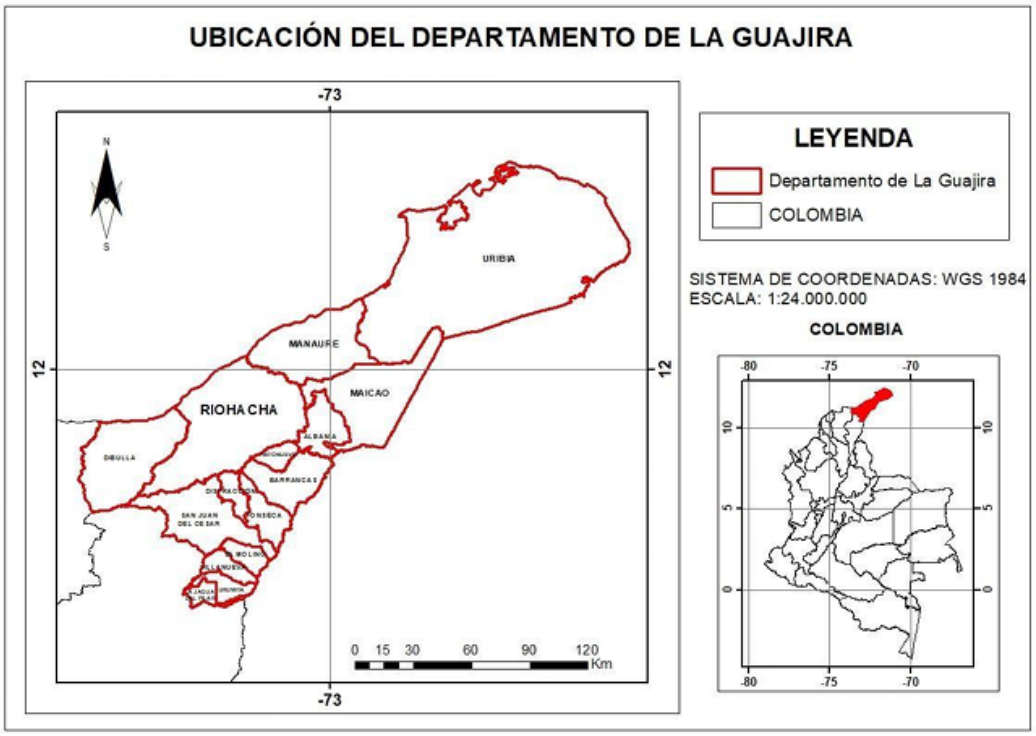


ILUSTRACIÓN 1. LOCALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

1.2.2. Estado Actual Del Contrato.

Se Anexa tabla de avance del mes que va desde el 14 al 21 de junio de 2025

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

CONTRATO: PS-001-2025		IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA.	FECHA
CONTRATISTA: SOLTAM S.A.S			16/08/2025
INTERVENTORÍA: ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ			

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCION	CANT REQUERIDA	VR UNIT.	VR TOTAL	CANT. EJECUTADA	VR EJECUTADO	%
1	Mejorar acciones de cultura ambiental en las escuelas públicas del Departamento de La Guajira.						
1,1	Realizar socialización del Proyecto	30	$ 1.267.458,33	$ 38.023.750,00	30	$38.023.750,00	100,00%
1,2	Implementar un plan de medios y divulgación del proyecto	1	$ 27.239.100,00	$ 27.239.100,00	1	$27.239.100,00	100,00%
1,3	Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales.	30	$ 15.655.306,00	$ 469.659.180,00	30	$469.659.180,00	100,00%
2	Fortalecer los procesos de participación comunitaria en la Gestión Ambiental del departamento de La Guajira.						
2,1	Realizar talleres de sensibilización en las instituciones Educativas.	181	$ 1.123.384,42	$ 203.332.580,00	181	$203.332.580,00	100,00%
2,2	Instalar puntos ecológicos (capacidad de 55lt) .	362	$ 1.871.068,82	$ 677.326.912,00	362	$677.326.912,00	100,00%
2,3	Ilustrar la conservación de los recursos naturales en sitios específicos de las instituciones públicas del departamento de La Guajira	15	$ 6.203.656,40	$ 93.054.846,00	15	$93.054.846,00	100,00%
2,4	Fortalecer las bibliotecas de Educación Ambiental en el Departamento de La Guajira	1475	$ 137.820,77	$ 203.285.631,00	1475	$203.285.631,00	100,00%
	TOTAL COSTOS			$ 1.711.921.999,0		$1.711.921.999,0	100,00%
	PORCENTAJE DE AVANCE						100,00%

Financiera – Presupuestal (conciliación cifras del contrato)

El pago de la suma estipulada en este Contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 5425 del 15 de enero de 2025, Identificación Presupuestal No. 00AD-3208-0900-2024-321800-0001 a, solicitud del Profesional Especializado de Presupuesto de Corpoguajira.

Balance general

Actualmente se lleva de manera detallada un balance presupuestal que garantiza un control del recurso presupuestado, dentro del seguimiento financiero se tiene en cuenta el presupuesto inicial como base para el control de costos quedando el siguiente balance general.

VALOR APORTE DE CORPOGUAJIRA	$ 1.711.921.999,00	
VALOR CONTRAPARTIDA	0	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 1.711.921.999,00	
VALOR ANTICIPO		$ 855.960.999,50
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		$ 1.034.265.668,00
VALOR PRESENTE PAGO		$ 677.656.331,00
MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO		$ 338.828.165,50
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$ 338.828.165,50
SALDO DEL CONTRATO, POR EJECUTAR		0
SUMAS IGUALES	**$ 1.711.921.999,00**	**$ 1.711.921.999,00**

Aportes Parafiscales: Queda pendiente la entrega de los soportes parafiscales correspondiente al mes de agosto de 2025.

INDICADOR DE EFICACIA: El contratista realizo las actividades según lo programado en el cronograma establecido y los recursos asignado para tales actividades.

EVALUACIÓN O RE-EVALUACIÓN AL PROVEEDOR

CERTIFICACIÓN.

Como supervisor del Contrato **N.º 001 de 2025.**
Certifico que, evaluado el desempeño del contratista o proveedor para el periodo comprendido desde el 01 **de agosto del 2025 hasta 16 de agosto del 2025**, obtuvo los puntajes que se detallan a continuación:

Nombre del Proveedor: SOLTAM S.A.S					
Contrato u Orden de Compra: 001 del 2025					
Factura Nº					
Fecha de Seguimiento: 14 de agosto de 2025					
CRITERIOS NECESARIOS	**PORCENTAJE**				**CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL PERIODO**
• Cumplimiento del objeto del contrato	**10**				9
• Calidad del producto/servicio (especificaciones/obligaciones)	**30**				29
• Cumplimiento en tiempo de entrega del bien, obra o para la prestación del servicio	**20**				19
• Personal idóneo	**20**				20
• Valor Agregado	**10**				9
• Atención a reclamaciones o sugerencias y/o sugerencias	**10**				9
• Proveedor cumple con criterios:	**SI**		**NO**	X	
SUMATORIA CALIFICACIÓN:					95

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
Como supervisor del Contrato Nº 001 de 2025.

Certifico que las actividades asignadas al contratista hasta la fecha se han ejecuto a satisfacción, estando al día con las actividades del mes de julio.

Por estas razones se proceda a informar sobre el cumplimiento responsable tanto técnica como financiera durante la implementación de las actividades que van desde el día 01 **de agosto del 2025 hasta 16 de agosto del 2025** del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 001 DE 2025 PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA. Actividades realizadas por la empresa SOLTAM S.A.S. identificada con el Nit. 900.674.214-6 representada legalmente por LUZ ESTHER GALIANO GUTIERREZ identificado con la C.C. No. 1.065.819.588 de Valledupar, el cual dio inicio el día 17 de febrero de 2025.

FIRMA



Hector Suaza Pimienta
SUPERVISOR
(PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRUPO DE EDUCACION AMBIENTAL)
FECHA DEL INFORME: 10 de octubre de 2025
