TEMA:	Seguimiento semanal Contrato Atenea 380-2025
PROCESO:	Talento Capital Formación - Jóvenes con Oportunidades

FECHA:	**06/08/2025**	**Hora Inicio**	**08:30**
		Hora Final	**10:00**

1. ORDEN DEL DÍA:

1.1. Avance cronograma proyecto.
1.2. Avance formación (Desarrollo proceso de formación, avance actividades de seguimiento y permanencia, etc).
1.3. Avance actividades de conexión con el sector real.
1.4. Proposiciones y Varios.

2. DESARROLLO:

Se da inicio a la reunión con la intervención del equipo Kuepa dando contexto sobre el oficio que se emitió con fecha a 5 de agosto, con los resultados de la jornada de recuperación y la finalización de la formación. Allí se reflejan los retos que se tienen a la fecha.

Avance Cronograma:

Avance Cronograma

Etapa	Inicio	Fin	Avance Promedio
Alistamiento	21/03/25	11/07/25	100%
Cierre	04/08/25	10/10/25	0%
Estrategia de comunicación	12/04/25	31/10/25	87%
Formación	17/04/25	03/08/25	71%
Formalización y matrícula	21/03/25	13/06/25	100%
Seguimiento actividades de acompañamiento y permanencia	12/04/25	03/08/25	100%
Seguimiento cumplimiento de tasas	14/05/25	30/09/25	72%
Seguimiento monitoreo y control	21/03/25	31/10/25	69%
Seguimiento de las actividades con el sector real	13/05/25	11/10/25	90%
Total general	**21/03/25**	**31/10/25**	**80%**

PUBLICA

El equipo Kuepa presentó los resultados de la estrategia de recuperación de clases, destacando que de 622 personas en formación, solo 402 lograron una asistencia mayor al 70%, y manifiesta la preocupación por el impacto económico y la necesidad de nuevas estrategias para reducir la deserción. Se explica que de 193 personas invitadas a la estrategia de recuperación, 104 estudiantes lograron recuperar y finalizar su proceso de formación, quedando listos para iniciar el entrenamiento para la certificación de industria. Sin embargo, este número está por debajo de lo esperado, lo que afecta la proyección de cierre.

Se detalló que solo 402 de 544 cupos asignados lograron la aprobación con asistencia mayor al 70%, lo que implica una pérdida económica significativa para la organización, ya que no podrán presentar cerca de 150 participantes para el pago correspondiente. Y se socializan las principales razones identificadas para la inasistencia incluyendo conflictos de horarios laborales, falta de acceso a Internet, responsabilidades de cuidado familiar y problemas de comunicación, lo que dificulta la participación sincrónica de algunos estudiantes.

El equipo de Atenea aclaró que aún no conoce el oficio sin embargo en el marco de la supervisión del contrato y entendiendo las necesidades de entendimiento entre las partes habilita este espacio, aclarando que los riesgos de deserción han sido conocidos desde el inicio de la operación y desde la presentación de la propuesta por parte del operador y que hace parte de la naturaleza de los ciclos cortos de formación sobre todo en este tipo de modalidad por los retos que implica lo sincrónico.

En este mismo sentido se aclara desde el equipo de Atenea no existe restricción para implementar estrategias asincrónicas y que la fórmula de aprobación permite combinar componentes sincrónicos y asincrónicos, siempre que se documente adecuadamente, toda vez que el objetivo principal es lograr que la mayoría de los participantes reciban el beneficio de la formación. Por lo tanto, y según lo establecido son 120 horas de formación, de las cuales se maneja la fórmula con la modalidad sincrónica y asincrónica. Se invita a implementar esa estrategia de una vez para motivar a los estudiantes y que puedan finalizar.

El equipo Atenea solicita de acuerdo a esto que:

- **Acompañamiento:** Habilitar los canales y espacios tipo tutorias para apoyar el proceso de generación de conocimiento reforzando las temáticas que los estudiantes abordaran. Se sugiere una mesa de ayuda abierta a las necesidades de la población.
- **Documentación de la estrategia:** Se enfatizó la importancia de documentar detalladamente las estrategias implementadas, especialmente para justificar la validez de actividades asincrónicas ante posibles auditorías o revisiones de entes de control.
- **Enfoque en Participantes Cercanos al Cumplimiento:** Se recomendó priorizar esfuerzos en los estudiantes que están más cerca de cumplir el 70% de avance, para

maximizar los resultados y optimizar recursos, sin dejar de atender al resto de los participantes.

- **Alineación y Comunicación Interna:** Se acordó que el equipo técnico de Atenea revisará y dará el visto bueno a las estrategias propuestas, asegurando que todo el equipo esté alineado y que las acciones sean coherentes con los lineamientos técnicos.

Kuepa solicitó la extensión del plazo para la estrategia de recuperación debido a la dificultad del día festivo que se aproxima, a lo que el equipo de Atenea explicó las limitaciones por compromisos de entrega de bases de datos finales, proponiendo una posible ampliación hasta el 13 o 14 de agosto y dejando como compromiso hacer una revisión y consulta interna y confirmar a lo largo del día.

Frente a la interpretación del 70% de cumplimiento para aprobación de la formación, Atenea aclara que en el documento de especificaciones técnicas se encuentra en el numeral 3 Literal A, indica que se certifica mediante una constancia de asistencia la cual es de 120 horas, asi, se aclaró que el 70% de cumplimiento se refiere al total de horas formativas (sincrónicas y asincrónicas), no solo a la asistencia sincrónica, y que la constancia de asistencia se otorga bajo esta fórmula. Se solicitó al equipo revisar los documentos contractuales, especialmente el literal A de los requisitos de la oferta, para asegurar que la interpretación y aplicación de la fórmula sean correctas y alineadas con la normativa y se deja abierta la posibilidad de un espacio de aclaración si este es requerido por Kuepa.

El equipo Kuepa solicita la base de PILA para cruzar con las personas colocadas. Se informa por parte de Atenea que ya se cuenta con la base, sin embargo, se está adelantando un ejercicio de depuración y organización de la información recibida para poderla compartir con los operadores.

Gestión Documental: Equipo Atenea manifiesta la urgencia de la entrega de la Gestión Documental para la verificación y revisión de aprobados. Se recomendó al equipo organizarse para realizar el cargue progresivo de la información, reconociendo que la tarea es extensa debido a la acumulación de archivos, y se ofreció apoyo para resolver dudas sobre el proceso.

Certificación de industria: Atenea solicita la respuesta frente a la estrategia de implementación para la certificación de industria, incluyendo el cronograma, los hitos importantes y los beneficios para los estudiantes, y que permitan a Atenea revisar el avance con el ente certificador.

Actividades Sector Real: Con relación a la encuesta de entrada y salida hace falta únicamente la ejecución de la actividad de inmersión sectorial, ya que está programada para

el 11, 12 y 13 de agosto. Se requiere este instrumento de la encuesta de salida para la misma semana.

Se manejan los mismos resultados de la feria de empleabilidad, el ajuste solicitado de la colocación ya se encuentra en la carpeta para revisión.

Componente de Colocación: Se tienen 698 remisiones, que representan 165 personas están interesadas en el proceso.

De las 165 personas, se tienen pendientes 65 retroalimentaciones del proceso de selección. El número de personas que no asisten al proceso o que ya desistieron son 89. Personas colocadas por operador 12 y otros operadores 14.

Se alerta sobre 89 personas que demostraron interés en su momento, pero ya no contestan por ningún medio.

3. CONCLUSIONES: Se socializa el resultado de la jornada de recuperación y el cierre de formalización, reconociendo retos que ajustan la proyección inicial.

Para asegurar el cumplimiento y la trazabilidad, se acordó iniciar espacios quincenales de seguimiento a la tasa de colocación todos los miércoles de 2:00 a 4:00 de la tarde, con agenda y matriz de seguimiento a cargo de equipo Atenea y validación posterior por base PILA.

Quedó pendiente la revisión de las pruebas de selección con el feedback incorporado, así como los entregables de inmersión sectorial, encuesta de salida y la base de colocación por PILA; entre tanto, el equipo seguirá remitiendo candidatos con interés laboral.

Respuesta frente a la fecha máxima para culminar el proceso de formación en su fase de recuperación.

Finalmente, se enfatizó en alinear criterios sobre la fórmula de cálculo para mantener consistencia en los análisis y reportes.

4. COMPROMISOS:

- **Extensión de Estrategia de Recuperación:** Consultar y definir hasta qué día máximo se puede extender la estrategia de recuperación más allá del 9 de agosto y comunicar la decisión al equipo. (Atenea)
- **Revisión de Fórmula de Cumplimiento:** Revisar la interpretación y aplicación de la fórmula de cumplimiento del 70% de las 120 horas de formación, asegurando alineación

PÚBLICA

con los documentos contractuales y comunicar cualquier duda o ajuste necesario. (Kuepa)

- **Entrega de Cruce de Base de Datos PILA:** Entregar al equipo la base de datos de cruce PILA ya depurada y estructurada para identificar a los participantes colocados laboralmente. (Atenea)
- **Organización y Cargue de Gestión Documental:** Organizar y cargar toda la gestión documental de las sesiones de formación en la carpeta de Atenea conforme al protocolo establecido, asegurando avance progresivo y cumplimiento urgente. (Kuepa)
- **Presentación de Estrategia de Certificación de Industria:** Presentar la estrategia detallada de implementación y cronograma para la certificación de industria, incluyendo el ente certificador y beneficios para los estudiantes, y permitir revisión interna de la constancia de participación. (Kuepa)
- **Unificación y Entrega de Encuesta de Satisfacción:** Unificar la encuesta de satisfacción con la del componente pedagógico y compartir la herramienta final para su aplicación al término de todas las actividades. (Atenea)
- **Coordinación de Revisión de Resultados de Estrategia:** Coordinar con Gina Paola la revisión conjunta y progresiva de los resultados de la estrategia y la documentación, adaptándose a la agenda del equipo de Atenea. (Atenea - Kuepa)

1.1 PENDIENTES DE REUNIONES ANTERIORES

REUNIÓN	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	ESTADO
31/07/2025	Enviar encuesta de salida a partir del 5 de agosto.	ATENEA	05/08/2025	Finalizado
31/07/2025	Cargar Cartilla Técnica al SharePoint para su revisión	KUEPA	05/08/2025	Finalizado
31/07/2025	Desarrollar Inmersión Sectorial	KUEPA	06/08/2025	Finalizado
31/07/2025	Entregar ajuste de feedback de las pruebas	KUEPA	01/08/2025	Finalizado
31/07/2025	Enviar un oficio solicitando la extensión de las fechas de recuperación	KUEPA	05/08/2025	Finalizado
31/07/2025	Reunión para discutir sobre la fórmula contractual y su impacto	KUEPA y ATENEA	04/08/2025	Finalizado
31/07/2025	Reportar en el informe los indicadores de colocados	KUEPA	04/08/2025	Finalizado
31/07/2025	Enviar base de PILA	ATENEA	04/08/2025	Finalizado

1.2 PENDIENTES REUNIÓN ACTUAL

REUNIÓN	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	ESTADO
06/08/2025	Envío Base de PILA	ATENEA	11/08/2025	Completado
06/08/2025	Entrega de Gestión Documental	KUEPA	11/08/2025	Completado
06/08/2025	Dar a Conocer avance de certificados a ATENEA	KUEPA	07/08/2025	Completado
06/08/2025	Revisar ajustes en informe de colocados	ATENEA	11/08/2025	Completado
06/08/2025	Envío de instrumento de encuesta	ATENEA	07/08/2025	Completado

LISTADO DE ASISTENCIA

NOMBRE	FIRMA
Mario Briceño	Listado adjunto (teams)
Vanessa Achury	Listado adjunto (teams)
Izabella Woyames	Listado adjunto (teams)
Sebastián Suarez	Listado adjunto (teams)
Heidy Herrera	Listado adjunto (teams)
David Leonardo Orjuela	Listado adjunto (teams)
Diana María González	Listado adjunto (teams)
Gina Paola Camargo Rodríguez	Listado adjunto (teams)
Yiza Yelena Aragón	Listado adjunto (teams)

PÚBLICA

(Virtual)_A380_2025_Kuepa Edutech_Reunión de seguimiento - Informe de asistencia 8-06-25

1. Resumen															
Título de la reunión	**(Virtual)_A380_2025_Kuepa Edutech_Reunión de seguimiento**														
Participantes que asistieron	**13**														
Hora de inicio	**8/06/25**											8:25:34 AM			
Hora de finalización	**8/06/25**											10:10:06 AM			
Duración de la reunión	**1 h 44 min 31 s**														
Tiempo medio de asistencia	**1 h 9 min 49 s**														
2. Participantes															
Nombre	**Primera entrada**	**Última salida**	**Duración de la reunión**	**Correo electrónico**	**Id. de participante (UPN)**	**Rol**	**Interacción: Cámara encendida**	**Interacción: Manos levantadas**	**Interacción: Audio activado**						
Gina Paola Camargo Rodríguez		**8/06/25**							8:31:03 AM	8/06/25					
David Leonardo Orjuela Calderón		**8/06/25**							8:33:49 AM	8/06/25					
Yiza Yelena Aragon Lozano		**8/06/25**							8:34:07 AM	8/06/25					
Diana María Gonzalez Wilches		**8/06/25**							8:34:16 AM	8/06/25					
Vanessa Achury (No comprobado)		**8/06/25**							8:34:26 AM	8/06/25					
read.ai meeting notes (No comprobado)		**8/06/25**							8:34:26 AM	8/06/25					
Izabella Woyames (No comprobado)		**8/06/25**							8:34:27 AM	8/06/25					
Fireflies.ai Notetaker Izabell (No comprobado)		**8/06/25**							8:34:27 AM	8/06/25					
VANESSA ACHURY (No comprobado)		**8/06/25**							8:34:27 AM	8/06/25					
Mario briceno (No comprobado)		**8/06/25**							8:34:39 AM	8/06/25					
Jennyfer Piñeros (No comprobado)		**8/06/25**							8:38:45 AM	8/06/25					
Heidy Herrera (No comprobado)		**8/06/25**							9:13:18 AM	8/06/25					
Sebastián S (No comprobado)		**8/06/25**							9:50:22 AM	1 h 15 min 55 s		Moderador	1	2	2
3. Actividades de la reunión															
Nombre	**Hora de entrada**	**Hora de salida**	**Duración**	**Correo electrónico**	**Rol**										
Gina Paola Camargo Rodríguez		**8/06/25**							8:31:03 AM	8/06/25					
David Leonardo Orjuela Calderón		**8/06/25**							8:33:49 AM	8/06/25					
Yiza Yelena Aragon Lozano		**8/06/25**							8:34:07 AM	8/06/25					
Diana María Gonzalez Wilches		**8/06/25**							8:34:16 AM	8/06/25					
Vanessa Achury (No comprobado)		**8/06/25**							8:34:26 AM	8/06/25					
read.ai meeting notes (No comprobado)		**8/06/25**							8:34:26 AM	8/06/25					
Izabella Woyames (No comprobado)		**8/06/25**							8:34:27 AM	8/06/25					
Fireflies.ai Notetaker Izabell (No comprobado)		**8/06/25**							8:34:27 AM	8/06/25					
VANESSA ACHURY (No comprobado)		**8/06/25**							8:34:27 AM	8/06/25					
Mario briceno (No comprobado)		**8/06/25**							8:34:39 AM	8/06/25					
Jennyfer Piñeros (No comprobado)		**8/06/25**							8:38:45 AM	8/06/25					
Heidy Herrera (No comprobado)		**8/06/25**							9:13:18 AM	8/06/25					
Sebastián S (No comprobado)		**8/06/25**							8:34:26 AM			Moderador			
Sebastián S (No comprobado)		**8/06/25**							8:34:26 AM	8/06/25					
4. Interacción en la reunión															
Nombre	**Tipo de compromiso**	**Tiempo**													
Gina Paola Camargo Rodríguez	**Audio activado**	**8/06/25**							8:34:02 AM						
Gina Paola Camargo Rodríguez	**Audio activado**	**8/06/25**							8:35:23 AM						
Gina Paola Camargo Rodríguez	**Audio activado**	**8/06/25**							8:51:24 AM						
Gina Paola Camargo Rodríguez	**Audio activado**	**8/06/25**							9:03:17 AM						
Gina Paola Camargo Rodríguez	**Audio activado**	**8/06/25**							9:12:17 AM						
Gina Paola Camargo Rodríguez	**Audio activado**	**8/06/25**							9:21:28 AM						
David Leonardo Orjuela Calderón	**Audio activado**	**8/06/25**							8:33:53 AM						
David Leonardo Orjuela Calderón	**Audio activado**	**8/06/25**							8:34:08 AM						
David Leonardo Orjuela Calderón	**Cámara encendida**	**8/06/25**							8:35:12 AM						
David Leonardo Orjuela Calderón	**Audio activado**	**8/06/25**							8:46:26 AM						
David Leonardo Orjuela Calderón	**Cámara encendida**	**8/06/25**							8:46:28 AM						
David Leonardo Orjuela Calderón	**Audio activado**	**8/06/25**							8:58:56 AM						
David Leonardo Orjuela Calderón	**Audio activado**	**8/06/25**							9:04:29 AM						
Yiza Yelena Aragon Lozano	**Audio activado**	**8/06/25**							8:34:16 AM						
Yiza Yelena Aragon Lozano	**Audio activado**	**8/06/25**							8:56:43 AM						
Yiza Yelena Aragon Lozano	**Audio activado**	**8/06/25**							9:21:33 AM						
Yiza Yelena Aragon Lozano	**Audio activado**	**8/06/25**							9:24:53 AM						
Yiza Yelena Aragon Lozano	**Manos levantadas**	**8/06/25**							9:26:31 AM						
Yiza Yelena Aragon Lozano	**Manos levantadas**	**8/06/25**							9:26:49 AM						
Yiza Yelena Aragon Lozano	**Audio activado**	**8/06/25**							9:29:00 AM						
Diana María Gonzalez Wilches	**Audio activado**	**8/06/25**							9:36:30 AM						
Diana María Gonzalez Wilches	**Audio activado**	**8/06/25**							9:50:17 AM						
Vanessa Achury (No comprobado)	**Audio activado**	**8/06/25**							8:34:35 AM						
Vanessa Achury (No comprobado)	**Cámara encendida**	**8/06/25**							8:35:01 AM						
Vanessa Achury (No comprobado)	**Audio activado**	**8/06/25**							8:58:09 AM						
Vanessa Achury (No comprobado)	**Audio activado**	**8/06/25**							9:03:18 AM						
Vanessa Achury (No comprobado)	**Audio activado**	**8/06/25**							9:08:18 AM						
Vanessa Achury (No comprobado)	**Audio activado**	**8/06/25**							9:08:59 AM						
Izabella Woyames (No comprobado)	**Audio activado**	**8/06/25**							8:34:30 AM						
Izabella Woyames (No comprobado)	**Cámara encendida**	**8/06/25**							8:34:35 AM						
Izabella Woyames (No comprobado)	**Cámara encendida**	**8/06/25**							8:35:10 AM						
Izabella Woyames (No comprobado)	**Audio activado**	**8/06/25**							8:37:07 AM						
Izabella Woyames (No comprobado)	**Audio activado**	**8/06/25**							8:38:14 AM						
Izabella Woyames (No comprobado)	**Audio activado**	**8/06/25**							8:39:07 AM						
Mario briceno (No comprobado)	**Cámara encendida**	**8/06/25**							8:34:39 AM						
Mario briceno (No comprobado)	**Cámara encendida**	**8/06/25**							8:36:39 AM						
Mario briceno (No comprobado)	**Cámara encendida**	**8/06/25**							8:46:40 AM						
Mario briceno (No comprobado)	**Manos levantadas**	**8/06/25**							8:51:19 AM						
Mario briceno (No comprobado)	**Manos levantadas**	**8/06/25**							9:03:06 AM						
Mario briceno (No comprobado)	**Cámara encendida**	**8/06/25**							9:21:42 AM						
Mario briceno (No comprobado)	**Cámara encendida**	**8/06/25**							9:26:58 AM						
Jennyfer Piñeros (No comprobado)	**Audio activado**	**8/06/25**							8:39:46 AM						
Heidy Herrera (No comprobado)	**Audio activado**	**8/06/25**							9:35:49 AM						
Sebastián S (No comprobado)	**Cámara encendida**	**8/06/25**							8:51:21 AM						
Sebastián S (No comprobado)	**Audio activado**	**8/06/25**							9:23:33 AM						
Sebastián S (No comprobado)	**Manos levantadas**	**8/06/25**							9:24:03 AM						
Sebastián S (No comprobado)	**Manos levantadas**	**8/06/25**							9:24:07 AM						
Sebastián S (No comprobado)	**Audio activado**	**8/06/25**							9:50:18 AM						

9:50:27 AM	1 h 19 min 24 s	gcamargo@agenciaatenea.gov.co		gcamargo@agenciaatenea.gov.co		Organizador					6
9:21:34 AM	47 min 45 s	dorjuela@agenciaatenea.gov.co	dorjuela@agenciaatenea.gov.co		Moderador	2		5			
9:59:18 AM	1 h 25 min 10 s	yaragon@agenciaatenea.gov.co	yaragon@agenciaatenea.gov.co		Moderador		2	5			
9:50:20 AM	1 h 16 min 3 s	dgonzalez@agenciaatenea.gov.co		dgonzalez@agenciaatenea.gov.co		Moderador					2
9:50:18 AM	1 h 15 min 52 s		Moderador	1		5					
10:08:22 AM	1 h 33 min 56 s		Moderador								
10:07:51 AM	1 h 33 min 24 s		Moderador	2		4					
10:10:06 AM	1 h 35 min 38 s		Moderador								
8:34:42 AM	14 s		Moderador								
9:50:19 AM	1 h 15 min 40 s		Moderador	5	2						
9:50:22 AM	1 h 11 min 36 s		Moderador			1					
9:50:21 AM	37 min 2 s		Moderador			1					


9:50:27 AM	1 h 19 min 24 s	gcamargo@agenciaatenea.gov.co	Organizador	
9:21:34 AM	47 min 45 s	dorjuela@agenciaatenea.gov.co	Moderador	
9:59:18 AM	1 h 25 min 10 s	yaragon@agenciaatenea.gov.co	Moderador	
9:50:20 AM	1 h 16 min 3 s	dgonzalez@agenciaatenea.gov.co	Moderador	
9:50:18 AM	1 h 15 min 52 s		Moderador	
10:08:22 AM	1 h 33 min 56 s		Moderador	
10:07:51 AM	1 h 33 min 24 s		Moderador	
10:10:06 AM	1 h 35 min 38 s		Moderador	
8:34:42 AM	14 s		Moderador	
9:50:19 AM	1 h 15 min 40 s		Moderador	
9:50:22 AM	1 h 11 min 36 s		Moderador	
9:50:21 AM	37 min 2 s		Moderador	
9:50:22 AM	1 h 15 min 55 s		Moderador	



Kuepa Edutech

Talento Capital - Convocatoria 4

ket
kuepa EduTech

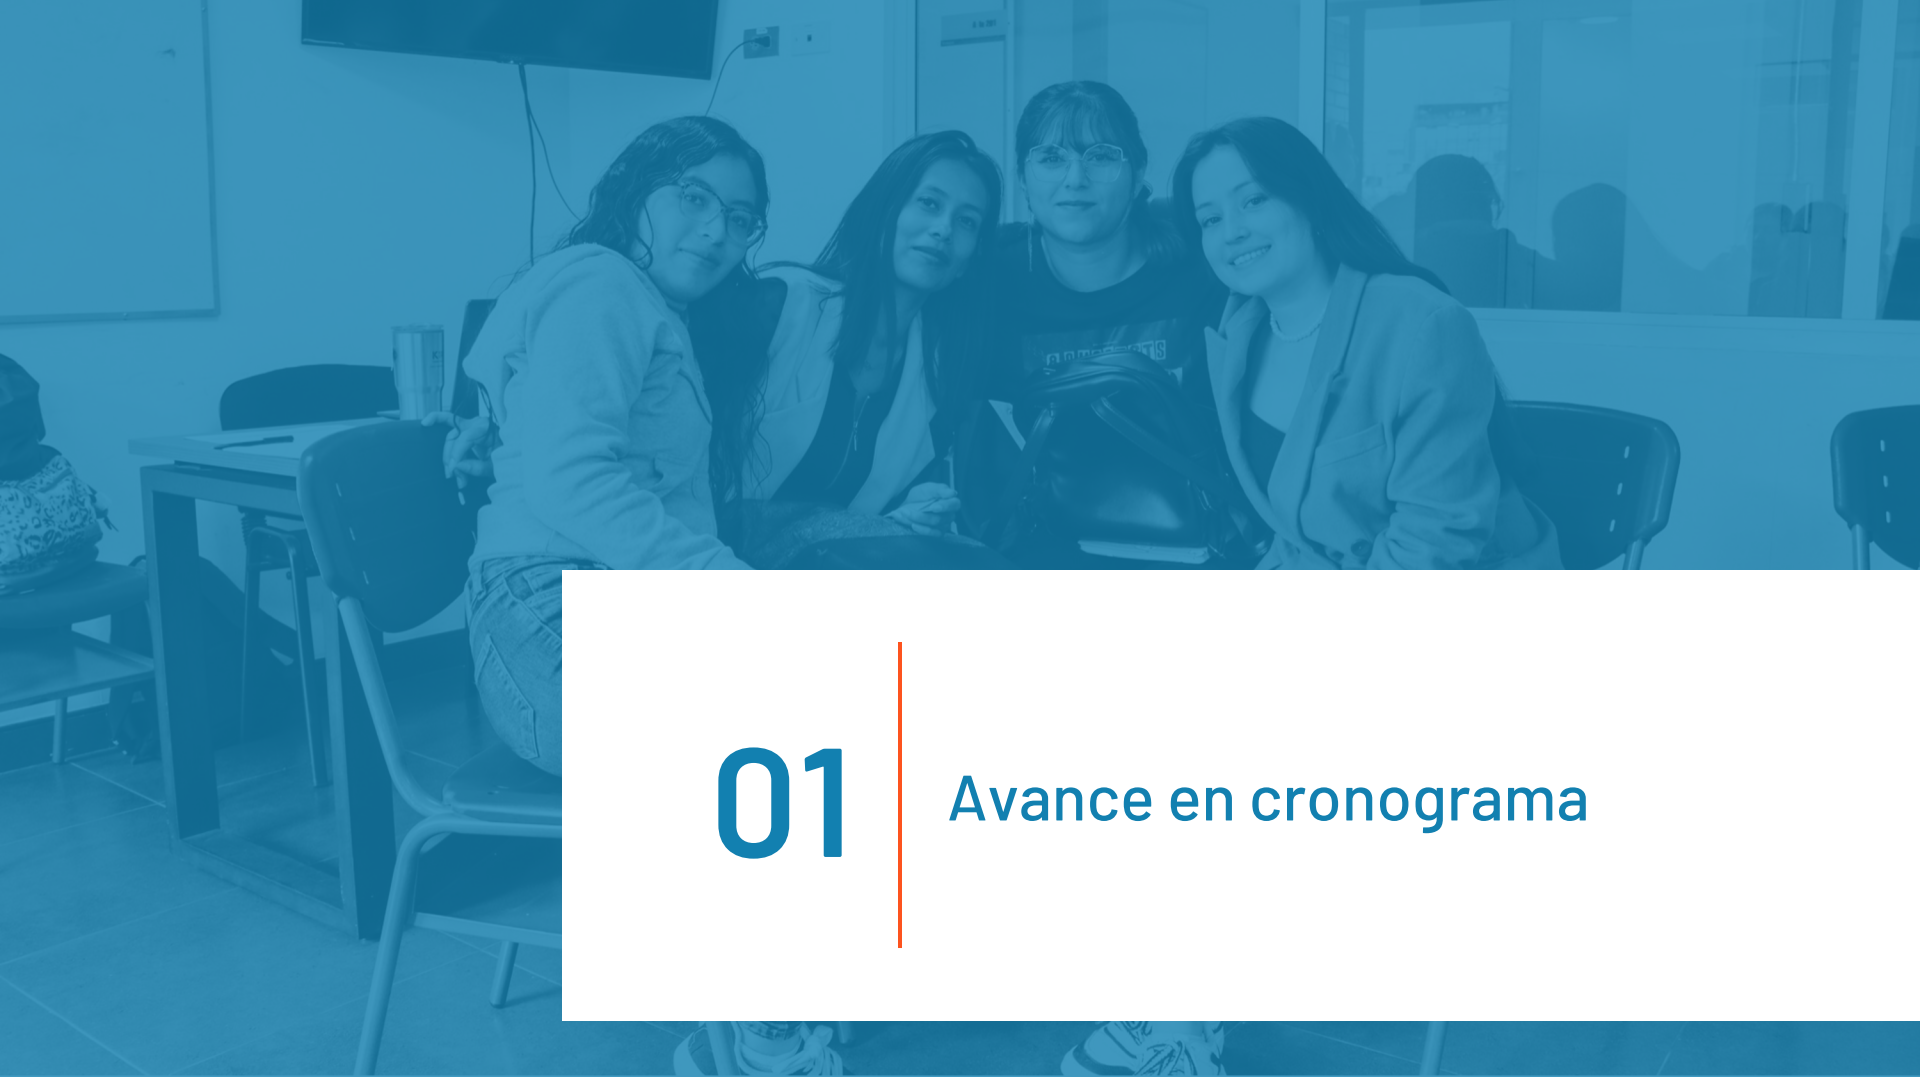


01 Avance en cronograma

Avance Cronograma

Etapa	Inicio	Fin	Avance Promedio
Alistamiento	21/03/25	11/07/25	100%
Cierre	04/08/25	10/10/25	0%
Estrategia de comunicación	12/04/25	31/10/25	87%
Formación	17/04/25	03/08/25	71%
Formalización y matrícula	21/03/25	13/06/25	100%
Seguimiento actividades de acompañamiento y permanencia	12/04/25	03/08/25	100%
Seguimiento cumplimiento de tasas	14/05/25	30/09/25	72%
Seguimiento monitoreo y control	21/03/25	31/10/25	69%
Seguimiento de las actividades con el sector real	13/05/25	11/10/25	90%
Total general	**21/03/25**	**31/10/25**	**80%**

ket
kuepa EduTech

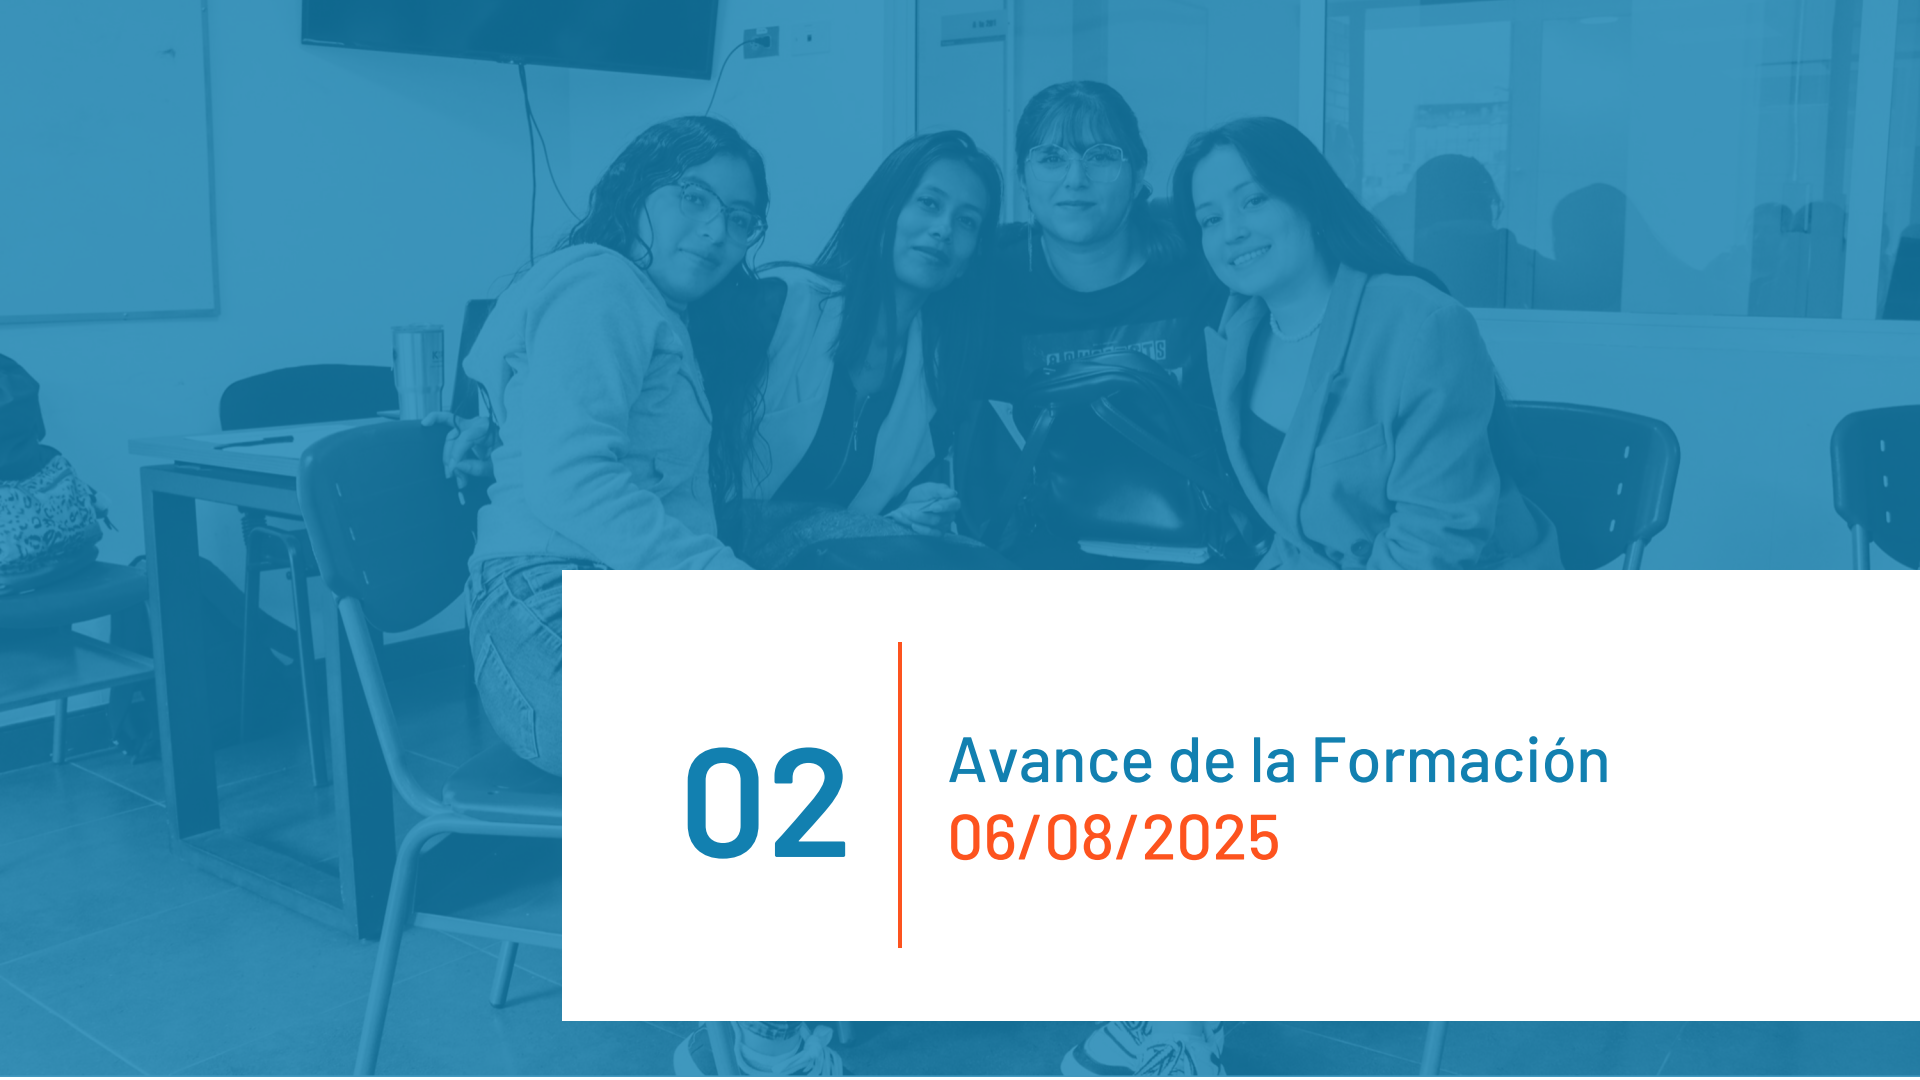

02

Avance de la Formación

06/08/2025

MATRÍCULA
PROCESO DE FORMALIZACIÓN

Base	Población
Prioridad 1	571
Prioridad 2	79
Total	650

Meta formalización:**544**

Tasa de Formalización
114%


Situación	Prioridad 1	Prioridad 2	Total
Formalizados	556	66	**622***

*Ajuste realizado a corte del 7 de julio de 2025

ket
kuepa EduTech

PERMANENCIA

FORMACIÓN POR GRUPO

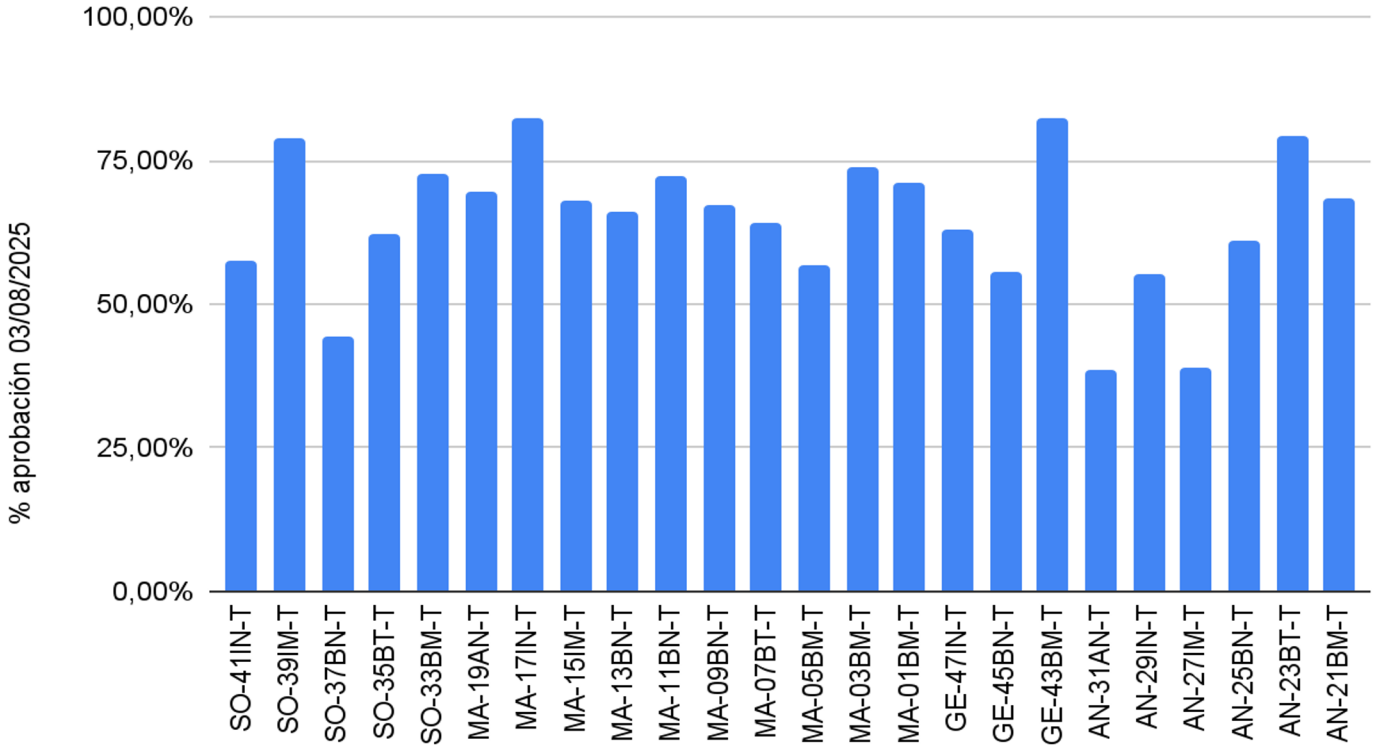

Indicador Semáforo Alerta Asistencia


kuepa

ATENEA
AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

Reporte de indicadores Proyecto Talento Capital

Número de estudiantes	Número de grupos	TOTAL ASISTENCIA
622	24,0	63,63 %

Alerta	Record Count
Escriba el término de búsqueda	
Alerta Roja	191
Alerta Amarilla	170
Alerta Verde	147
Alerta Naranja	114



Cierre 03/08/2025

ket
kuepa EduTech

Resultados de la Estrategia de Recuperación

Estado	Habilidades Técnicas	Socioemocional	Estudiantes en Recuperación	Rango de Asistencia
Aprobado	60	44	**104**	>70%
En formación	14	10	24	50% a 69%
En seguimiento	33	0	33	25 a 49%
En riesgo deserción	32	0	32	<25%
Matriculado Inactivo	0	0	0	0
TOTAL	**139**	**22**	**193**	**NA**

De los 193 estudiantes que se priorizaron en la estrategia de recuperación, 104 lograron ponerse al día con su proceso de formación.

ket
kuepa EduTech

Indicador Avance Formación

Reporte Asistencia 70%

Estado	Estudiantes	Porcentual	Rango de Asistencia
Aprobado	402	65%	>70%
En formación	31	5%	50% a 69%
En seguimiento	55	9%	25 a 49%
En riesgo deserción	116	19%	<25%
Matriculado Inactivo	18	3%	0
TOTAL	622	100	NA

Porcentaje de aprobación

402 Estudiantes
Entrenamiento para tomar certificados de industria


ESTUDIANTES APROBADOS ASISTENCIA				
Programa	**Básico**	**Intermedio**	**Avanzado**	**Total**
Marketing Digital	200	18	7	225
Soporte Técnico en Sistemas	67	6	0	73
Analista de Sistemas Informáticos	59	10	0	69
Gestión en Mesa de Servicio	29	6	0	35
TOTAL	355	40	7	**402**




ket
kuepa EduTech

Inasistencias


Razones reportadas por los beneficiarios para la inasistencia a las clases sincrónicas




Conflictos de horarios laborales



Comunicación ineficaz



Falta de acceso a internet



Responsabilidades de cuidado familiar

ket
kuepa EduTech

Estrategia para estudiantes en formación

Aprobados y En formación (50% - 69%)	
Número de clases	**Participantes**
0	104
1	5
2	4
3	7
4	8
TOTAL GENERAL	128
TOTAL EN FORMACIÓN	24

Una vez culminada la estrategia de recuperación, 24 estudiantes aún necesitan entre 1 y 4 sesiones adicionales para ponerse al día. De estos 24 estudiantes, 4 no se conectaron a ninguna sesión de recuperación.

Estrategia para estudiantes en seguimiento


En seguimiento (25% - 49%)	
Número de clases	**Participantes**
5	5
6	9
7	7
8	6
9	6
TOTAL GENERAL	33

Por otro lado, 33 estudiantes priorizados todavía necesitan entre 5 y 9 clases para ponerse al día. De los cuales 14 no se conectaron a ninguna sesión de recuperación.

Sumados a los 33 estudiantes priorizados, hay 22 estudiantes de los niveles intermedio y avanzado que podrían beneficiarse de sesiones asincrónicas.

Indicador Semáforo Alerta Asistencia


	Asistencia
Alerta Roja	0%-50%
Alerta Naranja	51% - 75%
Alerta Amarilla	76% - 90%
Alerta Verde	91% -100%

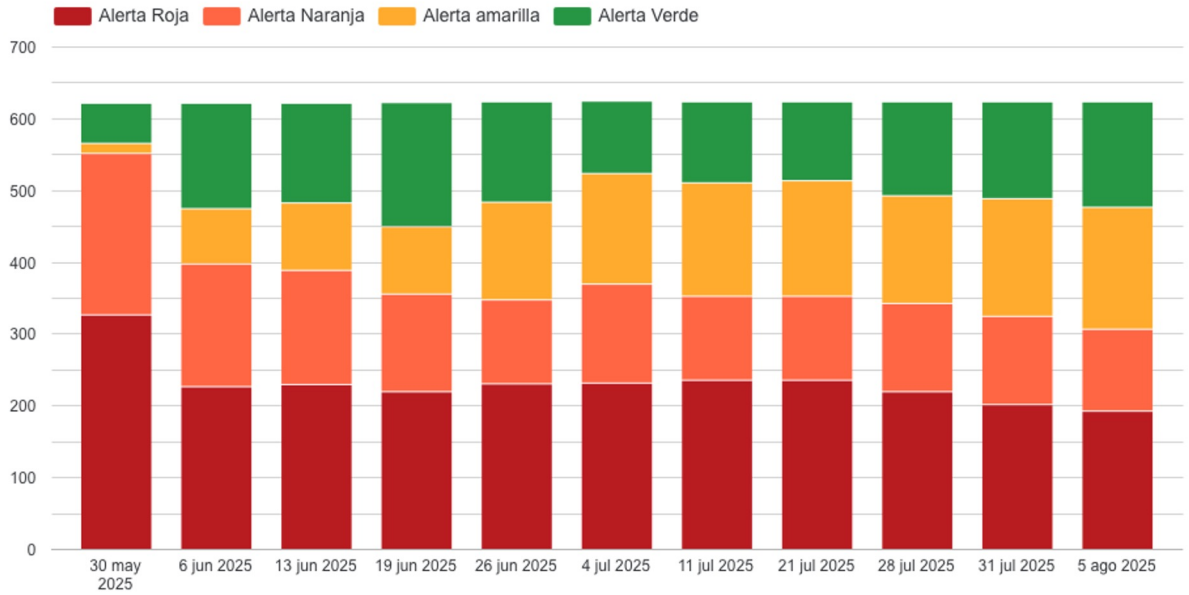

Clases presenciales socioemocionales

Sesiones	Franja horaria	# grupos	# personas
05/07/2025	Mañana	2	35
10/07/2025	Noche	4	95
11/07/2025	Noche	4	67
12/07/2025	Mañana	4	63
17/07/2025	Noche	4	86
18/07/2025	Noche	3	45
19/07/2025	Mañana	2	51
19/07/2025	Tarde	1	13
23/07/2025	Mañana	2	29
24/07/2025	Noche	1	12
26/07/2025	Mañana	1	19
Total	**11**	**28**	**515**



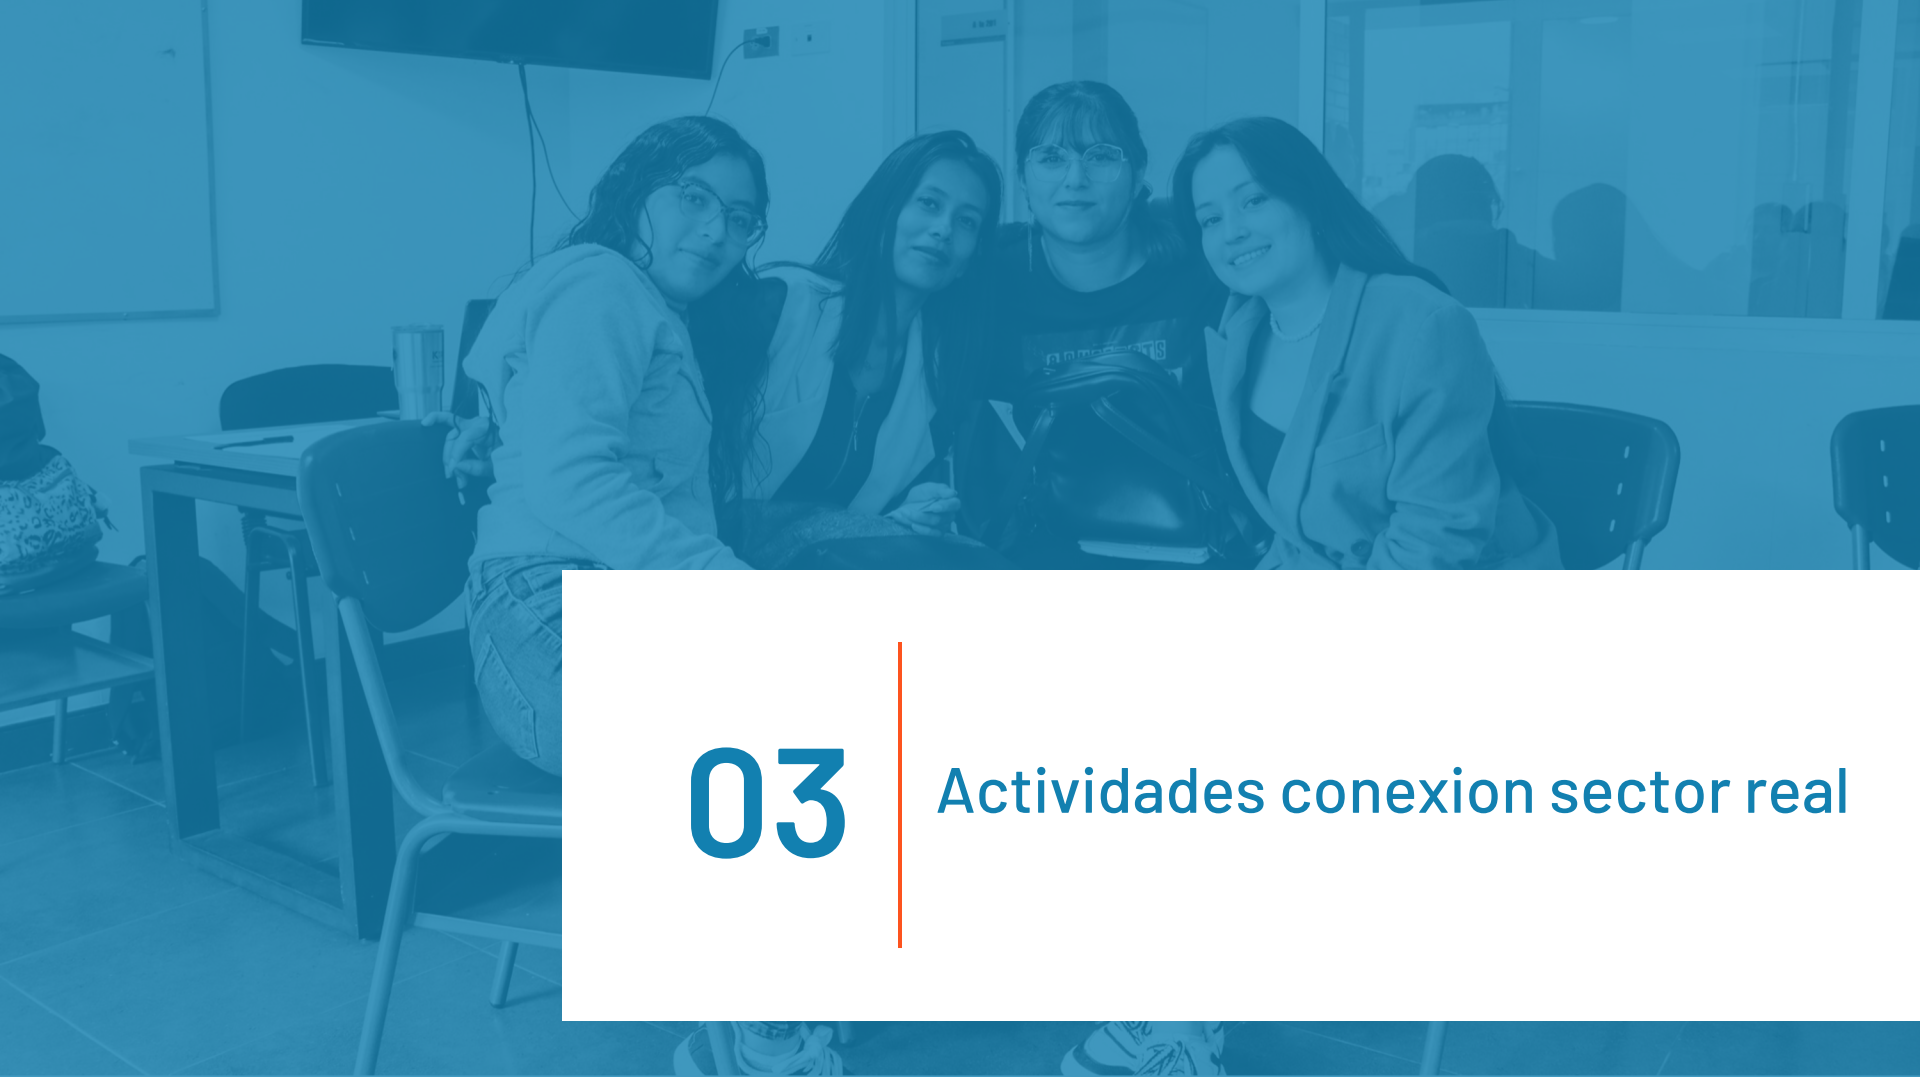

03

Actividades conexion sector real

Encuesta de Entrada y de Salida

Encuesta de Entrada: caracterización a los estudiantes formalizados

- Estado: Ejecutado
- Radicación: 19/06/2025
- Contenido: Conocimientos, experiencia y competencias de los estudiantes, así como intereses ocupacionales.

Encuesta de Salida: Encuesta de satisfacción

- Estado: Pendiente de Ejecución
- Radicación: 15/8/2025
- Contenido: a identificar y medir el proceso de calidad y pertinencia de todas las acciones de conexión con el sector real ejecutadas


Enrutamiento al SISE


Objetivo: Capacitación en uso de plataformas SISE.

- Estado: Ejecutado el 20/06/2025
- Radicación Informe: 01/07/2025
- Contenido: optimización de perfiles, realizar búsquedas estratégicas y aplicar a vacantes adecuadas.

Resultados:

- Convocatoria: 622 Estudiantes
- Asistencia: 202 Estudiantes





Feria de Empleo - Cifras y resultados

- **185 participantes de Talento Capital**.
- **59** han recibido presencialmente reconocimiento por su buen desempeño académico.
- **145** invitados, entre los que llevaron nuestros estudiantes y las personas que Atenea invitó a participar de la Feria
- **35** empresas participantes
- Total: **330 personas**
- **65 Vacantes ofertadas**
- **2888 Puestos ofertados:**
- **97 postulaciones** fueron realizadas por los estudiantes de Talento Capital.

Formación	Preseleccionados
Analista de Sistemas Informáticos	23
Gestión en Mesa de Servicio	9
Marketing Digital - Community Manager	40
Soporte Técnico en Sistemas	10
Total general	82





Colocación

Remisiones: *Total de veces que se remitieron personas a vacantes. Una misma persona puede haber sido remitida a varias vacantes, por lo que el número de remisiones es mayor que el número de personas remitidas.*

Personas remitidas: *Número total de personas que fueron referenciadas por el operador a vacantes específicas dentro del marco de la feria. Cada persona se cuenta una sola vez, sin importar cuántas vacantes se le hayan asignado.*

RESULTADOS DE INTERMEDIACIÓN	TOTAL
REMISIONES FERIA + INTERMEDIACIÓN	698
PERSONAS REMITIDAS FERIA + INTERMEDIACIÓN	165

REMISIONES /PERSONAS	TOTAL
PERS. PENDIENTES POR RETROALIMENTACIÓN	65
PERS. NO ASISTE A PROCESO /DESISTE	89
PERSONAS EN PROCESO	9
PERSONAS COLOCADAS POR OPERADOR	2
PERSONAS COLOCADAS OTRO	14

RAZÓN NO CONTINUIDAD	Suma total
Lista de espera	13
Desiste de la oferta	16
No aplica perfil	13
No asiste a entrevista	17
No contesta	24
Prácticas	1
Ya se encuentra trabajando	5

Mapeo oportunidades de proyectos

Metodología:

- Revisión documental y análisis de información secundaria de fuentes oficiales: DANE, Cámara de Comercio, observatorios, planes de desarrollo, estudios de mercado, gremios, entre otros.
- Complementado con entrevistas a expertos y empresarios del sector.
- Sistematización en matrices temáticas para identificar sectores emergentes, demanda ocupacional, barreras de acceso y oportunidades de negocio.

🔄 Productos esperados:

- Cartilla técnica, con análisis del sector/subsector, enlaces a ofertas vigentes, rutas de acceso, datos relevantes y bibliografía.
- Socialización mediante Zoom
- Estado: Entregado a Atenea para valoración



Inmersión Sectorial

Metodología:

- Se desarrollará en **modalidad virtual**, mediante un reto empresarial colaborativo (Casos reales), en el que los estudiantes, resolverán un desafío real planteado por una empresa del sector y formadores.
- El reto será presentado por las empresa aliadas que deseen participar, docentes de formación y retroalimentación final.

🔄 Modalidad específica por aliado:


- Con el aliado Atento, la experiencia se desarrollará a través de un reto empresarial virtual, centrado en el perfil de Asesor Call Center – Ventas, mediante simulación: caso de venta y atención al cliente.

- **Nota:** Se construirá un reto interno con apoyo de los docentes formadores, equipo técnico y empresarios con disponibilidad, que será desarrollado de forma virtual, manteniendo el enfoque experiencial y participativo.

- **Estado**: En gestión _ Actividad presupuestada **agosto 11** (Marketing Digital, Gestión Mesa de servicio) Y **agosto 12** (Análisis Sit. Informáticos, Soport. Tec. Sistemas)

Avance Actividades Conexion Sector Real


Actividad	Estado
Enrutamiento al SISE	Finalizada 20 de Junio Informe entregado
Feria de empleo	Finalizada 15 de julio Informe entregado
Charla de expertos	Finalizada: 23 de julio Informe entregado
Entrenamiento en pruebas de selección	Finalizada: 23 de julio Informe entregado
Mapeo oportunidad de proyectos	En gestión Cartilla entregado
Inmersión sectorial	En gestión: 11 y 12 de agosto
Encuesta de Salida	Pendiente Lineamiento
Base por PILA Colocación	Pendiente de recepción

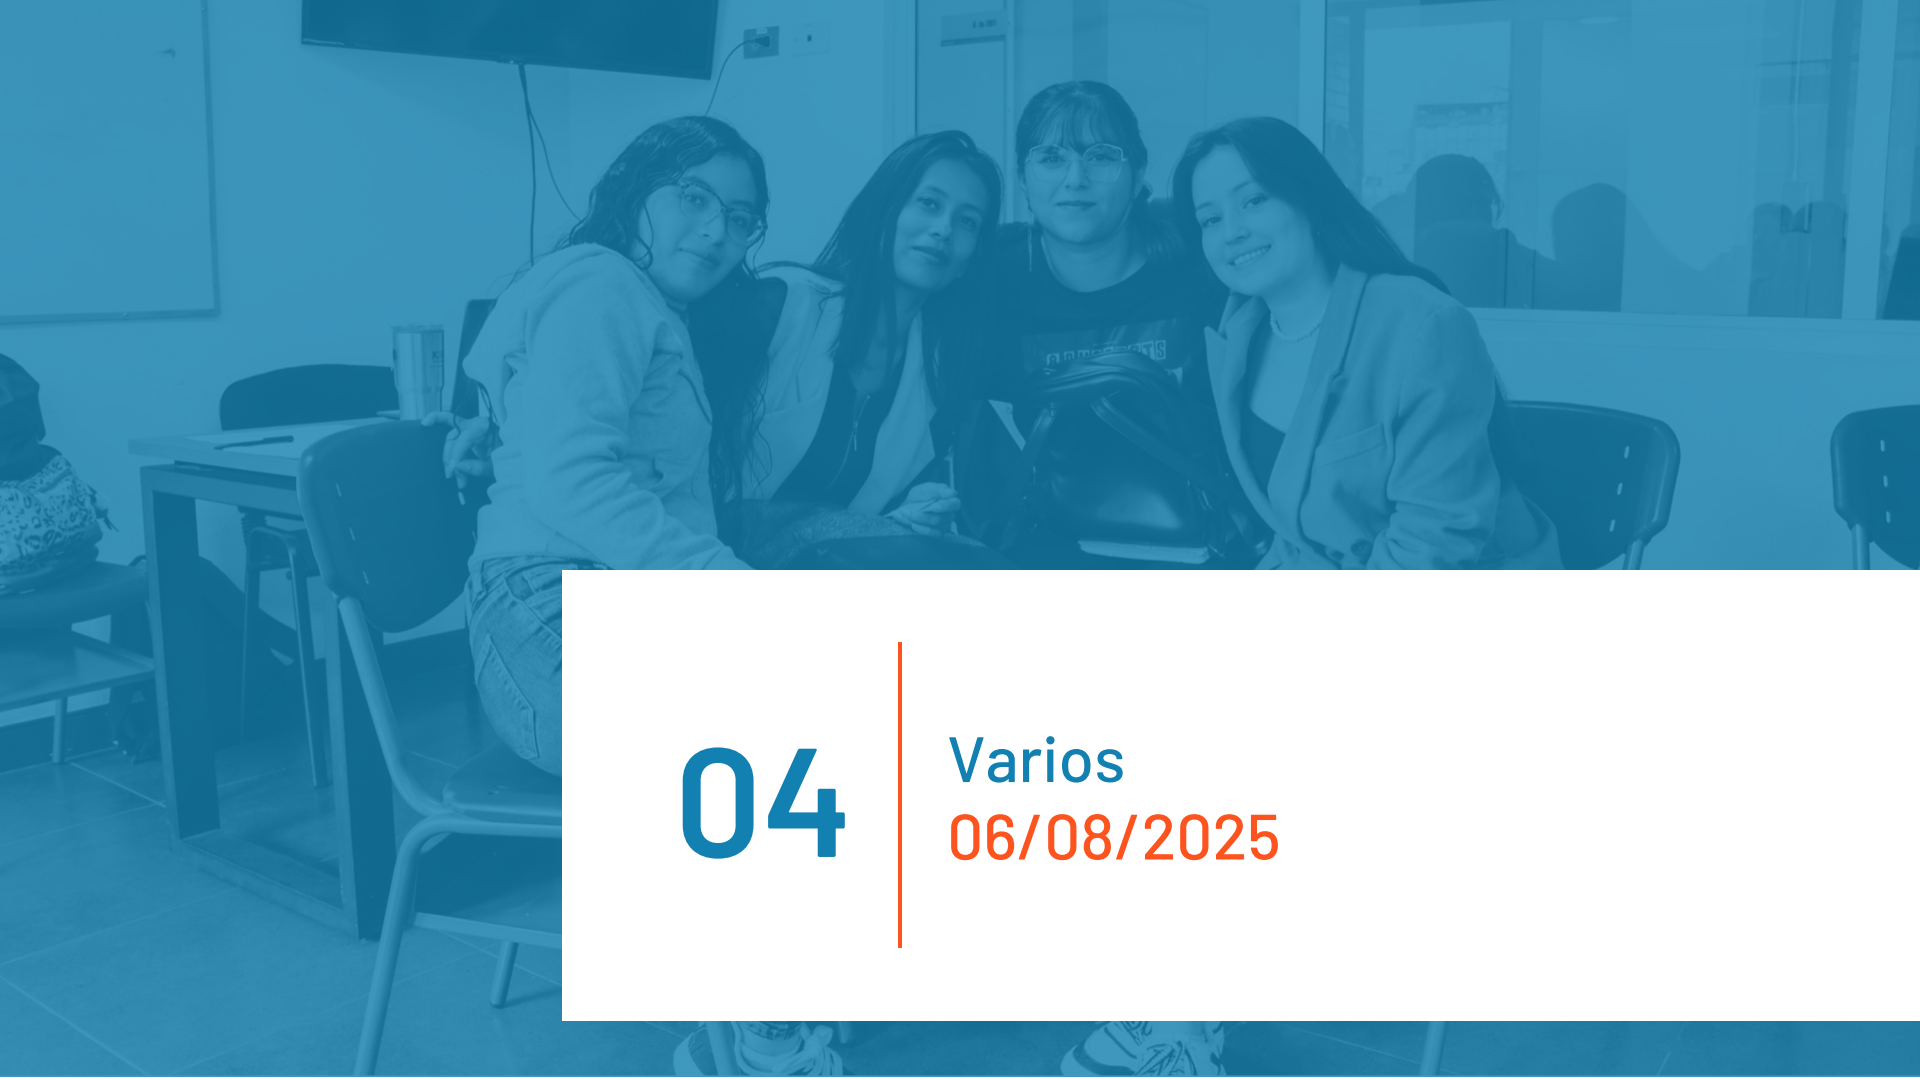

04

Varios

06/08/2025

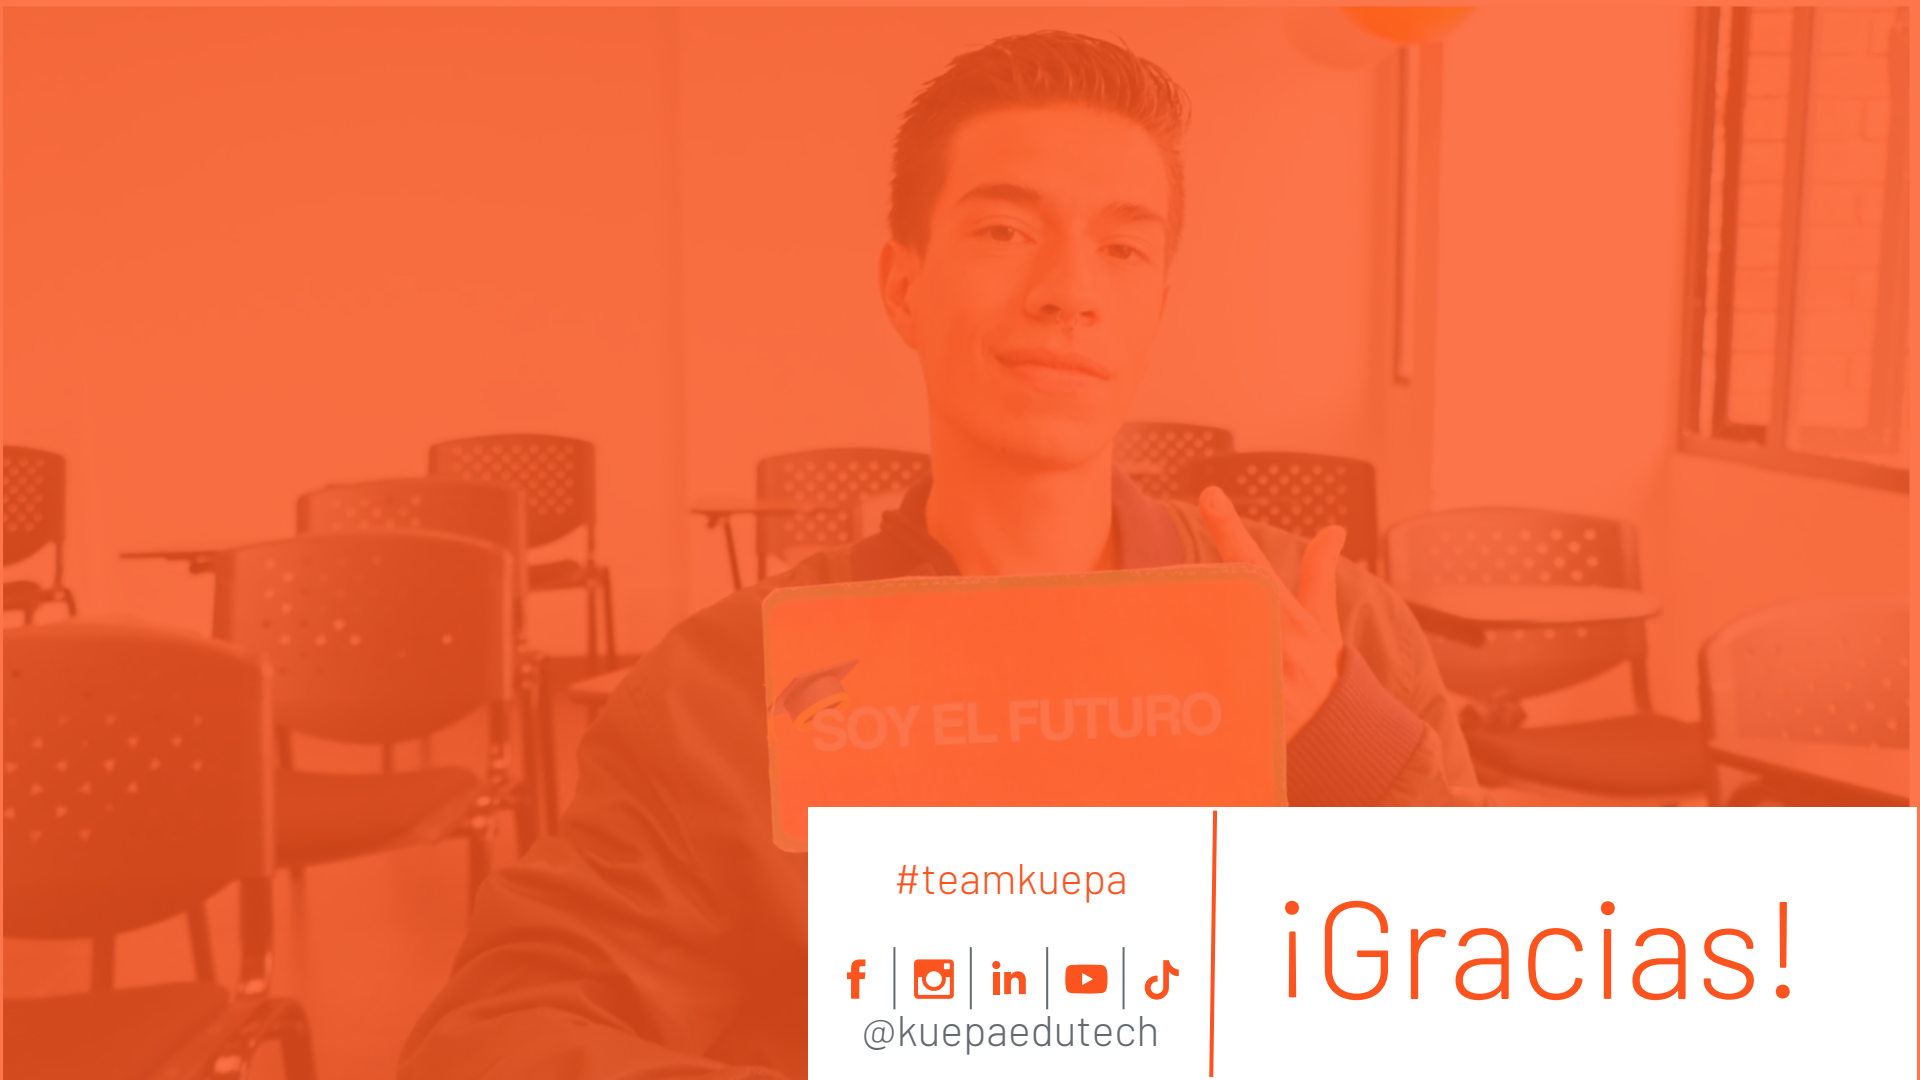

#teamkuepa

@kuepaedutech

¡Gracias!

TEMA:	Seguimiento semanal Contrato Atenea 380-2025
PROCESO:	Talento Capital Formación - Jóvenes con Oportunidades

FECHA:	**12/08/2025**	**Hora Inicio**	**16:00**
		Hora Final	**17:30**

1. ORDEN DEL DIA:

- Aspectos generales del contrato
- Aspectos técnicos y pedagógicos
- Resultados de formalización
- Avance en formación y permanencia
- Conexión con el sector real
- Certificaciones de industria
- Meta de colocación
- Revisión documental y logística del comité

.

2. DESARROLLO:

2.1 Aspectos generales del contrato

- Se presentó el resumen del contrato ATENEA-380-2025: objeto, presupuesto, plazo y metas contractuales.
- Se aclaró que la tasa de formalización fue superada (114% de cumplimiento).

2.2 Aspectos técnicos y pedagógicos

- Se revisaron los productos entregados en la etapa de alistamiento.
- Se confirmó la fórmula de aprobación: 60% asistencia, 15% plataforma, 25% actividades.

2.3 Resultados de formalización

- 622 estudiantes formalizados (meta: 544).
- Distribución por prioridad: 556 (P1), 66 (P2)

2.4 Avance en formación y permanencia

- 24 grupos activos: 22 finalizados, 2 por finalizar.
- 114 estudiantes aprobados a la fecha.

Avance Cronograma

Etapa	Inicio	Fin	Avance Promedio
Alistamiento	21/03/25	11/07/25	100%
Cierre	04/08/25	10/10/25	0%
Estrategia de comunicación	12/04/25	31/10/25	87%
Formación	17/04/25	06/09/25	89%
Formalización y matrícula	21/03/25	13/06/25	100%
Seguimiento actividades de acompañamiento y permanencia	12/04/25	03/08/25	100%
Seguimiento cumplimiento de tasas	14/05/25	30/09/25	79%
Seguimiento monitoreo y control	21/03/25	31/10/25	74%
Seguimiento de las actividades con el sector real	13/05/25	11/10/25	92%
Total general	**21/03/25**	**31/10/25**	**84%**

2.5 Estado general:

- En seguimiento: 33.9%
- En riesgo de deserción: 26.9%
- En formación: 15.6%
- Aprobados: 18.7%
- Matrícula inactiva: 4.2%

Se presentó la estrategia de semaforización y coaching proactivo.
Se solicitó incluir la matriz de estrategias con acciones, fechas, beneficiarios y resultados.

Orientación socio ocupacional

- **Actividades realizadas:** Feria de Empleo, talleres de hoja de vida, marca personal, simulación de pruebas**.**
- Se destacó el impacto positivo en la motivación y desempeño.

Canal de escucha

- Atención virtual continua (lunes a viernes, 7 a.m. – 7 p.m.).
- Sesiones individuales para resolver dudas académicas y técnicas.

Incentivos

- 59 estudiantes reconocidos con pasaporte Silver.

Clases presenciales

- Implementadas desde hace 3 semanas en sede Kuepa Calle 85.
- Participación promedio: 80%.
- Se proyecta finalizar con 2 sesiones adicionales antes del 31 de julio.

Conexión con el sector real

- Actividades finalizadas: enrutamiento al SISE, Feria de Empleo.
- En gestión: charla con expertos, inmersión sectorial, retos empresariales, mapeo de oportunidades.
- Se solicitó incluir el número de beneficiarios impactados por actividad y estado de ejecución.

Certificaciones de industria

- Se espera validación de syllabus para avanzar.
- Se mencionó el sistema de distribución de vouchers y criterios pedagógicos.

Meta de colocación

- Se requiere base PILA para identificar beneficiarios aplicables.
- Supervisión espera recibirla antes del 31 de julio.
- Se compartirá matriz para reporte de avances por estudiante.

Revisión documental y logística

- Se discutió el uso del control de cambios en informes.
- Se acordó realizar mesa de trabajo para validar ajustes.
- Se solicitó entrega de presentación ajustada, nombres y cédulas de asistentes, y base de datos de formación.

3. **CONCLUSIONES:**
   - La meta de formalización fue superada.
   - La estrategia de semaforización permite priorizar intervenciones efectivas.
   - Las clases presenciales y los incentivos han fortalecido la permanencia.
   - Se requiere mayor trazabilidad en las actividades de empleabilidad.
   - La validación de la base PILA es clave para cumplir la meta de colocación.

4. **COMPROMISOS:**
   - Presentación ajustada

- Matriz de estrategias diligenciada
- Base de datos de formación con rangos aclarados
- Cartilla de cierre antes del 30 de julio
- Validar criterios pedagógicos para certificaciones
- Consolidar cifras de impacto por actividad
- Coordinar mesa de trabajo para revisión documental

5. PENDIENTES DE REUNIONES ANTERIORES

REUNIÓN	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	ESTADO
06/08/2025	Envío Base de PILA	ATENEA	11/08/2025	Completado
06/08/2025	Entrega de Gestión Documental	KUEPA	11/08/2025	Completado
06/08/2025	Dar a Conocer avance de certificados a ATENEA	KUEPA	07/08/2025	Completado
06/08/2025	Revisar ajustes en informe de colocados	ATENEA	11/08/2025	Completado
06/08/2025	Envío de instrumento de encuesta	ATENEA	07/08/2025	Completado

5.1 PENDIENTES REUNIÓN ACTUAL

REUNIÓN	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	ESTADO
12/08/2025	Recepción de base PILA validada	ATENEA	19/08/2025	Completado
12/08/2025	Finalización de sesiones presenciales	KUEPA	19/08/2025	Completado
12/08/2025	Entrega de informe de Feria de Empleo	KUEPA	19/08/2025	Completado
12/08/2025	Actualización de matriz de colocación	KUEPA	19/08/2025	Completado

6. LISTADO DE ASISTENCIA

NOMBRE	FIRMA
Andrea Natalia Penagos Penagos	Listado Adjunto (teams)
Diana María González Wilches	Listado Adjunto (teams)
Eliana Montenegro Pulido	Listado Adjunto (teams)
Gina Paola Camargo Rodríguez	Listado Adjunto (teams)
Heidy Janeth Herrera	Listado Adjunto (teams)
Izabella Woyames	Listado Adjunto (teams)
Vanessa Achury	Listado Adjunto (teams)
Yiza Yelena Aragón	Listado Adjunto (teams)
Mario Briceño	Listado Adjunto (teams)

1. Resumen											
Título de la reunión	(Virtual)_A380_2025_Kuepa Edutech_Reunión de seguimiento										
Participantes que asistieron	9										
Hora de inicio	8/12/25							9:44:58 AM			
Hora de finalización	8/12/25							11:00:24 AM			
Duración de la reunión	1 h 15 min 25 s										
Tiempo medio de asistencia	56 min 21 s										
2. Participantes											
Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol	Interacción: Cámara encendida	Interacción: Manos levantadas	Interacción: Audio activado		
Gina Paola Camargo Rodríguez	8/12/25								10:02:10 AM	8/12/25	
Yiza Yelena Aragon Lozano	8/12/25								9:59:34 AM	8/12/25	
Diana María Gonzalez Wilches	8/12/25								10:01:58 AM	8/12/25	
Sebastián S (No comprobado)	8/12/25								10:02:31 AM	8/12/25	
Fireflies.ai Notetaker Izabell (No comprobado)	8/12/25								10:02:31 AM	8/12/25	
Heidy Herrera (No comprobado)	8/12/25								10:02:31 AM	8/12/25	
Mario Briceño (No comprobado)	8/12/25								10:02:32 AM	8/12/25	
Andrea Natalia Penagos Penagos	8/12/25								10:03:11 AM	8/12/25	
Izabella Woyames (No comprobado)	8/12/25								10:58:36 AM	53 min 34 s	Moderador 4 4 5
3. Actividades de la reunión											
Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol						
Gina Paola Camargo Rodríguez	8/12/25								10:02:10 AM	8/12/25	
Yiza Yelena Aragon Lozano	8/12/25								9:59:34 AM	8/12/25	
Diana María Gonzalez Wilches	8/12/25								10:01:58 AM	8/12/25	
Sebastián S (No comprobado)	8/12/25								10:02:31 AM	8/12/25	
Fireflies.ai Notetaker Izabell (No comprobado)	8/12/25								10:02:31 AM	8/12/25	
Heidy Herrera (No comprobado)	8/12/25								10:02:31 AM	8/12/25	
Mario Briceño (No comprobado)	8/12/25								10:02:32 AM	8/12/25	
Andrea Natalia Penagos Penagos	8/12/25								10:03:11 AM	8/12/25	
Izabella Woyames (No comprobado)	8/12/25								10:05:01 AM	Moderador	
Izabella Woyames (No comprobado)	8/12/25								10:05:01 AM	8/12/25	
4. Interacción en la reunión											
Nombre	Tipo de compromiso	Tiempo									
Gina Paola Camargo Rodríguez	Audio activado	8/12/25							10:02:34 AM		
Gina Paola Camargo Rodríguez	Audio activado	8/12/25							10:05:05 AM		
Gina Paola Camargo Rodríguez	Audio activado	8/12/25							10:15:19 AM		
Gina Paola Camargo Rodríguez	Manos levantadas	8/12/25							10:15:22 AM		
Gina Paola Camargo Rodríguez	Audio activado	8/12/25							10:18:29 AM		
Gina Paola Camargo Rodríguez	Audio activado	8/12/25							10:26:09 AM		
Yiza Yelena Aragon Lozano	Audio activado	8/12/25							10:02:50 AM		
Yiza Yelena Aragon Lozano	Audio activado	8/12/25							10:03:02 AM		
Yiza Yelena Aragon Lozano	Manos levantadas	8/12/25							10:49:50 AM		
Yiza Yelena Aragon Lozano	Audio activado	8/12/25							10:50:38 AM		
Yiza Yelena Aragon Lozano	Audio activado	8/12/25							10:52:11 AM		
Yiza Yelena Aragon Lozano	Audio activado	8/12/25							10:53:27 AM		
Diana María Gonzalez Wilches	Audio activado	8/12/25							10:27:04 AM		
Diana María Gonzalez Wilches	Audio activado	8/12/25							10:58:29 AM		
Sebastián S (No comprobado)	Audio activado	8/12/25							10:03:16 AM		
Heidy Herrera (No comprobado)	Audio activado	8/12/25							10:15:25 AM		
Heidy Herrera (No comprobado)	Audio activado	8/12/25							10:26:26 AM		
Heidy Herrera (No comprobado)	Audio activado	8/12/25							10:28:28 AM		
Heidy Herrera (No comprobado)	Audio activado	8/12/25							10:34:51 AM		
Heidy Herrera (No comprobado)	Audio activado	8/12/25							10:58:32 AM		
Mario Briceño (No comprobado)	Audio activado	8/12/25							10:02:43 AM		
Mario Briceño (No comprobado)	Audio activado	8/12/25							10:05:08 AM		
Mario Briceño (No comprobado)	Audio activado	8/12/25							10:27:38 AM		
Mario Briceño (No comprobado)	Audio activado	8/12/25							10:30:55 AM		
Mario Briceño (No comprobado)	Audio activado	8/12/25							10:52:05 AM		
Mario Briceño (No comprobado)	Audio activado	8/12/25							10:52:28 AM		
Andrea Natalia Penagos Penagos	Audio activado	8/12/25							10:49:58 AM		
Andrea Natalia Penagos Penagos	Audio activado	8/12/25							10:52:08 AM		
Izabella Woyames (No comprobado)	Cámara encendida	8/12/25							10:05:01 AM		
Izabella Woyames (No comprobado)	Audio activado	8/12/25							10:05:09 AM		
Izabella Woyames (No comprobado)	Audio activado	8/12/25							10:05:31 AM		
Izabella Woyames (No comprobado)	Audio activado	8/12/25							10:05:40 AM		
Izabella Woyames (No comprobado)	Cámara encendida	8/12/25							10:12:11 AM		
Izabella Woyames (No comprobado)	Audio activado	8/12/25							10:15:29 AM		
Izabella Woyames (No comprobado)	Cámara encendida	8/12/25							10:15:46 AM		
Izabella Woyames (No comprobado)	Manos levantadas	8/12/25							10:27:44 AM		
Izabella Woyames (No comprobado)	Audio activado	8/12/25							10:28:31 AM		
Izabella Woyames (No comprobado)	Manos levantadas	8/12/25							10:29:11 AM		
Izabella Woyames (No comprobado)	Cámara encendida	8/12/25							10:29:20 AM		
Izabella Woyames (No comprobado)	Manos levantadas	8/12/25							10:36:30 AM		
Izabella Woyames (No comprobado)	Manos levantadas	8/12/25							10:42:33 AM		

10:58:42 AM	56 min 31 s	gcamargo@agenciaatenea.gov.co	gcamargo@agenciaatenea.gov.co	Organizador		1	5
10:58:35 AM	59 min 1 s	yaragon@agenciaatenea.gov.co	yaragon@agenciaatenea.gov.co	Moderador	1	5	
10:58:33 AM	56 min 34 s	dgonzalez@agenciaatenea.gov.co	dgonzalez@agenciaatenea.gov.co	Moderador			2
10:58:36 AM	56 min 4 s		Moderador	1			
11:00:24 AM	57 min 52 s		Moderador				
10:58:36 AM	56 min 4 s		Moderador	5			
10:58:34 AM	56 min 2 s		Moderador	6			
10:58:35 AM	55 min 23 s	apenagos@agenciaatenea.gov.co	apenagos@agenciaatenea.gov.co	Moderador			2


10:58:42 AM	56 min 31 s	gcamargo@agenciaatenea.gov.co	Organizador	
10:58:35 AM	59 min 1 s	yaragon@agenciaatenea.gov.co	Moderador	
10:58:33 AM	56 min 34 s	dgonzalez@agenciaatenea.gov.co	Moderador	
10:58:36 AM	56 min 4 s		Moderador	
11:00:24 AM	57 min 52 s		Moderador	
10:58:36 AM	56 min 4 s		Moderador	
10:58:34 AM	56 min 2 s		Moderador	
10:58:35 AM	55 min 23 s	apenagos@agenciaatenea.gov.co	Moderador	
10:58:36 AM	53 min 34 s		Moderador	



Kuepa Edutech

Talento Capital - Convocatoria 4

ket
kuepa EduTech

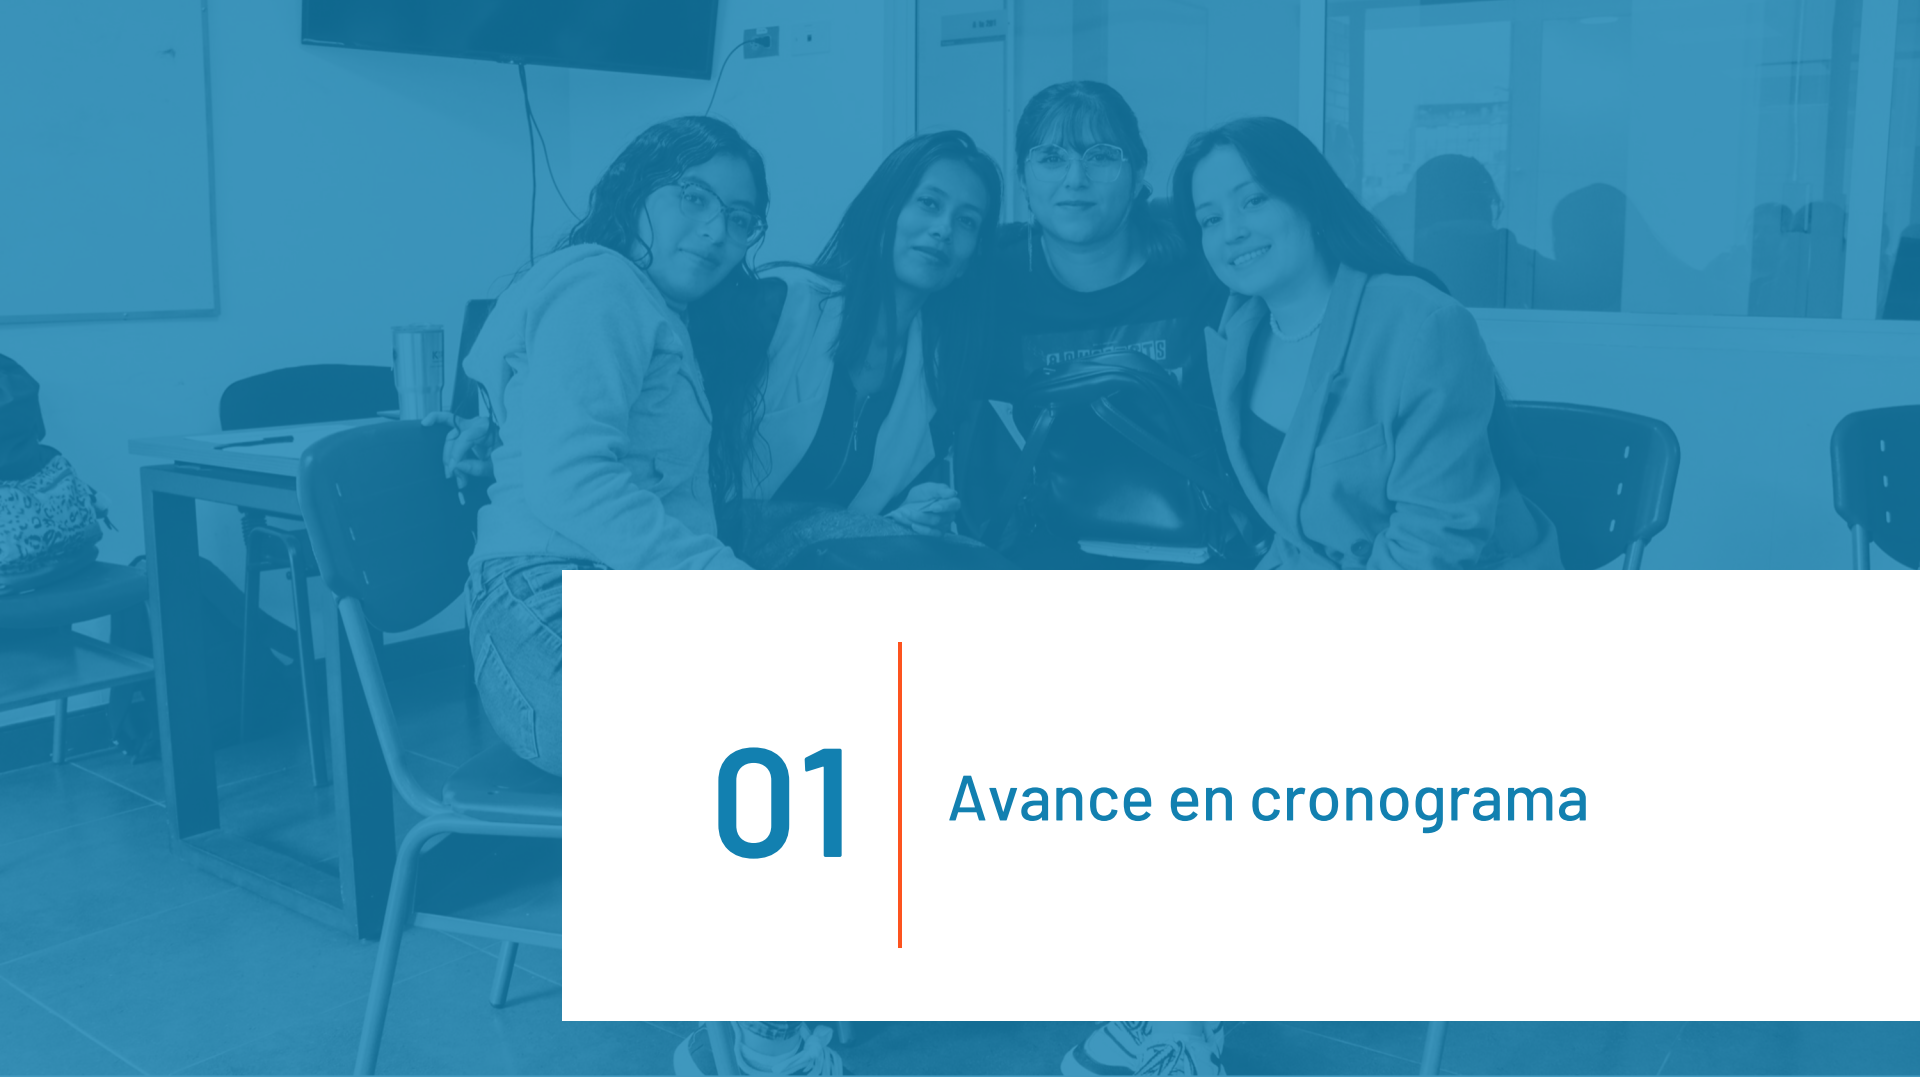


01 Avance en cronograma

Avance Cronograma

Etapa	Inicio	Fin	Avance Promedio
Alistamiento	21/03/25	11/07/25	100%
Cierre	04/08/25	10/10/25	0%
Estrategia de comunicación	12/04/25	31/10/25	87%
Formación	17/04/25	06/09/25	89%
Formalización y matrícula	21/03/25	13/06/25	100%
Seguimiento actividades de acompañamiento y permanencia	12/04/25	03/08/25	100%
Seguimiento cumplimiento de tasas	14/05/25	30/09/25	79%
Seguimiento monitoreo y control	21/03/25	31/10/25	74%
Seguimiento de las actividades con el sector real	13/05/25	11/10/25	92%
Total general	**21/03/25**	**31/10/25**	**84%**

ket
kuepa EduTech

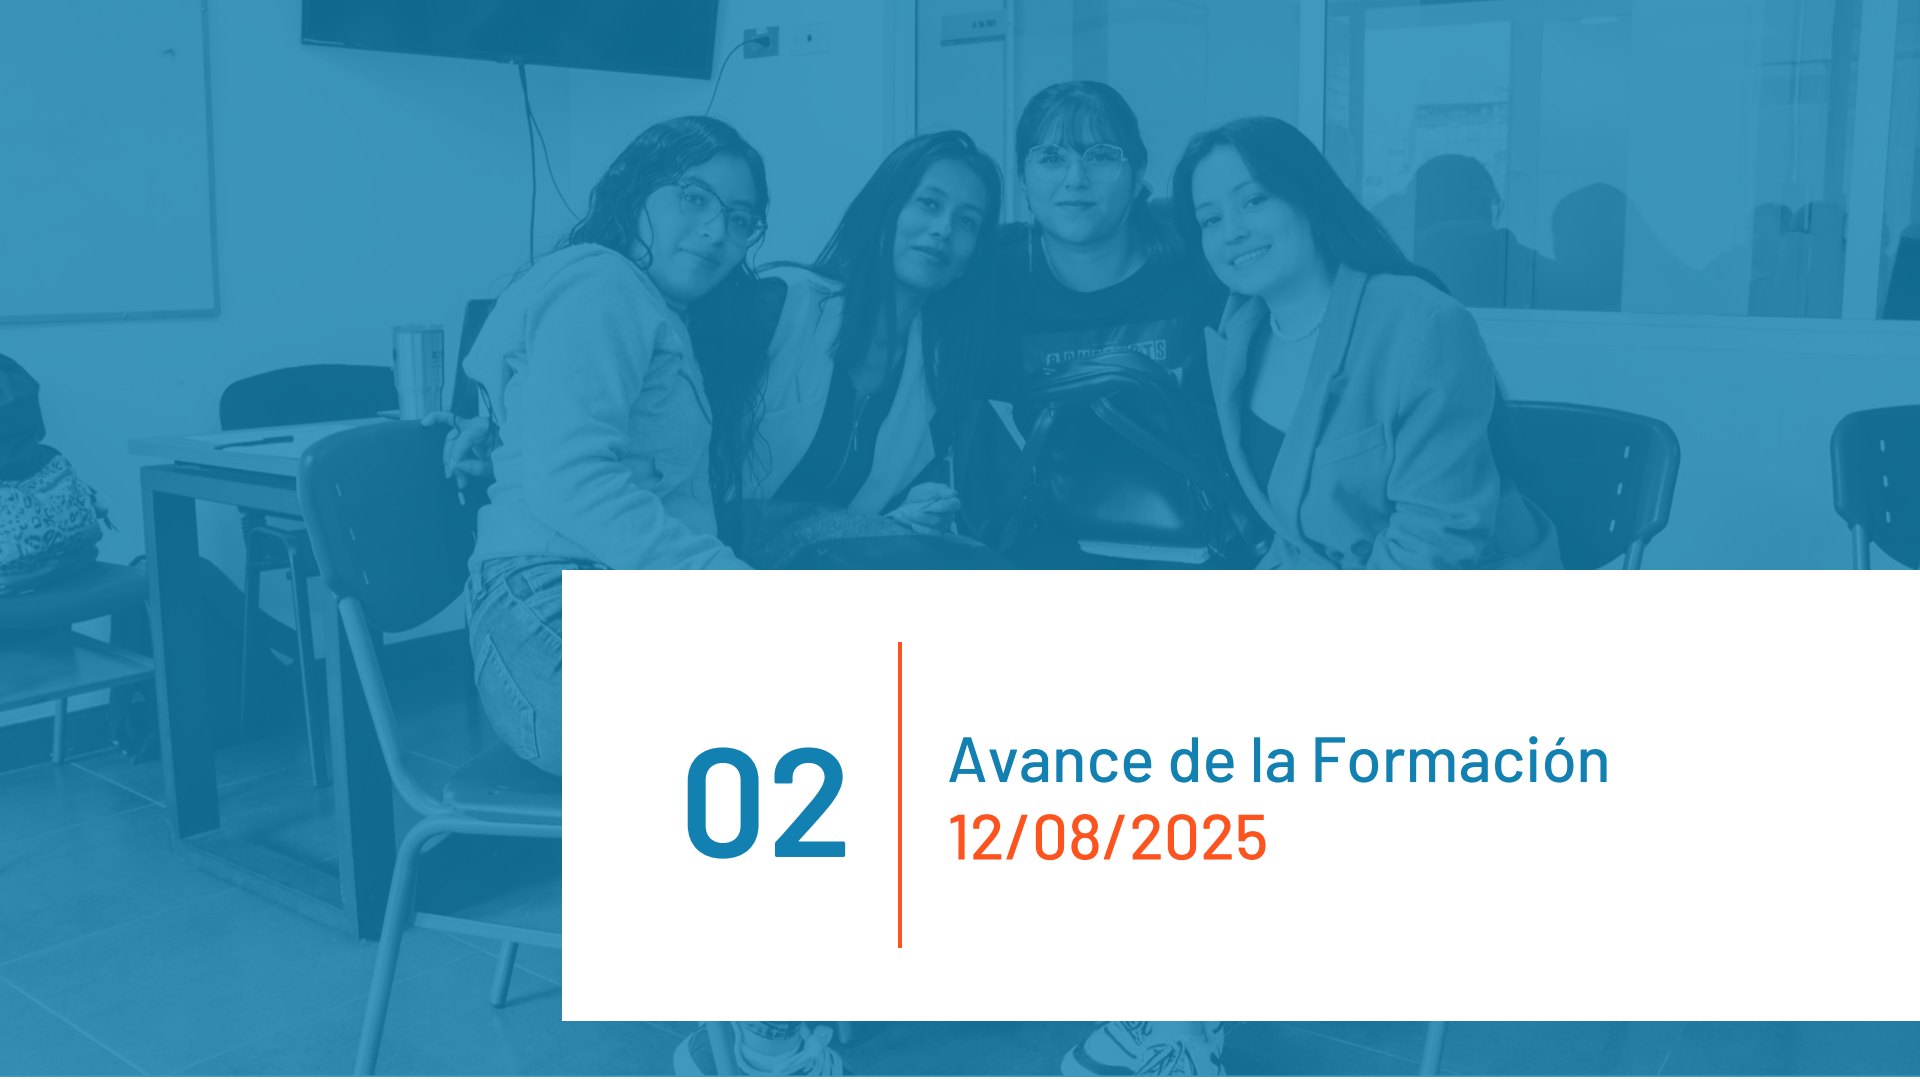

02

Avance de la Formación

12/08/2025

MATRÍCULA
PROCESO DE FORMALIZACIÓN

Base	Población
Prioridad 1	571
Prioridad 2	79
Total	650

Meta formalización:**544**

Tasa de Formalización
114%

Situación	Prioridad 1	Prioridad 2	Total
Formalizados	556	66	**622***

*Ajuste realizado a corte del 7 de julio de 2025

ket
kuepa EduTech

Resultados de la Estrategia de Recuperación Asincrónica (08/08/2025)

	# Estudiantes	Recuperados
Consumo Plataforma	35	20
Trabajo asincrónico	75	17



ket
kuepa EduTech

Indicador Avance Formación

Reporte Estados con indicador de aprobación

Estado	Estudiantes	Percentual	Rango de Asistencia
Aprobado	416	67	>70%
En formación	34	5	50% a 69%
En seguimiento	57	9	25 a 49%
En riesgo deserción	103	17	<25%
Matriculado Inactivo	12	2	0
TOTAL	622	100	NA

Cierre 11/08/2025

ket
kuepa EduTech

Porcentaje de aprobación

416 Estudiantes
Entrenamiento para tomar certificados de industria

ESTUDIANTES APROBADOS INDICADOR				
Programa	**Básico**	**Intermedio**	**Avanzado**	**Total**
Marketing Digital	198	19	9	226
Soporte Técnico en Sistemas	70	5	0	75
Analista de Sistemas Informaticos	58	15	7	80
Gestión en Mesa de Servicio	29	6	0	35
TOTAL	355	45	16	**416**



ket
kuepa EduTech


Skill Up Marketing



SKILL UP MARKETING	
Básico	198
Intermedio	19
Avanzado	9
TOTAL	**226**
Asistentes Sábado	140
Asistentes Lunes	106
PROMEDIO ASISTENTES	**123**

El equipo Kuepa invitó a 226 estudiantes del curso Marketing Digital, para que asistieron a las jornadas de Skill Up para prepararse para el examen de certificación de industria.

ket
kuepa EduTech

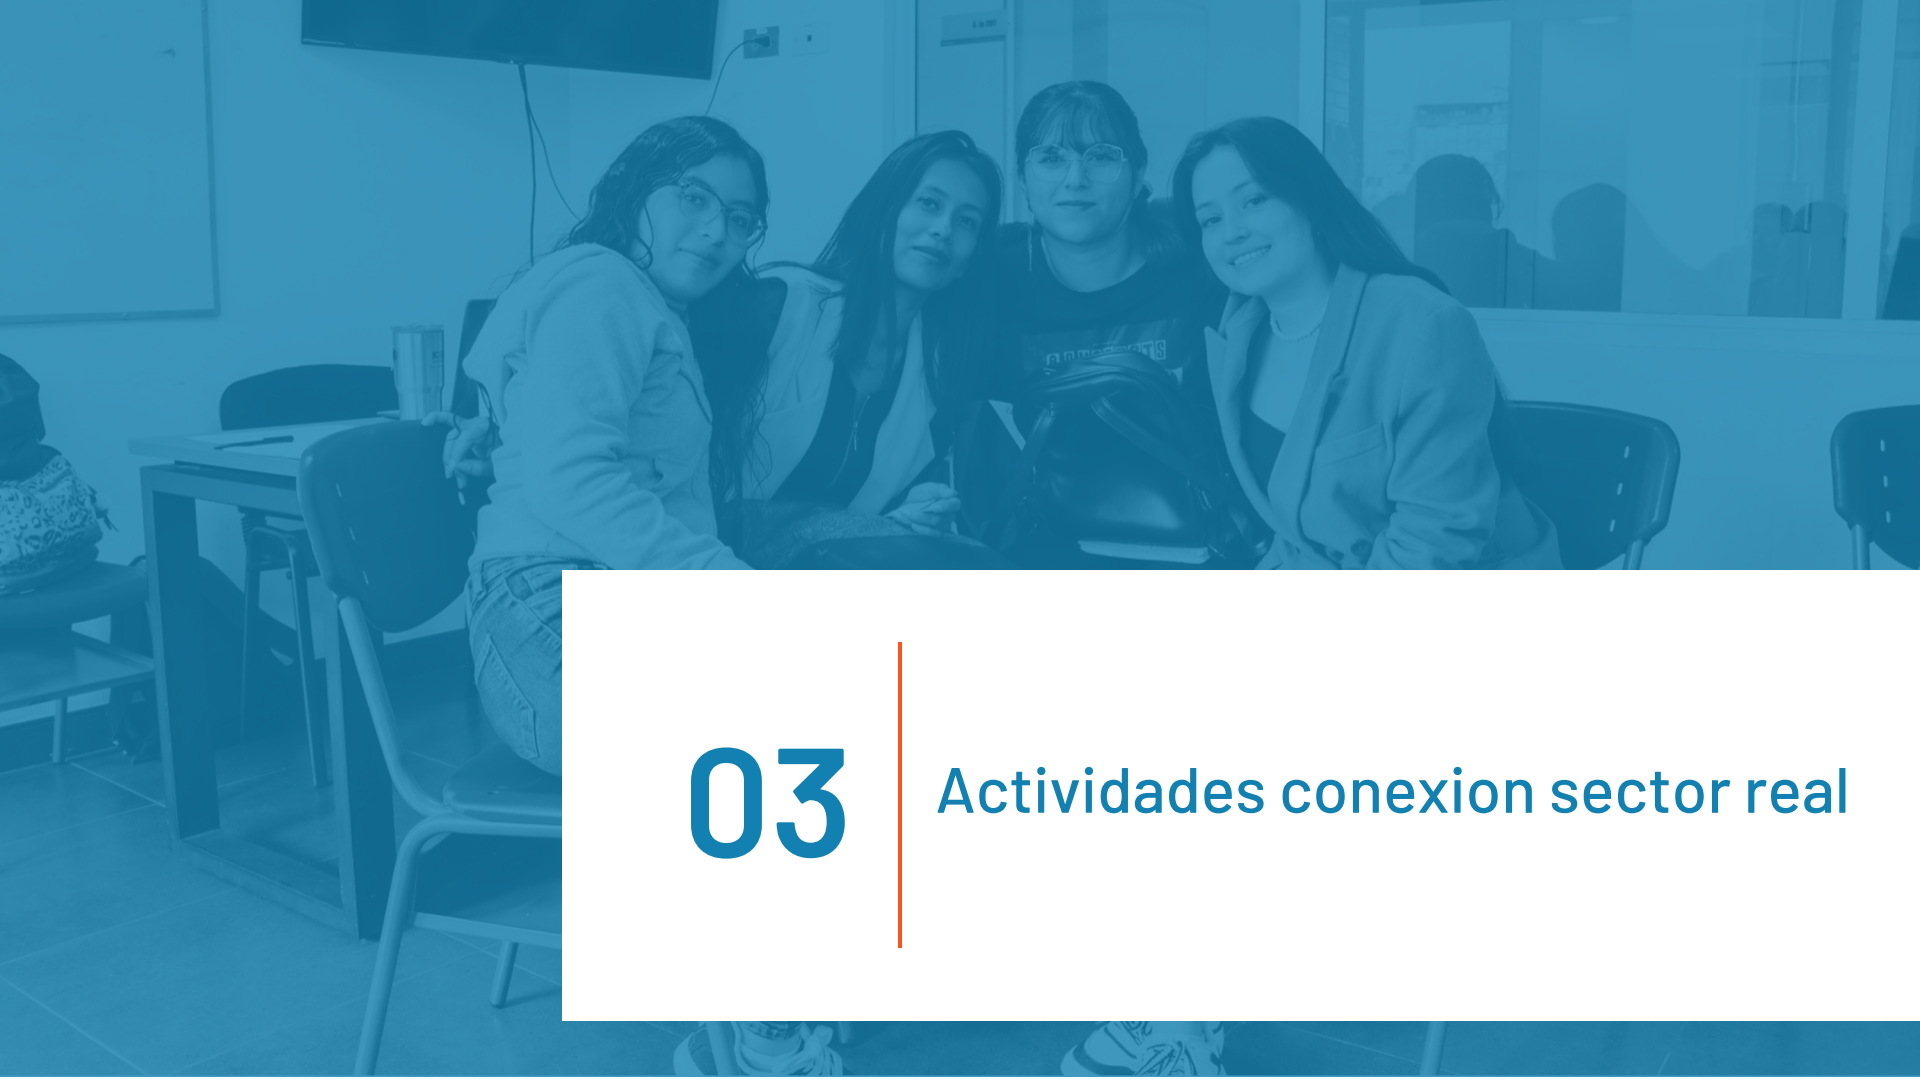

03

Actividades conexion sector real

Avance Actividades Conexion Sector Real

Actividad	Estado
Encuesta de Entrada	Finalizada Radicación: 19/06/2025
Enrutamiento al SISE	Finalizada 20 de Junio Informe entregado
Feria de empleo	Finalizada 15 de julio Informe entregado
Charla de expertos	Finalizada: 23 de julio Informe entregado
Entrenamiento en pruebas de selección	Finalizada: 23 de julio Informe entregado
Mapeo oportunidad de proyectos	Finalizado: Cartilla entregada

ket
kuepa EduTech

Avance Actividades Conexion Sector Real

Actividad	Estado
Inmersión sectorial	En gestión: 11 y 12 de agosto 11 Agosto Marketing Digital, Gestión Mesa de servicio): Finalizado 12 Agosto: Análisis Sit. Informáticos, Soport. Tec. Sistemas
Encuesta de Salida	Pendiente Lineamiento
Base por PILA Colocación	Pendiente de recepción

Inmersión Sectorial

Metodología: Modalidad Virtual - Assessment Center

- El reto será presentado por las empresa aliadas que deseen participar, docentes de formación y retroalimentación final.

- **Estado**: En gestión

    - **Agosto 11** (Marketing Digital, Gestión Mesa de servicio)
        - Asistencia: Marketing Digital 43 personas
        - Asistencia: Gestión Mesa de Servicio: 14 Personas

    - **Agosto 12** (Análisis Sit. Informáticos, Soport. Tec. Sistemas)
        - Informe Pendiente



Colocación


Remisiones: *Total de veces que se remitieron personas a vacantes. Una misma persona puede haber sido remitida a varias vacantes, por lo que el número de remisiones es mayor que el número de personas remitidas.*

Personas remitidas: *Número total de personas que fueron referenciadas por el operador a vacantes específicas dentro del marco de la feria. Cada persona se cuenta una sola vez, sin importar cuántas vacantes se le hayan asignado.*

RESULTADOS DE INTERMEDIACIÓN	TOTAL
REMISIONES FERIA + INTERMEDIACIÓN	734
PERSONAS REMITIDAS FERIA + INTERMEDIACIÓN	219

PERSONAS	TOTAL
PERS. PENDIENTES POR RETROALIMENTACIÓN	54
PERS. NO ASISTE A PROCESO /DESISTE	151
PERSONAS EN PROCESO	12
PERSONAS COLOCADAS POR OPERADOR	3
PERSONAS COLOCADAS “OTRO”	19


RAZÓN NO CONTINUIDAD	Suma total
Lista de espera	13
Desiste de la oferta	77
No aplica perfil	13
No asiste a entrevista	18
No contesta	24
Prácticas	1
Ya se encuentra trabajando	5

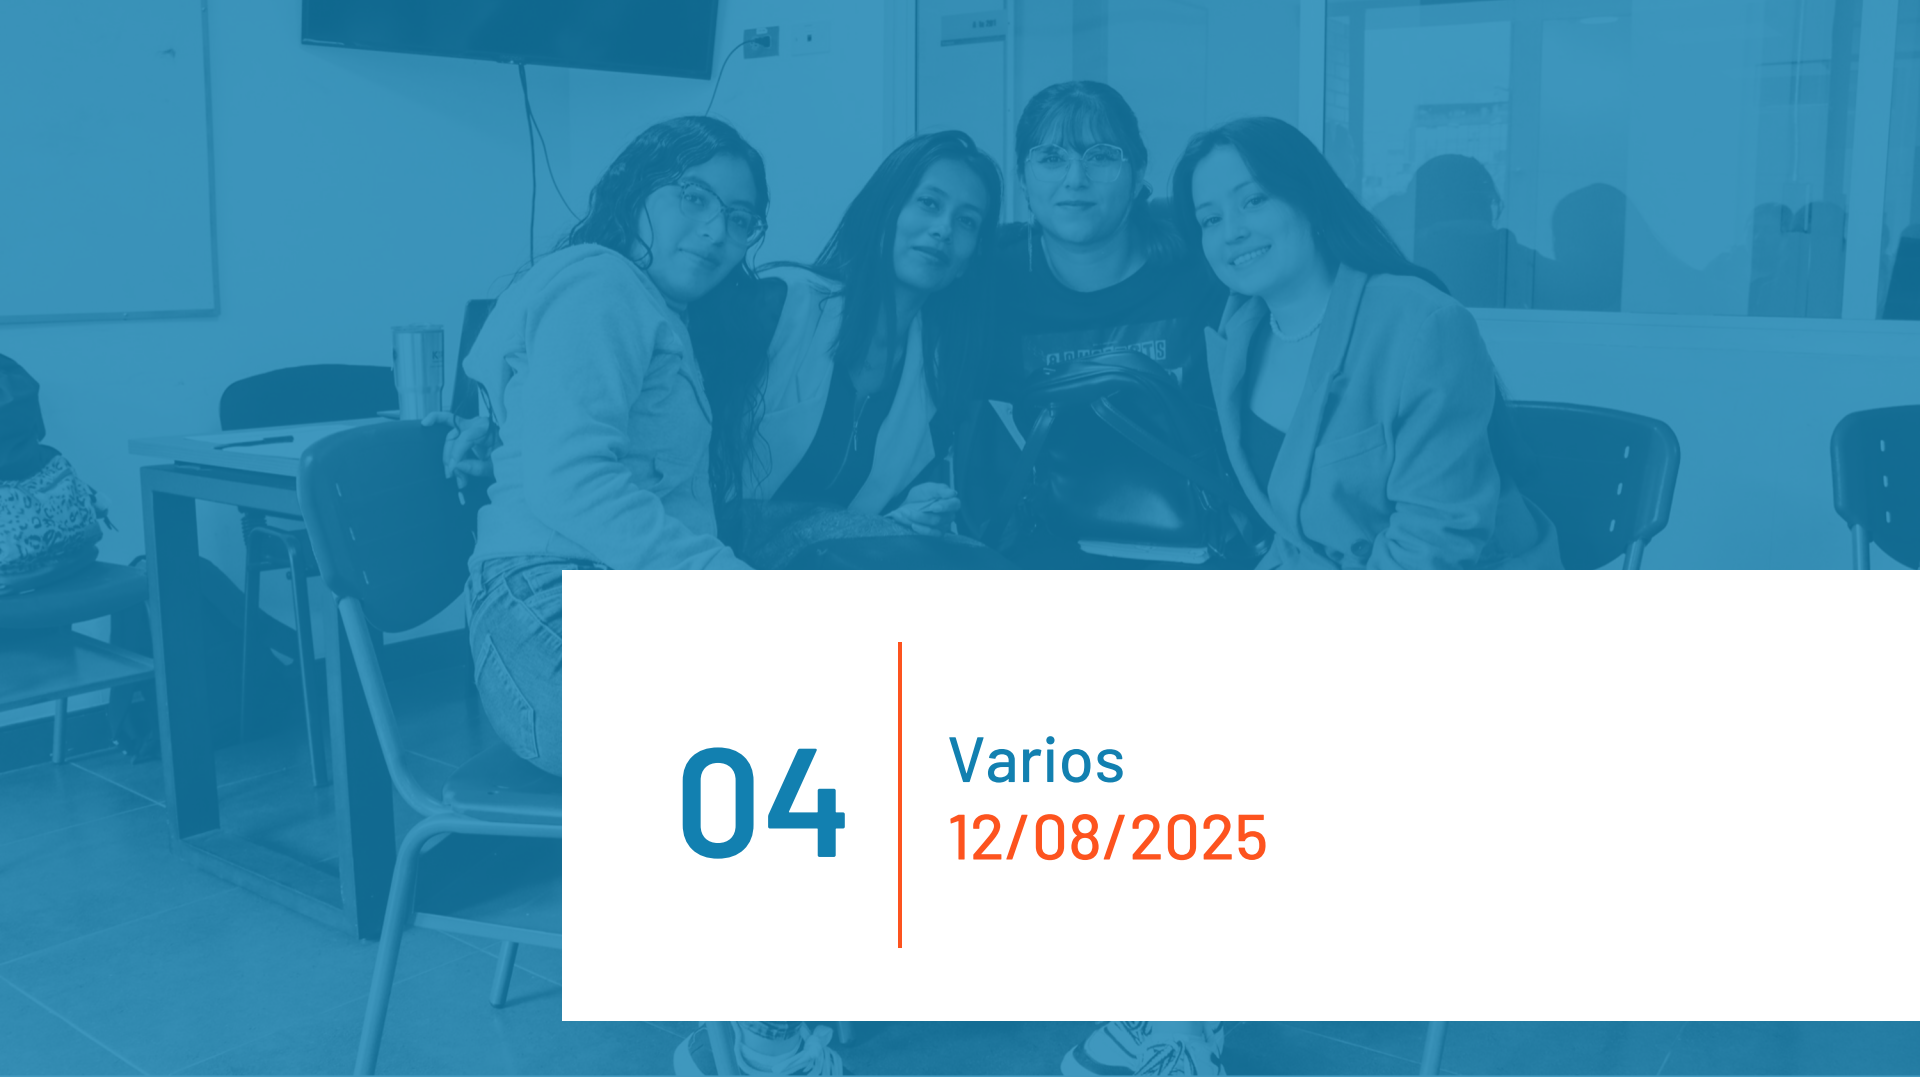

04

Varios

12/08/2025

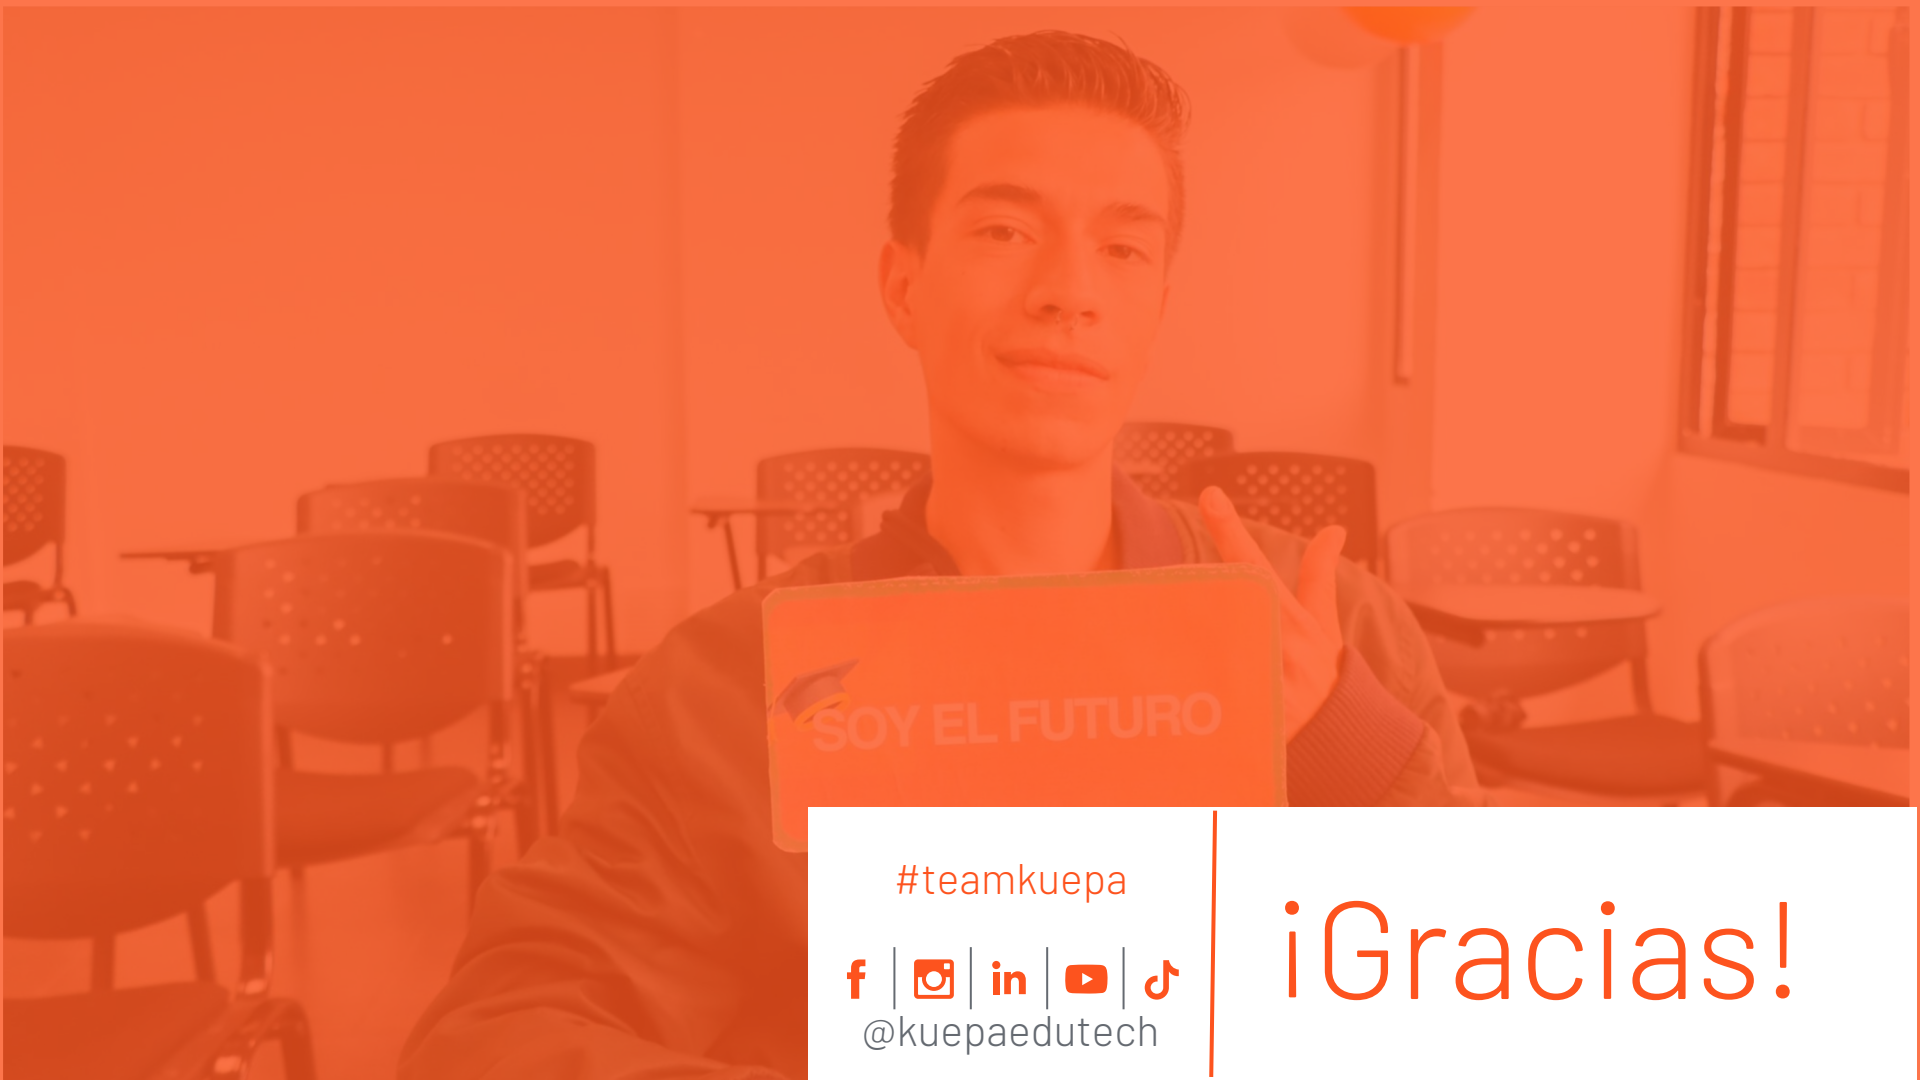

#teamkuepa

@kuepaedutech

¡Gracias!

TEMA:	Seguimiento semanal Contrato Atenea 380-2025
PROCESO:	Talento Capital Formación - Jóvenes con Oportunidades

FECHA:	**19/08/2025**	**Hora Inicio**	**04:00**
		Hora Final	**05:00**

1. ORDEN DEL DÍA:

1.1. Avance cronograma proyecto

1.2. Avance formación (Desarrollo proceso de formación, avance actividades de seguimiento y permanencia, etc)

1.3. Avance actividades de conexión con el sector real.

1.4. Proposiciones y Varios

2. DESARROLLO: Se presentó el informe sobre el avance de la formación, destacando un cumplimiento del **74%** en la iniciativa del contrato y un **65.73%** de asistencia general.

Avance Cronograma

Etapa	Inicio	Fin	Avance Promedio
Alistamiento	21/03/25	11/07/25	100%
Cierre	04/08/25	10/10/25	0%
Estrategia de comunicación	12/04/25	31/10/25	72%
Formación	17/04/25	06/09/25	73%
Formalización y matrícula	21/03/25	13/06/25	100%
Seguimiento actividades de acompañamiento y permanencia	12/04/25	03/08/25	100%
Seguimiento cumplimiento de tasas	14/05/25	30/09/25	79%
Seguimiento monitoreo y control	21/03/25	31/10/25	48%
Seguimiento de las actividades con el sector real	13/05/25	11/10/25	95%
Total general	**21/03/25**	**31/10/25**	**74%**

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

Se implementó una estrategia de recuperación que permitió poner al día a **104** estudiantes, logrando un nivel de aprobación del **80%** en los programas de formación. Se discutió la importancia de los programas de marketing para las actividades de certificación y se mantuvo una comunicación constante para consolidar los resultados.

El equipo Atenea solicitó la actualización de la base de datos de formación, incluyendo estados de aprobados, no aprobados y abandonos, y se acordó que sin documentación clara, los abandonos se clasificarían como no aprobados.

Si el caso del estudiante cuenta con el soporte, se tipifica como abandono a la formación y si no se tiene, se deja como no aprobado. Esto con el fin de que quede la constancia de que si se buscó al estudiante y se le solicitó la deserción por escrito, dejar evidencia de los diferentes contactos que se tuvo sin respuesta exitosa de parte de él para el caso en que el estudiante manifieste lo contrario.

Se abordó la necesidad de documentar el progreso de los estudiantes y se presentó un formato específico para reportar certificaciones. Se compartieron estadísticas sobre la dispersión de estudiantes en programas de formación, con un enfoque en el éxito en certificaciones de Google Analytics.

El equipo Kuepa informó sobre las ocho horas de capacitación realizadas en skill Up, resultando en **80** certificaciones. Se discutió la organización de las carpetas en el Drive, acordando que la estructura debe ser por sesiones para facilitar el seguimiento y mantener una trazabilidad adecuada.
Se coordinaron acciones para continuar con el trabajo, incluyendo una reunión de avance al día siguiente.

Actividades conexión sector real:
Se presentó un informe sobre las actividades de conexión con el sector real, revelando que **416** estudiantes fueron aprobados, de los cuales **265** no estaban trabajando, pero desean emplearse. Sin embargo, al momento de hablar directamente con ellos dicen que respondieron mal o quisieron decir esto para buscar una mejor opción.

Se planteó la necesidad de ajustar las estrategias de colocación para maximizar el número de estudiantes empleados, considerando las preferencias de los estudiantes y las regulaciones de seguridad social. Se acordó seguir trabajando en la información relacionada con los cruces de datos y unificar la encuesta de salida.

Se requiere el visto bueno final del equipo Kuepa para subir el ajuste de Inmersión Sectorial.
La encuesta de salida, ya la compartió el equipo Atenea y en espera del cruce con Pila.
El 22 de agosto se espera entregar informe de Assessment center.

Se está trabajando en la posibilidad de vacantes para un grupo de **26** personas que tienen algún tipo de discapacidad, con la empresa ATENTO, sin embargo algunos no cuentan con el certificado de discapacidad lo cual no permite el vínculo laboral con las empresas.

3. CONCLUSIONES: Se revisaron los avances en los proyectos en curso. Se destacó la importancia de cumplir con los plazos establecidos y mantener comunicación constante.
Se definieron los responsables de cada una de las tareas, enfatizando la necesidad de documentar los procesos para mejorar la trazabilidad.

Se discutió la necesidad de realizar un seguimiento semanal de los pendientes y de reforzar la coordinación entre las distintas áreas.

Se acordó establecer fechas de entrega más claras y designar responsables para cada fase del proyecto.

4. COMPROMISOS: El equipo Kuepa enviará la base ajustada con corte al 8 a Atenea
El equipo Atenea solicitará la actualización de la base semanal con los estados de aprobados, no aprobados y abandono.
El equipo Kuepa actualizará la base de datos con los últimos ajustes de números y enviará la versión final con los aprobados. Coordinará la revisión de las carpetas de los estudiantes junto con equipo Atenea.
El equipo Kuepa enviará la encuesta de salida para su aplicación.
El equipo Kuepa enviará la base ajustada con corte al ocho.

1.1 PENDIENTES DE REUNIONES ANTERIORES

PÚBLICA

REUNIÓN	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	ESTADO
12/08/2025	Recepción de base PILA validada	ATENEA	19/08/2025	Completado
12/08/2025	Finalización de sesiones presenciales	KUEPA	19/08/2025	Completado
12/08/2025	Entrega de informe de Feria de Empleo	KUEPA	19/08/2025	Completado
12/08/2025	Actualización de matriz de colocación	KUEPA	19/08/2025	Completado

1.2 PENDIENTES REUNIÓN ACTUAL

REUNIÓN	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	ESTADO
19/08/2025	Entregar estado de aprobados finales	KUEPA	20/08/2025	Completado
19/08/2025	Entregar base con aprobados y no aprobados.	KUEPA	20/08/2025	Completado
19/08/2025	Entregar base con abandono documentados	KUEPA	20/08/2025	Completado
19/08/2025	Base de datos para reportar la población que se está certificando	KUEPA	20/08/2025	Completado
19/08/2025	Ajustes entrenamiento pruebas de selección	KUEPA	20/08/2025	Completado
19/08/2025	Entrega de modelo para certificación	ATENEA	25/08/2025	Completado
19/08/2025	Revisar ajustes de charla con expertos y Feria de empleo y Cartilla	ATENEA	25/08/2025	Completado
19/08/2025	Cruce de base de PILA	ATENEA	25/08/2025	Completado
19/08/2025	Compartir uno a uno actualizado	KUEPA	25/08/2025	Completado

LISTADO DE ASISTENCIA

NOMBRE	FIRMA
Mario Briceño	Listado adjunto (teams)

PÚBLICA

Vanessa Achury	Listado adjunto (teams)
Izabella Woyames	Listado adjunto (teams)
Sebastián Suarez	Listado adjunto (teams)
Heidy Herrera	Listado adjunto (teams)
Diana María González	Listado adjunto (teams)
Gina Paola Camargo Rodríguez	Listado adjunto (teams)
Yiza Yelena Aragón	Listado adjunto (teams)
Andrea Natalia Penagos	Listado adjunto (teams)

PÚBLICA

(Virtual)_A380_2025_Kuepa Edutech_Reunión de seguimiento - Informe de asistencia 8-19-25

1. Resumen										
Título de la reunión	(Virtual)_A380_2025_Kuepa Edutech_Reunión de seguimiento									
Participantes que asistieron	13									
Hora de inicio	8/19/25								3:56:14 PM	
Hora de finalización	8/19/25								5:13:28 PM	
Duración de la reunión	1 h 17 min 13 s									
Tiempo medio de asistencia	1 h 58 s									
2. Participantes										
Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol	Interacción: Reacción-Aplauso	Interacción: Reacción-Me divierte	Interacción: Reacción	
Gina Paola Camargo Rodríguez	8/19/25								4:02:04 PM	8/19/25
Yiza Yelena Aragon Lozano	8/19/25								3:59:45 PM	8/19/25
Diana María Gonzalez Wilches	8/19/25								4:00:51 PM	8/19/25
read.ai meeting notes (No comprobado)	8/19/25								4:02:02 PM	8/19/25
Jennyfer Piñeros (No comprobado)	8/19/25								4:02:02 PM	8/19/25
Fireflies.ai Notetaker Izabell (No comprobado)	8/19/25								4:02:02 PM	8/19/25
Mario Briceno (No comprobado)	8/19/25								4:02:02 PM	8/19/25
Ximena García	8/19/25								4:02:03 PM	8/19/25
Vanessa Achury (No comprobado)	8/19/25								4:02:08 PM	8/19/25
Heidy Herrera (No comprobado)	8/19/25								4:03:03 PM	8/19/25
Sebastián S (No comprobado)	8/19/25								4:03:32 PM	8/19/25
Izabella Woyames (No comprobado)	8/19/25								4:04:22 PM	8/19/25
Lilia Ximena Garcia Niño	8/19/25								4:15:21 PM	8/19/25
3. Actividades de la reunión										
Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol					
Gina Paola Camargo Rodríguez	8/19/25								4:02:04 PM	8/19/25
Yiza Yelena Aragon Lozano	8/19/25								3:59:45 PM	8/19/25
Diana María Gonzalez Wilches	8/19/25								4:00:51 PM	8/19/25
read.ai meeting notes (No comprobado)	8/19/25								4:02:02 PM	8/19/25
Jennyfer Piñeros (No comprobado)	8/19/25								4:02:02 PM	8/19/25
Fireflies.ai Notetaker Izabell (No comprobado)	8/19/25								4:02:02 PM	8/19/25
Mario Briceno (No comprobado)	8/19/25								4:02:02 PM	8/19/25
Ximena García	8/19/25								4:02:03 PM	8/19/25
Vanessa Achury (No comprobado)	8/19/25								4:02:08 PM	8/19/25
Heidy Herrera (No comprobado)	8/19/25								4:03:03 PM	8/19/25
Sebastián S (No comprobado)	8/19/25								4:03:32 PM	8/19/25
Izabella Woyames (No comprobado)	8/19/25								4:04:22 PM	8/19/25
Lilia Ximena Garcia Niño	8/19/25								4:15:21 PM	8/19/25
4. Interacción en la reunión										
Nombre	Tipo de compromiso	Tiempo								
Gina Paola Camargo Rodríguez	Audio activado	8/19/25							4:02:17 PM	
Gina Paola Camargo Rodríguez	Audio activado	8/19/25							4:03:39 PM	
Gina Paola Camargo Rodríguez	Audio activado	8/19/25							4:11:55 PM	
Gina Paola Camargo Rodríguez	Audio activado	8/19/25							4:13:54 PM	
Gina Paola Camargo Rodríguez	Audio activado	8/19/25							4:14:42 PM	
Yiza Yelena Aragon Lozano	Audio activado	8/19/25							4:02:07 PM	
Yiza Yelena Aragon Lozano	Manos levantadas	8/19/25							4:13:52 PM	
Yiza Yelena Aragon Lozano	Audio activado	8/19/25							4:14:05 PM	
Yiza Yelena Aragon Lozano	Audio activado	8/19/25							4:20:34 PM	
Yiza Yelena Aragon Lozano	Audio activado	8/19/25							4:30:22 PM	
Yiza Yelena Aragon Lozano	Audio activado	8/19/25							4:33:52 PM	
Diana María Gonzalez Wilches	Audio activado	8/19/25							4:44:39 PM	
Diana María Gonzalez Wilches	Audio activado	8/19/25							4:51:07 PM	
Diana María Gonzalez Wilches	Audio activado	8/19/25							4:52:42 PM	
Diana María Gonzalez Wilches	Audio activado	8/19/25							5:04:11 PM	
Diana María Gonzalez Wilches	Audio activado	8/19/25							5:08:41 PM	
Jennyfer Piñeros (No comprobado)	Audio activado	8/19/25							4:02:21 PM	
Jennyfer Piñeros (No comprobado)	Audio activado	8/19/25							5:11:32 PM	
Mario Briceno (No comprobado)	Audio activado	8/19/25							4:02:22 PM	
Mario Briceno (No comprobado)	Cámara encendida	8/19/25							4:02:31 PM	
Mario Briceno (No comprobado)	Cámara encendida	8/19/25							4:15:29 PM	
Mario Briceno (No comprobado)	Cámara encendida	8/19/25							4:26:02 PM	
Mario Briceno (No comprobado)	Cámara encendida	8/19/25							4:32:41 PM	
Mario Briceno (No comprobado)	Cámara encendida	8/19/25							4:43:00 PM	
Ximena García	Audio activado	8/19/25							3:57:57 PM	
Vanessa Achury (No comprobado)	Audio activado	8/19/25							4:02:29 PM	
Vanessa Achury (No comprobado)	Manos levantadas	8/19/25							4:27:39 PM	
Vanessa Achury (No comprobado)	Audio activado	8/19/25							4:29:20 PM	
Vanessa Achury (No comprobado)	Audio activado	8/19/25							4:29:31 PM	
Vanessa Achury (No comprobado)	Audio activado	8/19/25							4:30:30 PM	
Vanessa Achury (No comprobado)	Manos levantadas	8/19/25							4:35:29 PM	
Vanessa Achury (No comprobado)	Audio activado	8/19/25							4:35:45 PM	
Vanessa Achury (No comprobado)	Manos levantadas	8/19/25							4:54:53 PM	
Heidy Herrera (No comprobado)	Audio activado	8/19/25							4:43:09 PM	
Heidy Herrera (No comprobado)	Audio activado	8/19/25							5:11:35 PM	
Izabella Woyames (No comprobado)	Cámara encendida	8/19/25							4:04:29 PM	
Izabella Woyames (No comprobado)	Audio activado	8/19/25							4:04:49 PM	
Izabella Woyames (No comprobado)	Manos levantadas	8/19/25							4:12:19 PM	
Izabella Woyames (No comprobado)	Audio activado	8/19/25							4:13:12 PM	
Izabella Woyames (No comprobado)	Cámara encendida	8/19/25							4:13:21 PM	
Izabella Woyames (No comprobado)	Audio activado	8/19/25							4:14:20 PM	
Izabella Woyames (No comprobado)	Cámara encendida	8/19/25							4:14:22 PM	
Izabella Woyames (No comprobado)	Cámara encendida	8/19/25							4:14:49 PM	
Izabella Woyames (No comprobado)	Audio activado	8/19/25							4:15:15 PM	
Izabella Woyames (No comprobado)	"Reacción enviada "me gusta""	8/19/25							4:15:22 PM	
Izabella Woyames (No comprobado)	"Reacción enviada "me gusta""	8/19/25							4:16:29 PM	
Izabella Woyames (No comprobado)	Cámara encendida	8/19/25							4:16:37 PM	
Izabella Woyames (No comprobado)	Audio activado	8/19/25							4:17:57 PM	
Izabella Woyames (No comprobado)	"Reacción enviada "me gusta""	8/19/25							4:21:28 PM	
Izabella Woyames (No comprobado)	"Reacción enviada "me gusta""	8/19/25							4:27:50 PM	
Izabella Woyames (No comprobado)	Manos levantadas	8/19/25							4:29:29 PM	


5:11:45 PM	1 h 9 min 41 s	gcamargo@agenciaatenea.gov.co	gcamargo@agenciaatenea.gov.co	Organizador										5
5:11:40 PM	1 h 11 min 55 s	yaragon@agenciaatenea.gov.co	yaragon@agenciaatenea.gov.co	Moderador							1	5		
5:11:38 PM	1 h 10 min 46 s	dgonzalez@agenciaatenea.gov.co	dgonzalez@agenciaatenea.gov.co	Moderador										5
5:05:59 PM	1 h 3 min 57 s	Moderador												
5:11:42 PM	1 h 9 min 40 s	Moderador						2						
5:13:28 PM	1 h 11 min 25 s	Moderador												
5:11:40 PM	1 h 9 min 37 s	Moderador				5		1						
5:01:25 PM	59 min 21 s	Moderador						1						
5:11:36 PM	1 h 9 min 27 s	Moderador					3	5						
5:11:40 PM	1 h 8 min 36 s	Moderador						2						
5:11:40 PM	1 h 8 min 7 s	Moderador												
4:43:25 PM	39 min 3 s	Moderador			4	5	2	5						
4:16:23 PM	1 min 1 s	lgarcian@agenciaatenea.gov.co	lgarcian@agenciaatenea.gov.co	Moderador										
5:11:45 PM	1 h 9 min 41 s	gcamargo@agenciaatenea.gov.co	Organizador											
5:11:40 PM	1 h 11 min 55 s	yaragon@agenciaatenea.gov.co	Moderador											
5:11:38 PM	1 h 10 min 46 s	dgonzalez@agenciaatenea.gov.co	Moderador											
5:05:59 PM	1 h 3 min 57 s	Moderador												
5:11:42 PM	1 h 9 min 40 s	Moderador												
5:13:28 PM	1 h 11 min 25 s	Moderador												
5:11:40 PM	1 h 9 min 37 s	Moderador												
5:01:25 PM	59 min 21 s	Moderador												
5:11:36 PM	1 h 9 min 27 s	Moderador												
5:11:40 PM	1 h 8 min 36 s	Moderador												
5:11:40 PM	1 h 8 min 7 s	Moderador												
4:43:25 PM	39 min 3 s	Moderador												
4:16:23 PM	1 min 1 s	lgarcian@agenciaatenea.gov.co	Moderador											



Kuepa Edutech

Talento Capital - Convocatoria 4

ket
kuepa EduTech

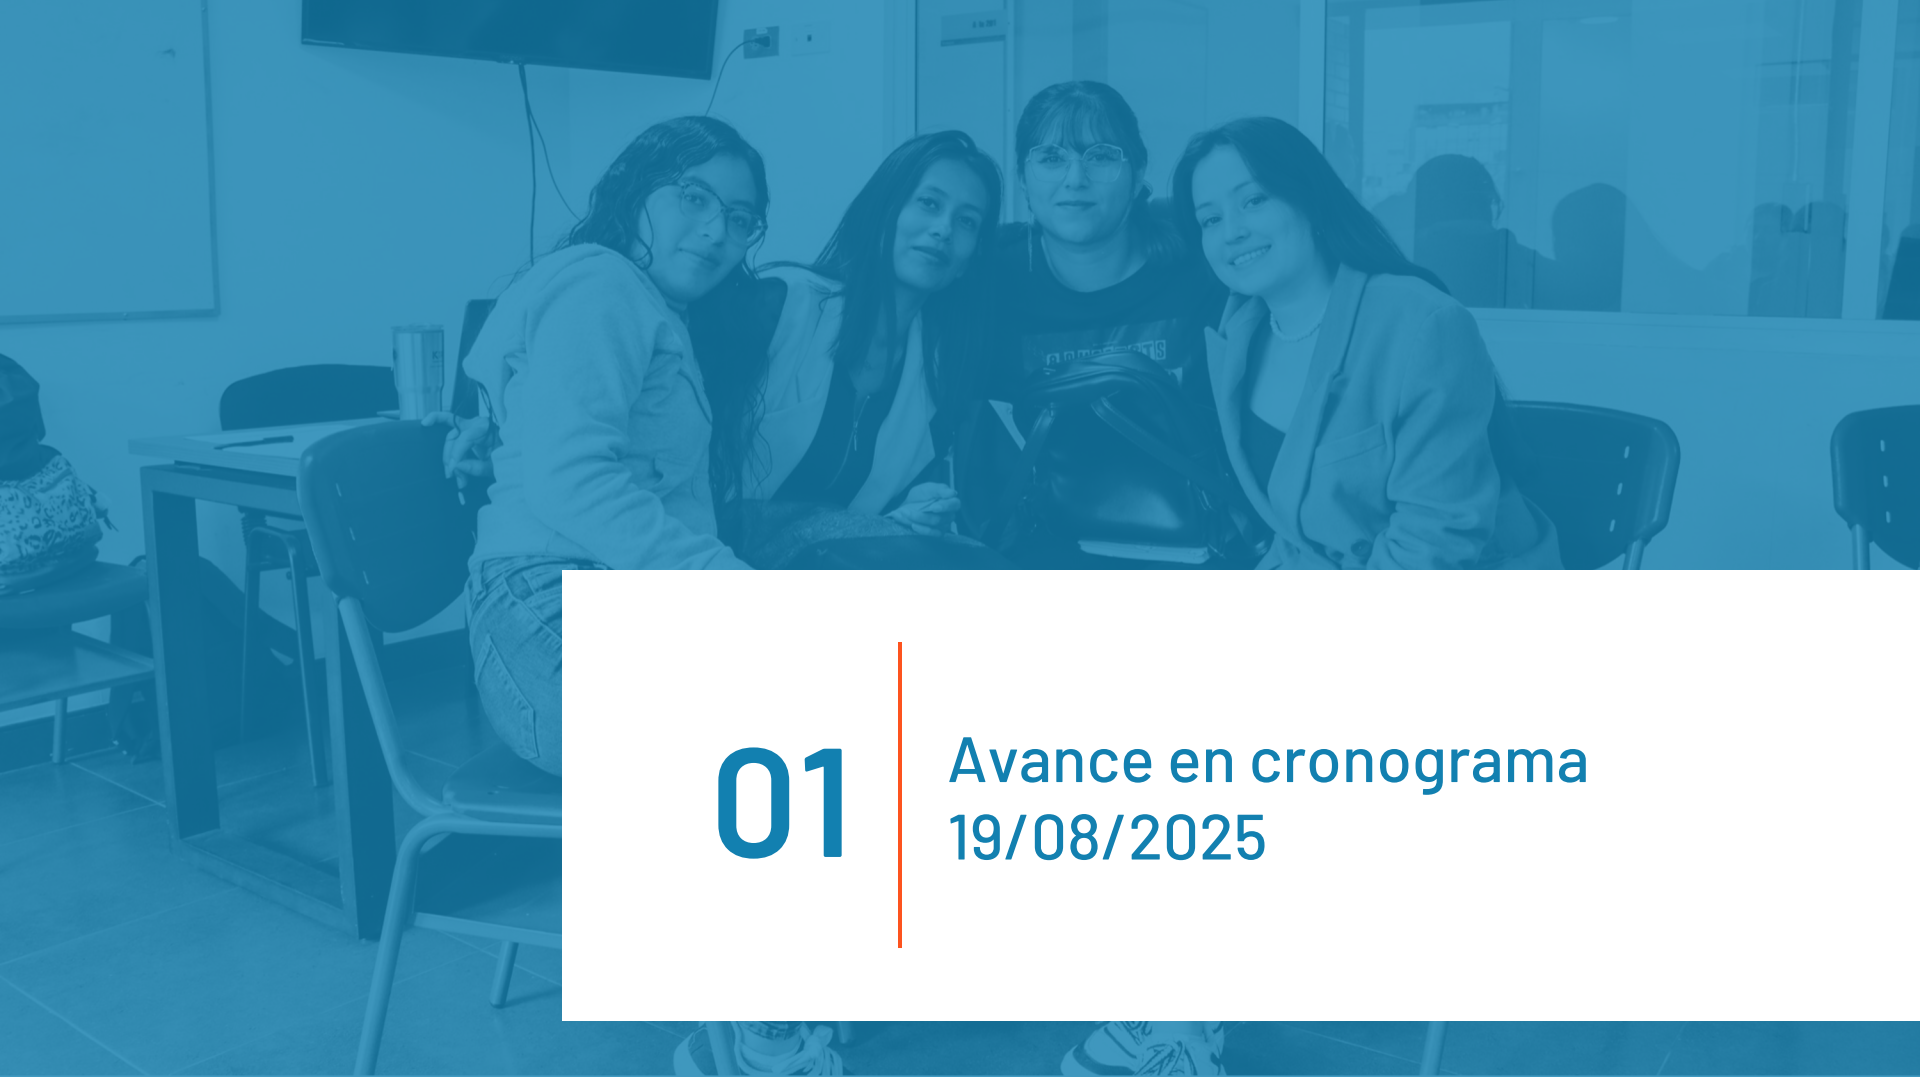

01

Avance en cronograma
19/08/2025

Avance Cronograma

Etapa	Inicio	Fin	Avance Promedio
Alistamiento	21/03/25	11/07/25	100%
Cierre	04/08/25	10/10/25	0%
Estrategia de comunicación	12/04/25	31/10/25	72%
Formación	17/04/25	06/09/25	73%
Formalización y matrícula	21/03/25	13/06/25	100%
Seguimiento actividades de acompañamiento y permanencia	12/04/25	03/08/25	100%
Seguimiento cumplimiento de tasas	14/05/25	30/09/25	79%
Seguimiento monitoreo y control	21/03/25	31/10/25	48%
Seguimiento de las actividades con el sector real	13/05/25	11/10/25	95%
Total general	**21/03/25**	**31/10/25**	**74%**

ket
kuepa EduTech



02

Avance de la Formación

19/08/2025

MATRÍCULA
PROCESO DE FORMALIZACIÓN

Base	Población
Prioridad 1	571
Prioridad 2	79
Total	650

Meta formalización:**544**

Tasa de Formalización
114%


Situación	Prioridad 1	Prioridad 2	Total
Formalizados	556	66	**622***

*Ajuste realizado a corte del 7 de julio de 2025

ket
kuepa EduTech

PERMANENCIA

FORMACIÓN POR GRUPO

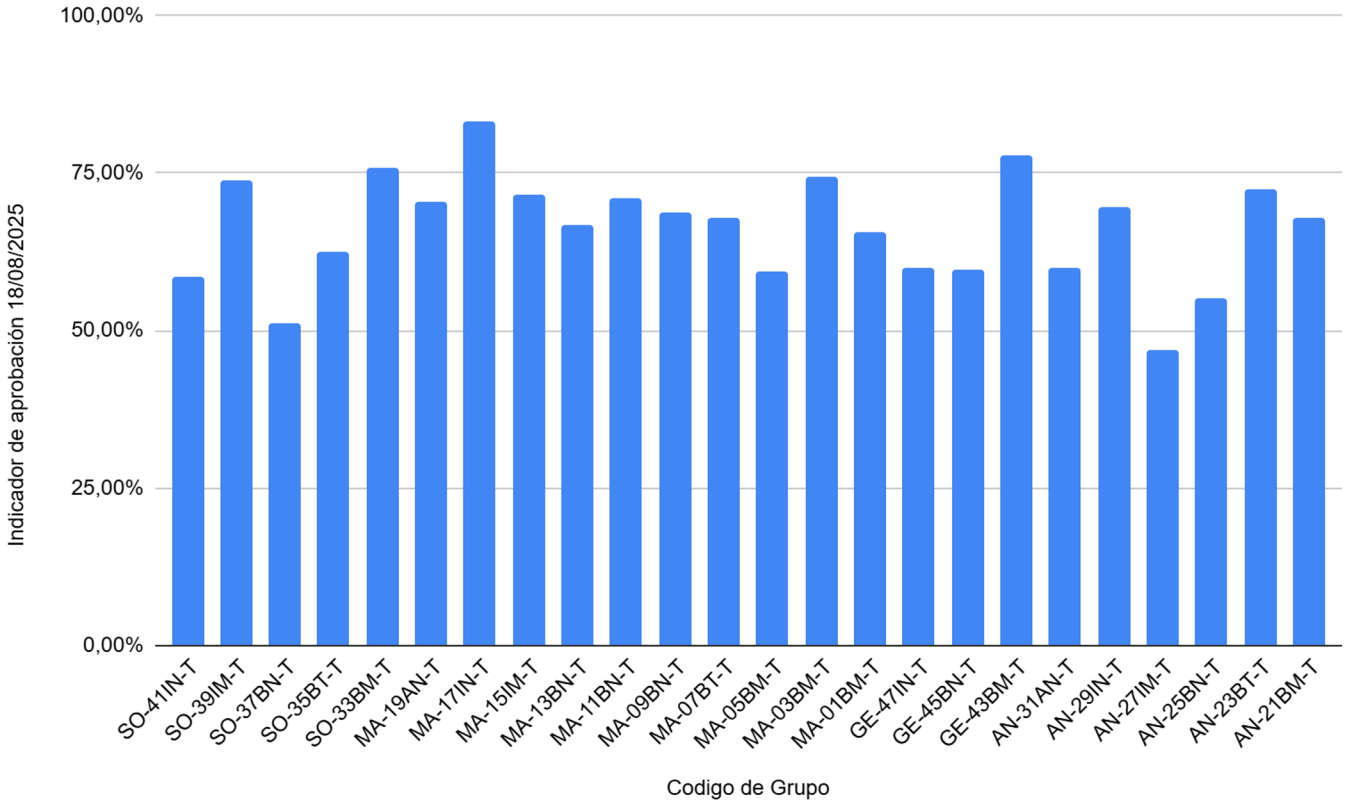


Indicador Semáforo Alerta Asistencia


kuepa

ATENEA
AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

Reporte de indicadores Proyecto Talento Capital

Número de estudiantes	Número de grupos	TOTAL ASISTENCIA
622	24,0	65,73 %





Cierre 18/08/2025

ket
kuepa EduTech

Resultados de la Estrategia de Recuperación Sincrónica

Estado	Habilidades Técnicas	Socioemocional	Estudiantes en Recuperación	Rango de Asistencia
Aprobado	60	44	**104**	>70%
En formación	14	10	24	50% a 69%
En seguimiento	33	0	33	25 a 49%
En riesgo deserción	32	0	32	<25%
Matriculado Inactivo	0	0	0	0
TOTAL	**139**	**22**	**193**	**NA**

De los **193** estudiantes que se priorizaron en la estrategia de recuperación sincrónica, **104** lograron ponerse al día con su proceso de formación.

ket
kuepa EduTech

Resultados de la Estrategia de Recuperación Asincrónica (18/08/2025)

	# Estudiantes	Recuperados
Consumo Plataforma	35	35
Trabajo asincrónico	160	70



ket
kuepa EduTech

Indicador Consolidado Avance Formación

Reporte Estados con indicador de aprobación

Estado	Estudiantes	Percentual	Indicador Aprobación
Aprobado	500	80	>70%
En formación	19	3	50% a 69%
En seguimiento	6	1	25 a 49%
En riesgo deserción	79	13	<25%
Matriculado Inactivo	18	3	0
TOTAL	622	100	NA

Cierre 18/08/2025

ket
kuepa EduTech

Porcentaje de aprobación

500 Estudiantes
Entrenamiento para tomar certificados de industria

ESTUDIANTES APROBADOS INDICADOR				
Programa	**Básico**	**Intermedio**	**Avanzado**	**Total**
Marketing Digital	238	22	10	270
Soporte Técnico en Sistemas	83	8	0	91
Analista de Sistemas Informáticos	67	23	11	101
Gestión en Mesa de Servicio	31	7	0	38
TOTAL	419	60	21	**500**



ket
kuepa EduTech

Resultados preliminares
Certificados de Industria
Marketing – Google Analytics Individual Qualification




Todos los estudiantes aprobados fueron invitados a las jornadas de Skill Up como preparación para presentar el examen de certificación de industria de Marketing Digital - Google Analytics Individual Qualification

80 certificaciones recibidas hasta el 19/08/2025.

Envío de tutorial enseñando a descargar la certificación del sistema.

ket
kuepa EduTech

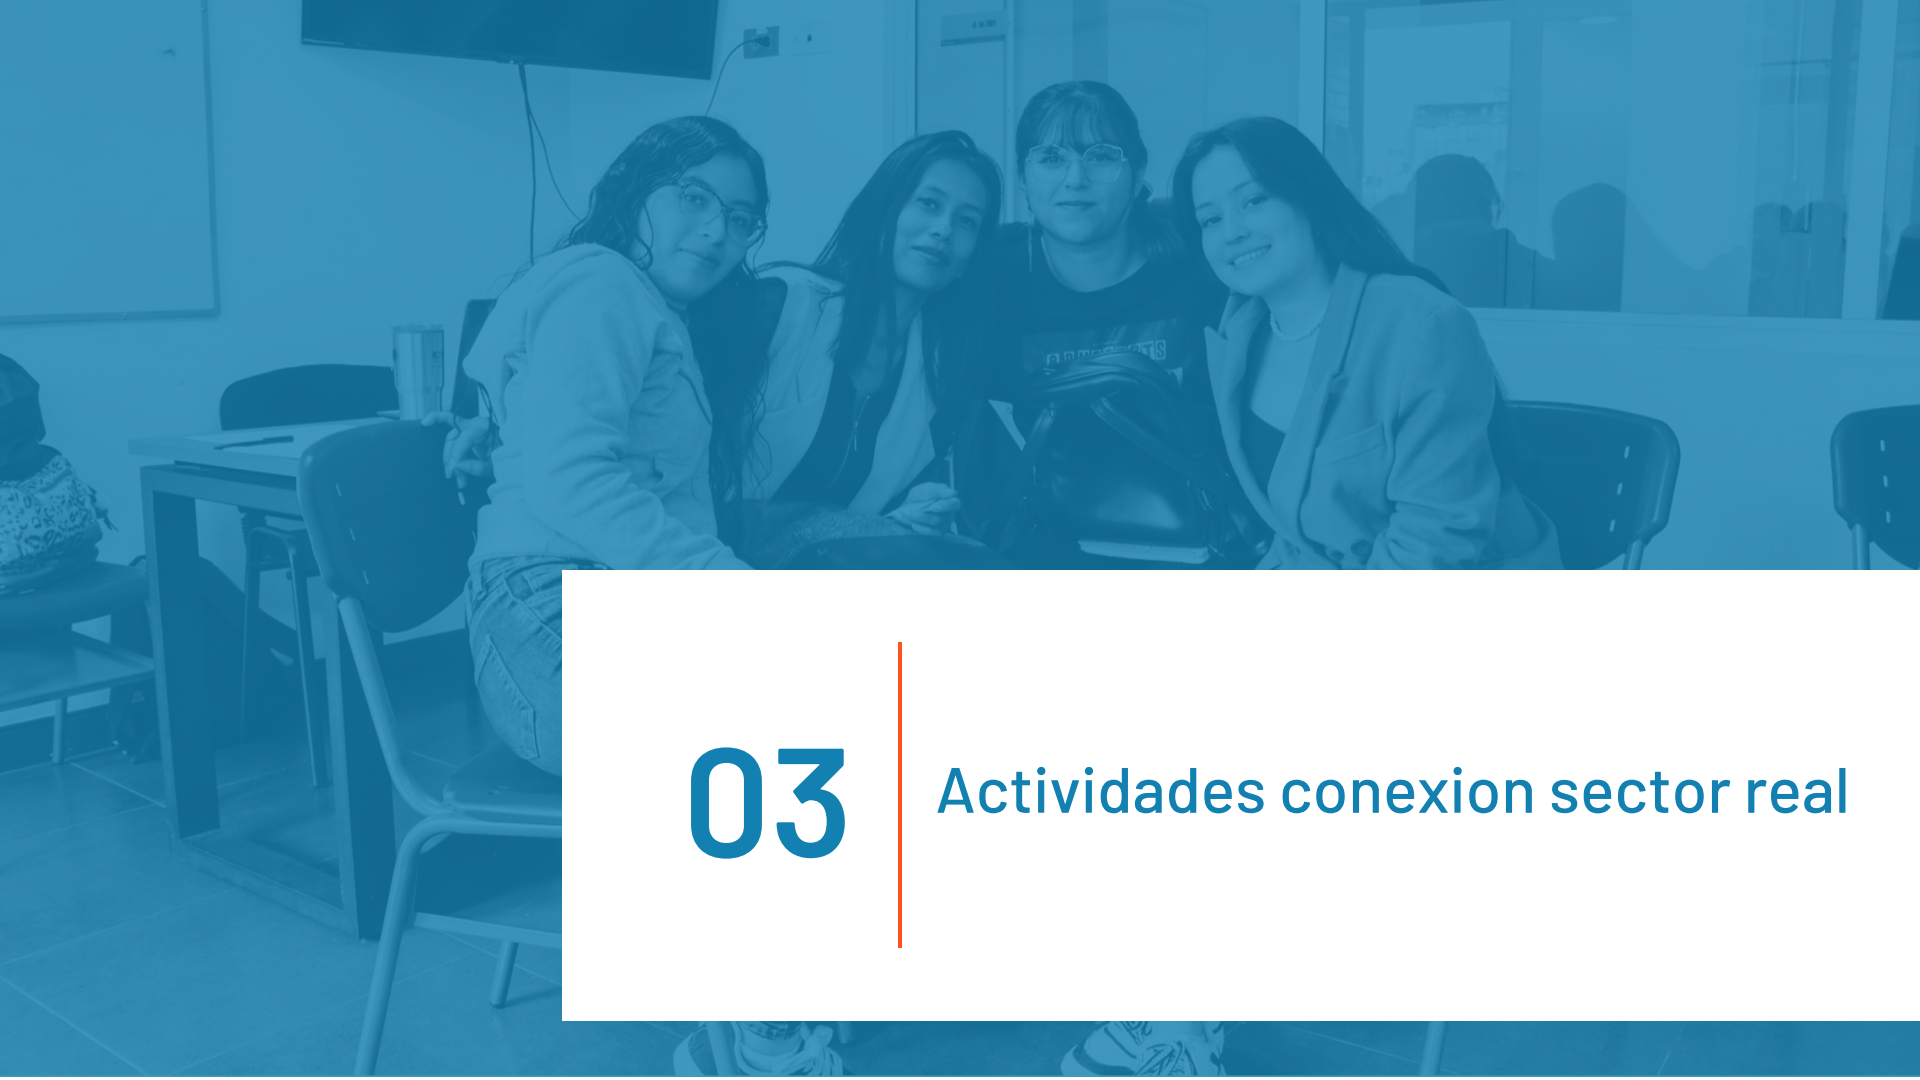

03

Actividades conexion sector real

Avance Actividades Conexion Sector Real

Actividad	Estado
Encuesta de Entrada	Finalizada Radicación: 19/06/2025
Enrutamiento al SISE	Finalizada 20 de Junio Informe entregado
Feria de empleo	Finalizada 15 de julio Informe entregado Ajustes a Comentarios Realizados
Charla de expertos	Finalizada: 23 de julio Informe entregado Ajustes a Comentarios Realizados Lista de asistencia cargada
Entrenamiento en pruebas de selección*	Finalizada: 23 de julio Informe entregado Pendiente de cargue en Drive
Mapeo oportunidad de proyectos	Finalizado: Cartilla entregada

ket
kuepa EduTech

Avance Actividades Conexion Sector Real

Actividad	Estado
Inmersión sectorial	Finalizada: 11 y 12 de agosto 11 Agosto Marketing Digital, Gestión Mesa de servicio): Finalizado 12 Agosto: Análisis Sit. Informáticos, Soport. Tec. Sistemas Entrega de Informe: 22 de agosto
Encuesta de Salida	Pendiente Lineamiento
Base por PILA Colocación	Pendiente de recepción

Inmersión Sectorial

Metodología: Modalidad Virtual - Assessment Center

- El reto será presentado por las empresa aliadas que deseen participar, docentes de formación y retroalimentación final.

- **Estado**: En gestión


  Agosto 11 (Marketing Digital, Gestión Mesa de servicio)
  - Asistencia: Marketing Digital 43 personas
  - Asistencia: Gestión Mesa de Servicio: 14 Personas

  Agosto 12 (Análisis Sit. Informáticos, Soport. Tec. Sistemas)
  - Análisis Sit. Informáticos: 25 Personas
  - Soport. Tec. Sistemas: 16 personas


- **Informe**: 22 de agosto



Colocación**

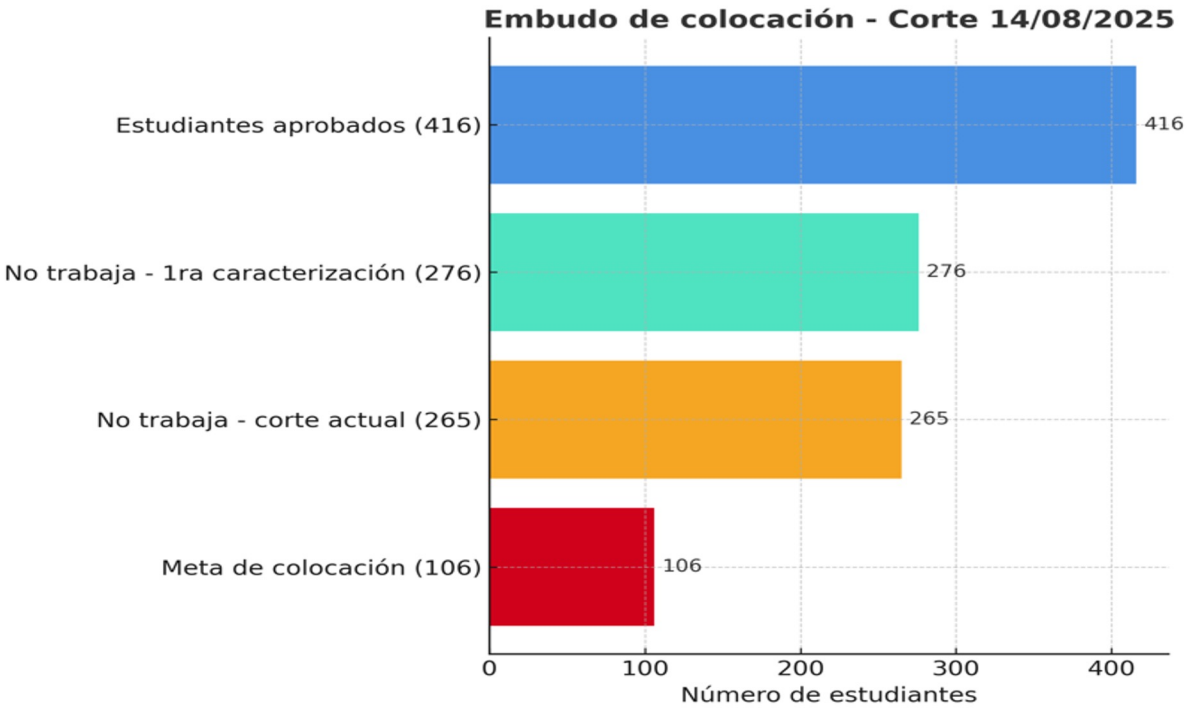
Embudo de colocación - Corte 14/08/2025
Estudiantes aprobados (416)
No trabaja - 1ra caracterización (276)
No trabaja - corte actual (265)
Meta de colocación (106)
416
276
265
106
0
100
200
300
400
Número de estudiantes


Colocación**

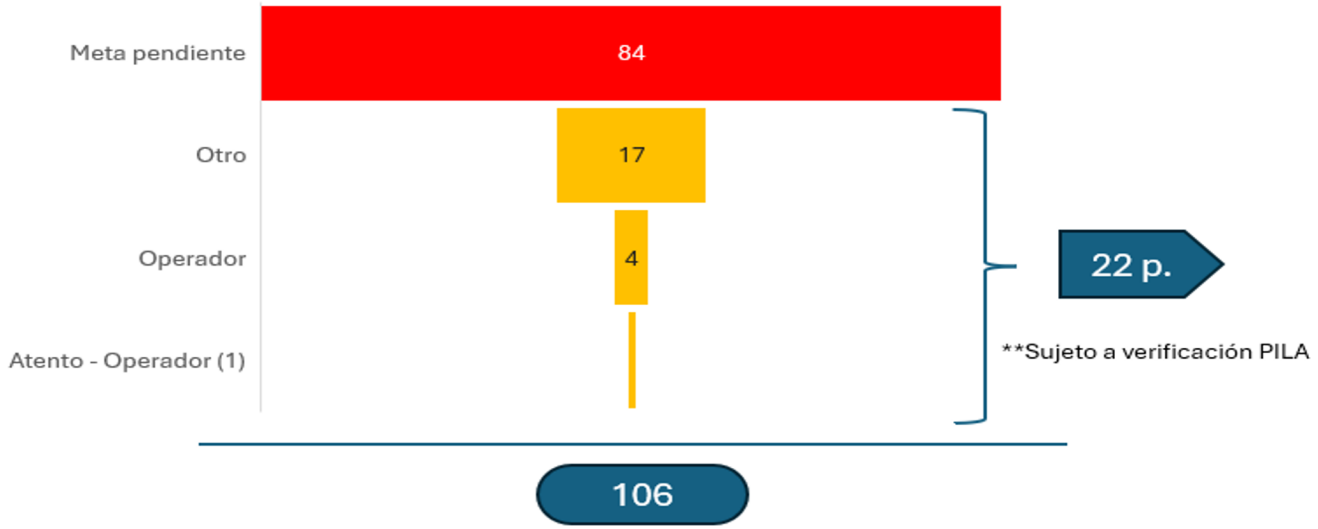

**Corte 14/08/2025
Resultados: Mes vencido
Dos eventos:

- Konectar: 20/08/2025
- Logique: 20 y 21 /08/2025


Grupo Konecta: - Discapacidad.

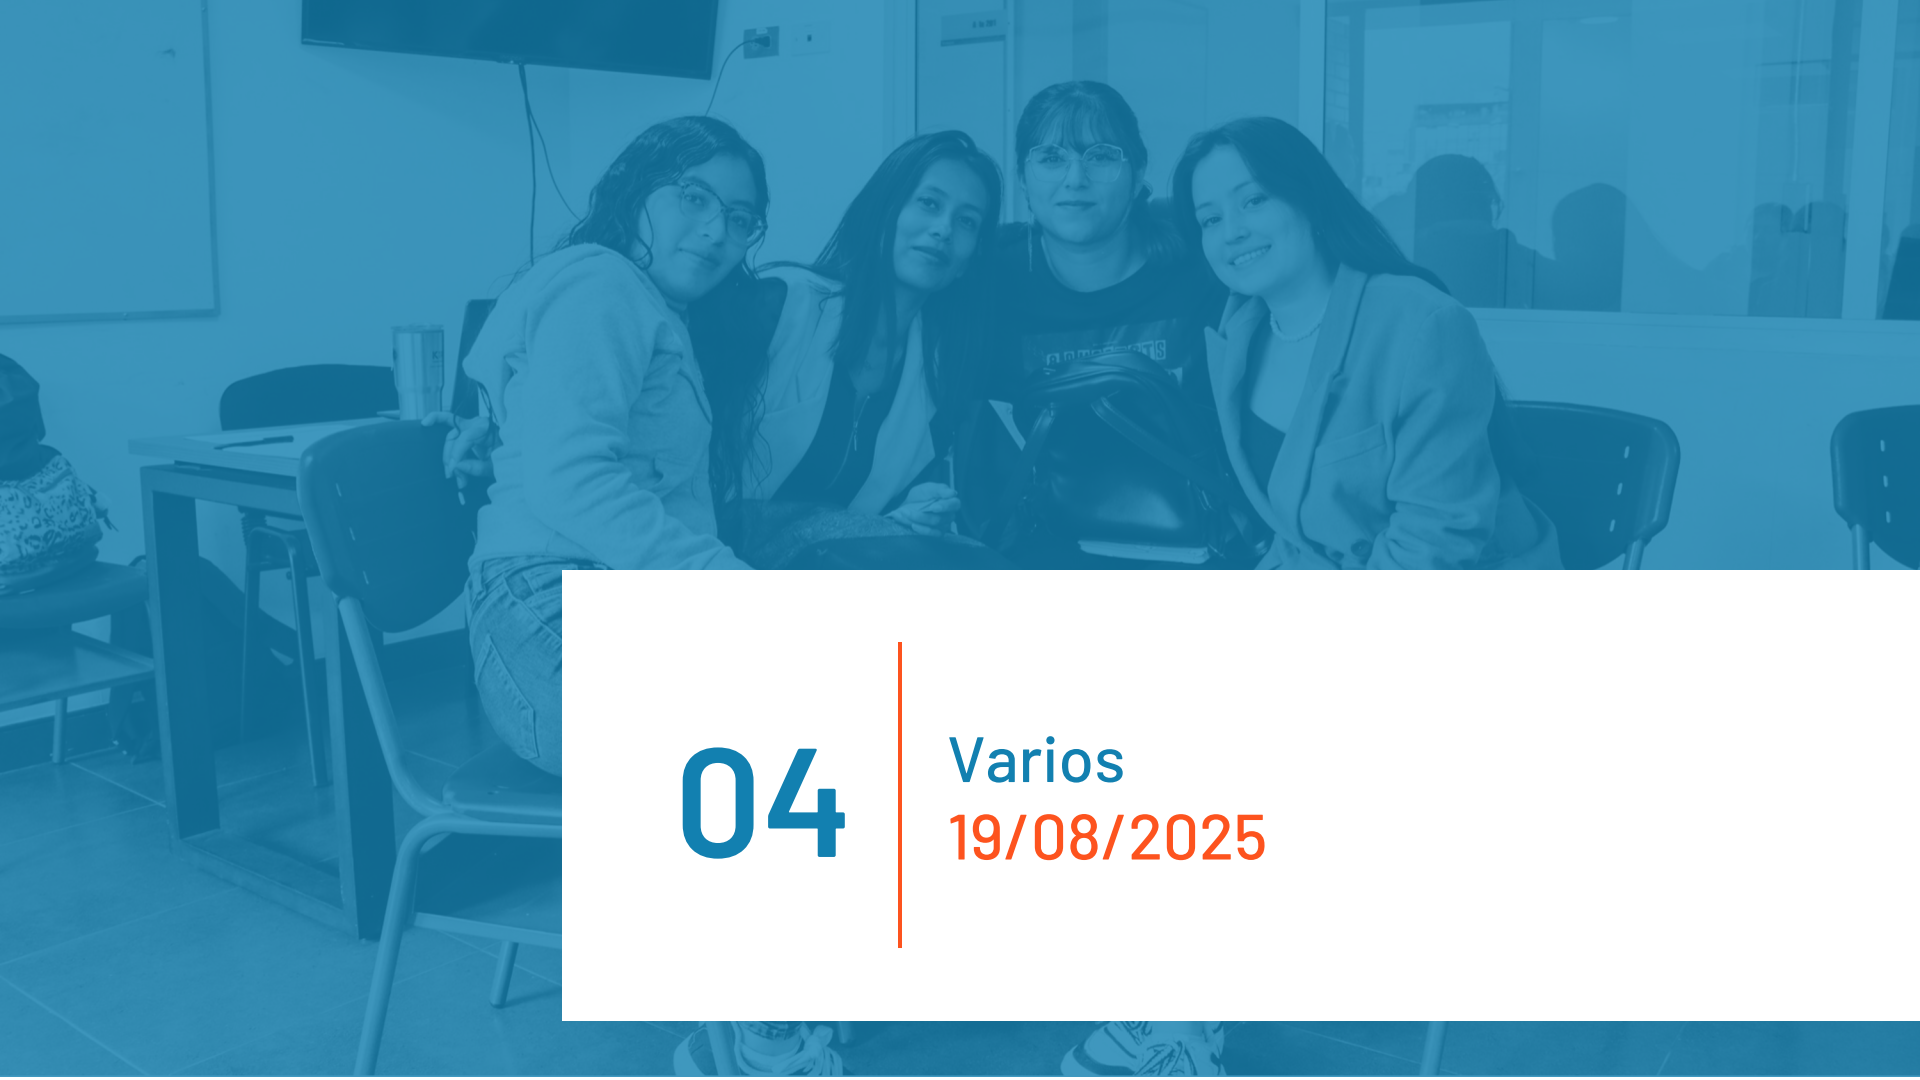

04

Varios

19/08/2025

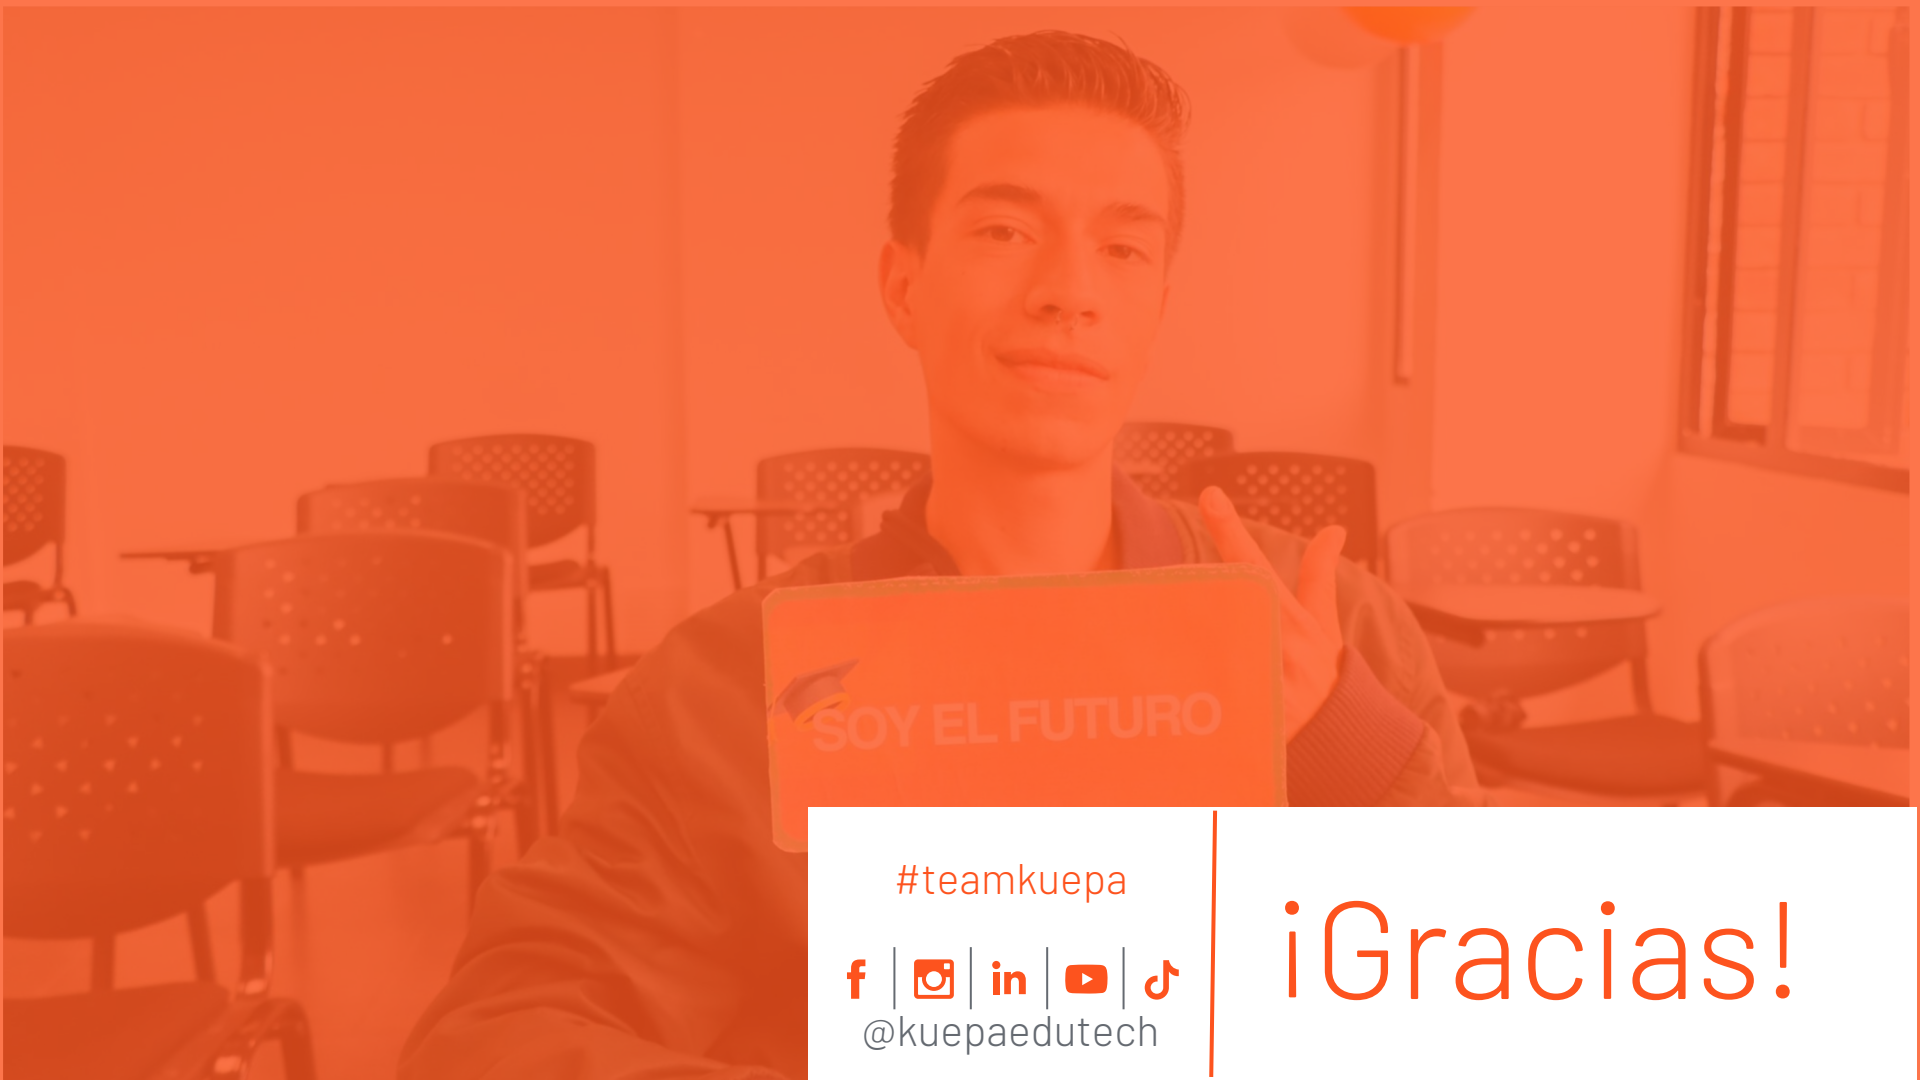

#teamkuepa

@kuepaedutech

¡Gracias!

TEMA:	Seguimiento semanal Contrato Atenea 380-2025
PROCESO:	Talento Capital Formación - Jóvenes con Oportunidades

FECHA:	**26/08/2025**	**Hora Inicio**	**15:00**
		Hora Final	**16:00**

1. ORDEN DEL DÍA:

1.1. Avance cronograma proyecto.
1.2. Avance formación (Desarrollo proceso de formación, avance actividades de seguimiento y permanencia, etc).
1.3. Avance actividades de conexión con el sector real.
1.4. Proposiciones y Varios.

2. DESARROLLO:

Se presentó un informe sobre el avance del proyecto, destacando un progreso del 76% y la formalización de 622 estudiantes, con 500 aprobaciones y 111 certificaciones en marketing digital, con un porcentaje de aprobación del 81% en las certificaciones de industria. Además, se discutieron las certificaciones complementarias necesarias para alcanzar las metas establecidas. Se solicitó la revisión de certificaciones complementarias y la entrega de informes semanales. Se discutió la necesidad de obtener retroalimentación sobre la encuesta de salida, con un seguimiento en curso para mejorar la tasa de respuesta. Se identificaron 127 personas potencialmente disponibles para trabajar, aunque se plantearon preocupaciones sobre la viabilidad de alcanzar la meta de colocación del 40%.

Se abordaron los desafíos en la colocación de estudiantes, con 34 personas contratadas y 27 en proceso de selección. Se sugirió la elaboración de un informe detallado sobre la gestión y los problemas encontrados, incluyendo la posibilidad de incluir candidatos que puedan trabajar fines de semana o medio tiempo. Se acordó compartir modelos de contrato para facilitar la evaluación de nuevas contrataciones y se enfatizó la importancia de mantener la información actualizada y planificar jornadas de validación. La discusión continuará en una próxima sesión.

Piensa en el medio ambiente, antes de imprimir este documento.
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

Avance Cronograma:

Avance Cronograma

Etapa	Inicio	Fin	Avance Promedio
Alistamiento	21/03/25	11/07/25	100%
Cierre	04/08/25	10/10/25	0%
Estrategia de comunicación	12/04/25	31/10/25	87%
Formación	17/04/25	06/09/25	76%
Formalización y matrícula	21/03/25	13/06/25	100%
Seguimiento actividades de acompañamiento y permanencia	12/04/25	03/08/25	100%
Seguimiento cumplimiento de tasas	14/05/25	30/09/25	83%
Seguimiento monitoreo y control	21/03/25	31/10/25	48%
Seguimiento de las actividades con el sector real	13/05/25	11/10/25	95%
Total general	**21/03/25**	**31/10/25**	**76%**

Encuesta de salida y seguimiento de colocación:
El equipo Kuepa pidió información sobre la encuesta de salida y la necesidad de obtener resultados parciales para incentivar a los estudiantes a participar. El equipo Atenea confirmó que se está monitoreando el progreso de la encuesta y que se coordinarán esfuerzos para aumentar la participación. Además, se discutió la elaboración de un informe sobre los resultados de la encuesta de salida.

Disponibilidad Laboral y Proceso de Selección:
El equipo Kuepa informó que de las 79 personas disponibles para trabajar, 69 no pueden aceptar ofertas debido a sus horarios de estudio. Se mencionó que solo 9 personas tienen certificado de discapacidad, lo que limita su vinculación a procesos de selección. A pesar de contar con 127 personas potencialmente disponibles, es crucial que todas cumplan con los requisitos del mercado laboral para alcanzar la meta de 126.

Seguimiento a Contrataciones y Soportes Documentales:
El equipo Kuepa explicó que no puede obtener contratos de las 35 personas colocadas debido a la naturaleza privada de los documentos. El equipo Atenea propuso buscar un soporte documental alternativo y mencionó que se está trabajando en un nuevo cruce de datos con Pila para facilitar las validaciones necesarias.

Informe de colocaciones y seguimiento de procesos:
El equipo Kuepa informó que actualmente hay 34 colocaciones y 27 personas en proceso de selección, con dificultades para contactar a los beneficiarios. El equipo Atenea sugirió la creación de un informe que documente la gestión y los contratiempos enfrentados. Se acordó revisar más a fondo la situación en una próxima reunión.

3. CONCLUSIONES: El proyecto presenta un avance significativo del 76%, con 622 estudiantes formalizados y 500 aprobaciones, lo cual refleja un progreso sostenido en los procesos de formación y certificación.
A pesar de los logros alcanzados, persisten retos importantes en la tasa de colocación laboral, dado que solo se han concretado 34 contrataciones y 27 procesos en curso, lo que pone en duda la viabilidad de alcanzar la meta del 40%.
La encuesta de salida constituye un insumo clave para el seguimiento y retroalimentación del proceso; sin embargo, requiere mayor participación estudiantil y la entrega de reportes parciales para mejorar la tasa de respuesta.
Se identificó la necesidad de contar con soportes documentales alternativos que respalden las contrataciones, así como de un informe detallado que documente los problemas encontrados en los procesos de colocación.
Los compromisos asumidos por los responsables, como la entrega de información sobre certificaciones complementarias, la revisión de propuestas y la elaboración de informes de gestión, serán determinantes para la toma de decisiones en las próximas reuniones.

4. COMPROMISOS: El equipo Kuepa enviará un correo con la información sobre las certificaciones complementarias necesarias para lograr la meta.
El equipo Atenea revisará la propuesta del certificado de industria y dará respuesta a equipo Kuepa.
El equipo Kuepa solicitará retroalimentación sobre la encuesta de salida para contrastar con los resultados obtenidos.
El equipo Atenea consultará si es posible enviar reportes parciales de las respuestas de la encuesta de satisfacción.
El equipo Kuepa elaborará un informe sobre la gestión de colocación y los contratiempos enfrentados con la población.

PÚBLICA

1.1 PENDIENTES DE REUNIONES ANTERIORES

REUNIÓN	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	ESTADO
19/08/2025	Entregar estado de aprobados finales	KUEPA	20/08/2025	Completado
19/08/2025	Entregar base con aprobados y no aprobados.	KUEPA	20/08/2025	Completado
19/08/2025	Entregar base con abandono documentados	KUEPA	20/08/2025	Completado
19/08/2025	Base de datos para reportar la población que se está certificando	KUEPA	20/08/2025	Completado
19/08/2025	Ajustes entrenamiento pruebas de selección	KUEPA	20/08/2025	Completado
19/08/2025	Entrega de modelo para certificación	ATENEA	25/08/2025	Completado
19/08/2025	Revisar ajustes de charla con expertos y Feria de empleo y Cartilla	ATENEA	25/08/2025	Completado
19/08/2025	Cruce de base de PILA	ATENEA	25/08/2025	Completado
19/08/2025	Compartir uno a uno actualizado	KUEPA	25/08/2025	Completado

1.2 PENDIENTES REUNIÓN ACTUAL

REUNIÓN	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO	ESTADO
26/08/2025	informe sobre la gestión de colocación y los contratiempos enfrentados con la población	KUEPA	25/08/2025	Completado
26/08/2025	Revisión de propuesta del certificado de industria	ATENEA	25/08/2025	Completado

PÚBLICA

LISTADO DE ASISTENCIA

NOMBRE	FIRMA
Mario Briceño	Listado adjunto (teams)
Vanessa Achury	Listado adjunto (teams)
Izabella Woyames	Listado adjunto (teams)
Heidy Herrera	Listado adjunto (teams)
Andrea Natalia Penagos	Listado adjunto (teams)
Diana María González	Listado adjunto (teams)
Gina Paola Camargo Rodríguez	Listado adjunto (teams)
Yiza Yelena Aragón	Listado adjunto (teams)

PÚBLICA

(Virtual)_A380_2025_Kuepa Edutech_Reunión de seguimiento - Informe de asistencia 8-26-25

1. Resumen										
Título de la reunión	(Virtual)_A380_2025_Kuepa Edutech_Reunión de seguimiento									
Participantes que asistieron	9									
Hora de inicio	8/26/25								2:40:34 PM	
Hora de finalización	8/26/25								4:17:26 PM	
Duración de la reunión	1 h 36 min 51 s									
Tiempo medio de asistencia	51 min 10 s									
2. Participantes										
Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol	Interacción: Reacción-Aplauso	Interacción: Reacción-Me divierte	Interacción: Reacción	
Gina Paola Camargo Rodríguez	8/26/25								3:00:31 PM	8/26/25
Andrea Natalia Penagos Penagos	8/26/25								2:58:45 PM	8/26/25
Diana María Gonzalez Wilches	8/26/25								3:01:09 PM	8/26/25
Fireflies.ai Notetaker Izabell (No comprobado)	8/26/25								3:02:13 PM	8/26/25
Heidy Herrera (No comprobado)	8/26/25								3:02:13 PM	8/26/25
read.ai meeting notes (No comprobado)	8/26/25								3:02:13 PM	8/26/25
Mario Briceño (No comprobado)	8/26/25								3:02:13 PM	8/26/25
Karen Valderrama (No comprobado)	8/26/25								3:02:14 PM	8/26/25
Yiza Yelena Aragon Lozano	8/26/25								3:04:04 PM	8/26/25
3. Actividades de la reunión										
Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol					
Gina Paola Camargo Rodríguez	8/26/25								3:00:31 PM	8/26/25
Andrea Natalia Penagos Penagos	8/26/25								2:58:45 PM	8/26/25
Diana María Gonzalez Wilches	8/26/25								3:01:09 PM	8/26/25
Fireflies.ai Notetaker Izabell (No comprobado)	8/26/25								3:02:13 PM	8/26/25
Heidy Herrera (No comprobado)	8/26/25								3:02:13 PM	8/26/25
read.ai meeting notes (No comprobado)	8/26/25								3:02:13 PM	8/26/25
Mario Briceño (No comprobado)	8/26/25								3:02:13 PM	8/26/25
Karen Valderrama (No comprobado)	8/26/25								3:02:14 PM	8/26/25
Yiza Yelena Aragon Lozano	8/26/25								3:04:04 PM	8/26/25
Yiza Yelena Aragon Lozano	8/26/25								3:32:26 PM	8/26/25
4. Interacción en la reunión										
Nombre	Tipo de compromiso	Tiempo								
Gina Paola Camargo Rodríguez	Audio activado	8/26/25							3:01:31 PM	
Gina Paola Camargo Rodríguez	Audio activado	8/26/25							3:05:03 PM	
Gina Paola Camargo Rodríguez	Audio activado	8/26/25							3:11:34 PM	
Gina Paola Camargo Rodríguez	Audio activado	8/26/25							3:13:39 PM	
Gina Paola Camargo Rodríguez	Audio activado	8/26/25							3:33:43 PM	
Andrea Natalia Penagos Penagos	Audio activado	8/26/25							3:15:46 PM	
Andrea Natalia Penagos Penagos	Audio activado	8/26/25							3:43:28 PM	
Diana María Gonzalez Wilches	Audio activado	8/26/25							3:01:33 PM	
Diana María Gonzalez Wilches	Audio activado	8/26/25							3:02:34 PM	
Diana María Gonzalez Wilches	Audio activado	8/26/25							3:02:42 PM	
Diana María Gonzalez Wilches	Audio activado	8/26/25							3:15:27 PM	
Diana María Gonzalez Wilches	Audio activado	8/26/25							3:19:21 PM	
Heidy Herrera (No comprobado)	Audio activado	8/26/25							3:13:51 PM	
Heidy Herrera (No comprobado)	Audio activado	8/26/25							3:42:49 PM	
Mario Briceño (No comprobado)	Audio activado	8/26/25							3:02:25 PM	
Mario Briceño (No comprobado)	Audio activado	8/26/25							3:05:15 PM	
Mario Briceño (No comprobado)	Audio activado	8/26/25							3:27:18 PM	
Mario Briceño (No comprobado)	Audio activado	8/26/25							3:41:04 PM	
Karen Valderrama (No comprobado)	Audio activado	8/26/25							3:02:35 PM	
Yiza Yelena Aragon Lozano	Manos levantadas	8/26/25							3:06:08 PM	
Yiza Yelena Aragon Lozano	Audio activado	8/26/25							3:06:16 PM	
Yiza Yelena Aragon Lozano	Audio activado	8/26/25							3:06:54 PM	
Yiza Yelena Aragon Lozano	"Reacción enviada "me gusta""	8/26/25							3:11:07 PM	

3:43:20 PM	42 min 48 s	gcamargo@agenciaatenea.gov.co	gcamargo@agenciaatenea.gov.co	Organizador					5
3:44:02 PM	45 min 16 s	apenagos@agenciaatenea.gov.co	apenagos@agenciaatenea.gov.co	Moderador					2
3:42:54 PM	41 min 44 s	dgonzalez@agenciaatenea.gov.co	dgonzalez@agenciaatenea.gov.co	Moderador					5
4:17:26 PM	1 h 15 min 12 s	Moderador							
3:42:56 PM	40 min 43 s	Moderador		2					
4:06:03 PM	1 h 3 min 50 s	Moderador							
3:42:55 PM	40 min 42 s	Moderador		4					
3:42:57 PM	40 min 42 s	Moderador		1					
4:15:40 PM	1 h 9 min 36 s	yaragon@agenciaatenea.gov.co	yaragon@agenciaatenea.gov.co	Moderador		1		1	2


3:43:20 PM	42 min 48 s	gcamargo@agenciaatenea.gov.co	Organizador
3:44:02 PM	45 min 16 s	apenagos@agenciaatenea.gov.co	Moderador
3:42:54 PM	41 min 44 s	dgonzalez@agenciaatenea.gov.co	Moderador
4:17:26 PM	1 h 15 min 12 s	Moderador	
3:42:56 PM	40 min 43 s	Moderador	
4:06:03 PM	1 h 3 min 50 s	Moderador	
3:42:55 PM	40 min 42 s	Moderador	
3:42:57 PM	40 min 42 s	Moderador	
3:30:26 PM	26 min 22 s	yaragon@agenciaatenea.gov.co	Moderador
4:15:40 PM	43 min 14 s	yaragon@agenciaatenea.gov.co	Moderador



Kuepa Edutech

Talento Capital - Convocatoria 4

ket
kuepa EduTech

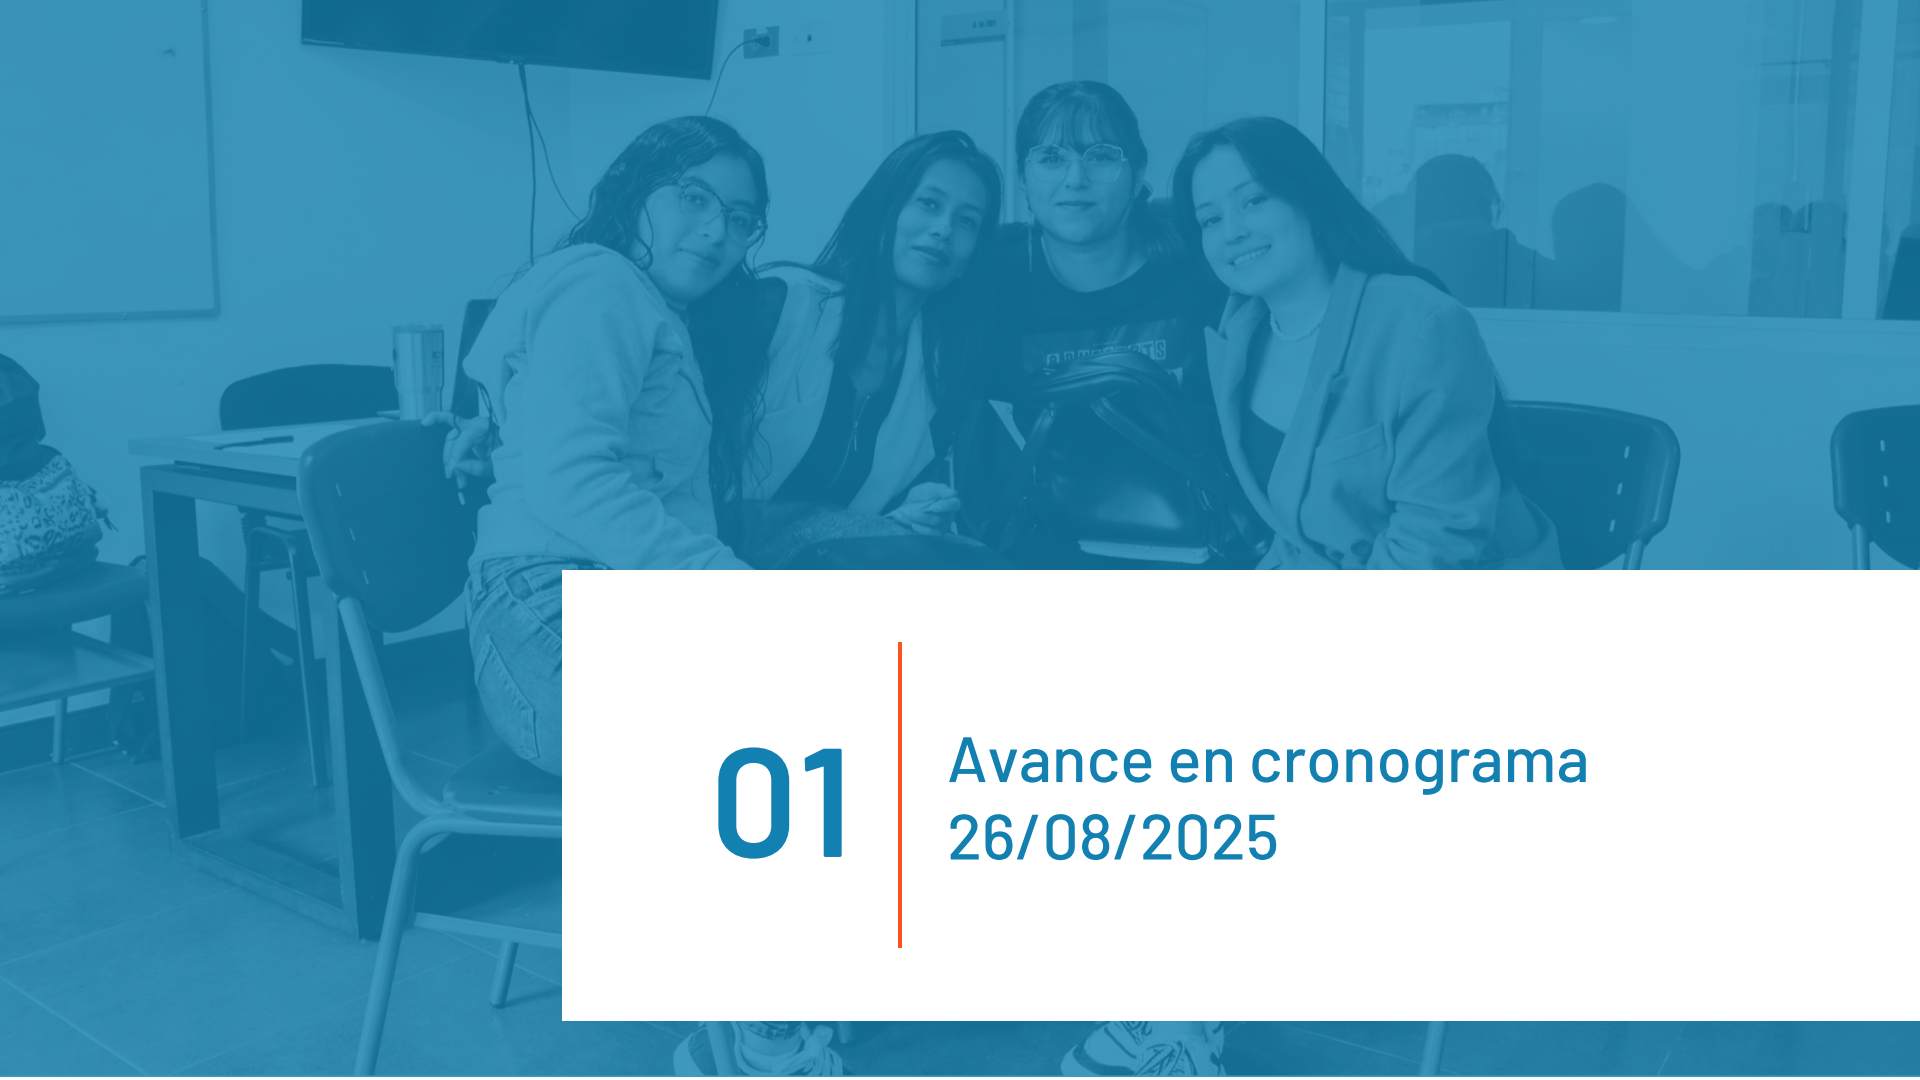

01

Avance en cronograma
26/08/2025

Avance Cronograma

Etapa	Inicio	Fin	Avance Promedio
Alistamiento	21/03/25	11/07/25	100%
Cierre	04/08/25	10/10/25	0%
Estrategia de comunicación	12/04/25	31/10/25	87%
Formación	17/04/25	06/09/25	76%
Formalización y matrícula	21/03/25	13/06/25	100%
Seguimiento actividades de acompañamiento y permanencia	12/04/25	03/08/25	100%
Seguimiento cumplimiento de tasas	14/05/25	30/09/25	83%
Seguimiento monitoreo y control	21/03/25	31/10/25	48%
Seguimiento de las actividades con el sector real	13/05/25	11/10/25	95%
Total general	**21/03/25**	**31/10/25**	**76%**

ket
kuepa EduTech



02

Avance de la Formación

26/08/2025

MATRÍCULA
PROCESO DE FORMALIZACIÓN

Base	Población
Prioridad 1	571
Prioridad 2	79
Total	650

Meta formalización:**544**


Tasa de Formalización
114%

Situación	Prioridad 1	Prioridad 2	Total
Formalizados	556	66	**622***

*Ajuste realizado a corte del 7 de julio de 2025

ket
kuepa EduTech

Indicadores de Formación por Grupo

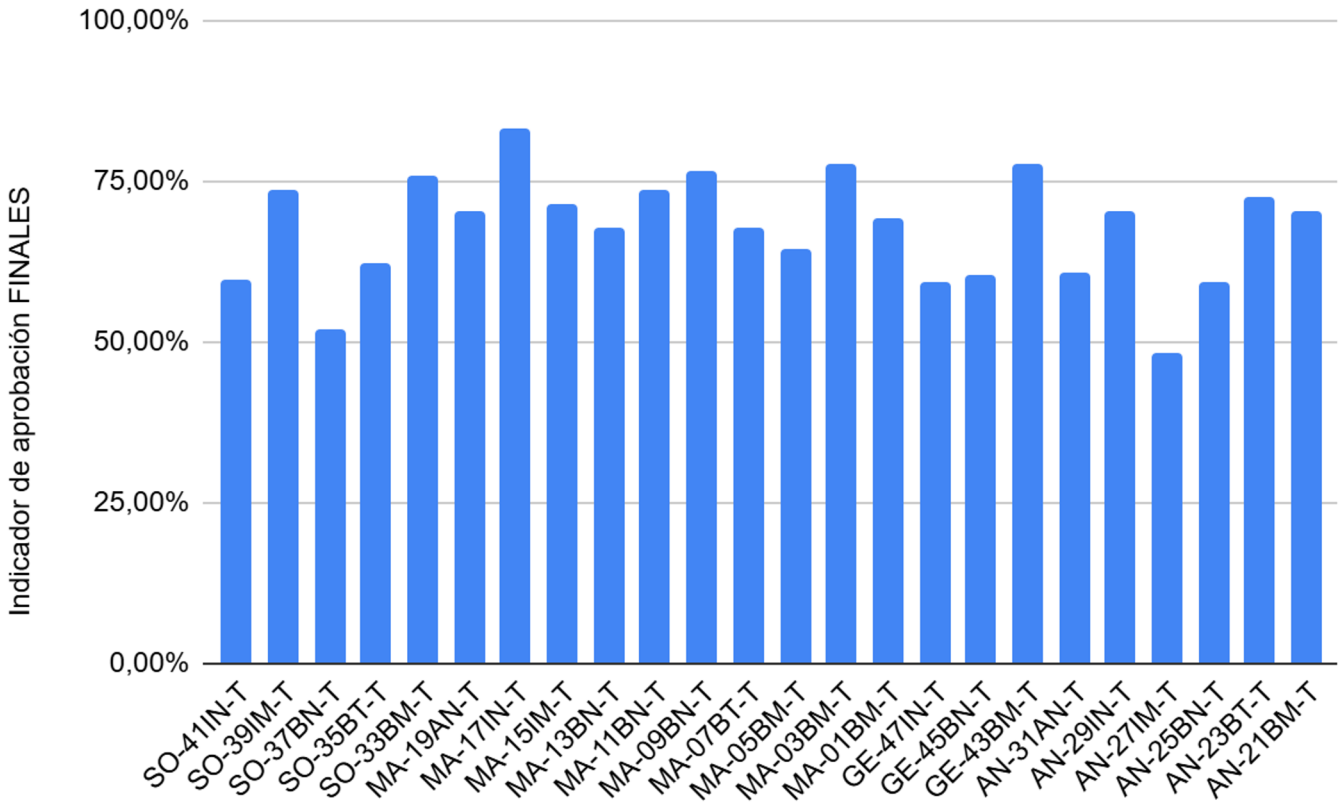

Cierre 20/08/2025

ket
kuepa EduTech

Indicador Semáforo Alerta Asistencia


kuepa

ATENEA
AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

Reporte de indicadores Proyecto Talento Capital

Número de estudiantes	Número de grupos	TOTAL ASISTENCIA
622	24,0	66,97 %

Alerta	Record Count
Escriba el término de búsqueda	
Alerta Amarilla	173
Alerta Naranja	164
Alerta Verde	151
Alerta Roja	134



Cierre 20/08/2025

ket
kuepa EduTech

Indicador Consolidado Final Formación

Reporte Estados con indicador de aprobación

Estado	Estudiantes	Percentual	Indicador Aprobación
Aprobado	501	81	>70%
En formación	17	3	50% a 69%
En seguimiento	7	1	25 a 49%
En riesgo deserción	79	13	<25%
Matriculado Inactivo	18	3	0
TOTAL	622	100	NA

Cierre 20/08/2025

ket
kuepa EduTech

Aprobación por curso y nivel

501 Estudiantes
Entrenamiento para tomar certificados de industria

ESTUDIANTES APROBADOS INDICADOR				
Programa	**Básico**	**Intermedio**	**Avanzado**	**Total**
Marketing Digital	238	22	10	270
Soporte Técnico en Sistemas	83	9	0	92
Analista de Sistemas Informáticos	67	23	11	101
Gestión en Mesa de Servicio	31	7	0	38
TOTAL	419	61	21	**501**



ket
kuepa EduTech

Resultados preliminares
Certificados de Industria
Marketing – Google Analytics Individual Qualification

Grupo	*Nivel*	# Certificados
Marketing Digital	AVANZADO	4
	BÁSICO	96
	INTERMEDIO	11
Total Marketing Digital		111
Suma total		**111**


Examen de certificación de industria de Marketing Digital - Google Analytics Individual Qualification

111 certificaciones recibidas hasta el 25/08/2025.

Soporte técnico - Básico - CompTIA A+ (Fundamentos) por Service Desk Certified Expert (SDCE).

Analista de sistemas - Intermedio - MySQL Certified Associate por Certified SQL Associate CSQA.

ket
kuepa EduTech

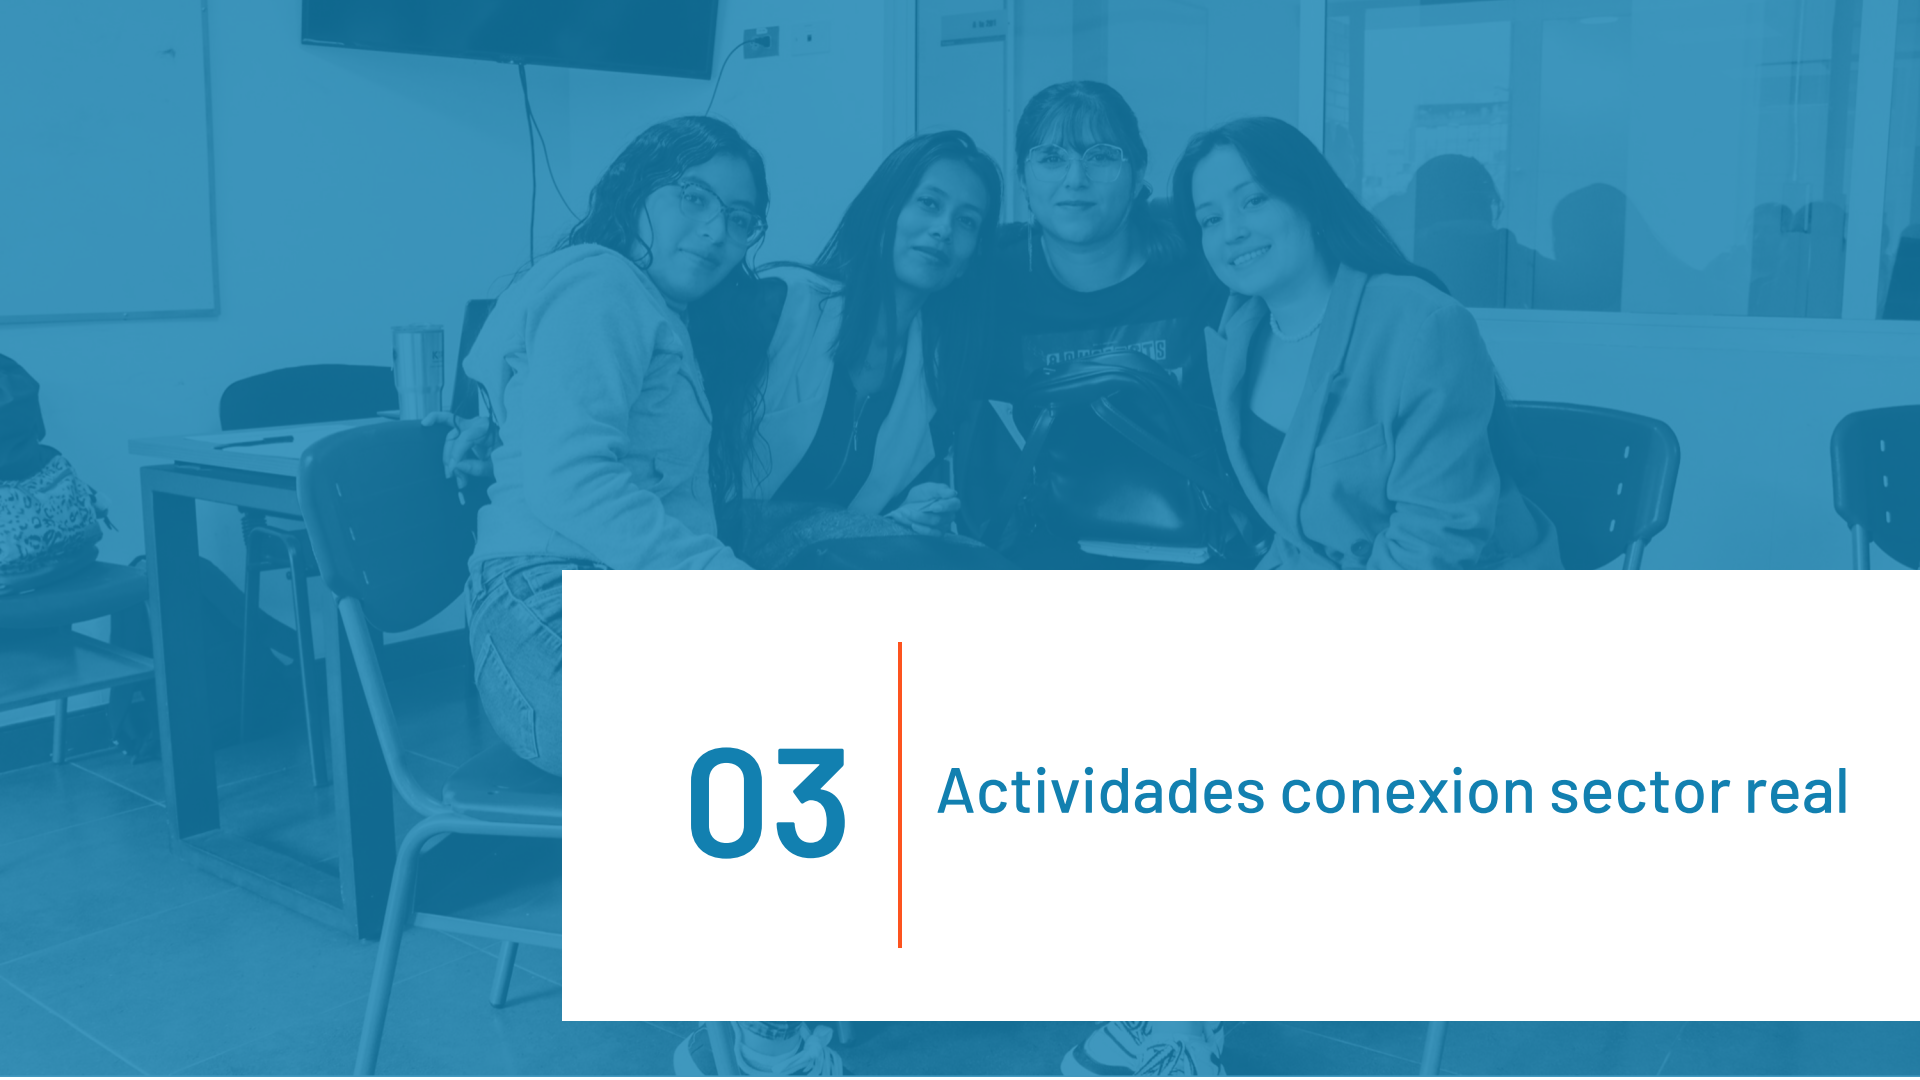

03

Actividades conexion sector real

Avance Actividades Conexion Sector Real


Actividad	Estado
Encuesta de Entrada	Finalizada Radicación: 19/06/2025
Enrutamiento al SISE	Finalizada 20 de Junio Informe entregado
Feria de empleo	Finalizada 15 de julio Informe entregado Ajustes a Comentarios Realizados
Charla de expertos	Finalizada: 23 de julio Informe entregado Ajustes a Comentarios Realizados Lista de asistencia cargada
Entrenamiento en pruebas de selección*	Finalizada: 23 de julio Informe entregado Cargue en Drive
Mapeo oportunidad de proyectos	Finalizado: Cartilla entregada

ket
kuepa EduTech


Avance Actividades Conexion Sector Real

Actividad	Estado
Inmersión sectorial	Finalizada: 11 y 12 de agosto 11 Agosto Marketing Digital, Gestión Mesa de servicio): Finalizado 12 Agosto: Análisis Sit. Informáticos, Soport. Tec. Sistemas Entrega de Informe: Cargado
Encuesta de Salida	Pendiente * Retroalimentación
Base por PILA Colocación	Pendiente de recepción


Colocación**

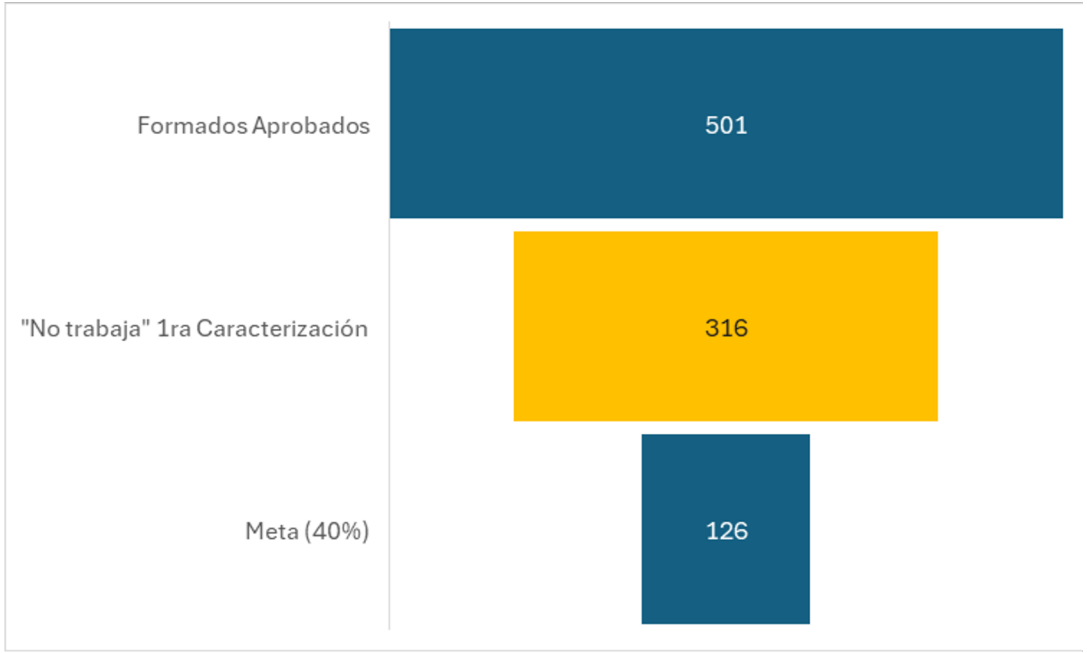
Formados Aprobados
501
"No trabaja" 1ra Caracterización
316
Meta (40%)
126


Población para Colocación /316 “No trabaja!

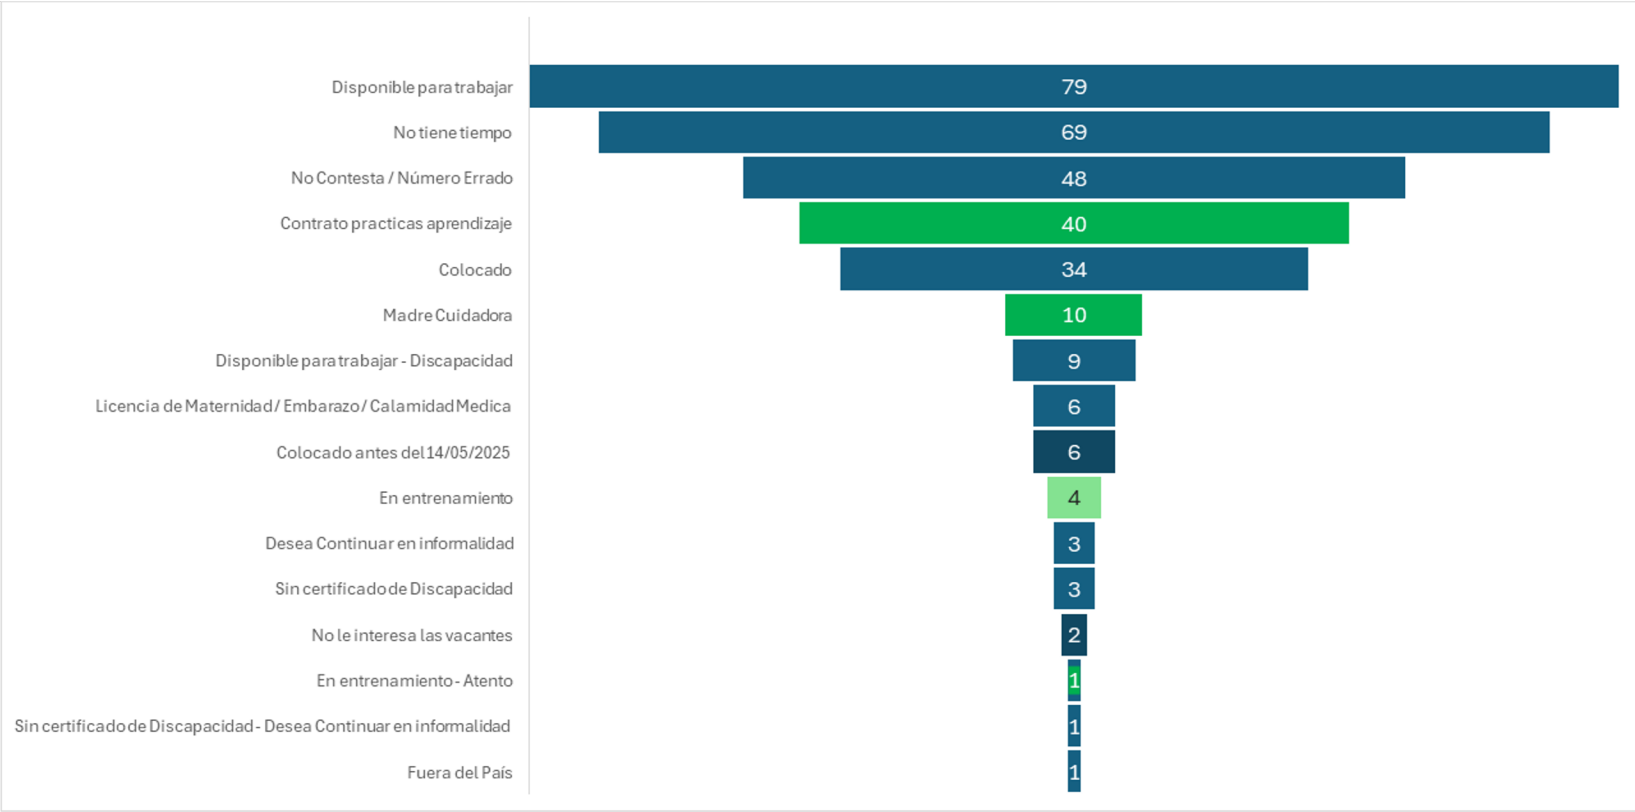

Población para Colocación /316 “No trabaja!

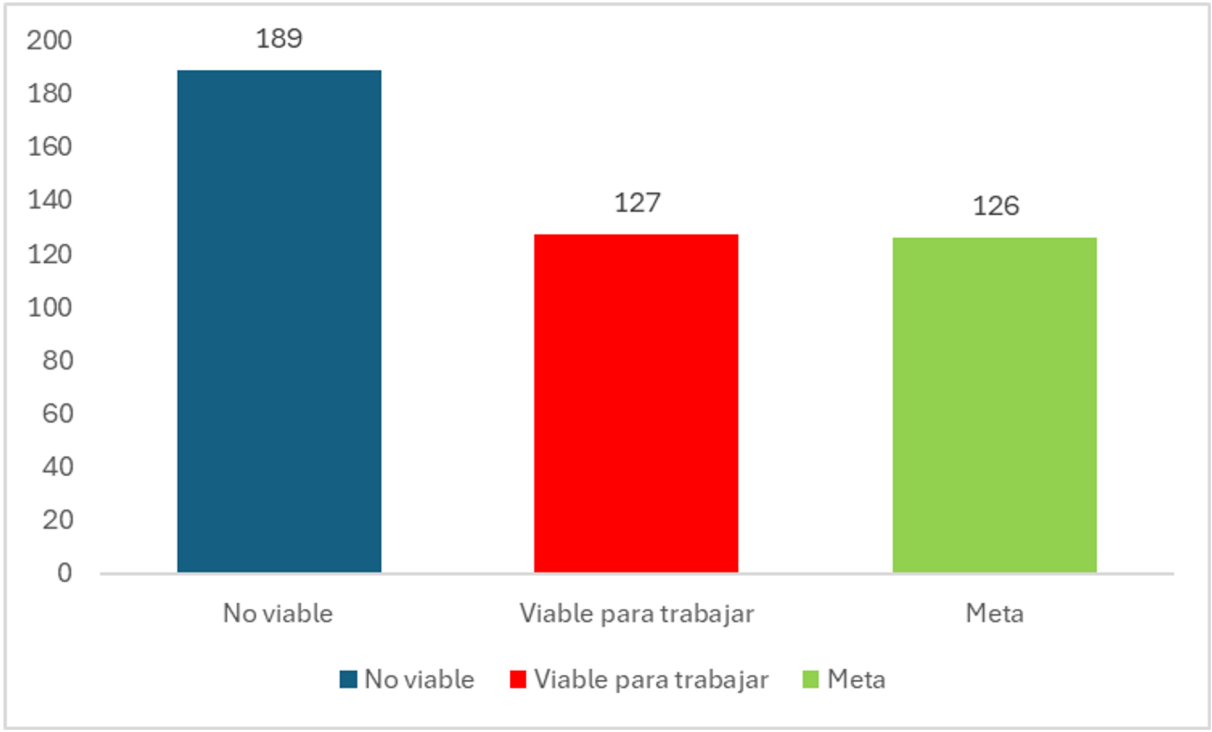


Colocación**

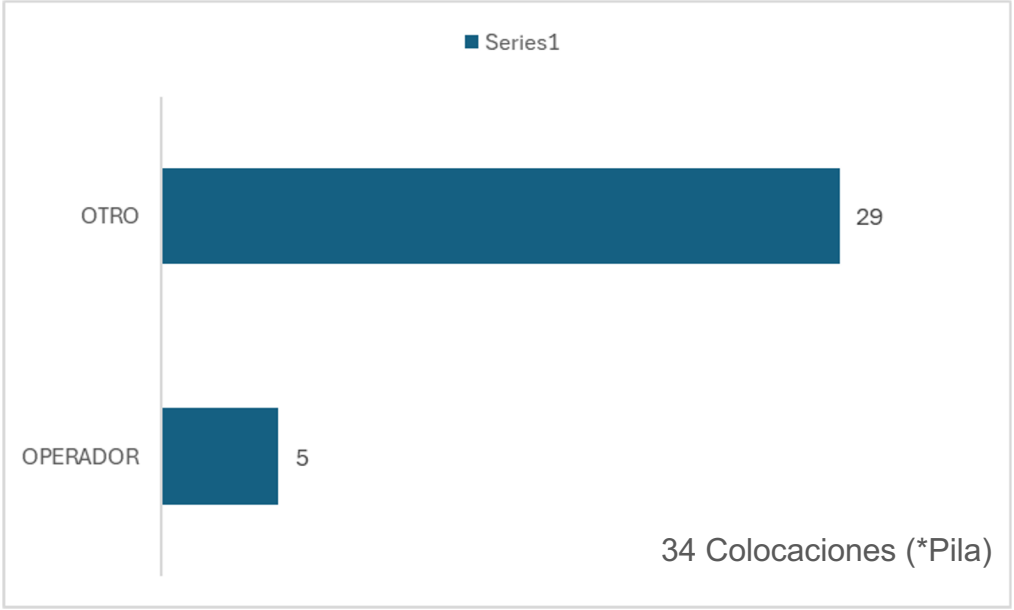

27 Personas en proceso de selección *Sept
5 Personas en entrenamiento *Sept

ALIADOS

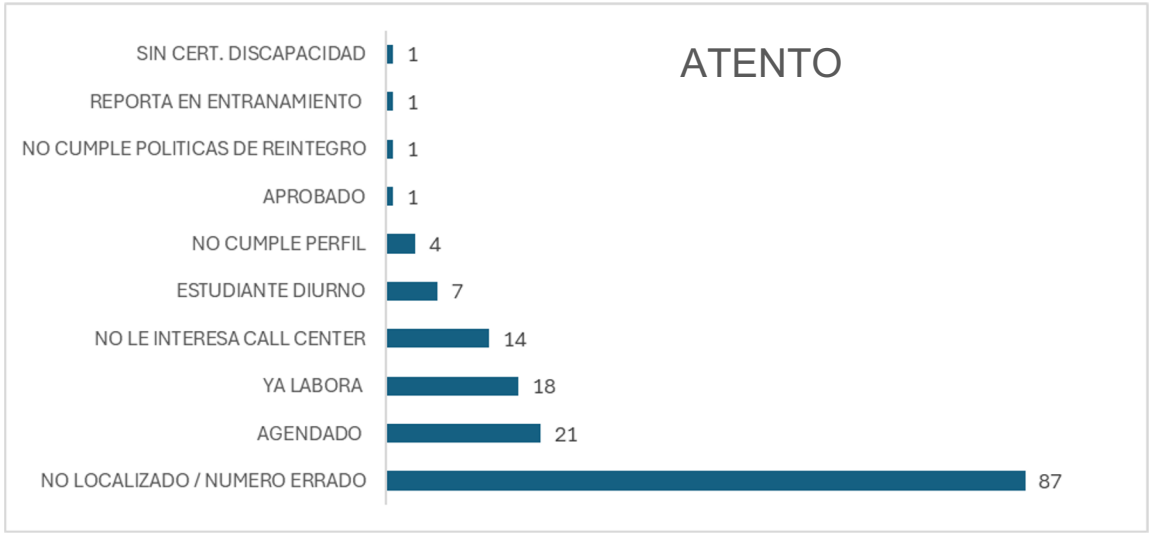


155 Beneficiarios Remitidos e inscritos a oferta **Atento**

Remitidos a Otros aliados: 103 Personas

Total de personas remitidas:225 / 316 “No trabaja”

El restante de aliados empresariales reportar la misma tendencia en respuestas de beneficiarios a la llamada o citación.

Propuesta de Colocación

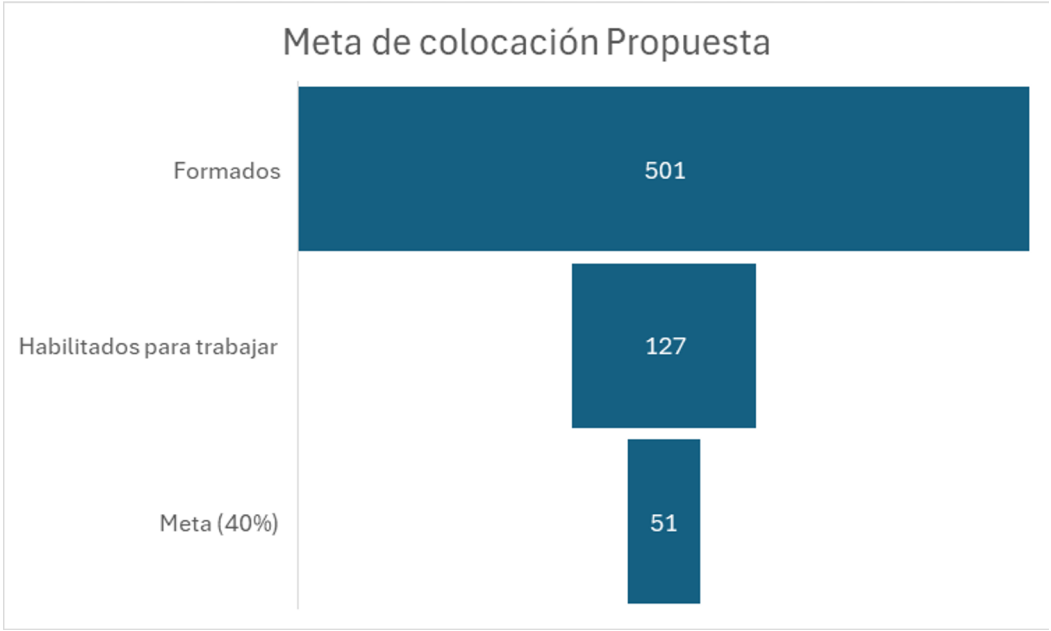




04

Varios

26/08/2025

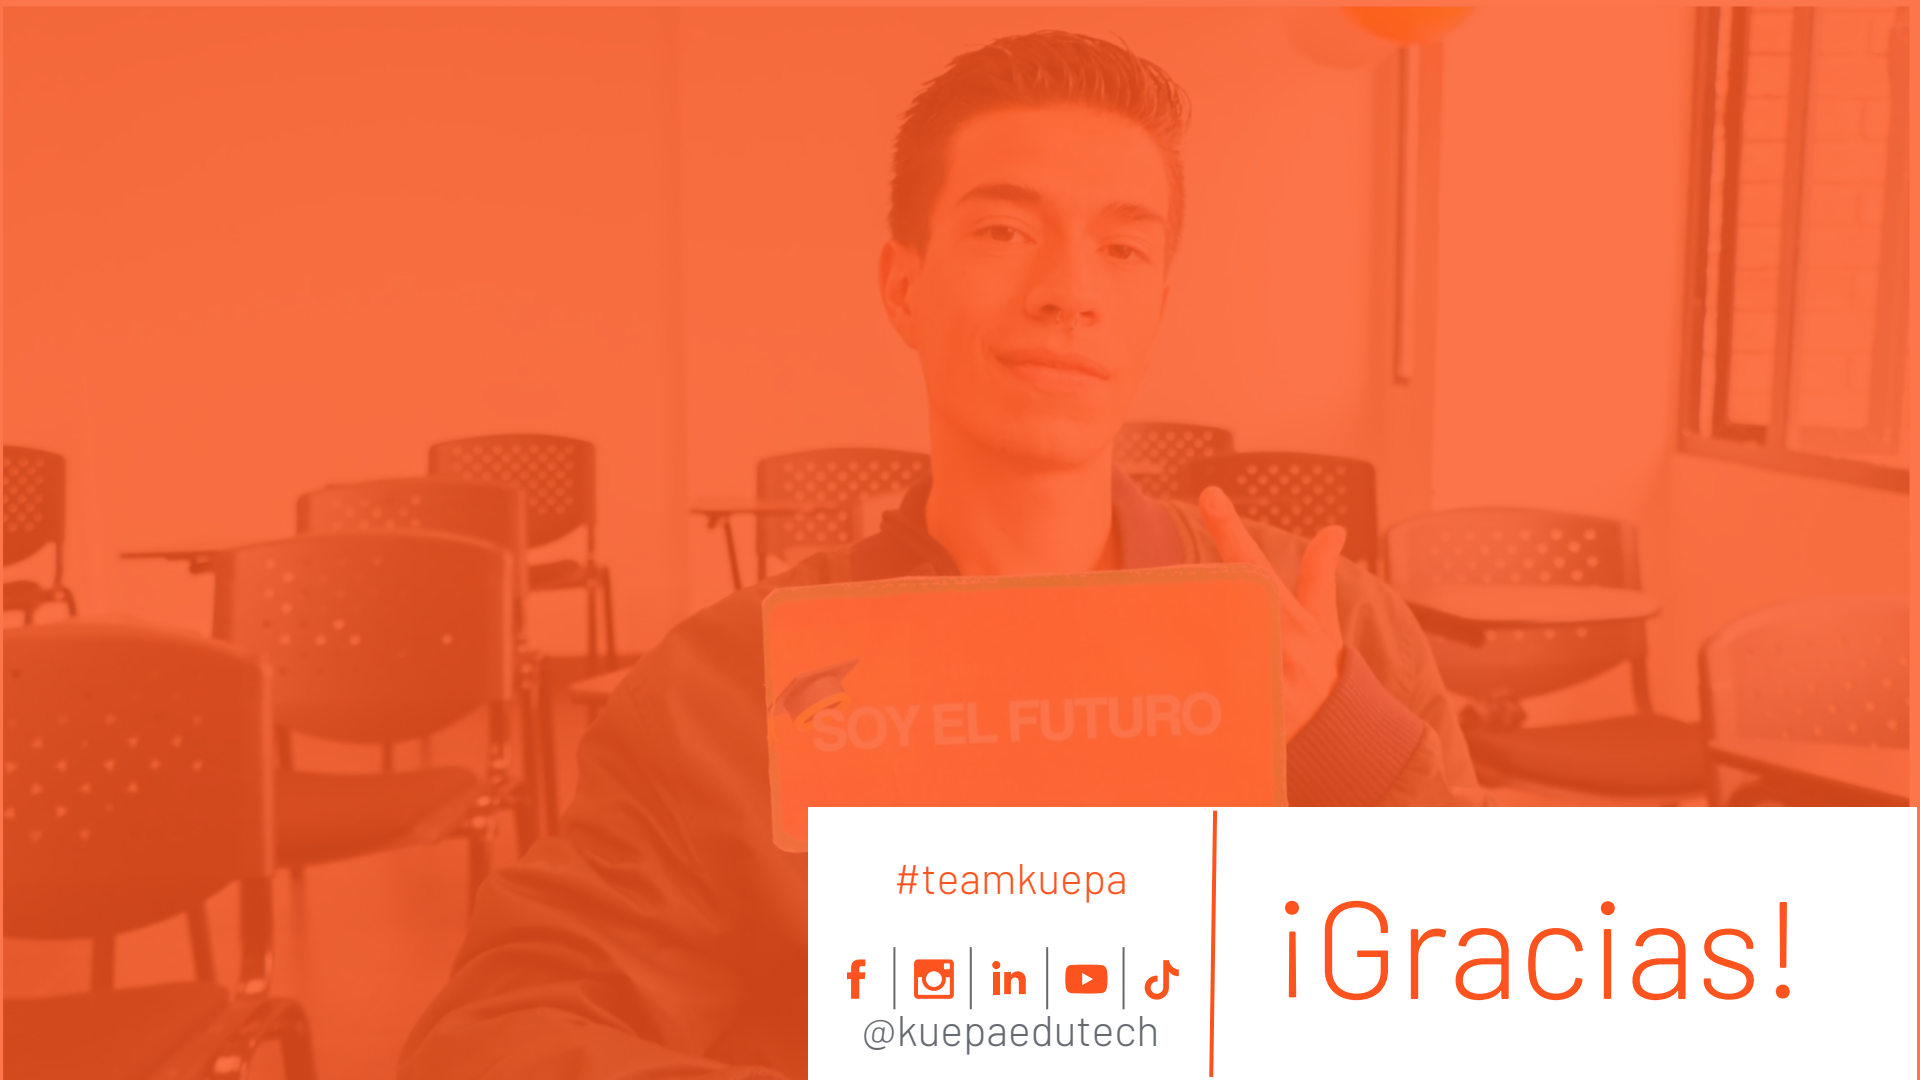

#teamkuepa

@kuepaedutech

¡Gracias!
