INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES

CONTRATO CO1.PCCNTR.8135886

I. Identificación de Proyecto

OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS PARA ESTRUCTURAR Y PRODUCIR PROGRAMAS DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL VIRTUAL PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO CRÍTICO DE LA ENTIDAD EN EL MARCO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN.
ENTIDAD CONTRATANTE:	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
VALOR DEL CONTRATO:	$ 181.522.600 (IVA incluido).
FECHA DE INICIO:	15 de agosto de 2025
FECHA DEL INFORME:	16 de octubre de 2025

II. Estado de Avance General

A la fecha, han sido desarrolladas actividades y entregados productos que evidencian un avance general del: **35%**.

III. Estado de Avance por Producto


Productos	Porcentaje de avance
Plan detallado de actividades para el desarrollo de los Programas de Aprendizaje Organizacional de conformidad con lo señalado en el anexo técnico que hace parte integral del contrato. *Descripción de actividades relacionadas:* El día 19 de agosto enviamos al Ministerio una primera versión del Plan Detallado de Actividades. Sin embargo, debido a que se identificó que los insumos que consisten en los contenidos de los PAO iban a tomar algunas semanas adicionales para su entrega por parte de los expertos del Ministerio, se elaboró una nueva versión de Plan Detallado de Actividades el cual fue enviado el día 10 de septiembre.	100%
Documento con el diseño gráfico, la corrección de estilo, la verificación y ajustes del proceso. *Descripción de actividades relacionadas:* El día 29 de agosto recibimos a través de correo electrónico el Manual de Imagen del Ministerio. A partir de este insumo desarrollamos una primera versión de la propuesta gráfica la cual entregamos vía correo electrónico el día 11 de septiembre. Recibimos retroalimentación sobre esta primera versión el día 15 de septiembre y este mismo día realizamos y entregamos los ajustes requeridos. El 16 de septiembre recibimos vía correo electrónico la confirmación de la aprobación final de este producto.	100%


Diseño de las guiones pedagógicas y curricular, de navegación y material de apoyo para los dos (2) Programas de Aprendizaje. *Descripción de actividades relacionadas:* El día 5 de septiembre fue realizada una reunión en las instalaciones del Ministerio en la que participaron los expertos de los contenidos del Ministerio, la supervisión del Contrato y el equipo de Didacsis. En la reunión se valoró el estado de los contenidos y se realizaron acuerdos sobre su entrega por parte de los expertos. Con la intención de favorecer este proceso, Didacsis ha venido realizando algunas actividades de apoyo: Didacsis aportó el día 23 de septiembre un documento con la consolidación de los contenidos del PAO sobre SEIP a partir de insumos que nos fueron entregados 10 de septiembre. Estos insumos consistieron especialmente en información que ha publicado el Ministerio sobre esta temática. Este documento ha sido creado con la intención de que los expertos lo valoren y a partir de este se construya el contenido definitivo. El día 12 de septiembre, se sostuvo una reunión con los expertos del PAO sobre Gestión Ambiental para evaluar los avances y de parte de Didacsis se brindaron recomendaciones para la construcción de los contenidos definitivos. El día 26 de septiembre tuvimos acceso a los documentos desarrollados hasta el momento sobre este PAO con los cuales estamos desarrollando actividades de estudio y análisis. El día 10 de octubre recibimos por parte del Ministerio los contenidos definitivos sobre Gestión Ambiental con los cuales hemos avanzado en los storyboards y recursos multimedia como ilustraciones y videos. A la fecha está pendiente la recepción de los contenidos sobre SEIP.	50%
Ocho (8) Storyboard para los videos para uno (1) de los Programas de Aprendizaje *Descripción de actividades relacionadas:* Hemos avanzado en la construcción de los storyboards del primer PAO y se encuentran en el OneDrive habilitado por el Ministerio para la entrega de productos: 6. Productos. Más abajo adjuntamos capturas de pantalla sobre la evidencia de estas entregas.	90%
Ocho (8) Storyboard restantes para los videos del segundo Programa de Aprendizaje	0%

Producción del 33% de los recursos virtuales de acuerdo con los guiones pedagógicos y storyboards aprobados. *Descripción de actividades relacionadas:* En el OneDrive se encuentran los recursos virtuales desarrollados hasta la fecha: 6. Productos. Estos han consistido en ilustraciones y diagramación para los videos animados. Más abajo adjuntamos capturas de pantalla sobre la evidencia de estas entregas.	100%
Producción del 66% de los recursos virtuales de acuerdo con los guiones pedagógicos y storyboards aprobados. *Descripción de actividades relacionadas:* En el OneDrive se encuentran los recursos virtuales desarrollados hasta la fecha: 6. Productos. Estos han consistido en ilustraciones y diagramación para los videos animados. Más abajo adjuntamos capturas de pantalla sobre la evidencia de estas entregas.	32%
Entrega del prototipo de Objeto Virtual de aprendizaje de uno (1) de los PAOs. *Descripción de actividades relacionadas:* Didacsis ha avanzado en la estructura de programación para el desarrollo de los módulos de los cursos y su adaptación gráfica.	18%
Producción del 100% de los recursos virtuales de acuerdo con los guiones pedagógicos y storyboards aprobados.	0%
Entrega del prototipo de Objeto Virtual de aprendizaje del PAOs faltante.	0%
Cargue de los PAOs en la plataforma del Ministerio (OVAS finales)	0%
Entrega de los SCORM y copias de seguridad de los dos cursos, documento con el diseño gráfico, la corrección de estilo, la verificación, ajustes del proceso de cada uno de los programas de aprendizaje organizacional, archivos, códigos fuente en versión final (2) PAOs.	0%
Documento final de correcciones y observaciones al diseño.	0%
Documento de Manual de usuario final.	0%

Evidencias


Contratos Escuela Corporativa
Nueva
Cargar
Editar en vista de cuadrícula
Compartir
Copiar vínculo
Documentos > General > DIDACSIS 2025 > 6. Productos > Gestion Ambiental
Nombre
Modificado
Modificado por
Módulo 1
hace 6 horas
cesarfranco
Módulo 2
hace 6 horas
cesarfranco
Módulo 3
hace 6 horas
cesarfranco
Módulo 4
hace 6 horas
cesarfranco

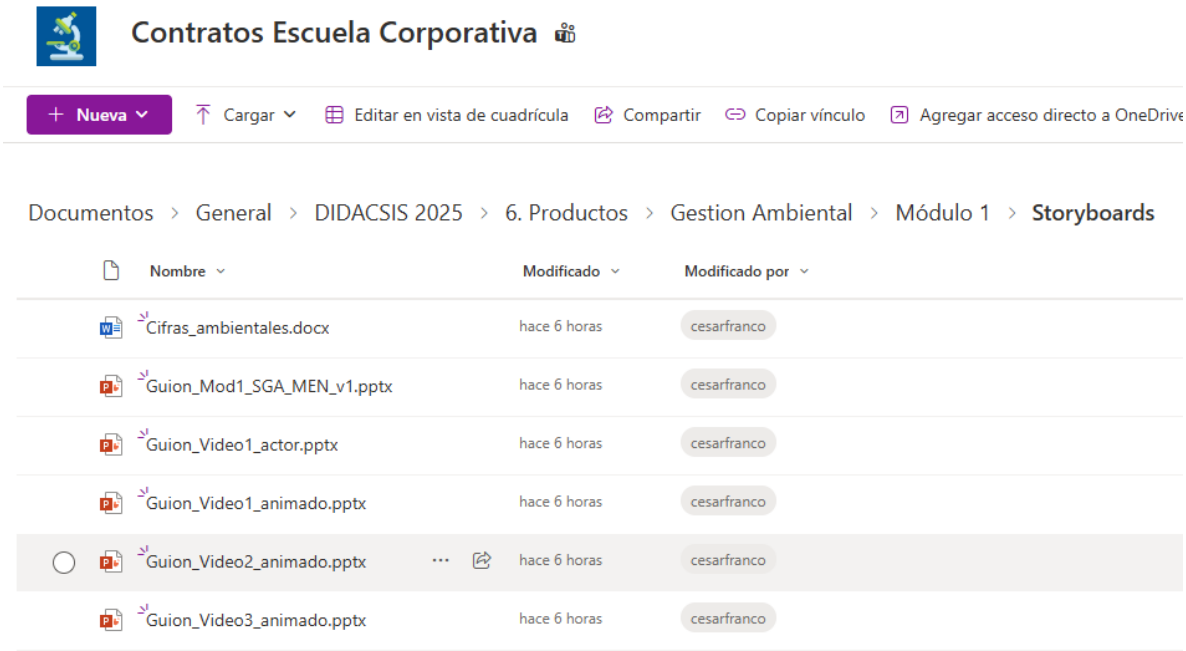
Contratos Escuela Corporativa
Nueva
Cargar
Editar en vista de cuadrícula
Compartir
Copiar vínculo
Agregar acceso directo a OneDrive
Documentos > General > DIDACSIS 2025 > 6. Productos > Gestion Ambiental > Módulo 1 > Storyboards
Nombre
Modificado
Modificado por
Cifras_ambientales.docx
hace 6 horas
cesarfranco
Guion_Mod1_SGA_MEN_v1.pptx
hace 6 horas
cesarfranco
Guion_Video1_actor.pptx
hace 6 horas
cesarfranco
Guion_Video1_animado.pptx
hace 6 horas
cesarfranco
Guion_Video2_animado.pptx
hace 6 horas
cesarfranco
Guion_Video3_animado.pptx
hace 6 horas
cesarfranco

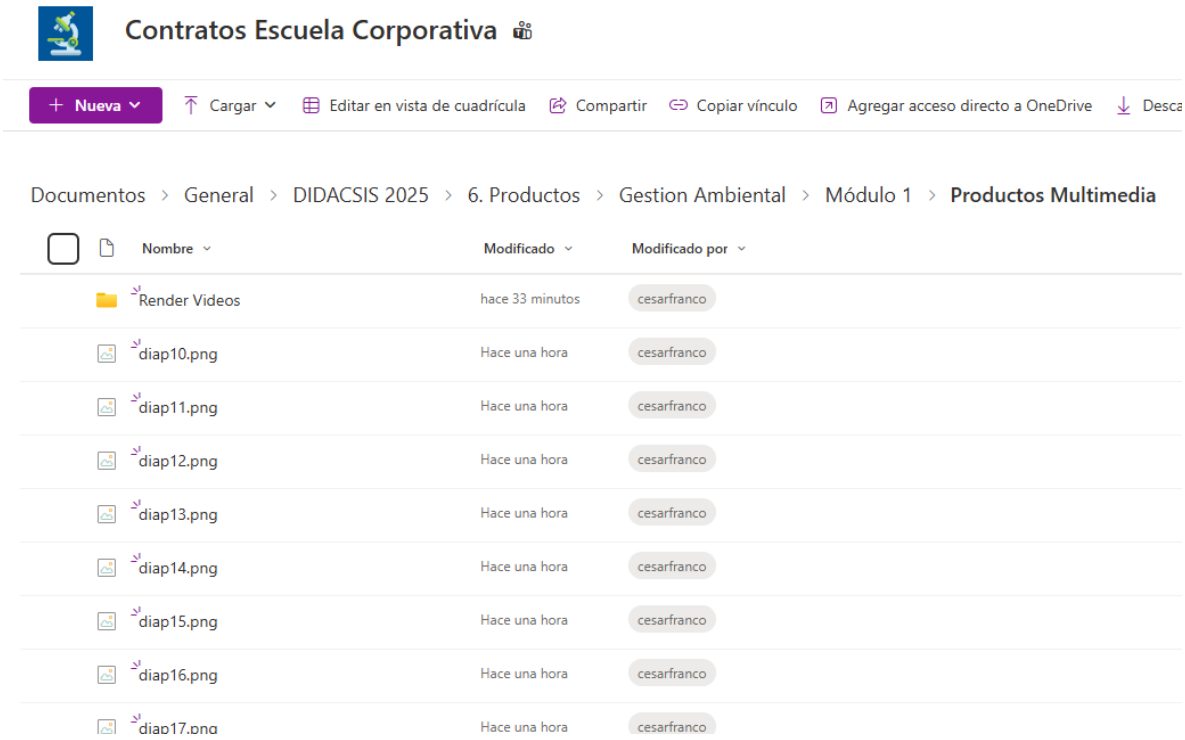

Cordialmente,

CÉSAR FRANCO CAICEDO

C.C. 80.040.683

Gerente de Proyecto

Didacsis SAS (NIT 900433013 – 9)

(571) 889 9091

316 761 0643

cesarfranco@didacsis.com
