INDUSTRIAS AFEP COLOMBIA SAS
NIT: 901.495.306-0

Bogotá, D.C, Octubre 15 de 2025

Señores:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
Atn. Sr. T3 Rueda Beltrán Luis Alberto
Supervisor
Ciudad

Ref. Contrato No. 075-00-A-COFAC-DILOS-2025 cuyo objeto es la Adquisición de Camisas, Camisetas y Pantaloncillos Tipo Bóxer para el Personal Militar de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Asunto: SOLICITUD PRORROGA

Respetado Sr. T3 Rueda:

Yo, **DANIEL ALEJANDRO CAVIEDES DUEÑAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.019.148.206 de Bogotá, actuando como representante legal de **INDUSTRIAS AFEP COLOMBIA SAS**, con identificación tributaria No. 901.495.306-0, por medio de este documento solicito de manera respetuosa me sea concedida una **PRORROGA** de 10 días al contrato en Referencia, esto con base en lo siguiente:

HECHOS

1. El pasado 1 de Julio del año en curso, enviamos orden de compra de las telas a Textiles Fabricato y el 9 de Julio, orden de compra del elástico para los Pantaloncillos tipo bóxer a Textiles Guarne



ORDEN DE COMPRA

licitaciones@afepcolombia.com.co
Para larango@fabricato.com

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...
mar 1/07/2025 1:19 p.m.

ORDEN DE COMPRA TELAS FABRICATO.pdf
453 KB

Buenas tardes Luis Fernando. Adjunto orden de compra.

Por otro lado, por favor me confirma si el color de las telas de los ítems 1 y 2 corresponde a la siguiente colorimetría.

Tabla 4. Coordenadas escala CIEL*a*b*

Color	L*	a*	b*	DEcmc
Gris	47.30	-0.79	-1.21	CMC 2:1

Cordialmente:

INDUSTRIAS AFEP COLOMBIA
Ing. ELIANA DUEÑAS ARAQUE
Licitaciones
Tel: 6016409052
Móvil: 3176684837
E-mail: licitaciones@afepcolombia.com.co
Bogotá - Colombia



ORDEN DE COMPRA

gerencia@afepcolombia.com.co
Para ventasbogota2@guarnetex.com

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...
mié 9/07/2025 1:47 p.m.

ORDEN DE COMPRA ELÁSTICO BOXER.pdf
329 KB

NTMD-0215-A1_BOXER.pdf
232 KB

Buenas tardes Sra. Nelly: adjunto al presente correo, orden de compra de elástico azul para Pantaloncillo tipo Bóxer con destino a la Fuerza Aeroespacial Colombiana y Norma Técnica donde están los requisitos que debe cumplir el elástico y las coordenadas del color.

Por favor me confirma el recibido.

Cordialmente:

INDUSTRIAS AFEP COLOMBIA
Ing. ELIANA DUEÑAS ARAQUE
Gerente General
Tel: 6016409052
Móvil: 3176684837
E-mail: gerencia@afepcolombia.com.co
Bogotá - Colombia

2. El pasado 3 de Julio, Fabricato en respuesta a nuestra solicitud, envía correo electrónico con la relación de las telas que tiene en existencia y las telas que se deben enviar a elaboración, con un tiempo de entrega de 30 a 40 días aproximadamente.

RE: ORDEN DE COMPRA

Luis Fernando Arango Correa <larango@fabric
Para licitaciones@afepcolombia.com.co
CC Victor Hugo Alzate Sossa

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

jue 3/07/2025 3:37 p.m.

Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de algunas imágenes en este mensaje.

Buenas tardes

Eliana, de acuerdo a las cantidades de tela relacionadas en las órdenes de compra, estoy enviado relacion de las telas que tenemos disponible en el momento y podemos despachar de forma inmediata, para lo cual les enviaría la prefactura para el respectivo tramite de pago.

La cantidad faltante que aparece en la ultima columna, se debe pasar a producción la cual tendría uno 30 a 40 dias aproximadamente.

REFERENCIA	BASE	DITEPT	ACAAP	DIESPT	COLOR	CALIDAD 1	CALIDAD 2	TOTAL	CANTIDAD PEDIDA OC	CANTIDAD FALTANTE
FLASH DYE FINISH DRY	4JE27	*	301R73	*	177002	620.08	550.23	1170.31	785	0
ALTAMAR FINISH DRY ANTIBACTERI	5MA45	003200	352R73	*	177002	0	82.81	82.81	235	235
ALTAMAR FINISH DRY	5MA45	003200	353R73	*	166552	795.82	0	795.82	270	0
INTERLOCK E.DISPERSO FINISH DR	4DK43	*	838R73	LQ0391	166552	114.01	33.9	147.91	3,410	3,300
ESCUADRA DYE PRINT SELLO AGUA	76201	FS01	841N73	LQ0391	03890	972.75	504.69	1477.44	850	0

Quedo atento a cualquier comentario al respecto.

Saludos

Cordialmente

Luis Fernando Arango Correa
Fabricato S.A.
Carrera 50 # 38-320 / Bello, Antioquia.
PBX: (+57 4) 448 35 00 Ext: 1005

3. El pasado 27 de Agosto, envían un comunicado de Fabricato, informando los inconvenientes de tipo técnico, presentados en producción (adjunto documento), haciendo entrega de las telas faltantes el pasado Sábado 6 de Septiembre.
4. El día Lunes 8 de Septiembre se realiza la visita de seguimiento de materia prima para la camiseta PCLO y RIB de la Camiseta Táctica y se realiza el muestreo de insumos con destino a los laboratorios para los respectivos ensayos.
5. Ese mismo día 8 de Septiembre, procedemos a desenrollar las telas con el fin de dejar en reposo 24 horas, proceso que se realiza para que las telas recuperen su estado y no afecte las medidas del producto terminado.
6. El 10 de Septiembre iniciamos el proceso de corte y posteriormente, el proceso de confección de estos elementos.
7. Con respecto a la tela principal para la elaboración del Pantaloncillo Tipo Bóxer, desde el pasado 23 de Julio se aprobó la tela y el tono pero esta tela fue entregada en su totalidad hasta el pasado 29 de Septiembre.

RV: APROBACION TONO TELA LYCRA ALGODON

licitaciones@afepcolombia.com.co
Para 'olga.c@toptex.com.co'

Responder | Responder a todos | Reenviar | ...

mié 23/07/2025 4:19 p. m.

APROBACION TONO TOPTEX.pdf
449 KB

Buenas tardes. Adjunto al presente correo, documento confirmando el tono aprobado de la Tela de Pantaloncillo tipo Bóxer azul el cual es la referencia 20799-11

Cantidad solicitada: 1.400 kilos


Cordialmente:

IAC INDUSTRIAS AFEP COLOMBIA
Ing. ELIANA DUEÑAS ARAQUE
Licitaciones
Tel: 6016409052
Móvil: 3176684837
E-mail: licitaciones@afepcolombia.com.co
Bogota - Colombia



8. Con respecto al elástico, la empresa Textiles Guarne, informa que tuvieron demoras en el proceso de entorchado y teñido del hilo para la confección del elástico y hasta el 13 de Septiembre empezaron a tejerlo, comprometiéndose a realizar la entrega de los 11.000 metros solicitados el 26 de Septiembre, fecha **que no se cumplió**, y dicho elástico lo entregaron en su totalidad hasta el 29 de Septiembre,

realizando la visita de seguimiento de materia prima del bóxer el 29 de Septiembre para el 50% y el 30 de Septiembre, el otro 50% como consta en las Actas de Visita de seguimiento de materia prima del Pantaloncillo tipo Bóxer.

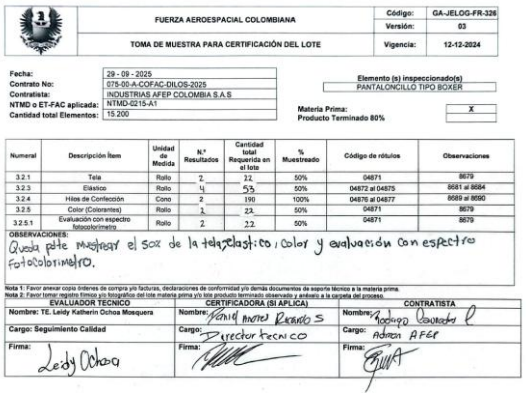

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA — Código: GA-JELOG-FR-326 — Versión: 03 — Vigencia: 12-12-2024

TOMA DE MUESTRA PARA CERTIFICACIÓN DEL LOTE

Fecha: 29 - 09 - 2025
Contrato No: 075-00-A-COFAC-DILOS-2025
Contratista: INDUSTRIAS AFEP COLOMBIA S.A.S
NTMD o ET-FAC aplicada: NTMD-0215-A1
Cantidad total Elementos: 15.200


Elemento (s) inspeccionado(s): PANTALONCILLO TIPO BOXER
Materia Prima: X
Producto Terminado 80%

Numeral	Descripción ítem	Unidad de Medida	N.° Resultados	Cantidad total Requerida en el lote	% Muestreado	Código de rótulos	Observaciones
3.2.1	Tela	Rollo	2	22	50%	04871	8679
3.2.3	Elastico	Rollo	4	53	50%	04872 al 04875	8681 al 8684
3.2.4	Hilos de Confección	Cono	2	190	100%	04876 al 04877	8689 al 8690
3.2.5	Color (Colorantes)	Rollo	1	23	50%	04871	8679
3.2.5.1	Evaluación con espectro fotocolorimetro	Rollo	2	22	50%	04871	8679

OBSERVACIONES: Queda pete mostrar el scr de la telaelastico, color y evaluacion con espectro fotocolorimetro.

Nota 1: Favor anexar copia órdenes de compra y/o facturas, declaraciones de conformidad y/o demás documentos de soporte técnico a la materia prima.
Nota 2: Favor tomar registro fílmico y/o fotográfico del lote materia prima y/o lote producto terminado observado y anexo a la carpeta del proceso.

EVALUADOR TECNICO	CERTIFICADORA (SI APLICA)	CONTRATISTA
Nombre: TE. Leidy Katherin Ochoa Mosquera	Nombre: Yenid Andrea Rivera S	Nombre: Rodrigo Coronado
Cargo: Seguimiento Calidad	Cargo: Director tecnico	Cargo: Admin AFEP
Firma: Leidy Ochoa	Firma:	Firma:

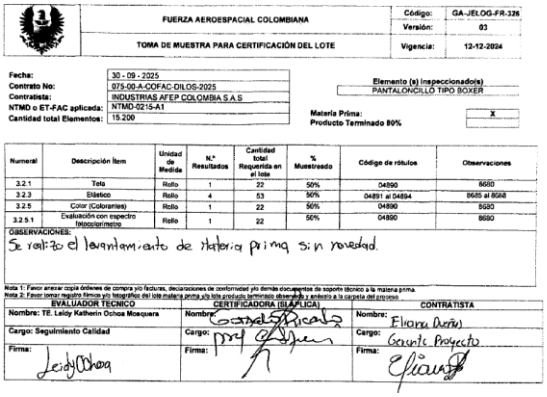

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA — Código: GA-JELOG-FR-326 — Versión: 03 — Vigencia: 12-12-2024

TOMA DE MUESTRA PARA CERTIFICACIÓN DEL LOTE

Fecha: 30 - 09 - 2025
Contrato No: 075-00-A-COFAC-DILOS-2025
Contratista: INDUSTRIAS AFEP COLOMBIA S.A.S
NTMD o ET-FAC aplicada: NTMD-0215-A1
Cantidad total Elementos: 15.200

Elemento (s) inspeccionado(s): PANTALONCILLO TIPO BOXER
Materia Prima: X
Producto Terminado 80%

Numeral	Descripción ítem	Unidad de Medida	N.° Resultados	Cantidad total Requerida en el lote	% Muestreado	Código de rótulos	Observaciones
3.2.1	Tela	Rollo	1	22	50%	04890	8680
3.2.3	Elástico	Rollo	4	53	90%	04891 al 04894	8685 al 8688
3.2.5	Color (Colorantes)	Rollo	1	22	50%	04890	8680
3.2.5.1	Evaluación con espectro fotocolorimetro	Rollo	1	22	50%	04890	8680

OBSERVACIONES: Se realizo el levantamiento de Materia prima sin novedad.

Nota 1: Favor anexar copia órdenes de compra y/o facturas, declaraciones de conformidad y/o demás documentos de soporte técnico a la materia prima.
Nota 2: Favor tomar registro fílmico y/o fotográfico del lote materia prima y/o lote producto terminado observado y anexo a la carpeta del proceso.

EVALUADOR TECNICO	CERTIFICADORA (SI APLICA)	CONTRATISTA
Nombre: TE. Leidy Katherin Ochoa Mosquera	Nombre: Gabriela Ricaurte	Nombre: Eliana Duran
Cargo: Seguimiento Calidad	Cargo:	Cargo: Gerente Proyecto
Firma: Leidy Ochoa	Firma:	Firma:

JUSTIFICACION

En virtud de lo expuesto anteriormente, informamos a la entidad:

Que, al presentarse inconvenientes de tipo técnico, en la producción de las telas principales y elástico se generó también un retraso en la entrega de las mismas, las cuales entregaron en nuestra planta hasta el Sábado 6 de Septiembre (Camiseta PCLO y RIB de la Táctica) y hasta el 29 de Septiembre, la tela y el elástico del Pantaloncillo tipo Bóxer.

Que, estos inconvenientes técnicos presentados a nuestros proveedores y el incumplimiento en las entregas de las materias primas, perjudicaron de gran manera el proceso de confección y nos vimos obligados a realizar ajustes en nuestro proceso productivo y a necesitar de un tiempo adicional al inicialmente establecido con el fin de culminar con éxito el proceso.

Que, estas telas al igual que el elástico, por su composición, no permiten realizar el proceso de corte de forma inmediata, sino que son telas que se deben desenrollar y dejar en reposo, con el fin que recuperen su estado y no se vean afectadas las medidas en el producto terminado.

Que, por la necesidad de realizar la visita del 2% de manera inmediata, se cometió el error de no dejar reposar la tela lo suficiente antes del proceso de corte y desafortunadamente tuvimos un problema de encogimiento de la tela, lo que nos obliga ahora a revisar las unidades de este 2% y reemplazarlas y volver a programar la visita de seguimiento.

Que, al juntarse la fabricación de todos los elementos, por el incumplimiento de nuestros proveedores en las entregas de las materias primas, estamos presentando un embotellamiento en el remate, revisión de calidad y empaque de los mismos, procesos que requieren de personal calificado para su ejecución por lo que no podemos tener personal que no sea idóneo para estos procesos.

Que, a pesar de todos los inconvenientes presentados por el incumplimiento de los proveedores, lo que nos ocasionó retrasos en el inicio del proceso de fabricación y fallas en el proceso productivo por el afán, nuestra empresa sabe del compromiso adquirido con ustedes y trabaja de forma muy diligente para entregar productos de excelente calidad.

INDUSTRIAS AFEP COLOMBIA SAS
NIT: 901.495.306-0

PRODUCTO PARA REMATE, CALIDAD Y EMPAQUE






Calle 18 No. 96B - 48 PISO 2; TEL: 6016409052; Móvil: 3175860989 - 3176684837
E-mail: gerencia@afepcolombia.com.co; licitaciones@afepcolombia.com.co
Bogotá, D.C. - Colombia

INDUSTRIAS AFEP COLOMBIA SAS
NIT: 901.495.306-0

PRODUCTO PARA EMPAQUE Y PRODUCTO EMPACADO





Calle 18 No. 96B - 48 PISO 2; TEL: 6016409052; Móvil: 3175860989 - 3176684837
E-mail: gerencia@afepcolombia.com.co; licitaciones@afepcolombia.com.co
Bogotá, D.C. - Colombia

INDUSTRIAS AFEP COLOMBIA SAS
NIT: 901.495.306-0



SOLICITUD

En virtud de lo anteriormente expuesto, solicitamos a la entidad nos conceda una **PRÓRROGA** para la entrega de los bienes objeto del contrato en referencia, de 10 días adicionales, o sea hasta el día 30 de Octubre del 2025.

Agradezco de antemano por su atención y quedo atento a su respuesta para realizar los ajustes respectivos al cronograma de actividades.

Cordialmente:

DANIEL ALEJANDRO CAVIEDES DUEÑAS
C.C. No. 1.019.148.206 de Bogotá
Representante Legal
INDUSTRIAS AFEP COLOMBIA SAS
