UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Contrato de Interventoría N° CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia. Obligación N° 25

Programa de Formación Especializada para la Economía Campesina - Convocatoria DSNFT – 0001 – FEEC – 2024

Informe final

ASOCIACIÓN NACIONAL DE USUARIOS CAMPESINOS DE COLOMBIA – ANUC COLOMBIA

UNIVERSIDAD® DE ANTIOQUIA
1803

CO1.PCCNTR.6914612

Contenido

1. Datos generales del convenio 2
2. Aspectos técnicos 2
2.1. Proyecto aprobado 2
2.2. Cumplimiento Técnico 3
2.3. Impacto regional 8
2.4. Indicadores del proyecto 12
3. Aspectos financieros 15
3.1. Ejecución presupuestal por fuente de financiación 15
3.2. Reconocimiento final 18
4. Aspectos transversales 18
4.1. Aspectos jurídicos 18
4.2. Aspectos administrativos 19
4.3. Aspectos relevantes 22
4.3.1. Fortalezas 23
4.3.2. Puntos a mejorar 23
4.3.3. Caso de éxito 23

1. Datos generales del convenio

- Fecha de suscripción del convenio: 31 de octubre de 2024
- Fecha de inicio del convenio: 13 de noviembre de 2024
- Fecha de inicio de actividades académicas: 29 de noviembre de 2024
- Fecha de finalización de actividades académicas: 21 de julio de 2025

2. Aspectos técnicos

2.1. Proyecto aprobado

El proyecto presentado por ANUC COLOMBIA se resume en las siguientes tablas:

N° AF	Nombre de la acción de formación	Horas de la acción de formación					Total horas	Evento de aprendizaje
		Presencial	PAT	Virtuales	Hibrida	N. grupos		
1	"Historia y visión de la ANUC"	16	0	0	0	4	64	Campamento de Formación
2	Tipos de democracia, participación y ODS	16	0	0	0	4	64	Campamento de Formación
3	Desafíos del proyecto político de la ANUC	8	0	0	0	4	32	Campamento de Formación
4	REFORMA AGRARIA	16	0	0	0	4	64	Campamento de Formación
5	Justicia transicional	16	0	0	0	4	64	Campamento de Formación
6	Ordenamiento territorial	8	0	0	0	4	32	Campamento de Formación
7	Planeación campesina y calendarios agrícolas	16	0	0	0	4	64	Campamento de Formación
8	Adaptación y resiliencia al cambio climático, producción y mercados campesinos	16	0	0	0	4	64	Campamento de Formación
9	Sistema de comercialización, agenda y rutas	8	0	0	0	4	32	Campamento de Formación
10	Gestión de recursos para problemas locales-territoriales	8	0	0	0	11	88	Taller
11	Tipos de informática y TICs en el contexto campesino	8	0	0	0	10	80	Taller
12	Contaduría y administración para la asociatividad campesina	8	0	0	0	10	80	Taller
13	Educación popular de sostenibilidad campesina	8	0	0	0	10	80	Taller
14	Sistema de alertas campesinas	8	0	0	0	10	80	Taller
15	Coordinación, seguimiento y veeduria	8	0	0	0	10	80	Taller
	TOTALES	168	0	0	0	**97**	**968**	

N° AF	Nombre de la acción de formación	BENEFICIARIOS		
		Empresa	SENA	Total
1	"Historia y visión de la ANUC"	80	0	80
2	Tipos de democracia, participación y ODS	80	0	80
3	Desafíos del proyecto político de la ANUC	80	0	80
4	REFORMA AGRARIA	80	0	80
5	Justicia transicional	80	0	80

6	Ordenamiento territorial	80	0	80
7	Planeación campesina y calendarios agrícolas	80	0	80
8	Adaptación y resiliencia al cambio climático, producción y mercados campesinos	80	0	80
9	Sistema de comercialización, agenda y rutas	80	0	80
10	Gestión de recursos para problemas locales-territoriales	110	0	110
11	Tipos de informática y TICs en el contexto campesino	100	0	100
12	Contaduría y administración para la asociatividad campesina	100	0	100
13	Educación popular de sostenibilidad campesina	100	0	100
14	Sistema de alertas campesinas	100	0	100
15	Coordinación, seguimiento y veeduria	100	0	100
	TOTALES	**1330**	**0**	**1.330**

N° AF	Nombre de la acción de formación	Costo AF
1	"Historia y visión de la ANUC"	$ 54.961.748,00
2	Tipos de democracia, participación y ODS	$ 54.961.748,00
3	Desafíos del proyecto político de la ANUC	$ 35.476.401,00
4	REFORMA AGRARIA	$ 54.961.748,00
5	Justicia transicional	$ 54.961.748,00
6	Ordenamiento territorial	$ 35.476.401,00
7	Planeación campesina y calendarios agrícolas	$ 54.961.748,00
8	Adaptación y resiliencia al cambio climático, producción y mercados campesinos	$ 54.961.748,00
9	Sistema de comercialización, agenda y rutas	$ 35.476.401,00
10	Gestión de recursos para problemas locales-territoriales	$ 69.301.087,00
11	Tipos de informática y TICs en el contexto campesino	$ 63.287.891,00
12	Contaduría y administración para la asociatividad campesina	$ 63.287.891,00
13	Educación popular de sostenibilidad campesina	$ 63.287.891,00
14	Sistema de alertas campesinas	$ 63.287.891,00
15	Coordinación, seguimiento y veeduria	$ 63.287.891,00
	TOTALES	$ 821.940.233,00

2.2. Cumplimiento Técnico

La ejecución académica del proyecto se cumplió de la siguiente manera:

AF	COFINANCIACIÓN	CONTRAPARTIDA	TOTAL	PESO AF	BENEFICIARIOS INICIALES	Indice de deserción X%	BENEFICIARIOS RECONOCIDOS
1	$ 48.412.253,00	$ 6.549.495,00	54.961.748,00	6,69%	80	0	80
2	$ 48.412.259,00	$ 6.549.489,00	54.961.748,00	6,69%	80	0	80
3	$ 31.926.913,00	$ 3.549.488,00	35.476.401,00	4,32%	80	0	80
4	$ 48.412.259,00	$ 6.549.489,00	54.961.748,00	6,69%	80	0	80
5	$ 48.412.259,00	$ 6.549.489,00	54.961.748,00	6,69%	80	0	80
6	$ 31.926.912,00	$ 3.549.489,00	35.476.401,00	4,32%	80	0	80
7	$ 48.412.259,00	$ 6.549.489,00	54.961.748,00	6,69%	80	0	80
8	$ 48.412.259,00	$ 6.549.489,00	54.961.748,00	6,69%	80	0	80
9	$ 31.926.912,00	$ 3.549.489,00	35.476.401,00	4,32%	80	0	80
10	$ 61.651.598,00	$ 7.649.489,00	69.301.087,00	8,43%	110	0	110
11	$ 55.638.402,00	$ 7.649.489,00	63.287.891,00	7,70%	100	0	100
12	$ 55.638.402,00	$ 7.649.489,00	63.287.891,00	7,70%	100	0	100
13	$ 55.638.402,00	$ 7.649.489,00	63.287.891,00	7,70%	100	0	100
14	$ 55.638.402,00	$ 7.649.489,00	63.287.891,00	7,70%	100	0	100
15	$ 55.638.402,00	$ 7.649.489,00	63.287.891,00	7,70%	100	0	100

AF	COFINANCIACIÓN	CONTRAPARTIDA	TOTAL	PESO AF	BENEFICIARIOS INICIALES	Indice de deserción X%	BENEFICIARIOS RECONOCIDOS
Total	**$726.097.893,00**	**$95.842.340,00**	**$821.940.233,00**	**100,00%**	**1330**	**0**	**1330**

AF	VALOR RECONOCIDO COFINANCIACIÓN	% RECONOCIDO COFINANCIACIÓN	VALOR RECONOCIDO CONTRAPARTIDA	% RECONOCIDO CONTRAPARTIDA	VALOR RECONOCIDO TOTAL	% RECONOCIDO TOTAL
1	48.412.253,00	6,67%	6.549.495,00	6,8%	54.961.748,00	6,69%
2	48.412.259,00	6,67%	6.549.489,00	6,8%	54.961.748,00	6,69%
3	31.926.913,00	4,40%	3.549.488,00	3,7%	35.476.401,00	4,32%
4	48.412.259,00	6,67%	6.549.489,00	6,8%	54.961.748,00	6,69%
5	48.412.259,00	6,67%	6.549.489,00	6,8%	54.961.748,00	6,69%
6	31.926.912,00	4,40%	3.549.489,00	3,7%	35.476.401,00	4,32%
7	48.412.259,00	6,67%	6.549.489,00	6,8%	54.961.748,00	6,69%
8	48.412.259,00	6,67%	6.549.489,00	6,8%	54.961.748,00	6,69%
9	31.926.912,00	4,40%	3.549.489,00	3,7%	35.476.401,00	4,32%
10	61.651.598,00	8,49%	7.649.489,00	8,0%	69.301.087,00	8,43%
11	55.638.402,00	7,66%	7.649.489,00	8,0%	63.287.891,00	7,70%
12	55.638.402,00	7,66%	7.649.489,00	8,0%	63.287.891,00	7,70%
13	55.638.402,00	7,66%	7.649.489,00	8,0%	63.287.891,00	7,70%
14	55.638.402,00	7,66%	7.649.489,00	8,0%	63.287.891,00	7,70%
15	55.638.402,00	7,66%	7.649.489,00	8,0%	63.287.891,00	7,70%
Total	**$726.097.893,00**	**100,00%**	**$95.842.340,00**	100,0%	**$821.940.233,00**	**100,00%**

Además, se presentó una certificación firmada por el Director del Proyecto, en la que se relacionan los beneficiarios de cada acción de formación, número de cédula y porcentaje de asistencia de cada uno, de acuerdo con:

N. AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	N. DE BENEFICIARIOS CERTIFICADOS	FECHA DE CERTIFICACION
1	"Historia y visión de la ANUC"	1	20	30/07/2025
		2	20	30/07/2025
		3	21	30/07/2025
		4	20	30/07/2025
2	Tipos de democracia, participación y ODS	1	20	30/07/2025
		2	20	30/07/2025
		3	21	30/07/2025
		4	20	30/07/2025
3	Desafíos del proyecto político de la ANUC	1	20	30/07/2025
		2	20	30/07/2025
		3	20	30/07/2025
		4	21	30/07/2025
4	REFORMA AGRARIA	1	20	30/07/2025
		2	20	30/07/2025
		3	20	30/07/2025
		4	20	30/07/2025
5	Justicia transicional	1	20	30/07/2025
		2	20	30/07/2025
		3	20	30/07/2025
		4	20	30/07/2025

N. AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	N. DE BENEFICIARIOS CERTIFICADOS	FECHA DE CERTIFICACION
6	Ordenamiento territorial	1	20	30/07/2025
		2	20	30/07/2025
		3	20	30/07/2025
		4	20	30/07/2025
7	Planeación campesina y calendarios agrícolas	1	20	30/07/2025
		2	20	30/07/2025
		3	23	30/07/2025
		4	20	30/07/2025
8	Adaptación y resiliencia al cambio climático, producción y mercados campesinos	1	20	30/07/2025
		2	20	30/07/2025
		3	20	30/07/2025
		4	20	30/07/2025
9	Sistema de comercialización, agenda y rutas	1	20	30/07/2025
		2	20	30/07/2025
		3	23	30/07/2025
		4	20	30/07/2025
10	Gestión de recursos para problemas locales-territoriales	1	10	30/07/2025
		2	10	30/07/2025
		3	10	30/07/2025
		4	11	30/07/2025
		5	10	30/07/2025
		6	10	30/07/2025
		7	10	30/07/2025
		8	10	30/07/2025
		9	10	30/07/2025
		10	13	30/07/2025
		11	10	30/07/2025
11	Tipos de informática y TICs en el contexto campesino	1	12	30/07/2025
		2	12	30/07/2025
		3	10	30/07/2025
		4	10	30/07/2025
		5	12	30/07/2025
		6	10	30/07/2025
		7	11	30/07/2025
		8	10	30/07/2025
		9	13	30/07/2025
		10	10	30/07/2025
12	Contaduría y administración para la asociatividad campesina	1	10	30/07/2025
		2	10	30/07/2025
		3	11	30/07/2025
		4	11	30/07/2025
		5	10	30/07/2025
		6	10	30/07/2025
		7	10	30/07/2025
		8	11	30/07/2025

N. AF	NOMBRE ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	N. DE BENEFICIARIOS CERTIFICADOS	FECHA DE CERTIFICACION
		9	10	30/07/2025
		10	11	30/07/2025
13	Educación popular de sostenibilidad campesina	1	10	30/07/2025
		2	10	30/07/2025
		3	10	30/07/2025
		4	10	30/07/2025
		5	10	30/07/2025
		6	10	30/07/2025
		7	10	30/07/2025
		8	10	30/07/2025
		9	10	30/07/2025
		10	10	30/07/2025
14	Sistema de alertas campesinas	1	10	30/07/2025
		2	10	30/07/2025
		3	10	30/07/2025
		4	10	30/07/2025
		5	10	30/07/2025
		6	10	30/07/2025
		7	10	30/07/2025
		8	10	30/07/2025
		9	12	30/07/2025
		10	10	30/07/2025
15	Coordinación, seguimiento y veeduría	1	10	30/07/2025
		2	10	30/07/2025
		3	10	30/07/2025
		4	10	30/07/2025
		5	13	30/07/2025
		6	13	30/07/2025
		7	13	30/07/2025
		8	14	30/07/2025
		9	12	30/07/2025
		10	10	30/07/2025

En el aplicativo dispuesto por el SENA, el conviniente evidencia el registro de beneficiarios cumpliendo con el numeral 9 de la cláusula sexta del convenio, así:

N°	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN EL SEP	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS
1	“Historia y visión de la ANUC”	1	20	20	20
		2	20	20	20
		3	20	21	21
		4	20	20	20
2	Tipos de democracia, participación y ODS	1	20	20	20
		2	20	20	20
		3	20	21	21
		4	20	20	20
3		1	20	20	20

N°	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN EL SEP	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS
	Desafíos del proyecto político de la ANUC	2	20	20	20
		3	20	20	20
		4	20	21	21
4	REFORMA AGRARIA	1	20	20	20
		2	20	20	20
		3	20	20	20
		4	20	20	20
5	Justicia transicional	1	20	20	20
		2	20	20	20
		3	20	20	20
		4	20	20	20
6	Ordenamiento territorial	1	20	20	20
		2	20	20	20
		3	20	20	20
		4	20	20	20
7	Planeación campesina y calendarios agrícolas	1	20	20	20
		2	20	20	20
		3	20	23	23
		4	20	20	20
8	Adaptación y resiliencia al cambio climático, producción y mercados campesinos	1	20	20	20
		2	20	20	20
		3	20	20	20
		4	20	20	20
9	Sistema de comercialización, agenda y rutas	1	20	20	20
		2	20	20	20
		3	20	23	23
		4	20	20	20
10	Gestión de recursos para problemas locales-territoriales	1	10	10	10
		2	10	10	10
		3	10	10	10
		4	10	11	11
		5	10	10	10
		6	10	10	10
		7	10	10	10
		8	10	10	10
		9	10	10	10
		10	10	13	13
		11	10	10	10
11	Tipos de informática y TICs en el contexto campesino	1	10	12	12
		2	10	12	12
		3	10	10	10
		4	10	10	10
		5	10	12	12
		6	10	10	10
		7	10	11	11
		8	10	10	10
		9	10	13	13
		10	10	10	10
12	Contaduría y administración para la asociatividad campesina	1	10	10	10
		2	10	10	10
		3	10	11	11

N°	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN EL SEP	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS
		4	10	11	11
		5	10	10	10
		6	10	10	10
		7	10	10	10
		8	10	11	11
		9	10	10	10
		10	10	11	11
13	Educación popular de sostenibilidad campesina	1	10	10	10
		2	10	10	10
		3	10	10	10
		4	10	10	10
		5	10	10	10
		6	10	10	10
		7	10	10	10
		8	10	10	10
		9	10	10	10
		10	10	10	10
14	Sistema de alertas campesinas	1	10	10	10
		2	10	10	10
		3	10	10	10
		4	10	10	10
		5	10	10	10
		6	10	10	10
		7	10	10	10
		8	10	10	10
		9	10	12	12
		10	10	10	10
15	Coordinación, seguimiento y veeduría	1	10	10	10
		2	10	10	10
		3	10	10	10
		4	10	10	10
		5	10	13	13
		6	10	13	13
		7	10	13	13
		8	10	14	14
		9	10	12	12
		10	10	10	10
Total			**1330**	**1374**	**1374**

- Beneficiarios esperados: 1330
- Beneficiarios certificados: 1374

2.3. Impacto regional

El programa de formación especializada para la economía campesina busca la adquisición y actualización de conocimientos, habilidades, técnicas, prácticas y la mejora de las competencias de las campesinas y campesinos, la generación de capacidades, incentivo de la asociatividad, la participación y la integración comercial entre los actores de la economía campesina, así como la transformación productiva, protección del ambiente, los

recursos hídricos y la agroecología, a través de la cofinanciación de los proyectos avalados, en la convocatoria DSNFT – 0001 – FEEC – 2024, entre otros aspectos, promovió y estimuló desde la formulación la implementación de acciones de formación en zonas rurales, especialmente para los beneficiarios que residen en (municipios PDET, ZOMAC o zonas aledañas a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, zonas rurales).

ANUC COLOMBIA alineado con este enfoque ejecutó algunos eventos formativos para la población ubicada en estas localidades así:


N°	NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN	COBERTURA GEOGRÀFICA INICIAL	COBERTURA GEOGRÁFICA MODIFICADA
1	“Historia y visión de la ANUC”	LA GUAJIRA- DIBULLA CHOCÓ- ISTMINA GUAVIARE- CALAMAR PUTUMAYO- MOCO	LA GUAJIRA- RIOACHA- CHOCÓ- ISTMINA GUAVIARE- CALAMAR PUTUMAYO- MOCOA
2	Tipos de democracia, participación y ODS	SUCRE- OVEJAS TOLIMA- PLANADAS GUAVIARE- SAN JOSÉ DEL GUAVIARE CAQUETÁ- FLORENCIA	SUCRE- OVEJAS CAUCA- TAMBO GUAVIARE- SAN JOSÉ DEL GUAVIARE CAQUETÁ- FLORENCIA
3	Desafíos del proyecto político de la ANUC	BOLÍVAR- MORALES NARIÑO- POLICARPA META- MAPIRIPÁN CAUCA- EL TAMBO	NA
4	REFORMA AGRARIA	CÓRDOBA- VALENCIA ANTIOQUIA- AMALFI META- VISTAHERMOSA HUILA- ALGECIRAS	CÓRDOBA- VALENCIA CAUCA- PATIA META- SAN MARTIN HUILA- ALGECIRAS
5	Justicia transicional	BOLÍVAR- MARÍA LA BAJA NARIÑO- FRANCISCO PIZARRO ARAUCA- SARAVENA PUTUMAYO- PUERTO ASÍS	BOLÍVAR- MARÍA LA BAJA NARIÑO- LEIVA CAUCA - MORALES PUTUMAYO- PUERTO ASÍS
6	Ordenamiento territorial	CESAR- MANAURE BALCÓN DEL CESAR NARIÑO- EL ROSARIO NORTE DE SANTANDER- EL TARRA CAUCA- CAJIBÍO	CESAR- MANAURE BALCÓN DEL CESAR NARIÑO- EL ROSARIO CAQUETÁ - SAN JOSE DEL FRAGUA CAUCA- CAJIBÍO
7	Planeación campesina y calendarios agrícolas	MAGDALENA- SANTA MARTA ANTIOQUIA- EL BAGRE META- PUERTO LLERAS VALLE DEL CAUCA- FLORIDA	MAGDALENA- FUNDACIÓN CHOCÓ- EL CARMEN DE ATRATO META- PUERTO LLERAS CAUCA – PIENDAMO
8	Adaptación y resiliencia al cambio climático, producción y mercados campesinos	BOLÍVAR- ARENAL CHOCÓ- BOJAYÁ ARAUCA- ARAUQUITA CAQUETÁ- BELÉN DE LOS ANDAQUIES	BOLÍVAR- EL CARMEN DE BOLIVAR CHOCÓ- ISMINA CAUCA- TAMBO CAQUETÁ- BELÉN DE LOS ANDAQUIES
9	Sistema de comercialización, agenda y rutas	CÓRDOBA- MONTELÍBANO ANTIOQUIA- VALDIVIA GUAVIARE- EL RETORNO CAQUETÁ- SAN VICENTE DEL CAGUÁN	CÓRDOBA- MONTELÍBANO ACHOCÓ – QUIBDO GUAVIARE- EL RETORNO CAQUETÁ- SAN VICENTE DEL CAGUÁN
10	Gestión de recursos para problemas locales-territoriales	BOLÍVAR- CÓRDOBA NARIÑO- RICAURTE META- MESETAS PUTUMAYO- PUERTO GUZMÁN CÓRDOBA- TIERRALTA ANTIOQUIA- DABEIBA CAUCA- MORALES CAUCA- PATÍA CAQUETÁ- EL DONCELLO BOLÍVAR- MAGANGUÉ BOLÍVAR- CLEMENCIA	NA
11	Tipos de informática y TICs en el contexto campesino	SUCRE- CHALÁN TOLIMA- RIOBLANCO META- PUERTO RICO CAUCA- CALDONO BOLÍVAR- SAN JACINTO SUCRE- COLOSÓ SUCRE- LOS PALMITOS SUCRE- MORROA SUCRE- OVEJAS SUCRE- PALMITO	NA

N°	NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN	COBERTURA GEOGRÀFICA INICIAL	COBERTURA GEOGRÁFICA MODIFICADA
12	Contaduría y administración para la asociatividad campesina	CESAR- BECERRIL ANTIOQUIA- CHIGORODÓ META- PUERTO CONCORDIA CAUCA- PIENDAMÓ - TUNÍA SUCRE- SAN JOSÉ DE TOLUVIEJO CESAR- LA JAGUA DE IBIRICO CESAR- LA PAZ CESAR- PUEBLO BELLO CESAR- SAN DIEGO CESAR- VALLEDUPAR	CESAR- BECERRIL CAUCA- BOLIVAR METAS- PUERTO GAITAN CAUCA- PATIA - TUNÍA SUCRE- SAN JOSÉ DE TOLUVIEJO CESAR- LA JAGUA DE IBIRICO CESAR- LA PAZ CESAR- PUEBLO BELLO CESAR- SAN DIEGO CESAR- VALLEDUPAR
13	Educación popular de sostenibilidad campesina	LA GUAJIRA- FONSECA NARIÑO- LEIVA ARAUCA- TAME VALLE DEL CAUCA- PRADERA BOLÍVAR- CARTAGENA BOLÍVAR- SAN FERNANDO BOLÍVAR- RÍO VIEJO BOLÍVAR- MORALES BOLÍVAR- CALAMAR BOLÍVAR- ARROYOHONDO	GUAJIRA - RIOHACHA NARIÑO- LEIVA CAUCA – BOLIVAR CAUCA – CALDONO BOLÍVAR- CARTAGENA BOLÍVAR- SAN FERNANDO BOLÍVAR- MARÍA LA BAJA CARMEN DE BOLÍVAR BOLIVAR – SAN JACINTO BOLÍVAR- ARROYOHONDO
14	Sistema de alertas campesinas	MAGDALENA- ARACATACA NARIÑO- TUMACO NORTE DE SANTANDER- SARDINATA CAQUETÁ- ALBANIA BOLÍVAR- MARGARITA BOLÍVAR- SANTA CRUZ DE MOMPOX BOLÍVAR- SAN CRISTÓBAL BOLÍVAR- CICUCO BOLÍVAR- SANTA CATALINA BOLÍVAR- SOPLAVIENTO	MAGDALENA- ARACATACA NARIÑO- EL ROSARIO PUTUMAYO-VILLAGARZON CAUCA – CAJIBIO BOLÍVAR – MARIA LA BAJA BOLÍVAR- SANTA CRUZ DE MOMPOX BOLÍVAR- SAN CRISTÓBAL BOLIVAR-MAGANGUE BOLIVAR- CLEMENCIA BOLÍVAR- SOPLAVIENTO
15	Coordinación, seguimiento y veeduria	SUCRE – CHALAN CHOCÓ- RIOSUCIO NORTE DE SANTANDER- EL CARMEN PUTUMAYO- VILLAGARZÓN TOLIMA- SUÁREZ TOLIMA- FALAN TOLIMA- LÉRIDA TOLIMA- ROVIRA TOLIMA- CARMEN DE APICALÁ TOLIMA- ARMERO	SUCRE- SAN ONOFRE CHOCO- QUIBDO CÓRDOBA- PUERTO LIBERTADOR PUTUMAYO – ORITO CAUCA – TAMBO CAUCA – TIMBIO CAUCA- SILVIA CAUCA – CALDONO PUTUMAYO- VILLA GARZON CORDOBA - VALENCIA


Como se indicó anteriormente el total de beneficiarios certificados bajo el convenio fue de 1374, a continuación, se presentan algunas graficas que detallan el nivel ocupacional, el impacto sectorial de las acciones de formación implementadas y la desagregación etaria y por genero de los participantes que culminaron satisfactoriamente la formación.



Género

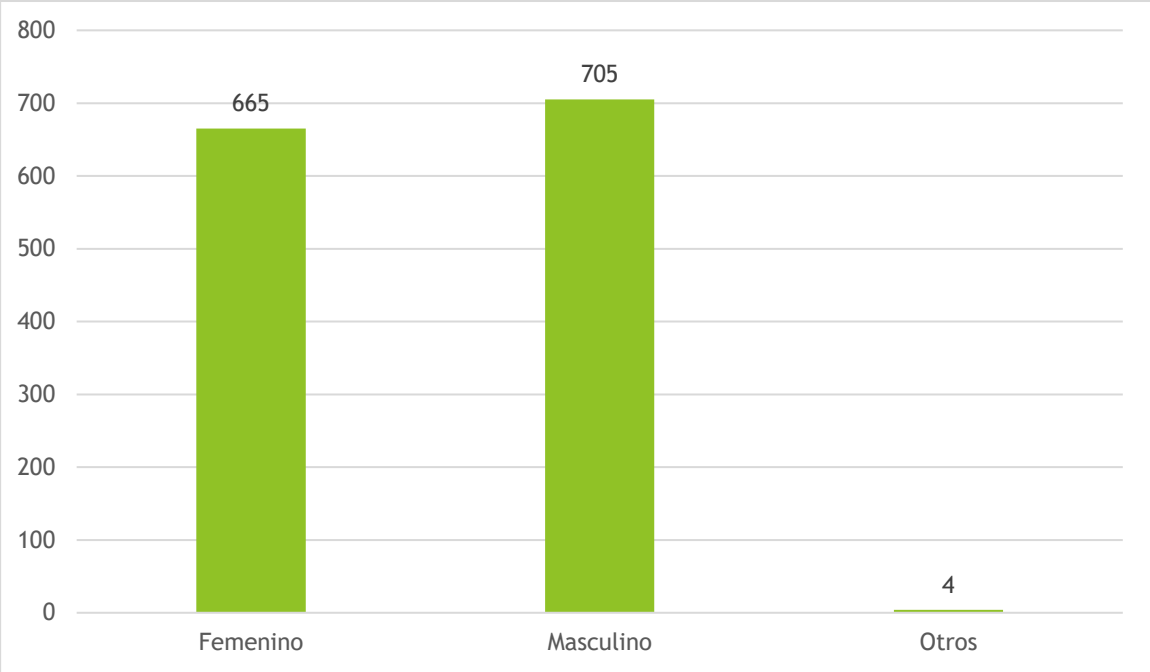

Desagregación etaria

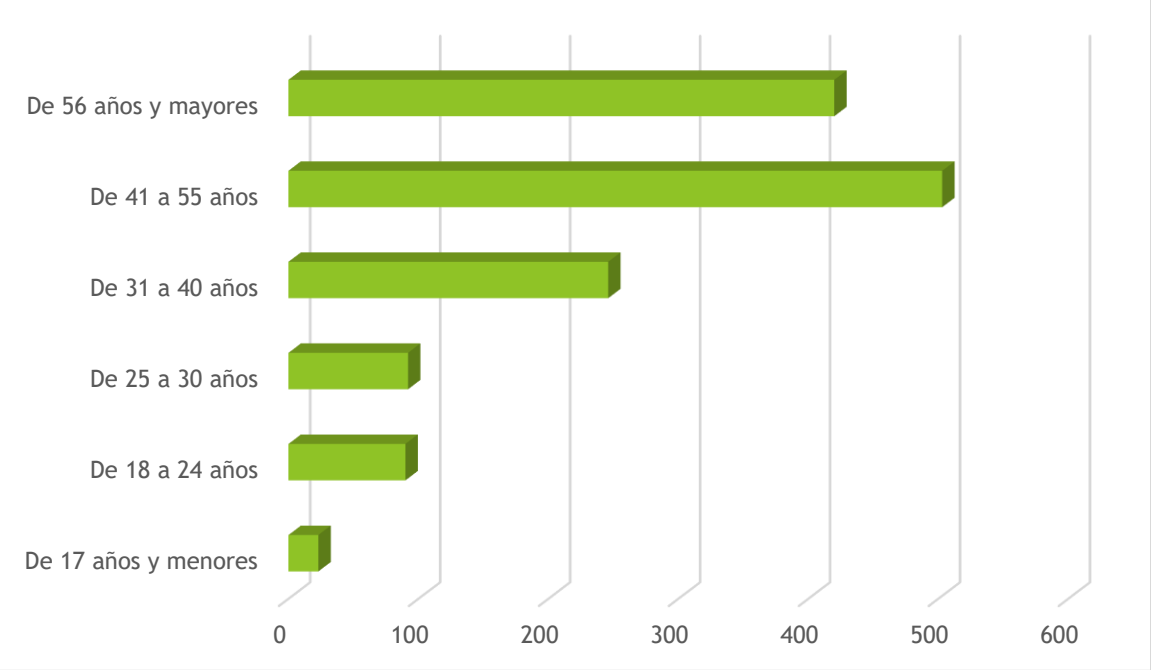

2.4. Indicadores del proyecto

Tasa de incremento del conocimiento

AF	Promedio tasa incremento del conocimiento
AF1	63%
AF2	83%
AF3	90%
AF4	90%
AF5	70%
AF6	90%
AF7	73%
AF8	88%
AF9	83%
AF10	100%
AF11	100%
AF12	90%
AF13	72%
AF14	78%
AF15	91%
PROMEDIO	**84%**

Impacto

- **Número total de campesinas y campesinos beneficiados**

Este indicador mide la cantidad de campesinas y campesinos que participan en los programas o que reciben beneficios de la formación o apoyo brindado por el proyecto

Fórmula

$$\frac{\text{Número de Campesinas y Campesinos beneficiados por el Proyecto}}{\text{Número total de Campesinas y Campesinos afiliados a las organizaciones}} \text{ X100}$$

Resultado

$$\frac{1330}{138324} \text{ X100} = 1\%$$

- **Número de asociaciones campesinas, agropecuarias, cooperativas campesinas u otras organizaciones campesinas a beneficiar.**

Este indicador mide la cantidad de organizaciones campesinas (asociaciones agropecuarias, cooperativas, entre otras) que reciben formación, capacitación o participación en el programa.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de Organizaciones beneficiadas con el Proyecto}}{\text{Número total de Organizaciones afiliadas al conveniente}} \text{ X100}$$

Resultado

$$\frac{14}{28} \text{ X100} = 50\%$$

- **Incremento de la formación**

Este indicador mide el aumento en el nivel de conocimientos y habilidades adquiridos por los participantes tras recibir la formación.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas que por primera vez reciben formación especializada}}{\text{Número total de campesinos que conforman la asociación u organización}} \text{ X100}$$

Resultado

$$\frac{1330}{138324} \text{ X100} = 1\%$$

- **Indicador incremento de gestión – Técnico**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento técnico}}{\text{Número de beneficiarios totales del Proyecto}} \text{ X100}$$

Resultado

$$\frac{600}{1330} \text{ X100} = 45\%$$

- **Indicador incremento de gestión – Administrativo**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento administrativo}}{\text{Número de beneficiarios totales del Proyecto}} \text{ X100}$$

Resultado

$$\frac{600}{1330} \text{ X100} = 45\%$$

- **Indicador incremento de gestión – Financiero**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento financiero}}{\text{Número de beneficiarios totales del Proyecto}} \text{ X100}$$

Resultado

$$\frac{600}{1330} \text{ X100} = 45\%$$

- **Indicador incremento de gestión - TICS**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento TICS}}{\text{Número de beneficiarios totales del Proyecto}} \text{ X100}$$

Resultado

$$\frac{600}{1330} \text{ X100} = 45\%$$

- **Indicador incremento de gestión – Desarrollo Tecnológico**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento de desarrollo tecnológico / Número de beneficiarios totales del Proyecto X100

Resultado

$\frac{600}{1330}$ X100 = 45%

- **Indicador incremento de gestión – Habilidades Transversales**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento de habilidades transversales / Número de beneficiarios totales del Proyecto X100

Resultado

$\frac{900}{1330}$ X100 = 68%

3. Aspectos financieros

3.1. Ejecución presupuestal por fuente de financiación

Aportes SENA

ANUC COLOMBIA presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de cofinanciación de acuerdo con el siguiente detalle:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R 1.2.1.2	Honorario Nacional Profesional titulado	$154.664.718,00	$154.707.122,00	$ 90.131.394,00	$ 64.575.728,00	$ 42.404,00	$ 154.664.718,00	100,00%
R 1.1.2	Capacitadores con experiencia en Labores y Saberes de	$ 28.002.294,00	$ 28.534.407,00	$ 24.987.199,00	$ 3.547.208,00	$ 532.113,00	$ 28.002.294,00	100,00%

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
	más de 5 años a hasta 10 años							
R 1.1.4	Capacitador Promotor de comunidad (PC)	$ 40.833.526,00	$ 41.890.479,00	$ 25.434.901,00	$ 16.455.578,00	$ 1.056.953,00	$ 40.833.526,00	100,00%
R 2.1	Alojamiento, manutención y Transporte local Nacional	$ 93.668.200,00	$ 93.450.561,00	$ 28.572.393,00	$ 64.878.168,00	$ 0,00	$ 93.450.561,00	99,77%
R 4	Tiquetes Aéreos, terrestres intermunicipales y/o fluvial (Ida y vuelta) Nacional	$ 86.450.000,00	$ 86.577.363,00	$ 17.639.809,00	$ 68.937.554,00	$ 127.363,00	$ 86.450.000,00	100,00%
R 5.1.2.1.1	Impresión de Cartillas De 10 a 150 unidades	$ 47.778.920,00	$ 46.574.880,00	$ 9.095.000,00	$ 37.479.880,00	$ 0,00	$ 46.574.880,00	97,48%
R 5.1.3	Diagramación Cartillas y Folletos	$ 43.160.400,00	$ 43.160.400,00	$ 16.833.951,00	$ 26.326.449,00	$ 0,00	$ 43.160.400,00	100,00%
R 5.2.1	Cuadernos tamaño Media carta de 100 hojas, anillado, con carátula con Diseño SENA y pasta dura.	$ 21.434.280,00	$ 21.588.520,00	$ 14.884.000,00	$ 6.704.520,00	$ 154.240,00	$ 21.434.280,00	100,00%
R 5.2.2	Esferos retráctil de tinta negra por beneficiario	$ 3.656.170,00	$ 3.498.880,00	$ 200.000,00	$ 3.298.880,00	$ 0,00	$ 3.498.880,00	95,70%
R 5.2.3	Papelógrafos por grupo de formación	$ 299.112,00	$ 299.112,00	$ 0,00	$ 299.112,00	$ 0,00	$ 299.112,00	100,00%
R 5.2.4	Marcadores por grupo de formación	$ 1.128.244,00	$ 1.128.244,00	$ 0,00	$ 1.128.244,00	$ 0,00	$ 1.128.244,00	100,00%
R 6.1.1	Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.(Incluido video beam y conectividad).	$ 91.915.604,00	$ 91.673.623,00	$ 24.510.892,00	$ 67.162.731,00	$ 0,00	$ 91.673.623,00	99,74%
R 7	Gastos de operación del proyecto.	$164.388.046,00	$164.556.834,00	$ 131.928.686,00	$ 32.628.148,00	$ 168.788,00	$ 164.388.046,00	100,00%
R 8.1	Elaboración de Video	$ 1.614.999,00	$ 1.076.666,00	$ 0,00	$ 1.076.666,00	$ 0,00	$ 1.076.666,00	66,67%
R 8.2	Elaboración podcast	$ 4.122.000,00	$ 4.122.000,00	$ 0,00	$ 4.122.000,00	$ 0,00	$ 4.122.000,00	100,00%
R 8.3	Diseño e impresión de infografía	$ 1.671.426,00	$ 1.392.855,00	$ 0,00	$ 1.392.855,00	$ 0,00	$ 1.392.855,00	83,33%
R 10	Pólizas y garantías	$ 863.036,00	$ 859.809,00	$ 859.809,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 859.809,00	99,63%
R 11.3	Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 8 horas	$ 39.950.000,00	$ 39.810.000	$ 37.820.000,00	$ 1.990.000,00	$ 0,00	$ 39.810.000,00	99,65%
R 11.4	Gastos de Alojamiento, manutención y transporte para Evento de formación Campamento (Cuando la formación sea de 8 horas	$ 65.748.000,00	$ 65.136.105,00	$ 25.453.861,00	$ 39.682.244,00	$ 0,00	$ 65.136.105,00	99,07%

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
	diarias y en 2 diás seguidos)							
R12	Transferencia de conocimiento SENA	$ 8.219.402,00	$ 8.219.402,00	8.083.402,00	$136.000,00	$ 0,00	$ 8.219.402,00	100,00%
TOTALES		**$899.568.377,00**	**$898.257.262,00**	**$ 456.435.297,00**	**$ 441.821.965,00**	**$ 2.081.861,00**	**$ 896.175.401,00**	**99,62%**

Aportes contrapartida

Según el convenio suscrito, el conviniente debe aportar recursos por valor de $99.952.041, en especie.

Recursos de contrapartida en efectivo

ASOCIACIÓN NACIONAL DE USUARIOS CAMPESINOS DE COLOMBIA "ANUC" no tiene contemplado un valor por esta fuente de recursos.

Recursos de contrapartida en especie

El conviniente presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de contrapartida en especie de acuerdo con el siguiente detalle:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R 1.2.1.2	Honorario Nacional Profesional titulado	$ 66.000.000,00	$ 66.000.000,00	$ 0,00	$ 66.000.000,00	100,00%
R 6.1.1	Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo. (Incluido video beam y conectividad).	$ 29.842.340,00	$ 29.842.340,00	$ 0,00	$ 29.842.340,00	100,00%
R 10	Pólizas	$ 4.109.701,00	$ 1.698.884,00	$ 0,00	$ 1.698.884,00	41,34%
TOTALES		**$ 99.952.041,00**	**$ 97.541.224,00**	**$ 0,00**	**$ 97.541.224,00**	**97,59%**

Resumen de la ejecución financiera

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No reconocido	Valor reconocido	% Ejecución
Cofinanciación	$ 899.568.377,00	$898.257.262,00	$2.081.861,00	$896.175.401,00	99,62%
Contrapartida en dinero	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	0,00%
Contrapartida en especie	$ 99.952.041,00	$97.541.224,00	$0,00	$97.541.224,00	97,59%
Contrapartida total	$ 99.952.041,00	$97.541.224,00	$0,00	$97.541.224,00	97,59%
TOTAL	**$ 999.520.418,00**	**$ 995.798.486,00**	**$ 2.081.861,00**	**$ 993.716.625,00**	**99,42%**

3.2. Reconocimiento final

Los siguientes son los resultados de ejecución del proyecto:

Fuente de Financiación	Valor Aprobado	% cumplimiento técnico	valor a reconocer cumplimiento técnico	Ejecución financiera	% Ejecución financiera	% reconocido Ejecución para liquidar	Valor reconocido por la Interventoría
Cofinanciación	$899.568.377,00	100,00%	$899.568.377,00	$896.175.401,00	99,62%	97,59%	$877.871.023,81
Contrapartida	$99.952.041,00		$99.952.041,00	$97.541.224,00	97,59%		$97.541.224,00
Total	$999.520.418,00		$999.520.418,00				$975.412.247,81

4. Aspectos transversales

4.1. Aspectos jurídicos

Modificaciones

Durante la ejecución el conviniente solicitó las siguientes modificaciones:

Modificación	Concepto de Interventoría	Viabilidad	Radicado SENA	Fecha
Prorroga	CP_051224_07	Viable	72024315411	5/12/2024
Cronograma, Capacitador	CM_311224_64	Viable	72024336646	31/12/2024
Cronograma, Capacitador	CM_080125_72	Viable	72025002880	8/01/2025
Cronograma, Capacitador	CM_220125_95	Viable	72025024393	22/01/2025
Cronograma	CM_290125_105	Viable	72025033537	29/01/2025
Suspensión	CS_030225_02	Viable	72025041374	3/02/2025
Prorroga	CP_160325_77	Viable	72025112227	16/03/2025
Cambio de Municipios	CM_210325_146	Viable No viable para la AF13	72025119270	21/03/2025
Cambio de Municipio	CM_260325_148	No Viable	72025123818	26/03/2025
Cronograma	CM_020525_186	Viable	72025170157	2/05/2025
Cronograma y capacitador	CM_120525_198	Viable	72025181704	12/05/2025
Cronograma	CM_130525_200	Viable	72025184003	13/05/2025
Cronograma, y capacitador Cambio de municipio	CM_160525_204	Viable No viable para la AF13	72025189431	16/05/2025
Cambio de Lugar de ejecución y municipio	CM_190525_207	Viable	72025192762	19/05/2025
Cronograma	CM_280525_217	Viable	72025206996	28/05/2025
Prorroga	CP_300525_116	Viable	72025210463	30/05/2025
Cronograma	CM_170725_235	Viable	72025270981	17/07/2025
Cronograma	CM_090725_234	Viable	72025257283- 72025257292	09/07/2025
Cronograma	CM_070725_233	Viable	72025252957	07/07/2025
Cronograma	CM_020725_232	Viable	72025247094	02/07/2025

Acciones de Interventoría

Durante la Ejecución la interventoría realizó las siguientes acciones:

TIPO DE ACCIÓN	MOTIVO	RADICADO INTERVENTORIA	RADICADO SENA	FECHA RADICADO	CIERRE
Solicitud Información	Información Académica	ASI_210125_138	72025020904	21/01/2025	RC_270125_117
Solicitud Información	Informe mensual enero	ASI_170225_200	72025065757	17/02/2025	IM_200225_225
Solicitud Información	Información adicional requerida para modificación lugares de ejecución)	ASI_120325_244	72025106511	12/03/2025	MOD_180325_373
Solicitud Información	Informe mensual marzo	ASI_150425_272	72025152591	15/04/2025	IM_150425_310
Solicitud información	Subsanación F6	ASI_020525_286	72025170613	2/05/2025	RC_060525_313
Solicitud información	Subsanación F6	ASI_100525_296	72025181383	10/05/2025	RC_120525_331 RC_130525_339
Solicitud información	informe mensual abril	ASI_140525_311	72025185498	14/05/2025	IM_170525_343
Solicitud información	Subsanación F6	ASI_150525_313	72025187539	15/05/2025	RC_190525_353 RC_200525_363
Solicitud información	Subsanación F6 para segundo desembolso.	ASI_240525_348	72025202270	24/05/2025	RC_260525_397
Alerta posible incumplimiento	Alerta posible incumplimiento cronograma académico	ASI_260525_351	72025203600	26/05/2025	CIN_300525_4132
Solicitud información	Informe mensual junio	ASI_050725_449	72025252366	5/07/2025	IM_070725_363
Solicitud información	Información tercer desembolso	ASI_140725_471	72025264765	14/07/2025	RC_170725_583
Solicitud información	Información tercer desembolso	ASI_180725_484	72025273026	18/07/2025	RC_210725_603

4.2. Aspectos administrativos

Garantías

Pólizas de seguro aprobadas:

Póliza de Cumplimiento n. CCS-100035103 anexo 1 del 01 de noviembre de 2024

Responsabilidad Civil extracontractual n. CCS-100007367 anexo 1 del 01 de noviembre de 2024.

Fecha aprobación garantías: 06 de noviembre de 2024

Pólizas de seguro aprobadas prorroga otrosí 1:

Póliza de Cumplimiento n. CCS-100035103 anexo 2 del 27 de diciembre de 2024

Responsabilidad Civil extracontractual n. CCS-100007367 anexo 2 del 27 de diciembre de 2024.

Fecha aprobación garantías prorroga otrosí 1: 21 de febrero de 2025

Pólizas de seguro aprobadas prorroga otrosí 2:

Póliza de Cumplimiento n. CCS-100035103 anexo 5 del 24 de abril de 2025

Responsabilidad Civil extracontractual n. CCS-100007367 anexo 4 de 24 de abril de 2025.

Fecha aprobación garantías prorroga otrosí 2: 06 de mayo de 2025

Pólizas de seguro aprobadas prorroga otrosí 3:

Póliza de Cumplimiento n.° CCS-100035103 anexo 6 del 4 de junio de 2025.

Responsabilidad Civil extracontractual n.° CCS-100007367 anexo 5 del 4 de junio de 2025.

Fecha aprobación garantías prorroga otrosí 3: 10 de junio de 2025

Fecha de inicio: 13 de noviembre de 2024

Contratos

El Conviniente suscribió los siguientes contratos con el fin de cumplir con las obligaciones establecidas en el convenio y ejecutar el proyecto aprobado:

Contrato No.	Proveedor	NIT o	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
	Tatiana Margarita Ballestero s Jiménez		Realizar todo lo relacionado a la dirección del proyecto según lo estipulado en los términos de referencia de la convocatoria FEEC N.° C01.PCCNTR.6914512 del		Según las condiciones de los desembolsos del convenio		

Contrato No.	Proveedor	NIT o	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
OPS0 056	Heilin Michell Castro Medina	1001943782	Realizar todo lo relacionado a la dirección del proyecto según lo estipulado en los términos de referencia de la convocatoria FEEC N.° C01.PCCNTR.6914512 del	$12.000.000	Según las condiciones de los desembolsos del convenio	2 meses	13/11/2024
OPS0 057	Yennis Lopez Fuentes	1049827430	Realizar todo lo relacionado a la dirección del proyecto según lo estipulado en los términos de referencia de la convocatoria FEEC N.° C01.PCCNTR.6914512 del	$12.000.000	Según las condiciones de los desembolsos del convenio	2 meses	13/11/2024
0058	DANIEL FELIPE CARDENAS BARRERO	1020712864	Realizar todo lo relacionado a la coordinación de publicidad del proyecto según lo estipulado en los términos de referencia de la convocatoria FEEC N°CO1.PCCNTR.6914612	$12.000.000	Según las condiciones de los desembolsos del convenio	2 meses	13/11/2024
0059	ALEJANDRO ORJUELA ALVAREZ		Realizar todo lo relacionado con la coordinación del diseño técnico de la imagen que establece el SENA e interventoría, según lo estipulado en los términos de referencia de la convocatoria FEEC N°CO1.PCCNTR.6914612	$12.000.000	Según las condiciones de los desembolsos del convenio	2 meses	13/11/2024
0060	ESTEBAN GUTIEREZ SÁNCHEZ	1.127.572.877	Prestar sus servicios profesionales como coordinador del general del proyecto en el ámbito de la formación especializada para la economía campesina en la ejecución del Programa Convenio de Formación Especializada para la Economía Campesina (FEEC), conforme a las	$32.000.000	Según las condiciones de los desembolsos del convenio	2 meses	13/11/2024
0061	GUSTAVO ADOLFO CASTILLO SOLARTE	1.061.703.078	Prestar sus servicios profesionales como Contador Público para el apoyo contable, financiero y tributario en la ejecución del Convenio CO1.PCCNTR.6914612 – Programa de Formación Especializada para la Economía Campesina (FEEC), conforme a las obligaciones legales y contractuales vigentes.	$12.000.000	Según las condiciones de los desembolsos del convenio	2 meses	13/11/2024

Contrato No.	Proveedor	NIT o	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
0063	SERGIO AUGUST O RUIZ	32	Realizar todo lo relacionado a la coordinación del sistema de comunicaciones electrónicas según lo estipulado en los términos de referencia de la convocatoria FEEC N°CO1.PCCNTR.6914612 del año 2024, el anexo 12 y lo que indique la interventoría.	$12.000.000	Según las condiciones de los desembolsos del convenio	2 meses	13/11/2024
0058	LUZ ELENA OCHOA VILLADIE GO	1.129.565.664	Realizar todo lo relacionado con el apoyo a la dirección del proyecto según lo estipulado en los términos de referencia de la convocatoria FEEC N°CO1.PCCNTR.6914612 del año 2024, el anexo 12 y lo que indique la interventoría.	$3.000.000	Según las condiciones de los desembolsos del convenio	1 mes	01/05/2025
Otro sí al contra to 0057	HEILIN MICHELL CASTRO MEDINA	1.001.943.782	-	$12.000.000	Según las condiciones de los desembolsos del convenio	4 meses	01/01/2025
Otro sí al contra to 0055	TATIANA MARGARI TA BALLEST EROS JIMÉNEZ	33.025.5551	-	$36.000.000	Según las condiciones de los desembolsos del convenio	3 meses	01/01/2025
Otro sí al contra to 0057	YENNIS LOPEZ FUENTES	30	-	$7.000.000	Según las condiciones de los desembolsos del convenio	4 meses	01/01/2025
2025-0064	KAREN VANESSA RODRÍG EZ GALINDE Z	1061730294	Prestar sus servicios profesionales como Contador Público para el apoyo contable, financiero y tributario en la ejecución del Convenio CO1.PCCNTR.6914612 – Programa de Formación Especializada para la Economía Campesina (FEEC), conforme a las obligaciones legales y contractuales vigentes	$6.000.000	Según las condiciones de los desembolsos del convenio	2 meses	01/05/2025

4.3. Aspectos relevantes

La ejecución del convenio entre el SENA y ANUC COLOMBIA, en el marco del Programa de Formación Especializada para la Economía Campesina – FEEC, propició la adquisición y actualización de conocimientos, habilidades, técnicas, prácticas y la mejora de las competencias de las campesinas y campesinos de la región, la generación de capacidades, incentivo de la asociatividad, la participación y la integración comercial entre los actores de la economía campesina, así como la transformación productiva, protección del ambiente, los recursos hídricos y la agroecología.

4.3.1. Fortalezas

Las acciones de formación desarrolladas permitieron a los beneficiarios fortalecer sus capacidades y adquirir herramientas clave para mejorar la gestión de sus actividades y lograron tener un impacto significativo en el fortalecimiento de la capacidad del movimiento campesino. Los conocimientos adquiridos, en conjunto con el desarrollo de habilidades prácticas, han permitido que los miembros de la ANUC se conviertan en actores más efectivos dentro de sus comunidades, enfrentando los retos contemporáneos de manera más informada y proactiva.

Los resultados alcanzados, además de cumplir con los indicadores establecidos, revelan un impacto cualitativo profundo. La formación brindada no solo se centró en transmitir conocimientos, sino en generar conciencia política, identidad campesina y empoderamiento. El enfoque metodológico participativo, la pertinencia de los contenidos y la conexión con las realidades territoriales contribuyeron a que los beneficiarios valoraran altamente la experiencia formativa, como se evidenció en las encuestas de satisfacción aplicadas al finalizar cada acción.

Por ello, este proceso formativo se constituye en un avance significativo en la construcción de autonomía y soberanía organizativa del campesinado, consolidando a la ANUC como un actor estratégico en la transformación del campo colombiano. La articulación entre educación, territorio y acción política refuerza el compromiso con la justicia social, la equidad rural y la defensa de los derechos campesinos.

4.3.2. Puntos a mejorar

Se identifica la necesidad de fortalecer el seguimiento posterior a los procesos formativos mediante programas de actualización y acompañamiento técnico continuos, dado que la ausencia de estos mecanismos puede limitar la consolidación de los conocimientos adquiridos y afectar la sostenibilidad de los resultados obtenidos. Así mismo, se recomienda continuar con esta estrategia de formación, profundizar en la planeación participativa y en la articulación de redes campesinas, y seguir consolidando a la ANUC como una plataforma nacional para la defensa de los derechos del campesinado colombiano.

4.3.3. Caso de éxito

La acción de formación AF9 - Sistema de comercialización, agenda y rutas, y su impacto en la región, se consolidó como un caso de éxito al brindar a sus beneficiarios aprendizajes tan valiosos que van desde qué es un mercado campesino, cómo deben organizarse como asociación campesina, cuáles son las responsabilidades del comité, qué es la comercialización y la productividad del territorio, cómo y para qué llevar registro de toda información y tener conocimiento del valor de los productos; lo cual va a ayudar a todos la población a la gestión y a lograr que todos sus proyectos sean efectivos, oportunos y eficaces y que finalmente se refleje en la economía campesina del territorio y la nación.

Así mismo, éste se convierte en el primer proyecto presentado y liderado en la región, lo que lo hace que el conocimiento se refleje en los municipios y allegados de todos los participantes.
