UNIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

Contrato de Interventoría N° CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia. Obligación N° 25

Programa de Formación Especializada para la Economía Campesina - Convocatoria DSNFT – 0001 – FEEC – 2024

Informe final

ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS BANANEROS DE COLOMBIA – BANAC

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

CO1.PCCNTR.7003666

Contenido

1. Datos generales del convenio 2
2. Aspectos técnicos 2
2.1. Proyecto aprobado 2
2.2. Cumplimiento Técnico 3
2.3. Impacto regional 5
2.4. Indicadores del proyecto 7
3. Aspectos financieros 11
3.1. Ejecución presupuestal por fuente de financiación 11
3.2. Reconocimiento final 12
4. Aspectos transversales 12
4.1. Aspectos jurídicos 12
4.2. Aspectos administrativos 14
4.3. Aspectos relevantes 15
4.3.1. Fortalezas 16
4.3.2. Puntos a mejorar 16
4.3.3. Caso de éxito 16

1. Datos generales del convenio

- Fecha de suscripción del convenio: 15 de noviembre de 2024
- Fecha de inicio del convenio: 20 de noviembre de 2024
- Fecha de inicio de actividades académicas: 13 de diciembre de 2024
- Fecha de finalización de actividades académicas: 16 de marzo de 2025

2. Aspectos técnicos

2.1. Proyecto aprobado

El proyecto presentado por BANAC se resume en las siguientes tablas:

N° AF	Nombre de la acción de formación	Horas de la acción de formación					Total horas	Evento de aprendizaje
		Presencial	PAT	Virtuales	Hibrida	N. grupos		
1	Exploración de la Contabilidad y Finanzas: Comprendiendo Procesos Contables y Tributarios	16	0	0	0	9	144	Campamento de Formación
2	Estrategias de dirección y administración para mejorar la estructura organizativa en el proceso de la asociación	16	0	0	0	8	128	Campamento de Formación
3	Fortalecimiento integral de las capacidades en gestión administrativas y financiera de la asociación campesina	16	0	0	0	6	96	Campamento de Formación
4	Fortalecimiento de los derechos de los campesinos como sujetos políticos para la construcción identidad campesina	16	0	0	0	6	96	Campamento de Formación
5	Perspectivas de empoderamiento campesino en contexto de la juventud, mujer y género	16	0	0	0	5	80	Campamento de Formación
	TOTALES	80	0	0	0	**34**	**544**	

N° AF	Nombre de la acción de formación	BENEFICIARIOS		
		Empresa	SENA	Total
1	Exploración de la Contabilidad y Finanzas: Comprendiendo Procesos Contables y Tributarios	90	0	90
2	Estrategias de dirección y administración para mejorar la estructura organizativa en el proceso de la asociación	80	0	80
3	Fortalecimiento integral de las capacidades en gestión administrativas y financiera de la asociación campesina	60	0	60
4	Fortalecimiento de los derechos de los campesinos como sujetos políticos para la construcción identidad campesina	60	0	60
5	Perspectivas de empoderamiento campesino en contexto de la juventud, mujer y género	50	0	50
	TOTALES	**340**	**0**	**340**

N° AF	Nombre de la acción de formación	Costo AF
1	Exploración de la Contabilidad y Finanzas: Comprendiendo Procesos Contables y Tributarios	$ 114.468.853,00
2	Estrategias de dirección y administración para mejorar la estructura organizativa en el proceso de la asociación	$ 102.129.613,00
3	Fortalecimiento integral de las capacidades en gestión administrativas y financiera de la asociación campesina	$ 77.451.133,00
4	Fortalecimiento de los derechos de los campesinos como sujetos políticos para la construcción identidad campesina	$ 77.451.133,00
5	Perspectivas de empoderamiento campesino en contexto de la juventud, mujer y género	$ 65.111.893,00
	TOTALES	$ 436.612.625,00

2.2. Cumplimiento Técnico

La ejecución académica del proyecto se cumplió de la siguiente manera:

AF	COFINANCIACIÓN	CONTRAPARTIDA	TOTAL	PESO AF	BENEFICIARIOS INICIALES	Índice de deserción X%	BENEFICIARIOS RECONOCIDOS
1	$ 72.115.911,82	$ 42.352.941,18	$ 114.468.853,00	26,22%	90	0	90
2	$ 64.482.554,18	$ 37.647.058,82	$102.129.613,00	23,39%	80	0	80
3	$ 49.215.838,88	$ 28.235.294,12	$77.451.133,00	17,74%	60	0	60
4	$ 49.215.838,88	$ 28.235.294,12	$77.451.133,00	17,74%	60	0	60
5	$ 41.582.481,24	$ 23.529.411,76	$65.111.893,00	14,91%	50	0	50
Total	**$276.612.625,00**	**$160.000.000,00**	**$436.612.625,00**	**100,00%**	**340**	**0**	**340**

AF	VALOR RECONOCIDO COFINANCIACIÓN	% RECONOCIDO COFINANCIACIÓN	VALOR RECONOCIDO CONTRAPARTIDA	% RECONOCIDO CONTRAPARTIDA	VALOR RECONOCIDO TOTAL	% RECONOCIDO TOTAL
1	$ 72.115.911,82	26,07%	$ 42.352.941,18	26,5%	$ 114.468.853,00	26,22%
2	$ 64.482.554,18	23,31%	$ 37.647.058,82	23,5%	$ 102.129.613,00	23,39%
3	$ 49.215.838,88	17,79%	$ 28.235.294,12	17,6%	$ 77.451.133,00	17,74%
4	$ 49.215.838,88	17,79%	$ 28.235.294,12	17,6%	$ 77.451.133,00	17,74%
5	$ 41.582.481,24	15,03%	$ 23.529.411,76	14,7%	$ 65.111.893,00	14,91%
Total	**$ 276.612.625,00**	**100,00%**	**$ 160.000.000,00**	**100,00%**	**$436.612.625,00**	**100,00%**

Además, el director del proyecto informa que el evento se llevó a cabo el día 29 de abril de 2025 de manera presencial en el municipio de Matanza; el cual contó con una asistencia de 70 participantes; sin embargo, **a la fecha de la visita no se evidencia de manera digital y/o fotográfica registros que demuestren la realización del evento**.

En el aplicativo dispuesto por el SENA, el conviniente evidencia el registro de beneficiarios cumpliendo con el numeral 9 de la cláusula sexta del convenio, así:

N°	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN EL SEP	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS ASISTENCIA 85%
1	Exploración de la Contabilidad y Finanzas: Comprendiendo Procesos Contables y Tributarios	1	CODAZZI	10	10	10
		2	DIBULLA	10	11	11

N°	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN EL SEP	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS ASISTENCIA 85%
		3	CIENAGA	10	14	14
		4	CIENAGA	10	12	12
		5	DIBULLA	10	10	10
		6	CHARTA	10	10	10
		7	CHARTA	10	10	10
		8	MATANZA	10	10	10
		9	MATANZA	10	10	10
			TOTAL	**90**	**97**	**97**
2	Estrategias de dirección y administración para mejorar la estructura organizativa en el proceso de la asociación	1	DIBULLA	10	10	10
		2	CODAZZI	10	10	10
		3	CIENAGA	10	12	12
		4	DIBULLA	10	10	10
		5	CHARTA	10	10	10
		6	CHARTA	10	10	10
		7	CIENAGA	10	12	12
		8	MATANZA	10	10	10
			TOTAL	**80**	**84**	**84**
3	Fortalecimiento integral de las capacidades en gestión administrativas y financiera de la asociación campesina	1	CIENAGA	10	10	10
		2	CIENAGA	10	10	10
		3	CODAZZI	10	12	12
		4	DIBULLA	10	10	10
		5	SURATA	10	10	10
		6	MATANZA	10	10	10
			TOTAL	**60**	**62**	**62**
4	Fortalecimiento de los derechos de los campesinos como sujetos políticos para la construcción identidad campesina	1	CIENAGA	10	11	11
		2	CIENAGA	10	10	10
		3	CODAZZI	10	10	10
		4	DIBULLA	10	11	11
		5	SURATA	10	10	10
		6	MATANZA	10	10	10
			TOTAL	**60**	**62**	**62**
5		1	CIENAGA	10	14	14

N°	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN EL SEP	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS ASISTENCIA 85%
	Perspectivas de empoderamiento campesino en contexto de la juventud, mujer y género	2	CODAZZI	10	12	12
		3	DIBULLA	10	11	11
		4	TURBO	10	10	10
		5	FLORIDA	10	10	10
			TOTAL	**50**	**57**	**57**
	TOTAL		**-**	**340**	**362**	**362**

- Beneficiarios esperados: 340
- Beneficiarios certificados: 362

2.3. Impacto regional

El programa de formación especializada para la economía campesina busca la adquisición y actualización de conocimientos, habilidades, técnicas, prácticas y la mejora de las competencias de las campesinas y campesinos, la generación de capacidades, incentivo de la asociatividad, la participación y la integración comercial entre los actores de la economía campesina, así como la transformación productiva, protección del ambiente, los recursos hídricos y la agroecología, a través de la cofinanciación de los proyectos avalados, en la convocatoria DSNFT – 0001 – FEEC – 2024, entre otros aspectos, promovió y estimuló desde la formulación la implementación de acciones de formación en zonas rurales, especialmente para los beneficiarios que residen en (municipios PDET, ZOMAC o zonas aledañas a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, zonas rurales).


BANAC alineado con este enfoque ejecutó algunos eventos formativos para la población ubicada en estas localidades así:

N°	NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN	COBERTURA GEOGRÀFICA Departamento - Municipio
1	Exploración de la Contabilidad y Finanzas: Comprendiendo Procesos Contables y Tributarios	LA GUAJIRA- DIBULLA; MAGDALENA -CIÉNAGA -ANTIOQUIA-TURBO; CESAR- AGUSTÍN CODAZZI; VALLE DEL CAUCA-FLORIDA
2	Estrategias de dirección y administración para mejorar la estructura organizativa en el proceso de la asociación	LA GUAJIRA- DIBULLA; MAGDALENA -CIÉNAGA -ANTIOQUIA-TURBO; CESAR- AGUSTÍN CODAZZI; VALLE DEL CAUCA-FLORIDA
3	Fortalecimiento integral de las capacidades en gestión administrativas y financiera de la asociación campesina	LA GUAJIRA- DIBULLA; MAGDALENA -CIÉNAGA -ANTIOQUIA-TURBO; CESAR- AGUSTÍN CODAZZI; VALLE DEL CAUCA-FLORIDA
4	Fortalecimiento de los derechos de los campesinos como sujetos políticos para la construcción identidad campesina	LA GUAJIRA- DIBULLA; MAGDALENA -CIÉNAGA -ANTIOQUIA-TURBO; CESAR- AGUSTÍN CODAZZI; VALLE DEL CAUCA-FLORIDA
5	Perspectivas de empoderamiento campesino en contexto de la juventud, mujer y género	LA GUAJIRA- DIBULLA; MAGDALENA -CIÉNAGA -ANTIOQUIA-TURBO; CESAR- AGUSTÍN CODAZZI; VALLE DEL CAUCA-FLORIDA

Como se indicó anteriormente el total de beneficiarios certificados bajo el convenio fue de 362, a continuación, se presentan algunas graficas que detallan el nivel ocupacional, el

impacto sectorial de las acciones de formación implementadas y la desagregación etaria y por genero de los participantes que culminaron satisfactoriamente la formación.


Nivel ocupacional

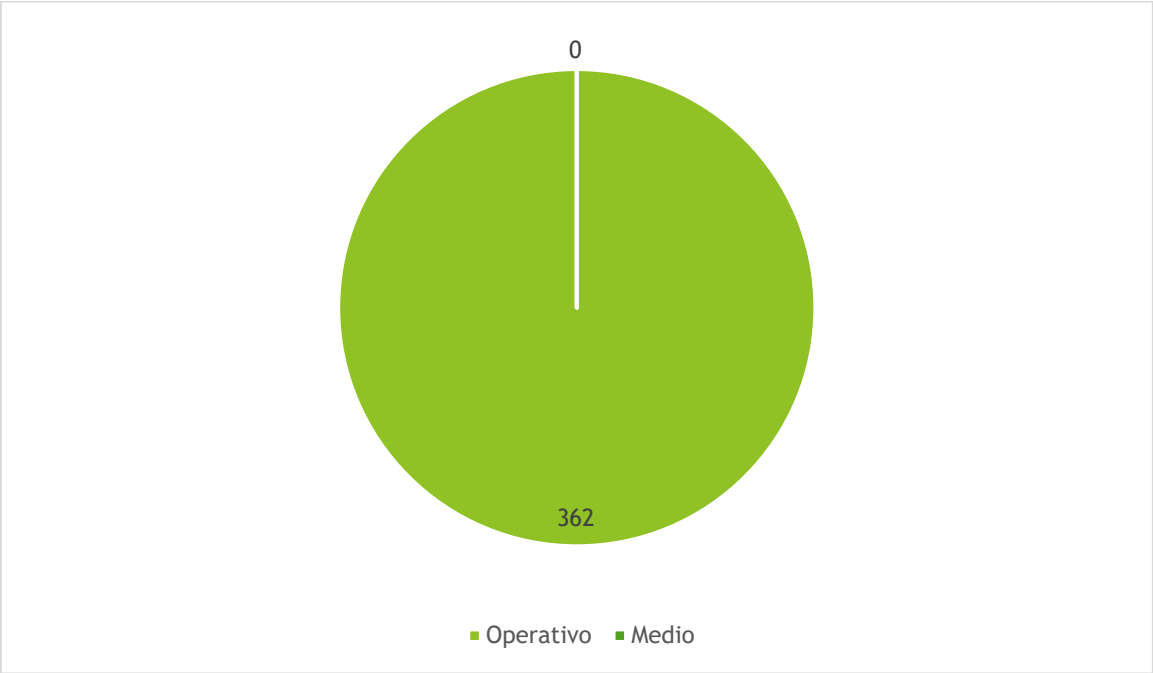

Género



Desagregación etaria

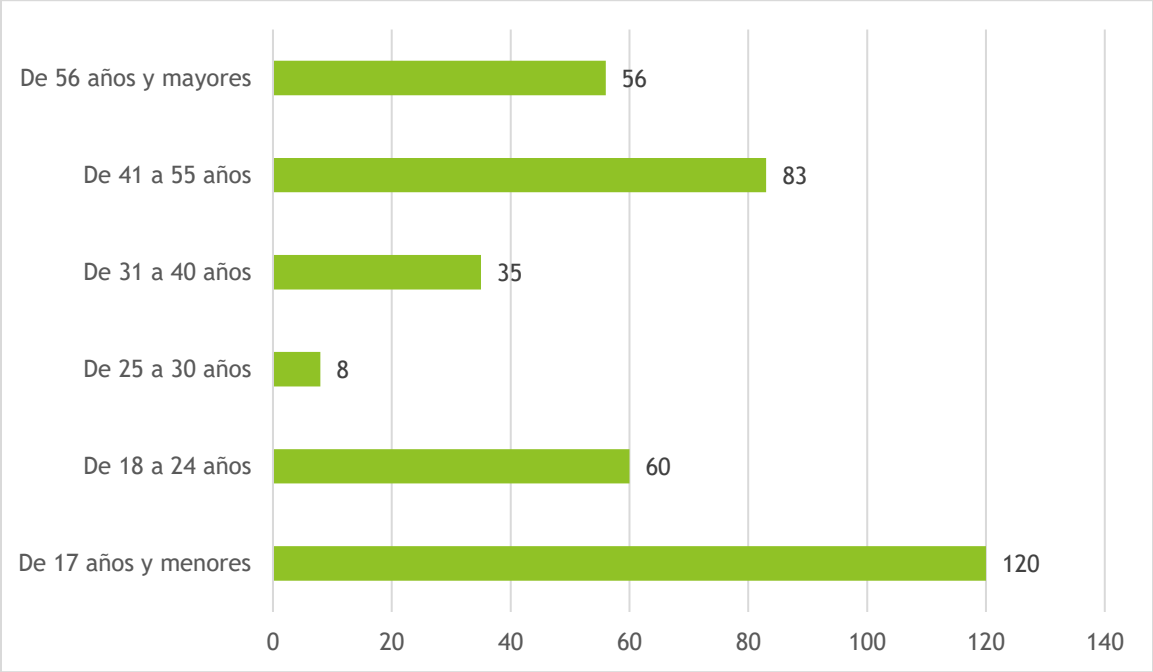

2.4. Indicadores del proyecto

Tasa de incremento del conocimiento

AF	Promedio tasa incremento del conocimiento
AF1	28%
AF2	29%
AF3	27%
AF4	27%
AF5	28%
PROMEDIO	**28%**

Impacto

- **Número total de campesinas y campesinos beneficiados**

Este indicador mide la cantidad de campesinas y campesinos que participan en los programas o que reciben beneficios de la formación o apoyo brindado por el proyecto

Fórmula

$$\frac{\text{Número de Campesinas y Campesinos beneficiados por el Proyecto}}{\text{Número total de Campesinas y Campesinos afiliados a las organizaciones}} \text{ X100}$$

Resultado

$$\frac{362}{169} \text{ X100} = 214\%$$

- **Número de asociaciones campesinas, agropecuarias, cooperativas campesinas u otras organizaciones campesinas a beneficiar.**

Este indicador mide la cantidad de organizaciones campesinas (asociaciones agropecuarias, cooperativas, entre otras) que reciben formación, capacitación o participación en el programa.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de Organizaciones beneficiadas con el Proyecto}}{\text{Número total de Organizaciones afiliadas al conveniente}} \text{ X100}$$

Resultado

$$\frac{0}{0} \text{ X100} = 0\%$$

- **Incremento de la formación**

Este indicador mide el aumento en el nivel de conocimientos y habilidades adquiridos por los participantes tras recibir la formación.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas que por primera vez reciben formación especializada}}{\text{Número total de campesinos que conforman la asociación u organización}} \text{ X100}$$

Resultado

$$\frac{302}{222} \text{ X100} = 136\%$$

- **Indicador incremento de gestión – Técnico**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento técnico}}{} \text{ X100}$$

Número de beneficiarios totales del Proyecto

Resultado

$$\frac{0}{362} \text{ X100} = 0\%$$

- **Indicador incremento de gestión – Administrativo**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento administrativo}}{\text{Número de beneficiarios totales del Proyecto}} \text{ X100}$$

Resultado

$$\frac{243}{362} \text{ X100} = 67\%$$

- **Indicador incremento de gestión – Financiero**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento financiero}}{\text{Número de beneficiarios totales del Proyecto}} \text{ X100}$$

Resultado

$$\frac{243}{362} \text{ X100} = 67\%$$

- **Indicador incremento de gestión - TICS**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento TICS

Número de beneficiarios totales del Proyecto X100

Resultado

$$\frac{243}{362} \text{ X100} = 67\%$$

- **Indicador incremento de gestión – Desarrollo Tecnológico**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento de desarrollo tecnológico

Número de beneficiarios totales del Proyecto X100

Resultado

$$\frac{0}{362} \text{ X100} = 0\%$$

- **Indicador incremento de gestión – Habilidades Transversales**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento de habilidades transversales

Número de beneficiarios totales del Proyecto X100

Resultado

$$\frac{362}{362} \text{ X100} = 100\%$$

3. Aspectos financieros

3.1. Ejecución presupuestal por fuente de financiación

Aportes SENA

BANAC presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de cofinanciación de acuerdo con el siguiente detalle:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Recursos aceptados como ejecución	%
R.1.2.1.5	Honorario Nacional Profesional con título de doctorado	$ 76.640.000,00	$ 76.640.000,00	$ 76.640.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.640.000,00	100,00%
R.2.1	Alojamiento, manutención y Transporte local Nacional	$ 30.600.000,00	$ 30.600.000,00	$ 26.100.000,00	$ 4.500.000,00	$ 0,00	$ 30.600.000,00	100,00%
R.4	Tiquetes Aéreos, terrestres intermunicipales y/o fluvial (Ida y vuelta) Nacional	$ 34.000.000,00	$ 34.000.000,00	$ 29.000.000,00	$ 5.000.000,00	$ 0,00	$ 34.000.000,00	100,00%
R.6.1.1.	Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo. (Incluido video beam y conectividad).	$ 59.840.000,00	$ 59.840.000,00	$ 58.506.321,60	$ 1.333.678,40	$ 0,00	$ 59.840.000,00	100,00%
R.8.1.	Elaboración de Video	$ 2.691.665,00	$ 2.691.665,00	$ 0,00	$ 2.691.665,00	$ 0,00	$ 2.691.665,00	100,00%
R.11.4	Gastos de Alojamiento, manutención y transporte para Evento de formación Campamento (Cuando la formación sea de 8 horas diarias y en 2 diás seguidos)	$ 46.240.000,00	$ 46.240.000,00	$ 43.279.575,00	$ 2.960.425,00	$ 0,00	$ 46.240.000,00	100,00%
R.5.1.2.1.1.	Impresión de Cartillas De 10 a 150 unidades	$ 12.214.160,00	$ 12.214.160,00	$ 10.417.960,00	$ 1.796.200,00	$ 0,00	$ 12.214.160,00	100,00%
R.5.1.3	Diagramación Cartillas y Folletos	$ 14.386.800,00	$ 14.386.800,00	$ 11.509.440,00	$ 2.877.360,00	$ 0,00	$ 14.386.800,00	100,00%
R.10	Pólizas	$ 2.641.506,00	$ 1.776.785,00	$ 1.776.785,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.776.785,00	67,26%
R.7	Gastos de operación del proyecto	$ 87.322.525,00	$ 87.322.525,00	$ 69.422.000,00	$ 17.900.525,00	$ 0,00	$ 87.322.525,00	100,00%
R.12	Transferencia de conocimiento	$ 4.366.126,00	$ 4.366.126,01	$ 4.366.126,01	$ 0,00	$ 0,01	$ 4.366.126,00	100,00%
TOTALES		**$ 370.942.782,00**	**$ 370.078.061,01**	**$331.018.207,61**	**$ 39.059.853,40**	**$ 0,01**	**$ 370.078.061,00**	**99,766885610945800%**

Aportes contrapartida

Según el convenio suscrito, el conviniente aportará la suma $160.000.000,00 en dinero.

Recursos de contrapartida en efectivo

El conviniente presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de contrapartida en efectivo de acuerdo con el siguiente detalle:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos no aceptados por la interventoría	Recursos aceptados como ejecución	% Ejecución
R.1.2.1.5	Honorario Nacional Profesional con título de doctorado	$ 160.000.000,00	$ 160.000.000,00	$160.000.000,00	$ 0,00	$160.000.000,00	100,00%
TOTALES		**$ 160.000.000,00**	**$ 160.000.000,00**	**$160.000.000,00**	**$ 0,00**	**$160.000.000,00**	**100,00%**

Recursos de contrapartida en especie

El conviniente no tiene un valor contemplado por esta fuente de recursos.

Resumen de la ejecución financiera

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No reconocido	Valor considerado por la Interventoría	% Ejecución
SENA	$ 370.942.782,00	$ 370.078.061,01	$ 0,01	$ 370.078.061,00	99,766885610945800%
Contrapartida en efectivo	$ 160.000.000,00	$ 160.000.000,00	$ -	$ 160.000.000,00	100,00%
Contrapartida en especie	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00%
Contrapartida total	$ 160.000.000,00	$ 160.000.000,00	$ -	$ 160.000.000,00	100,00%
TOTAL	**$ 530.942.782,00**	**$ 530.078.061,01**	**$ 0,01**	**$ 530.078.061,00**	**$ 99,84**

3.2. Reconocimiento final

Los siguientes son los resultados de ejecución del proyecto:

Fuente de Financiación	Valor Aprobado	% Académico	Valor a reconocer según cumplimiento académico	Ejecución financiera	% Ejecución financiera	% reconocido Ejecución para liquidar	Valor reconocido por la Interventoría
SENA	$370.942.782,00	100,00%	$370.942.782,00	$370.078.061,00	99,76%	99,766885610945800%	$370.078.061,00
EMPRESA	$160.000.000,00		$160.000.000,00	$160.000.000,00	100,00%		$159.627.016,98
Total	$530.942.782,00		$530.942.782,00				$529.705.077,98

Nota: Para efectos del cálculo el % corresponde a 99,766885610945800%

4. Aspectos transversales

4.1. Aspectos jurídicos

Modificaciones

El conviniente solicitó las siguientes modificaciones:

Modificación	Concepto de Interventoría	Viabilidad	Radicado SENA	Fecha	Requiere aceptación SENA	Radicado aceptación SENA
Cambio director Proyecto	CM_051224_21	Viable	72024315984	05/12/2024	NO	N/A
Cronograma	CM_131224_42	Viable	72024326190	13/12/2024	NO	N/A
Cronograma	CM_181224_48	Viable	72024329865	18/12/2024	NO	N/A
Cambio director Proyecto	CM_270125_103	Viable	72025030455	27/01/2025	NO	N/A
Cronograma	CM_140325_140	Viable	72025109362	14/03/2025	NO	N/A
Cronograma	CM_200325_145	Viable	72025118360	20/03/2025	NO	N/A

Además, se tramitó modificaciones que requieren aval del SENA así:

Modificación	Concepto de Interventoría	Viabilidad	Radicado SENA	Fecha	Respuesta SENA	Fecha
Concepto Prorroga	CP_131224_60	Viable	72024326376	13/12/2024	SI	Otro sí - SECOP
Concepto Prorroga	CP_260325_99	Viable	72025125207	26/03/2025	SI	Otro sí - SECOP
Concepto Prorroga	CP_290425_114	No Viable	72025167177	29/04/2025	NA	

Acciones de Interventoría

Durante la Ejecución la interventoría realizó las siguientes acciones:

TIPO DE ACCIÓN	MOTIVO	RADICADO INTERVENTORIA	RADICADO SENA	FECHA RADICADO
Solicitud de Información	Oficio solicitud HV Director	ASI_041224_15	72024314284	04/12/2024
Solicitud de Información	Oficio solicitud reporte informe mensual	ASI_121224_45	72024324418	12/12/2024
Solicitud de Información	Oficio solicitud HV Capacitadores	ASI_041224_114	72024314266	04/12/2024
Solicitud de Información	Oficio solicitud Listados de asistencia	ASI_271224_91	72024335610	27/12/2024
Solicitud de Información	Oficio solicitud reporte informe mensual	ASI_100125_122	72025005620	10/01/2025
Solicitud de Información	Solicitud de Cronograma corte 2 y Ejecución financiera	ASI_210125_141	72025021437	21/01/2025
Solicitud de Información	Solicitud Segundo Desembolso	ASI_290125_149	72025034164	29/01/2025
Solicitud de Información	Solicitud de información académica y financiera	ASI_110225_177	72025057038	11/02/2025
Comunicación	Alerta de presunto incumplimiento conviniente	COM_170225_27	72025066018	17/02/2025
Observación	Observación Visita Fallida	AO_250225_01	72025081493	25/02/2025
Observación	Observación Visita Fallida	AO_270225_02	72025085206	27/02/2025
Comunicación	Alerta de presunto incumplimiento conviniente	ASI_030325_230	72025089950	03/03/2025
Comunicación	Urgente. Aviso de alto riesgo de incumplimiento. - SENA	COMF_040325_35	72025092187	04/03/2025
Solicitud de Información	Solicitud de información mensual financiero y académico	ASI_160325_251	72025112058	16/03/2025

TIPO DE ACCIÓN	MOTIVO	RADICADO INTERVENTORIA	RADICADO SENA	FECHA RADICADO
Solicitud de Información	Reiteración y última solicitud de información segundo	ASI_300325_261	72025131742	30/03/2025
Comunicación	Requerimiento Presunto Incumplimiento	RPI_090425_02	72025145194	09/04/2025

4.2. Aspectos administrativos

Garantías

Póliza de Cumplimiento n.° B-100054991 del 15 de noviembre de 2024

Responsabilidad Civil extracontractual n.° B-100014821 del 15 de noviembre de 2024

Fecha aprobación garantías: 20 de noviembre de 2024

Pólizas de seguro aprobadas prórroga otrosí 1:

Póliza de Cumplimiento n.° B-100054991 anexo 3 del 26 de diciembre de 2024

Responsabilidad Civil extracontractual n.° B-100014821 anexo 3 del 26 de diciembre de 2024

Fecha aprobación garantías prorroga otrosí 1: 30 de enero de 2025

Pólizas de seguros aprobadas prórroga otrosí 2:

Póliza de Cumplimiento n.° B-100054991 anexo 4 del 31 de marzo de 2025

Responsabilidad Civil extracontractual n.° B-100014821 anexo 4 del 31 de marzo de 2025

Fecha aprobación garantías prorroga otrosí 2: 08 de abril de 2025

Fecha de inicio: 20 de noviembre de 2024

Contratos

El Conviniente suscribió los siguientes contratos con el fin de cumplir con las obligaciones establecidas en el convenio y ejecutar el proyecto aprobado:

Tipo Contrato	Objeto	Contratante	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
Prestación de servicios	Formar a los campesinos que pertenecen a la asociación o que este determine para impartir las temáticas aprobadas en el marco del convenio suscrito entre la asociación y el SENA en la vigencia 2024.	INDESA	$ 323.080.960 $ 64.600.000	Un primer pago por valor del treinta por ciento (30%) del valor total del contrato cuando cumpla los requisitos de perfeccionamiento del contrato, legalización y cuando el avance del cronograma sea igual o superior al diez por ciento (10%), previa presentación de la factura por parte del CONTRATISTA, la cual deberá ser aprobada por EL CONTRATANTE. B) el setenta por ciento (70%) se cancelará, de acuerdo con los avances parciales del proyecto previa presentación y aprobación de las facturas.	26/11/2024 30/03/2025 Otro si 30/04/2025	31/12/2024 05/12/2024 15/03/2025
Prestación de servicios	Prestar los servicios profesionales como DIRECTOR DE PROYECTOS	FABIAN ENRIQUE LEAL DELGADO	$ 8.000.000	1 pago con la entrega del 35% a cumpliendo del cronograma del plan del trabajo un segundo pago por la suma de $3.500.000 con la entrega del 85% del plan de trabajo y un tercer pago con una entrega del 15% final para el cumplimiento del 100% del objeto contratado.	31/03/2025 Otro si 30/04/2025	27/01/2025 15/03/2025
Prestación de servicios	Apoyo Administrativo en el marco de la ejecución del proyecto de prestación de servicios suscrito entre EL PROFESIONAL y la ASOCIACIÓN	SILVIA JULIANA SERRANO ACEVEDO	$ 3.000.000	1 pago por la suma de QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($500.000) con la entrega del 35% del cronograma de obra o plan de trabajo. 2. Un segundo pago por la suma de UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($1.750.000) con la entrega del 85% de la obra o plan de trabajo. 3. Un tercer pago por la suma de SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($750.000) con la entrega del 100% del objeto contratado o la acreditación de la culminación del plan de trabajo con la entrega del 5% a cumplimiento del cronograma del pan del trabajo,	31/03/2025 Otro si 30/04/2025	5/02/2025 15/03/2025
Prestación de servicios	APOYO CONTABLE en el marco de la ejecución del contrato de prestación de servicios No 002 de fecha 2024 suscrito entre el profesional y la ASOCIACION	MARCOS FIDEL SUÁREZ RODRÍGUEZ	$ 5.000.000	Un primer pago con la entrega del 15% del cronograma de obra o plan de trabajo. 2. Un segundo Pago con la entrega del 35% de la obra o plan de trabajo. 3. Un tercer pago con la entrega del 85% de la obra o plan de trabajo. 4. Un cuarto pago con la entrega del 100% del objeto contratado o la acreditación de la culminación del plan de trabajo.	30/03/2025 Otro si 30/04/2025	16/12/2025 14/03/2025

4.3. Aspectos relevantes

La ejecución del convenio entre el SENA y BANAC, en el marco del Programa de Formación Especializada para la Economía Campesina – FEEC, permitió fortalecer el tejido organizacional y financiero de los pequeños productores de BANAC, brindando así formación especializada para que los beneficiarios optimicen la gestión de sus asociaciones.

4.3.1. Fortalezas

Por medio del convenio se logró:

- Alcanzar un alto nivel de satisfacción y utilidad de la capacitación

- Mejora comprobada en el conocimiento y aplicación de herramientas de gestión financiera y organizacional.

- Fortalecimiento organizacional que optimiza la administración interna de BANAC.

- Impacto comunitario significativo, con beneficiarios fortalecidos en liderazgo y autonomía.

4.3.2. Puntos a mejorar

Se recomienda consolidar y escalar el modelo de formación aplicado, reforzando el seguimiento post-formación con estrategias de acompañamiento técnico, mentoría o redes colaborativas. Además, puede ser útil diseñar mecanismos de monitoreo continuo que midan la aplicación sostenida de los conocimientos adquiridos, para garantizar que los aprendizajes se mantengan y se traduzcan en mejoras estructurales a mediano y largo plazo.

4.3.3. Caso de éxito

La acción de formación AF1 - Exploración de la Contabilidad y Finanzas: Comprendiendo Procesos Contables y Tributarios, se consolidó como un caso de éxito al lograr capacitar a más de 97 campesinos de la región, quienes aprendieron a organizar, planear y liderar a partir de la aplicación y manejo de herramientas que les enseñó cómo hacer un presupuesto, cómo llevar contabilidad en la pequeña empresa y cómo sacar provecho de las habilidades blandas para mejorar sus procesos contables básicos.
