UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Contrato de Interventoría N° CO1.PCCNTR.6836437 de 2024 suscrito entre el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y la Universidad de Antioquia. Obligación N° 25

Programa de Formación Especializada para la Economía Campesina - Convocatoria DSNFT – 0001 – FEEC – 2024

Informe final

COMITÉ AGROPESQUERO DE CASCAJAL – AGROPESCA CASCAJAL

UNIVERSIDAD® DE ANTIOQUIA 1803

CO1.PCCNTR.6914664

Contenido

1. Datos generales del convenio 2
2. Aspectos técnicos 2
2.1. Proyecto aprobado 2
2.2. Cumplimiento Técnico 2
2.3. Impacto regional 4
2.4. Indicadores del proyecto 7
3. Aspectos financieros 10
3.1. Ejecución presupuestal por fuente de financiación 10
3.2. Reconocimiento final 12
4. Aspectos transversales 12
4.1. Aspectos jurídicos 12
4.2. Aspectos administrativos 13
4.3. Aspectos relevantes 14
4.3.1. Fortalezas 14
4.3.2. Puntos a mejorar 15
4.3.3. Caso de éxito 15

1. Datos generales del convenio

- Fecha de suscripción del convenio: 25 de octubre de 2024
- Fecha de inicio del convenio: 07 de noviembre de 2024
- Fecha de inicio de actividades académicas: 26 de noviembre de 2024
- Fecha de finalización de actividades académicas: 05 de mayo de 2025

2. Aspectos técnicos

2.1. Proyecto aprobado

El proyecto presentado por AGROPESCA-CASCAJAL se resume en las siguientes tablas:

N° AF	Nombre de la acción de formación	Horas de la acción de formación					Total horas	Evento de aprendizaje
		Presencial	PAT	Virtuales	Hibrida	N. grupos		
1	Construcción de tejido social y productivo en el agropesquero	16	0	0	0	19	304	Campamento de Formación
2	Asociatividad para el Desarrollo Rural y la Construcción de Paz	8	0	0	0	19	152	Campamento de Formación
	TOTALES	24	0	0	0	**38**	**456**	

N° AF	Nombre de la acción de formación	BENEFICIARIOS		
		Empresa	SENA	Total
1	Construcción de tejido social y productivo en el agropesquero	304	0	304
2	Asociatividad para el Desarrollo Rural y la Construcción de Paz	380	0	380
	TOTALES	**684**	**0**	**684**

N° AF	Nombre de la acción de formación	Costo AF
1	Construcción de tejido social y productivo en el agropesquero	$ 211.582.800,00
2	Asociatividad para el Desarrollo Rural y la Construcción de Paz	$ 154.446.000,00
	TOTALES	$ 366.028.800,00

2.2. Cumplimiento Técnico

La ejecución académica del proyecto se cumplió de la siguiente manera:

Cálculo del Porcentaje reconocimiento ejecución técnica								
AF	NOMBRE AF	COFINANCIACIÓN	CONTRAPARTIDA	TOTAL	PESO AF	BENEFICIARIOS INICIALES	Indice de deserción X%	BENEFICIARIOS RECONOCIDOS
AF 1	Construcción de tejido social y productivo en el agro pesquero	183.006.800	28.576.000,00	211.582.800,00	57,80%	304	0	304
AF2	Asociatividad para el Desarrollo Rural	136.586.000	17860000	154.446.000,00	42,20%	380	0	380

Cálculo del Porcentaje reconocimiento ejecución técnica								
AF	NOMBRE AF	COFINANCIACIÓN	CONTRAPARTIDA	TOTAL	PESO AF	BENEFICIARIOS INICIALES	Indice de deserción X%	BENEFICIARIOS RECONOCIDOS
	y la Construcción de Paz							
Total		**319.592.800**	**46.436.000,00**	**366.028.800,00**	**100,00%**	**684**		**684**

Cálculo del Porcentaje reconocimiento ejecución técnica					
VALOR RECONOCIDO COFINANCIACIÓN	% RECONOCIDO COFINANCIACIÓN	VALOR RECONOCIDO CONTRAPARTIDA	% RECONOCIDO CONTRAPARTIDA	VALOR RECONOCIDO TOTAL	% RECONOCIDO TOTAL
183.006.800,00	57,26%	28.576.000,00	61,5%	211.582.800,00	57,80%
136.586.000,00	42,74%	17.860.000,00	38,5%	154.446.000,00	42,20%
319.592.800,00	**100,00%**	**46.436.000,00**	**100,0%**	**366.028.800,00**	**100,00%**

Además, se presentó una certificación firmada por el Director del Proyecto, en la que se relacionan los beneficiarios de cada acción de formación, número de cédula y porcentaje de asistencia de cada uno, de acuerdo con:

N°	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	BENEFICIARIOS CAPACITADOS/EN CAPACITACIÓN	FECHA DE CERTIFICACION
1	CONSTRUCCIÓN DE TEJIDO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN EL AGROPESQUERO	1	16	16/01/2025
		2	18	16/01/2025
		3	17	16/01/2025
		4	17	19/01/2025
		5	17	19/01/2025
		6	16	16/05/2025
		7	16	16/05/2025
		8	16	16/05/2025
		9	16	16/05/2025
		10	16	16/05/2025
		11	17	16/05/2025
		12	16	19/01/2025
		13	18	19/01/2025
		14	16	16/04/2025
		15	17	16/05/2025
		16	16	16/05/2025
		17	16	16/05/2025
		18	16	16/05/2025
		19	16	16/05/2025
2	Asociatividad para el Desarrollo Rural y la Construcción de Paz	1	19	19/01/2025
		2	20	16/05/2025
		3	20	19/01/2025
		4	20	16/05/2025
		5	20	19/01/2025
		6	20	19/01/2025
		7	20	19/01/2025
		8	20	16/05/2025
		9	19	16/05/2025
		10	20	16/05/2025
		11	20	16/05/2025
		12	20	16/05/2025
		13	20	16/05/2025
		14	23	16/05/2025
		15	21	16/05/2025
		16	20	19/01/2025
		17	19	19/01/2025
		18	20	16/05/2025
		19	20	16/05/2025

En el aplicativo dispuesto por el SENA, el conviniente evidencia el registro de beneficiarios cumpliendo con el numeral 9 de la cláusula sexta del convenio, así:

N°	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS CAPACITADOS/EN CAPACITACIÓN
1	CONSTRUCCIÓN DE TEJIDO SOCIAL Y PRODUCTIVO EN EL AGROPESQUERO	1	16	16
		2	16	18
		3	16	17
		4	16	17
		5	16	17
		6	16	16
		7	16	16
		8	16	16
		9	16	16
		10	16	16
		11	16	17
		12	16	16
		13	16	18
		14	16	16
		15	16	17
		16	16	16
		17	16	16
		18	16	16
		19	16	16
2	Asociatividad para el Desarrollo Rural y la Construcción de Paz	1	20	19
		2	20	20
		3	20	20
		4	20	20
		5	20	20
		6	20	20
		7	20	20
		8	20	20
		9	20	19
		10	20	20
		11	20	20
		12	20	20
		13	20	20
		14	20	23
		15	20	21
		16	20	20
		17	20	19
		18	20	20
		19	20	20

- Beneficiarios esperados: 684
- Beneficiarios certificados: 694

2.3. Impacto regional


El programa de formación especializada para la economía campesina busca la adquisición y actualización de conocimientos, habilidades, técnicas, prácticas y la mejora de las competencias de las campesinas y campesinos, la generación de capacidades, incentivo de la asociatividad, la participación y la integración comercial entre los actores de la economía campesina, así como la transformación productiva, protección del ambiente, los recursos hídricos y la agroecología, a través de la cofinanciación de los proyectos avalados, en la convocatoria DSNFT – 0001 – FEEC – 2024, entre otros aspectos, promovió y estimuló desde la formulación la implementación de acciones de formación en zonas rurales, especialmente para los beneficiarios que residen en (municipios PDET, ZOMAC o zonas aledañas a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, zonas rurales).

AGROPESCA CASCAJAL alineado con este enfoque ejecutó algunos eventos formativos para la población ubicada en estas localidades así:


N°	NOMBRE DE LA ACCIÓN DE FORMACIÓN	COBERTURA GEOGRÀFICA INICIAL
1	Construcción de tejido social y productivo en el agro pesquero	BOLÍVAR- MAGANGUÉ BOLÍVAR- ACHÍ BOLÍVAR- ACHÍ BOLÍVAR- SIMITÍ CESAR- PUEBLO BELLO CESAR- PUEBLO BELLO BOLÍVAR- TURBANÁ BOLÍVAR- BOLÍVAR- REGIDOR BOLÍVAR- REGIDOR BOLÍVAR- RÍO VIEJO BOLÍVAR- MAGANGUÉ BOLÍVAR-
2	Asociatividad para el Desarrollo Rural y la Construcción de Paz	BOLÍVAR- MAGANGUÉ BOLÍVAR- ACHÍ BOLÍVAR- ACHÍ BOLÍVAR- SIMITÍ CESAR- PUEBLO BELLO CESAR- PUEBLO BELLO BOLÍVAR- TURBANÁ BOLÍVAR- BOLÍVAR- REGIDOR BOLÍVAR- REGIDOR BOLÍVAR- RÍO VIEJO BOLÍVAR- MAGANGUÉ BOLÍVAR

Como se indicó anteriormente el total de beneficiarios certificados bajo el convenio fue de 694, a continuación, se presentan algunas graficas que detallan el nivel ocupacional, el impacto sectorial de las acciones de formación implementadas y la desagregación etaria y por genero de los participantes que culminaron satisfactoriamente la formación.


Nivel ocupacional

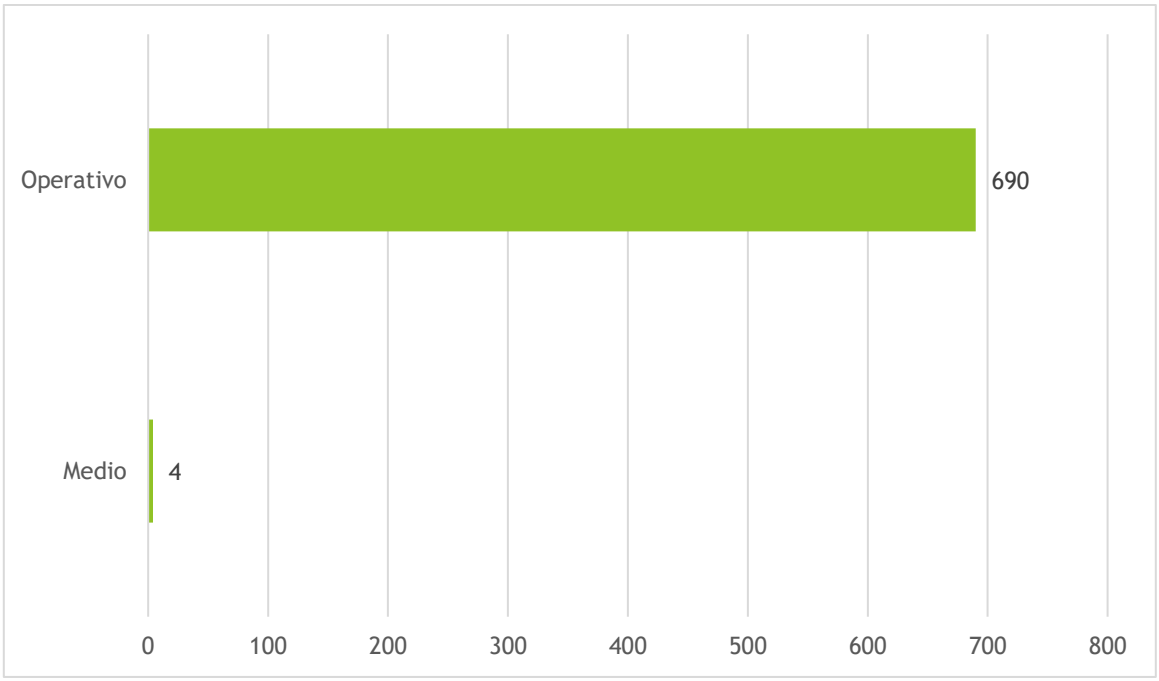

Género

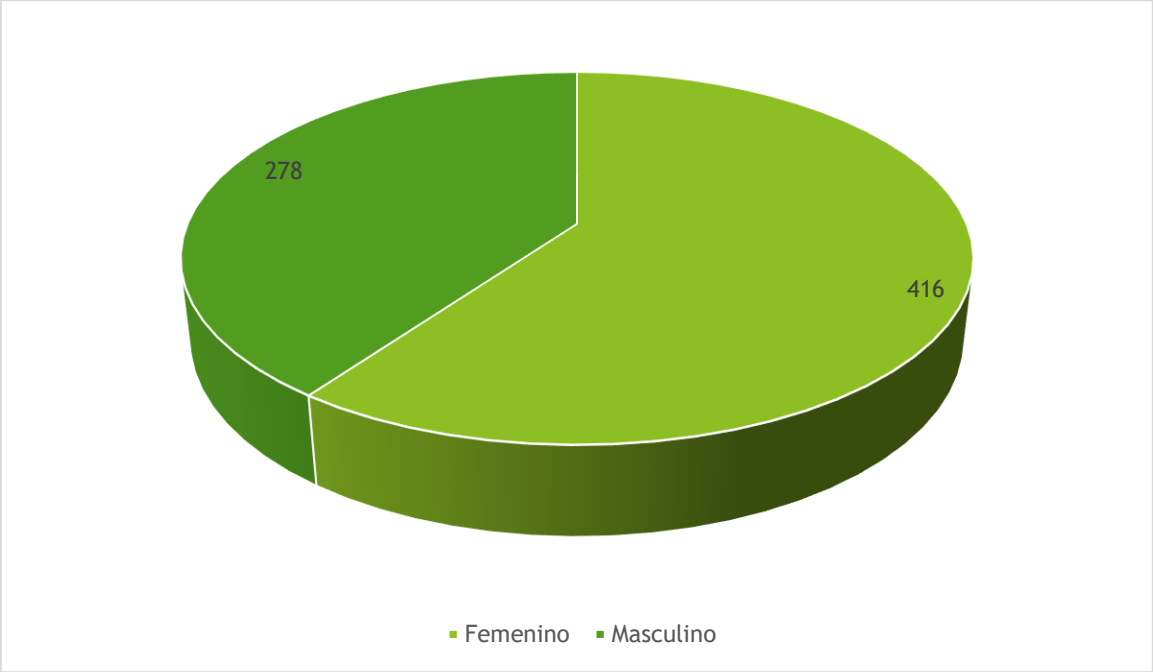

Desagregación etaria

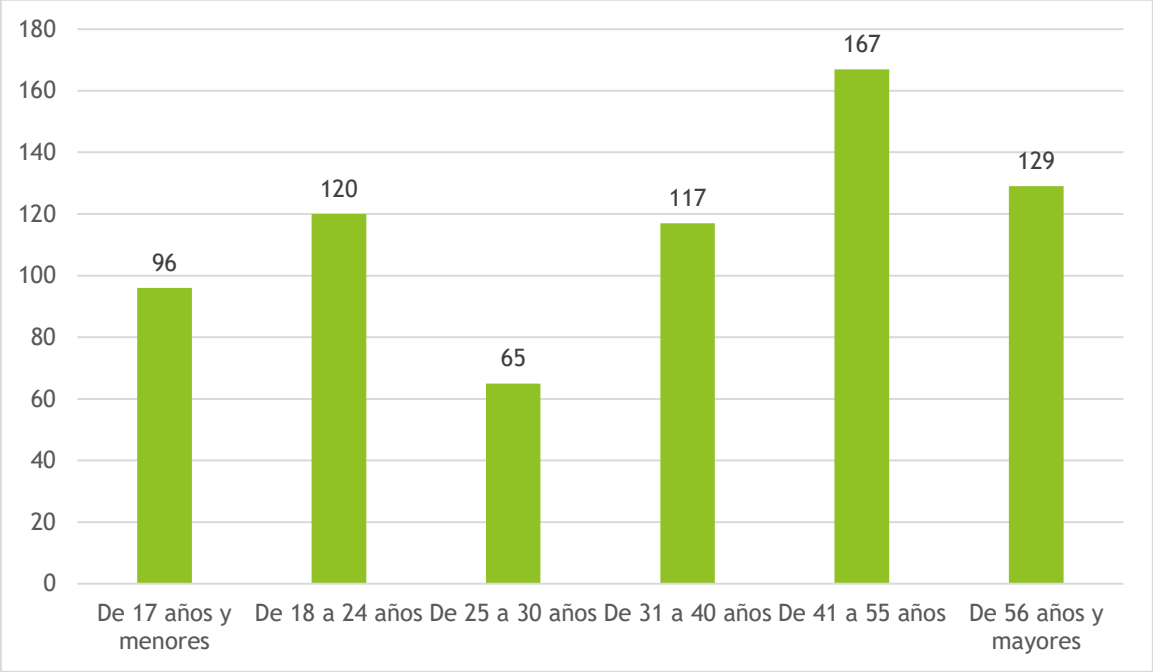

2.4. Indicadores del proyecto

Tasa de incremento del conocimiento

AF	Promedio tasa incremento del conocimiento
AF1	66%
AF2	69%
PROMEDIO	**68%**

Impacto

- **Número total de campesinas y campesinos beneficiados**

Este indicador mide la cantidad de campesinas y campesinos que participan en los programas o que reciben beneficios de la formación o apoyo brindado por el proyecto

Fórmula

$$\frac{\text{Número de Campesinas y Campesinos beneficiados por el Proyecto}}{\text{Número total de Campesinas y Campesinos afiliados a las organizaciones}} \text{ X100}$$

Resultado

$$\frac{694}{684} \text{ X100} = 101\%$$

- **Número de asociaciones campesinas, agropecuarias, cooperativas campesinas u otras organizaciones campesinas a beneficiar.**

Este indicador mide la cantidad de organizaciones campesinas (asociaciones agropecuarias, cooperativas, entre otras) que reciben formación, capacitación o participación en el programa.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de Organizaciones beneficiadas con el Proyecto}}{\text{Número total de Organizaciones afiliadas al conveniente}} \text{ X100}$$

Resultado

$$\frac{1}{1} \text{ X100} = 100\%$$

- **Incremento de la formación**

Este indicador mide el aumento en el nivel de conocimientos y habilidades adquiridos por los participantes tras recibir la formación.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas que por primera vez reciben formación especializada}}{\text{Número total de campesinos que conforman la asociación u organización}} \text{ X100}$$

Resultado

$$\frac{710}{684} \text{ X100} = 104\%$$

- **Indicador incremento de gestión – Técnico**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento técnico}}{\text{Número de beneficiarios totales del Proyecto}} \text{ X100}$$

Resultado

$$\frac{710}{684} \text{ X100} = 104\%$$

- **Indicador incremento de gestión – Administrativo**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento administrativo}}{\text{Número de beneficiarios totales del Proyecto}} \text{ X100}$$

Resultado

$$\frac{710}{} \text{ X100} = 104\%$$

684

- **Indicador incremento de gestión – Financiero**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento financiero
——————————————————————————— X100
Número de beneficiarios totales del Proyecto

Resultado

$$\frac{710}{684} \text{ X100} = 104\%$$

- **Indicador incremento de gestión - TICS**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento TICS
——————————————————————————— X100
Número de beneficiarios totales del Proyecto

Resultado

$$\frac{710}{684} \text{ X100} = 104\%$$

- **Indicador incremento de gestión – Desarrollo Tecnológico**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento de desarrollo tecnológico
——————————————————————————— X100

Número de beneficiarios totales del Proyecto

Resultado

$$\frac{710}{684} \text{ X100} = 104\%$$

- **Indicador incremento de gestión – Habilidades Transversales**

Este indicador mide la mejora en la capacidad de gestión (organización, administración, toma de decisiones) de las asociaciones y cooperativas campesinas tras recibir apoyo o formación.

Fórmula

$$\frac{\text{Número de campesinos y campesinas beneficiarios de la formación especializada que generaron un impacto en las áreas de conocimiento de habilidades transversales}}{\text{Número de beneficiarios totales del Proyecto}} \text{ X100}$$

Resultado

$$\frac{710}{684} \text{ X100} = 104\%$$

3. Aspectos financieros

3.1. Ejecución presupuestal por fuente de financiación

Aportes SENA

AGROPESCA CASCAJAL presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de cofinanciación de acuerdo con el siguiente detalle:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R 1.2.1.4	Honorario Nacional Profesional con título de maestría	$ 57.000.000	$57.000.000	$14.071.820	$ 42.928.180		$ 57.000.000	100,00%
R 1.2.1.2	Honorario Nacional Profesional titulado	$ 79.040.000	$79.040.000	$49.084.600	$ 29.955.400		$ 79.040.000	100,00%
R 2.1	Alojamiento, manutención y Transporte local Nacional	$ 43.130.000	$43.130.000	$30.147.200	$ 12.982.800		$ 43.130.000	100,00%
R 4	Tiquetes Aéreos, terrestres intermunicipales y/o fluvial (Ida y vuelta) Nacional	$ 47.500.000	$47.500.000	$15.369.968	$ 32.130.032		$ 47.500.000	100,00%

R 6.1.1	Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo. (Incluido video beam y conectividad).	$ 57.000.000	$57.000.000	$ 4.600.000	$ 52.400.000		$ 57.000.000	100,00%
R 5.1.2.1.2	Impresión de Cartillas 151 unidades en adelante	$ 16.416.000	$16.416.000	$ 8.911.600	$ 7.504.400		$ 16.416.000	100,00%
R 5.1.3	Diagramación Cartillas y Folletos	$ 5.640.000	$ 5.640.000	$ 5.640.000			$ 5.640.000	100,00%
R 5.2.1	Cuadernos tamaño Media carta de 100 hojas, anillado, con carátula con Diseño SENA y pasta dura.	$ 10.944.000	$10.944.000	$10.944.000			$ 10.944.000	100,00%
R 5.2.2	Esferos retráctiles de tinta negra por beneficiario	$ 1.846.800	$ 1.846.800	$ 1.846.800			$ 1.846.800	100,00%
R 11.3 -	Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 8 horas	$ 7.134.774	$ 7.134.774		$ 7.134.774		$ 7.134.774	100,00%
R 8.1 -	Elaboración de Video	$ 1.076.000	$ 1.076.000		$ 1.076.000		$ 1.076.000	100,00%
R7	Gastos operacionales del proyecto	$ 73.205.760	$73.205.760	$59.360.000	$ 13.845.760		$ 73.205.760	100,00%
TOTALES		**$ 399.933.334**	**$399.933.334**	**$199.975.988**	**$ 199.957.346**	**$ 0,00**	**$399.933.334**	**100,00%**

Aportes contrapartida

Según el convenio suscrito, el conviniente debe aportar recursos por valor de 45.175.988 en dinero.

Recursos de contrapartida en efectivo

COMITE AGROPESQUERO DE CASCAJAL AGROPESCA-CASCAJAL presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de contrapartida en dinero de acuerdo con el siguiente detalle:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	%
R 11.3 -	Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 8 horas	$39.301.226	$39.301.226	$39.301.226	$0	$ 39.301.226	100,00%
R 10	Pólizas	$2.156.221	$2.156.221	$2.156.221	$0	$ 2.156.221	100,00%
R12	Transferencia	$3.718.541	$3.718.541	$3.718.541	$0	$ 3.718.541	100,00%
TOTALES		**$45.175.988,00**	**$ 45.175.988**	**$ 45.175.988**	**$ 0,00**	**$ 45.175.988**	**100,00%**

Recursos de contrapartida en especie

Para esta fuente de financiación, no hay recursos presupuestados.

Resumen de la ejecución financiera

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No reconocido	Valor reconocido	% Ejecución
Cofinanciación	$399.933.334,00	$399.933.334,00	$ -	$399.933.334,00	100,00%
Contrapartida en dinero	$45.175.988,00	$45.175.988,00	$ -	$45.175.988,00	100,00%
Contrapartida en especie	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
Contrapartida total	$45.175.988,00	$45.175.988,00	$ -	$45.175.988,00	100,00%
TOTAL	**$ 445.109.322**	**$ 445.109.322**	**$ 0**	**$ 445.109.322**	**100,00%**

3.2. Reconocimiento final

Los siguientes son los resultados de ejecución del proyecto:

Fuente de Financiación	Valor Aprobado	% cumplimiento técnico	valor a reconocer cumplimiento técnico	Ejecución financiera	% Ejecución financiera	% reconocido Ejecución para liquidar	Valor reconocido por la Interventoría
Cofinanciación	399.933.334,00	100,00%	399.933.334,00	399.933.334,00	100,00%	100,00%	399.933.334,00
Contrapartida	45.175.988,00		45.175.988,00	45.175.988,00	100,00%		45.175.988,00
Total	**445.109.322,00**		**445.109.322,00**				**445.109.322,00**

4. Aspectos transversales

4.1. Aspectos jurídicos

Modificaciones

El conviniente solicitó las siguientes modificaciones:

Modificación	Concepto de Interventoría	Viabilidad	Radicado SENA	Fecha
Cronograma	CM_150125_78	Viable	72025011266	15/01/2025

Además, se tramitó modificaciones que requieren aval del SENA así:

Modificación	Concepto de Interventoría	Viabilidad	Radicado SENA	Fecha
Presupuestal	CM_100525_196	Viable	72025181388	10/05/2025

Acciones de Interventoría

Durante la Ejecución la interventoría realizó las siguientes acciones:

TIPO DE ACCIÓN	MOTIVO	RADICADO INTERVENTORIA	RADICADO SENA	FECHA RADICADO	CIERRE
Solicitud de Información	Segundo desembolso	ASI_100125_118	72025005598	10/01/2025	CIN_250325_3058

Solicitud de Información	Listados de Asistencia	ASI_230525_346	72025201347	23/05/2025	SP_050625_222

4.2. Aspectos administrativos

Garantías

Pólizas de seguro aprobadas:

Póliza de Cumplimiento n. 320-47-994000029951 anexo 1 del 30 de octubre de 2024

Responsabilidad Civil extracontractual n. 320-74-994000014081 anexo 3 del 30 de octubre de 2024.

Fecha aprobación garantías: 07 de noviembre de 2024

Pólizas de seguro aprobadas primera prorroga:

Póliza de Cumplimiento n. 320-47- 994000029951 anexo 2 del 30 de diciembre de 2024

Responsabilidad Civil extracontractual n. 320-74-994000014081 anexo 4 del 30 de diciembre de 2024

Fecha aprobación garantías primera prórroga: 30 de enero 2025

Pólizas de seguro aprobadas segunda prorroga:

Póliza de Cumplimiento n. 320-47-994000029951 anexo 3 del 31 de marzo de 2025

Responsabilidad Civil extracontractual n. 320-74-994000014081 anexo 5 del 31 de marzo de 2025.

Fecha aprobación garantías segunda prórroga: 9 de abril 2025

Fecha de inicio: 07 de noviembre de 2024

Contratos

El Conviniente suscribió los siguientes contratos con el fin de cumplir con las obligaciones establecidas en el convenio y ejecutar el proyecto aprobado:

Tipo Contrato	Objeto	Valor	Forma de Pago	Vigencia	Fecha de suscripción
Prestación de servicios	aunar esfuerzos para ejecutar el proyecto aprobado entre el Sena y agropesca coordinador administrativo Jahindys Jandaira de Leon Martinez	$20.000.000 en tres pagos de 1° de 10.000.000, 2° por 7.000.000 y el 3° por 3.000.000	1° pago con el 35% ejecución, 2 pago cuando se haga el segundo desembolso y el 60% del proyecto y el 3 pago con el 100% del desembolso y ejecución del proyecto	31/12/2024	7/11/2024
Prestación de servicios	aunar esfuerzos para ejecutar el proyecto aprobado entre el Sena y agropesca coordinador financiero Carola Cassiani Escorcia	$22.000.000 en tres pagos de 1° de 11.000.000, 2° por	1° pago con el 35% ejecución, 2 pago cuando se haga el segundo desembolso y el 60% del proyecto y	31/12/2024	7/11/2024

		7.700.000 y el 3° por 3.300.000	el 3 pago con el 100% del desembolso y ejecución del proyecto		
Prestación de servicios	se compromete a desarrollar los cursos de capacitación incluyendo ayudas audiovisuales material de formacion y refrigerio entre otros, a los 38 grupos beneficiados de la asociación. Fundación Genius	$228.962.800	1° del 15% del contrato previa ejecución del 10%, 2° x1previa ejecución del 35%, 3° el 35% ejecución del proyecto y 4° 15% ejecución del total del proyecto	30/01/2025	1/11/2024
Prestación de servicios	aunar esfuerzos para ejecutar el proyecto aprobado entre el Sena y agropesca Directora de proyecto Erika Patricia Pérez Cervantes	$24.800.000 en cuatro pagos de 1° de 2.200.000, 2° por 12.680.000 el 3° por 7.440.000 y 4° por 2.480.000	1° pago con el 10% ejecución del proyecto, 2 pago cuando se haga el segundo desembolso y el 35% del proyecto y el 3 pago con el 100 ejecución del 60% del cronograma y el 4° ejecución del proyecto del 100%	31/12/2024	12/11/2024

4.3. Aspectos relevantes

La ejecución del convenio entre el SENA y AGROPESCA CASCAJAL, en el marco del Programa de Formación Especializada para la Economía Campesina – FEEC, permitió generar nuevos conocimientos en los campesinos y campesinas que hacen parte del COMITE AGROPESQUERO DE CASCAJAL, mejorando sus competencias en organización comunitaria y de creación de tejido social, para así generar procesos de asociatividad y organización agroempresarial de la economía campesina.

4.3.1. Fortalezas

Las acciones de formación permitieron a los beneficiarios fortalecer sus capacidades y adquirir herramientas clave para mejorar la gestión de sus actividades. A continuación, se presentan las principales fortalezas alcanzadas en cada acción de formación.

AF1 - Construcción de tejido social y productivo en el Agropesquero

Por medio del desarrollo de esta acción de formación se logró diseñar e implementar intervenciones favorecedoras del desarrollo social y comunitario de los campesinos del COMITÉ AGROPESQUERO DE CASCAJAL con el fin de ser mediadores del crecimiento y la transformación como elemento básico de la gestión efectiva del cambio social y comunitario, y así generar capacidades e incentivar la asociatividad, la participación y la integración comercial entre los actores de la economía campesina.

AF2 - Asociatividad para el desarrollo rural y la construcción de paz

Por medio de la cual los beneficiarios lograron integrar, articular y robustecer la oferta institucional para la asociatividad rural productiva y construcción de paz de la comunidad de campesinos del COMITE AGROPESQUERO DE CASCAJAL, con el fin de reconocer la conformación de organizaciones autosostenibles que tengan fines productivos y comerciales colectivos a largo plazo y promover los mecanismos de financiamiento para organizaciones de productores rurales, como canal para aumentar sus capacidades productivas.

4.3.2. Puntos a mejorar

Se identifica la necesidad de fortalecer el seguimiento posterior a los procesos formativos mediante programas de actualización y acompañamiento técnico continuos ya que la ausencia de estos mecanismos puede limitar la consolidación de los conocimientos adquiridos y afectar la sostenibilidad de los resultados obtenidos.

4.3.3. Caso de éxito

La acción de formación AF2 - Asociatividad para el desarrollo rural y la construcción de paz, a través de la cual y por medio de varias jornadas, se logró llegar a un número importante de campesinos a hablarles de la importancia de asociarnos y las ventajas que ello traería para la comunidad en general y el campo en sí, tales como el mejoramiento de vías, nuevos hospitales, escuelas, trabajo para la comunidad, la paz, entre otras; que sin lugar a dudas siempre van a traer beneficios a toda la comunidad.
