ACTA COMITÉ TECNICO No. 04

Asunto:	SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SPOPM-LP-CO-001-2024 CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA, EN LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL SAN MARCELINO, MUNICIPIO SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" Y EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SPOPM-CMA-INT-001-2024.
Fecha:	16 DE OCTUBRE DE 2025
Hora:	04:30 P.M.
Lugar:	Plataforma Meet Google - https://meet.google.com/gik-bfwx-iwz

Orden del día:	**Objetivos de la Reunión:** 1. Saludos y presentación de las partes 2. Revisión documentación enviada por parte de los contratistas de obra e interventoría 2.1. Cambio de representación legal del CONSORCIO SANMAR 2.2. Solicitudes de prórroga y concepto de viabilidad 3. Compromisos

TEMAS TRATADOS:

1	**REVISIÓN SOLICITUDES DE PRÓRROGA, OBRA E INTERVENTORÍA Y CONCEPTO DE VIABILIDAD**
2	**COMPROMISOS DE LA REUNIÓN**

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El día jueves 16 de octubre de 2025 siendo las 04:30 p.m. se da inicio al comité técnico No.04 del año 2025 del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. SPOPM-LP-CO-001-2024 CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA, EN LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL SAN MARCELINO, MUNICIPIO SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" Y EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. SPOPM-CMA-INT-001-2024., de manera virtual, mediante la Plataforma Meet Google - https://meet.google.com/gik-bfwx-iwz

1. Saludo y presentación de las partes

El ingeniero Eleazar Mora, profesional de apoyo de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas del Municipio de San Miguel, brinda el saludo a los asistentes al comité y da el paso para la presentación de todas las partes, por parte del CONSORCIO SANMAR, hace presencia la abogada Mónica Fernanda Montezuma Rojas, representante legal y el Ingeniero Carlos Alberto Torres Montero, consorciado, la Ingeniera Dayani Marcela Rodríguez Rosero, por parte de ALCUBO INTEGRAL S.A.S., firma interventora y el Arquitecto Guillermo Yamid Vallejos Benavides, Secretario de Planeación y Obras Públicas, quien funge como supervisor de los contratos.

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio La Libertad La Dorada - San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co planeacionyobras@sanmiguel-putumayo.gov.co

2. Revisión documentación enviada por parte de los contratistas de obra e interventoría

Toma la palabra el ingeniero Eleazar Mora quien señala que, de acuerdo a la información enviada entre los días 09 y 10 de octubre de 2025, por parte de los contratistas derivados, la cual hace parte del compromiso adquirido en la segunda sesión del comité operativo del Convenio interadministrativo N° SG 0106 2024 llevado a cabo los días 29 de septiembre y 06 de octubre de 2025, se convocó la realización del presente comité a fin de llevar a cabo el respectivo análisis a las solicitudes de prórroga de los contratos derivados según los argumentos expuestos.

El ingeniero Eleazar Mora adicionalmente indica que:

El cambio de representación legal del CONSORCIO SANMAR, se efectuó el día 08 de octubre de 2025, mediante documento denominado ACTA DE CAMBIO DE REPRESENTACIÓN LEGAL DEL CONSORCIO SANMAR, suscrita por los integrantes del consorcio, estableciendo como nueva representante legal a Mónica Fernanda Montezuma Rojas, para lo cual se adjuntó el RUT actualizado del consorcio.


Interviene el Secretario de Planeación y obras públicas quien solicita que dicho cambio también sea actualizado en la plataforma SECOP II, a lo cual el CONSORCIO SANMAR se compromete.

De acuerdo a la solicitud de prórroga de obra, se requirió por parte de la supervisión hacer unas modificaciones frente al numeral 1. Antecedentes, y por parte de la interventoría, se requiere subsanar en el numeral 2. Causas de retraso, frente a las condiciones climáticas adversas, las cuales son subsanaciones de forma, y serán atendidas de manera oportuna una vez finalice el comité por parte del contratista de obra.

Interviene la ingeniera Marcela Rodríguez, quien hace parte del equipo de trabajo como director de interventoría la cual fue delegada por la representante legal de la Sociedad ALCUBO INTEGRAL S.A.S., la cual expresa que, en atención a la presentación del nuevo cronograma de ejecución de actividades junto al plan de contingencia por parte del contratista de obra, la firma interventora considera viable la ampliación en tiempo de los contratos de obra e interventoría por el término de dos (02) meses es decir hasta el dia 24 de diciembre de 2025, conforme a la fecha límite de vencimiento del plazo de ejecución del convenio interadministrativo No. SG 0106-2024, que ampara los contratos derivados.

Ante este pronunciamiento, la Secretaría de Planeación y Obras Públicas, ve factible realizar la ampliación en tiempo por el término solicitado a los contratos derivados, para lo cual como supervisor del contrato de interventoría emitirá el respectivo concepto de viabilidad y así mismo notificará al Alcalde Municipal de los compromisos adquiridos en el presente comité para efectos de dar continuidad al trámite de prórroga.

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio La Libertad La Dorada - San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co planeacionyobras@sanmiguel-putumayo.gov.co

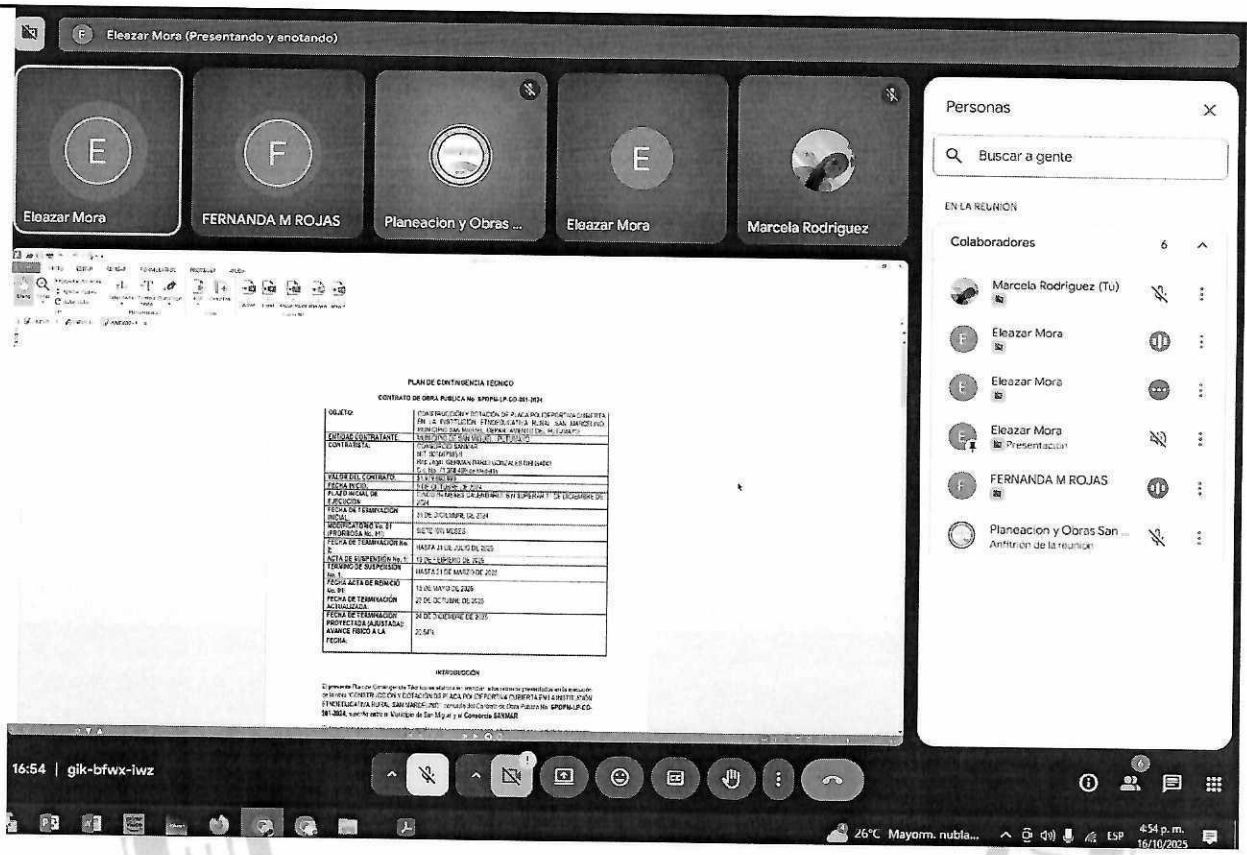

2. Compromisos.

No.	Descripción	Responsable	Fecha Prevista de entrega.
1.	Llevar cabo la actualización de representante legal por el CONSORCIO SANMAR en la plataforma SECOP II.	Contratista de obra CONSORCIO SANMAR	22 de octubre de 2025
2.	Emitir el concepto de viabilidad frente a la solicitud de prórroga para el contrato de obra	Secretaría de Planeación y Obras Públicas del Municipio de San Miguel	22 de octubre de 2025
3.	Notificar y remitir al Alcalde Municipal de San Miguel el contenido de la presente acta junto con el concepto de viabilidad suscrito por el supervisor.	Secretaría de Planeación y Obras Públicas del Municipio de San Miguel	22 de octubre de 2025

FIN DE COMITE

Dirección: Carrera 4 Calle 7 Esquina Palacio Municipal Barrio La Libertad La Dorada - San Miguel Putumayo.
Tel: móvil: 3202152347 - Código Postal 862040
Email: contactenos@sanmiguel-putumayo.gov.co planeacionyobras@sanmiguel-putumayo.gov.co
