Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
1		**CTO 1010-2024**	**283 días**	**mié 2/04/25**	**vie 1/05/26**		**$ 11,070,560,764.00**
2		DIAGNOSTICOS EyD	44 días	mié 2/04/25	lun 2/06/25		$ 0.00
3		**FASE 1**	**218 días**	**mié 2/04/25**	**vie 30/01/26**		**$ 7,033,332,493.00**
4		PRELIMINARES	48 días	mié 2/04/25	vie 6/06/25		$ 0.00
5		**Casa Blanca - FASE 1 (11005623-11005728-11005765)**	**151 días**	**lun 9/06/25**	**lun 5/01/26**	**4FC+5 días**	**$ 1,045,918,292.00**
34		**Casa Blanca - FASE 2 (11005566-11014376)**	**86 días**	**vie 3/10/25**	**vie 30/01/26**	**4FC+5 días**	**$ 939,402,360.00**
59		**Costa Azul - Tibabuyes (11005215)**	**47 días**	**lun 30/06/25**	**mar 2/09/25**		**$ 368,083,121.00**
86		**Potosi 11011188**	**32 días**	**lun 7/07/25**	**mar 19/08/25**	**59CC+5 días**	**$ 110,400,790.00**
106		**Portico (11004156-11013439-11004110-11004080)**	**82 días**	**lun 28/07/25**	**mar 18/11/25**	**60CC+20 días**	**$ 647,476,903.00**
132		**Niza Sur 1 - 11010613 - ETAPA 1**	**100 días**	**vie 11/07/25**	**jue 27/11/25**	**60CC+9 días**	**$ 347,368,175.00**
158		**Niza Sur 1 - 11010613 - ETAPA 2**	**72 días**	**vie 29/08/25**	**lun 8/12/25**	**60CC+9 días**	**$ 347,368,175.00**
185		**Parque Piloto (11006438-11011976-11011977-11006546-11011978-11006617)**	**142 días**	**jue 17/07/25**	**vie 30/01/26**	**60CC+13 días**	**$ 3,227,314,677.00**
258		**FASE 2**	**166 días**	**lun 19/05/25**	**lun 5/01/26**		**$ 1,994,985,445.00**
259		PRELIMINARES	55 días	lun 19/05/25	vie 1/08/25		$ 0.00
260		**Colina Campestre - 11008694**	**28 días**	**vie 26/09/25**	**mar 4/11/25**	**259FC+39 días**	**$ 304,574,992.00**
272		**La Gaitana - 11005262**	**28 días**	**mar 7/10/25**	**jue 13/11/25**	**260CC+7 días**	**$ 184,085,602.00**
289		**EL POA - 11004672**	**47 días**	**mar 23/09/25**	**mié 26/11/25**	**259FC+31 días**	**$ 286,447,901.00**
309		**La Campiña - 11003955**	**15 días**	**lun 13/10/25**	**vie 31/10/25**	**259FC+41 días**	**$ 160,821,655.00**
318		**Niza Sur 3 - 11010612**	**13 días**	**vie 31/10/25**	**mar 18/11/25**	259FC+64 días	**$ 26,524,588.00**
326		**El Recreo de los Frailes**	**51 días**	**lun 27/10/25**	**lun 5/01/26**	**259CC**	**$ 1,032,530,707.00**
364		**FASE 3**	**91 días**	**lun 15/09/25**	**lun 19/01/26**		**$ 114,910,995.00**
365		PRELIMINARES	43 días	lun 15/09/25	mié 12/11/25	259FC+30 días	$ 0.00
366		**Villa Elisa 11006280**	**25 días**	**lun 15/12/25**	**vie 16/01/26**	**365FC+22 días**	**$ 14,475,887.00**
378		**Prado Veraniego 11010114**	**25 días**	**lun 15/12/25**	**vie 16/01/26**	**365FC+22 días**	**$ 19,067,072.00**
390		**EL POA**	**26 días**	**lun 15/12/25**	**lun 19/01/26**	**365FC+6 días**	**$ 75,612,066.00**
427		**Aures - 11006499**	**24 días**	**lun 15/12/25**	**jue 15/01/26**	**365FC+22 días**	**$ 5,755,970.00**
439		**FASE 4**	**113 días**	**lun 22/09/25**	**mié 25/02/26**		**$ 1,927,331,831.00**
440		PRELIMINARES	20 días	lun 22/09/25	vie 17/10/25	259FC+35 días	$ 0.00
441		**La Campiña - 11003803**	**24 días**	**mar 18/11/25**	**vie 19/12/25**	**440FC+21 días**	**$ 60,489,584.00**
453		**Atabanza - 11010414**	**83 días**	**lun 3/11/25**	**mié 25/02/26**	**440CC+12 días**	**$ 1,866,842,247.00**
477		**FASE 5 - Adición**	**90 días**	**lun 29/12/25**	**vie 1/05/26**		**$ 0.00**
478		**Suba Centro - 11005331**	60 días	lun 2/02/26	vie 24/04/26	441FC+30 días	$ 0.00
479		**Prado Veraniego - 11010147**	40 días	lun 9/03/26	vie 1/05/26	441FC+55 días	$ 0.00
480		**La Chucua - 11005794**	10 días	lun 9/03/26	vie 20/03/26	441FC+55 días	$ 0.00
481		**Ciudad Hunza - 11009243, 11009180, 11009224, 11009242**	90 días	lun 29/12/25	vie 1/05/26	441FC+5 días	$ 0.00
482		**Salitre - 11013175, 110010589**	30 días	lun 23/02/26	vie 3/04/26	441FC+45 días	$ 0.00
483							$ 0.00

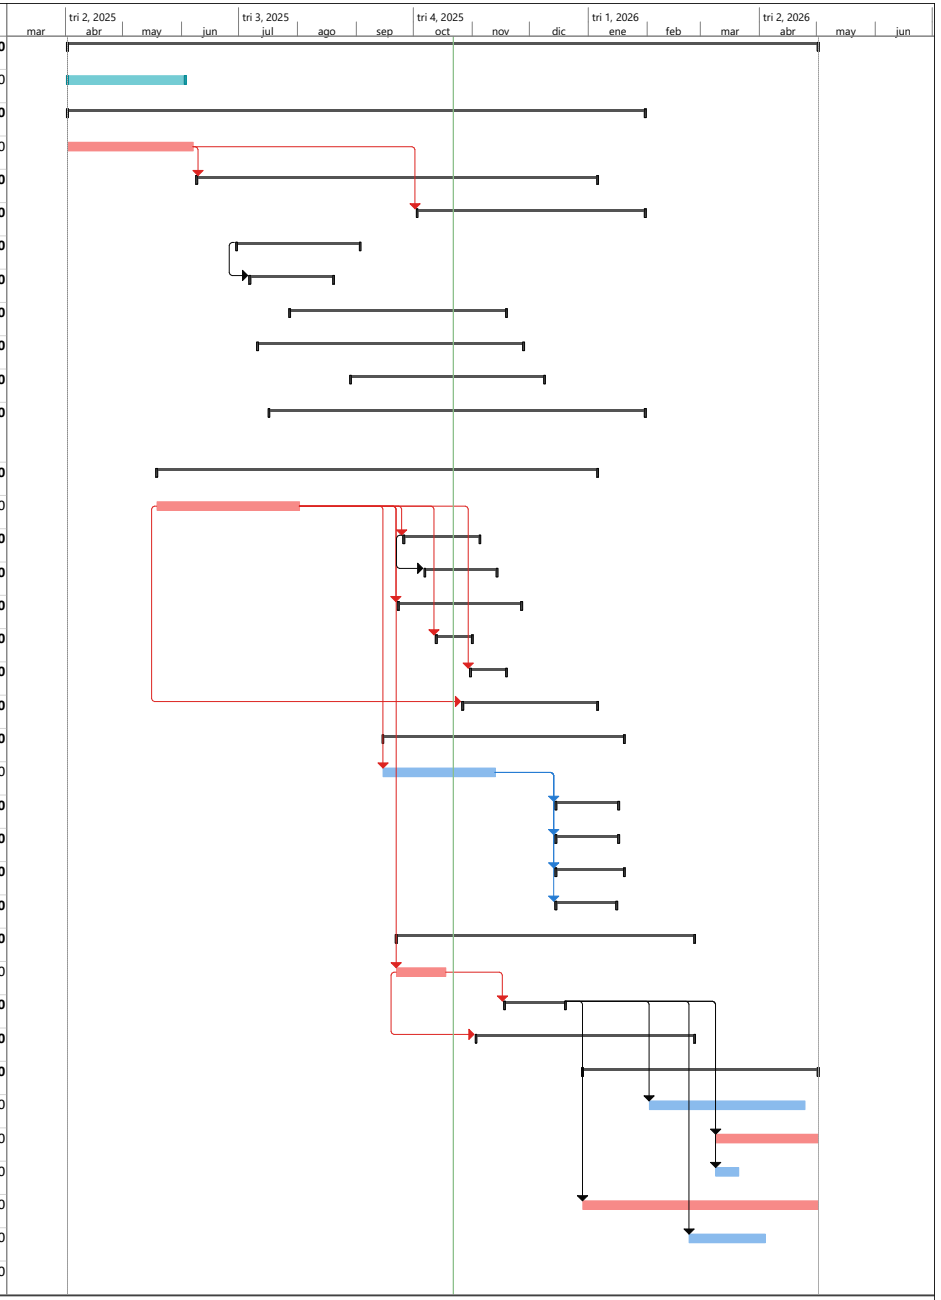

Proyecto: Programacion Genera
Fecha: mié 22/10/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual
