

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
1		**REMOTIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE APOYO A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA TORRE DE CONTROL DEL CACOM-1**	**190 días?**	**mié 9/04/25**	**lun 29/12/25**		
2		FIRMA DE CONTRA	1 día	mié 9/04/25	mié 9/04/25		
3		ACTA DE INICIO	1 día	mar 6/05/25	mar 6/05/25	2	
4		VISITA SITE SURVEY	2 días	jue 5/06/25	vie 6/06/25	3	
5		GENERACION ORDENES DE COMPRA	5 días	lun 9/06/25	vie 13/06/25	4	
6		TRANSPORTE A SITIO INSUMOS FABRICACIÓN NACIONAL	3 días	lun 16/06/25	mié 18/06/25	5	
7		ENTREGA E IMPORTACIÓN ISUMOS	10 días	lun 16/06/25	vie 27/06/25	5	
8		**REUBICACION RADIO ENLACE CONTROL REMOTO RADIO AYUDASDESMONT DE EQUIPOS EXISTENTES EN LA**	**14 días**	**sáb 1/11/25**	**mié 19/11/25**		
9		REMOVER LOS EQUIPOS EXISTENTES, INCLUYENDO EL RADIOENLACE, RCSU	2 días	sáb 1/11/25	lun 3/11/25	7;6	
10		EVALUAR EL ESTADO OPERATIVO DE CADA EQUIPO, DETERMINANDO SI ES	2 días	mar 4/11/25	mié 5/11/25	9	
11		EJECUTAR MANTENIMIENT CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN LOS EQUIPOS	2 días	jue 6/11/25	vie 7/11/25	10	
12		ACTUALIZAR EL HARDWARE, FIRMWARE Y SOFTWARE DE LOS EQUIPOS, SI APLICA,	1 día	lun 10/11/25	lun 10/11/25	11	
13		REALIZAR PRUEBAS DE OPERATIVIDAD PARA	1 día	mar 11/11/25	mar 11/11/25	12	
14		INSTALACIÓN LINEA DE TRANSMISIÓN	2 días	mié 12/11/25	jue 13/11/25	13	
15		INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DEL RADIOENLACE	1 día	vie 14/11/25	vie 14/11/25	14	
16		INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LA RCSU, RADIO	1 día	lun 17/11/25	lun 17/11/25	15	
17		INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LA RSU Y DEL CABLE DE COMUNICACIÓN CON LA RCSU	2 días	mar 18/11/25	mié 19/11/25	16	

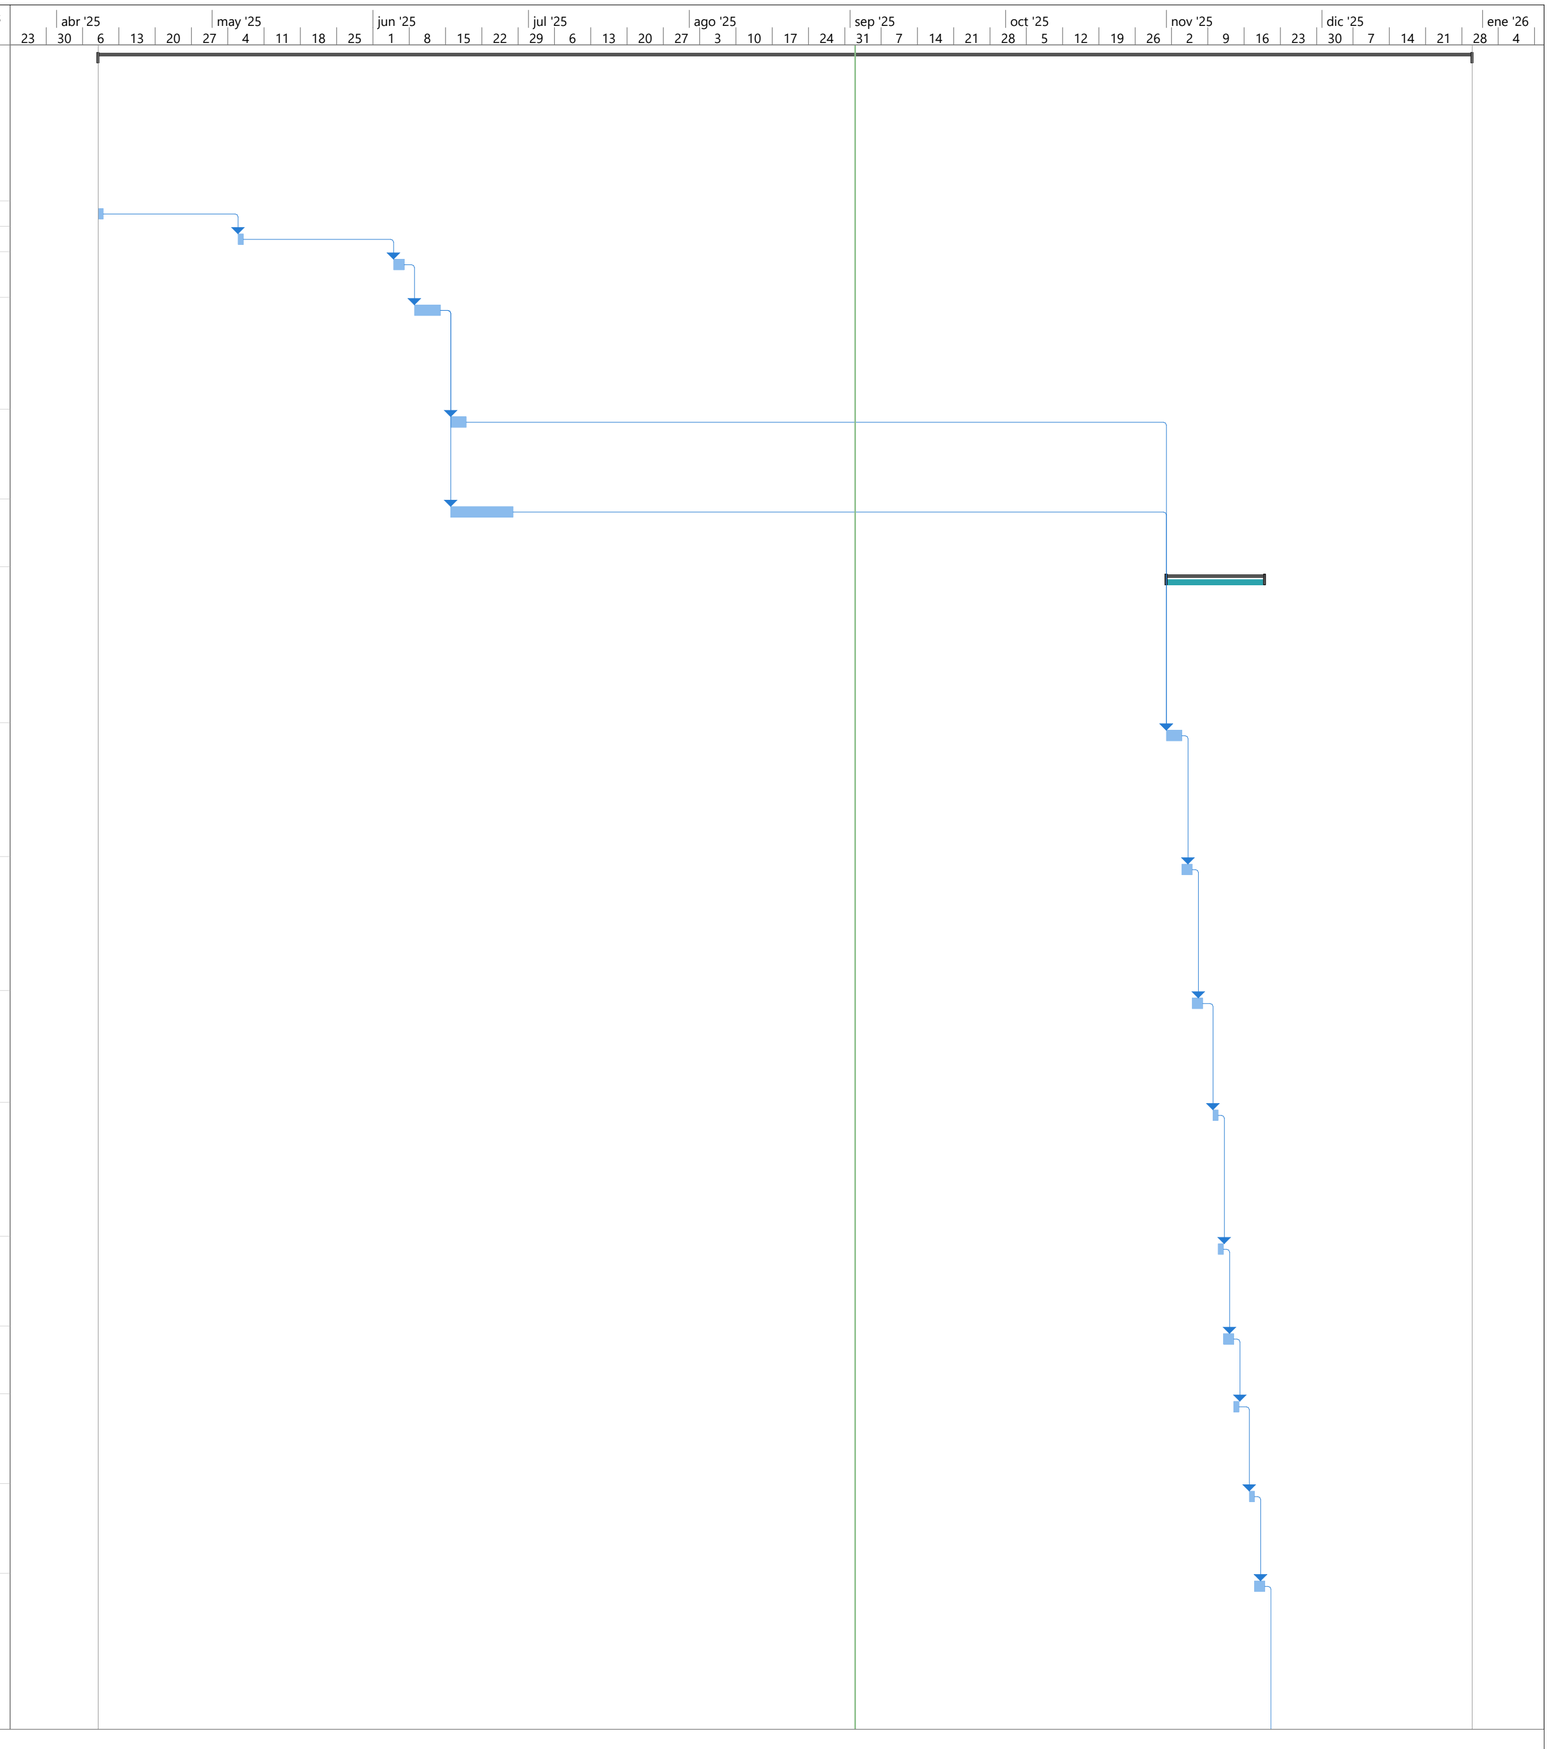

Proyecto: CRONOGRAMA TRAS
Fecha: mar 2/09/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
18		**REUBICACIÓN RADIOENLACE DE CONTROL REMOTOBARRERA DE FRENADO**	**8 días**	**jue 20/11/25**	**lun 1/12/25**		
19		DESMONTAJE DE EQUIPOS EN LA ANTIGUA	1 día	jue 20/11/25	jue 20/11/25	17	
20		SUMINISTRO DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN PARA LA CONEXIÓN DE EQUIPOS DE CONTROL REMOTO	2 días	vie 21/11/25	lun 24/11/25	19	
21		NSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DEL RADIOENLACE	2 días	mar 25/11/25	mié 26/11/25	20	
22		INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DEL CONTROL REMOTO BARRERAS DE FRENADO	3 días	jue 27/11/25	lun 1/12/25	21	
23		**REUBICACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACION DE METEOROLOGIA Y WORKSTATION PARA LA VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN**	**12 días**	**mar 2/12/25**	**mié 17/12/25**		
24		REMOVER EL RADIOENLACE, RACK AVIMET Y EQUIPOS ASOCIADOS, VERIFICANDO LA CONDICIÓN ACTUAL DE LOS EQUIPOS ASÍ COMO SU INTERCONEXIÓN	6 días	mar 2/12/25	mar 9/12/25	22	
25		INSTALACIÓN LINEA DE	3 días	mié 10/12/25	vie 12/12/25	24	
26		INSTALACIÓN EQUIPOS	3 días	lun 15/12/25	mié 17/12/25	25	
27		**REMOTIZACIÓN CONTROL REMOTO PLC**	**7 días?**	**jue 18/12/25**	**vie 26/12/25**		
28		DESMONTAJE DE LA PANTALLA DE CONTROL REMOTO DE LUCES DE PISTA Y EQUIPOS ANEXOS DE LA ANTIGUA	2 días	jue 18/12/25	vie 19/12/25	26	
29		INSTALACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO PANTALLA DE CONTROL REMOTO DE LUCES DE PISTA Y EQUIPOS ANEXOS EN LA NUEVA TORRE	1 día	lun 22/12/25	lun 22/12/25	28	

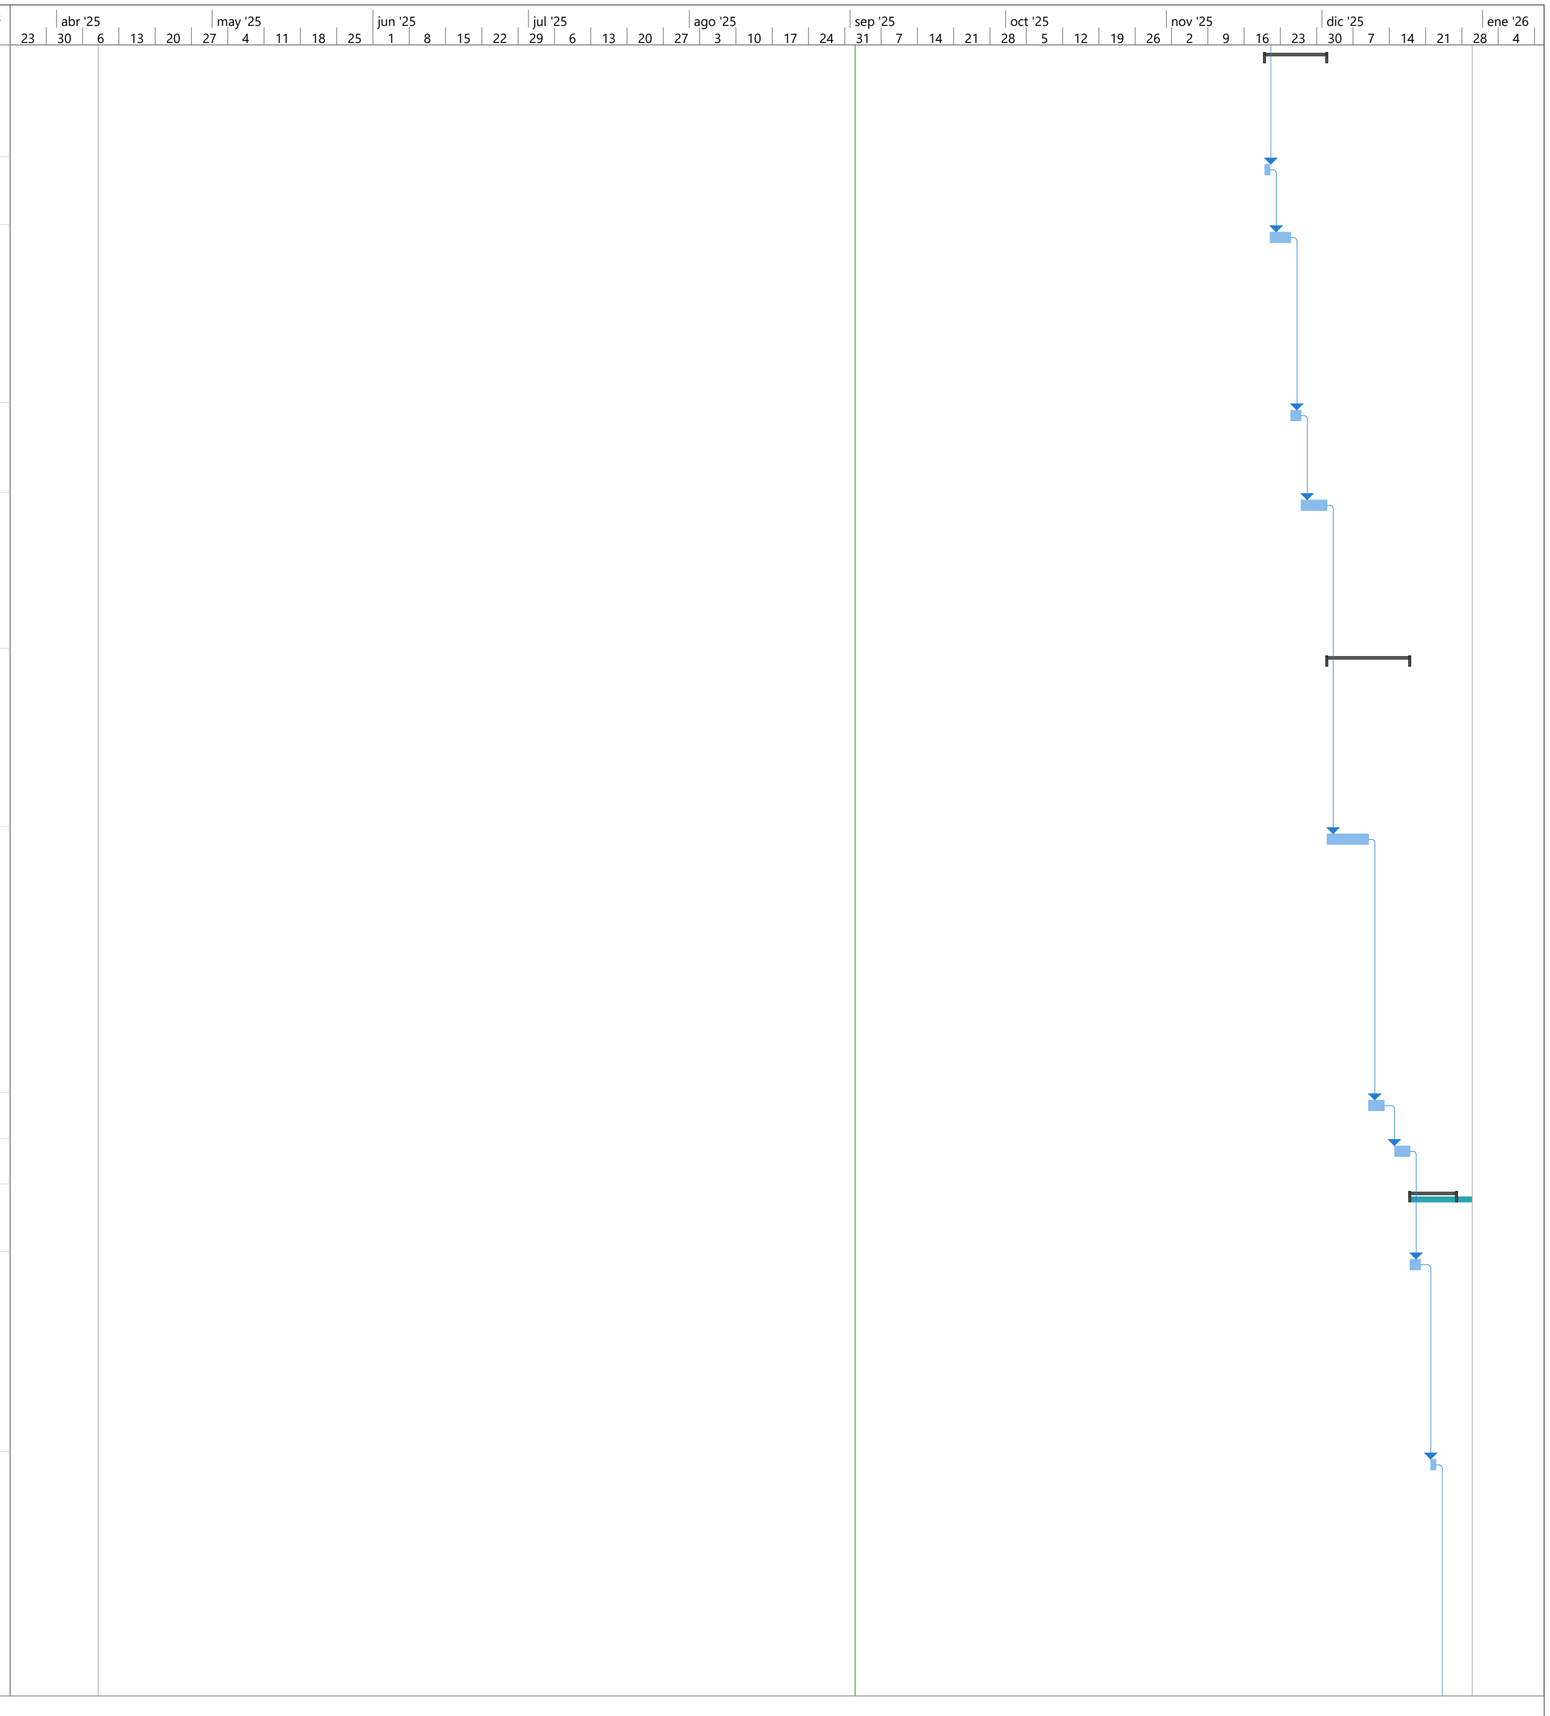

Proyecto: CRONOGRAMA TRAS
Fecha: mar 2/09/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
30		CONEXIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LA PANTALLA DE CONTROL REMOTO DE LUCES DE PISTA AL PLC EN LA SALA DE REGULADORES	1 día	mar 23/12/25	mar 23/12/25	29	
31		TRASLADO E INSTALACIÓN FARO DE	1 día	mié 24/12/25	mié 24/12/25	30	
32		INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE FARO GIRATORIO DE	1 día	jue 25/12/25	jue 25/12/25	31	
33		INTEGRACIÓN DEL CONTROL DE ENCENDIDO-APA DEL FARO A LA PANTALLA DE CONTROL REMOTO DE	1 día	vie 26/12/25	vie 26/12/25	32	
34		ENTREGA FINAL	2 días	vie 26/12/25	lun 29/12/25	32	



Proyecto: CRONOGRAMA TRAS
Fecha: mar 2/09/25

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	Progreso manual			
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite				
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Progreso				
