
Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**ETAPA 1 APROPIACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y ANÁLISIS LOGISTICO:**	**30 días?30**	**lun 1/09/25**	**sáb 4/10/25**
2		Firma del acta de inicio	1 día	lun 1/09/25	lun 1/09/25
3		Visitas de obra	8 días	lun 1/09/25	mar 9/09/25
4		Entrega de documentación	19 días	mar 9/09/25	mar 30/09/25
5		**ETAPA 2 - CONSTRUCCIÓN**	**76 días?**	**mié 1/10/25**	**vie 2/01/26**
6		**Ejecucion de actividades**	**72 días?**	**mié 1/10/25**	**sáb 27/12/25**
7		Localización y replanteo	2 días?	mié 1/10/25	jue 2/10/25
8		Excavacion manual en material común incluye retiro E=0.30 M	9 días?	mié 1/10/25	vie 10/10/25
9		Relleno en recebo común	7 días	sáb 11/10/25	lun 20/10/25
10		Concreto de 3000 psi para placa	40 días	lun 20/10/25	vie 5/12/25
11		Diseño y construccion de membrana tipo arquitectonica	40 días	mar 4/11/25	sáb 20/12/25
12		Construccion de cuneta	15 días	mar 18/11/25	jue 4/12/25
13		Demarcación del area del juego	5 días?	mar 9/12/25	sáb 13/12/25
14		Dotacion	5 días?	lun 22/12/25	sáb 27/12/25
15		Acta de entrega y liquidación del contrato	5 días?	sáb 27/12/25	vie 2/01/26

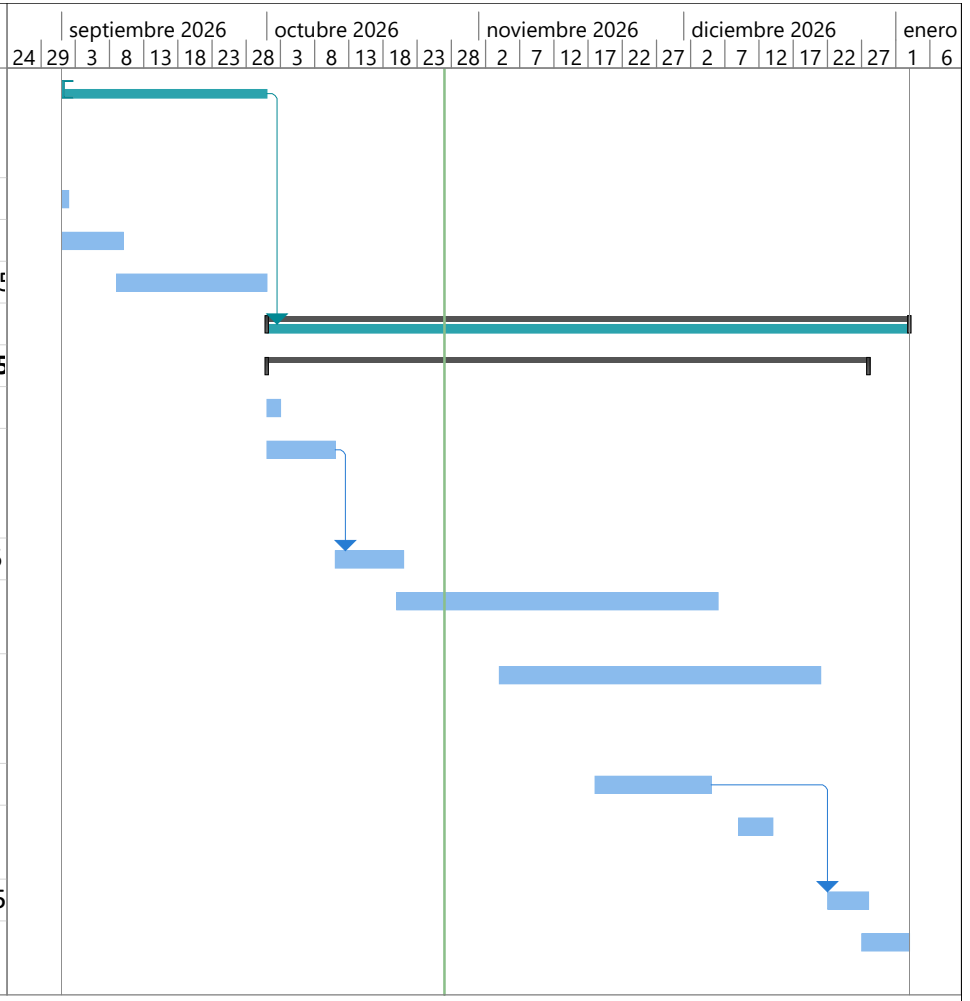

Proyecto: Cancha de Tejo
Fecha: lun 27/10/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual
