DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES RYV S.A.S

Nit: 901.432.414-8

Buenaventura, 25 de Noviembre de 2025

Señores
GRUPO DE GUARDACOSTAS DE LA AMAZONÍA ARMADA NACIONAL
Leticia, Amazonas

Asunto: SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO 012-ARC-GAMA-2025

Yo, **VLADIMIR RIASCOS VELASQUEZ** identificado con cedula de ciudadanía No. 94442017 Representante legal de **DISEÑOS Y CONSTRUCIONES RYV SAS con nit 901432414-8,** Por medio del presente documento se expone, de manera formal y detallada, la justificación de la solicitud de prórroga en relación con la ejecución de la consultoría y los factores que han incidido y afectado plazos establecidos en el cronograma de actividades del contrato No. **012-ARC-GAMA-2025,** que finaliza el 30 de noviembre de 2025. En las siguientes actividades de los ítem de la consultoría:

1. **Resistividad Eléctrica:** Durante la ejecución de esta actividad, el ingeniero eléctrico tuvo un incidente donde un virus informático ingreso en su computador, por lo cual se extraviaron se dañaron archivos y perdió gran parte de la información de cálculos y diseños ya realizados, el cual tomo tiempo valioso para realización del insumo a entregar.
2. **Diseños Hidráulicos:** esta Actividad es dependiente de la revisión y aprobación de la topografía realizada por parte de la entidad, como también de concertar las alternativas de solución y sumado a esto la verificación en sitio, esto ocasiono demoras en la entrega de insumo técnico por parte de los profesionales encargados de la entrega de esta actividad, de diseños que se están terminando de elaborar.
3. **Diseños Estructurales:** Durante la ejecución de esta actividad, los atrasos en los avances de estos Diseños Estructurales, son porque el ingeniero estructural le toco esperar los resultados de los estudios de suelos, teniendo en cuenta que en esta zona son pocas las empresas que realizan esta actividad, por las dificultades de acceso a esta zona y por lo cual los diseños y modelaciones de cálculos estructurales son dependientes de los resultados de los estudios suelos, por esta razón esta actividad retraso entregar a tiempo la información.

4. **Estudio de Suelos:** Durante la ejecución de esta actividad, los atrasos en los avances de los estudios de suelos, fueron por que en la cuidad de Leticia amazonas carece de laboratorios certificados y además someten a los clientes a turnos, razón por las cual los estudios se demoran considerablemente, y algunas pruebas, ensayos de laboratorios se realizan en la Capital de Bogotá, donde también nos tocó tomar un tiempo de espera prolongado.
5. **Levantamientos Topográficos:** Durante la ejecución de esta actividad, el día 16 de septiembre de 2025 a las 15:00 horas, en la ciudad de Barranquilla, el topógrafo fue asaltado, se le llevaron su equipo y herramientas de trabajo en el cual tenía la información topográfica. Este imprevisto ocasionó grandes atrasos en el proyecto, siendo así hubo que volver a tomar la información de campo en el Municipio de Leticia Amazonas , desde el día 20/09/2025 hasta 23/09/2025, motivo por el cual no logramos hacer este entregable Topográfico el día 25 de septiembre de 2025 y razón por la cual se entregó el 15 de octubre de 2025, teniendo un retraso de 15 días calendarios.

6. Las otras actividades como son: informes ambientales, presupuestos, cronogramas de obras, dependen netamente de las actividades principales para priorizar y entregar sus avances finales.

   Ya hemos reorganizado el cronograma de trabajo, ajustado las prioridades y asignando recursos adicionales para avanzar de manera más eficiente y completar el contrato. Propongo como nueva fecha de entrega el día **15/12/2025**, lo cual considero suficiente para terminar todas las actividades pendientes sin comprometer la calidad del insumo.

Quedo atento a su respuesta y a cualquier observación que tengan para formalizar esta prórroga de manera mutuamente satisfactoria.

Les agradezco su tiempo y consideración.

Cordialmente,



R.L VLADIMIR RIASCOS VELASQUEZ
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES RYV SAS

FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
FORMATO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

Fecha: 18/09/2025
Hora: 16:31
Departamento: Atlántico
Municipio: BARRANQUILLA

NÚMERO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

CASO NOTICIA:	080016109524202505347
DEPARTAMENTO:	08 - Atlántico
MUNICIPIO:	001 - BARRANQUILLA
ENTIDAD RECEPTORA:	61 - Policía Nacional
UNIDAD RECEPTORA:	0952 - SALA DE DENUNCIAS SIJIN DEATA
AÑO:	2025
CONSECUTIVO:	0534

TIPO DE NOTICIA

CONSECUTIVO:	DENUNCIA
DELITO REFERENTE:	HURTO. ART. 239 C.P.

MODO DE OPERACIÓN DEL DELITO:

GRADO DEL DELITO:	NINGUNO
LEY DE APLICABILIDAD:	Ley 906

AUTORIDADES

¿El usuario es remitido por una entidad?	SI
Fecha:	9/22/25 5:44 PM
¿Cúal?	POLICIA NACIONAL
Nombre de quien remite:	
Cargo:	

DATOS DEL DENUNCIANTE O QUERELLANTE

Primer Nombre:	SERGIO	Segundo Nombre:	ALEXANDER
Primer Apellido:	CABEZAS	Segundo Apellido:	LEON
Documento Identidad:	CEDULA DE CIUDADANIA	Numero Documento:	8572519

País Expedición:	Colombia	Depto Expedición:	ATLÁNTICO
Municipio Expedición:	PONEDERA		
Edad:	46	Género:	MASCULINO

Fecha Nacimiento:	16/04/1979		
País Nacimiento:	Colombia	Depto Nacimiento:	TOLIMA
Municipio Nacimiento:	IBAGUÉ		

Profesion:	TECNICO PROFESIONAL	Oficio:	CONSTRUCCION
Estado Civil:	SOLTERO/A	Nivel Educativo:	TECNICO O TECNOLOGO

País Residencia:	Colombia	Depto Residencia:	Atlántico
Municipio Residencia:	BARRANQUILLA	Barrio:	[DESCONOCIDO]
Dirección Notificación:	carrera 16 n 45c -28	Teléfono Residencia:	[DESCONOCIDO]
Teléfono Móvil:	3505809968	Correo Electrónico:	spyeix@hotmail.com

País Oficina:	[DESCONOCIDO]	Depto Oficina:	[DESCONOCIDO]
Municipio Oficina:	[DESCONOCIDO]	Barrio:	[DESCONOCIDO]
Dirección Oficina:	[DESCONOCIDA]	Teléfono Oficina:	[DESCONOCIDO]
Entidad donde labora:	[DESCONOCIDA]		

Estimación de los daños y perjuicios (en delitos contra el patrimonio) 3980000

Relacion con los Indiciados:

[DESCONOCIDO]

DATOS DE LAS VICTIMAS

Se informa a la victima el contenido de los artículos 11, 136 y 137 del Código de Procedimiento Penal, en cuanto a la información que debe conocer en su calidad de victima y el derecho a intervenir en todas las fases de la actuación penal de conformidad con las reglas señaladas en la norma procesal penal.

Primer Nombre:	SERGIO	Segundo Nombre:	ALEXANDER
Primer Apellido:	CABEZAS	Segundo Apellido:	LEON
Documento Identidad:	CEDULA DE CIUDADANIA	Numero Documento:	8572519
País Expedición:	Colombia	Depto Expedición:	ATLÁNTICO
Municipio Expedición:	PONEDERA		
Edad:	46	Género:	MASCULINO

Fecha Nacimiento:	16/04/1979		
País Nacimiento:	Colombia	Depto Nacimiento:	TOLIMA
Municipio Nacimiento:	IBAGUÉ		
Profesion:	TECNICO PROFESIONAL	Oficio:	CONSTRUCCION
Estado Civil:	SOLTERO/A	Nivel Educativo:	TECNICO O TECNOLOGO
País Residencia:	Colombia	Depto Residencia:	Atlántico
Municipio Residencia:	BARRANQUILLA	Barrio:	[DESCONOCIDO]
Dirección Notificación:	carrera 16 n 45c -28	Teléfono Residencia:	[DESCONOCIDO]
Teléfono Móvil:	3505809968	Correo Electrónico:	spyeix@hotmail.com
País Oficina:	[DESCONOCIDO]	Depto Oficina:	[DESCONOCIDO]
Municipio Oficina:	[DESCONOCIDO]	Barrio:	[DESCONOCIDO]
Dirección Oficina:	[DESCONOCIDA]	Teléfono Oficina:	[DESCONOCIDO]
Entidad donde labora:	[DESCONOCIDA]		

Caracteristicas Morfocromaticas:
[DESCONOCIDA]

Relacion con los Denunciantes:
[DESCONOCIDA]

Datos relacionados con padres y familiares:

DATOS DE LOS INDICIADOS

En Averiguación? SI

DATOS DE LOS TESTIGOS

DATOS RELACIONADOS CON BIENES

DATOS SOBRE LOS HECHOS

Se hace constar que el denunciante ha sido informado sobre: la obligación legal que tiene toda persona mayor de 18 años de denunciar cualquier hecho de que tenga conocimiento y que las autoridades deban investigar de oficio; de la exoneración del deber de denunciar contra si mismo, contra su conyugue o compañero permanente, parientes en 4º grado de consanguinidad, de afinidad o civil, o hechos que haya conocido en el ejercicio de una actividad amparada por el secreto profesional; que la presente denuncia se realiza bajo la gravedad de juramento y acerca de las sanciones penales impuestas a quien incurra en falsa denuncia. (Artículos 67,68,69 del C.P.P. y 435 – 436 C.P.).

FECHA DE COMISIÓN DE LOS HECHOS: 16/09/2025

HORA: 15.00

Para delitos de ejecucion continuada

FECHA INICIAL DE COMISIÓN: 16/09/2025

HORA: 15.00

FECHA FINAL DE COMISIÓN:

HORA:

Lugar de comisión de los hechos

Departamento:	Atlántico	Municipio:	MALAMBO
Zona Localidad:		Barrio:	
Dirección:	08433 KR 27 CON CL 17 C KR 27 CL 17C	Sitio Especifico:	VIAS PUBLICAS

¿Uso de Armas? SI ¿Cúal? ARMA DE FUEGO

¿Uso de Sustancias Toxicas? NO

Relato de los hechos

pocos minutos de salir de aeropuerto de barranquilla despues de haber llegado de un viaje me dispuse a tomar transporte para mi lugar de residencia y en el camino fui abordado por dos sujetos en motocicleta, los cuales me quitaron un bolso que contenia equipos satelitales de topografia, las personas me abordaron en una motocicleta negra marca boxer, aunque fui despojado de un maletin con equipos de topografia, los delincuente durante el forcejeo lograron llevarse un colector de datos avaluado en aproximadamente 4 millones de pesos. Relación de bienes hurtados:OTROS ELEMENTOS: EQUIPOS DE TOPOGRAFIA-OTROS ELEMENTOSTIPO_BIEN: OTROS ELEMENTOSCLASE_BIEN: EQUIPOS DE TOPOGRAFIA-OTROS ELEMENTOSMARCA: XIAOMICANTIDAD: 1VALOR: 3980000CARAC_BIEN: colector de datos android s50BIEN_ASEGURADO: NO. Relación de bienes bicicletas:. Relación de celulares hurtados:. Relación de vehiculos hurtados: N/A

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL CASO:

Firmas

Denunciante	Autoridad Receptora

Bogotá D.C. Noviembre 25 de 2025

Señores
GRUPO DE GUARDACOSTAS DE LA AMAZONIA ARMADA NACIONAL
Leticia Amazonas.

Respetados Señores:

Yo, **HUGO HERNANDO BARRAGAN TORRES**, ingeniero Civil, con Matricula 2520206362 CND, en mi condición de Ingeniero Geotecnista, realizo los Informes Geotécnicos por prestación de Servicios al Laboratorio de Suelos FUZ, de propiedad del Señor German Gutiérrez Báez, Laboratorio que se encuentra Ubicado en la Ciudad de Leticia, en la Carrera 1ª No. 20-81 Barrio Costa Rica.

EL Ingeniero **VLADIMIR RIASCOS VELASQUEZ**, Representante Legal de la Firma **DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES R & V SAS**. Me solicito le informara la razón que originó la demora en a entrega de los Informes Geotécnicos para los Estudios pertinentes al Contrato de Consultoría 012-ARC-GAMA-2025, para justificar el atraso en el cronograma de Actividades del Contrato ante el Grupo de Guardacostas

Al respecto le manifesté que en la Ciudad de Leticia solo hay un Laboratorio de Suelos y los equipos y personal con el que cuenta el laboratorio no son suficientes para analizar tantas muestras para que se puedan satisfacer las necesidades de varios clientes en corto tiempo, razón por la cual se ven obligados a someten a los Clientes a un turno especifico; fue por eso que los resultados de las muestras analizadas para este contrato me las fueron enviando, parcialmente desde el día 20 de Octubre del año en curso y mientras organice los resultados de la muestras para cada Frente, inicie la elaboración de los Informes desde el día 23 hasta día 27 de Octubre, fechas que quedaron consignadas en los Informes; una ves terminados los Informes se los fui enviando formalmente a la firma DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES R & V SAS, desde el día 28 de Octubre hasta el día 1 de Noviembre del año en curso. Pero el cronograma de firma DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES R & V SAS tenía como fecha de entrega para esta actividad el día 29 de septiembre de 2025 iniciando con atraso de este entregable de 24 días.

Cordialmente,



HUGO HERNANDO BARRAGAN TORRES
C.C. 11332347 de Zipaquirá

SEÑORES

AQUIEN LE INTERESE

Asunto: certificación de servicio

APM INGENIERÍA LTDA con el NIT **900.297.511-1,** certifica que desde el 8 al el 20 de octubre de 2025 se estuvo arreglando y recuperando información , del computador **HP LAPTON MODEL 15-DB0004la** del **Ingeniero Fernando Truque** con c.c. 16’495.135, su computador presentó un incidente de seguridad informática derivado de la propagación de un virus tipo troyano, el virus que afectó aproximadamente más del 50% de las estaciones de trabajo, generando fallas en el acceso a las aplicaciones importantes , causando bloqueo de archivos de trabajo y daños programas de diseños


Para verificar información verificar llamar al teléfono 319 267 5729

Se hace esta constancia a los 25 días del mes de noviembre del 2025 en Buenaventura valle.

APM INGENIERIA LTDA.
900.297.511-1

ALVARO MOSQUERA ORTIZ
GERENTE
APM INGENIERIA LTDA
NIT 900.297.511-1


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**CRONOGRAMA FINAL DE CONSUTORIA**			
2		INFORME VISITA TÉCNICA	2 días	vie 12/09/25	lun 15/09/25
3		**FRENTE No. 1 - PROTECCIÓN DE LA LADERA**			
4		LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO – INFORME PRELIMINAR	10 días	vie 12/09/25	jue 25/09/25
5		LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO – INFORME FINAL	10 días	jue 25/09/25	mié 8/10/25
6		EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA – INFORME PRELIMINAR	54 días	mar 16/09/25	vie 28/11/25
7		EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA – INFORME FINAL	44 días	mar 30/09/25	vie 28/11/25
8		EVALUACIÓN Y DISEÑOS HIDRÁULICOS	50 días	lun 29/09/25	vie 5/12/25
9		DISEÑOS ESTRUCTURALES	50 días	lun 29/09/25	vie 5/12/25
10		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PRESUPUESTO	31 días	sáb 25/10/25	vie 5/12/25
11		CRONOGRAMA DE OBRA.	31 días	sáb 25/10/25	vie 5/12/25
12		PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA OBRA.	48 días	mié 1/10/25	vie 5/12/25
13		**FRENTE No. 2 – ALOJAMIENTOS MILITARES**			
14		LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO – INFORME PRELIMINAR	10 días	vie 12/09/25	jue 25/09/25
15		LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO – INFORME FINAL	15 días	jue 25/09/25	mié 15/10/25
16		EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA – INFORME PRELIMINAR	54 días	mar 16/09/25	vie 28/11/25
17		EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA – INFORME FINAL	44 días	mar 30/09/25	vie 28/11/25
18		DISEÑOS ESTRUCTURALES	50 días	lun 29/09/25	vie 5/12/25
19		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PRESUPUESTO	31 días	sáb 25/10/25	vie 5/12/25

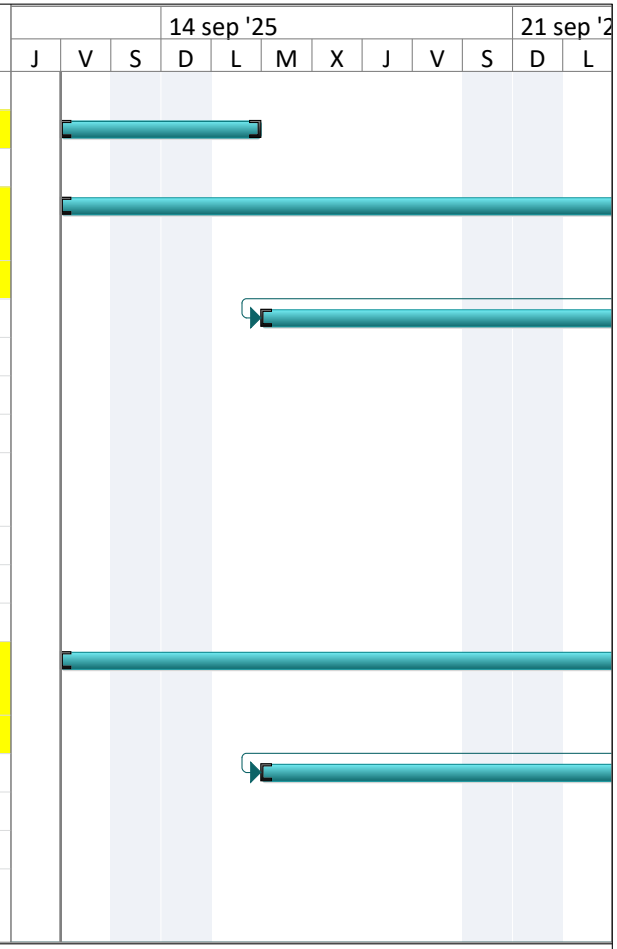

Proyecto: 012-ARC- CRONOGRAM
Fecha: jue 20/11/25


Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Fecha límite
Progreso

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
20		CRONOGRAMA DE OBRA.	31 días	sáb 25/10/25	vie 5/12/25
21		PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA OBRA.	48 días	mié 1/10/25	vie 5/12/25
22		ESTUDIOS DE RESISTIVIDAD ELÉCTRICA DEL TERRENO	56 días	vie 12/09/25	vie 28/11/25
23		**FRENTE No. 3 – ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR EN LETICIA**			
24		LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO – INFORME FINAL	30 días	vie 12/09/25	jue 23/10/25
25		EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA – INFORME FINAL	54 días	mar 16/09/25	vie 28/11/25
26		ESTUDIOS DE RESISTIVIDAD ELÉCTRICA DEL TERRENO	56 días	vie 12/09/25	vie 28/11/25
27					

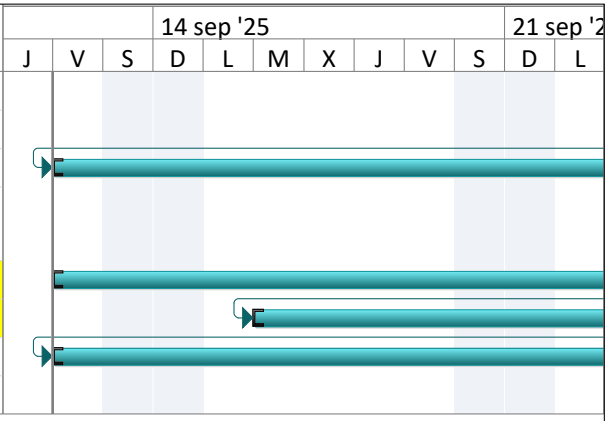


Proyecto: 012-ARC- CRONOGRAM
Fecha: jue 20/11/25

Tarea		Resumen inactivo	
División		Tarea manual	
Hito		Sólo duración	
Resumen		Informe de resumen manual	
Resumen del proyecto		Resumen manual	
Tareas externas		Sólo el comienzo	
Hito externo		Sólo fin	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Progreso	

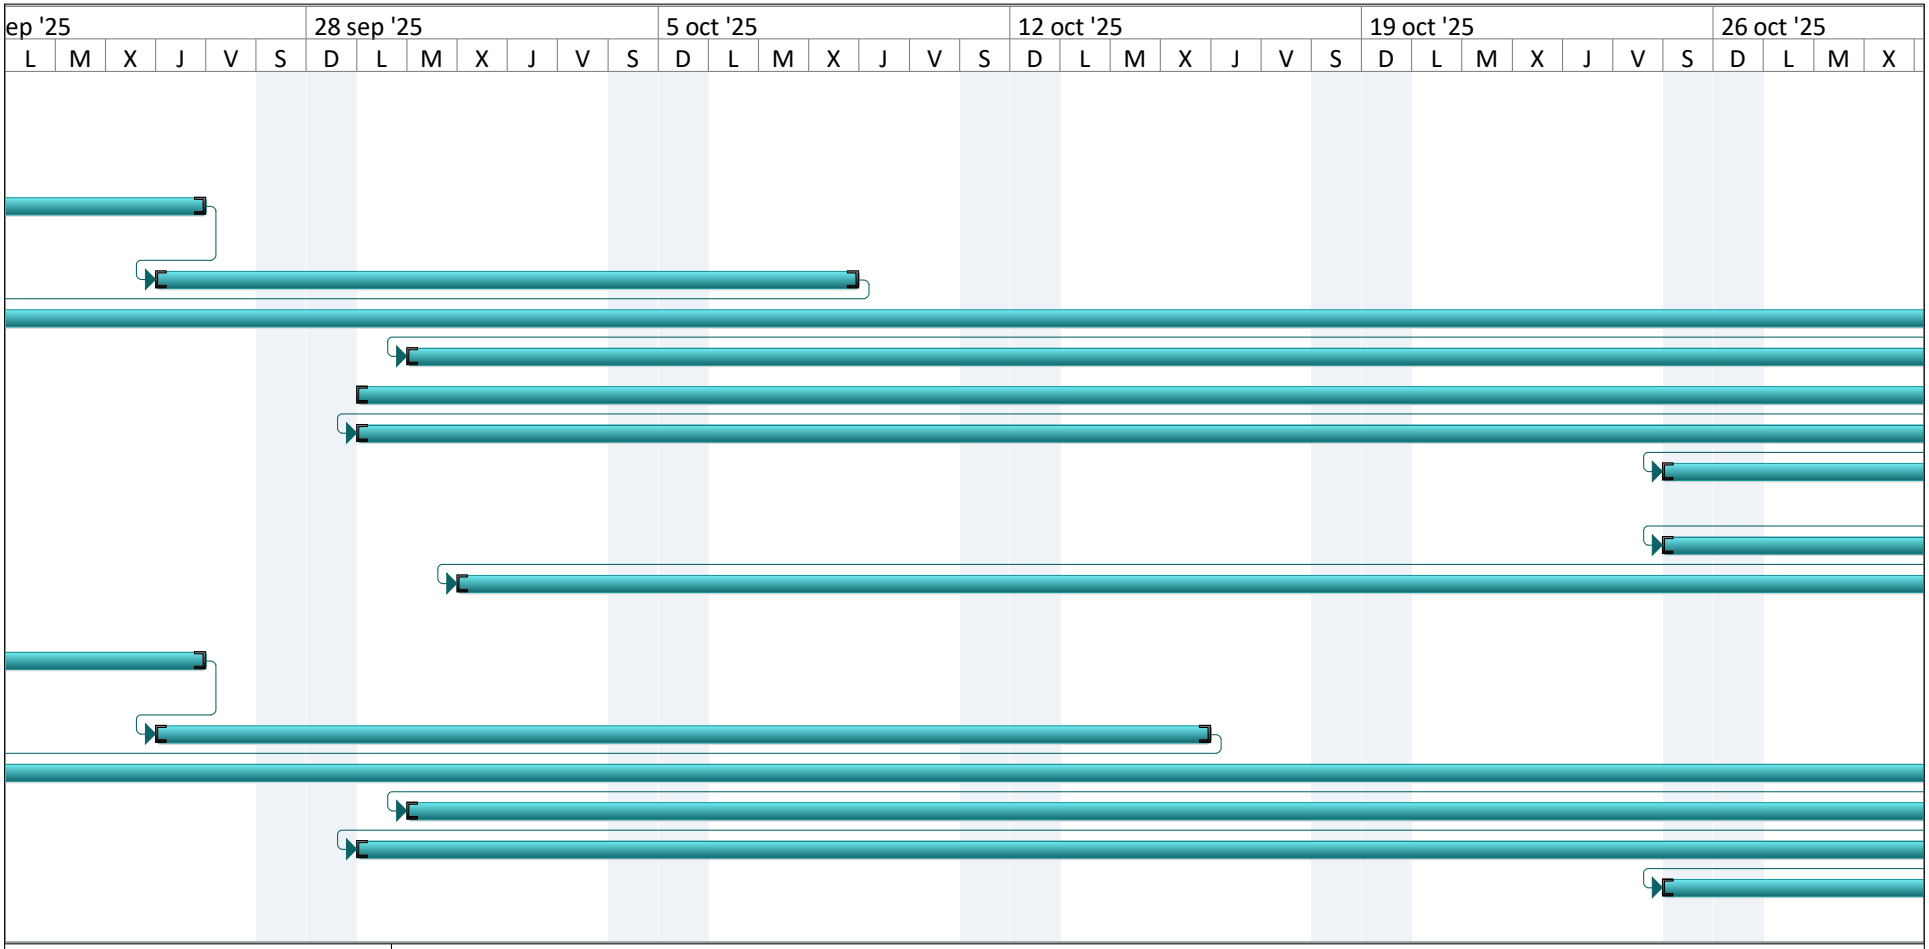


Proyecto: 012-ARC- CRONOGRAM
Fecha: jue 20/11/25

Tarea		Resumen inactivo	
División		Tarea manual	
Hito		Sólo duración	
Resumen		Informe de resumen manual	
Resumen del proyecto		Resumen manual	
Tareas externas		Sólo el comienzo	
Hito externo		Sólo fin	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Progreso	

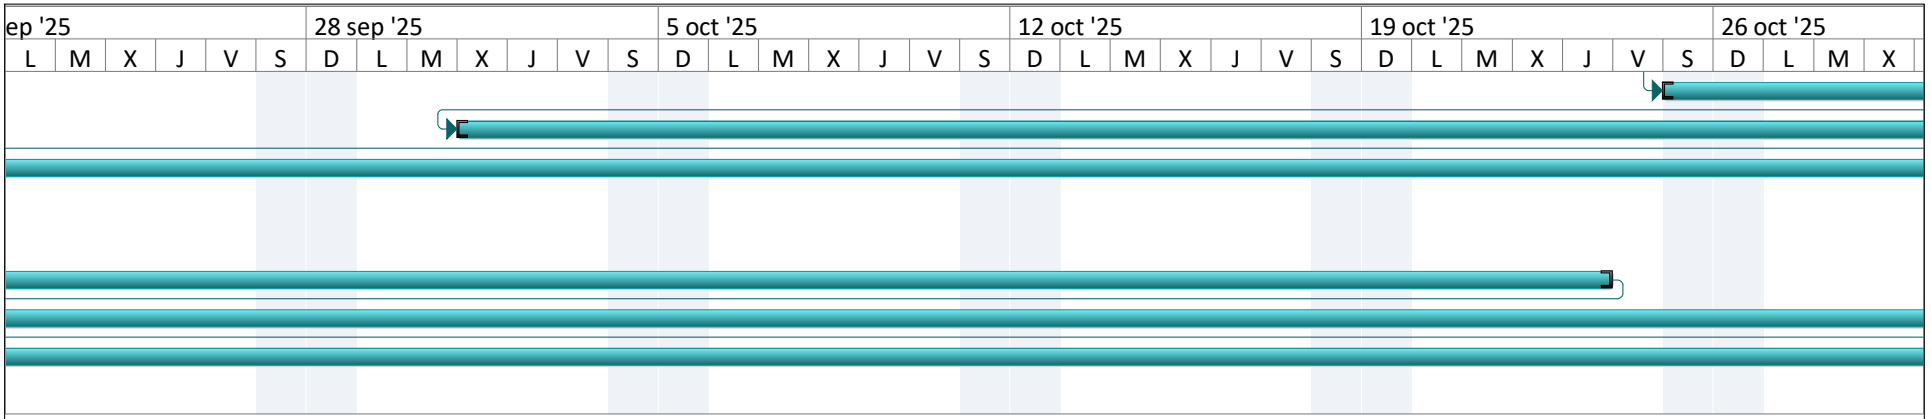


Proyecto: 012-ARC- CRONOGRAM
Fecha: jue 20/11/25

Tarea		Resumen inactivo	
División		Tarea manual	
Hito		Sólo duración	
Resumen		Informe de resumen manual	
Resumen del proyecto		Resumen manual	
Tareas externas		Sólo el comienzo	
Hito externo		Sólo fin	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Progreso	

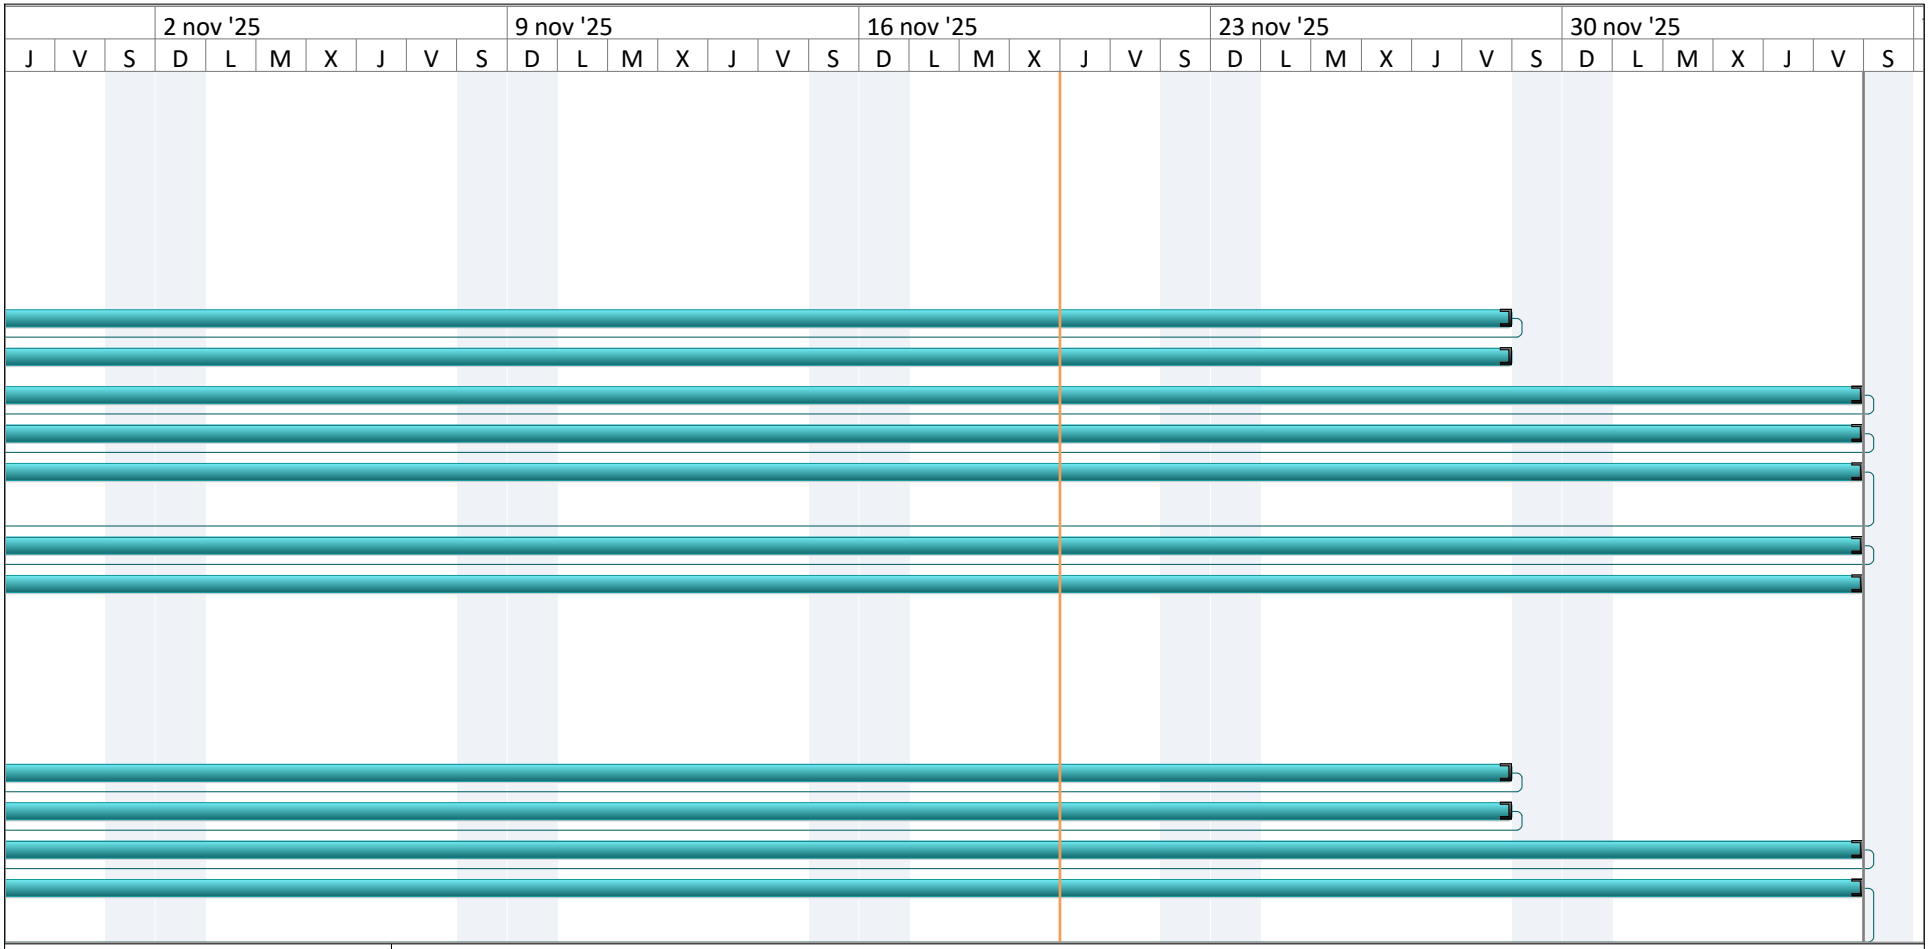

Proyecto: 012-ARC- CRONOGRAM
Fecha: jue 20/11/25

Tarea		Resumen inactivo	
División		Tarea manual	
Hito		Sólo duración	
Resumen		Informe de resumen manual	
Resumen del proyecto		Resumen manual	
Tareas externas		Sólo el comienzo	
Hito externo		Sólo fin	
Tarea inactiva		Fecha límite	
Hito inactivo		Progreso	

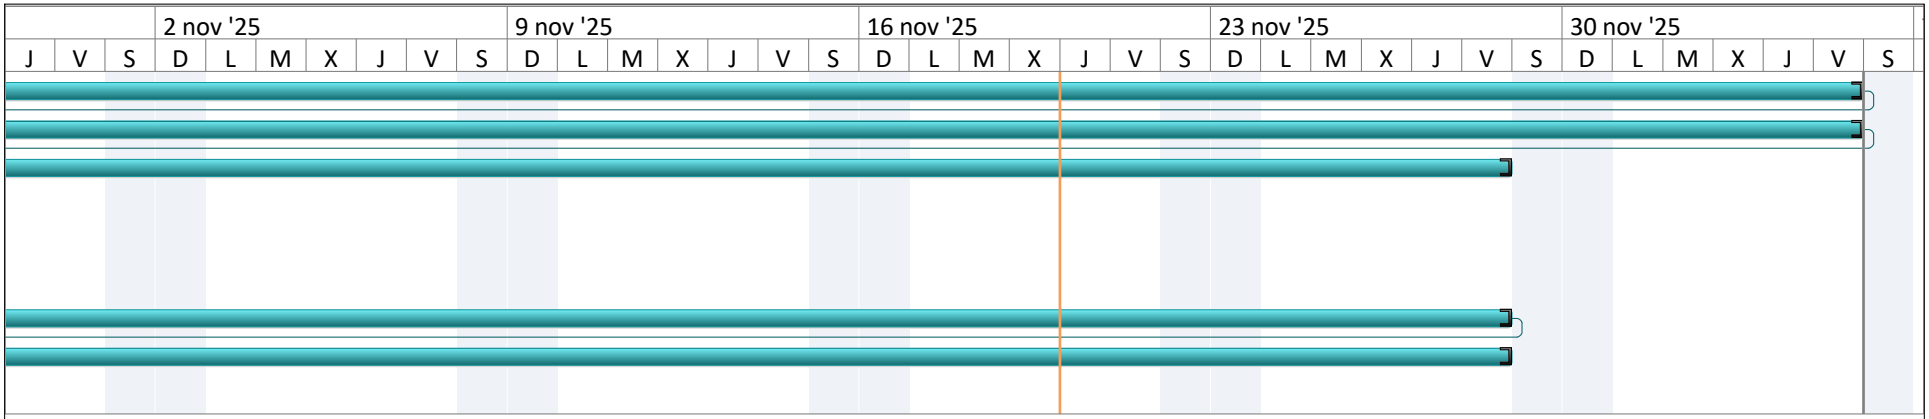

Proyecto: 012-ARC- CRONOGRAM Fecha: jue 20/11/25	Tarea	Resumen inactivo	
	División	Tarea manual	
	Hito	Sólo duración	
	Resumen	Informe de resumen manual	
	Resumen del proyecto	Resumen manual	
	Tareas externas	Sólo el comienzo	
	Hito externo	Sólo fin	
	Tarea inactiva	Fecha límite	
	Hito inactivo	Progreso	
