	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISION E INTERVENTORIA	**Codigo: F-PCT-008**
		Versión: 10
		Hoja 1 de 1
Proceso de Contratacion		**Fecha Aprobación: 15/12/2022**

FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME: 16/11/2025 — **ESTADO DEL CONTRATO: EN EJECUCIÓN**

CONTRATO No: 01166 DE 2025 — **TIPO DE CONTRATO: CONSULTORIA**

CONTRATISTA: CONSORCIO DRMI RIO MINERO 2025

Nit o C.C. No. 901.962.124-0 — **No. DE INFORME: 01**

OBJETO: FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO -DRMI DEL RÍO MINERO Y SUS ZONAS ALEDAÑAS Y FORMULACION DEL PLAN DE MANEJO DEL PARQUE NATURAL REGIONAL SERRANIA DE LAS QUINCHAS EN JURISDICCIÓN DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER

VALOR INICIAL: $ 2.448´612.900 — **VALOR ADICIONAL: $ 0**

PLAZO CONTRATO: 12 MESES — **PLAZO ADICIONAL:** N.A

SUPERVISOR EDNA ROCÍO CASTELLANOS MARTÍNEZ

CARGO SUPERVISOR: Subdirección de Planeación y ordenamiento territorial

INTERVENTOR: GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS

FECHA INICIO DEL CONTRATO: 15/10/2025

FECHA DE SUSPENSIÓN:	NO APLICA	X	**TERMINO DE LA SUSPENSION:**	
FECHA DE REINICIO:	NO APLICA	X	**TIEMPO DE PRORROGAS:**	
FECHA DE TERMINACIÓN 1:			**FECHA DE TERMINACIÓN 2:**	

PERIODO DEL INFORME: 15 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE 2025

ALCANCES O ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO CONTRACTUAL

INFORME SUPERVISION O INTERVENTORIA | **INTERVENTORÍA** | NOVIEMBRE 15 DE 2025

AVANCES DE EJECUCIÓN

ALCANCE	PRESUP. CONTRATO	VALOR ADICIONAL	VALOR PAGADO	PLAZO DEL CONTRATO	TIEMPO EJECUTADO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO PAGADO %
FORMULAR EL PLAN DE MANEJO DEL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO DEL RÍO MINERO Y SUS ZONAS ALEDAÑAS	**$ 1.794.217.138**						
Formular la fase de aprestamiento y definir la plataforma técnica, social y logística del Distrito Regional de Manejo Integrado del Río Minero y sus zonas aledañas	$ 287.915.115	$ -	$ -	12 MESES	1 MES	4,33%	$ -
Elaborar la fase de formulación del DRMI del Río minero y sus zonas aledañas	$ 1.349.585.160	$ -	$ -	12 MESES	1 MES	0,00%	$ -
Elaborar la fase de formalización del DRMI del río minero y sus zonas aledañas y su estructura ecológica principal	$ 78.358.433	$ -	$ -	12 MESES	1 MES	0,00%	$ -
Elaborar la fase de seguimiento y monitoreo al plan de manejo del DRMI del río minero y sus zonas aledañas	$ 62.686.744	$ -	$ -	12 MESES	1 MES	0,00%	$ -
Elaborar retroalimentación al plan de manejo del DRMI del río minero y sus zonas aledañas	$ 15.671.686	$ -	$ -	12 MESES	1 MES	0,00%	$ -
FORMULAR EL PLAN DE MANEJO DEL PARQUE NATURAL REGIONAL SERRANÍA DE LAS QUINCHAS	**$ 654.395.762**						
Elaborar la fase de aprestamiento y definir la plataforma técnica, social y logística del PNR Serranía de las Quinchas	$ 123.724.335	$ -	$ -	12 MESES	1 MES	4,24%	$ -
Elaborar la fase de formulación del Parque Natural Regional – PNR- Serranía de las Quinchas.	$ 452.313.000	$ -	$ -	12 MESES	1 MES	0,00%	$ -
Elaborar la fase de formalización del Parque Natural Regional – PNR- Serranía de las Quinchas	$ 39.179.216	$ -	$ -	12 MESES	1 MES	0,00%	$ -
Elaborar la fase de seguimiento y monitoreo al plan de manejo del Parque Natural Regional – PNR- Serranía de las Quinchas	$ 30.472.722	$ -	$ -	12 MESES	1 MES	0,00%	$ -
Elaborar retroalimentación al plan de manejo del Parque Natural Regional – PNR- Serranía de las Quinchas.	$ 8.706.489	$ -	$ -	12 MESES	1 MES	0,00%	$ -
TOTAL	**$ 2.448.612.900**	**$ -**	**$ -**	**12 MESES**	**1 MES**	**8,56%**	**$ -**

Acta No.	CONCEPTO (Inicio,prorroga, Suspen, Reincio,etc)	FECHA DEL ACTA	POLIZA	FECHA TERMINACION DEL ACTA	VALORES			
					VALOR PAGADO	SALDO POR PAGAR	AMORTIZADO	PAGOS ACUMULADOS
1	Acta de Inicio	15/10/2025		14/10/2026	$ -	$ 2.448.612.900	$ -	$ -

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES

ACTIVIDAD PROYECTADA	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD EJECUTADA	VALOR PROYECTADO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO
100,00%	8,62%	8,56%	$ 2.448.612.900	$ 211.137.751	$ 209.716.234
FISICO			FINANCIERO		

FIRMA INTERVENTOR

ING. DIANA CAROLINA RAMOS

Representantel Legal

GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS

	INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISION E INTERVENTORIA	Codigo: F-PCT-008
		Versión: 10
		Hoja 1 de 1
Proceso de Contratacion		Fecha Aprobación: 15/12/2022

ANEXO: SOPORTE DE AVANCE


1. Fase Aprestamiento DRMI
https://drive.google.com/drive/folders/1GgBhattl7YFlnPHZUOkc2iB5ezBlfnGO?usp=drive_link
2. Fase de Aprestamiento PNR
https://drive.google.com/drive/folders/1qEGGzA3TJneYfNE0veTuxN5hmEIYNfy-?usp=sharing
3. Actas de seguimiento al proyecto con grabaciones
https://drive.google.com/drive/folders/1-YvrNfC95QQp3rzpwLSI18D6QGmtwHIz?usp=drive_link
4. Seguimiento Observaciones de interventoria a entregables del consultor
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v5E2MrdHCjhJz45RyBk4VA9Sx6G4gYwX/edit?usp=drive_link&ouid=118086554094917698687&rtpof=true&sd=true
5. Correspondencia del proyecto
https://drive.google.com/drive/folders/1KF6fDdBJQTnRix4Cu-QqfB7er5UgI9Fp?usp=drive_link
6. Control de Correspondencia del proyecto
https://drive.google.com/drive/folders/1pRKlJgmFres0nyQLu6xDK9J_oYV_dNgM?usp=drive_link
7. Plan de trabajo -PDT versión No1
https://drive.google.com/drive/folders/1BvLc9HmP7KXAfV7n0wRywfRW8436JwpB?usp=drive_link
8. Informe de avance entragado por el consutlor al mes 1
https://drive.google.com/file/d/1imob26U7cke-pSIpQaZXAu4q5DLd5CVL/view?usp=drive_link

Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve el control de ingreso o asistencia, lo contacte consulte la información registrada en otras bases de datos o archivos de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, adelante trámites ante autoridades y atienda requerimientos de entidades públicas o privadas y, en general, para que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS cumpla las demás finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en http://cas.gov.co, el cual declara haber leído previamente al otorgamiento de la autorización.

Como titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. El responsable del tratamiento es la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil, Santander PBX: (57 7)723 8925, 7240765 correo electrónico: contactenos@cas.gov.co

ANEXO 1 - (Ind. Fisico y Financiero) FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO -DRMI DEL RÍO MINERO Y SUS ZONAS ALEDAÑAS Y FORMULACION DEL PLAN DE MANEJO DEL PARQUE NATURAL REGIONAL SERRANIA DE LAS QUINCHAS EN JURISDICCIÓN DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER - - No. CM2-015-2025

DURACION	MES 1			MES 2			MES 3					MES 4				MES 5				MES 6				MES 7				MES 8				MES 9				MES 10				MES 11				MES 12					
DRMI DEL RÍO MINERO CM2-015-2025	15/10/25	20/10/25	27/10/25	03/11/25	10/11/25	17/11/25	24/11/25	01/12/25	08/12/25	15/12/25	22/12/25	29/12/25	05/01/26	12/01/26	19/01/26	26/01/26	02/02/26	09/02/26	16/02/26	23/02/26	02/03/26	09/03/26	16/03/26	23/03/26	30/03/26	06/04/26	13/04/26	20/04/26	27/04/26	04/05/26	11/05/26	18/05/26	25/05/26	01/06/26	08/06/26	15/06/26	22/06/26	29/06/26	06/07/26	13/07/26	20/07/26	27/07/26	03/08/26	10/08/26	17/08/26	24/08/26	31/08/26	07/09/26	14/09/26	21/09/26	28/09/26	05/10/26	14/10/26
$ 2.448.612.900	SEM 0	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6	SEM 7	SEM 8	SEM 9	SEM 10	SEM 11	SEM 12	SEM 13	SEM 14	SEM 15	SEM 16	SEM 17	SEM 18	SEM 19	SEM 20	SEM 21	SEM 22	SEM 23	SEM 24	SEM 25	SEM 26	SEM 27	SEM 28	SEM 29	SEM 30	SEM 31	SEM 32	SEM 33	SEM 34	SEM 35	SEM 36	SEM 37	SEM 38	SEM 39	SEM 40	SEM 41	SEM 42	SEM 43	SEM 44	SEM 45	SEM 46	SEM 47	SEM 48	SEM 49	SEM 50	SEM 51	SEM 52
% FISICO PROGRAMADO	0,00%	1,88%	4,31%	6,27%	7,53%	8,62%	10,43%	11,76%	11,76%	15,78%	20,03%	20,83%	22,32%	23,93%	25,54%	35,07%	39,55%	41,73%	42,53%	43,34%	44,14%	44,94%	45,75%	50,22%	51,95%	52,75%	54,93%	58,15%	61,36%	64,58%	66,87%	66,87%	70,07%	70,07%	70,29%	72,21%	72,63%	72,63%	73,27%	73,27%	74,62%	78,33%	78,33%	80,64%	88,33%	96,80%	98,40%	98,40%	98,93%	99,64%	100,00%	100,00%
% FISICO EJECUTADO	0,00%	0,00%	0,00%	6,25%	7,59%	8,56%																																															
FINANCIERO PROGRAMADO	$ -	$ 46.066	$ 105.569	$ 153.555	$ 184.266	$ 211.138	$ 255.285	$ 287.915	$ 287.915	$ 386.322	$ 490.353	$ 510.034	$ 546.586	$ 585.949	$ 625.311	$ 858.677	$ 968.331	$ 1.021.752	$ 1.041.433	$ 1.061.115	$ 1.080.796	$ 1.100.478	$ 1.120.159	$ 1.229.813	$ 1.271.988	$ 1.291.669	$ 1.345.090	$ 1.423.816	$ 1.502.542	$ 1.581.268	$ 1.637.500	$ 1.637.500	$ 1.715.859	$ 1.715.859	$ 1.721.083	$ 1.768.098	$ 1.778.545	$ 1.778.545	$ 1.794.217	$ 1.794.217	$ 1.827.210	$ 1.917.941	$ 1.917.941	$ 1.974.481	$ 2.162.944	$ 2.370.254	$ 2.370.254	$ 2.409.434	$ 2.409.434	$ 2.422.493	$ 2.439.906	$ 2.448.613	$ 2.448.613
FINANCIERO EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ 152.936	$ 185.759	$ 209.716	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DIFERENCIA FISICA	0,00%	-1,88%	-4,31%	-0,03%	0,06%	-0,06%	-10,43%																																													
DIFERENCIA FINANCIERA	$ -	-$ 46.066	-$ 105.569	-$ 618	$ 1.493	-$ 1.422	-$ 255.285																																													

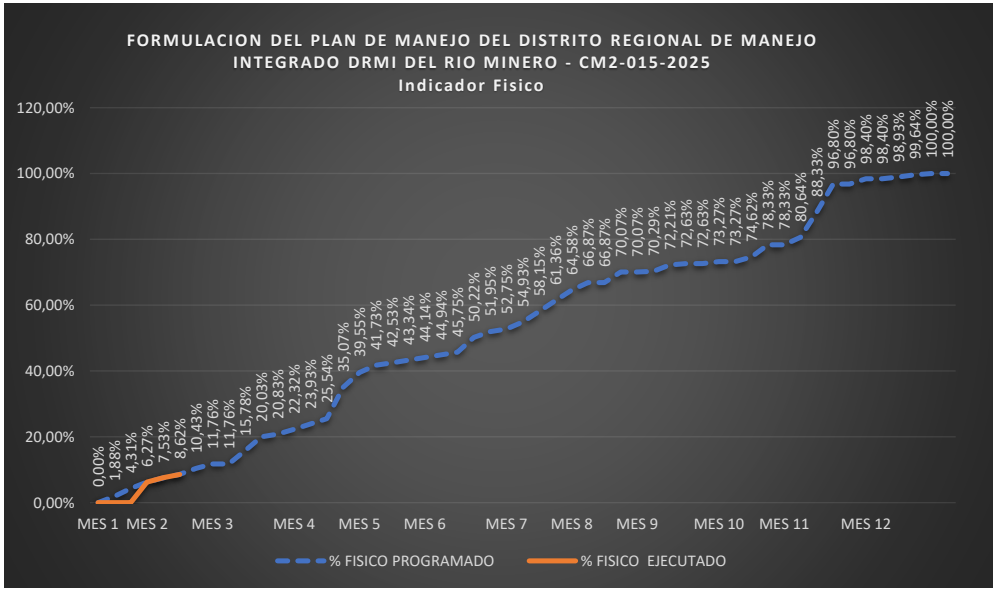



ENINCO S.A. LONJA ACUN CONSORCIO DRMI RIO MINERO 2025

CAS Corporación Autónoma Regional de Santander

"FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO -DRMI- DEL RÍO MINERO Y SUS ZONAS ALEDAÑAS Y DEL PARQUE NATURAL REGIONAL SERRANIA DE LAS QUINCHAS EN JURISDICCIÓN DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER" - No. CM2-015-2025

VALOR DEL CONTRATO CONSULTORIA	$ 2.448.612.900

INICIO DE ACTIVIDAD	FECHA DE CORTE	FECHA REAL DE FINALIZACION DE LA ACTIVIDAD	TIEMPO EJECUTADO REAL
	17/11/25		

ID	TAREA	RESPONSABLE	VALOR PROYECTADO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	INICIO	FIN	N° DIAS
0,00	Firma Contrato	Consultor - Supervision	NA	NA	NA	1/10/2025	1/10/2025	1
0,00	Documentacion	Consultor	NA	NA	NA	2/10/2025	9/10/2025	8
0,00	Acta de Inicio	Consultor - Supervision - Interventoria	NA	NA	NA	15/10/2025	15/10/2025	1
0,00	Solicitud de Documentacion Contractual a Consultor	Interventor	NA	NA	NA	17/10/2025	17/10/2025	1
0,00	Entrega de Documentacion Contractual	Consultor	NA	NA	NA	18/10/2025	22/10/2025	5
0,00	Revision de Documentacion Contractual (Aprobacion/No aprobacion)	Interventor	NA	NA	NA	22/10/2025	26/10/2025	5
0,00	Solicitud de Certificacion de Equipos a Utilizar por parte del Consultor	Interventor	NA	NA	NA	17/10/2025	17/10/2025	1
0,00	Entrega de Certificacion de Equipos a Utilizar por parte del Consultor	Consultor	NA	NA	NA	18/10/2025	22/10/2025	5
0,00	Revision de Certificacion de Equipos a Utilizar (Aprobacion/No aprobacion)	Interventor	NA	NA	NA	22/10/2025	26/10/2025	5
0,00	Solicitud de Arte y especificaciones Pendon por parte del Consultor	Interventor	NA	NA	NA	17/10/2025	17/10/2025	1
0,00	Entrega de Arte y especificaciones Pendon por parte del Consultor	Consultor	NA	NA	NA	18/10/2025	22/10/2025	5
0,00	Revision de Arte y especificaciones Pendon (Aprobacion/No aprobacion)	Interventor	NA	NA	NA	22/10/2025	26/10/2025	5
0,00	Revision de Arte y especificaciones Pendon (Objecion/No Objecion)	Supervision	NA	NA	NA	26/10/2025	30/10/2025	5
0,00	Instalacion Pendon	Consultor	NA	NA	NA	2/11/2025	6/11/2025	5
0,00	Solicitud de Arte y especificaciones de Indumentarias para el personal del Contratista	Interventor	NA	NA	NA	17/10/2025	17/10/2025	1
0,00	Entrega de Arte y especificaciones de Indumentarias para el personal del Contratista	Consultor	NA	NA	NA	18/10/2025	22/10/2025	5
0,00	Revision de Indumentarias (Aprobacion/No aprobacion)	Interventor	NA	NA	NA	22/10/2025	25/10/2025	4
0,00	Solicitud de Entrega de la politica de especial consideración a la conservación del medio ambiente del Contratista	Interventor	NA	NA	NA	17/10/2025	17/10/2025	1
0,00	Entrega de la politica de especial consideración a la conservación del medio ambiente del Contratista	Consultor	NA	NA	NA	18/10/2025	22/10/2025	5
0,00	Revision de Politica Ambiental (Aprobacion/No aprobacion)	Interventor	NA	NA	NA	22/10/2025	25/10/2025	4

ID	TAREA	SUBTAREA	ALCANCE	PRODUCTOS	ENTREGABLE	RESPONSABLE	ACTIVIDAD PROYECTADA	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD EJECUTADA	VALOR PROYECTADO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	INICIO	FIN	N° DIAS

% PROGRAMADO PROYECTO

CONSORCIO
DRMI RIO MINERO
2025

FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO -DRMI- DEL RÍO MINERO Y SUS ZONAS ALEDAÑAS Y DEL PARQUE NATURAL REGIONAL SERRANIA DE LAS QUINCHAS EN JURISDICCIÓN DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER

Consorcio DRMI Río Minero 2025

Contrato de consultoría 01166-2025

Informe mensual N° 1.

Periodo

15 de octubre al 14 de noviembre de 2025

Versión 0

Noviembre de 2025

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Responsable	Descripción del cambio
0	14/11/2025	Consultoría	Entrega inicial

APROBACIÓN


ELABORÓ Y VALIDÓ	APOYÓ Y REVISO	APROBÓ
Hayde Tatiana Morales A.	Javier Vergara Estupiñán	Diana Carolina Ramos M.
Profesional coordinación	Director	Representante legal
CONSORCIO DRMI RIO MINERO 2025	**CONSORCIO DRMI RIO MINERO 2025**	**GESTIÓN AMBIENTAL & HSEQ S.A.S.**
Consultoría	**Consultoría**	**Interventoría**
		

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4

2. OBJETIVOS DEL INFORME 4

3. RESUMEN EJECUTIVO 4

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5

1.1 DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 5

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 6

1.2 Fase de aprestamiento 6

1.1.1 Aspectos técnicos 6

1.3 Actividades Administrativas 25

1.1.2 Seguimiento y control 25

1.1.3 Oficios entregados 26

1.1.4 Oficios recibidos 26

1.1.5 Productos entregados 27

1.4 Observaciones y recomendaciones 27

1.1.6 Ejecución y Avance del Proyecto 27

1.1.7 Conclusiones y recomendaciones 27

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe consolida las actividades técnicas y administrativas desarrolladas en el marco del Contrato de Consultoría No. 01166-2025, cuyo objeto corresponde a la FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO -DRMI- DEL RÍO MINERO Y SUS ZONAS ALEDAÑAS Y DEL PARQUE NATURAL REGIONAL SERRANIA DE LAS QUINCHAS EN JURISDICCIÓN DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER.

El informe describe las actividades ejecutadas durante el primer mes de gestión, las cuales se centran en el desarrollo de la Fase 1: Aprestamiento, de acuerdo con el plan de trabajo y cronograma aprobados, y en cumplimiento de la metodología establecida en la "Guía para la Planificación del Manejo en las áreas protegidas del SINAP Colombia".

Este documento expone de manera ordenada los avances alcanzados durante el periodo evaluado, el cumplimiento del cronograma aprobado, así como las observaciones y recomendaciones que permiten asegurar la adecuada continuidad del proyecto. El informe se estructura conforme a los requerimientos mínimos establecidos.

2. OBJETIVOS DEL INFORME

El objetivo principal del presente informe es presentar de forma detallada y verificable las actividades ejecutadas durante el periodo, el grado de avance alcanzado respecto al cronograma aprobado, el estado de los recursos empleados y las principales consideraciones técnicas y administrativas que permiten evaluar el cumplimiento del contrato. De manera específica, el informe busca:

- Documentar las acciones desarrolladas por el equipo consultor.
- Verificar el cumplimiento del cronograma y metas establecidas.
- Identificar avances, dificultades o desviaciones relevantes.
- Proporcionar información soporte para la toma de decisiones por parte de la supervisión/interventoría.

3. RESUMEN EJECUTIVO

Durante el primer mes de ejecución, las actividades se centraron en el alistamiento técnico y administrativo del proyecto. Se conformó el equipo de trabajo, se legalizó el contrato con la aprobación de las garantías y se suscribió el acta de inicio.

En el componente técnico, se dio inicio formal a la fase de aprestamiento. El avance principal consiste en la estructuración de la Geodatabase del proyecto y la recopilación de

información secundaria disponible. Se ha avanzado en un 7.59% en la recopilación y análisis de la información disponible para el DRMI Río Minero y sus Zonas Aledañas y PNR Serranía de las Quinchas, se ha estructurado la metodología de la estrategia de participación, crucial para el desarrollo de los espacios de participación definidos. Así mismo, se han realizado avances en las metodologías de la revisión de coherencia de los objetivos de conservación.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la formulación de los planes de manejo para dos áreas protegidas estratégicas en jurisdicción de la CAS:

- **DRMI del Río Minero y sus zonas aledañas**: Localizado en los municipios de Bolívar, Cimitarra, El Peñón, La Belleza y Sucre.
- **PNR Serranía de las Quinchas**: Localizado en el municipio de Bolívar.

La formulación de ambos planes sigue las fases metodológicas establecidas en la "Guía para la Planificación del Manejo en las áreas protegidas del SINAP Colombia"

1.1 DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

En la siguiente tabla se relaciona la información general del contrato

Tabla 1 *Información general del contrato*

Objeto	FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO DRMI DEL RIO MINERO Y SUS ZONAS ALEDAÑAS Y DEL PARQUE NATURAL REGIONAL SERRANÍA DE LAS QUINCHAS EN JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER
Contrato de consultoría	No. 01166 de 2025
N° proceso SECOP II	CM2-015-2025
Fecha del contrato	29 de septiembre
Contratante	Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS
Contratista	Consorcio DRMI Río Minero 2025 RL Javier Vergara Estupiñán
Valor del contrato	Dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho millones seiscientos doce mil novecientos pesos COP ($2.448.612.900), incluido IVA
Interventor	GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS RL Diana Carolina Ramos Mayorga

Supervisor	Edna Rocío Castellanos Martínez
Plazo de ejecución	Doce (12) meses
Fecha de inicio	15 de octubre de 2025
Fecha de terminación	14 de octubre de 2026
Estado de pólizas	Vigentes

FUENTE: CONSORCIO DRMI RÍO MINERO 2025

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

En cumplimiento del plan de trabajo aprobado , las actividades ejecutadas se centraron en la Fase de Aprestamiento para el DRMI Río Minero y para el PNR Serranía de las Quinchas.

1.2 Fase de aprestamiento

Para esta fase de aprestamiento, las actividades se están ejecutando de manera paralela para ambas áreas protegidas, registrando avances en cada una de las tareas previstas para esta etapa en las dos unidades de conservación.

1.1.1 Aspectos técnicos

En este apartado se presentan las actividades desarrolladas durante el periodo de ejecución correspondiente a este informe, las cuales están asociadas al avance de los componentes técnicos del contrato.

1.1.1.1 Actividades ejecutadas

Durante el periodo reportado se desarrollaron las siguientes actividades, en correspondencia con el cronograma aprobado.

1.1.1.1.1 Conformación del equipo técnico

De acuerdo con los lineamientos presentados por supervisión e interventoría del contrato, se conformó el equipo técnico el cual se compone de los siguientes profesionales.

Tabla 2 *Conformación equipo técnico para la formulación del PMA del DRMI Río Minero y sus Zonas Aledañas y PNR Serranía de las Quinchas*

Profesional	Perfil	Nombre
Director	Biólogo	Edwin Javier Vergara
Profesional líder en planificación de áreas protegidas	Ing. Ambiental	Camilo José Bravo
Líder SIG	Ing. Catastral y Geodesta	Melquicedec Mena Parra
Líder en ciencias biológicas	Biólogo	Dalia Xiomara Suarez

Líder social	Trabajador Social	Angela María Serrano Trejos

FUENTE: CONSORCIO DRMI RÍO MINERO 2025

1.1.1.1.2 Definición del Plan de Trabajo – PDT

Se estableció el cronograma y el plan de trabajo, detallando las actividades, responsables, tiempos de ejecución y secuencia lógica de las tareas del proceso. En este PDT se organizó la ejecución técnica del proyecto, facilitando el seguimiento y la verificación del avance frente a los objetivos propuestos. También incluye la programación de entregables.

Figura 1 *Cronograma – PDT*

ID	TAREA	SUBTAREA	ALCANCE	RESPONSABLE	ACTIVIDAD PROYECTADA	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD EJECUTADA	VALOR PROYECTADO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	INICIO	FIN	N° DIAS
1.1	**Formular la fase de aprestamiento y definir la plataforma técnica, social y logística del Distrito Regional de Manejo Integrado del Río**				**11.76%**	**7.53%**	**3.65%**	**$ 287,915,115**	**$ 184,265,674**	**$ 89,253,685**			
1.1.1	Recopilar y analizar la información disponible	Recopilación, organización y sistematización de la información existente.	Revisión de la información documental y cartográfica de soporte	Consultor	0.78%	0.78%	0.74%	$ 19,194,341	$ 19,194,341	$ 18,234,624	16/10/2025	21/10/2025	5
			Identificación de vacíos de información y necesidades de actualización de la existente.	Consultor	0.78%	0.78%	0.74%	$ 19,194,341	$ 19,194,341	$ 18,234,624	16/10/2025	21/10/2025	5
			Espacio para la recopilación de información de estudios e investigaciones desarrolladas en el área del DRMI de otros actores del área de estudio con los actores del área	Consultor	0.78%	0.78%	0.74%	$ 19,194,341	$ 19,194,341	$ 18,234,624	16/10/2025	21/10/2025	5
1.1.2	Promover y facilitar la articulación interinstitucional.	Identificación y caracterización de los actores estratégicos en el AP, con base en los cuales se debe como tal, ya diseñar el esquema que permita la articulación y sinergia interinstitucional.	Generación de espacios de trabajo con actores institucionales y sectoriales estratégicos para el manejo del DRMI, que permita garantizar la participación de estos actores en el proceso articulación y sinergia interinstitucional.	Consultor	0.78%	0.78%	0.09%	$ 19,194,341	$ 19,194,341	$ 2,303,321	**21/10/2025**	26/10/2025	5
		Definición de esquema que facilite la articulación interinstitucional entre entidades relacionadas con el manejo del AP, incluyendo instancias y mecanismos de funcionamiento.		Consultor	0.78%	0.78%	0.09%	$ 19,194,341	$ 19,194,341	$ 2,303,321	21/10/2025	26/10/2025	5
1.1.3	Elaborar Estrategia de Participación y Comunicación.	Análisis que permita identificar preliminarmente los actores sociales que puedan ser estratégicos para el proceso de planificación del manejo del AP y sus roles	Generación de espacios de socialización y sensibilización que propicien el interés de los actores sociales estratégicos de participar en el proceso.	Consultor	0.78%	0.78%	0.09%	$ 19,194,341	$ 19,194,341	$ 2,303,321	**26/10/2025**	30/10/2025	4
		Diseño de estrategia para interesar e involucrar a actores estratégicos en la administración y manejo del AP, incluye instancias y mecanismos de participación.		Consultor	0.78%	0.78%	0.16%	$ 19,194,341	$ 19,194,341	$ 3,838,868	26/10/2025	30/10/2025	4
		Identificación de requerimientos de comunicación por grupos objetivo identificados.		Consultor	0.78%	0.78%	0.12%	$ 19,194,341	$ 19,194,341	$ 2,879,151	30/10/2025	03/11/2025	4
		Generación de productos de divulgación del AP para dar a conocer sus aportes al bienestar de las comunidades y a la conservación de la biodiversidad		Consultor	0.78%	0.78%	0.09%	$ 19,194,341	$ 19,194,341	$ 2,303,321	03/11/2025	07/11/2025	4
1.1.4	Revisar coherencia entre los objetivos de conservación y el área definidas como área protegida y generar capacidades.	Sistematización y análisis de los aprendizajes obtenidos en procesos anteriores en el AP y otras AP afines	Ajuste de los Objetivos específicos de conservación (OEC) de DRMI, de acuerdo con la revisión y análisis, teniendo en cuenta la relación de los sistemas productivos con el estado de conservación de niveles de biodiversidad.	Consultor	0.78%	0.47%	0.16%	$ 19,194,341	$ 11,516,605	$ 3,838,868	**07/11/2025**	12/11/2025	5
		Revisión y análisis de los objetivos de conservación.		Consultor	0.78%	0.00%	0.16%	$ 19,194,341	$ 0	$ 3,838,868	12/11/2025	17/11/2025	5
		Evaluación a partir un análisis o diagnóstico del área (Caracterización integral del AP y su contexto ecológico, socioeconómico, cultural, institucionaladministrativo y jurídico, a las escalas adecuadas, por las unidades de análisis definidas.), ya que de acuerdo al resultado de este análisis pueden llegar a tomarse decisiones en relación a los objetivos de conservación, que van o no cambiar las decisiones tomadas a partir de la participación social.		Interventoria-Supervision	0.78%	0.00%	0.09%	$ 19,194,341	$ 0	$ 2,303,321	17/11/2025	22/11/2025	5
		Identificación de capacidades (operativas, técnicas, financieras, logísticas, etc.) al interior de las autoridades relacionadas con la administración y manejo del AP	Generación de espacios de formación y capacitación a actores sociales e institucionales que faciliten su participación en el proceso.	Consultor	0.78%	0.00%	0.12%	$ 19,194,341	$ 0	$ 2,879,151	**22/11/2025**	26/11/2025	4
		Definición de necesidades de fortalecimiento de capacidades (operativas, técnicas, logísticas, financieros, etc.)		Consultor	0.78%	0.00%	0.12%	$ 19,194,341	$ 0	$ 2,879,151	22/11/2025	27/11/2025	5
		Gestión de apoyos requeridos para la generación de capacidades.		Consultor	0.78%	0.00%	0.12%	$ 19,194,341	$ 0	$ 2,879,151	22/11/2025	27/11/2025	5
	Entrega Informe Consolidado por parte del Consultor			**Consultor**							**27/11/2025**	**28/11/2025**	**2**
	Revision de Informe por parte de Interventoria			**Interventoria**							**29/11/2025**	**04/12/2025**	**6**
	Revision de Informe por parte de la Supervision			**Supervision**							**05/12/2025**	**10/12/2025**	**6**

1.2	**Elaborar la fase de formulación del DRMI del Río minero y sus zonas aledañas**				**55.12%**	**0.00%**	**0.00%**	**$ 1,349,585,160**	**$ 0**	**$ 0**			
1.2.1	Elaborar participativamente el Componente Diagnóstico.	Teniendo en cuenta el resultado de Revisar coherencia entre los objetivos de conservación y el área definidas como área protegida (numeral 1.4), definir la categoría de manejo y el polígono delimitado (esta actividad determina la necesidad de redelimientacion o recategorizacion)	Realineación o ajuste de los límites del DRMI, de acuerdo con la revisión y análisis, teniendo en cuenta la relación de los sistemas productivos y actividades presentes con el estado de conservación de niveles de biodiversidad.	Consultor	2.30%	0.00%		$ 56,232,715	$ 0	$ 0	10/12/2025	30/12/2025	20
		Definición de los Valores de Conservación (VCBH) a partir de los objetivos específicos de conservación del AP	Revisión y ajuste de los VCBH, a partir del ajuste de los OEC del DRMI.	Consultor	2.30%	0.00%		$ 56,232,715	$ 0	$ 0	10/12/2025	20/12/2025	10
		Caracterización integral del AP y su contexto ecológico, socioeconómico, cultural, institucional administrativo y jurídico, a las escalas adecuadas, por las unidades de análisis definidas.	Actualización de la caracterización del DRMI y su contexto, en esta actividad se contempla el diseño y ejecución de levantamiento de información primaria en los aspectos biofísicos y socioeconómicos, para lo cual se debe diseñar y entregar la metodología de levantamiento de información fauna, flora, social, económica, etc la cual debe ser acorde a las características de la zona a evaluar; todo el proceso de levantamiento de información primaria (muestreos, Área de muestreo, metodología, puntos de levantamiento de información) debe ser aprobada previamente por la interventoria/supervisión	Consultor	2.30%	0.00%		$ 56,232,715	$ 0	$ 0	10/12/2025	20/12/2025	10
		Definición de Prioridades de Manejo, a partir de la Caracterización integral del AP y su contexto ecológico, sociocultural, económico, institucional administrativo y jurídico, a las escalas adecuadas.	Actualización de las prioridades de manejo. Teniendo en cuenta que las prioridades de manejo hacen referencia a las situaciones positivas o negativas a las que debe responder la administración y manejo de un área protegida, de manera prioritaria en el plazo de vigencia del plan de manejo, para avanzar en el logro de sus Objetivos de Conservación, teniendo en cuenta las dinámicas ecológicas, climáticas, socioeconómicas, culturales e institucionales en el territorio y que esta Área es existente, se debe revisar las prioridades de la entidad a la fecha para esta área protegida, revisar el estado actual del área, la efectiva de la misma y determinar la necesidad de formular o actualizar las prioridades de manejo de AP	Consultor	2.30%	0.00%		$ 56,232,715	$ 0	$ 0	10/12/2025	20/12/2025	10
		Elaboración de la Síntesis diagnóstica, como línea base de la Efectividad del Manejo	Elaboración de Síntesis Diagnóstica.	Consultor	2.30%	0.00%		$ 56,232,715	$ 0	$ 0	**30/12/2025**	09/01/2026	10
		Análisis de coherencia al interior del componente Diagnóstico.	Revisión de la coherencia del Componente Diagnóstico. Antes de entrar a la formulación del Componente Ordenamiento del Plan de Manejo es necesario realizar una revisión de los contenidos del Componente Diagnóstico, que permita analizar la coherencia y lógica que debe existir entre los aspectos que conforman dicho componente Adicionalmente se deberá realizar un análisis multitemporal con las imágenes satelitales adquiridas en tres períodos de análisis (2010-2017-2024), con el fin de establecer las tasas de deforestación, praderización y degradación ocurridos en esos periodos en el DRMI del río Minero y sus zonas aledañas. Los periodos del análisis podrán ser concertados con la interventoria y supervisión.	Interventoria-Supervision	2.30%	0.00%		$ 56,232,715	$ 0	$ 0	09/01/2026	19/01/2026	10
1.2.2	Elaborar participativamente el Componente Ordenamiento.	Formulación de los Objetivos estratégicos o y visión de largo plazo para el manejo del AP.	Actualización de los Objetivos estratégicos para el DRMI	Consultor	2.30%	0.00%		$ 56,232,715	$ 0	$ 0	**19/01/2026**	29/01/2026	10
		Zonificación para el manejo del AP	Definición de criterios para la zonificación prospectiva del manejo (arreglo espaciotemporal).	Consultor	2.30%	0.00%		$ 56,232,715	$ 0	$ 0	19/01/2026	29/01/2026	10
			Armonización de los criterios de zonificación con el estado actual del área protegida de acuerdo al Diagnostico.	Consultor	2.30%	0.00%		$ 56,232,715	$ 0	$ 0	19/01/2026	29/01/2026	10
		Determinación de los usos y las actividades principales., compatibles, condicionadas y permitidas para cada una de las zonas de manejo establecidas.	Establecimiento de la regulación de usos y actividades, en el marco de la zonificación de manejo.	Consultor	2.30%	0.00%		$ 56,232,715	$ 0	$ 0	19/01/2026	21/01/2026	2
		Establecimiento y formalización de acuerdos de uso y manejo con actores relacionados directamente con el AP	Formalización de acuerdos con actores estratégicos para la administración y manejo del DRMI, que viabilicen el cumplimiento de la regulación establecida.	Consultor	2.30%	0.00%		$ 56,232,715	$ 0	$ 0	19/01/2026	08/02/2026	20
		Definición de acciones para la articulación al ordenamiento en sectores circunvecinos y colindantes con el AP para cumplir la función amortiguadora y generar la conectividad necesaria con los paisajes circundantes.	Actualizar los análisis de conectividad del DRMI en su contexto regional.	Consultor	2.30%	0.00%		$ 56,232,715	$ 0	$ 0	19/01/2026	08/02/2026	20
		Análisis de coherencia al interior del componente Ordenamiento y de este con los otros componentes del Plan de Manejo.	Revisión de la coherencia del Componente Ordenamiento y de este con el Diagnóstico.	Consultor	2.30%	0.00%		$ 56,232,715	$ 0	$ 0	19/01/2026	08/02/2026	20
1.2.3	Elaborar participativamente el Componente Estratégico.	Formulación de objetivos de gestión de mediano plazo y sus indicadores, a partir de los Objetivos estratégicos de largo plazo y la zonificación de manejo definida	Actualización de los Objetivos de Gestión de mediano plazo (5 años) y sus indicadores	Consultor	2.30%	0.00%		$ 56,232,715	$ 0	$ 0	**08/02/2026**	28/02/2026	20
			Elaboración de las hojas metodológicas de los indicadores.	Consultor	2.30%	0.00%		$ 56,232,715	$ 0	$ 0	28/02/2026	20/03/2026	20
		Definición de metas de corto, mediano y largo plazo, a partir de los indicadores de los objetivos de gestión, con sus requerimientos para lograrlas (financieros, técnicos, logísticos, etc.).	Actualización de las metas de mediano plazo y sus requerimientos (financieros, técnicos, logísticos, administrativos, etc.).	Consultor	2.30%	0.00%		$ 56,232,715	$ 0	$ 0	**20/03/2026**	25/03/2026	5
		Formulación de perfiles de proyecto.	Elaboración de perfiles de proyectos de acuerdo a los resultados del componente de ordenamiento del área protegida.	Consultor	2.30%	0.00%		$ 56,232,715	$ 0	$ 0	20/03/2026	09/04/2026	20
		Análisis de coherencia al interior de componente Estratégico y de este con los otros componentes del Plan de Manejo	Revisión de la coherencia del Componente Estratégico y de este con los otros dos componentes del Plan de Manejo.	Consultor	2.30%	0.00%		$ 56,232,715	$ 0	$ 0	20/03/2026	21/03/2026	1
1.2.4	Diseñar y conformar el Esquema de Gobernanza para la administración y manejo del AP.	Análisis de competencias, funciones e intereses de los actores estratégicos para la administración y manejo del AP.	Construcción conjunta del esquema de gobernanza para la administración y manejo del DRMI.	Consultor	2.30%	0.00%		$ 56,232,715	$ 0	$ 0	**09/04/2026**	14/04/2026	5
		Análisis de posibles instancias, mecanismos o instrumentos para la administración y manejo del AP.		Interventor	2.30%	0.00%		$ 56,232,715	$ 0	$ 0	14/04/2026	19/04/2026	5
		Diseño, concertación y conformación del esquema de gobernanza para la administración y manejo del AP.		Supervision	2.30%	0.00%		$ 56,232,715	$ 0	$ 0	19/04/2026	24/04/2026	5
1.2.5	Editar documento final de PM.	Conformación de equipo editor.	Preparación y entrega de documento técnico de Plan de Manejo con sus tres componentes, cartografía y anexos requeridos.	Consultor	2.30%	0.00%		$ 56,232,715	$ 0	$ 0	**24/04/2026**	29/04/2026	5
		Elaboración de documento técnico de PM con sus tres componentes		Interventor	2.30%	0.00%		$ 56,232,715	$ 0	$ 0	29/04/2026	04/05/2026	5
		Edición, diagramación y corrección de estilo del documento final de PM (de ser necesario).		Supervision	2.30%	0.00%		$ 56,232,715	$ 0	$ 0	04/05/2026	09/05/2026	5
			Entrega Informe Consolidado por parte del Consultor	**Consultor**							**09/05/2026**	**10/05/2026**	**2**
			Revision de Informe por parte de Interventoria	**Interventoria**							**11/05/2026**	**16/05/2026**	**6**
			Revision de Informe por parte de la Supervision	**Supervision**							**17/05/2026**	**22/05/2026**	**6**

1.3	**Elaborar la fase de formalización del DRMI del río minero y sus zonas aledañas y su estructura ecológica principal**				**3.20%**	**0.00%**	**0.00%**	**$ 78,358,433**	**$ 0**	**$ 0**			
1.3.1	Elaborar Acto Administrativo para Adoptar el PM y formalizar el Esquema de Gobernanza	Proyección propuesta del acto administrativo de adopción del PM y formalización del Esquema de Gobernanza. (Propuesta)	Elaboración de proyecto de acto administrativo para la adopción del PM.	Consultor	3.20%	0.00%		$ 78,358,433	$ 0	$ 0	22/05/2026	25/05/2026	3
	Entrega Informe Consolidado por parte del Consultor			**Consultor**							**25/05/2026**	**26/05/2026**	**2**
	Revision de Informe por parte de Interventoria			**Interventoria**							**27/05/2026**	**01/06/2026**	**6**
	Revision de Informe por parte de la Supervision			**Supervision**							**02/06/2026**	**07/06/2026**	**6**
1.4	**Elaborar la fase de seguimiento y monitoreo al plan de manejo del DRMI del río minero y sus zonas aledañas**				**2.56%**	**0.00%**	**0.00%**	**$ 62,686,744**	**$ 0**	**$ 0**			
1.4.1	Elaborar el plan operativo, a partir del Componente Estratégico del PM	Formulación conjunta de las metas anuales con compromisos concretos por parte de los actores para su ejecución	Preparación de Plan Operativo para el primer año de ejecución del PM del DRMI.	Consultor	0.32%	0.00%		$ 7,835,843	$ 0	$ 0	07/06/2026	10/06/2026	3
		Definición de actividades, cronograma y asignación de recursos para cada meta anual		Consultor	0.32%	0.00%		$ 7,835,843	$ 0	$ 0	07/06/2026	10/06/2026	3
1.4.2	Generar acuerdos para la ejecución del plan operativo, el seguimiento y el monitoreo del AP	Definición de actividades, cronograma y asignación de recursos para cada meta anual	Definición de alianzas estratégicas que viabilicen la ejecución del Plan Operativo del DRMI.	Consultor	0.32%	0.00%		$ 7,835,843	$ 0	$ 0	10/06/2026	13/06/2026	3
		Definición de sistema de seguimiento conjunto a la ejecución del plan operativo		Consultor	0.32%	0.00%		$ 7,835,843	$ 0	$ 0	10/06/2026	13/06/2026	3
		Definición de programa participativo de monitoreo para el AP.		Consultor	0.32%	0.00%		$ 7,835,843	$ 0	$ 0	10/06/2026	13/06/2026	3
		Concreción de los compromisos para la asignación de recursos y ejecución del plan operativo.		Consultor	0.32%	0.00%		$ 7,835,843	$ 0	$ 0	10/06/2026	13/06/2026	3
		Análisis y evaluación de los indicadores establecidos (eficacia: integridad VCBH, objetivos estratégicos, objetivos de gestión; y eficiencia de la administración y manejo), de acuerdo con sus hojas metodológicas.		Consultor	0.32%	0.00%		$ 7,835,843	$ 0	$ 0	13/06/2026	16/06/2026	3
		Identificación, sistematización y divulgación de aprendizajes (éxitos y errores) en la administración y manejo del AP.		Consultor	0.32%	0.00%		$ 7,835,843	$ 0	$ 0	16/06/2026	19/06/2026	3
	Entrega Informe Consolidado por parte del Consultor			**Consultor**							**19/06/2026**	**20/06/2026**	**2**
	Revision de Informe por parte de Interventoria			**Interventoria**							**21/06/2026**	**26/06/2026**	**6**
	Revision de Informe por parte de la Supervision			**Supervision**							**27/06/2026**	**02/07/2026**	**6**
1.5	**Elaborar retroalimentación al plan de manejo del DRMI del río minero y sus zonas aledañas**				**0.64%**	**0.00%**	**0.00%**	**$ 15,671,686**	**$ 0**	**$ 0**			
1.5.1	Evaluar la efectividad del manejo del AP	Análisis de la efectividad de corto y mediano plazo con participación de los actores estratégicos para la administración y manejo del AP.	Realización de análisis de efectividad que permita generar línea base del manejo del DRMI.	Consultor	0.32%	0.00%		$ 7,835,843	$ 0	$ 0	02/07/2026	03/07/2026	1
		Análisis de la efectividad de largo plazo con participación de actores estratégicos y expertos temáticos.		Consultor	0.32%	0.00%		$ 7,835,843	$ 0	$ 0	03/07/2026	04/07/2026	1
	Entrega Informe Consolidado por parte del Consultor			**Consultor**							**04/07/2026**	**05/07/2026**	**2**
	Revision de Informe por parte de Interventoria			**Interventoria**							**06/07/2026**	**11/07/2026**	**6**
	Revision de Informe por parte de la Supervision			**Supervision**							**12/07/2026**	**17/07/2026**	**6**

FUENTE: CONSORCIO DRMI RÍO MINERO 2025

1.1.1.1.3 Recopilación y análisis de información disponible

Tal y como lo define la guía SINAP este es el punto de partida fundamental de la fase de aprestamiento. El cual consiste en la recopilación, organización y sistematización exhaustiva de la información secundaria existente. Este proceso tiene como finalidad construir una línea base documental sólida que integre los componentes o aspectos temáticos físico-bióticos, socioeconómicos, culturales, político-institucionales y jurídicos pertinentes para el DRMI Río Minero y sus Zonas Aledañas y el PNR Serranía de las Quinchas.

Para ello, se realizó un barrido sistemático de fuentes oficiales, entre ellas la CAS, MinAmbiente, IDEAM, IAvH, SGC, DANE, entre otras entidades, así como fuentes académicas e instrumentos de planificación, tales como POMCAS, EOT, con el propósito de consolidar un acervo documental integral. Para esta actividad realizó lo siguiente:

- Estructuración de la Geodatabase (GDB) del proyecto según los lineamientos de la Guía SINAP.
- Se recopiló información cartográfica base (IGAC) e información documental (EOTs municipales, POMCAS, estudios previos).

Durante el periodo reportado se ejecutaron las siguientes actividades programadas, en concordancia con el cronograma aprobado para cada una de las áreas protegidas, garantizando el avance ordenado de las tareas previstas y el cumplimiento de los objetivos establecidos para la fase correspondiente:

Tabla 3 *Actividades ejecutadas en la recopilación y organización de la información*

ID	Actividad	Descripción	Soporte	Actividad programada (%)	Actividad ejecutada (%)
DRMI RÍO MINERO Y SUS ZONAS ALEDAÑAS					
1.1.1	Recopilación, organización y sistematización de la información disponible	Revisión de la información documental y cartográfica de soporte	Documento 1.1.1. Recopilación y análisis de la información, anexo 1. Matriz de evaluación y análisis de la información disponible, estructura GDB temática y GDB base,	0.78%	0.74%
PNR SERRANÍA DE LAS QUINCHAS					
2.1.1	Recopilación, organización y sistematización de la información disponible	Revisión de la información documental y cartográfica de soporte	Documento 1.1.1. Recopilación y análisis de la información, anexo 1. Matriz de evaluación y análisis de la información disponible, estructura GDB temática y GDB base,	0.34%	0.17%


FUENTE: CONSORCIO DRMI RÍO MINERO 2025

De acuerdo con la tabla anterior, durante el periodo evaluado en este informe, se alcanzó un avance del 0,74% en la recopilación, organización y sistematización de la información disponible para el DRMI Río Minero, y del 0,17% para el PNR. En este último caso, la metodología ya se encuentra definida y se avanza en la evaluación y análisis de la información recopilada.

- **Estructura metodológica de la evaluación y análisis de la información recopilada para el DRMI Río Minero y PNR Serranía de las Quinchas**

La metodología aplicada para la recopilación, organización y sistematización de la información se desarrolló en fases secuenciales e interrelacionadas, orientadas a garantizar la calidad, confiabilidad técnica, completitud temática y pertinencia de los insumos que soportan el análisis y la toma de decisiones dentro del proyecto. Esta metodología se consolidó en la Matriz de Evaluación y Análisis de la Información Disponible, presentada en el ***Anexo 1. Matriz Evaluación y Análisis de la Información Secundaria.***

Figura 2 *Metodología para el análisis de la información secundaria recopilada*

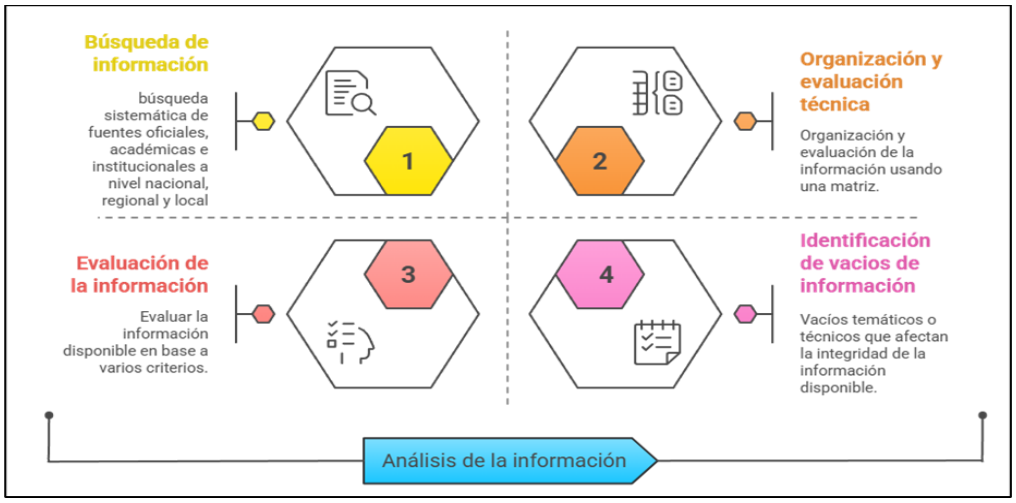

FUENTE: CONSORCIO DRMI RÍO MINERO 2025

Fases metodológicas

I. Recopilación de la información

Se realizó una búsqueda sistemática de fuentes oficiales, académicas e institucionales a nivel nacional, regional y local, priorizando documentos actualizados y con cobertura espacial correspondiente al área de estudio. Cada documento registrándose en una matriz de evaluación y análisis, bajo los siguientes campos:

Tabla 4 *Información general del insumo recopilado*

Información general del insumo recopilado				
ASPECTOS	**TEMA ESPECIFICO**	**AUTOR, FECHA, TITULO, FUENTE, CIUDAD, EDITORIAL DEL DOCUMENTO (CITAR CON NORMAS APA)**	**AÑO**	**FORMATO**
Político-institucionales	Instrumento de planificación regional	Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS). (2022). Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) de la Corporación Autónoma Regional de Santander 2022-2033	2022	PDF
Político-institucionales	Instrumento de planificación regional	Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS). (2024). Plan de Acción Institucional 2024-2027	2024	PDF
Político-institucionales	Política Nacional del SINAP	Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES. (2021). Documento CONPES 4050. Política para la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas—SINAP—	2021	PDF
Político-institucionales	Instrumento de planificación regional	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2015). Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Territorial—PIGCCT—del Santander 2030	2015	PDF

FUENTE: CONSORCIO DRMI RÍO MINERO 2025

II. Organización y evaluación técnica de los insumos

Cada insumo recopilado fue sometido a un proceso de valoración mediante criterios técnicos definidos, que permiten medir su vigencia, escala, confiabilidad, completitud temática y pertinencia. A continuación se presentan los criterios evaluados

Tabla 5 *Organización y evaluación técnica de los insumos*

Evaluación y análisis del insumo recopilado									
VIGENCIA	**VALOR VIGENCIA**	**ESCALA**	**VALOR ESCALA**	**CONFIABILIDAD TÉCNICA**	**VALOR CONFIABILIDAD TÉCNICA**	**COMPLETITUD TEMÁTICA**	**VALOR COMPLETITUD TEMÁTICA**	**PERTINENCIA**	**VALOR PERTINENCIA**
Información entre 6 y 3 años	3	REGIONAL	3	Fuente oficial, académica o técnicamente verificada	5	Completa	5	Alta	5
Información menor a 3 años	5	REGIONAL	3	Fuente oficial, académica o técnicamente verificada	5	Completa	5	Alta	5
Información entre 6 y 3 años	3	NACIONAL	1	Fuente oficial, académica o técnicamente verificada	5	Completa	5	Alta	5
Información entre 6 y 3 años	3	REGIONAL	3	Fuente oficial, académica o técnicamente verificada	5	Completa	5	Alta	5

FUENTE: CONSORCIO DRMI RÍO MINERO 2025

Una vez valorados los criterios anteriormente descritos, se obtiene una evaluación final, la cual se obtiene del promedio de los cinco criterios evaluados y se clasifica en las siguientes categorías

- Óptima: Información actualizada, completa y confiable
- Suficiente: Información vigente y útil, con ajustes menores requeridos
- Parcial: Información incompleta o desactualizada
- Insuficiente: Información obsoleta, inexacta o inexistente

III. Identificación de vacíos de información y método de subsanación

Posterior a la evaluación, se identifican vacíos temáticos o técnicos que afectan la integridad de la información disponible.

Tabla 6 *identificación de vacíos de información y método de subsanación*

VACÍO DE INFORMACIÓN IDENTIFICADO (ANÁLISIS TÉCNICO)	PRIORIDAD DEL VACÍO	MÉTODO DE SUBSANACIÓN (ACCIÓN)
No presenta vacíos		N.A
No presenta vacíos		N.A
No presenta vacíos		N.A
No presenta vacíos		N.A
Falta de articulación con determinantes ambientales	Media	Solicitar información actualizada (si existe), y revisión de determinantes ambientales vigentes para revisar posibles conflictos en el uso del suelo
Está en concertación, por lo que presenta vacíos temporales de validación, vigencia y coherencia normativa	Alta	Utilizar ambos instrumentos (vigente y en concertación) para análisis comparativo y registrar el vacío normativo temporal.
Vacíos en vigencia y coherencia, vacíos de articulación interinstitucional.	Alta	Solicitar información actualizada (si existe),

FUENTE: CONSORCIO DRMI RÍO MINERO 2025

IV. Ficha técnica

Finalmente, la ficha técnica consolida los resultados de la Matriz de Evaluación y Análisis de la Información, con el fin de sintetizar la calidad, confiabilidad y pertinencia de los insumos disponibles, así como identificar vacíos y definir acciones.

La ficha se estructura en cinco secciones:

I. **Identificación:** registro de los datos del proyecto (nombre, localización, área protegida).

Figura 3 *Ficha técnica, apartado identificación*

FICHA TÉCNICA EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE - FASE APRESTAMIENTO	
IDENTIFICACIÓN	
PROYECTO	Formulación del Plan de Manejo del Distrito Regional de Manejo Integrado – DRMI- del Río Minero y sus zonas aledañas
ÁREA PROTEGIDA	
LOCALIZACIÓN	Bolívar, Cimitarra, La Belleza, El Peñon, Sucre, departamento de Santander

FUENTE: CONSORCIO DRMI RÍO MINERO 2025

II. **Análisis general:** síntesis interpretativa de los resultados obtenidos en la matriz, destacando las tendencias, fortalezas y debilidades de la información recopilada.

Figura 4 *Ficha técnica, apartado análisis general*

ANALISIS GENERAL

FUENTE: CONSORCIO DRMI RÍO MINERO 2025

III. **Nivel de confianza general:** cálculo del promedio de los valores obtenidos en las columnas evaluación y prioridad del vacío, reflejando la solidez del componente informativo.

Figura 5 *Ficha técnica, apartado nivel de confianza general*

NIVEL DE CONFIANZA GENERAL		
Aspecto	**Nivel**	**Justificación breve del nivel (resumen de la evaluación)**
Físico		
Biótico		
Socioeconómico		
Cultural		
Político-institucional		
Jurídico		

FUENTE: CONSORCIO DRMI RÍO MINERO 2025

IV. **Vacíos críticos identificados:** priorización de los vacíos de información con categoría alta, relevantes para la toma de decisiones.

Figura 6 *Ficha técnica, apartado vacíos de información identificados*

VACÍOS CRITICOS IDENTIFICADOS	
Extraídos de la matriz, columna "PRIORIDAD DEL VACÍO" = Alto)	
1	
2	
3	
4	

FUENTE: CONSORCIO DRMI RÍO MINERO 2025

V. **Análisis por aspecto:** consolidación del estado del arte, nivel de confianza, vacíos y acciones prioritarias de subsanación, según los resultados del análisis temático.

Figura 7 *Ficha técnica, apartado análisis por aspecto temático*


ANÁLISIS POR ASPECTO (Guía SINAP)	
Apectos físicos	
Estado del arte	
Evaluación	
Vacíos críticos del componente	
Acciones	
Aspectos bióticos	
Estado del arte	
Evaluación	
Vacíos críticos del componente	
Acciones	
Aspectos socioeconómicos	
Estado del arte	
Evaluación	
Vacíos críticos del componente	
Acciones	
Aspectos culturales	
Estado del arte	
Evaluación	
Vacíos críticos del componente	
Acciones	

FUENTE: CONSORCIO DRMI RÍO MINERO 2025

- **Recopilación, organización y sistematización de la información disponible para el DRMI Río Minero y sus Zonas Aledañas**

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta actividad para el área protegida DRMI Río Minero y sus Zonas Aledañas, se recopilaron un total de 84 insumos. El componente socioeconómico concentra la mayor proporción de la información analizada, con un 31%, seguido del componente biótico con un 20%. El aspecto físico aporta el 19% y los componentes político-institucionales representan el 16%, evidenciando una distribución equilibrada entre las dimensiones para la comprensión integral del territorio. Finalmente, los componentes cultural y jurídico registran una menor representación, con el 6% y 8%, respectivamente (**Figura 8**).


Figura 8 *Distribución de la información recopilada por aspecto temático*

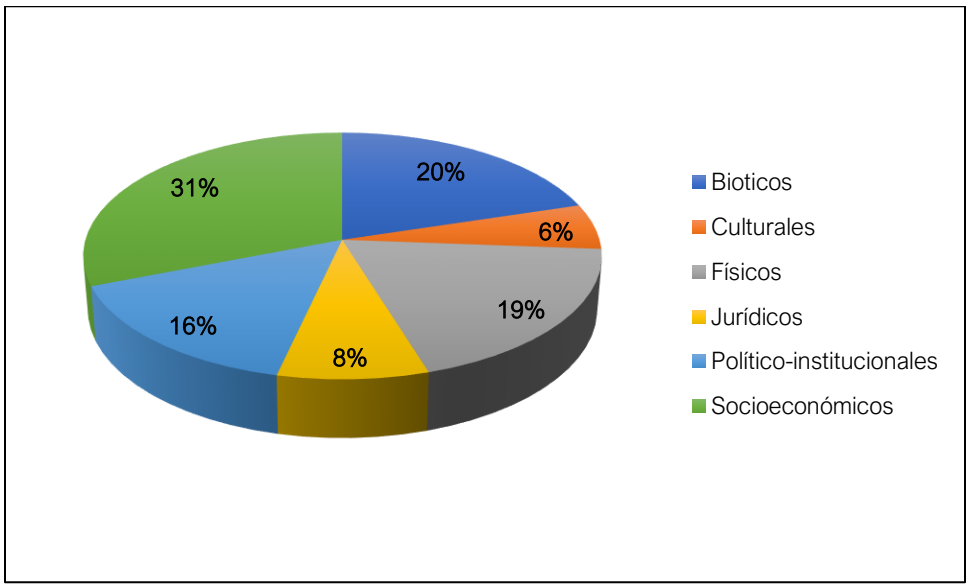

FUENTE: CONSORCIO DRMI RÍO MINERO 2025

En relación con la evaluación de los criterios analizados, se determinó que el 41% de los insumos corresponde a información con una antigüedad menor a 3 años, lo que asegura un alto nivel de actualidad y pertinencia para el análisis temático. Un 31% presenta una vigencia intermedia, entre 3 y 6 años, que, si bien continúa siendo funcional, podría requerir verificación o actualización según las transformaciones territoriales y ambientales recientes. Finalmente, el 28% de los insumos supera los 7 años de antigüedad, lo que reduce su aplicabilidad para los procesos de planificación y toma de decisiones, particularmente en escenarios donde las condiciones biofísicas, socioeconómicas o de uso del suelo han experimentado cambios significativos.

Figura 9 *Distribución de la información recopilada por vigencia*

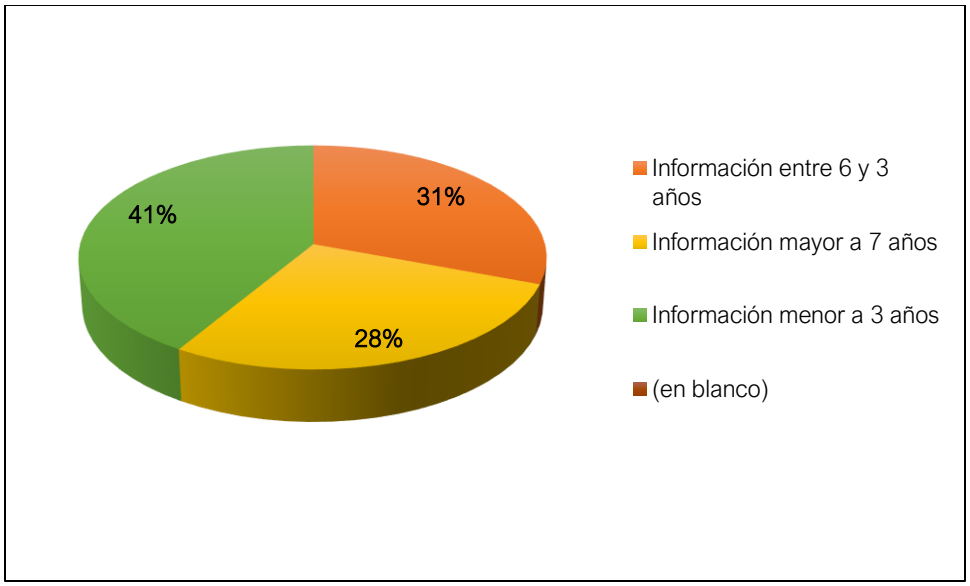


FUENTE: CONSORCIO DRMI RÍO MINERO 2025

En términos de completitud temática, el 84% de la información recopilada se considera completa, lo cual indica una adecuada cobertura de los aspectos técnicos requeridos para el análisis. Este porcentaje refleja la existencia de insumos con suficiente nivel de detalle y coherencia interna, permitiendo su integración efectiva en los procesos de evaluación y planificación.

Por su parte, el 11% corresponde a información parcial, que aunque aporta elementos relevantes, presenta vacíos o limitaciones en ciertas variables temáticas o espaciales. Finalmente, el 5% de los insumos se clasifica como información incompleta, lo que puede dificultar su uso directo en la toma de decisiones o requerir complementación mediante otras fuentes o trabajo de campo.


Figura 10 *Distribución de la información recopilada por su completitud temática*

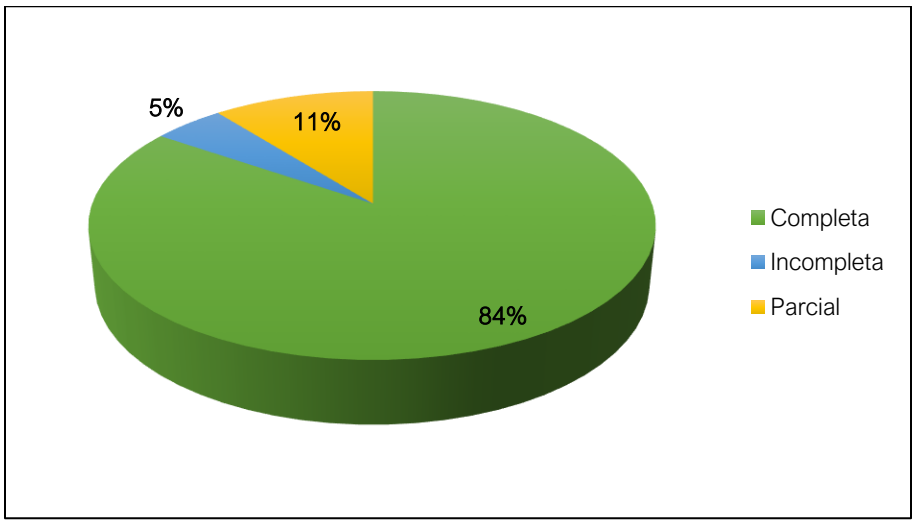

Fuente: Consorcio DRMI Río Minero 2025

Por otro lado, la pertinencia de la información el 82% de las fuentes presentan una pertinencia alta, lo que evidencia una adecuada correspondencia entre los insumos disponibles y los objetivos del análisis de los aspectos temáticos en el área de estudio. Este alto nivel de pertinencia de la mayoría de información recopilada, garantiza que la información utilizada responde de manera directa a las necesidades de diagnóstico, planificación y toma de decisiones dentro del ámbito de estudio. Por su parte, el 14% de las fuentes se clasifican con pertinencia media, ya que, si bien aportan datos relevantes, su alcance o nivel de detalle puede no estar completamente alineado con los requerimientos específicos del análisis. Finalmente, el 4% de las fuentes presenta pertinencia baja, lo que indica que su utilidad es limitada o complementaria, y que podrían requerir ser reemplazadas o contrastadas con otra información.

Figura 11 *Distribución de la información recopilada por su pertinencia*

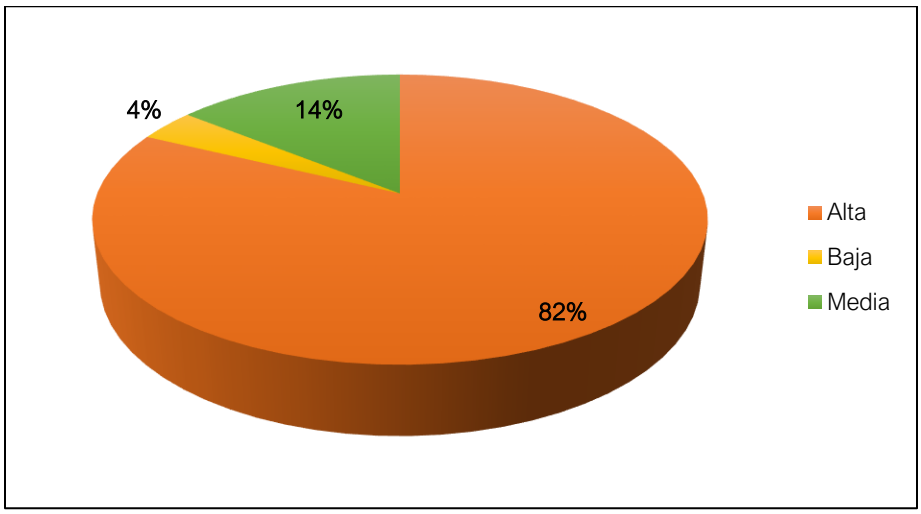


Fuente: Consorcio DRMI Río Minero 2025

Finalmente, la evaluación final de la información recopilada, muestra que el 64% de los insumos se clasifican en la categoría óptima, lo que refleja un alto nivel de calidad, consistencia y utilidad para el análisis integral del área de estudio. Este resultado evidencia que la mayoría de los datos cuentan con una adecuada vigencia, confiabilidad técnica, pertinencia y completitud temática.

Por su parte, el 29% de la información se ubica en la categoría suficiente, lo que indica que, aunque cumple con los criterios mínimos requeridos para el análisis, podría beneficiarse de actualizaciones o ajustes metodológicos para mejorar su precisión o nivel de detalle. Finalmente, el 7% corresponde a la categoría parcial, lo que sugiere limitaciones en cobertura, calidad o disponibilidad de variables específicas, que podrían afectar la integralidad de algunos componentes del análisis.

Figura 12 *Distribución de la información recopilada por su categoría de evaluación final*

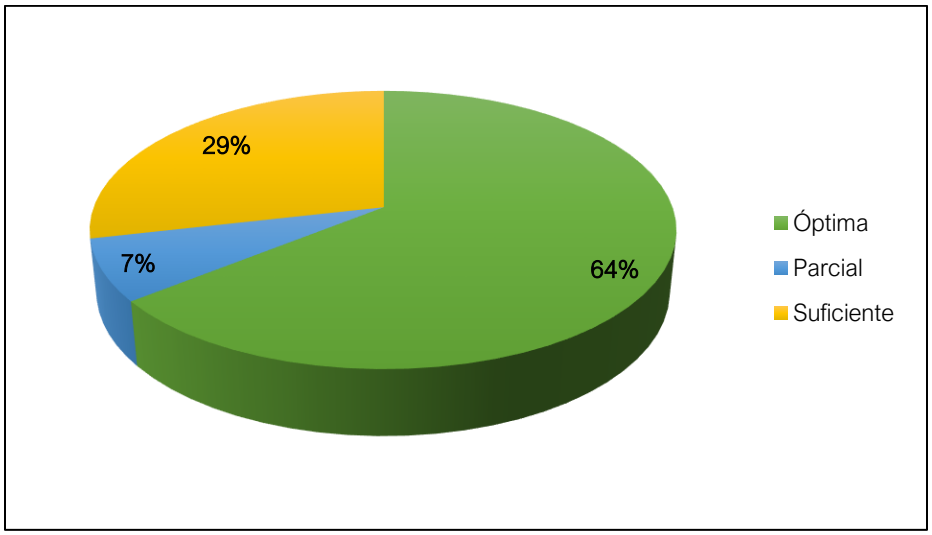


Fuente: Consorcio DRMI Río Minero 2025

Los vacíos de información identificados 47% de los insumos se clasifican como no aplica (N.A.), lo que indica que no presentan vacíos de información y, por tanto, cuentan con un nivel de completitud y calidad adecuado para su uso en los procesos de análisis posteriores Por otro lado, el 25% de la información presenta vacíos con prioridad baja, asociados principalmente a aspectos complementarios o de menor incidencia en la interpretación general de los resultados. Por su parte, el 14% corresponde a vacíos con prioridad media, relacionados con la ausencia parcial de variables o con limitaciones en la actualización o escala de los datos. Finalmente, el 14% restante se clasifica con prioridad alta, lo que evidencia la necesidad de intervención para mejorar la cobertura, precisión o disponibilidad de información crítica para el análisis integral del área de estudio.

Esta distribución sugiere que, si bien la mayoría de los insumos presentan una calidad adecuada, es fundamental priorizar acciones orientadas a la generación o actualización de la información con vacíos de prioridad media y alta, especialmente en aquellos temas estratégicos en el marco de la formulación del plan de manejo y cada una de sus fases.

Figura 13 *Distribución de la información recopilada por la prioridad del vacío*

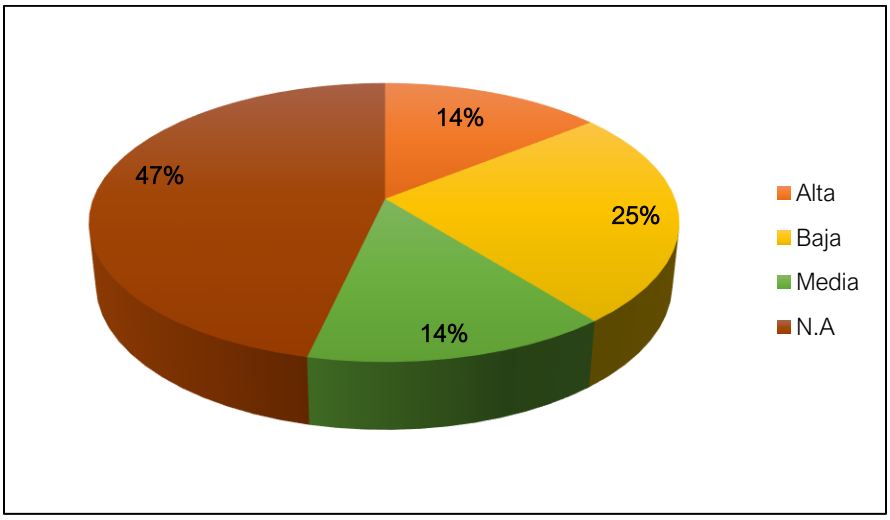

Fuente: Consorcio DRMI Río Minero 2025

1.1.1.1.4 Elaborar Estrategia de Participación y Comunicación

Para la formulación de la estrategia de participación y comunicaciones del DRMI y PNR es necesario desarrollar una secuencia de acciones que aseguren una implementación alineada con los requerimientos técnicos, las directrices del SINAP y las particularidades sociales, económicas y culturales del territorio. En este sentido, el equipo social se encuentra preparando el plan operativo para cada una de las áreas protegidas, orientado a estructurar, ordenar y orientar las actividades, garantizando su cumplimiento conforme a las fases y lineamientos establecidos en la guía del SINAP.

A la fecha, se ha elaborado el documento borrador de la estrategia de participación, el cual incorpora la metodología correspondiente y una propuesta metodológica preliminar del plan operativo, que servirá como base para la planificación detallada de las acciones a implementar en la estrategia de participación. Paralelamente, se avanza en el diseño gráfico y la definición de las especificaciones técnicas de los pendones.

A continuación, se presenta la propuesta metodológica inicial del plan operativo, junto con la tabla relacionando el porcentaje de las actividades ejecutadas para este periodo.

Tabla 7 *Propuesta preliminar del plan operativo*

Tareas	Producto	Propuesta metodológica
Promover facilitar articulación interinstitucional: identificación y caracterización de los actores estratégicos en el AP y propuesta de esquema facilite que la articulación interinstitucional	Esquema para la articulación entre entidades relacionadas con la administración y manejo del AP establecido.	1. Realizar identificación de actores estratégicos para la gobernanza de la región a través de técnicas como rastreo de medios y entrevistas 2. Construir base de datos inicial con análisis de roles e incidencia en el área protegida y la gobernanza. 3. Realizar encuentro virtual con los actores identificados con el fin de hacer procesos de análisis de capacidades y revisar propuestas para la consolidación del esquema 4. Elaborar una propuesta de articulación con los aportes recolectados en los encuentros virtuales y los resultados de la valoración de actores
Diseñar conformar Esquema y el de Gobernanza para la administración y manejo del AP.	Esquema Gobernanza para de la administración y manejo del AP diseñado y en conformación.	1. Realizar mesas de trabajo virtuales o presenciales con los actores que conformen la figura de articulación consolidad en la primera fase. 2. Plantear una metodología de trabajo con los actores del esquema a través de herramientas de recolección de información y diálogos de saberes que permitan construir los tres insumos que conformaran el esquema de gobernanza: • Análisis competencias, funciones de e intereses de los actores estratégicos para la administración y manejo del AP • Análisis de posibles instancias, mecanismos o instrumentos para la administración y manejo del AP. • Diseño, concertación y conformación del esquema de gobernanza para la administración y manejo del AP
Tareas	**Producto**	**Propuesta metodológica**
Elaborar Estrategia Participación Comunicación.	Estrategia a actores sociales considerados estratégicos para la planificación del AP, que permita la generación de espacios de participación con su respetivo cronograma de trabajo.	1. Realizar la identificación de actores clave del DRMI y PNR 2. Realizar la caracterización social y económica del municipio que hacen parte del DRMI Río Minero y PNR serranía 3. Revisar y consolidar un marco conceptual que oriente la ruta metodológica de la estrategia 4. Diseñar la estrategia comunicativa y el material divulgativo 5. Plantear la ruta metodológica y sus alcances 6. Diseñar los escenarios de participación y socialización de acuerdo a los resultados de la identificación de actores y los lineamientos metodológicos de la estrategia enfocados a cumplir los alcances de cada fase de la formulación- Aprestamiento- Formulación (Diagnóstico, ordenamiento y componente estratégico)

FUENTE: CONSORCIO DRMI RÍO MINERO 2025

Los avances de las actividades se relacionan en la siguiente tabla:

Tabla 8 *Actividades ejecutadas en la estrategia de participación*

ID	Actividad	Descripción	Soporte	Actividad programada (%)	Actividad ejecutada (%)
DRMI RÍO MINERO Y SUS ZONAS ALEDAÑAS					
1.1.3	Elaborar Estrategia de Participación y Comunicación	Análisis que permita identificar preliminarmente los actores sociales que puedan ser estratégicos para el proceso de planificación del manejo del AP y sus roles. Diseño de estrategia para interesar e involucrar a actores estratégicos en la administración y manejo del AP. Identificación de requerimientos de comunicación por grupos objetivo identificados.	Documento borrador estrategia de participación y comunicación	0.78%	0.09%
PNR SERRANÍA DE LAS QUINCHAS					
2.1.3	Elaborar Estrategia de Participación y Comunicación	Análisis que permita identificar preliminarmente los actores sociales que puedan ser estratégicos para el proceso de planificación del manejo del AP y sus roles. Diseño de estrategia para interesar e involucrar a actores estratégicos en la administración y manejo del AP.	Documento borrador estrategia de participación y comunicación	0.34%	0.27%

		Identificación de requerimientos de comunicación por grupos objetivo identificados.			

FUENTE: CONSORCIO DRMI RÍO MINERO 2025

1.1.1.1.5 Revisar coherencia y generar capacidades

Se inició la revisión documental de los actos administrativos de declaratoria para el análisis de coherencia de los objetivos de conservación. Paralelamente, se inició la estructuración de la metodología que orientará esta evaluación, definiendo criterios, procedimientos y herramientas de análisis que permitan asegurar la consistencia de los OEC con el régimen normativo vigente, el contexto territorial y las directrices del SINAP.

Tabla 9 *Actividades ejecutadas en la revisión y coherencia de los OEC*

ID	Actividad	Descripción	Soporte	Actividad programada (%)	Actividad ejecutada (%)
DRMI RÍO MINERO Y SUS ZONAS ALEDAÑAS					
1.1.4	Revisar coherencia entre los objetivos de conservación y el área definidas como área protegida y generar capacidades.	Sistematización y análisis de los aprendizajes obtenidos en procesos anteriores en el AP y otras AP afines. Revisión y análisis de los objetivos de conservación. Identificación de capacidades (operativas, técnicas, financieras, logísticas, etc.) al interior de las autoridades relacionadas con la administración y manejo del AP Definición de necesidades de fortalecimiento de capacidades (operativas, técnicas, logísticas,	Documento borrador de la actividad 1.1.4	0.78%	0.12%

		financieros, etc.). Gestión de apoyos requeridos para la generación de capacidades.			
PNR SERRANÍA DE LAS QUINCHAS					
2.1.4	Revisar coherencia entre los objetivos de conservación y el área definidas como área protegida y generar capacidades.	Sistematización y análisis de los aprendizajes obtenidos en procesos anteriores en el AP y otras AP afines. Revisión y análisis de los objetivos de conservación. Identificación de capacidades (operativas, técnicas, financieras, logísticas, etc.) al interior de las autoridades relacionadas con la administración y manejo del AP Definición de necesidades de fortalecimiento de capacidades (operativas, técnicas, logísticas, financieros, etc.). Gestión de apoyos requeridos para la generación de capacidades.	Documento borrador de la actividad 2.1.4	0.34%	0.27%

FUENTE: CONSORCIO DRMI RÍO MINERO 2025

1.3 Actividades Administrativas

En este primer periodo se han desarrollado las siguientes actividades administrativas

1.1.2 Seguimiento y control

En cuanto al seguimiento y control, se han reportado los siguientes avances en el plan de trabajo

Fecha	Corte
30/10/2025	PDT semana 2 corte 27-10-2025
03/11/2025	PDT semana 3 corte 03-11-2025
10/11/2025	PDT semana 4 corte 10-11-2025

FUENTE: CONSORCIO DRMI RÍO MINERO 2025

1.1.3 Oficios entregados

En cuanto a los oficios enviados por parte del Consorcio DRMI Río Minero durante el periodo comprendido entre el 15 de octubre y el 14 de noviembre, se efectuó el envío de los siguientes oficios:

Tabla 10 *Oficios radicados*

Fecha	Radicado	Destinatario	Referencia
14/10/2025	CDM-001-2025	Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS Gestión ambiental & HSEQ S.A.S.	Entrega de Plan de Trabajo y Cronograma para firma del Acta de Inicio – Contrato 01166 de 2025 (CM2-015-2025)
23/10/2025	CDM-002-2025 RDO-22511-2025	Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS Gestión ambiental & HSEQ S.A.S.	Solicitud de información CAS Contrato No. 01166-2025
30/10/2025	CDM-003-2025	Gestión ambiental & HSEQ S.A.S.	Respuesta a oficio OF-MG-02-25. Solicitud de documentos de inicio para revisión interventoría.
06/11/2025	CDM-009-2025 RAD-23639-2025	Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS Gestión ambiental & HSEQ S.A.S.	Remisión de oficios para solicitud de información a las administraciones municipales
13/11/2025	CDM-010-2025	Gestión ambiental & HSEQ S.A.S.	Respuesta a oficio OF-MG-03-25. Lineamientos y/o metodología de programación para la elaboración, seguimiento y control del cronograma de ejecución, para el contrato de consultoría 01166-2025.

FUENTE: CONSORCIO DRMI RÍO MINERO 2025

1.1.4 Oficios recibidos

En la siguiente tabla se relacionan los oficios recibidos durante el periodo comprendido entre el 15 de octubre y el 14 de noviembre:

Tabla 11 *Oficios recibidos*

Fecha	Radicado	Destinatario	Referencia
17/10/2025	OF-MG-02-25	Consorcio DRMI Rio Minero 2025	Solicitud de documentos de inicio para revisión interventoría
30/10/2025	OF-MG-03-25	Consorcio DRMI Rio Minero 2025	Lineamientos y/o metodología de programación para la elaboración, seguimiento y control del cronograma de ejecución, para el contrato de la Referencia.
06/11/2025	OF-MG-04-25	Consorcio DRMI Rio Minero 2025	Solicitud de información sobre dedicación del personal ofertado

FUENTE: CONSORCIO DRMI RÍO MINERO 2025

1.1.5 Productos entregados

A la fecha del presente informe no se ha realizado la entrega oficial de los productos correspondientes a las actividades de la fase de aprestamiento. No obstante, para efectos de seguimiento del PDT, se han remitido como soportes los documentos preliminares que se encuentran en elaboración.

1.4 Observaciones y recomendaciones

1.1.6 Ejecución y avance del PDT

I. Avance físico: se presenta un avance físico global del 8.56% ejecutado, frente al 8.62% programado, lo que representa una diferencia negativa de -0,06%.
II. Avance Financiero: a la fecha, se reporta un valor de $ 209.716.234 ejecutado frente a un valor de $ 211.137.751 programado evidenciando una diferencia financiera negativa de -$1.536.

1.1.7 Conclusiones y recomendaciones

I. Aunque la ejecución técnica avanza de manera simultánea en las dos áreas protegidas objeto del contrato, se requiere implementar acciones de nivelación específicas para las actividades del DRMI Río Minero, con el fin de corregir las

desviaciones identificadas respecto a los tiempos estipulados en el plan de trabajo aprobado y garantizar el cumplimiento de los hitos contractuales.
