	FORMATO ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO		
gestión ambiental & hseq SAS	IINTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO ESTUDIOS PARA LA DELIMITACION DE LA RONDA HIDRICA DE LA QUEBRADA LAS GACHAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE SANTANDER	VERSIÓN 1.0	GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS

CONTRATO No 00934 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción) **ACTA No** 5 Páginas Totales 4

OBJETO DEL CONTRATO

ESTUDIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LA RONDA HÍDRICA DE LA QUEBRADA LAS GACHAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, SANTANDER.

I. PARTICIPANTES	AREA / ENTIDAD	CARGO	FIRMA
Diana C. Ramos M	Interventoria	Representante Legal	Asistencia Virtual
Berenice Garces G	Consultor	Director Consultoria	Asistencia Virtual
Diana Sanchez	Consultor	Recurso Hídrico	Asistencia Virtual
Jose Nayith Contreras	Consultor	Geomorfología	Asistencia Virtual
César Rojas	Consultor	Geomorfología	Asistencia Virtual
Oscar Leal	Supervision CAS	Apoyo Supervisión	Asistencia Virtual
Anderson Usma	Interventoria	Hidrologo	Asistencia Virtual
Claudia Valero	Supervision CAS	Apoyo Supervisión	Asistencia Virtual
Mayra Salazar	Consultor	Coordinador	Asistencia Virtual
Miguel Ortiz	Interventoria	Director Interventoría	Asistencia Virtual



II. AGENDA O TEMARIO

Toma de listado de asistentes

Presentación de la propuesta del área de estudio de componente geomorfologico e hidrologico

Concertación interdisciplinaria del área de trabajo

Revisión de observaciones del componente de hidrología

Definición del area final de trabajo

Se anexa a esta acta la presentación realizada por el consutlor.

III. LUGAR Y HORA

LUGAR meet.google.com/eex-hmjd-iqz **HORA** 4 pm

Grabación https://drive.google.com/file/d/1REQheknZ2aShjo-EN9pK3ohostQua0Ed/view?usp=drive_link

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

COMPROMISOS PACTADOS	COMENTARIO Y/U OBSERVACION	FECHA ENTREGA - RESPONSABLES
No se revisaron compromisos pactados en esta reunión		

V. TEMAS TRATADOS


	FORMATO ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO		
gestión ambiental & hseq SAS	IINTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO ESTUDIOS PARA LA DELIMITACION DE LA RONDA HIDRICA DE LA QUEBRADA LAS GACHAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE SANTANDER	VERSIÓN 1.0	GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS

CONTRATO No 00934 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción) **ACTA No** **5** Páginas Totales 4

OBJETO DEL CONTRATO

ESTUDIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LA RONDA HÍDRICA DE LA QUEBRADA LAS GACHAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, SANTANDER.

Metodología para la defínción de las areas de trabajo de los componentes de geomorfología e hidrología

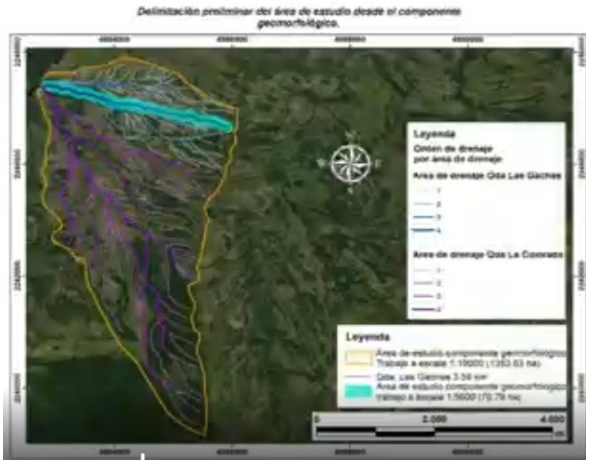



Presentacion de Actividades/productos/Insumos por parte del Consultor:

En desarrollo de la reunión, el consultor César Augusto Rojas Ruiz presentó la metodología implementada para la definición del área de trabajo del componente geomorfológico, exponiendo los criterios técnicos considerados en la delimitación y la forma en que se integraron las variables morfoestructurales, topográficas e hidrográficas.
Explicó que el enfoque metodológico parte de un análisis a escala macro, donde se identifican las principales geomorfounidades y se establecen las divisorias naturales que conforman la cuenca de estudio, con el fin de definir el área de análisis a escala 1:5.000 y 10.000.

Posteriormente, la profesional encargada del componente de hidrología de la consultoría expuso los criterios empleados para definir el área de trabajo correspondiente a dicho componente, presentando las bases técnicas y los insumos cartográficos utilizados en el proceso.

Durante esta exposición, el equipo de la interventoría formuló diversas observaciones y aclaraciones, principalmente relacionadas con las salidas cartográficas incluidas en los documentos entregados. Se evidenciaron inconsistencias en el trazado de los drenajes y en su correspondencia con el límite propuesto del área de trabajo.
Por tal motivo, se solicitó formalmente a la consultoría remitir la cartografía base utilizada para la delimitación, con el fin de realizar una verificación técnica detallada por parte del equipo interventor.

El profesional Miguel Felipe Ortiz Higuera, de la interventoría, señaló la necesidad de que en el documento técnico se explique de manera más detallada la justificación del área de trabajo propuesta a escala 1:5.000, en especial el criterio aplicado para la generación del buffer presentado, de modo que se asegure la trazabilidad metodológica y su coherencia con la delimitación hidrológica.

Aprovechando el espacio, se realizó una revisión rápida de las observaciones correspondientes al componente de hidrología, las cuales no estaban inicialmente programadas en la agenda. En este punto, el hidrólogo de la interventoría, Anderson Usma Madroñero, precisó que las observaciones consignadas previamente no aplican al documento actualmente en revisión, dado que este no incluye aún la descripción detallada de las metodologías hidrológicas empleadas.
El equipo consultor aclaró que dichas metodologías serán presentadas en un documento complementario específico para el componente hidrológico, donde se detallarán los procedimientos técnicos adoptados.

Finalmente, se llevó a cabo la concertación del área de trabajo definitiva, acordándose que, de manera temporal, se adoptará el área propuesta por el componente de hidrología como área de trabajo general. No obstante, esta quedará sujeta a la revisión y aprobación por parte de la interventoría, una vez la consultoría entregue la cartografía solicitada y se verifique la correspondencia entre los límites propuestos y la red de drenaje empleada.
De encontrarse conforme la información técnica, se procederá a emitir el visto bueno; en caso contrario, se generarán las observaciones pertinentes para su ajuste.

La Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) manifestó su conformidad con los acuerdos alcanzados y apoyó la decisión de realizar la validación conjunta de los insumos cartográficos antes de la aprobación definitiva del límite del área de trabajo.

	FORMATO ACTA DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO		
gestión ambiental & hseq SAS	IINTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL PROYECTO ESTUDIOS PARA LA DELIMITACION DE LA RONDA HIDRICA DE LA QUEBRADA LAS GACHAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE SANTANDER	VERSIÓN 1.0	GESTION AMBIENTAL & HSEQ SAS

CONTRATO No 00934 (Número de Contrato) **DE** 2025 (Año de suscripción) **ACTA No** **5** Páginas Totales 4

OBJETO DEL CONTRATO

ESTUDIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LA RONDA HÍDRICA DE LA QUEBRADA LAS GACHAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, SANTANDER.

VI. COMPROMISOS PACTADOS	FECHA ENTREGA	RESPONSABLES
Entrega de la cartografía utilizada para la definición del límite del área de trabajo y la presentación de las metodologías empleadas en su delimitación.	15/10/2025	Consultor
Revisión y formulación de observaciones sobre la cartografía propuesta para los límites del área de trabajo, con el fin de emitir el visto bueno y concertar el límite final.	17/10/2025	Consultor - interventoria -CAS

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA **DÍA** 17 **MES** Octubre **AÑO** 2025

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría.

en Bogotá., a los **catorce** (Día en letras) **(14)** (Día en números) días del mes de **Octubre** (Mes en que se firma el acta) de **2025** (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) DIANA CAROLINA RAMOS

Representantel Legal - Directora de Proyectos

Original : Dependencia responsable del contrato.
1ra copia : Interventor.
2da copia : Contratista
