ALCALDÍA MUNICIPAL DE FONSECA LA GUAJIRA **NIT: 892.170.008-3**					
FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN					
DESDE 22/08/2025 – HASTA 21/10/20254					
CONTRATO	X	***CONVENIO***			
INFORME PARCIAL	*X*	***INFORME FINAL***			
1. OBJETIVO					
SEGUIMIENTO Y VERIFICACION A LA EJECUCION DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA SUSCRITO					
2. DATOS GENERALES					
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN		CMA			
TIPO DE CONTRATO		INTERVENTORIA			
SECRETARÍA U OFICINA QUE GENERA LA NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO)		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL			
CONTRATO/CONVENIO		CONTRATO DE INTERVENTORIA 002 – 2025			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO		15-08-2025			
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA			
CONTRATISTA		CONSORCIO INTER-DIGITAL FONSECA			
NIT		901.977.531-0			
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO		$446.576.060 MDA/CTE			
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS		EL Municipio entregará al contratista un anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato y pagará el valor del contrato, por porcentaje de avance del contrato vigilado o intervenido aplicando el porcentaje del contrato de interventoría a las actas de avance del contratista; en ellas debe constar que las actividades correspondientes se ejecutaron dando cumplimiento al cronograma presentado, y aprobado por el Supervisor.			
PLAZO DEL CONTRATO /CONVENIO		OCHO (08) MESES.			
FECHA DE INICIO		VEINTIDOS (22) DE AGOSTO DE 2025			
FECHA FINAL		VEINTI UNO (21) DE ABRIL DE 2026			
SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	ANA KARINA MENDOZA MOYA			
	FECHA DE DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN	22 de Agosto de 2025			
3. DATOS FINANCIEROS					
CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP					
N°	1525	**VALOR(ES)**	$7.626.691.189,86	**FECHA(S)**	09/07/2025
REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) – RP					
N°	2225	**VALOR(ES)**	$446.576.060	**FECHA(S)**	22/08/2025

4. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

TIPO DE APORTE	PLANILLA N°	PERSONAL
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	35363055	ELIECER SUEREZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	9493041480	RUBEN DARIO CELEDON ESCORCIA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	35369464	REYNALDO VEGA
INTERVENTOR EDUCATIVO	35369550	ALEJANDRA GONZALES
APOYO CONTABLE	35369550	KAROL VILLAZON
SECRETARIA	9493041480	ANDREA MADRID

5. DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATISTA

Según Informe de Interventoría 001 se deja la siguiente constancia de las actividades ejecutadas:

1. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA.

A continuación, se detallan las actividades administrativas realizadas por CONSORCIO INTERDIGITAL, FONSECA. como cumplimiento a las obligaciones contractuales del contrato de interventoría 002 del 2025 en el periodo de tiempo que comprende el presente informe.

1.1 CONTRATACIÓN DEL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENTORÍA.

Se realizaron los procesos de contratación del personal requerido para la ejecución de la interventoría en concordación con el equipo mínimo de trabajo solicitado en CMA – 005 y presentado en la propuesta técnica CONSORCIO INTERDIGITAL, FONSECA.

CARGO	PERSONAL	PERFIL PROFESIONAL
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	ELIECER SUEREZ	INGENIERO DE SISTEMAS.
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	RUBEN DARIO CELEDON ESCORCIA	ARQUITECTO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	REYNALDO VEGA	ING DE SISTEMAS
INTERVENTOR EDUCATIVO	ALEJANDRA GONZALES	DOCENTE EN ÁREA DE LENGUA CASTELLANA E INGLÉS.
APOYO CONTABLE	KAROL VILLAZON	CONTADOR PUBLICO
SECRETARIA	ANDREA MADRID	ASISTENTE ADMINISTRATIVA.

1.1.1 APORTES PARAFISCALES DEL PERSONAL VINCULADO A LA INTERVENTORÍA.

CARGO	PERSONAL	NÚMERO DE PLANILLA AGOSTO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	ELIECER SUEREZ	35363055
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	RUBEN DARIO CELEDON ESCORCIA	9493041480
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	REYNALDO VEGA	35369464

INTERVENTOR EDUCATIVO	ALEJANDRA GONZALES	35369550
APOYO CONTABLE	KAROL VILLAZON	35369550
SECRETARIA	ANDREA MADRID	9493041480

1.2 ALQUILER DE OFICINA.

Se realizó el contrato de arrendamiento de local comercial celebrado entre la empresa inmobiliaria Lavi inmobiliaria S.AS y CONSORCIO INTER DIGITAL 2025 Dicho inmueble se encuentra ubicado en la ciudad de Valledupar, en la dirección CR 23 9 B 06 el contrato se encuentra como documento anexo del presente informe.

1.3 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.

- **Papelería, Informes, Fotocopia:**

Incluye todos los gastos de papelería empleados para el desarrollo de las actividades de oficina, notificación de comunicados al personal, documento de informes, impresiones a color para evidencias y registro fotográfico.

- **Gastos de transportes:**

Estos se generaron por el desplazamiento del personal del equipo de trabajo a los puntos de ejecución del proyecto a supervisar.

2. ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA REALIZADAS.

Verificación del cumplimiento de las obligaciones contraculturales del contratista CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025 durante el periodo de tiempo que compete al presente informe de interventoría (22- 08-2025 al 21-09-2025) por lo cual se realizaron las siguientes actividades:

2.1 LECTURA Y DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO OBJETO DE INTERVENTORÍA.

Para ejercer de manera correcta el objeto de la interventoría técnica, administrativa y financiera para el contrato de suministro 002 del 2025 con objeto FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA, fue necesario el estudio y socialización con el equipo de trabajo de todos los documentos del proyecto, tales como: Documento técnico, Estudios y diseños, planos, memorias, componente del proyecto, de igual forma se estudia y análisis la propuesta con la que participó el contratista del proyecto, una vez realizada esta actividad la interventoría posee mayor facultad para realizar su objeto contractual.

2.2 VERIFICACIÓN DE DOCUMENTO DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATISTA.

Se realizó la solitud al contratista CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025 de la siguiente documentación con la finalidad de ser validada por la interventoría.

- Documentos de RUT : La cual fue validada por la interventoría.
- Pólizas contractuales actualizadas.

PÓLIZA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTOS No. 47-44-101031991.	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	22/08/2025 a 22/08/2026	$ 717.969.769,19
Buen manejo y correcta inversión del anticipo.	22/08/2025 a 22/04/2026	$ 3.589.848.845,93
Pago de salaries, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones.	22/08/2025 a 22/04/2029	$ 358.984.884,59
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	22/08/2025 a 22/04/2027	$ 717.969.769,19
Calidad de servicio.	22/08/2025 a 22/04/2026	$ 717.969.769,19

2.3 VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DEL CONTRATISTA.

Actividad # 1.

Supervisión de la activación de las licencias de la plataforma educativa por parte del contratista CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025 , encontrando las siguientes situaciones:

El contratista realizó la activación de las licencias de la plataforma tecnológica PEDIGITAL / BIBLIOPED, como primer paso para el funcionamiento de dichas plataformas

La Interventoría verificó que los licenciamientos activados por parte del contratista por cada área del conocimiento, corresponden a la plataforma educativas con funcionamiento en ambiente WEB, cumpliendo con el requerimiento establecidos en las especificaciones técnicas del pliego de condiciones y establecidas en el contrato de suministro 002 del 2025. A continuación, se desglosan las licencias activadas y se valida que éstas tengan disponibles las asignaturas establecidas como requisitos en los documentos contractuales y pliego de condiciones.

AULAS EDUCATIVA VIRTUAL EN WEB CIENCIAS MATEMÁTICAS.

INSTITUCIONES EDUCATIVA	LICENCIA ACTIVADA POR EL CONTRATISTA	OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA.
Licencia Aula Educativa Virtual Web Matemáticas		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA - SEDE PRINCIPAL	CSIEEPMS - MT Aulas Educativa Virtual En Web Ciencias Matemáticas	Interventoría válida la activación de la licencia plataforma educativa PEDIGITAL para cada una de las sedes beneficiarias, así mismo se valida que

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ - SEDE PRINCIPAL	CSIERAJP - MT Aulas Educativa Virtual En Web Ciencias Matemáticas	corresponde al área de Matemáticas contiene las siguientes asignaturas: - Matemáticas de grado de 1° a 11° - **Concepto interventoría:** Cumple con las especificaciones.
INSTITUCIONES EDUCATIVA	**LICENCIA ACTIVADA POR EL CONTRATISTA**	**OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA.**
Activación de licencias de Aulas virtual en web Ciencias Naturales.		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA - SEDE PRINCIPAL	CSIEEPMS - CN Aulas virtual en web Ciencias Naturales	Interventoría validó la activación de las licencias de la plataforma educativa PEDIGITAL para cada una de las sedes beneficiarias, así mismo se validó que corresponde al área de Ciencias Naturales y contiene las siguientes asignaturas: - Naturales/Biología de 1° a 11° grado - Química de 10° grado y 11° - Educación sexual de 6° a 9° grado - Educación ambiental de 6° a 9° grado. - Física 10°grado y 11° grado **Concepto interventoría:** Cumple con las especificaciones.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ - SEDE PRINCIPAL	CSIERAJP – CN Aulas virtual en web Ciencias Naturales	
INSTITUCIONES EDUCATIVA	**LICENCIA ACTIVADA POR EL CONTRATISTA**	**OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA.**
Activación de licencias de Aulas educativa virtual en Web Ciencias Sociales.		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA - SEDE PRINCIPAL	CSIEEPMS - CS Aulas virtual en web Ciencias Sociales.	Interventoría validó la activación de las licencias de la plataforma educativa PEDIGITAL para cada una de las sedes beneficiarias así mismo se validó que

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ - SEDE PRINCIPAL	CSIERAJP - CS Aulas virtual en web Ciencias Sociales.	corresponde al área de Ciencias Sociales y contiene las siguientes asignaturas: - Sociales de 1° a 11° grado - Constitución de 6° a 11° - Catedra de la Paz de 1° a 11° - Filosofía de 10° y 11° **Concepto interventoría:** Cumple con las especificaciones.
INSTITUCIONES EDUCATIVA	**LICENCIA ACTIVADA POR EL CONTRATISTA**	**OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA.**
Activación de licencias de Aulas educativa virtual en Web Lengua Castellana e inglés.		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA - SEDE PRINCIPAL	CSIEEPMS - LC Aulas virtual en web Lengua castellana e Ingles	Interventoría validó la activación de la licencia de la plataforma educativa PEDIGITAL para cada una de las sedes beneficiarias así mismo se validó que corresponde al área de lenguaje e inglés y contiene las siguientes asignaturas: - Lengua castellana de 1° a 11° grado. - Ingles de 1° a 11° grado. **Concepto interventoría:** Cumple con las especificaciones.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ - SEDE PRINCIPAL	CSIERAJP - LC Aulas virtual en web Lengua castellana e Inglés.	
INSTITUCIONES EDUCATIVA	**LICENCIA ACTIVADA POR EL CONTRATISTA**	**OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA.**
Activación de licencias de Aulas educativa virtual en Web modulo transversal.		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO PARODI		

MEDINA - SEDE PRINCIPAL	CSIEEPMS - ET Aulas virtual en web modulo transversal.	Interventoría validó la activación de las licencias de la plataforma PEDIGITAL para cada una de las sedes beneficiarias así mismo se validó que corresponden al módulo de educación transversal y contiene los siguientes módulos: - Emprendimiento de 3° a 11° grado - Urbanidad, Ética y Valores de 1° a 11° grado. - Informática de 1° a 11° grado. **Concepto interventoría:** Cumple con las especificaciones.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ - SEDE PRINCIPAL	CSIERAJP - ET Aulas virtual en web modulo transversal.	
INSTITUCIONES EDUCATIVA	**LICENCIA ACTIVADA POR EL CONTRATISTA**	**OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA.**
Modulo Virtual Web Play-Zone		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA - SEDE PRINCIPAL	CSIEEPMSPB – PZ Modulo Virtual Web Play-Zone	La interventoría del contrato realizó la revisión técnica del módulo Playzone de juego, verificando el cumplimiento de las características técnicas establecidas en las especificaciones del proyecto. Una vez efectuadas las inspecciones correspondientes, se constató la activación del módulo cumplen con los requerimientos de calidad, seguridad y funcionalidad exigidos. Por tanto, la interventoría aprueba el cumplimiento de las características técnicas del licenciamiento.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ - SEDE PRINCIPAL	CSIERAJP - PZ Modulo Virtual Web Play-Zone	
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ROIG Y VILLALBA- SEDE PRINCIPAL	CSIETRVPB - PZ Modulo Virtual Web Play-Zone	
INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGON- SEDE PRINCIPAL.	CSIEJJAPB - PZ Modulo Virtual Web Play-Zone	
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE FONSECA - SEDE PRINCIPAL	CSIETAFPB - PZ Modulo Virtual Web Play-Zone	
INSTITUCIONES EDUCATIVA	**LICENCIA ACTIVADA POR EL CONTRATISTA**	**OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA.**

Modulo Entrenador Modulo E		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA - SEDE PRINCIPAL	Entrenador Modulo E CSIEEPMSPB - ME	Interventoría validó la activación de las licencias de la plataforma PEDIGITAL para cada una de las sedes beneficiarias así mismo se validó que corresponden al módulo de entrenados de pruebas MODULO E - Entrenamiento pruebas Saber 3, 5, 9 y 11º - Simulacros - bando de contenido educativo mentefactos . **Concepto interventoría:** Cumple con las especificaciones
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ - SEDE PRINCIPAL	Entrenador Modulo E - CSIERAJP - ME	
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ROIG Y VILLALBA- SEDE PRINCIPAL	Entrenador Modulo E CSIETRVPB - ME	
INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGON- SEDE PRINCIPAL.	Entrenador Modulo E CSIEJJAPB - ME	
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE FONSECA - SEDE PRINCIPAL	Entrenador Modulo E CSIETAFPB - ME	
INSTITUCIONES EDUCATIVA	**LICENCIA ACTIVADA POR EL CONTRATISTA**	**OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA.**
Modulo Explora tu conocimiento		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA - SEDE PRINCIPAL	Modulo Explora tu conocimiento: CSIEEPMSPB - MEX	La interventoría del contrato realizó la revisión técnica del módulo Explora tu conocimiento de juego, verificando el cumplimiento de las características técnicas establecidas en las especificaciones del proyecto. Una vez efectuadas las inspecciones correspondientes, se constató la activación del módulo cumplen con los requerimientos de calidad, seguridad y funcionalidad exigidos. **Concepto interventoría:** Cumple con las especificaciones
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ - SEDE PRINCIPAL	Modulo Explora tu conocimiento: CSIERAJP - MEX	
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ROIG Y VILLALBA- SEDE PRINCIPAL	Modulo Explora tu conocimiento: CSIETRVPB - MEX	
INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGON- SEDE PRINCIPAL.	Modulo Explora tu conocimiento: CSIEJJAPB - MEX	
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE	Modulo Explora tu conocimiento: CSIETAFPB - MEX	

FONSECA - SEDE PRINCIPAL		
INSTITUCIONES EDUCATIVA	**LICENCIA ACTIVADA POR EL CONTRATISTA**	**OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA.**
AMBIENTE DE BIBLIOTECA - Plataforma BIBLIOPED		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA - SEDE PRINCIPAL	BIBLIOPED modulo 1: CSIEEPMSPB - M1 BIBLIOPED modulo 2: CSIEEPMSPB - M2 BIBLIOPED modulo 3: CSIEEPMSPB - M3	Interventoría validó la activación de las licencias de la plataforma BIBLIOPED para cada una de las sedes beneficiarias así mismo se validó que corresponden los siguientes módulos: - Modulo1: Repositorio de contenidos educativos de todas las áreas del conocimiento (Matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, lenguaje.) - Modulo 2: Videoteca - Modulo3: Repositorio de imágenes académicas y contenidos educativos esquematizados. **Concepto interventoría:** Cumple con las especificaciones
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ROIG Y VILLALBA- SEDE PRINCIPAL	BIBLIOPED modulo 1: CSIETRVPB - M1 BIBLIOPED modulo 2: CSIETRVPB - M2 BIBLIOPED modulo 3: CSIETRVPB - M3	
INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGON-SEDE PRINCIPAL.	BIBLIOPED modulo 1: CSIEJJAPB - M1 BIBLIOPED modulo 2: CSIEJJAPB - M2 BIBLIOPED modulo 3: CSIEJJAPB - M3	
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE FONSECA - SEDE PRINCIPAL	BIBLIOPED modulo 1: CSIETAFPB - M1 BIBLIOPED modulo 2: CSIETAFPB - M2 BIBLIOPED modulo 3: CSIETAFPB - M3	


Actividad # 2.

La interventoría realiza actividades de supervisión y verificación de la actividad de configuración de la plataforma licenciada, evidenciando lo siguiente:


En el periodo que comprende el presente informe el contratista realizó la configuración de la plataforma educativa en web PEDIGITAL y BIBLIOPED acorde a las características propias de cada sede educativa beneficiaria, como nombre de la institución, símbolo como el escudo de cada institución, configuración de los componentes de la plataforma como; gestión de temas, gestión de actividades, gestión de asignaturas.

Institución educativa Ernesto Parodi medina - Sede principal.

Configuración gestión de asignaturas:

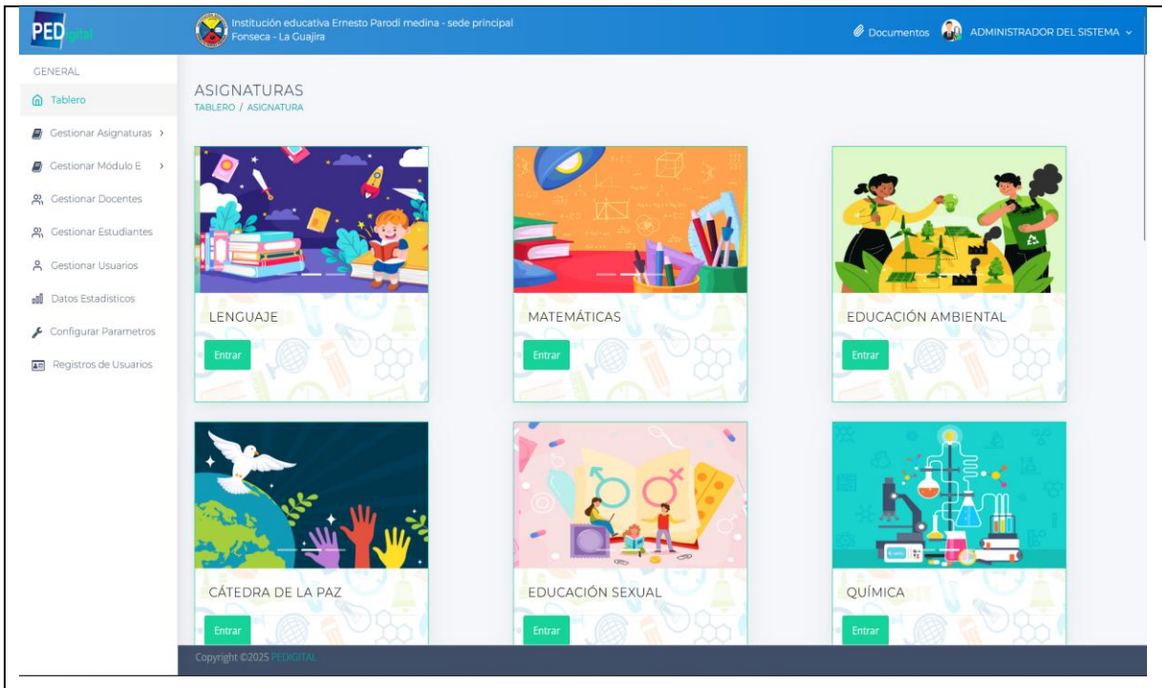



Plataforma Configurada A La Institución Educativa Rural Agroambiental José Pérez - Sede Principal.

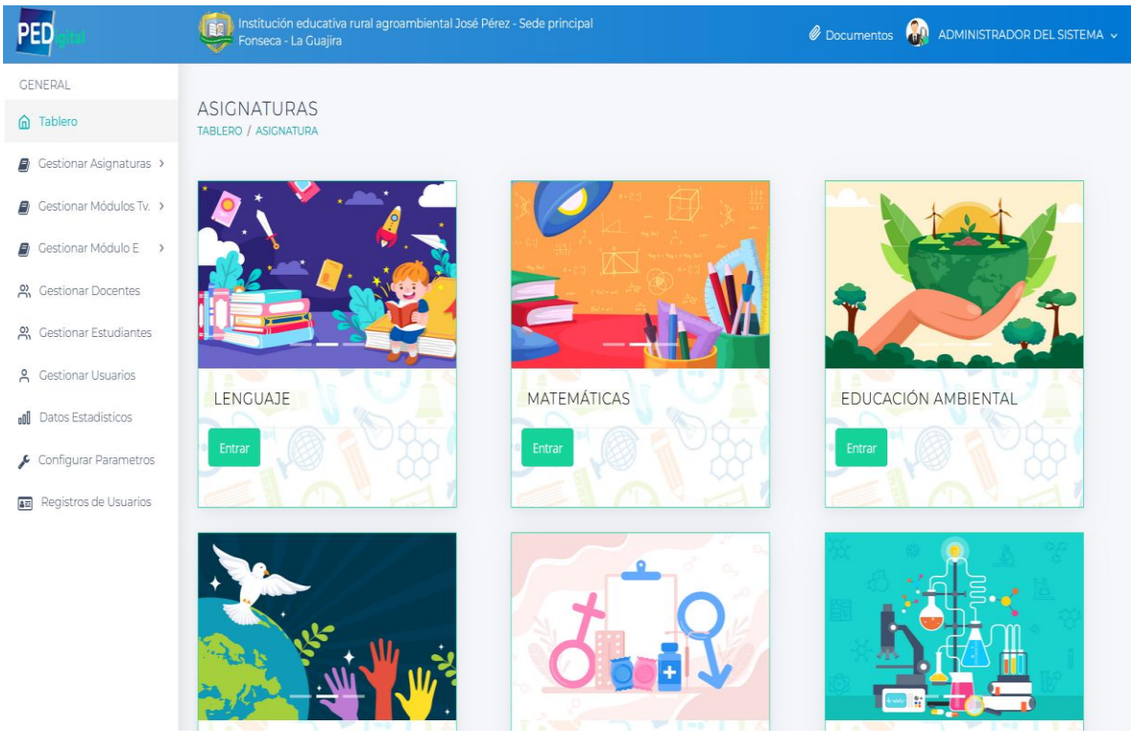

PLATAFOMA EDUCATIVA (BIBLIOPED).


- **Institución Educativa Ernesto Parodi Medina - Sede Principal.**

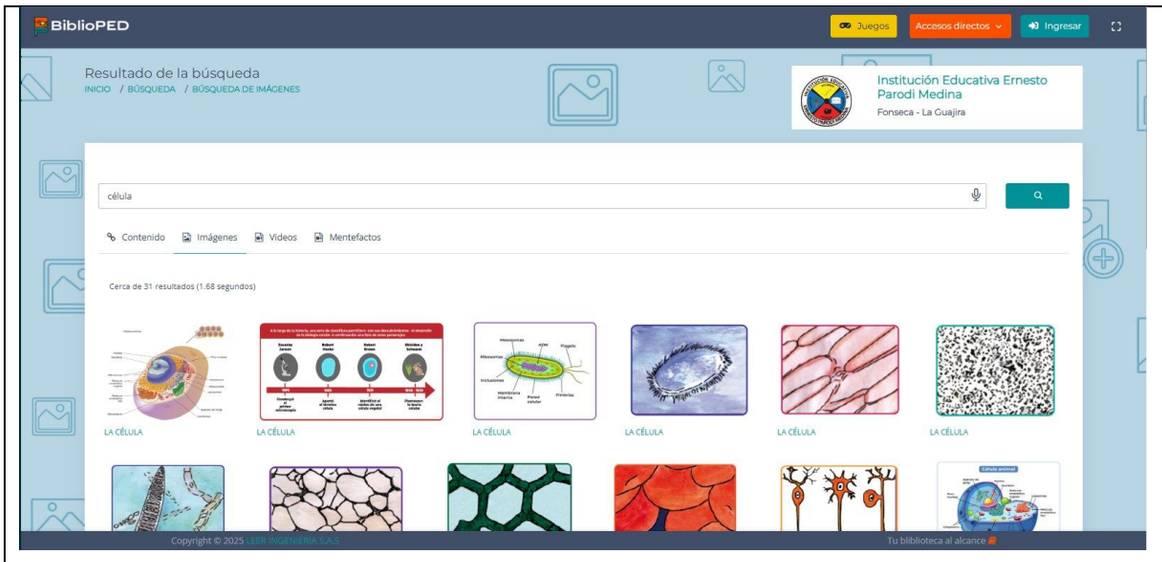

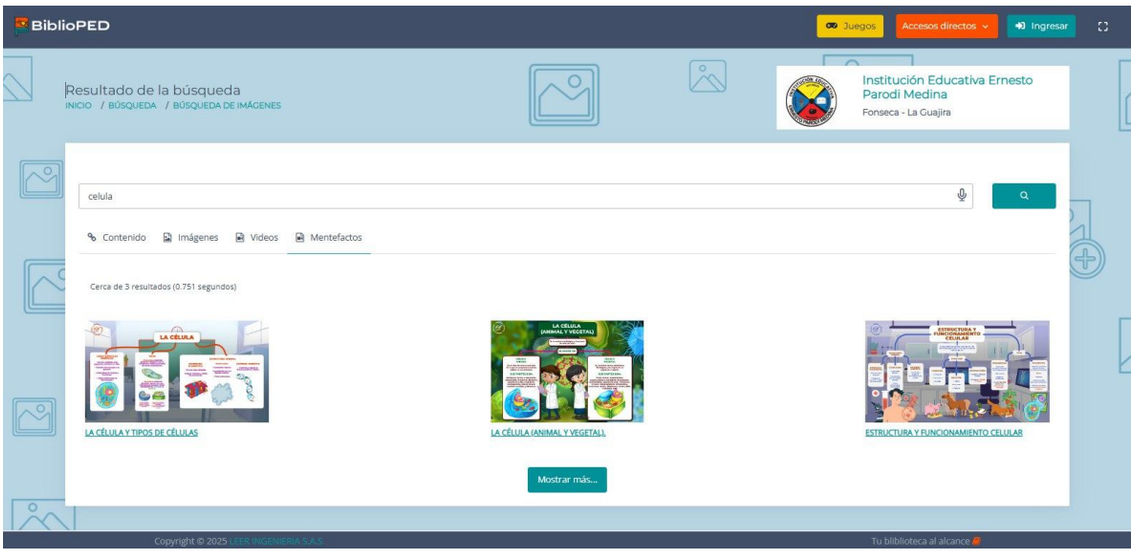



- **Institución Educativa Técnica Roig Y Villalba- Sede Principal.**



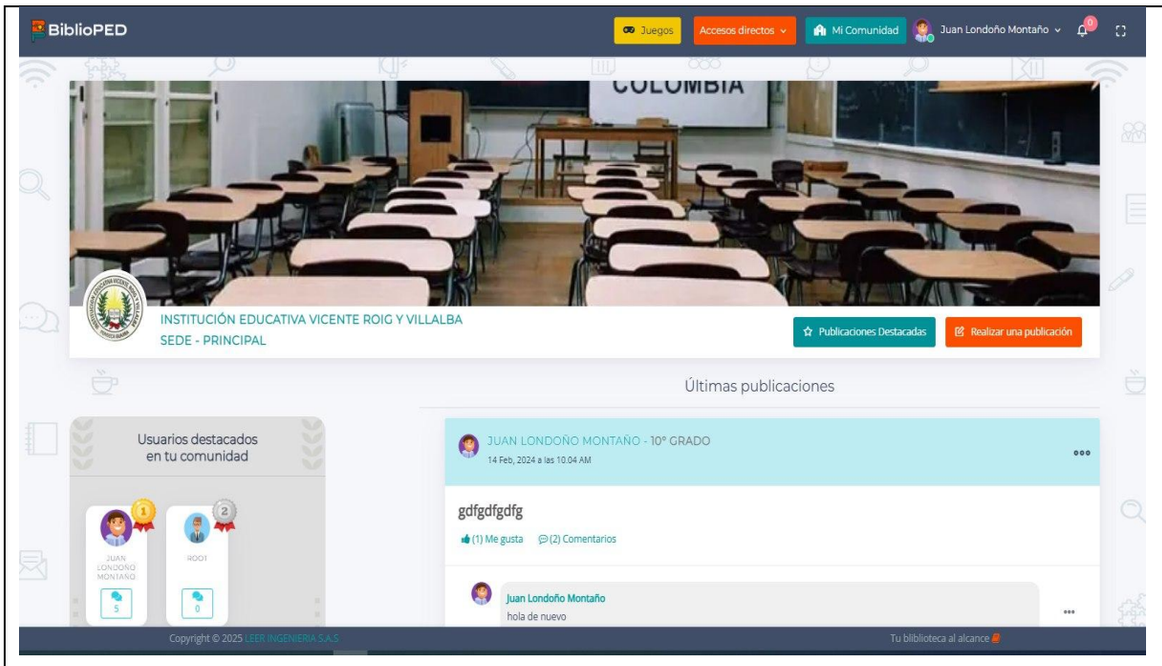



- **Institución Educativa Juan Jacobo Aragón- Sede Principal.**

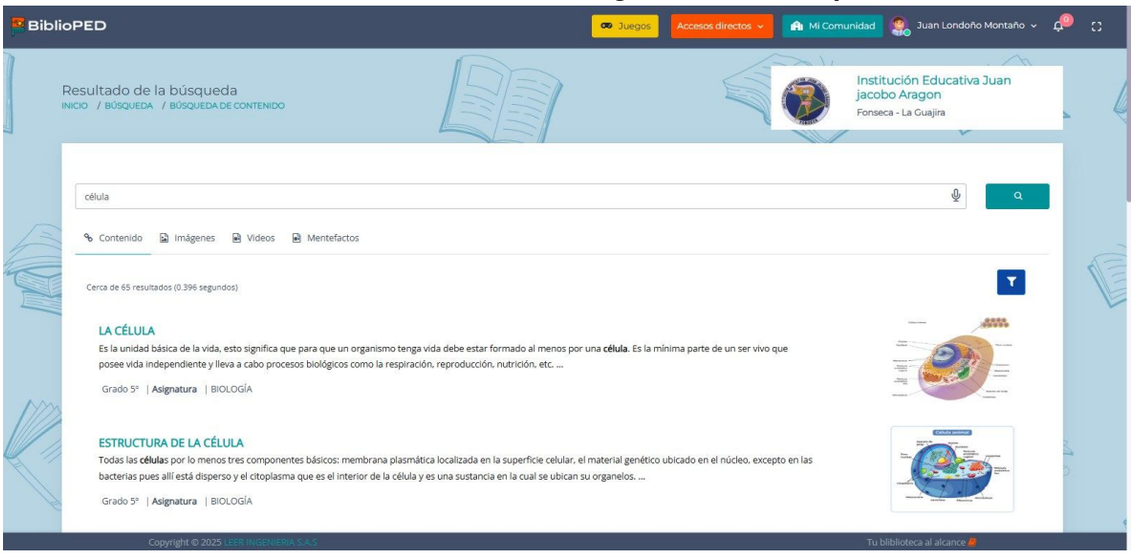

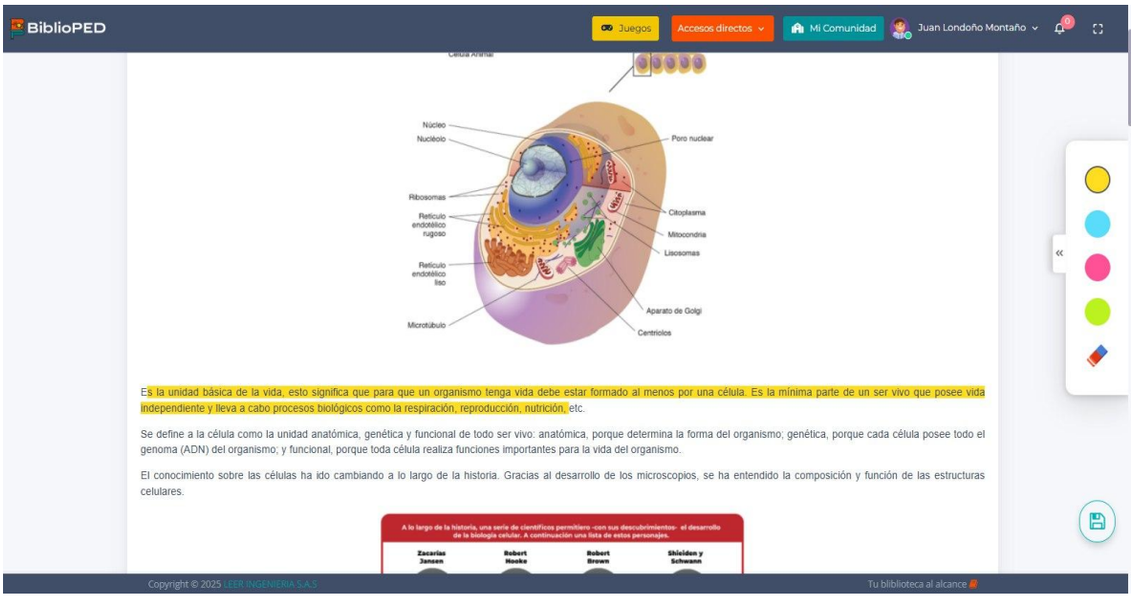

- **Institución Educativa Técnica Agropecuaria De Fonseca - Sede Principal.**

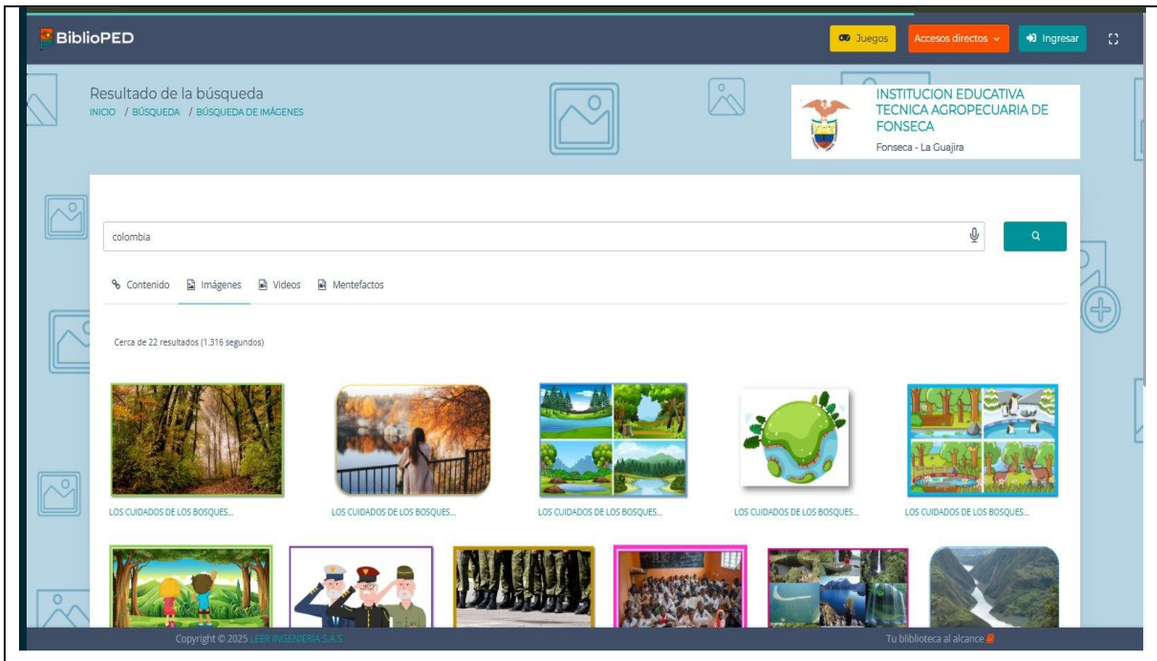

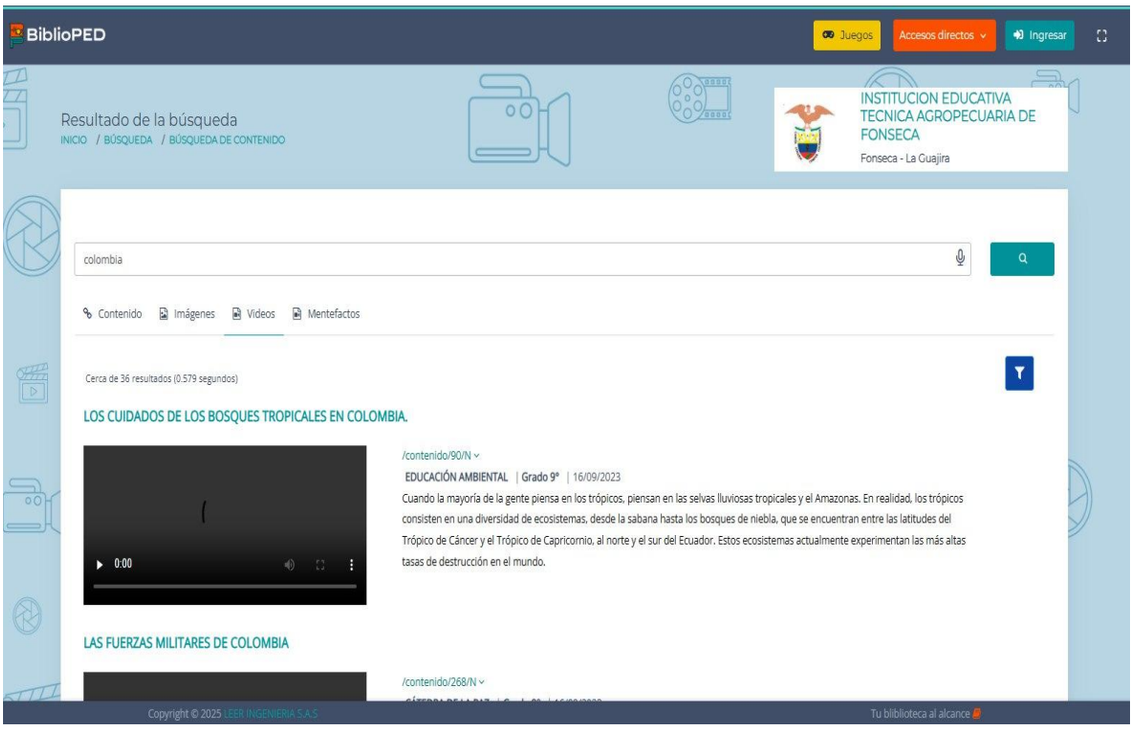

2.4 VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.

La Interventoría verificó las actividades de mejoramiento de infraestructura en las aulas de las sedes educativas beneficiarias del proyecto, evidenciando el siguiente:

EL contratista desarrolló actividades del componente preliminar, se verificó el cumplimiento de los requerimientos técnicos y los materiales empleados por el contratista.

- DEMOLICION PISO EN BALDOSIN.



- DEMOLICIÓN DE MESONES.

Institución educativa Julia Sierra Iguarán.



- DEMOLICION DE PLANTILLA EN CONCRETO.




- DEMOLICIÓN ZÓCALO EXISTENTE.



- DESMONTE DE CIELO RASO LAMINA PLANA.



DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS.

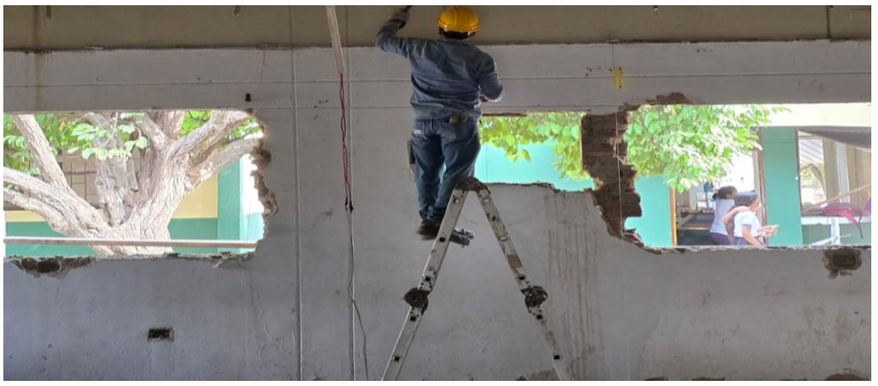

2.5 VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL CONTRATISTA. Se realizó la revisión del informe No 1 de actividades el contratista, el cual conforme a la verificación se evidencias solos las actividades del componente de implementación tecnológica, se sugiere al contratista incluir las cantidades de las actividades de componente de mejoramiento de infraestructura, en respuesta el contratista manifestó que dicho informe de actividades de mejoramiento de infraestructura será presentado de manera individual con su respectiva acta de cobro, para dar mayor claridad en relación al desarrollo de cada uno de sus actividades.

2.5.1 VERIFICACIÓN DE PAGOS DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL.

La interventoría supervisó el proceso de vinculación de equipos de trabajo del contratista y que el mismos cumpla con los perfiles y experiencia solicitados en los pliegos contractuales.

Así mismo, se validó el pago de seguridad social y otras obligaciones parafiscales por parte del contratista, las planilla se detallan a continuación.

TITULAR.	N.o PLANILLA AGOSTO	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO FONSECA DIGITAL	9494687024	Cumple.

NOMBRE	CARGO	PLANILLA AGOSTO	TIPO DE VINCULACION.
HERNÁN RAFAEL ALARCÓN ANAYA	Director Del Proyecto.	35359466	**Independiente.**
LIBANIS ARGUELLE DAZA	Coordinador General	35342913	**Independiente.**
XIAMIR ALEXANDER LUQUEZ RAMÍREZ	Profesional En Sistemas Y Programación	1077177422	**Independiente.**
LEIDER ARGUELLE DAZA	Ingeniero Electrónico	9493040702	**Dependiente integrante consorcio**
ANGIE VANESSA MEDINA GONZALEZ.	Asesor Jurídico	9494634950	**Dependiente integrante consorcio**
NATALIA INES ARGUELLES OVIEDO	Secretaria	9493042974	**Dependiente integrante consorcio**
MARIA ALVEAR	Conductor	9493042974	**Dependiente integrante consorcio**
YALETHNIS RINCONES	Supervisor Educativo	35359248	**Independiente.**
JORGE STUMMO	Profesional Contable	9493042974	**Dependiente integrante consorcio**
FABIAN ARAQUE ZUTA	Tecnólogo En Mantenimiento De Equipo Equipos.	9493040702	**Dependiente integrante consorcio**
LINETH ARGUELLES DAZA	Profesional De SG SST.	4630780760	**Independiente.**
FABIAN QUINTERO	Gestor de innovación tecnología educativa	9493040702	**Dependiente integrante consorcio**

3. INFORME DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA.

Director De Interventoría:

Se mencionan las actividades realizadas por el director de interventoría en el periodo correspondiente a este informe se encuentran:

- Realizo la planificación y socialización con el equipo de trabajo de las estrategias para la puesta en marcha de las actividades de interventoría.
- Realizó visitas a campo (sedes educativas) para verificación de condiciones iniciales.
- Realizó actividades de supervisión para llevar control económico de la ejecución del contratista y de la interventoría.
- Realizó el seguimiento del cumplimiento de los objetivos de las actividades del contratista y de la interventoría.
- Revisó el análisis del informe y demás documentación suministrada por el contratista.
- Gestionado la asignación de los recursos para la ejecución de las actividades de la interventoría.
- Coordinó la verificación de las activaciones de las licencias de la plataforma educativa virtual en web PEDIGITAL y BIBLIOPED
- Coordinó la verificación de la configuración y cumplimiento de requisitos de la plataforma educativa PEDIGITAL y BIBLIOPED
- Verificación de plan de inversión de anticipo suministrado por el contratista.

Residente De Interventoría 1:

Dentro de las actividades realizadas por el residente de interventoría en el periodo correspondiente a este informe se encuentran:

- Realizó visitas a campo (sedes educativas) para verificación de condiciones iniciales.
- Realizó la verificación de la infraestructura a intervenir.
- Realizó análisis y socialización de los estudios de diseños y planos del proyecto.
- Realizó visitas de verificación a campo en las actividades de mejoramiento de infraestructura del contratista.
- Verifica cumplimiento de la normatividad pertinente.
- Realizó la verificación del de las pólizas de garantía del contratista.

Residente De Interventoría 2:

-Coordino la verificación de la activación y configuración de las licencias a suministrar por parte del contratista.

- Verifico el funcionamiento y características técnicas de las plataformas educativas a suministrar por parte del contratista e las sedes beneficiarias el contrato.

Interventor Educativo.

Dentro de las actividades realizadas por el interventor educativo en el periodo correspondiente a este informe se encuentran:

- Verificación de cumplimiento del lineamiento de ministerio de educación nacional en las actividades del proyecto.
- Verificación de los contenidos educativos de la plataforma PEDIGITAL y BIBLIOPED alineados a las DBA.
- Apoyó en la verificación de las activaciones de las licencias de la plataforma educativa virtual en web PEDIGITAL y BIBLIOPED.
- Apoyó en la verificación de la configuración y cumplimiento de requisitos de la plataforma educativa PEDIGITAL y BIBLIOPED.
- Respondió dudas e inquietudes de parte de la comunidad educativa con relación a la ejecución del proyecto en relación al contrato de suministro 002 del 2025.

3.1 PAGO SE OBLIGACIONES PARAFISCALES DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA.

TITULAR.	N.o PLANILLA AGOSTO	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO FONSECA DIGITAL	9494687024	Cumple.


NOMBRE	CARGO	PLANILLA AGOSTO	TIPO DE VINCULACIÓN.
ELIECER SUAREZ SERRANO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	35363055	Independiente
REYNALDO VEGA	RESIDENTE 1 DE INTERVENTORÍA	35369464	Independiente
RUBEN DARIO CELEDÓN	RESIDENTE 2 DE INTERVENTORÍA	9493041480	Dependiente integran del consorcio
ALEJANDRA GONZALES	APOYO EDUCATIVO	35369550	Independiente
KAROL VILLAZON	APOYO CONTABLE	9494696916	Dependiente consorcio
ANDRE MADRID	SECRETARIA	9493041480	Dependiente integran del consorcio

4. GASTOS DE OPERACIÓN DE

PRIMER MES.

1. COSTOS MES DEL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA					
1.1	COSTOS DEL PERSONAL EN CAMPO.				
1.1.1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	$ 6.000.000,00	1,00	100 %	$ 6.000.000,00
1.1.2	RESIDENTE DE	$ 3.000.000,00	1,00	100 %	$ 3.000.000,00

1.1.3	INTERVENTORÍA	$ 3.000.000,00	1,00	100 %	$ 3.000.000,00
1.1.4	APOYO EDUCATIVO	$ 3.050.000,00	1,00	100 %	$ 3.050.000,00
1.1.5	APOYO CONTABLE	$ 3.050.000,00	1,00	50%	$ 1.525.000,00
	SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL EN CAMPO				**$ 16.575.000**
1.2	**COSTOS DEL PERSONAL EN OFICINA**				
1.2.2	SECRETARIA	$ 1.500.000,00		100 %	$ 1.500.000,00
	SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL EN OFICINA				**$ 1.500.000,00**
	SUBTOTAL				**$ 18.075.000,00**
	FACTOR MULTIPLICADOR (***)				**$ 35.969.250,00**
	2. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				
2.1	PAPELERIA, INFORMES, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFIAS, ETC.	$ 940.000,00			$ 940.000,00
2.2	ARRENDAMIENTOS (Incluye servicios públicos)	$ 3.500.000,00			$ 3.500.000,00
2.4	GASTOS DE TRANSPORTE	$ 6.500.000,00			$ 6.500.000,00
	(2) SUBTOTAL ADMINISTRATIVOS				**$ 10.940.000,00**
	TOTAL SUMA 1+2				**$ 46.909.250,00**
	I.V.A				**$ 8.912.757,50**
	VALOR TOTAL INTERVENTORIA				**$ 55.822.007,50**

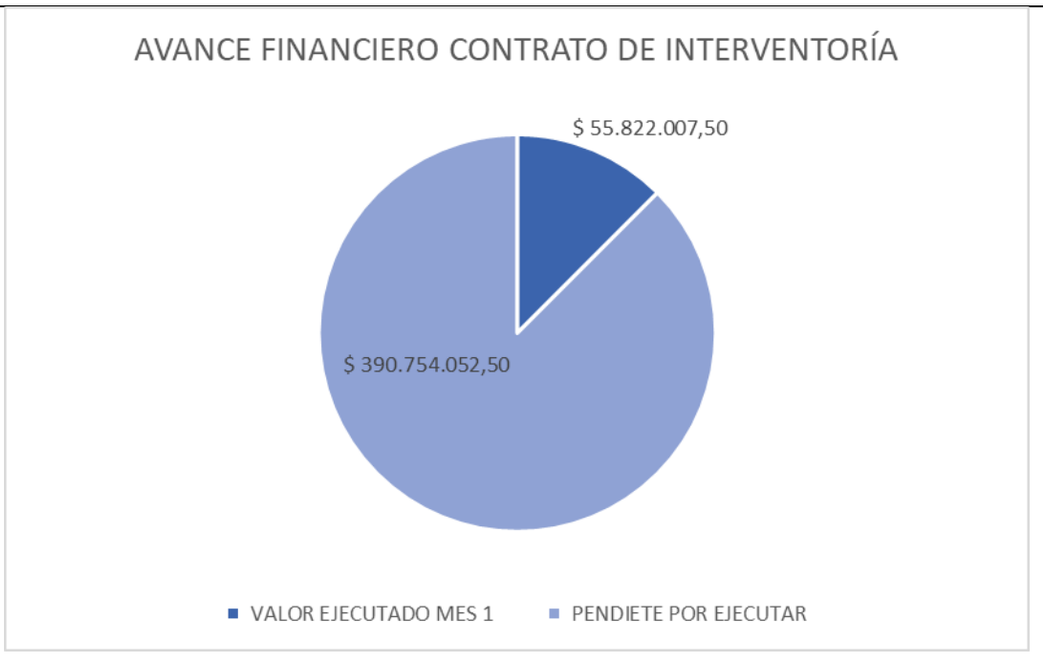

6. OBSERVACIONES FINALES

RECOMENDACIONES:

- N/A

EJECUCIÓN FINANCIERA:

- VALOR DEL CONTRATO: **$ 446.576.060 M/CTE.**
- VALOR EJECUTADO ACTUAL: **$ 180.035.154,75 M/CTE.**
- PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTUAL:**40,43%**
- VALOR EJECUTADO ACUMULADO: **$ 180.035.154,75 M/CTE.**
- PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA: **40,43%**
- SALDO POR EJECUTAR: **$ 266.035.154,75 M/CTE**
- PORCENTAJE POR EJECUTAR: **59,57%**

7. OBSERVACIONES FINALES

RECOMENDACIONES:

- N/A

EJECUCIÓN FINANCIERA: (Ver tabla siguiente página)

EJECUCIÓN					
COMPONENTE DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.					
1	**PRELIMINARES**	**UND**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD EJECUTADA**	**VALOR CON AIU**
1.1	DEMOLICION PISO EN BALDOSIN.	M2	$ 34.117,00	400	$ 18.412.789,02
1.2	DEMOLICION DE PLANTILLA EN CONCRETO.	M2	$ 28.614,88	400	$ 15.443.317,36
1.3	DEMOLICIÓN ZÓCALO EXISTENTE.	ML	$ 9.008,52	200	$ 2.430.929,57
1.4	DEMOLICION MANUAL DE MUROS e=0.15.	M2	$ 23.882,27		$ -
1.5	DESMONTE DE CIELO RASO LAMINA PLANA.	M2	$ 20.650,90	250	$ 6.965.747,13
1.6	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS.	M2	$ 47.378,49	50	$ 3.196.244,65
1.7	DESMONTE DE SISTEMA ELÉCTRICO EXISTENTE	ML	$ 12.652,88	0	$ -
1.8	CARGUE MANUAL, RETIRO Y DESECHO DE MATERIAL SOBRANTE (ESCOMBROS) HASTA 20 KM.	M3	$ 47.321,59	50	$ 3.192.405,55
1.9	DESMONTE DE CUBIERTAS A.C.	M2	$ 36.443,73	0	$ -
SUBTOTAL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA					**$ 49.641.433,26**
IMPLEMENTACIÓN TECNOLOGICA.					
2.1	ADMINISTRACIÓN	MES	$ 64.207.143,75	1	$ 64.207.143,75
	SUBTOTAL				**$ 64.207.143,75**
TOTAL DE EJECUCIÓN.				**1,59%**	**$ 113.848.577,01**

Según el informe de Interventoría 002, se deja constancia de las siguientes actividades ejecutadas:

4.1 VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DEL CONTRATISTA.

Actividad # 1.

Supervisión de la entrega de licencias educativas

El contratista realizó la entrega de las licencias de la plataforma tecnológica PEDIGITAL / BIBLIOPED, con cada módulo contratado en las sedes educativas beneficiarias del proyecto.

La Interventoría verificó que los licenciamientos entregados por parte del contratista por cada área del conocimiento, corresponden a la plataforma educativas con funcionamiento en ambiente WEB, cumpliendo con el requerimiento establecidos en las especificaciones técnicas del pliego de condiciones y establecidas en el contrato de suministro 002 del 2025. A continuación, se desglosan las licencias SUMINISTRADAS y se valida que éstas tengan disponibles las asignaturas establecidas como requisitos en los documentos contractuales y pliego de condiciones.

AULAS EDUCATIVA VIRTUAL EN WEB CIENCIAS MATEMÁTICAS.

INSTITUCIONES EDUCATIVA	**LICENCIA ACTIVADA POR EL CONTRATISTA**	**OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA.**
Licencia Aula Educativa Virtual Web Matemáticas		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA - SEDE PRINCIPAL	CSIEEPMS - MT Aulas Educativa Virtual En Web Ciencias Matemáticas	Interventoría válida la ENTREGA de la licencia plataforma educativa PEDIGITAL para cada una de las sedes beneficiarias, así mismo se valida que corresponde al área de Matemáticas contiene las siguientes asignaturas: - Matemáticas de grado de 1° a 11° - **Concepto interventoría:** Cumple con las especificaciones.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ - SEDE PRINCIPAL	CSIERAJP - MT Aulas Educativa Virtual En Web Ciencias Matemáticas	
INSTITUCIONES EDUCATIVA	**LICENCIA ACTIVADA POR EL CONTRATISTA**	**OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA.**
Activación de licencias de Aulas virtual en web Ciencias Naturales.		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA - SEDE PRINCIPAL	CSIEEPMS - CN Aulas virtual en web Ciencias Naturales	Interventoría validó la ENTREGA de las licencias de la plataforma educativa PEDIGITAL para cada una de las sedes beneficiarias, así mismo se validó que corresponde al área de Ciencias Naturales y contiene las siguientes asignaturas: - Naturales/Biología de 1° a 11° grado
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ - SEDE PRINCIPAL	CSIERAJP – CN Aulas virtual en web Ciencias Naturales	

		- Química de 10° grado y 11° - Educación sexual de 6° a 9° grado - Educación ambiental de 6° a 9° grado. - Física 10°grado y 11° grado **Concepto interventoría:** Cumple con las especificaciones.
INSTITUCIONES EDUCATIVA	**LICENCIA ACTIVADA POR EL CONTRATISTA**	**OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA.**
Activación de licencias de Aulas educativa virtual en Web Ciencias Sociales.		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA - SEDE PRINCIPAL	CSIEEPMS - CS Aulas virtual en web Ciencias Sociales.	Interventoría validó la ENTREGA de las licencias de la plataforma educativa PEDIGITAL para cada una de las sedes beneficiarias así mismo se validó que corresponde al área de Ciencias Sociales y contiene las siguientes asignaturas: - Sociales de 1° a 11° grado - Constitución de 6° a 11° - Catedra de la Paz de 1° a 11° - Filosofía de 10° y 11° **Concepto interventoría:** Cumple con las especificaciones.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ - SEDE PRINCIPAL	CSIERAJP - CS Aulas virtual en web Ciencias Sociales.	
INSTITUCIONES EDUCATIVA	**LICENCIA ACTIVADA POR EL CONTRATISTA**	**OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA.**
Activación de licencias de Aulas educativa virtual en Web Lengua Castellana e inglés.		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA - SEDE PRINCIPAL	CSIEEPMS - LC Aulas virtual en web Lengua castellana e Ingles	Interventoría validó la ENTREGA de la licencia de la plataforma educativa PEDIGITAL para cada una de las sedes beneficiarias así mismo se validó que corresponde al área de lenguaje e inglés y contiene las siguientes asignaturas: - Lengua castellana de 1° a 11° grado. - Ingles de 1° a 11° grado. **Concepto interventoría:** Cumple con las especificaciones.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ - SEDE PRINCIPAL	CSIERAJP - LC Aulas virtual en web Lengua castellana e Inglés.	

INSTITUCIONES EDUCATIVA	**LICENCIA ACTIVADA POR EL CONTRATISTA**	**OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA.**
Activación de licencias de Aulas educativa virtual en Web modulo transversal.		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA - SEDE PRINCIPAL	CSIEEPMS - ET Aulas virtual en web modulo transversal.	Interventoría validó la ENTREGA de las licencias de la plataforma PEDIGITAL para cada una de las sedes beneficiarias así mismo se validó que corresponden al módulo de educación transversal y contiene los siguientes módulos: - Emprendimiento de 3° a 11° grado - Urbanidad, Ética y Valores de 1° a 11° grado. - Informática de 1° a 11° grado. **Concepto interventoría:** Cumple con las especificaciones.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ - SEDE PRINCIPAL	CSIERAJP - ET Aulas virtual en web modulo transversal.	
INSTITUCIONES EDUCATIVA	**LICENCIA ACTIVADA POR EL CONTRATISTA**	**OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA.**
Modulo Virtual Web Play-Zone		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA - SEDE PRINCIPAL	CSIEEPMSPB – PZ Modulo Virtual Web Play-Zone	La interventoría del contrato realizó la revisión técnica del módulo Playzone de juego, verificando el cumplimiento de las características técnicas establecidas en las especificaciones del proyecto. Una vez efectuadas las inspecciones correspondientes, se constató la activación del módulo cumplen con los requerimientos de calidad, seguridad y funcionalidad exigidos. Por tanto, la interventoría aprueba el cumplimiento de las características técnicas del licenciamiento.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ - SEDE PRINCIPAL	CSIERAJP - PZ Modulo Virtual Web Play-Zone	
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ROIG Y VILLALBA- SEDE PRINCIPAL	CSIETRVPB - PZ Modulo Virtual Web Play-Zone	
INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGON-SEDE PRINCIPAL.	CSIEJJAPB - PZ Modulo Virtual Web Play-Zone	
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE FONSECA - SEDE PRINCIPAL	CSIETAFPB - PZ Modulo Virtual Web Play-Zone	
INSTITUCIONES EDUCATIVA	**LICENCIA ACTIVADA POR EL CONTRATISTA**	**OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA.**
Modulo Entrenador Modulo E		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO PARODI	Entrenador Modulo E CSIEEPMSPB - ME	Interventoría validó la ENTREGA de las licencias de la plataforma PEDIGITAL para cada una

MEDINA - SEDE PRINCIPAL		de las sedes beneficiarias así mismo se validó que corresponden al módulo de entrenados de pruebas MODULO E - Entrenamiento pruebas Saber 3, 5, 9 y 11º - Simulacros - bando de contenido educativo mentefactos . **Concepto interventoría:** Cumple con las especificaciones
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ - SEDE PRINCIPAL	Entrenador Modulo E - CSIERAJP - ME	
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ROIG Y VILLALBA- SEDE PRINCIPAL	Entrenador Modulo E CSIETRVPB - ME	
INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGON- SEDE PRINCIPAL.	Entrenador Modulo E CSIEJJAPB - ME	
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE FONSECA - SEDE PRINCIPAL	Entrenador Modulo E CSIETAFPB - ME	
INSTITUCIONES EDUCATIVA	**LICENCIA ACTIVADA POR EL CONTRATISTA**	**OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA.**
Modulo Explora tu conocimiento		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA - SEDE PRINCIPAL	Modulo Explora tu conocimiento: CSIEEPMSPB - MEX	La interventoría del contrato realizó la revisión técnica del módulo Explora tu conocimiento de juego, verificando el cumplimiento de las características técnicas establecidas en las especificaciones del proyecto. Una vez efectuadas las inspecciones correspondientes, se constató la activación del módulo cumplen con los requerimientos de calidad, seguridad y funcionalidad exigidos. **Concepto interventoría:** Cumple con las especificaciones
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ - SEDE PRINCIPAL	Modulo Explora tu conocimiento: CSIERAJP - MEX	
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ROIG Y VILLALBA- SEDE PRINCIPAL	Modulo Explora tu conocimiento: CSIETRVPB - MEX	
INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGON- SEDE PRINCIPAL.	Modulo Explora tu conocimiento: CSIEJJAPB - MEX	
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE FONSECA - SEDE PRINCIPAL	Modulo Explora tu conocimiento: CSIETAFPB - MEX	
INSTITUCIONES EDUCATIVA	**LICENCIA ACTIVADA POR EL CONTRATISTA**	**OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA.**
AMBIENTE DE BIBLIOTECA - Plataforma BIBLIOPED		
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA - SEDE PRINCIPAL	BIBLIOPED modulo 1: CSIEEPMSPB - M1 BIBLIOPED modulo 2: CSIEEPMSPB - M2 BIBLIOPED modulo 3: CSIEEPMSPB - M3	Interventoría validó la ENTREGA de las licencias de la plataforma BIBLIOPED para cada una de las sedes beneficiarias así mismo se validó que corresponden los siguientes módulos: - Modulo1: Repositorio de contenidos educativos de todas las áreas del conocimiento (
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ROIG Y VILLALBA- SEDE PRINCIPAL	BIBLIOPED modulo 1: CSIETRVPB - M1 BIBLIOPED modulo 2: CSIETRVPB - M2 BIBLIOPED modulo 3: CSIETRVPB - M3	

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGON-SEDE PRINCIPAL.	BIBLIOPED modulo 1: CSIEJJAPB - M1 BIBLIOPED modulo 2: CSIEJJAPB - M2 BIBLIOPED modulo 3: CSIEJJAPB - M3	Matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, lenguaje.) - Modulo 2: Videoteca - Modulo3: Repositorio de imágenes académicas y contenidos educativos esquematizados. **Concepto interventoría:** Cumple con las especificaciones
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE FONSECA - SEDE PRINCIPAL	BIBLIOPED modulo 1: CSIETAFPB - M1 BIBLIOPED modulo 2: CSIETAFPB - M2 BIBLIOPED modulo 3: CSIETAFPB - M3	

Actividad 2 .

Supervisión de entrega de equipos tecnológico servidor.

Durante el periodo de ejecución del presente informe la interventoría supervisó la entrega por parte del contratista a las sedes educativas beneficiarias el contrato los siguientes elementos en el marco del componte de implementación tecnológica del contrato de suministro 002- 2025 .

- Equipos Servidor, 24gb En RAM, 1 Disco De 2tb, Pantalla De 19.5, Procesador Xeon. Incluye Configuración.

INSTITUCION	SERVIDOR	MONITOR	AMBIENTE	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
I.E ERNESTO PARODI MEDINA – SEDE PRINCIPAL	Servidor Dell Power Edge T160 Intel Xeon (Disco duro 2 Tera, Memoria RAM 32 Gb - SN 5XP2DB4	MMTYAAA001322004BD3511 **MODELO ACER EA220Q**	AULA TECNOLÓGICA.	**CUMPLE** CON LOS REQUERIMIENO TECNICOS CONTRACTUALES
I.E RURAL AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ – SEDE PRINCIPAL	Servidor Dell Power Edge T160 Intel Xeon (Disco duro 2 Tera, Memoria RAM 32 Gb - SN DWP2DB4	MMTJDAA0055160AA143W01 **MODELO ACER EA220Q**	AULA TECNOLÓGICA	**CUMPLE** CON LOS REQUERIMIENO TECNICOS CONTRACTUALES
I.E ERNESTO PARODI MEDINA – SEDE PRINCIPAL	Servidor Dell Power Edge T160 Intel Xeon (Disco duro 2 Tera, Memoria RAM 32 Gb – SN JWP2DB4	MMTJDAA0055160AFFE3W01 **MODELO ACER EA220Q**	BIBLIOTECA TECNOLÓGICA.	**CUMPLE** CON LOS REQUERIMIENO TECNICOS CONTRACTUALES

I.E TECNICA ROIG Y VILLALBA – SEDE PRINCIPAL	Servidor Dell Power Edge T160 Intel Xeon (Disco duro 2 Tera, Memoria RAM 32 Gb – SN HWP2DB4	MMTE2AA001229035D43LCC **ACER K2 SERIES MODELO K222HQL**	BIBLIOTECA TECNOLÓGICA	**CUMPLE** CON LOS REQUERIMIENO TECNICOS CONTRACTUALES
.E TECNICA AGROPECUARIA DE FONSECA	Servidor Dell Power Edge T160 Intel Xeon (Disco duro 2 Tera, Memoria RAM 32 Gb – SN 1TPS794	6Q46H9PY6000762 **MODEL SAMSUNNG S22D310EAN**	BIBLIOTECA TECNOLÓGICA	**CUMPLE** CON LOS REQUERIMIENO TECNICOS CONTRACTUALES
I.E JUAN JACOBO ARAGON	Servidor Dell Power Edge T160 Intel Xeon (Disco duro 2 Tera, Memoria RAM 32 Gb – SN 1XP2DB4	6Q46H9PY600900 **MODEL SAMSUNNG S22D310EAN**	BIBLIOTECA TECNOLÓGICA	**CUMPLE** CON LOS REQUERIMIENO TECNICOS CONTRACTUALES

El suministro de dichos elementos es fundamental para el funcionamiento de las plataformas educativas contradas, dado que guardan la configuración y código fuente para su funcionamiento en web y usos por tarde de la cuidad educativa.


4.2 VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.

La Interventoría verificó las actividades de mejoramiento de infraestructura en las aulas de las sedes educativas beneficiarias del proyecto, evidenciando el siguiente:

EL contratista en el periodo de ejecución del presente informe continuo con el desarrollo de las actividades de capítulo de preliminares en el componente de mejoramiento de infraestructura desarrolló actividades del componente preliminar, Pisos e instalaciones eléctricas tales como:

- Demolición de baldosín
- Demolición Zócalo Existente
- Demolición De Plantilla En Concreto.
- Desmonte De Cielo Raso Lamina Plana.
- Desmonte De Puertas Y Ventanas.
- Demolición Manual De Muros E=0.15.
- Desmonte De Puertas Y Ventanas
- Desmonte De Sistema Eléctrico Existente
- Cargue Manual, Retiro Y Desecho De Material Sobrante (Escombros) Hasta 20 Km.
- Desmonte De Cubiertas A.C.
- Contrapiso 10 Cm Concreto 3.000 Psi-Esp., Incluye Malla Electrosoldada.
- Acometida 3 No. 4 -Ducto Pvc De 2 "

- caja de inspección de 60X60X40CM, en concreto de f'C=3.000psi , incluye excavación y tape, tapa y herrajes, marcos en angulo de 2" e incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento
- tablero 24 ctos con espacio para totalizador de 80 amp, incluye 22 breakers de 1x20amp mas 2x30amp monopolar y empotrada e instalacion.
- tablero 18 ctos con espacio para totalizador de 80 amp, incluye 16 breakers de 1x20amp mas 2x30amp monopolar y empotrada e instalacion

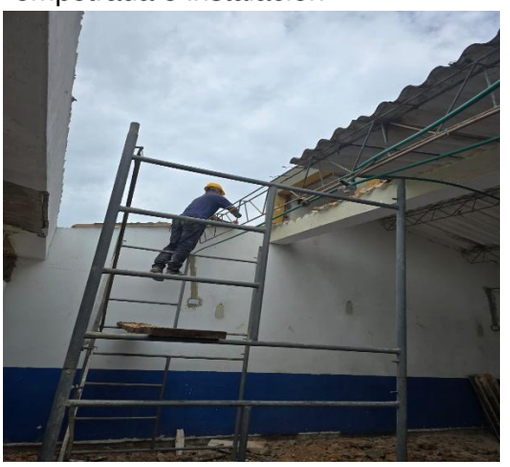









4.3 VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL CONTRATISTA.

Se realizó la revisión del informe No 2 de actividades el contratista, el cual conforme a la verificación se evidencias solos las actividades del componente de implementación tecnológica, se sugiere al contratista incluir actividades de componente de mejoramiento de infraestructura, en respuesta el contratista manifestó que dicho informe de actividades de mejoramiento de infraestructura será presentado de manera individual con su respectiva acta de cobro, para dar mayor claridad en relación al desarrollo de cada uno de sus actividades.

7.4.1 VALIDACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y OBLIGACIONES DE PARAFISCALES DEL CONTRATISTA.

TITULAR.	N.o PLANILLA SEPTIEMBRE	N.o PLANILLA OCTUBRE	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO FONSECA DIGITAL	9494687029	9494668111	Cumple.

NOMBRE	CARGO	PLANILLA SEPTIEMBRE	PLANILLA OCTUBRE
HERNÁN RAFAEL ALARCÓN ANAYA	Director Del Proyecto.	35359504	35359504

LIBANIS ARGUELLE DAZA	Coordinador General	35342926	**35342945**
XIAMIR ALEXANDER LUQUEZ RAMÍREZ	Profesional En Sistemas Y Programación	1077177539	**1077177634**
LEIDER ARGUELLE DAZA	Ingeniero Electrónico	9494196817	----------
ANGIE VANESSA MEDINA GONZALEZ.	Asesor Jurídico	9494196817	----------
NATALIA INES ARGUELLES OVIEDO	Secretaria	9494195299	----------
MARIA ALVEAR	Conductor	9494195299	
YALETHNIS RINCONES	Supervisor Educativo	35359253	35359260
JORGE STUMMO	Profesional Contable	9494195299	----------
FABIAN ARAQUE ZUTA	Tecnólogo En Mantenimiento De Equipo Equipos.	9494196817	----------
LINETH ARGUELLES DAZA	Profesional De SG SST.	4630781351	4630783085
FABIAN QUINTERO	Gestor de innovación tecnología educativa	9494196817	----------

5. INFORME DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA.

Director De Interventoría:

Se mencionan las actividades realizadas por el director de interventoría en el periodo correspondiente a este informe se encuentran:

- Realizo la planificación y socialización con el equipo de trabajo de las estrategias para la puesta en marcha de las actividades de interventoría.
- Realizó visitas a campo (sedes educativas) para verificación de condiciones iniciales.
- Realizó actividades de supervisión para llevar control económico de la ejecución del contratista y de la interventoría.
- Realizó el seguimiento del cumplimiento de los objetivos de las actividades del contratista y de la interventoría.
- Revisó el análisis del informe y demás documentación suministrada por el contratista.
- Gestionado la asignación de los recursos para la ejecución de las actividades de la interventoría.
- Coordinó la verificación de las entregas de las licencias de la plataforma educativa virtual en web PEDIGITAL y BIBLIOPED
- Coordinó la verificación de la configuración y cumplimiento de requisitos de la plataforma educativa PEDIGITAL y BIBLIOPED

Residente De Interventoría 1:

Dentro de las actividades realizadas por el residente de interventoría en el periodo correspondiente a este informe se encuentran:

- Realizó análisis y socialización de los estudios de diseños y planos del proyecto durante la ejecución e etapas iniciales de la intervención.
- Realizó visitas de verificación a campo en las actividades de mejoramiento de infraestructura del contratista.
- Verifica cumplimiento de la normatividad pertinente.
- Realizó la verificación del de las pólizas de garantía del contratista.

Residente De Interventoría 2:

-Coordino la verificación de la activación y configuración de las licencias a suministrar por parte del contratista.

- Verifico el funcionamiento y características técnicas de las plataformas educativas a suministradas por parte del contratista e las sedes beneficiarias el contrato.

Interventor Educativo.

Dentro de las actividades realizadas por el interventor educativo en el periodo correspondiente a este informe se encuentran:


- Verificación de cumplimiento del lineamiento de ministerio de educación nacional en las actividades del proyecto.
- Verificación de los contenidos educativos de la plataforma PEDIGITAL y BIBLIOPED alineados a las DBA.
- Apoyó en la verificación de las activaciones de las licencias de la plataforma educativa virtual en web PEDIGITAL y BIBLIOPED.
- Apoyó en la verificación de la configuración y cumplimiento de requisitos de la plataforma educativa PEDIGITAL y BIBLIOPED.
- Respondió dudas e inquietudes de parte de la comunidad educativa con relación a la ejecución del proyecto en relación al contrato de suministro 002 del 2025.

6. AVANCE FINANCIERO INTERVENTORÍA.

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD (MES)	VALOR TOTAL	VR TOTAL		% AVANCE ACTA 1	TOTAL
1. COSTOS DEL PERSONAL DE LA INTERVENTORIA								
1.1	COSTOS DEL PERSONAL EN CAMPO.							
1.1.1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	PERSONA	8,00	$ 11.940.000,00	$ 95.520.000,00		40,43%	$ 38.616.640,73
1.1.2	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	PERSONA	8,00	$ 5.970.000,00	$ 47.760.000,00		40,43%	$ 19.308.320,37
1.1.3		PERSONA	8,00	$ 5.970.000,00	$ 47.760.000,00		40,43%	$ 19.308.320,37
1.1.4	APOYO EDUCATIVO	PERSONA	8,00	$ 6.069.500,00	$ 48.556.000,00		40,43%	$ 19.630.125,71
1.1.5	APOYO CONTABLE	PERSONA	8,00	$ 3.034.750,00	$ 24.278.000,00		40,43%	$ 9.815.062,85
1.2.2	SECRETARIA	PERSONA	8,00	$ 2.985.000,00	$ 23.880.000,00		40,43%	$ 9.654.160,18
2. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN								
2.1	PAPELERIA, INFORMES, FOTOCOPIAS, FOTOGRAFIAS, ETC.	UND	8,00	$ 940.000,00	$ 7.520.000,00		40,43%	$ 3.040.171,05
2.2	ARRENDAMIENTOS (Incluye servicios públicos)	MES	8,00	$ 3.500.000,00	$ 28.000.000,00		40,43%	$ 11.319.785,81
2.4	GASTOS DE TRANSPORTE	MES	8,00	$ 6.500.000,00	$ 52.000.000,00		40,43%	$ 21.022.459,36
	TOTAL COSTOS DIRECTOS.				375.274.000,0			$ 151.715.046,43
	I.V.A 19%				$ 71.302.060,00			$ 28.825.858,82
	VALOR TOTAL INTERVENTORIA				$ 446.576.060,00			$ 180.540.905,25

PAGO OBLIGACIONES PARAFISCALES INTERVENTORÍA.


TITULAR.	N.o PLANILLA SEPTIEMBRE	N.o PLANILLA OCTUBRE	
CONSORCIO INTERDIGITAL, FONSECA.	9494696940	9494696947	
NOMBRE	**CARGO**	**PLANILLA SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**
ELIECER SUAREZ SERRANO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	35363066	35363084
REYNALDO VEGA	RESIDENTE 1 DE INTERVENTORÍA	35369469	35369472
RUBEN DARIO CELEDÓN	RESIDENTE 2 DE INTERVENTORÍA	9494700853	--------
ALEJANDRA GONZALES	APOYO EDUCATIVO	35369558	35369561
KAROL VILLAZON	APOYO CONTABLE	9494696940	9494696947
ANDRE MADRID	SECRETARIA	9494700853	---------

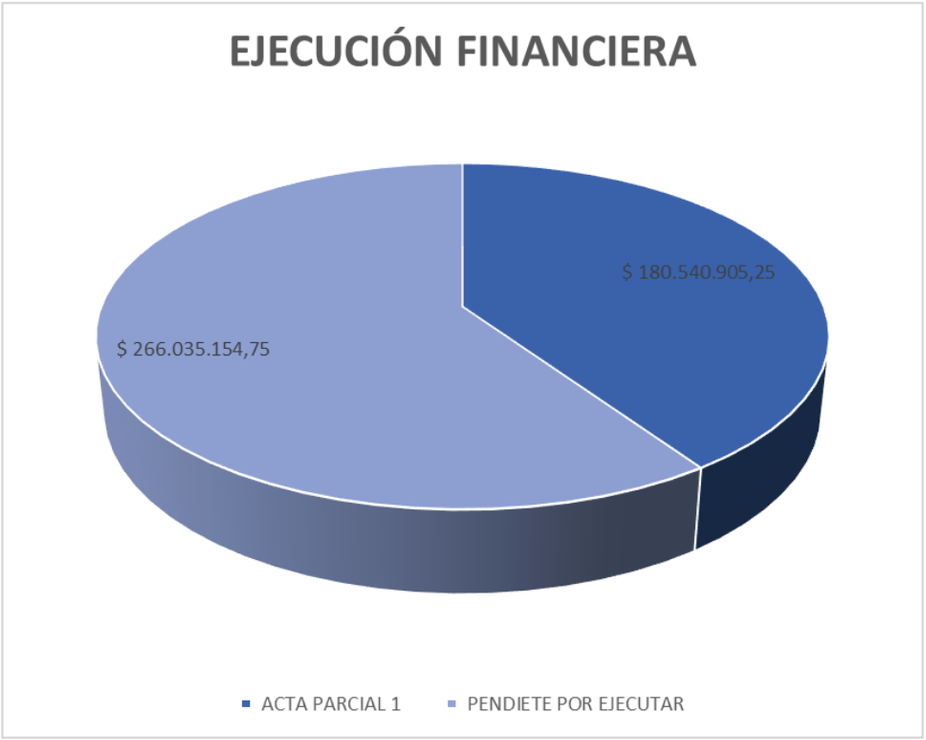
EJECUCIÓN FINANCIERA
$ 180.540.905,25
$ 266.035.154,75
ACTA PARCIAL 1
PENDIETE POR EJECUTAR


8. INFORME FOTOGRAFICO (Evidencia de Actas)

ANEXOS
VERIFICACIÓN EXISTENCIAS LICENCIAS.


INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA - SEDE PRINCIPAL

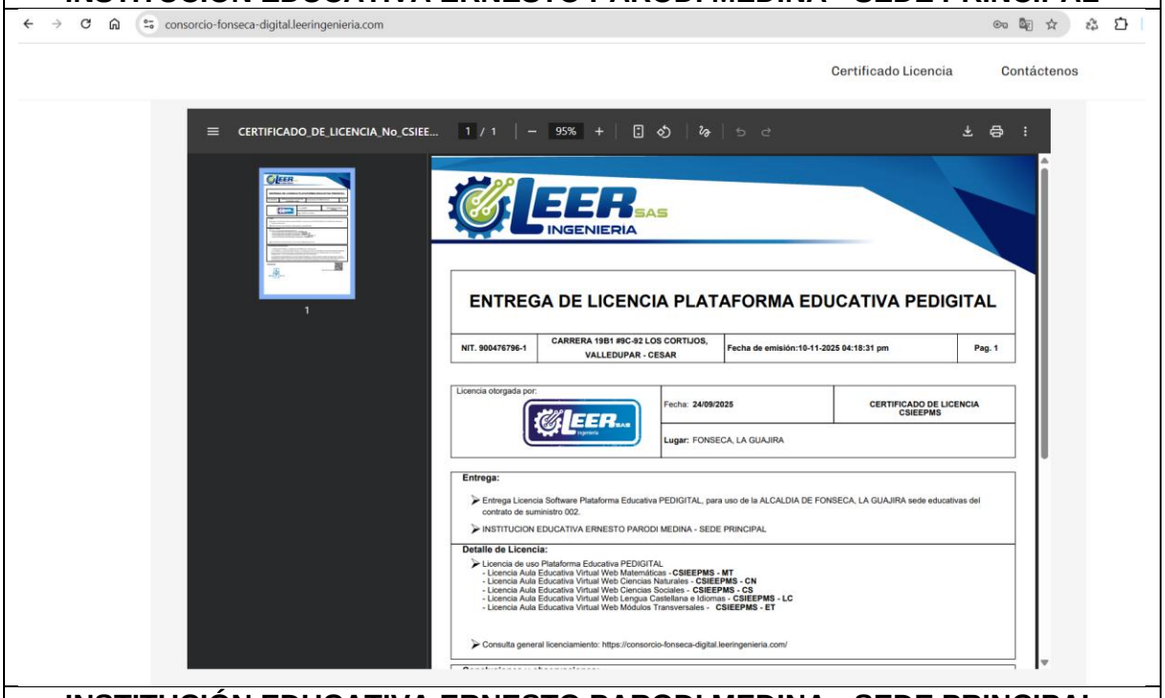


INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA - SEDE PRINCIPAL

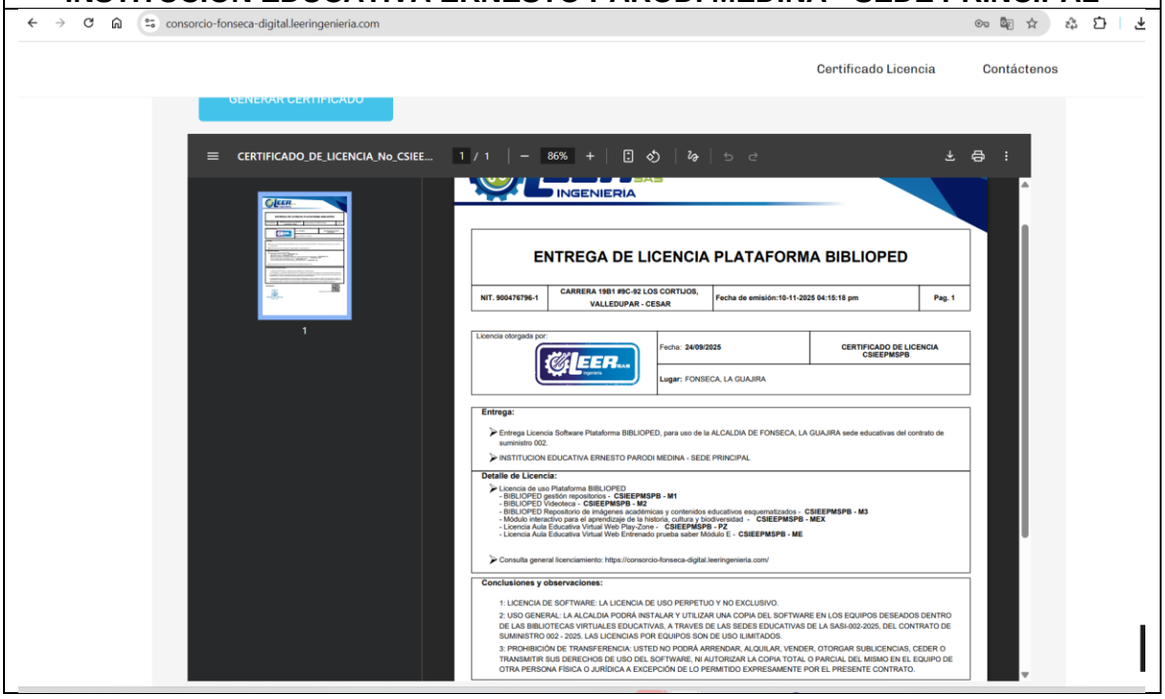


INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ROIG Y VILLALBA- SEDE PRINCIPAL

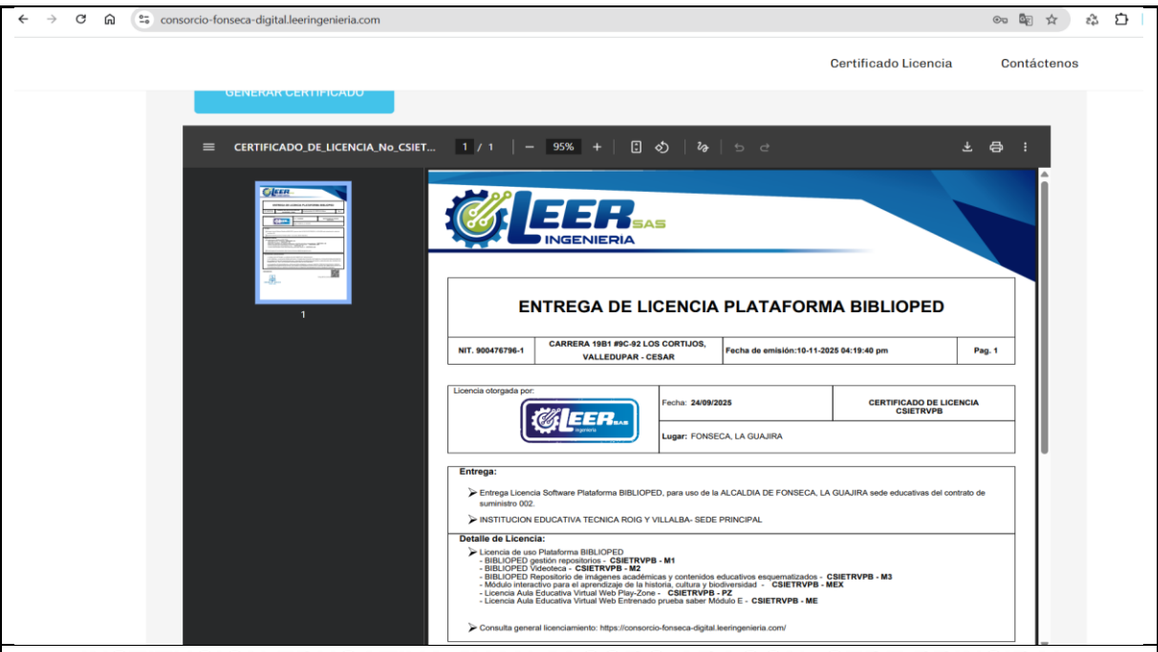


INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGON- SEDE PRINCIPAL.

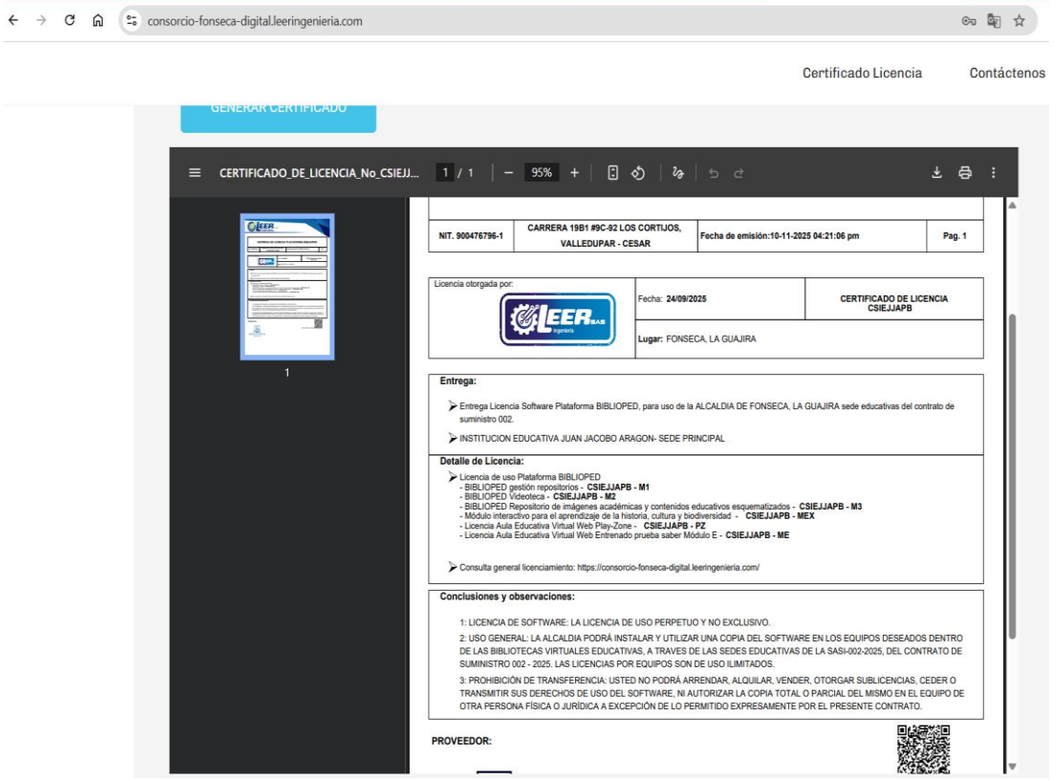

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE FONSECA - SEDE PRINCIPAL

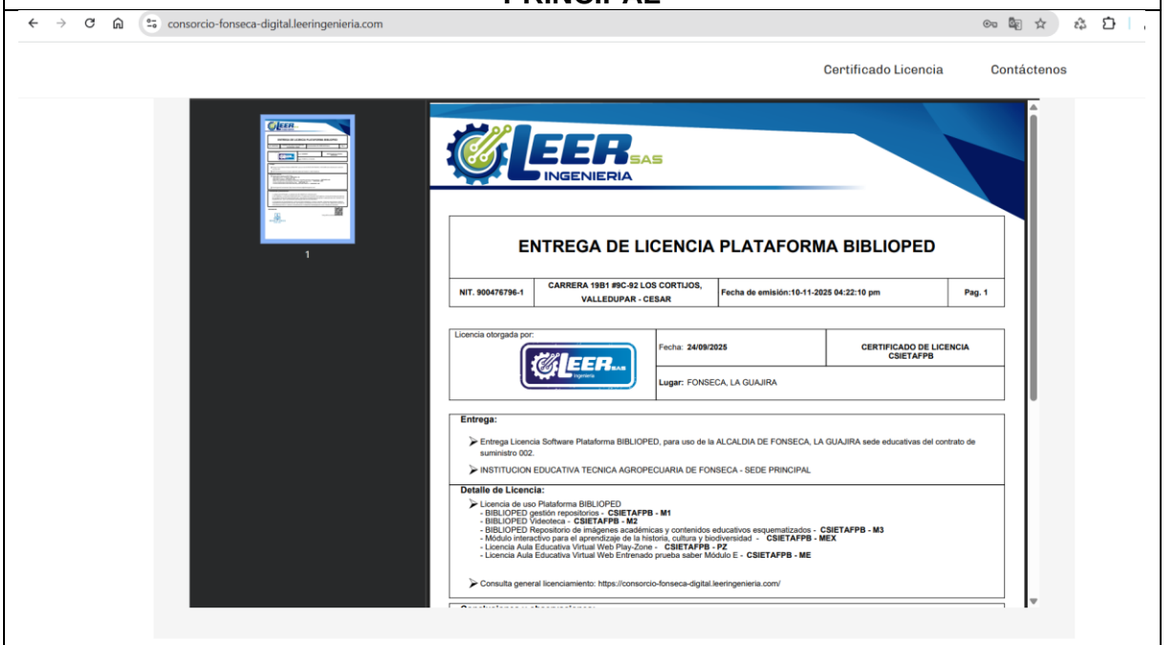

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ - SEDE PRINCIPAL

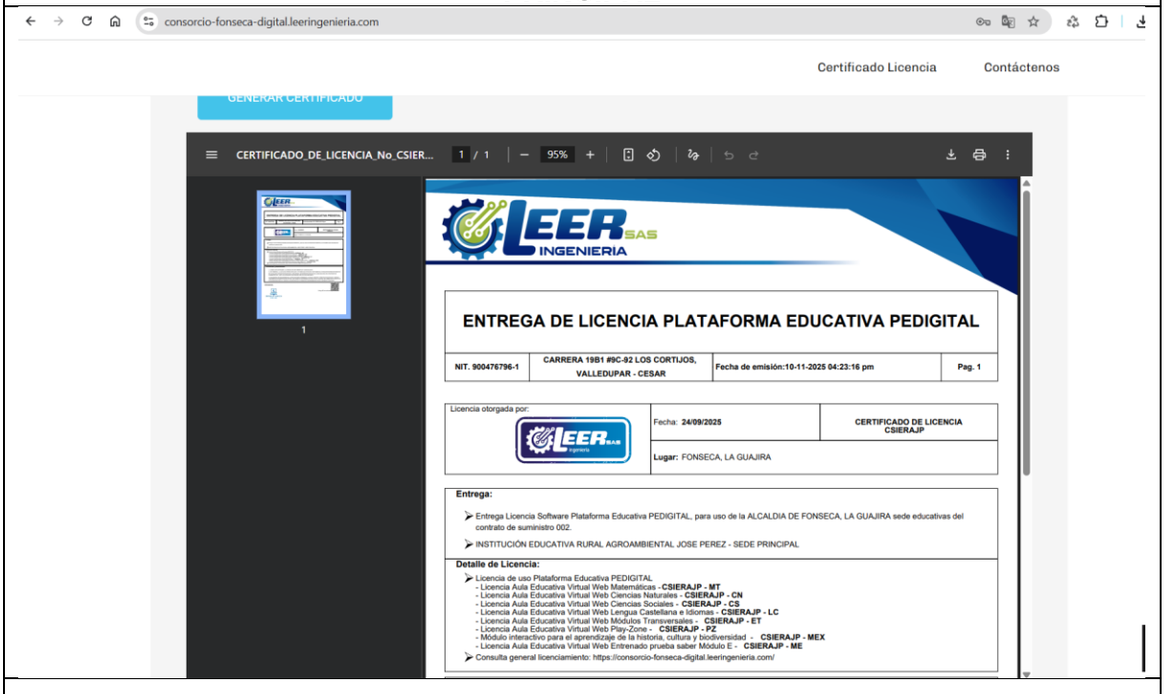

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025

ACTA DE SOCIALIZACIÓN PROYECTO.

LUGAR:	SALA DE JUNTAS DESPACHO ALCALDIA MUNICIPAL FONSECA – LA GUAJIRA
PROYECTO:	"FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLOGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA – LA GUAJIRA.
CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 002 DE 2025 (SASI -002)
CONTRATISTA:	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
ACTA DE INICIO.	22 DE AGOSTO 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	OCHO (8) MESES.
EJECUTOR:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE FONSECA – LA GUAJIRA
CONVOCADOS:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE FONSECA – LA GUAJIRA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA ROIG Y VILLALBA – SEDE PRINCIPAL INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGÓN – SEDE PRINCIPAL INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE FONSECA – SEDE PRINCIPAL INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ DEL MUNICIPIO DE FONSECA LA GUAJIRA INTER DIGITAL FONSECA – INTERVENTORIA

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025

INTRODUCCIÓN.

El presente proyecto cuyo objeto es "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLOGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA, busca brindar ambientes pedagógicos innovadores con acceso a las herramientas TIC para los procesos de aprendizajes para la comunidad del municipio de Fonseca disminuyendo con esto las brechas digitales, contribuyendo al mejoramiento la calidad educativa.

La socialización del proyecto con las partes interesadas busca informar e involucrar a las partes beneficiarias (Beneficiarios, comunidad, Autoridades) sobre los detalles del proyecto a ejecutar por medio del contrato 002 DE 2025 (SASI – 002).

DESARROLLO DE LA SOCIALIZACIÓN.

La socialización se llevó a cabo en SALA DE JUNTAS DEL DESPACHO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL FONSECA – LA GUAJIRA, durante la reunión, se presentaron los detalles del proyecto, incluyendo su alcance, tiempo de ejecución, plan de trabajo para el desarrollo del proyecto y beneficios esperados. Además, se abrió un espacio para resolver inquietudes y recibir aportes de los asistentes, con el fin de garantizar que la implementación sea efectiva y responda a las necesidades de las comunidades educativas.

OBJETO DEL CONTRATO:

"FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA.

ALCANCE DEL CONTRATO:

Creación de 6 Ambientes de aprendizajes basados en el uso de la tecnología para el desarrollo de competencia digitales en el municipio de Fonseca, La Guajira

- 2 aulas tecnológicas dotadas.
- 4 bibliotecas tecnológicas dotadas

Adicionalmente el proyecto contempla la puesta en marcha de metodologías de apropiación con el desarrollo de jornadas de transferencia de conocimiento para los

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025

docentes de las sedes beneficiarias del proyecto en relación al uso de tendencias, así como el buen uso para la sostenibilidad de los bienes a dotar por el proyecto.

- **TIPO DE AMBIENTES A ENTREGAR EN INSTITUCIONES BENEFICIARIAS**

Sedes Educativas:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA- SEDE PRINCIPAL se contempla el mejoramiento de la infraestructura existente y dotación de: 1. Aula tecnológica en áreas del conocimiento y 2. Biblioteca Educativa con componentes tecnológicos y pedagógicos.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA ROIG Y VILLALBA- SEDE PRINCIPAL se contempla el mejoramiento de la infraestructura existente y dotación de: 1. Biblioteca Educativa con componentes tecnológicos y pedagógicos.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGÓN- SEDE PRINCIPAL se contempla el mejoramiento de la infraestructura existente y dotación de: 1. Biblioteca Educativa con componentes tecnológicos y pedagógicos.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE FONSECA - SEDE PRINCIPAL se contempla el mejoramiento de la infraestructura existente y dotación de: 1. Biblioteca Educativa con componentes tecnológicos y pedagógicos.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ - SEDE PRINCIPAL se contempla el mejoramiento de la infraestructura existente y dotación de: 1. Aula tecnológica en áreas del conocimiento.

CIERRE DE LA SOCIALIZACIÓN:

Las partes involucradas manifiestan su conformidad con los términos y condiciones expuestos durante la socialización del contrato 002-2025. Se reitera el compromiso de todas las partes para llevar a cabo el proyecto en los plazos y condiciones acordados, garantizando el cumplimiento de las obligaciones contractuales en conformidad con la normativa vigente.

En constancia de lo expuesto y con el propósito de cumplir con los compromisos adquiridos en el marco del contrato, las partes firman el presente acta de socialización.

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGÓN – SEDE PRINCIPAL
Cargo: RECTOR

GISELA ZAMBRANO MONTENEGRO
R.L. Consorcio Fonseca Digital 2025
Contratista

ROIMAN COBO NIEVES
R.L. Consorcio Inter Digital Fonseca
Interventoría

ANA MENDOZA MOYA
Secretario de Desarrollo Social
Alcaldía Municipal Fonseca – La Guajira

Nombre:
Cargo:

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025

ACTA DE SOCIALIZACIÓN PROYECTO.

LUGAR:	SALA DE JUNTAS DESPACHO ALCALDIA MUNICIPAL FONSECA – LA GUAJIRA
PROYECTO:	"FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLOGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA – LA GUAJIRA.
CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 002 DE 2025 (SASI -002)
CONTRATISTA:	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
ACTA DE INICIO.	22 DE AGOSTO 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	OCHO (8) MESES.
EJECUTOR:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE FONSECA – LA GUAJIRA
CONVOCADOS:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE FONSECA – LA GUAJIRA
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA ROIG Y VILLALBA – SEDE PRINCIPAL
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGÓN – SEDE PRINCIPAL
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE FONSECA – SEDE PRINCIPAL
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ DEL MUNICIPIO DE FONSECA LA GUAJIRA
	INTER DIGITAL FONSECA – INTERVENTORIA

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025

INTRODUCCIÓN.

El presente proyecto cuyo objeto es "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLOGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA, busca brindar ambientes pedagógicos innovadores con acceso a las herramientas TIC para los procesos de aprendizajes para la comunidad del municipio de Fonseca disminuyendo con esto las brechas digitales, contribuyendo al mejoramiento la calidad educativa.

La socialización del proyecto con las partes interesadas busca informar e involucrar a las partes beneficiarias (Beneficiarios, comunidad, Autoridades) sobre los detalles del proyecto a ejecutar por medio del contrato 002 DE 2025 (SASI – 002).

DESARROLLO DE LA SOCIALIZACIÓN.

La socialización se llevó a cabo en SALA DE JUNTAS DEL DESPACHO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL FONSECA – LA GUAJIRA, durante la reunión, se presentaron los detalles del proyecto, incluyendo su alcance, tiempo de ejecución, plan de trabajo para el desarrollo del proyecto y beneficios esperados. Además, se abrió un espacio para resolver inquietudes y recibir aportes de los asistentes, con el fin de garantizar que la implementación sea efectiva y responda a las necesidades de las comunidades educativas.

OBJETO DEL CONTRATO:

"FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA.

ALCANCE DEL CONTRATO:

Creación de 6 Ambientes de aprendizajes basados en el uso de la tecnología para el desarrollo de competencia digitales en el municipio de Fonseca, La Guajira

- 2 aulas tecnológicas dotadas.
- 4 bibliotecas tecnológicas dotadas

Adicionalmente el proyecto contempla la puesta en marcha de metodologías de apropiación con el desarrollo de jornadas de transferencia de conocimiento para los

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025

docentes de las sedes beneficiarias del proyecto en relación al uso de tendencias, así como el buen uso para la sostenibilidad de los bienes a dotar por el proyecto.

- **TIPO DE AMBIENTES A ENTREGAR EN INSTITUCIONES BENEFICIARIAS**

Sedes Educativas:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA- SEDE PRINCIPAL se contempla el mejoramiento de la infraestructura existente y dotación de: 1. Aula tecnológica en áreas del conocimiento y 2. Biblioteca Educativa con componentes tecnológicos y pedagógicos.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA ROIG Y VILLALBA- SEDE PRINCIPAL se contempla el mejoramiento de la infraestructura existente y dotación de: 1. Biblioteca Educativa con componentes tecnológicos y pedagógicos.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGÓN- SEDE PRINCIPAL se contempla el mejoramiento de la infraestructura existente y dotación de: 1. Biblioteca Educativa con componentes tecnológicos y pedagógicos.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE FONSECA - SEDE PRINCIPAL se contempla el mejoramiento de la infraestructura existente y dotación de: 1. Biblioteca Educativa con componentes tecnológicos y pedagógicos.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ - SEDE PRINCIPAL se contempla el mejoramiento de la infraestructura existente y dotación de: 1. Aula tecnológica en áreas del conocimiento.

CIERRE DE LA SOCIALIZACIÓN:

Las partes involucradas manifiestan su conformidad con los términos y condiciones expuestos durante la socialización del contrato 002-2025. Se reitera el compromiso de todas las partes para llevar a cabo el proyecto en los plazos y condiciones acordados, garantizando el cumplimiento de las obligaciones contractuales en conformidad con la normativa vigente.

En constancia de lo expuesto y con el propósito de cumplir con los compromisos adquiridos en el marco del contrato, las partes firman el presente acta de socialización.

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSÉ PEREZ DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA.
Cargo:

GISELA ZAMBRANO MONTENEGRO
R.L. Consorcio Fonseca Digital 2025
Contratista

ROIMAN COBO NIEVES
R.L. Consorcio Inter Digital Fonseca
Interventoría

ANA MENDOZA MOYA
Secretario de Desarrollo Social
Alcaldía Municipal Fonseca – La Guajira

Nombre:
Cargo:

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025

ACTA DE SOCIALIZACIÓN PROYECTO.

LUGAR:	SALA DE JUNTAS DESPACHO ALCALDIA MUNICIPAL FONSECA – LA GUAJIRA
PROYECTO:	"FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLOGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA – LA GUAJIRA.
CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 002 DE 2025 (SASI -002)
CONTRATISTA:	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
ACTA DE INICIO.	22 DE AGOSTO 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	OCHO (8) MESES.
EJECUTOR:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE FONSECA – LA GUAJIRA
CONVOCADOS:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE FONSECA – LA GUAJIRA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA ROIG Y VILLALBA – SEDE PRINCIPAL INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGÓN – SEDE PRINCIPAL INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE FONSECA – SEDE PRINCIPAL INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ DEL MUNICIPIO DE FONSECA LA GUAJIRA INTER DIGITAL FONSECA – INTERVENTORIA

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025

INTRODUCCIÓN.

El presente proyecto cuyo objeto es "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLOGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA, busca brindar ambientes pedagógicos innovadores con acceso a las herramientas TIC para los procesos de aprendizajes para la comunidad del municipio de Fonseca disminuyendo con esto las brechas digitales, contribuyendo al mejoramiento la calidad educativa.

La socialización del proyecto con las partes interesadas busca informar e involucrar a las partes beneficiarias (Beneficiarios, comunidad, Autoridades) sobre los detalles del proyecto a ejecutar por medio del contrato 002 DE 2025 (SASI – 002).

DESARROLLO DE LA SOCIALIZACIÓN.

La socialización se llevó a cabo en SALA DE JUNTAS DEL DESPACHO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL FONSECA – LA GUAJIRA, durante la reunión, se presentaron los detalles del proyecto, incluyendo su alcance, tiempo de ejecución, plan de trabajo para el desarrollo del proyecto y beneficios esperados. Además, se abrió un espacio para resolver inquietudes y recibir aportes de los asistentes, con el fin de garantizar que la implementación sea efectiva y responda a las necesidades de las comunidades educativas.

OBJETO DEL CONTRATO:

"FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA.

ALCANCE DEL CONTRATO:

Creación de 6 Ambientes de aprendizajes basados en el uso de la tecnología para el desarrollo de competencia digitales en el municipio de Fonseca, La Guajira

- 2 aulas tecnológicas dotadas.
- 4 bibliotecas tecnológicas dotadas

Adicionalmente el proyecto contempla la puesta en marcha de metodologías de apropiación con el desarrollo de jornadas de transferencia de conocimiento para los

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025

docentes de las sedes beneficiarias del proyecto en relación al uso de tendencias, así como el buen uso para la sostenibilidad de los bienes a dotar por el proyecto.

- **TIPO DE AMBIENTES A ENTREGAR EN INSTITUCIONES BENEFICIARIAS**

Sedes Educativas:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA- SEDE PRINCIPAL se contempla el mejoramiento de la infraestructura existente y dotación de: 1. Aula tecnológica en áreas del conocimiento y 2. Biblioteca Educativa con componentes tecnológicos y pedagógicos.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA ROIG Y VILLALBA- SEDE PRINCIPAL se contempla el mejoramiento de la infraestructura existente y dotación de: 1. Biblioteca Educativa con componentes tecnológicos y pedagógicos.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGÓN- SEDE PRINCIPAL se contempla el mejoramiento de la infraestructura existente y dotación de: 1. Biblioteca Educativa con componentes tecnológicos y pedagógicos.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE FONSECA - SEDE PRINCIPAL se contempla el mejoramiento de la infraestructura existente y dotación de: 1. Biblioteca Educativa con componentes tecnológicos y pedagógicos.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ - SEDE PRINCIPAL se contempla el mejoramiento de la infraestructura existente y dotación de: 1. Aula tecnológica en áreas del conocimiento.

CIERRE DE LA SOCIALIZACIÓN:

Las partes involucradas manifiestan su conformidad con los términos y condiciones expuestos durante la socialización del contrato 002-2025. Se reitera el compromiso de todas las partes para llevar a cabo el proyecto en los plazos y condiciones acordados, garantizando el cumplimiento de las obligaciones contractuales en conformidad con la normativa vigente.

En constancia de lo expuesto y con el propósito de cumplir con los compromisos adquiridos en el marco del contrato, las partes firman el presente acta de socialización.

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025

Gisela ZM

GISELA ZAMBRANO MONTENEGRO
R.L. Consorcio Fonseca Digital 2025
Contratista

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE FONSECA– SEDE PRINCIPAL
Cargo: Rector

Roiman Cobo Nieves

ROIMAN COBO NIEVES
R.L. Consorcio Inter Digital Fonseca
Interventoría

ANA MENDOZA MOYA
Secretario de Desarrollo Social
Alcaldía Municipal Fonseca – La Guajira

Nombre:
Cargo:

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025

ACTA DE SOCIALIZACIÓN PROYECTO.

LUGAR:	SALA DE JUNTAS DESPACHO ALCALDIA MUNICIPAL FONSECA – LA GUAJIRA
PROYECTO:	"FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLOGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA – LA GUAJIRA.
CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 002 DE 2025 (SASI -002)
CONTRATISTA:	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
ACTA DE INICIO.	22 DE AGOSTO 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	OCHO (8) MESES.
EJECUTOR:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE FONSECA – LA GUAJIRA
CONVOCADOS:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE FONSECA – LA GUAJIRA
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA ROIG Y VILLALBA – SEDE PRINCIPAL
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGÓN – SEDE PRINCIPAL
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE FONSECA – SEDE PRINCIPAL
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ DEL MUNICIPIO DE FONSECA LA GUAJIRA
	INTER DIGITAL FONSECA – INTERVENTORIA

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025

INTRODUCCIÓN.

El presente proyecto cuyo objeto es "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLOGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA, busca brindar ambientes pedagógicos innovadores con acceso a las herramientas TIC para los procesos de aprendizajes para la comunidad del municipio de Fonseca disminuyendo con esto las brechas digitales, contribuyendo al mejoramiento la calidad educativa.

La socialización del proyecto con las partes interesadas busca informar e involucrar a las partes beneficiarias (Beneficiarios, comunidad, Autoridades) sobre los detalles del proyecto a ejecutar por medio del contrato 002 DE 2025 (SASI – 002).

DESARROLLO DE LA SOCIALIZACIÓN.

La socialización se llevó a cabo en SALA DE JUNTAS DEL DESPACHO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL FONSECA – LA GUAJIRA, durante la reunión, se presentaron los detalles del proyecto, incluyendo su alcance, tiempo de ejecución, plan de trabajo para el desarrollo del proyecto y beneficios esperados. Además, se abrió un espacio para resolver inquietudes y recibir aportes de los asistentes, con el fin de garantizar que la implementación sea efectiva y responda a las necesidades de las comunidades educativas.

OBJETO DEL CONTRATO:

"FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA.

ALCANCE DEL CONTRATO:

Creación de 6 Ambientes de aprendizajes basados en el uso de la tecnología para el desarrollo de competencia digitales en el municipio de Fonseca, La Guajira

- 2 aulas tecnológicas dotadas.
- 4 bibliotecas tecnológicas dotadas

Adicionalmente el proyecto contempla la puesta en marcha de metodologías de apropiación con el desarrollo de jornadas de transferencia de conocimiento para los

docentes de las sedes beneficiarias del proyecto en relación al uso de tendencias, así como el buen uso para la sostenibilidad de los bienes a dotar por el proyecto.

- **TIPO DE AMBIENTES A ENTREGAR EN INSTITUCIONES BENEFICIARIAS**

Sedes Educativas:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA- SEDE PRINCIPAL se contempla el mejoramiento de la infraestructura existente y dotación de: 1. Aula tecnológica en áreas del conocimiento y 2. Biblioteca Educativa con componentes tecnológicos y pedagógicos.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA ROIG Y VILLALBA- SEDE PRINCIPAL se contempla el mejoramiento de la infraestructura existente y dotación de: 1. Biblioteca Educativa con componentes tecnológicos y pedagógicos.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGÓN- SEDE PRINCIPAL se contempla el mejoramiento de la infraestructura existente y dotación de: 1. Biblioteca Educativa con componentes tecnológicos y pedagógicos.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE FONSECA - SEDE PRINCIPAL se contempla el mejoramiento de la infraestructura existente y dotación de: 1. Biblioteca Educativa con componentes tecnológicos y pedagógicos.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ - SEDE PRINCIPAL se contempla el mejoramiento de la infraestructura existente y dotación de: 1. Aula tecnológica en áreas del conocimiento.

CIERRE DE LA SOCIALIZACIÓN:

Las partes involucradas manifiestan su conformidad con los términos y condiciones expuestos durante la socialización del contrato 002-2025. Se reitera el compromiso de todas las partes para llevar a cabo el proyecto en los plazos y condiciones acordados, garantizando el cumplimiento de las obligaciones contractuales en conformidad con la normativa vigente.

En constancia de lo expuesto y con el propósito de cumplir con los compromisos adquiridos en el marco del contrato, las partes firman el presente acta de socialización.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA
Cargo: Rector

GISELA ZAMBRANO MONTENEGRO
R.L. Consorcio Fonseca Digital 2025
Contratista

ROIMAN COBO NIEVES
R.L. Consorcio Inter Digital Fonseca
Interventoría

ANA MENDOZA MOYA
Secretario de Desarrollo Social
Alcaldía Municipal Fonseca – La Guajira

Nombre:
Cargo:

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025

ACTA DE SOCIALIZACIÓN PROYECTO.

LUGAR:	SALA DE JUNTAS DESPACHO ALCALDIA MUNICIPAL FONSECA – LA GUAJIRA
PROYECTO:	"FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLOGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA – LA GUAJIRA.
CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 002 DE 2025 (SASI -002)
CONTRATISTA:	CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
ACTA DE INICIO.	22 DE AGOSTO 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	OCHO (8) MESES.
EJECUTOR:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE FONSECA – LA GUAJIRA
CONVOCADOS:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE FONSECA – LA GUAJIRA
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA ROIG Y VILLALBA – SEDE PRINCIPAL
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGÓN – SEDE PRINCIPAL
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE FONSECA – SEDE PRINCIPAL
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ DEL MUNICIPIO DE FONSECA LA GUAJIRA
	INTER DIGITAL FONSECA – INTERVENTORIA

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025

INTRODUCCIÓN.

El presente proyecto cuyo objeto es "FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLOGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA, busca brindar ambientes pedagógicos innovadores con acceso a las herramientas TIC para los procesos de aprendizajes para la comunidad del municipio de Fonseca disminuyendo con esto las brechas digitales, contribuyendo al mejoramiento la calidad educativa.

La socialización del proyecto con las partes interesadas busca informar e involucrar a las partes beneficiarias (Beneficiarios, comunidad, Autoridades) sobre los detalles del proyecto a ejecutar por medio del contrato 002 DE 2025 (SASI – 002).

DESARROLLO DE LA SOCIALIZACIÓN.

La socialización se llevó a cabo en SALA DE JUNTAS DEL DESPACHO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL FONSECA – LA GUAJIRA, durante la reunión, se presentaron los detalles del proyecto, incluyendo su alcance, tiempo de ejecución, plan de trabajo para el desarrollo del proyecto y beneficios esperados. Además, se abrió un espacio para resolver inquietudes y recibir aportes de los asistentes, con el fin de garantizar que la implementación sea efectiva y responda a las necesidades de las comunidades educativas.

OBJETO DEL CONTRATO:

"FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA.

ALCANCE DEL CONTRATO:

Creación de 6 Ambientes de aprendizajes basados en el uso de la tecnología para el desarrollo de competencia digitales en el municipio de Fonseca, La Guajira

- 2 aulas tecnológicas dotadas.
- 4 bibliotecas tecnológicas dotadas

Adicionalmente el proyecto contempla la puesta en marcha de metodologías de apropiación con el desarrollo de jornadas de transferencia de conocimiento para los

docentes de las sedes beneficiarias del proyecto en relación al uso de tendencias, así como el buen uso para la sostenibilidad de los bienes a dotar por el proyecto.

- **TIPO DE AMBIENTES A ENTREGAR EN INSTITUCIONES BENEFICIARIAS**

Sedes Educativas:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA- SEDE PRINCIPAL se contempla el mejoramiento de la infraestructura existente y dotación de: 1. Aula tecnológica en áreas del conocimiento y 2. Biblioteca Educativa con componentes tecnológicos y pedagógicos.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA ROIG Y VILLALBA- SEDE PRINCIPAL se contempla el mejoramiento de la infraestructura existente y dotación de: 1. Biblioteca Educativa con componentes tecnológicos y pedagógicos.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGÓN- SEDE PRINCIPAL se contempla el mejoramiento de la infraestructura existente y dotación de: 1. Biblioteca Educativa con componentes tecnológicos y pedagógicos.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE FONSECA - SEDE PRINCIPAL se contempla el mejoramiento de la infraestructura existente y dotación de: 1. Biblioteca Educativa con componentes tecnológicos y pedagógicos.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ - SEDE PRINCIPAL se contempla el mejoramiento de la infraestructura existente y dotación de: 1. Aula tecnológica en áreas del conocimiento.

CIERRE DE LA SOCIALIZACIÓN:

Las partes involucradas manifiestan su conformidad con los términos y condiciones expuestos durante la socialización del contrato 002-2025. Se reitera el compromiso de todas las partes para llevar a cabo el proyecto en los plazos y condiciones acordados, garantizando el cumplimiento de las obligaciones contractuales en conformidad con la normativa vigente.

En constancia de lo expuesto y con el propósito de cumplir con los compromisos adquiridos en el marco del contrato, las partes firman la presente acta de socialización.

GISELA ZAMBRANO MONTENEGRO
R.L. Consorcio Fonseca Digital 2025
Contratista

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA ROIG Y VILLALBA – SEDE PRINCIPAL
Cargo: Docente

ROIMAN COBO NIEVES
R.L. Consorcio Inter Digital Fonseca
Interventoria

ANA MENDOZA MOYA
Secretario de Desarrollo Social
Alcaldia Municipal Fonseca – La Guajira

Nombre:
Cargo:

ANEXOS INFORME DE INTERVENTORÍA 002

VERIFICACIÓN ENTREGA DE LICENCIAS DE MÓDULOS EDUCATIVOS.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA - SEDE PRINCIPAL

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025

ACTA DE ENTREGA DE LICENCIA DE SOFTWARE

Fonseca, La Guajira 24 de septiembre 2025

Formalizamos la entrega de la licencia del software detallado a continuación:

CLÁUSULAS

PRIMERA - OBJETO DE LA ENTREGA

Por medio de la presente acta, **FOSECA DIGITAL 2025** hace entrega a **LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA- SEDE PRINCIPAL** en Fonseca La Guajira la licencia(s) del siguiente software:

- Licencia Software Plataforma Educativa PEDIGITAL, para uso de la Alcaldía Fonseca – La Guajira en sedes educativas beneficiarias en contrato de suministro 002.
- Tipo de licencia: Perpetua
- Clave acceso: CSIEEPMS
- Soporte incluido: Si

SEGUNDA - USO Y PROPIEDAD

La presente entrega no implica la cesión de propiedad intelectual sobre el software, el cual pertenece a su respectivo desarrollador/fabricante. **LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA- SEDE PRINCIPAL** se compromete a utilizar el software conforme a los términos y condiciones establecidos en el contrato de licencia de uso correspondiente.

TERCERA - ACEPTACIÓN

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA- SEDE PRINCIPAL declara haber recibido el software descrito en la cláusula primera.

CUARTA - SOPORTE TÉCNICO

Si, por tres (3) años

QUINTA - FIRMA DE CONFORMIDAD

Leída la presente acta, y en prueba de conformidad, ambas partes la firman por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.

FIRMAS

EL ENTREGANTE
Nombre: Gisela Tambrano
Cargo: Mes Irega | Fonseca Digital 2025
Firma: Gisela Tam

EL RECEPTOR
Nombre: Maryoris B M
Cargo: Rector
Firma:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA - SEDE PRINCIPAL

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025

ACTA DE ENTREGA DE LICENCIA DE SOFTWARE

Fonseca, La Guajira 24 de septiembre 2025

Formalizamos la entrega de la licencia del software detallado a continuación:

CLÁUSULAS

PRIMERA - OBJETO DE LA ENTREGA

Por medio de la presente acta, **FOSECA DIGITAL 2025** hace entrega a **LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA- SEDE PRINCIPAL** en Fonseca La Guajira la licencia(s) del siguiente software:

- Licencia Software Plataforma BIBLIOPED, para uso de la Alcaldía Fonseca – La Guajira en sedes educativas beneficiarias en contrato de suministro 002.
- Tipo de licencia: Perpetua
- Clave acceso: CSIEEPMSPB
- Soporte incluido: Si

SEGUNDA - USO Y PROPIEDAD

La presente entrega no implica la cesión de propiedad intelectual sobre el software, el cual pertenece a su respectivo desarrollador/fabricante. **LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA- SEDE PRINCIPAL** se compromete a utilizar el software conforme a los términos y condiciones establecidos en el contrato de licencia de uso correspondiente.

TERCERA - ACEPTACIÓN

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA- SEDE PRINCIPAL declara haber recibido el software descrito en la cláusula primera.

CUARTA - SOPORTE TÉCNICO

Si, por tres (3) años.

QUINTA - FIRMA DE CONFORMIDAD

Leída la presente acta, y en prueba de conformidad, ambas partes la firman por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.

FIRMAS

EL ENTREGANTE
Nombre: Gisela Zambrano
Cargo: Rep Legal Fonseca Digital 2025
Firma: Gisela Zm.

EL RECEPTOR
Nombre: Mayor B MR
Cargo: Rector
Firma:

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ROIG Y VILLALBA- SEDE PRINCIPAL

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025

ACTA DE ENTREGA DE LICENCIA DE SOFTWARE

Fonseca, La Guajira 24 de septiembre 2025

Formalizamos la entrega de la licencia del software detallado a continuación:

CLÁUSULAS

PRIMERA - OBJETO DE LA ENTREGA

Por medio de la presente acta, **FOSECA DIGITAL 2025** hace entrega a **LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA ROIG Y VILLALBA - SEDE PRINCIPAL** en Fonseca La Guajira la licencia(s) del siguiente software:

- Licencia Software Plataforma BIBLIOPED, para uso de la Alcaldía Fonseca – La Guajira en sedes educativas beneficiarias en contrato de suministro 002.
- Tipo de licencia: Perpetua
- Clave acceso: CSIETRVPB
- Soporte incluido: Si

SEGUNDA - USO Y PROPIEDAD

La presente entrega no implica la cesión de propiedad intelectual sobre el software, el cual pertenece a su respectivo desarrollador/fabricante. **LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA ROIG Y VILLALBA - SEDE PRINCIPAL** se compromete a utilizar el software conforme a los términos y condiciones establecidos en el contrato de licencia de uso correspondiente.

TERCERA - ACEPTACIÓN

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA ROIG Y VILLALBA - SEDE PRINCIPAL declara haber recibido el software descrito en la cláusula primera.

CUARTA - SOPORTE TÉCNICO

Si, por tres (3) años.

QUINTA - FIRMA DE CONFORMIDAD

Leída la presente acta, y en prueba de conformidad, ambas partes la firman por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.

FIRMAS

EL ENTREGANTE
Nombre: Gisela Zambrano
Cargo: Rep Legal Consorcio Fonseca Digital 2025
Firma:

EL RECEPTOR
Nombre: Alfonso Acosta R
Cargo: Docente
Firma:

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGON- SEDE PRINCIPAL.

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025

ACTA DE ENTREGA DE LICENCIA DE SOFTWARE

Fonseca, La Guajira 24 de septiembre 2025

Formalizamos la entrega de la licencia del software detallado a continuación:

CLÁUSULAS

PRIMERA - OBJETO DE LA ENTREGA

Por medio de la presente acta, **FOSECA DIGITAL 2025** hace entrega a **LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGON - SEDE PRINCIPAL** en Fonseca La Guajira la licencia(s) del siguiente software:

- Licencia Software Plataforma BIBLIOPED, para uso de la Alcaldía Fonseca – La Guajira en sedes educativas beneficiarias en contrato de suministro 002.
- Tipo de licencia: Perpetua
- Clave acceso: CSIEJJAPB
- Soporte incluido: Si

SEGUNDA - USO Y PROPIEDAD

La presente entrega no implica la cesión de propiedad intelectual sobre el software, el cual pertenece a su respectivo desarrollador/fabricante. **LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGON - SEDE PRINCIPAL** se compromete a utilizar el software conforme a los términos y condiciones establecidos en el contrato de licencia de uso correspondiente.

TERCERA - ACEPTACIÓN

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGON - SEDE PRINCIPAL declara haber recibido el software descrito en la cláusula primera.

CUARTA - SOPORTE TÉCNICO

Si, por tres (3) años.

QUINTA - FIRMA DE CONFORMIDAD

Leída la presente acta, y en prueba de conformidad, ambas partes la firman por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.

FIRMAS

EL ENTREGANTE
Nombre: Gisela Lombisomo
Cargo: Rep legal Consorcio Fonseca Digital 2025
Firma:

EL RECEPTOR
Nombre: LEONEL RIZO G.
Cargo: RECTOR
Firma:

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE FONSECA - SEDE PRINCIPAL

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025

ACTA DE ENTREGA DE LICENCIA DE SOFTWARE

Fonseca, La Guajira 24 de septiembre 2025

Formalizamos la entrega de la licencia del software detallado a continuación:

CLÁUSULAS

PRIMERA - OBJETO DE LA ENTREGA

Por medio de la presente acta, **FOSECA DIGITAL 2025** hace entrega a **LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE FONSECA - SEDE PRINCIPAL** en Fonseca La Guajira la licencia(s) del siguiente software:

- Licencia Software Plataforma BIBLIOPED, para uso de la Alcaldía Fonseca – La Guajira en sedes educativas beneficiarias en contrato de suministro 002.
- Tipo de licencia: Perpetua
- Clave acceso: CSIETAFPB
- Soporte incluido: Si

SEGUNDA - USO Y PROPIEDAD

La presente entrega no implica la cesión de propiedad intelectual sobre el software, el cual pertenece a su respectivo desarrollador/fabricante. **LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE FONSECA - SEDE PRINCIPAL** se compromete a utilizar el software conforme a los términos y condiciones establecidos en el contrato de licencia de uso correspondiente.

TERCERA - ACEPTACIÓN

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE FONSECA - SEDE PRINCIPAL declara haber recibido el software descrito en la cláusula primera.

CUARTA - SOPORTE TÉCNICO

Si, por tres (3) años.

QUINTA - FIRMA DE CONFORMIDAD

Leída la presente acta, y en prueba de conformidad, ambas partes la firman por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.

FIRMAS

EL ENTREGANTE
Nombre: Gisela Zambrano
Cargo: Rep Legal Consorcio Fonseca Digital 2025
Firma: Gisela Zam

EL RECEPTOR
Nombre: Francisco Núñez
Cargo: Rector
Firma:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ - SEDE PRINCIPAL

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025

ACTA DE ENTREGA DE LICENCIA DE SOFTWARE

Fonseca, La Guajira 24 de septiembre 2025

Formalizamos la entrega de la licencia del software detallado a continuación:

CLÁUSULAS

PRIMERA - OBJETO DE LA ENTREGA

Por medio de la presente acta, **FOSECA DIGITAL 2025** hace entrega a **LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ - SEDE PRINCIPAL** en Fonseca La Guajira la licencia(s) del siguiente software:

- Licencia Software Plataforma Educativa PEDIGITAL, para uso de la Alcaldía Fonseca – La Guajira en sedes educativas beneficiarias en contrato de suministro 002.
- Tipo de licencia: Perpetua
- Clave acceso: CSIERAJP
- Soporte incluido: Si

SEGUNDA - USO Y PROPIEDAD

La presente entrega no implica la cesión de propiedad intelectual sobre el software, el cual pertenece a su respectivo desarrollador/fabricante. **LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ - SEDE PRINCIPAL** se compromete a utilizar el software conforme a los términos y condiciones establecidos en el contrato de licencia de uso correspondiente.

TERCERA - ACEPTACIÓN

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ - SEDE PRINCIPAL declara haber recibido el software descrito en la cláusula primera.

CUARTA - SOPORTE TÉCNICO

Si, por tres (3) años

QUINTA - FIRMA DE CONFORMIDAD

Leída la presente acta, y en prueba de conformidad, ambas partes la firman por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados.

FIRMAS

EL ENTREGANTE
Nombre: Gisela Zambrano
Cargo: Rep legal Consorcio Fonseca Digital 2025
Firma: Gisela Zam

EL RECEPTOR
Nombre: Yuley Arregoces
Cargo: Rectora
Firma:

ACTAS DE ENTREGAS DE EQUIPOS SERVIDORES.

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025

ACTA DE ENTREGA DE SUMINISTRO.

En el municipio de Fonseca, La Guajira en las instalaciones de la **INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA ROIG Y VILLALBA – SEDE PRINCIPAL** se hace la entrega por parte del contratista CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025 de los siguientes elementos tecnológicos en cumplimiento a lo establecido en el contrato de suministro No 002 del 2025 (SASI-002) cuyo objeto es **FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLOGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA.**

- Servidor Dell Power Edge T160, incluye Pantalla monitor modelo ACER K2 K222HQL, teclado y mouse.

INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA ROIG Y VILLALBA – SEDE PRINCIPAL BIBLIOTECA EDUCATIVA CON COMPONENTES TECNOLOGICOS Y PEDAGOGICOS		
ELEMENTO	**SERIAL SERVIDOR**	**SERIALES MONITOR**
Servidor Dell Power Edge T160 Intel Xeon (Disco duro 2 Tera, Memoria RAM 32 Gb	HWP2DB4	MMTE2AA001229035D43LCC ACER K2 SERIES MODELO K222HQL

FIRMA ENTREGA.

GISELA ZAMBRANO MONTENEGRO
R/L CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
Contratista

FIRMA RECIBE

INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA ROIG Y VILLALBA – SEDE PRINCIPAL
Nombre: Yilena Mercedes Molina Rodríguez
Cargo: Rectora

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025

ACTA DE ENTREGA DE SUMINISTRO.

En el municipio de Fonseca, La Guajira en las instalaciones de la **INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE FONSECA – SEDE PRINCIPAL** se hace la entrega por parte del contratista CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025 de los siguientes elementos tecnológicos en cumplimiento a lo establecido en el contrato de suministro No 002 del 2025 (SASI-002) cuyo objeto es **FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLOGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA.**

- Servidor Dell Power Edge T160, incluye Pantalla monitor modelo Samsung S22D310EAN, teclado y mouse.

INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE FONSECA – SEDE PRINCIPAL BIBLIOTECA EDUCATIVA CON COPONENTES TECNOLOGICOS		
ELEMENTO	**SERIAL SERVIDOR**	**SERIALES MONITOR**
Servidor Dell Power Edge T160 Intel Xeon (Disco duro 2 Tera, Memoria RAM 32 Gb	1TPS794	6Q46H9PY6000762 MODEL SAMSUNG S22D310EAN

FIRMA ENTREGA.

GISELA ZAMBRANO MONTENEGRO
R/L. CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
Contratista
Contratista

FIRMA RECIBE

INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA DE FONSECA-SEDE PRINCIPAL
Nombre: Francisco Muñoz Pulo
Cargo: Rector.

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025

ACTA DE ENTREGA DE SUMINISTRO.

En el municipio de Fonseca, La Guajira en las instalaciones de la **INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGÓN – SEDE PRINCIPAL** se hace la entrega por parte del contratista CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025 de los siguientes elementos tecnológicos en cumplimiento a lo establecido en el contrato de suministro No 002 del 2025 (SASI-002) cuyo objeto es **FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLOGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA.**

- Servidor Dell Power Edge T160, incluye Pantalla monitor modelo Samsung S22D310EAN, teclados y mouse.

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGÓN – SEDE PRINCIPAL BIBLIOTECAS EDUCATIVAS CON COMPONENTES TECNOLOGICOS Y PEDAGOGICOS		
ELEMENTO	**SERIAL SERVIDOR**	**SERIALES MONITOR**
Servidor Dell Power Edge T160 Intel Xeon (Disco duro 2 Tera, Memoria RAM 32 Gb	1XP2DB4	6Q46H9PY600900 MODEL SAMSUNG S22D310EAN

FIRMA ENTREGA.

GISELA ZAMBRANO MONTENEGRO
R/L CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
Contratista

FIRMA RECIBE

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN JACOBO ARAGÓN – SEDE PRINCIPAL
Nombre: LEONEL ICIZO G.
Cargo: RECTOR

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025

ACTA DE ENTREGA DE SUMINISTRO.

En el municipio de Fonseca, La Guajira en las instalaciones de la **INSTITUCION EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ** se hace la entrega por parte del contratista CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025 de los siguientes elementos tecnológicos en cumplimiento a lo establecido en el contrato de suministro No 002 del 2025 (SASI-002) cuyo objeto es FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLOGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA.

- Servidor Dell Power Edge T160, incluye Pantalla monitor modelo ACER EA220Q, teclado y mouse.

INSTITUCION EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ AULA TECNOLOGICA		
ELEMENTO	**SERIAL SERVIDOR**	**SERIALES MONITOR**
Servidor Dell Power Edge T160 Intel Xeon (Disco duro 2 Tera, Memoria RAM 32 Gb	DWP2DB4	MMTJDAA0055160AA143W01 **MODELO ACER EA220Q**

FIRMA ENTREGA.

GISELA ZAMBRANO MONTENEGRO
R/L CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
Contratista

FIRMA RECIBE

INSTITUCION EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ FONSECA - LA GUAJIRA
Nombre:
CARGO:



CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025

ACTA DE ENTREGA DE SUMINISTRO.

En el municipio de Fonseca, La Guajira en las instalaciones de la **INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA** se hace la entrega por parte del contratista CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025 de los siguientes elementos tecnológicos en cumplimiento a lo establecido en el contrato de suministro No 002 del 2025 (SASI-002) cuyo objeto es FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLOGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA.


- Servidor Dell Power Edge T160, incluye Pantalla monitor modelo ACER EA220Q, teclado y mouse.

INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA - AULA TECNOLOGICA		
ELEMENTO	**SERIAL SERVIDOR**	**SERIALES MONITOR**
Servidor Dell Power Edge T160 Intel Xeon (Disco duro 2 Tera, Memoria RAM 32 Gb.	5XP2DB4	MMTYAAA001322004BD3511 MODELO ACER EA220Q

FIRMA ENTREGA: FIRMA RECIBE:

GISELA ZAMBRANO MONTENEGRO
R/L CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
Contratista

INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA
Nombre: Mayorga
Cargo: Rector

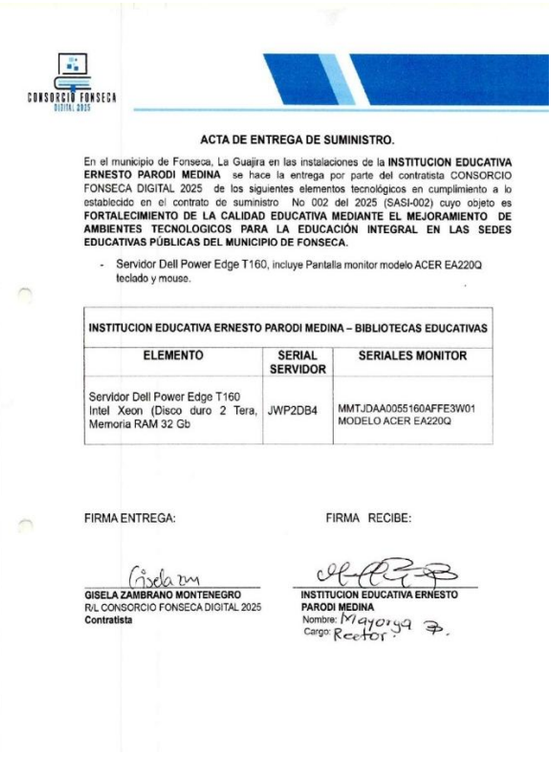

CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025

ACTA DE ENTREGA DE SUMINISTRO.

En el municipio de Fonseca, La Guajira en las instalaciones de la **INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA** se hace la entrega por parte del contratista CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025 de los siguientes elementos tecnológicos en cumplimiento a lo establecido en el contrato de suministro No 002 del 2025 (SASI-002) cuyo objeto es **FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE AMBIENTES TECNOLOGICOS PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN LAS SEDES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FONSECA.**

- Servidor Dell Power Edge T160, incluye Pantalla monitor modelo ACER EA220Q teclado y mouse.

INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA – BIBLIOTECAS EDUCATIVAS		
ELEMENTO	**SERIAL SERVIDOR**	**SERIALES MONITOR**
Servidor Dell Power Edge T160 Intel Xeon (Disco duro 2 Tera, Memoria RAM 32 Gb	JWP2DB4	MMTJDAA0055160AFFE3W01 MODELO ACER EA220Q

FIRMA ENTREGA: FIRMA RECIBE:

GISELA ZAMBRANO MONTENEGRO
R/L CONSORCIO FONSECA DIGITAL 2025
Contratista

INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA
Nombre: Mayorga
Cargo: Rector

9. Ciudad y fecha de emisión:	Fonseca – La Guajira, mes de Diciembre de 2025.
10. Firma del interventor y/o supervisor	
